

14ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Mercúrio

Comissão Nacional de Segurança Química

Brasília, 08 de agosto de 2017

Projeto MIA

*Desenvolvimento da Avaliação Inicial da Convenção
de Minamata sobre Mercúrio no Brasil*

SB-001062.03.01

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



Projeto MIA

Nome:

Desenvolvimento da Avaliação Inicial da Convenção de Minamata sobre Mercúrio no Brasil

SB-001062.03.01

Vigência:

08/2015 – 06/2018

Doação (GEF):

US\$ 821.918,00

CP não financeiro:

US\$ 2.511.918,00

Agência Executora:

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

**Agência Implementadora:**

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



Status do Projeto – Progresso das Atividades

- 4 componentes;
- 11 atividades:
 - ✓ 1 **concluída**;
 - ✓ 2 **contínuas**;
 - ✓ 4 **em execução**;
 - 3 atividades em fase final de execução (1.1.C, 1.2.A e 2.2);
 - ✓ 4 **a serem executadas**.
 - 2 atividades em processo de contratação de consultoria (3.1 e 3.2);
 - 1 atividade com Termo de Referência em elaboração.

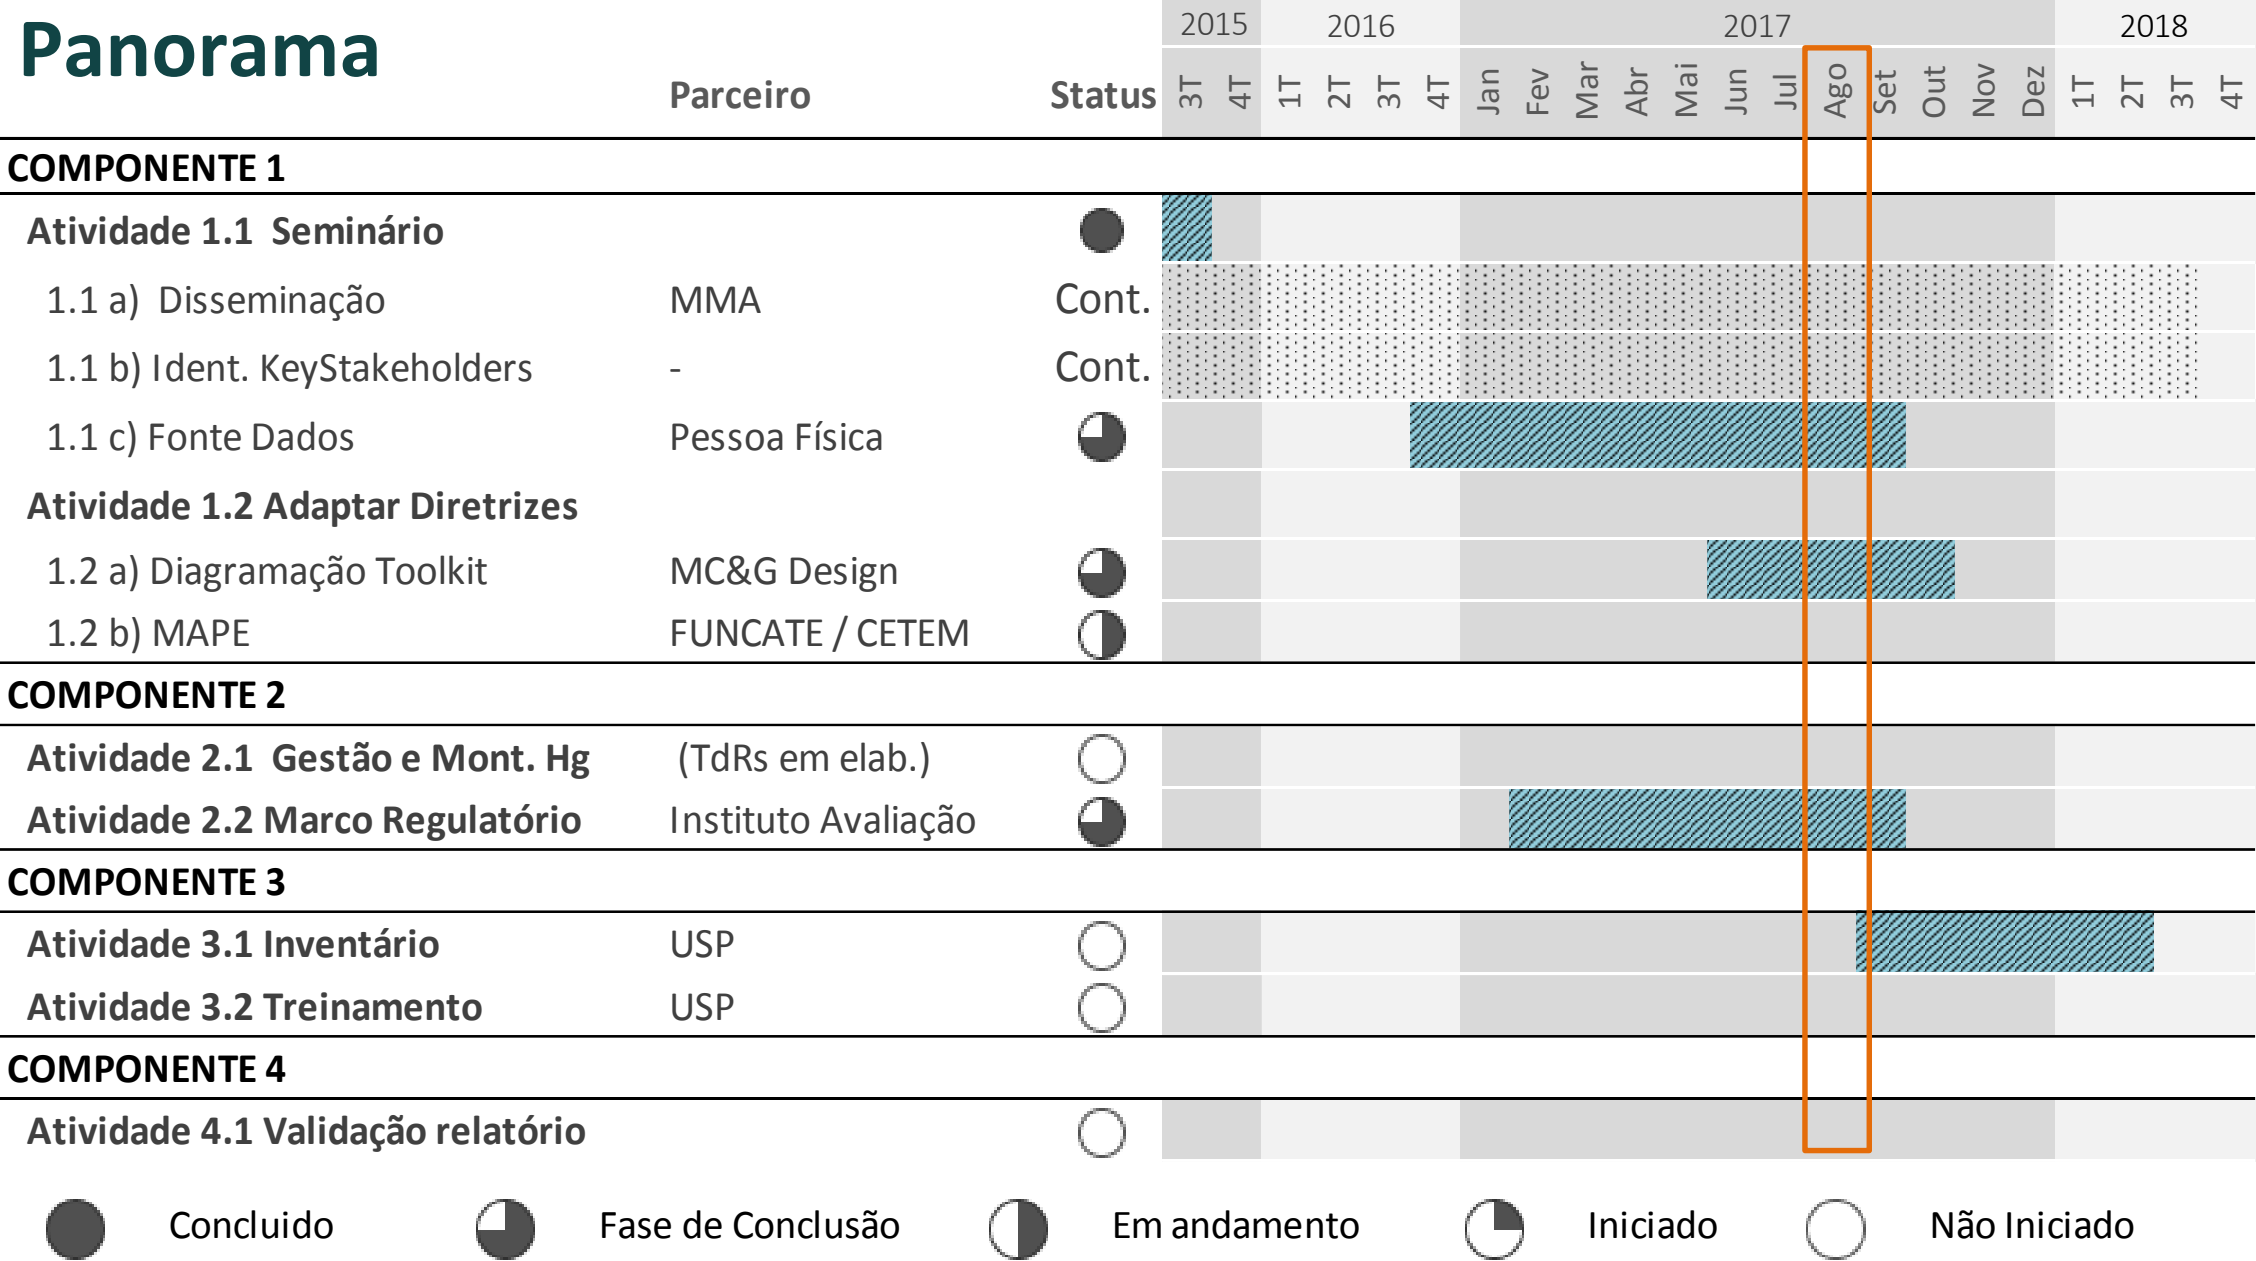
Objetivo

Facilitar a ratificação e a **pronta implementação** da Convenção de Minamata, provendo aos principais stakeholders nacionais o **conhecimento técnico e científico** bem como os instrumentos necessários para essa função.





Resultados previstos

- 1 Avaliação e atualização das informações disponíveis afetas à **gestão nacional de mercúrio**;
- 2 Análise dos **marcos regulatórios** relacionados à gestão de mercúrio;
- 3 Avaliação da capacidade nacional para **gestão e monitoramento** de mercúrio;
- 4 Elaboração de **inventário de emissões e liberações** antropogênicas de mercúrio;
- 5 Redação de um relatório final sobre principais **oportunidades e desafios** para implementação da Convenção.





Panorama



Status do Projeto – Progresso das Atividades

Atividade		Status	
COMPONENTE I			
Atividade 1.1	Seminário Nacional de Lançamento do Projeto	Concluída	
a)	Desenvolver estratégia de conscientização e disseminação para os stakeholders	Contínuo	
b)	Identificar stakeholders e designar funções	Contínuo	
c)	Avaliação nacional de fontes de informações	Em Conclusão	

Status do Projeto – Progresso das Atividades

Atividade		Status
COMPONENTE I		
Atividade 1.2		
a)	Traduzir o Toolkit do PNUMA	Em Conclusão 
b)	Orientações para o inventário de mercúrio no setor de MAPE	Em execução 
COMPONENTE II		
Atividade 2.1	Avaliar stakeholders nacionais chave	A ser executada 
Atividade 2.2	Analisar marco regulatório nacional	Em Conclusão 

Status do Projeto – Progresso das Atividades

Atividade		Status
COMPONENTE III		
Atividade 3.1	Inventário qualitativo e quantitativo sobre fontes de mercúrio	A ser executada <input type="radio"/>
Atividade 3.2	Treinamento sobre o Toolkit do PNUMA	A ser executada <input type="radio"/>
COMPONENTE IV		
Atividade 4.1	Preparar e validar o Relatório da MIA	A ser executada <input type="radio"/>

Apresentação de Resultados

- 1 Avaliação e atualização das informações disponíveis afetas à **gestão nacional de mercúrio**;
- 2 Análise dos **marcos regulatórios** relacionados à gestão de mercúrio;
- 3 Avaliação da capacidade nacional para **gestão e monitoramento** de mercúrio;
- 4 Elaboração de **inventário de emissões e liberações** antropogênicas de mercúrio;
- 5 Redação de um relatório final sobre principais **oportunidades e desafios** para implementação da Convenção.

Equipe

Nome	Órgão	Cargo	Telefone	E-mail
Letícia Reis de Carvalho	MMA	Diretora Nacional Projeto MIA	61-2028 2070	leticia.carvalho@mma.gov.br
Francisca Menezes	PNUMA	Oficial de Projeto	61-3038 9238	francisca.menezes.affiliate@pnuma.org
Camila Boechat	MMA	Analista Ambiental	61-2028 2614	camila.boechat@mma.gov.br
Diego Pereira	MMA	Analista Ambiental	61-2028 2230	diego.pereira@mma.gov.br
Luiz Mandalho	MMA	Analista Ambiental	61-2028 2362	luizgustavo.madalho@mma.gov.br
Elisa Badziack	PNUMA/ MMA	Assistente Técnico de Projeto	61-2028 2221	ebadziack.mma@gmail.com
Gabriel Silva	PNUMA/ MMA	Assistente Administrativo	61-2028 2619	silva.gabriel.mma@gmail.com
