



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2018



**Recife
Agosto de 2018**

SUMÁRIO

Introdução.....	3
1. Resultados do monitoramento	5
2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	12
3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais.....	26
4. Indicadores de Gestão de Convênios	35
5. Indicadores de Gestão de Pessoas.....	51
6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional.....	54
7. Metas de desempenho institucional para o período out/2017 - set/2018	64
8. Conclusão	69
ANEXO I – Planos Operativos do Monitoramento	71
ANEXO II – Gestão Orçamentária e Financeira 2018 (posição até 30/06/2018)	191
ANEXO III – Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE	193
ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA 2016-2019	200
ANEXO V - Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE	207
ANEXO VI – Planos Operativos prioritários relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE	215
ANEXO VII - Planos Operativos prioritários 2018, relacionados na Ata da 304ª Reunião Ordinária, da Diretoria Colegiada da SUDENE	337

Introdução

Realizado desde 2012, o monitoramento dos projetos, promovido pela Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), tem como objetivo não se ater a meras ações de controle, mas proporcionar, por exemplo, transparência às atividades realizadas pelas diversas unidades da Sudene e a implantação de ações preventivas e corretivas face ao compartilhamento dos projetos em andamento na Autarquia.

A reunião do segundo ciclo do monitoramento 2018 estava prevista para acontecer no dia 29 de junho de 2018, mas devido à agenda do Superintendente Substituto, o diretor Antônio Ribeiro, foi transferida para o dia 12 de julho de 2018. Todas as unidades foram comunicadas de tal alteração, sendo solicitada a atualização das informações, uma vez que anteriormente a data de referência era 31 de maio de 2018. Porém, a reunião foi suspensa, até segunda ordem, pelo então Superintendente Substituto sob o argumento de que as unidades finalísticas estariam, durante os meses de junho e julho, comprometidas com outras atividades que deveriam ser concluídas em curto prazo. Tal decisão foi comunicada via e-mail, pelo então Superintendente Substituto, para as diversas unidades no dia 29 de junho de 2018.

A realização de atividades que mobilizassem diversas unidades apenas foi autorizada quando obedecesse aos seguintes critérios: “Atividades com prazos determinados por instâncias superiores da Administração Pública, particularmente aqueles estipulados pelos órgãos de Fiscalização e Controle e os que se relacionam com a administração financeira da entidade (liberação de recursos, etc); Atividades decorrentes de decisões aprovadas pela Diretoria Colegiada; Demandas outras cujo não atendimento possa provocar danos às pessoas, bens e interesses da administração pública e da sociedade”. Portanto, a suspensão foi mantida e a reunião do 2º ciclo de monitoramento não aconteceu, assim como a do 1º ciclo que foi cancelada devido à agenda do Superintendente, embora os relatórios continuassem a ser feitos.

Apesar do impedimento à reunião do 2º ciclo, as unidades atualizaram e encaminharam os planos operativos, contudo, apenas a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS) não enviou os seus projetos atualizados. Neste ciclo, os planos operativos totalizaram 124, incluindo os planos trabalhados pelas unidades; os projetos prioritários estabelecidos durante a 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Sudene, realizada em 16 de maio de 2018; os que foram definidos pela Resolução nº 281, de 13 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada da Sudene, além de projetos ligados ao ciclo de desempenho institucional out 2017/set 2018.

Os planos desatualizados da CGDS correspondem a 65, abrangendo 52 projetos relacionados ao acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como, do apoio técnico à articulação de novas emendas. Esses planos constam como “desatualizados” nas planilhas que seguem anexas neste relatório. A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN) encaminhou 14 planos; a Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN) enviou 4 projetos; a Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN) encaminhou 33 planos; a Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI/SUP) encaminhou 3; a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/DAD) enviou 3 e a Comissão Permanente de Convênios, Congêneres, e Tomada de Contas Especial (CCONT/DAD) enviou 2, todos detalhados nos anexos deste relatório. Sabe-se hoje, que a quantidade de planos operativos (projetos) relacionados a emendas parlamentares supera a casa dos 100 (cem).

Dentre os projetos a cargo da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) considerados prioritários durante a 304ª reunião da Diretoria Colegiada da Sudene, para o exercício

2018, foram atualizados e encaminhados os projetos de elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE); de elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana e de Campina Grande; projetos vinculados à melhoria da agricultura familiar e à inclusão do semiárido na produção de energias renováveis, fotovoltaica e eólica, com a finalidade de promover o seu desenvolvimento econômico, além de projetos relacionados à avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene. Outros projetos considerados prioritários, durante a supracitada reunião, não foram atualizados e encaminhados para compor o relatório em questão. Em andamento encontram-se também os projetos prioritários, definidos pela Resolução nº 281 de 13/06/2017, destinados ao acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus Planos de Trabalho. Em relação aos projetos sob a responsabilidade da CGDF, muitos estão em andamento, pois estão pendentes de fiscalizações ou da emissão de certificados de empreendimento implantado ou de correções em tais certificados.

No tocante aos projetos vinculados às metas de desempenho institucional, fixadas pela Portaria nº 167 de 20 de dezembro de 2017, para o período compreendido entre 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018, as unidades encaminharam seus planos operativos que estão relacionados a programas, projetos ou atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas, diretamente relacionados às atividades-fim da Sudene, com base no artigo 5º do Decreto nº 7.133/2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional.

Porém, a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS) não encaminhou tais projetos relacionados à meta institucional, o que compromete o trabalho da Coordenação-Geral de Gestão Institucional em acompanhar o que está posto no § 2º do Decreto nº 7.133/2010, que estabelece que as metas institucionais poderão ser revistas, “a qualquer tempo na hipótese de superveniência de fatores que influenciem significativa e diretamente a sua consecução, desde que o órgão ou entidade não tenha dado causa a tais fatores”. Tal dificuldade por parte da CGGI foi relatada durante a 310ª Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada da Sudene, ocorrida no dia 19 de julho de 2018.

A elaboração deste relatório tem como um dos objetivos partilhar com as demais unidades as ações em andamento na Sudene, contribuindo para a propagação do conhecimento e a efetivação de ações de gerenciamento de riscos, promovendo o controle necessário, como mecanismo de governança, a fim de monitorar as ações das diversas unidades.

O significado das siglas consideradas neste relatório poderá ser verificado na página eletrônica da SUDENE, no endereço http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf

1. Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 2º Ciclo de Monitoramento 2018

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

**Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 2º ciclo 2018,
por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status**

STATUS	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS ¹	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
A Iniciar								0
Concluído		4		22	1			27
Em Andamento	63	5	4	4	1	3	2	82
Atrasado	2	5		3	1			11
Cancelado				2				2
Paralisado				2				2
TOTAL	65	14	4	33	3	3	2	124

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

¹CGDS – dados computados até o 1º Ciclo 2018.

Nota:

1 - As análises de convênios para emissão de parecer financeiro e as tomadas de conta especial foram trabalhadas, para fins de monitoramento, como planos operativos da Comissão Permanente de Convênios, Congêneres e Tomada de Contas Especial (CCONT/DAD)

2 – Os Planos Operativos vinculados à CGDS não estão atualizados, uma vez que a unidade não encaminhou tais atualizações.

O Gráfico 1, adiante, mostra a situação dos Planos Operativos no 2º ciclo de 2018, totalizando 124 incluindo os projetos que foram tidos com prioritários pela resolução nº281/2017, da Diretoria Colegiada e posteriormente pela Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.

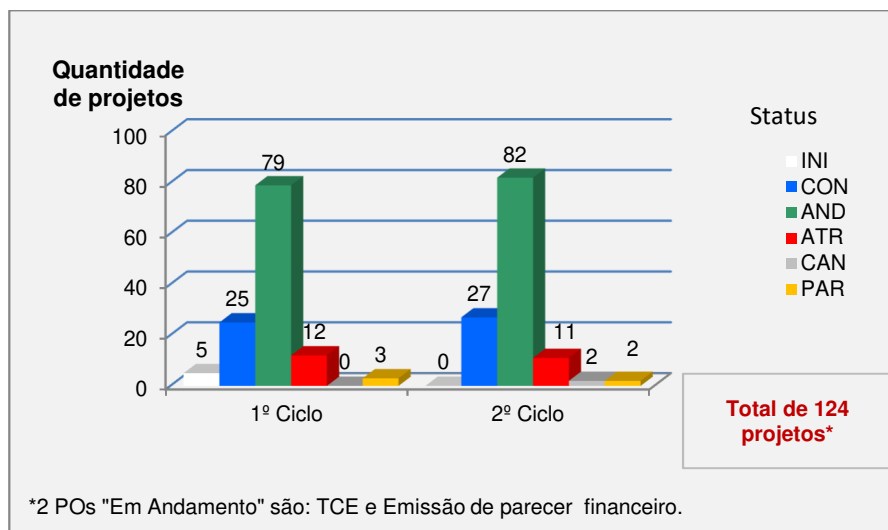


Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos no 2º Ciclo de 2018, inclusive os prioritários de 2017 e 2018

Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 2º ciclo 2018, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto, incluindo os classificados como prioritários pela Resolução nº 281/2017, e pela Ata da 304ª Reunião Ordinária de 2018, da Diretoria Colegiada da SUDENE

ANO	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS ¹	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
2008				3				3
2011				5				5
2012	1			15				16
2013	3		1	1				5
2014	5			1				6
2015	3	1		1				5
2016	14	3		3				20
2017	38	1	2	4	2		2	49
2018	1	9	1		1	3		15
TOTAL	65	14	4	33	3	3	2	124

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

¹ CGDS – dados computados até o 1º Ciclo 2018.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, exclusive os projetos prioritários 2017 e 2018, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	Status ⁴						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
1	1.1	42	8.375.226,46	6.845.435,02		22	10	6	2	2	42
	1.4	10	0,00	0,00		4	2	4			10
Sub-Total		52	8.375.226,46	6.845.435,02	0	26	12	10	2	2	52
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00			1				1
	2.3	2	989,48	724,24			2				2
Sub-Total		3	44.279,48	17.962,24	0	0	3	0	0	0	3
3	3.1	8	156,37	7,65		1	6	1			8
Sub-Total		8	156,37	7,65	0	1	6	1	0	0	8
TOTAL		63	8.419.662,32	6.863.404,91	0	27	21	11	2	2	63

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.2-** Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 29/06/2018 (2º Ciclo de monitoramento-2018)

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos,
exclusive os projetos prioritários 2017 e 2018, segundo Programas e
Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018**

Programa do PPA¹ (Código)	Ação do PPA¹ (Código)	Projetos enquadrados² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados³ (R\$ 1 mil)	STATUS⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	31	8.369.574,21	6.840.232,65		22	2	3	2	2	31
	20N7	2	1.114,59	977,15			2				2
	20WQ	4	749,00	749,00		3		1			4
	4640	1	1.069,87	764,87			1				1
	8689	2	989,48	724,24			2				2
	8902	6	2.511,25	2.503,81			5	1			6
	8917	1	207,54	207,54				1			1
Sub-Total		47	8.376.215,95	6.846.159,26	0	25	12	6	2	2	47
2111	2000	5	156,37	7,65			5				5
Sub-Total		5	156,37	7,65	0	0	5	0	0	0	5
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		1	43.290,00	17.238,00	0	0	1	0	0	0	1
Ações Internas		10	0,00	0,00		2	3	5			10
Sub-Total		10	0,00	0,00	0	2	3	5	0	0	10
TOTAL		63	8.419.662,32	6.863.404,91	0	27	21	11	2	2	63

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais. **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Siglário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 29/06/2018 (2º Ciclo de monitoramento-2018)

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos,
exclusive, os projetos prioritários 2017 e 2018, segundo Unidades
administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018**

Unidade superior	Sub-unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	12	5.892,73	5.177,62			10	2			12
	CGEP	11	749,00	749,00		4	2	5			11
	CGCP	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		24	49.931,73	23.164,62	0	4	13	7	0	0	24
DFIN	CGDF	31	8.369.574,21	6.840.232,65		22	2	3	2	2	31
Sub-Total		31	8.369.574,21	6.840.232,65	0	22	2	3	2	2	31
SUP.	CGGI	3	0,00	0,00		1	1	1			3
Sub-Total		3	0,00	0,00	0	1	1	1	0	0	3
DAD	CCONT	2	0,00	0,00			2				2
	CGGP	3	156,37	7,65			3				3
Sub-Total		5	156,37	7,65	0	0	5	0	0	0	5
TOTAL		63	8.419.662,32	6.863.404,91	0	27	21	11	2	2	63

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.


² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

³Projetos do FDNE na condição de espera para receber o Certificado de Empreendimento Implantado.

⁴TCE e Emissão de parecer financeiro.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 29/06/2018 (2º Ciclo de monitoramento-2018)

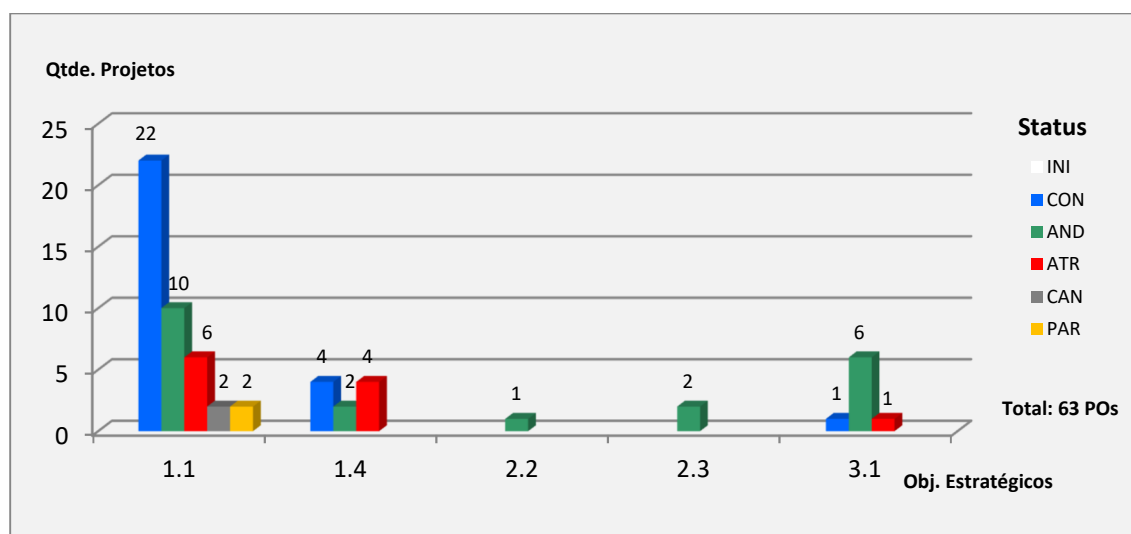


Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste;** 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4-** Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos;** 2.2- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3-Promover a sustentabilidade ambiental;** **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE;** 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º Ciclo – 2018), exclusive os Projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

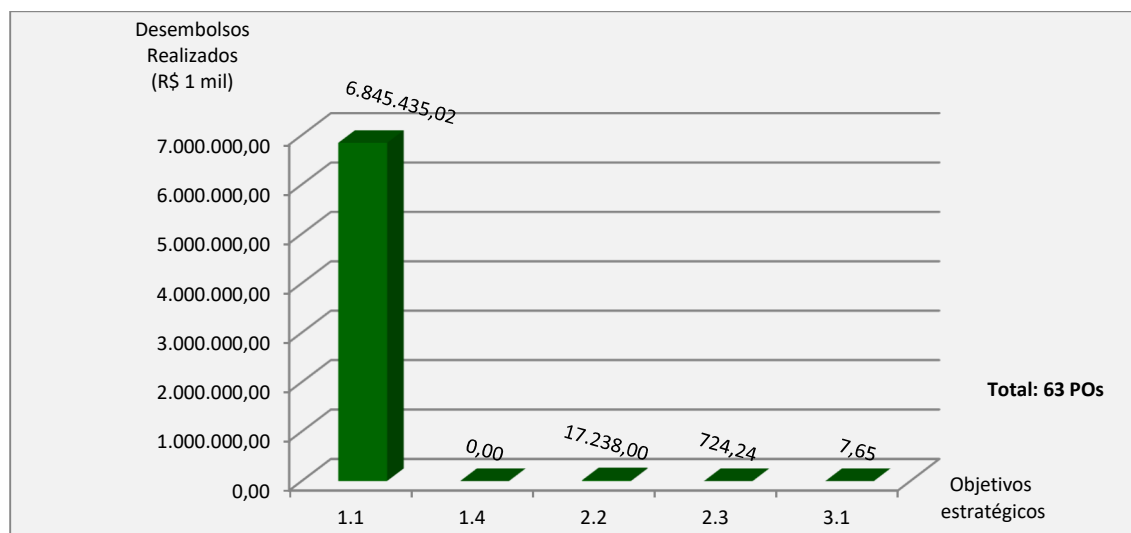

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º ciclo - 2018), exclusive os projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

Tabela 4 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, e da Ata da 304ª Reunião Ordinária, da Diretoria Colegiada, em 2018,, segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018 (não inclui os novos projetos da CGDS)

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
1	1.1	56	30.850,13	3.077,44			56				56
	1.2	2	564,12	0,00			2				2
	1.3	2	0,00	0,00			2				2
	1.4	1	0,00	0,00			1				1
TOTAL		61	31.414,25	3.077,44	0	0	61	0	0	0	61

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar **diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas.

² Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 29/06/2018 (2º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 5 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, e da Ata da 304ª Reunião Ordinária, da Diretoria Colegiada, em 2018, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018 (não inclui os novos projetos da CGDS)

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
2029	20WQ	3	2.049,76	300,00			3				3
	8340	1	364,12	0,00			1				
	214S	17	12.670,02	0,00			17				17
	7K66	36	16.330,35	2.777,44			36				36
Sub-Total		57	31.414,25	3.077,44	0	0	57	0	0	0	57
Não se Aplica		4	0,00	0,00			4				4
Sub-Total		4	0,00	0,00	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		61	31.414,25	3.077,44	0	0	61	0	0	0	61

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: **20WQ** -Plano Orçamentário 0000 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial **20WQ** - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **7K66** – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Emenda Parlamentar). **Não se aplica** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Siglário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 29/06/2018 (1º Ciclo de monitoramento-2018)

Tabela 6 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, e da Ata da 304ª Reunião Ordinária, da Diretoria Colegiada, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2018 (não inclui os novos projetos da CGDS)

Diretoria	Unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
DPLAN	CGDS ¹	53	28.800,37	2.777,44			53				53
	CGEP	3	564,12	0,00			3				3
	CGCP	3	2.049,76	300,00			3				3
Sub-Total		59	31.414,25	3.077,44	0	0	59	0	0	0	59
DFIN	CGDF	2	0,00	0,00			2				2
Sub-Total		2	0,00	0,00	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL		61	31.414,25	3.077,44	0	0	61	0	0	0	61

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

¹Não incluiu os novos projetos da CGDS, que os deixou de apresentar para o 2º ciclo 2018.

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 29/06/2018 (2º Ciclo de monitoramento-2018)

2. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{6 \times 100}{6} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica

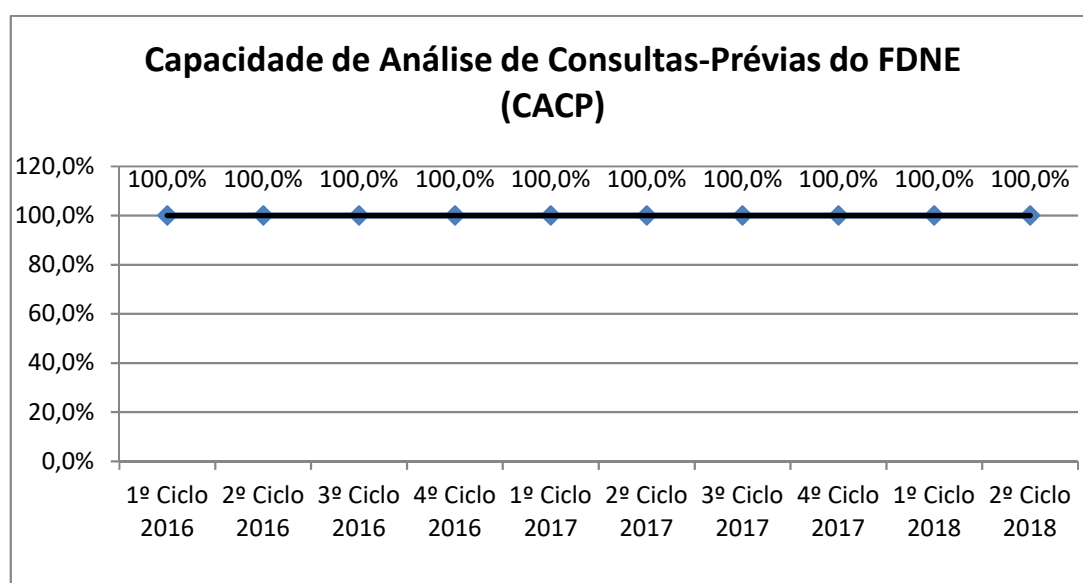

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{6}{4} = 1,5 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,5 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	3 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	3 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	7,13 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	6,56 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	10,67 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	16,50 análises/técnico	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

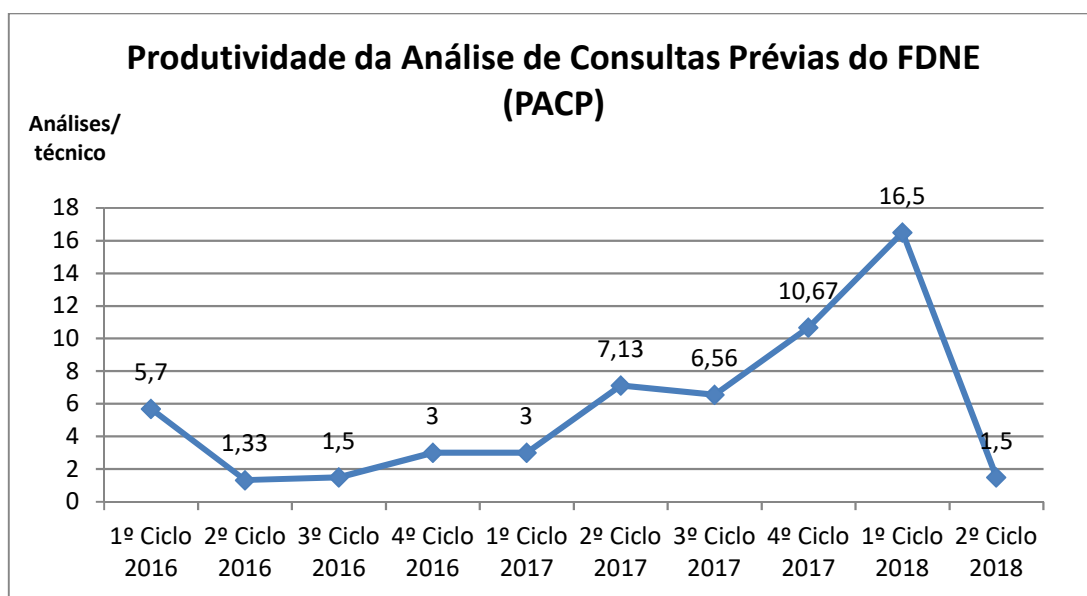

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévia Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévia Protocoladas}^1} = \frac{3 \times 100}{6} = 50\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévia protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	55,5%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	50%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	50%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	78,9%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	79,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	78,1%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	77,3%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

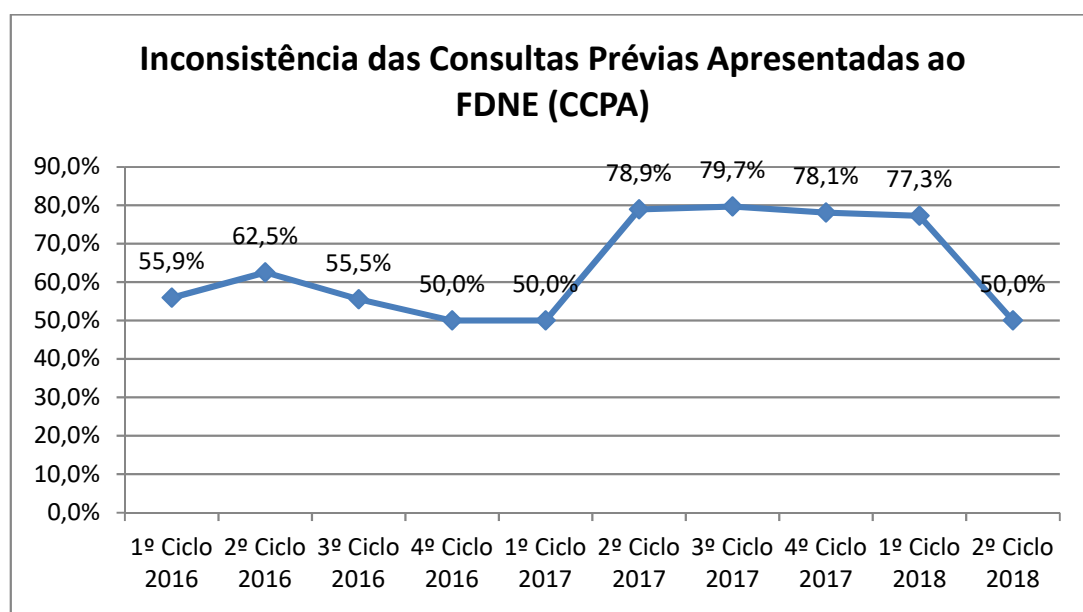

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

$$\text{a) Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB e ao BNB. A CEF não concluiu a análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0,00; BB 1,48; CEF 0,00	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 1,39; BB 1,46; CEF 0,00	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

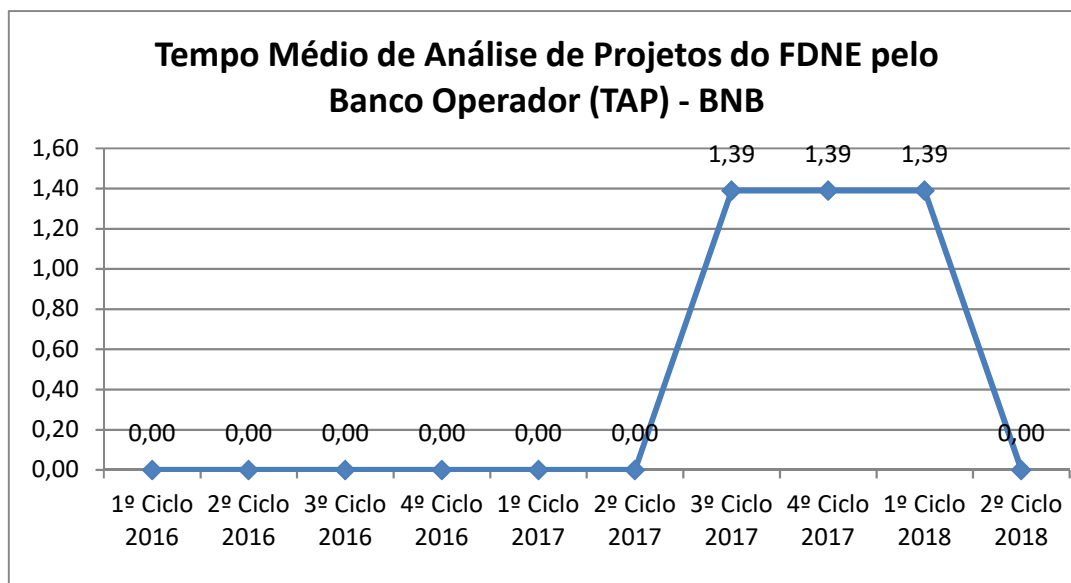


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

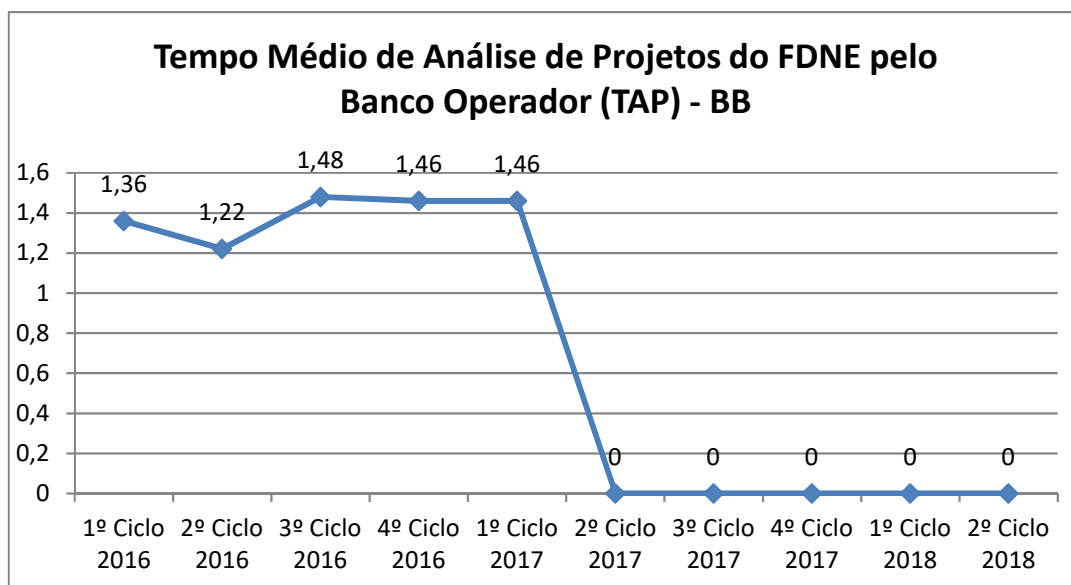

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

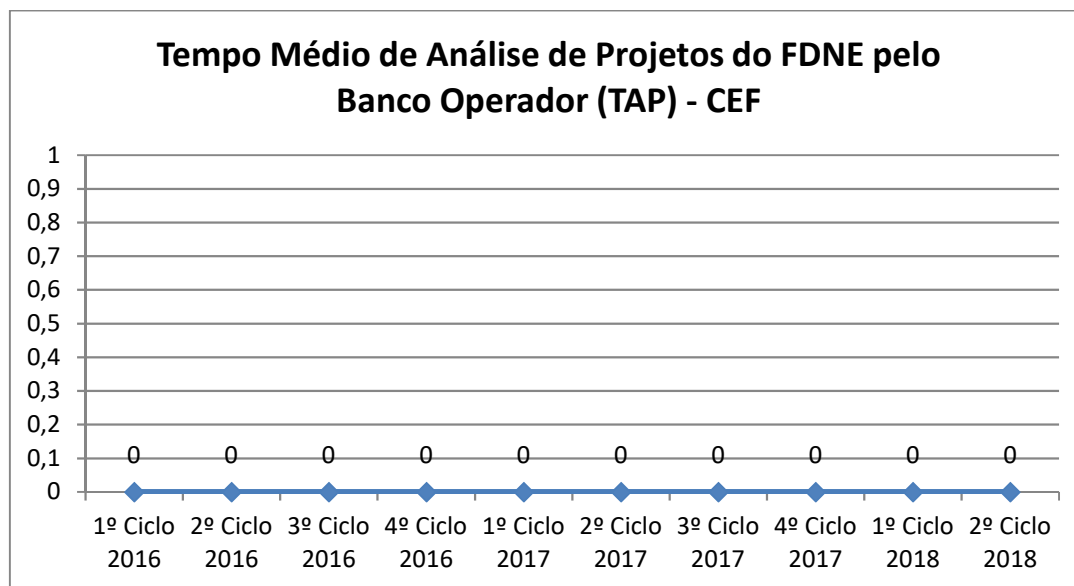

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{1} = 100\%$$

b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e BNB.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2018


h) Representação gráfica:

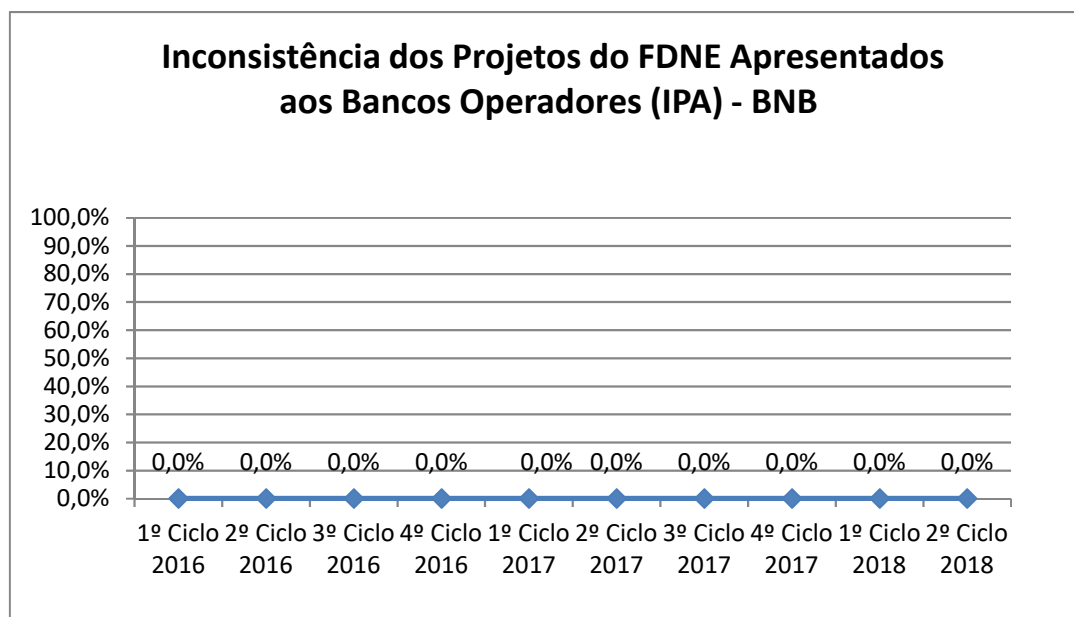

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA) - BB

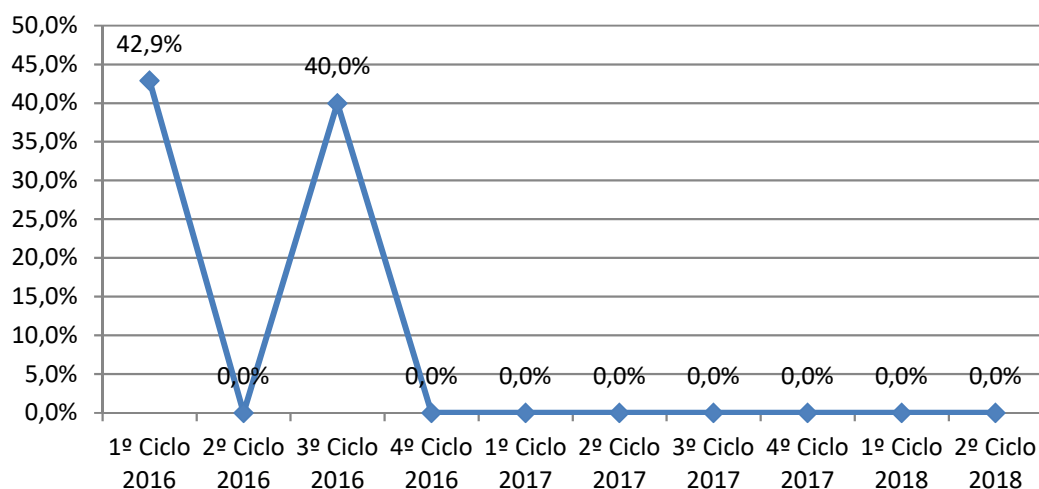

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA) - CEF

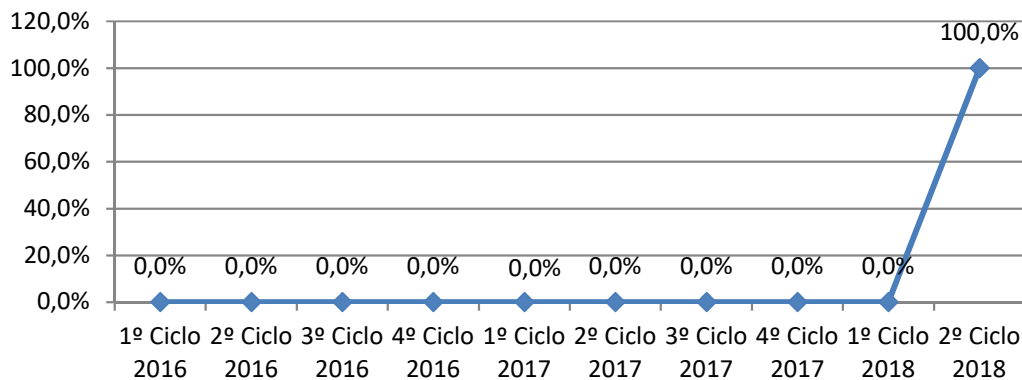

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado LOA 2017} \times 100}{\text{Dotação LOA 2017}} = \frac{0 \times 100}{438.172.704,00} = 0,00\%$$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,47%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,47%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,90%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

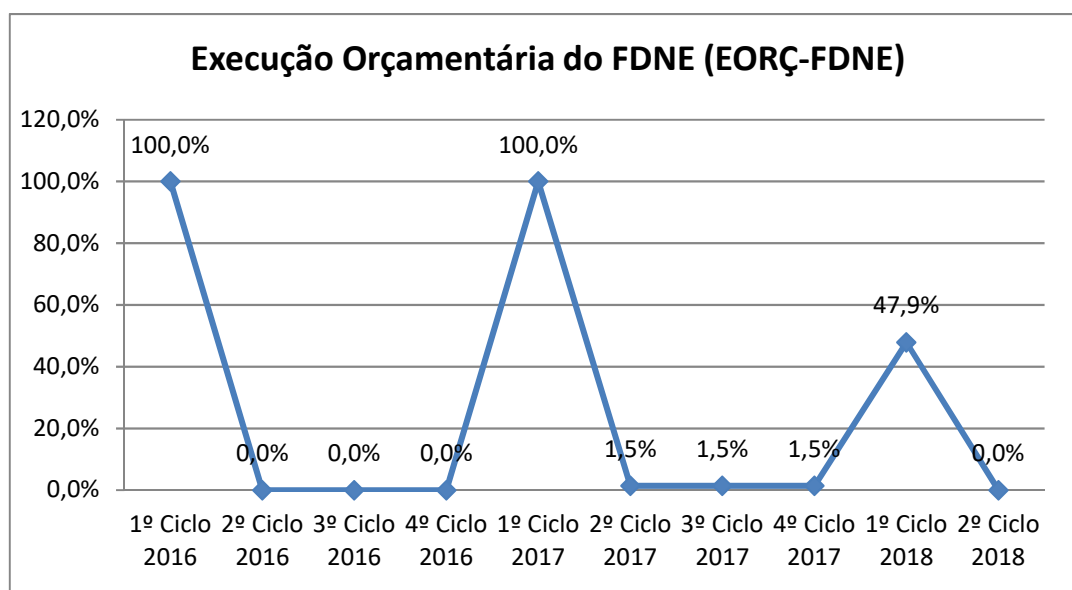

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{69.164.568,00 \times 100}{2.264.590.263,44} = 3,05\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Referência da aferição: Jan-mai/2018

f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	10,9%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	11,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	7,6%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	2,57%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	2,57%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	8,51%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	9,30%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

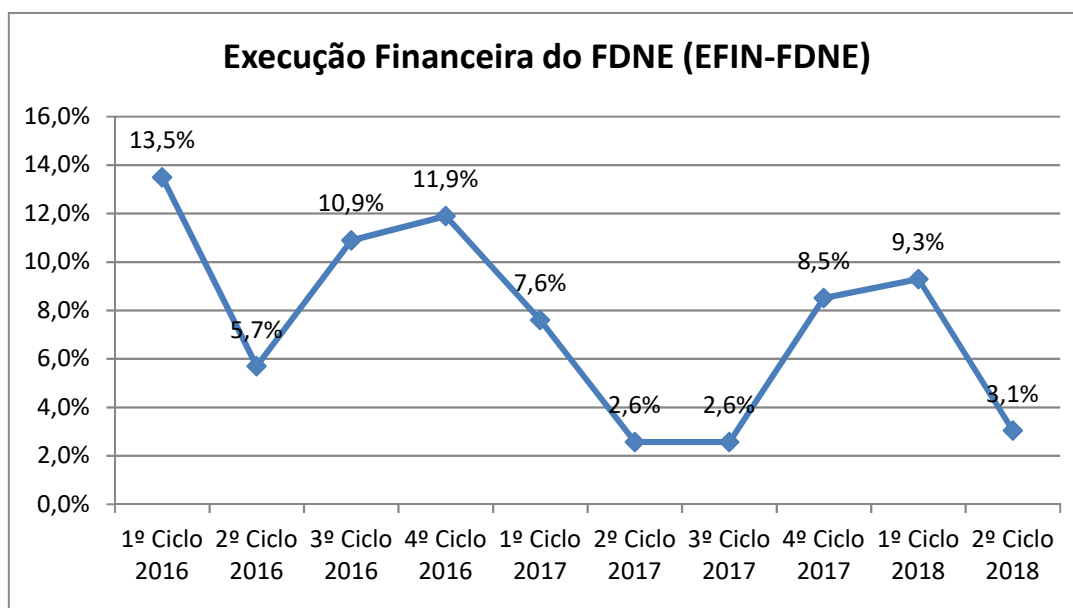

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0}{30} = 0$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não foram apresentados projetos no período observado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,9	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,9	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,78	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,00	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,5	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,5	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

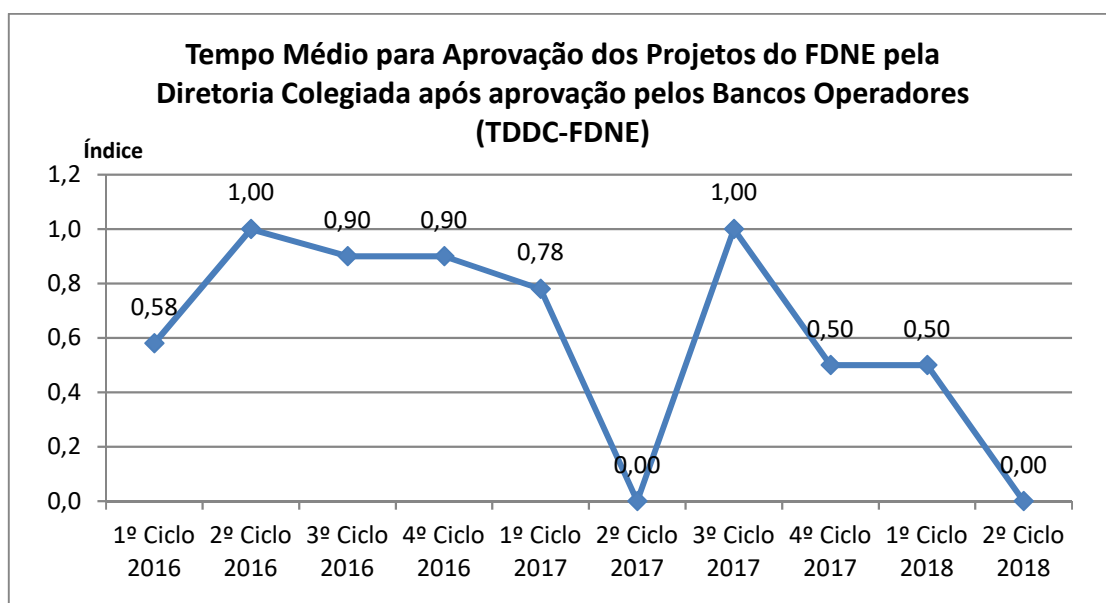

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:


¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{0 \text{ dias}}{0 \text{ financiamentos aprovados}} = 0 \text{ dias/financiamento aprovado}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período. O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	321,8 dias	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	315,2 dias	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	315,2 dias	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0 dias	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	252 dias	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	252 dias	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	252 dias	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

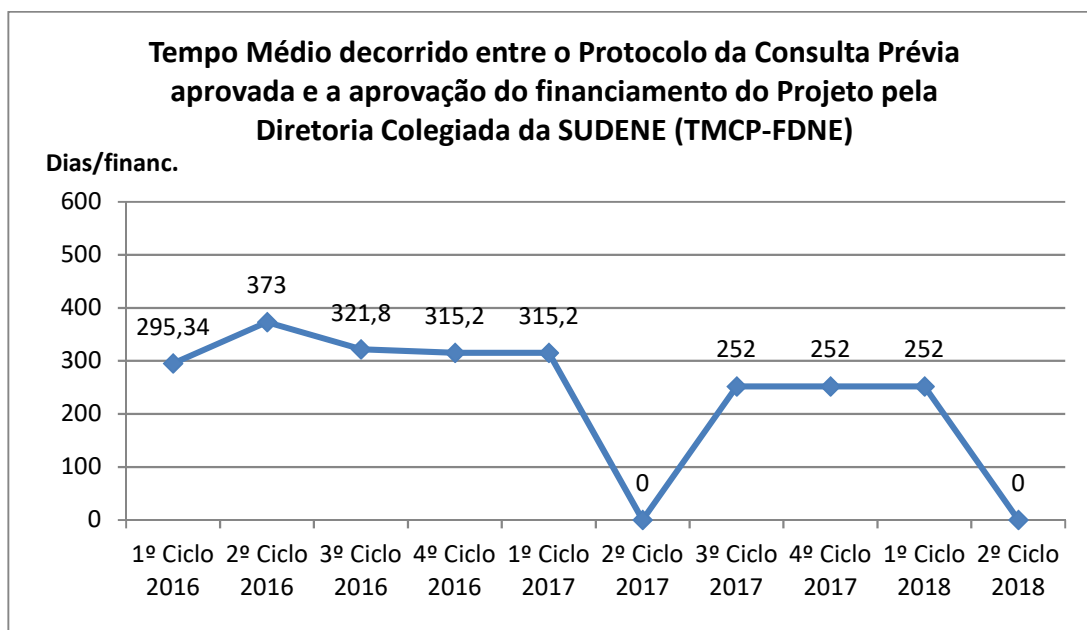

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não foram apresentados projetos à Diretoria Colegiada no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,0	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	1,0	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	1,0	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,0	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	1,0	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	1,0	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

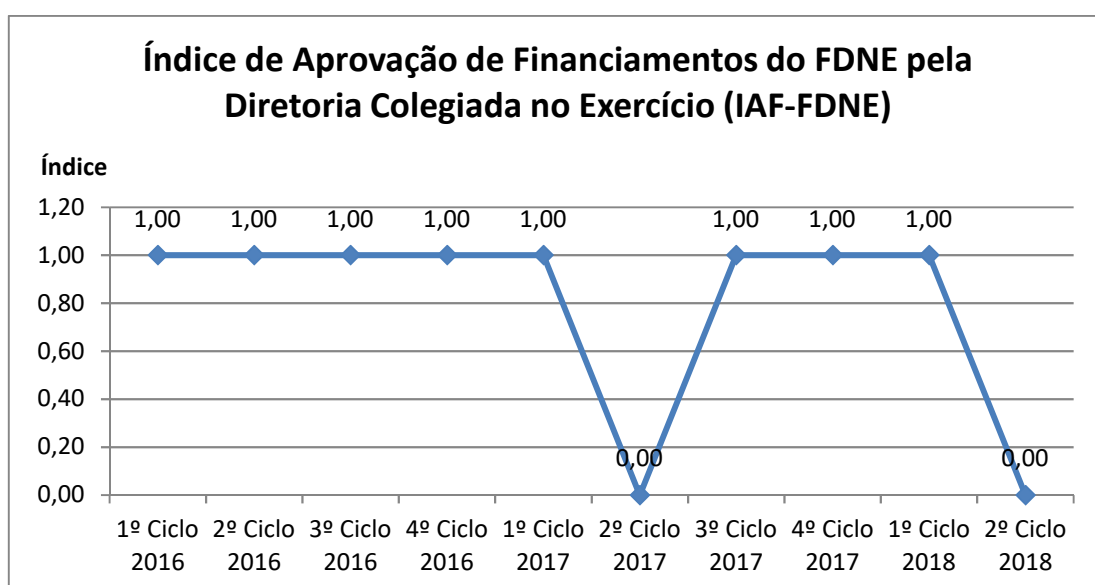

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

a) Fórmula:
$$T_1 = \frac{3.929 \text{ dias}}{42 \text{ processos}} = 93,5 \text{ dias/processo}$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.

- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2018 e encerrado em 31 de maio de 2018, foram **vistoriados 42 estabelecimentos dos 56 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 93,5 dias**, basicamente por conta de diversos pleitos ingressados após 31 de outubro de 2017, com destaque para os de interesse do grupo Casa dos Ventos (Ventos de Santo Estevão, Santo Onofre, São Virgílio, localizados em Simões, Piauí, e que somente foram vistoriados em abril de 2018).

Cabe registrar que esse prazo médio para a realização das vistorias, de mais de 93 dias, foi fortemente impactado pelas restrições à compra de passagens aéreas no início do ano, uma vez que a modalidade com utilização de cartão estava suspensa, sendo reativada a partir do mês de março, com a edição da Medida Provisória 822, que “restabelece a compra com dispensa de retenção de tributos federais na aquisição de passagens aéreas”. Das 42 vistorias realizadas, 16 relativas a pleitos ingressados em 2017 somente foram realizadas em abril de 2018.

Como existe prazo regulamentar para solicitação de passagens aéreas as vistorias somente puderam ter início em 02 de abril, indo até o dia 12 do mesmo mês, razão pela qual o tempo gasto foi tão impactado em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram gastos 59,4 dias para a realização do mesmo trabalho.

Convenções:


T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	92,30 dias/ processo	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/ processo	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	76,4 dias/ processo	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80,70 dias/processo	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	71,32 dias/processos	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,4 dias/processos	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	62,3 dias/processos	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	66,16 dias/processo	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	64,7 dias/processo	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

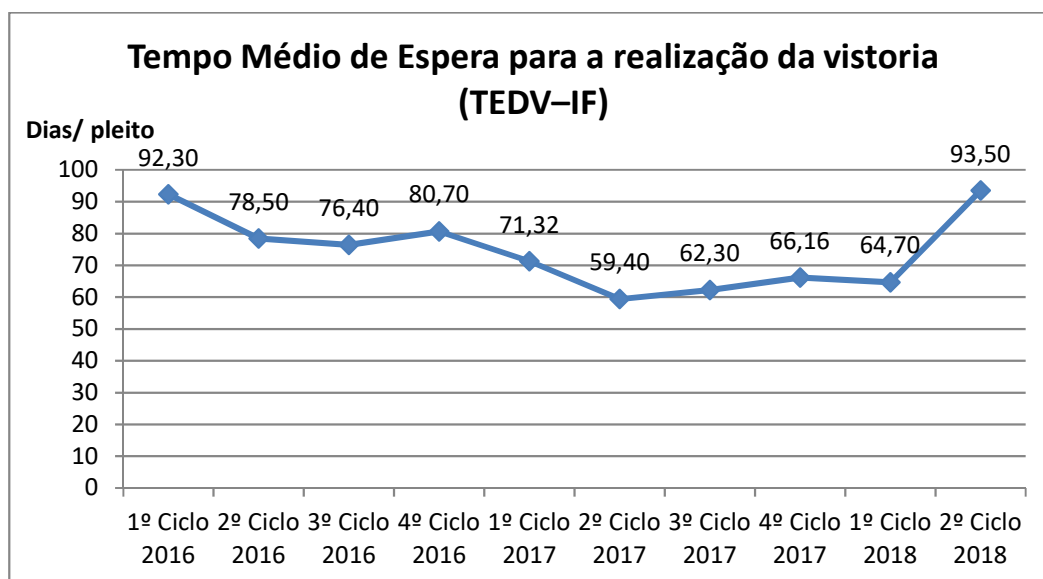

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{0 \times 100}{95} = 0\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,00%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

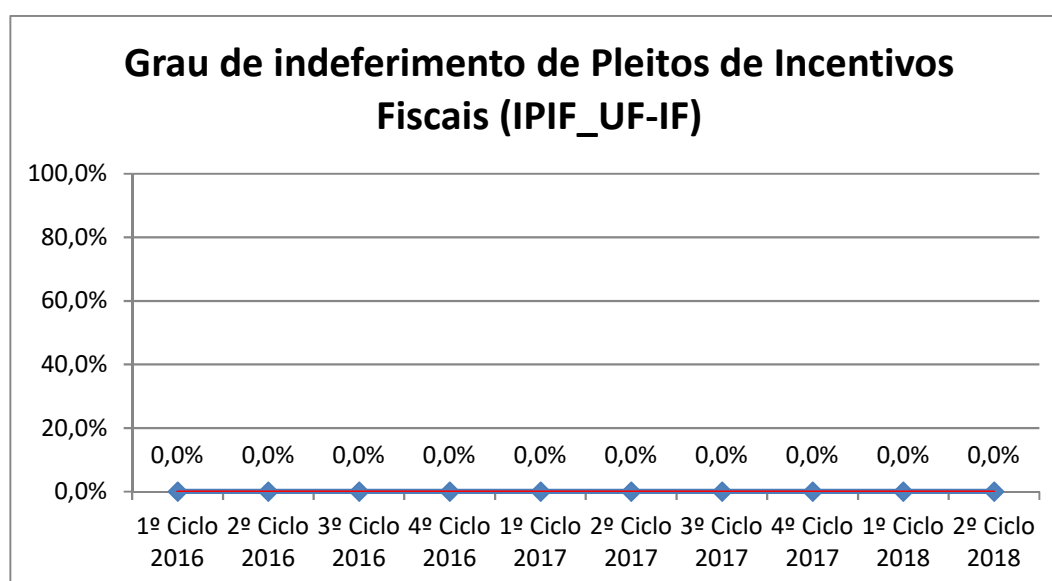

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)


a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{77 \times 100}{95} = 81,0\%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: no período foram concluídas 77 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 81,0% dos pleitos ingressados. Geralmente, nos primeiros meses do ano, por conta das férias regulamentares são realizadas menos vistorias que nos demais meses o que se reflete no desempenho observado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	71,2%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	91%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,5%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	84,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	93,9 %	1º ciclo 2018

- a) Representação gráfica:

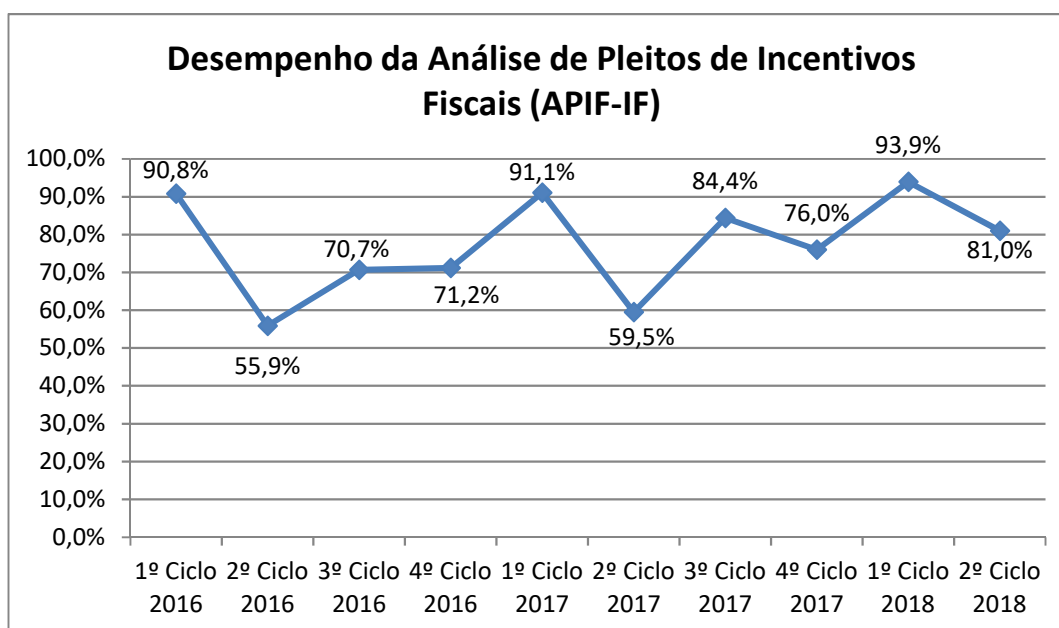

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:
$$T1 = \frac{6.783 \text{ dias}}{63 \text{ pleitos}} = 107,7 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: Com relação ao cálculo do Tempo Médio de Espera, oportuno destacar o grande número de pleitos relativos a Transferências de Laudos que se observou nesses cinco meses objeto do monitoramento. Ao contrário do que ocorre com os demais processos de incentivos fiscais, quando os procedimentos estabelecidos no Manual de Instruções implicam na devolução daqueles encaminhados com inconformidade na documentação exigida e não regularizadas as pendências no prazo improrrogável de 30 dias, no exame de pedidos de Transferência de Laudos, seja por mudança de controle societário, seja por qualquer outro motivo, não há prazo para atendimento de inconformidades detectadas. O pleito somente será encaminhado para deliberação da Diretoria Colegiada quando atendidos todos os requisitos.

Assim, pode ocorrer, como de fato tem acontecido, que determinados processos permaneçam pendentes de solução por prazo considerável. No período em exame, por exemplo, tivemos dois pleitos somente tiveram seus processos concluídos passados mais de 500 dias, sem que isso signifique deficiência dos técnicos responsáveis pela conclusão dos exames, uma vez que a empresa solicitante deixou de cumprir uma série de exigências, comprometendo o prazo de análise.

Diante disso passamos a desconsiderar, a partir do monitoramento de janeiro a maio de 2017, os pleitos de Transferência de Laudos no cômputo do Tempo Médio de Espera para conclusão dos exames de incentivos fiscais, mesmo porque referidos processos não fazem parte do cálculo de dias decorridos entre a formalização e a vistoria, uma vez que os mesmos não são vistoriados.

O prazo médio observado, de 107,7 **dias** é função do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros cinco meses de 2018 (63 pleitos). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 127,1 dias, **fortemente impactado pelo problema das passagens**, sendo de 68,8 dias o prazo para conclusão dos processos de Reinvestimento de 30% do IRPJ.

Convenção:


T1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	93,3 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	118,5 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	107,7 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	110,8 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	115,1 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	121,6 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

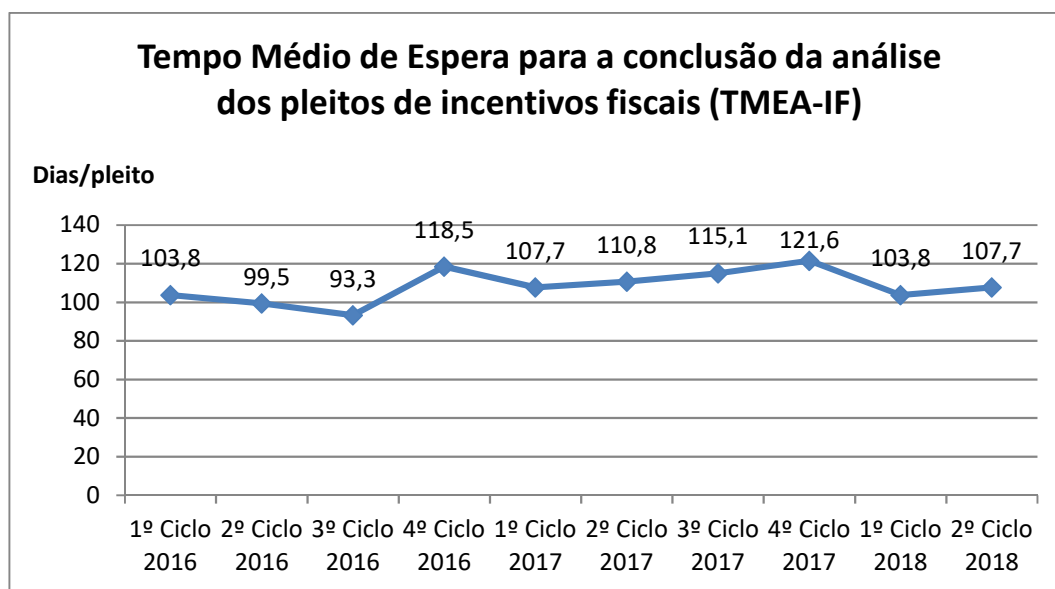

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{77}{15} = 5,1 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: o número observado, de 5,1 análises por técnico, é compatível com o número de técnicos que atualmente compõe a equipe, tendo em vista o ingresso de novos servidores decorrente do último concurso.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	16,5 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	6,3 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	10,8 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	15,5 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	7,8 análises/técnico	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	11,7 análises/técnico	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	17,4 análises/técnico	1 ciclo 2018

h) Representação gráfica:

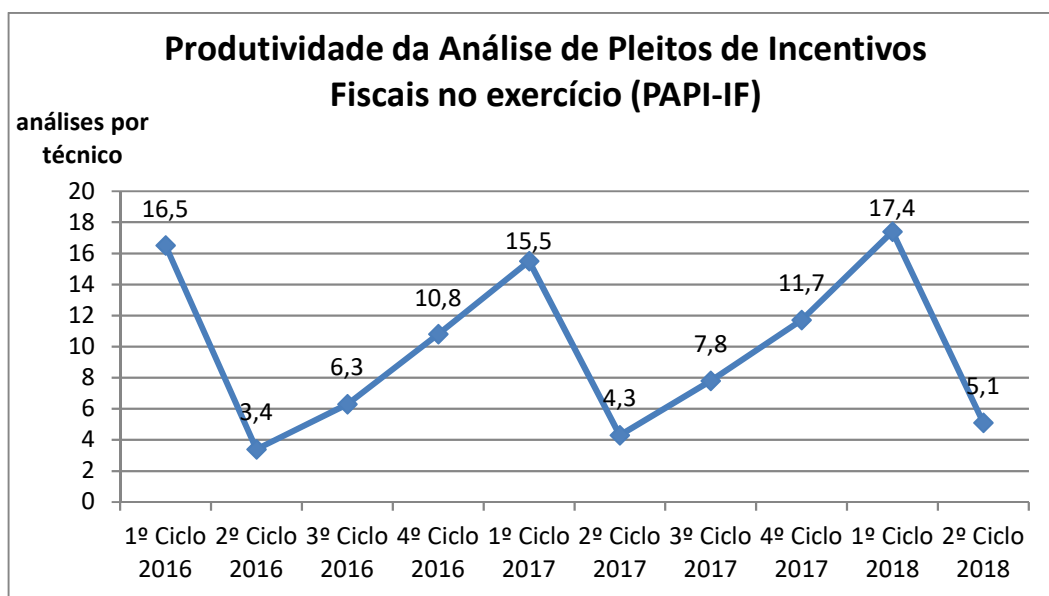

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$


$$= \frac{42}{7} = 5,6 \text{ vistorias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 42 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	20,1 vistorias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vistorias/equipe	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	9,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	15,4 vistorias/equipe	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	24,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 vistorias/equipe	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	9,7 vistorias/equipe	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	16,7 vistorias/equipe	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	25,5 vistorias/equipe	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

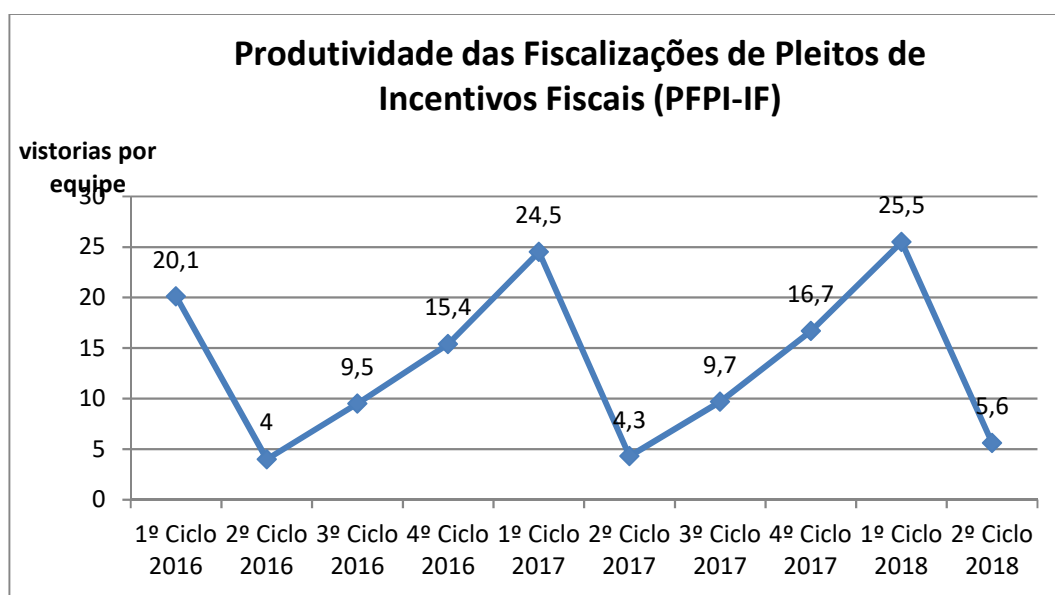

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.


4. Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \text{Não informado}$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período de aferição: Jan-mai/2018.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	91,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	58,2%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	65,3%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	72,6%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	86,8%	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

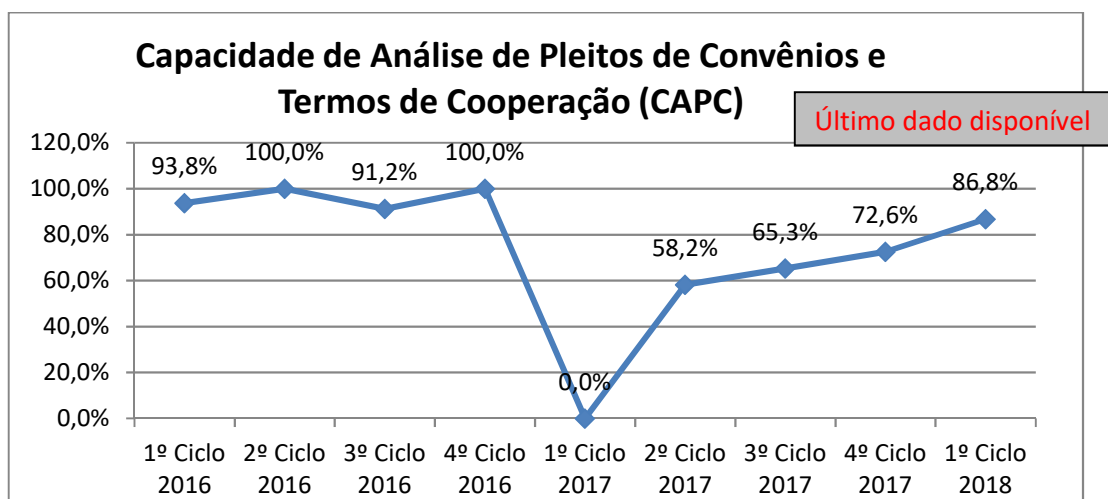

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}}$ = **Não informado**

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-mai/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	67,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	27,66%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	57,4%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	64,2%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	60,6%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

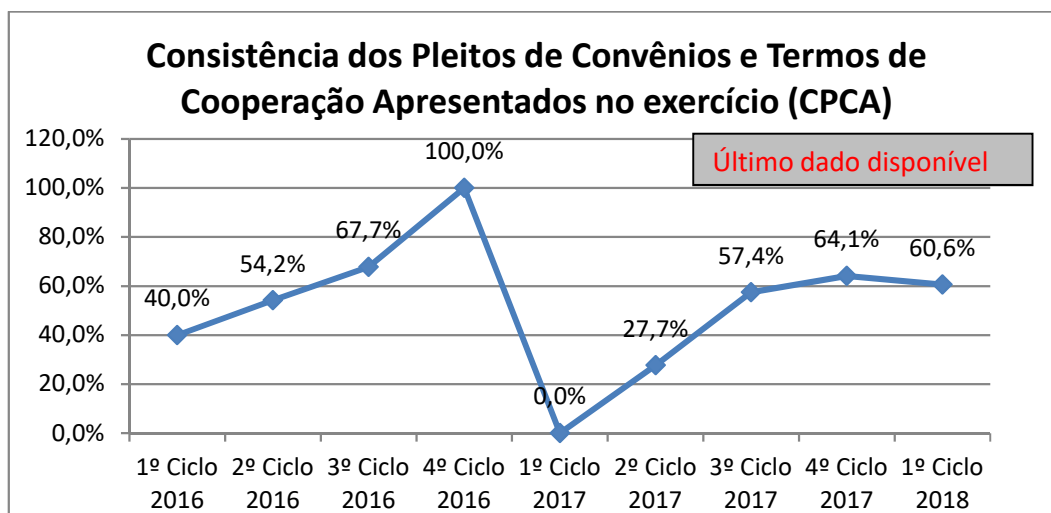

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$

= Não informado

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-mai/2018

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	20,6%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	32,72%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	23,6%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	23,3%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	32,9%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

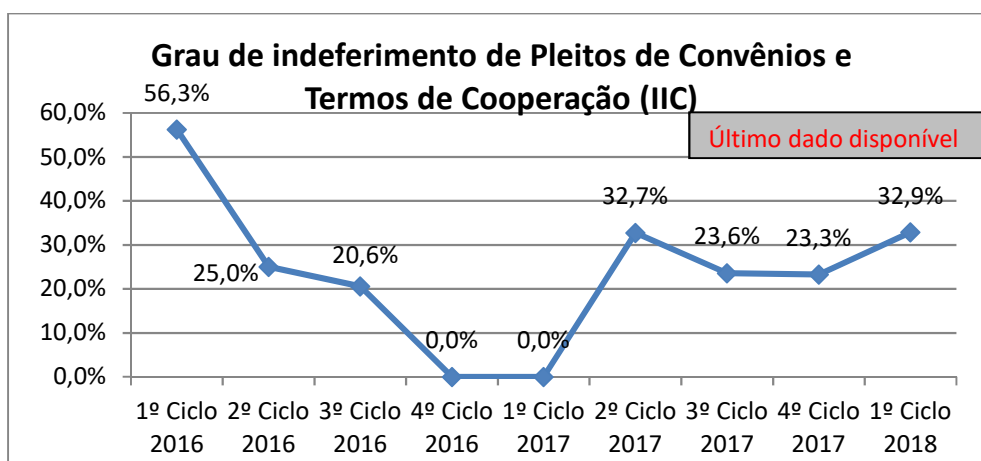

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \text{Não informado}$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-mai/2018

f) Comentários: **Não informado**

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0,00%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

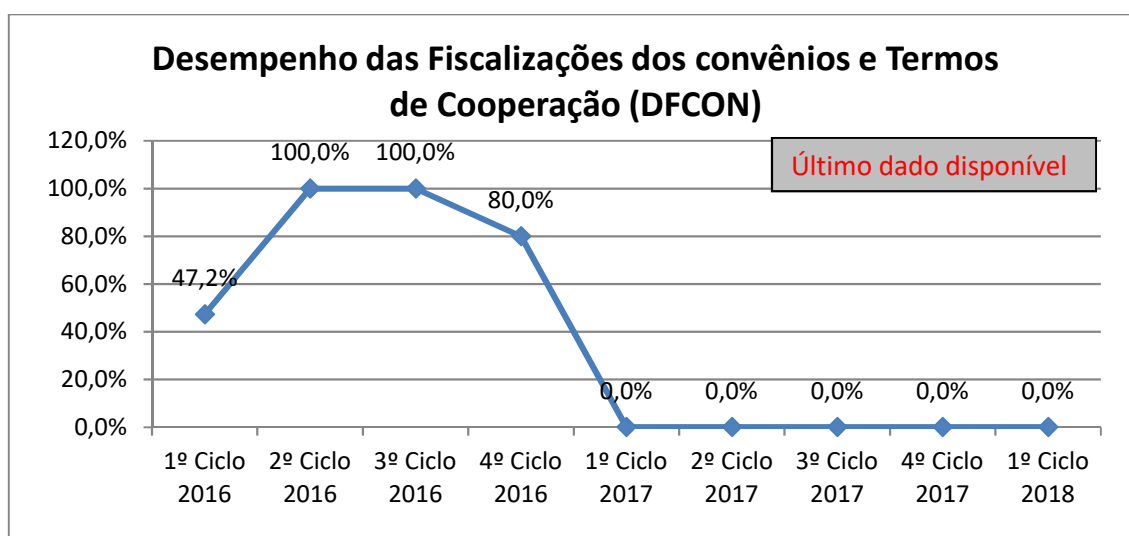

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 -

Esse tópico não foi atualizado pela CGDS/DPLAN.

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{79}{57} = 1,4 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: entre janeiro e maio/2018, a SUDENE recebeu 57 propostas de convênios. O quadro a seguir ilustra os quantitativos de propostas, agrupadas por status e por UF.

Propostas 2018 na SUDENE - Posição em 31-05-2018	UF					
Status	BA	PB	PE	PI	RN	Total Geral
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados	21	1			16	38
Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados	2					2
Proposta/Plano de Trabalho Cancelados	1					1
Proposta/Plano de Trabalho complementado em Análise	6					6
Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise	2					2
Proposta/Plano de Trabalho em Complementação	5					5
Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise			1	1		2
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico					1	1
Total Geral	37	1	1	1	17	57


Fonte: SICONV

Até o momento, houve apenas a conversão das propostas aprovadas em pré-convênios.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	22,8 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	258 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	228 dias/pleito	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

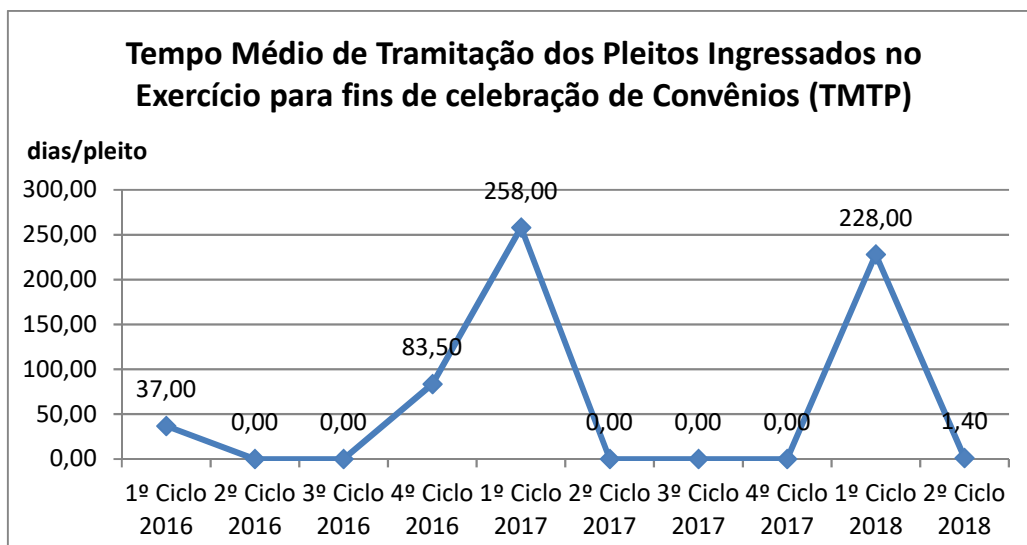

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{150}{2} = 75 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-mai/2018


e) Comentários: Entre Janeiro e maio/2018 foram celebrados 2 TED: 1 com a CENTRESAF/PE (SIAFI n.º 693587) e 1 com a CENTRESAF/BA (SIAFI n.º 693747),

mas não nos foi possível aferir os tempos de tramitação, pois eles não tramitaram pela CCONT. Fonte: SIAFI, transação CONNC.

f) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	0 dias/pleito	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	0 dias/pleito	1º ciclo 2018

g) Representação gráfica:

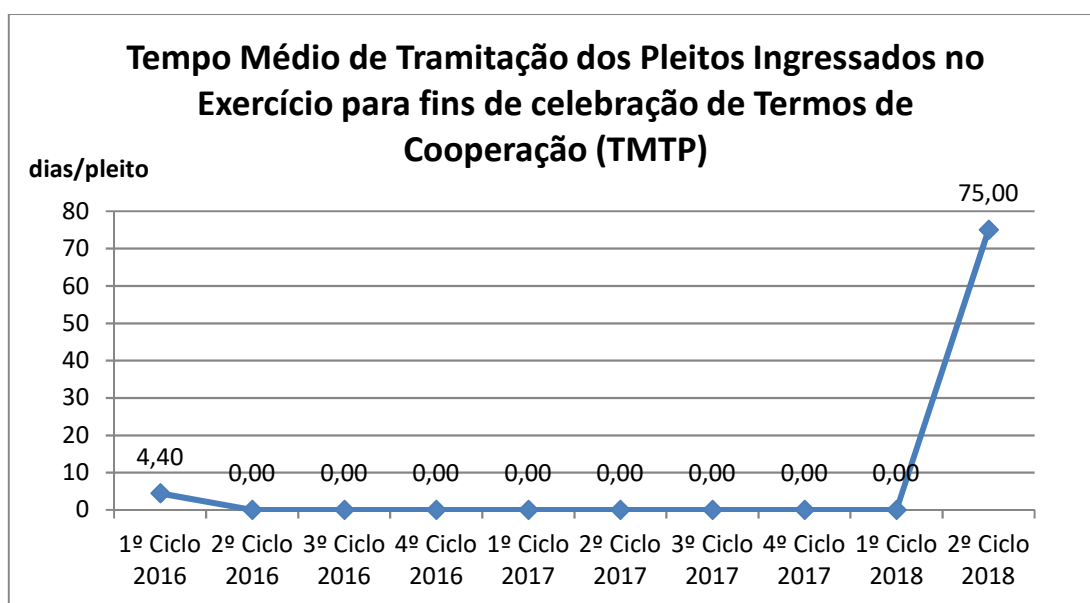

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_{a\_Aprovar_{FINAL}}}{\text{Convênios}_{a\_Aprovar_{INICIAL}}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%)_{SICNV} = 100 \times \frac{22}{22} = 100\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: A posição dos convênios na condição “**A Aprovar**” no SIAFI em Mai/2018 é:

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENIENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1993	069547	SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	6.044.165,46		Em cobrança administrativa
1996	312117	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS	5.700.000,00		Em conciliação na CJU/PE
1996	317428	FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	65.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1997	337849	INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL – CENTRO	250.000,00		Em conciliação na CJU/RN
1997	338364	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE
1997	338456	ASSOCIACAO CEARENSE DE ESTUDOS E PE	90.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1997	338464	ESTADO DA PARAIBA	219.800,00		Aguardando instrução de TCE
1998	339202	ESTADO DE PERNAMBUCO	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	348985	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE
1998	363977	ESTADO DE MINAS GERAIS	884.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368374	MUNICIPIO DE ASSARE	1.521,02		Aguardando instrução de TCE

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENIENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1998	368485	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	52.066,80	I.SU 306	Aguardando instrução de TCE
1998	368496	CNPq	124.802,00		Conciliação no MI
1998	368525	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPE	139.000,00		Está na DPLAN/CGDS para emissão de Laudo Técnico
1998	368547	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPE	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368692	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA	24.000,00		Autorizada a recomposição do processo
1999	374633	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA	20.000,00		Em cobrança administrativa
2000	399481	ASSEMP-ASSOC DAS EMPRESAS DE PLANEJAMENTO E CONSULTORA	30.000,00		Prestação de contas aguardando análise
2000	402702	FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO CTI-NE	132.500,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406376	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSÃO DA UFPE	46.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406570	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	952.000,00		TCE em instrução
2000	407086	INSTITUTO ANTHROPOS	156.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE

Fonte: SIAFI 2018 e NETDOC

Totalizando a posição dos convênios supra por posição resumida, temos:


Posição Resumida	Quant Convênios	Soma Valor. Concedente (R\$)
Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE	8	1.673.500,00
Aguardando instrução de TCE	5	573.387,82
Conciliação no MI	1	124.802,00
Autorizada a recomposição do processo	1	24.000,00
Em cobrança administrativa	2	6.064.165,46
Em conciliação na CJU/PE	1	5.700.000,00
Em conciliação na CJU/RN	1	250.000,00
Está na DPLAN/CGDS para emissão de Laudo Técnico	1	139.000,00
Prestação de contas aguardando análise	1	30.000,00
TCE em instrução	1	952.000,00
Total Geral	22	15.530.855,28

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	76,7%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	76,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	76,67%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

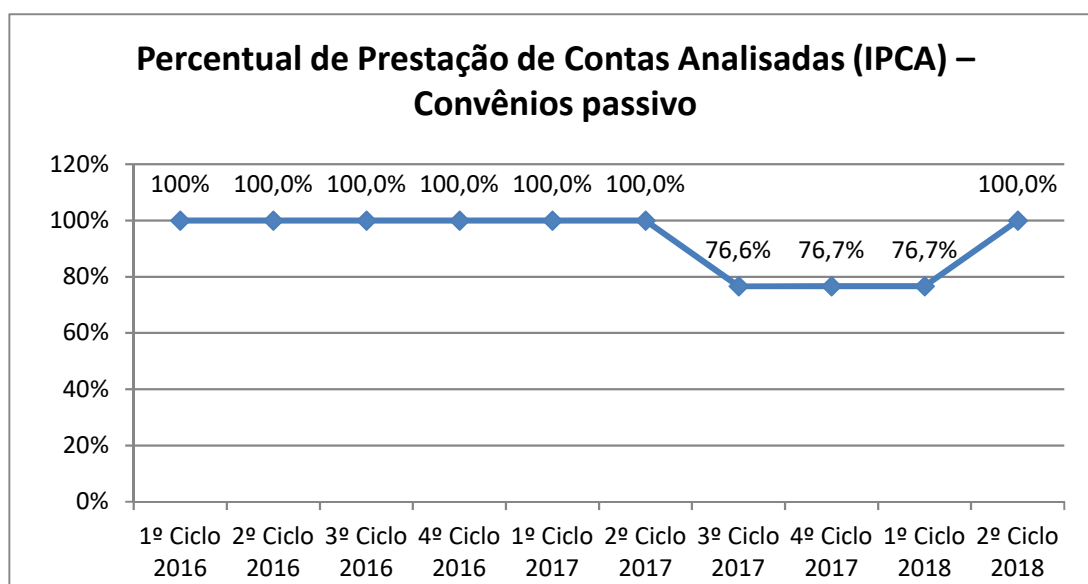

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial, e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo: $IPCA (\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{57}{26} = 219\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-mai/2018

f) Comentários: De um total de 73 convênios em 01/01/2018, 19 continuam em plena execução, entraram mais 38 novos convênios (total de 57 convênios em execução) e 16 estão em fase de prestação de contas em 31/05/2017, conforme posições a seguir indicadas:

Posição dos Convênios SICONV em
01/01/2018

Status do Convênio	Quantidade
Aguardando Prestação de Contas	4
Conv Novo	38
Em Execução	19
Em Prestação de Contas	12
Total Geral	73

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Os 57 convênios “a Aprovar” estão em letra azul.

Posição dos Convênios SICONV em
31/05/2018

Status do Convênio	Quantidade
Aguardando Prestação de Contas	2
Em Execução	55
Em Prestação de Contas	16
Total Geral	73

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial

Nota: Os 57 convênios “a Aprovar” estão em letra azul.

A tabela abaixo detalha a posição de cada um dos 73 convênios:

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2018	Status em 31/05/2018
707430/2009	RIACHUELO PREFEITURA	RN	Aguardando PTC	Aguardando PTC
710365/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA	RN	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
718521/2009	ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	PB	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
737121/2010	GRUPO GESTAO - PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO SOCIAL	PE	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas

Continua

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2018	Status em 31/05/2018
769782/2012	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
744654/2010	MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	RN	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
770741/2012	ESTADO DA PARAIBA	PB	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
770859/2012	SEMAS	PE	Em Execução	Em Execução
770860/2012	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
789013/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	CE	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
789015/2013	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	RN	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
792551/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Aguardando PTC	Em Prestação de Contas
794329/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	Aguardando PTC
794997/2013	IDENE	MG	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
802144/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	RN	Em Execução	Em Execução
802415/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	Em Execução	Em Execução
812155/2014	Sec. Des. Agrário	CE	Aguardando PTC	Em Prestação de Contas
813665/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	Aguardando PTC	Em Prestação de Contas
813695/2014	SERHMACT	PB	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
813986/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	Em Execução	Em Execução
827249/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Prestação de Contas

Continua

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2018	Status em 31/05/2018
827250/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Execução
827251/2016	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	RN	Em Prestação de Contas	Em Prestação de Contas
827676/2016	TANGARA	RN	Em Execução	Em Execução
828295/2016	LAGOA D'ANTA	RN	Em Execução	Em Execução
828296/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
828297/2016	JUCURUTU	RN	Em Execução	Em Execução
828298/2016	TIBAU DO SUL	RN	Em Execução	Em Execução
828299/2016	PARELHAS	RN	Em Execução	Em Execução
828300/2016	CAMPO REDONDO	RN	Em Execução	Em Execução
828301/2016	NATAL	RN	Em Execução	Em Execução
836181/2016	LUCRÉCIA	RN	Em Execução	Em Execução
836220/2016	PARAZINHO	RN	Em Execução	Em Execução
838038/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
839953/2016	UPANEMA	RN	Em Execução	Em Execução
847035/2017	APUAREMA	BA	Conv Novo	Em Execução
847036/2017	IAÇU	BA	Conv Novo	Em Execução
847037/2017	BOM JESUS DA SERRA	BA	Conv Novo	Em Execução
847038/2017	MARACÁS	BA	Conv Novo	Em Execução
847039/2017	TREMEDAL	BA	Conv Novo	Em Execução
847040/2017	WANDERLEY	BA	Conv Novo	Em Execução
847041/2017	BRUMADO	BA	Conv Novo	Em Execução
847042/2017	SITIO DO MATO	BA	Conv Novo	Em Execução
847045/2017	CAMPO ALEGRE DE LOURDES	BA	Conv Novo	Em Execução
847990/2017	JANDAÍRA	RN	Conv Novo	Em Execução
847991/2017	JANDAÍRA	RN	Conv Novo	Em Execução

Continua

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2018	Status em 31/05/2018
850088/2017	JOÃO CÂMARA	RN	Conv Novo	Em Execução
850212/2017	JABORANDI	BA	Conv Novo	Em Execução
850213/2017	Oliveira dos Brejinhos	BA	Conv Novo	Em Execução
850215/2017	GENTIO DO OURO	BA	Conv Novo	Em Execução
850586/2017	FRANCISCO DANTAS	RN	Conv Novo	Em Execução
850628/2017	PASSA E FICA	RN	Conv Novo	Em Execução
850666/2017	EXTREMOZ	RN	Conv Novo	Em Execução
850667/2017	BOM JESUS	RN	Conv Novo	Em Execução
850668/2017	BOA VISTA DO TUPIM	BA	Conv Novo	Em Execução
850669/2017	ASSU	RN	Conv Novo	Em Execução
850670/2017	SAO MIGUEL	RN	Conv Novo	Em Execução
850889/2017	GENTIO DO OURO	BA	Conv Novo	Em Execução
851669/2017	Mutuípe	BA	Conv Novo	Em Execução
852855/2017	Matina	BA	Conv Novo	Em Execução
852856/2017	Jaborandi	BA	Conv Novo	Em Execução
852858/2017	Mansidão	BA	Conv Novo	Em Execução
852859/2017	Campo Alegre de Lourdes	BA	Conv Novo	Em Execução
852902/2017	Tremedal	BA	Conv Novo	Em Execução
853282/2017	Icapuí	CE	Conv Novo	Em Execução
853688/2017	Doutor Severiano	RN	Conv Novo	Em Execução
853926/2017	Caraúbas	RN	Conv Novo	Em Execução
853949/2017	Várzea Nova	BA	Conv Novo	Em Execução
854312/2017	Araripe	CE	Conv Novo	Em Execução
858618/2017	Canguaretama	RN	Conv Novo	Em Execução
858619/2017	Coronel João Pessoa	RN	Conv Novo	Em Execução

Continua


SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2018	Status em 31/05/2018
862689/2017	Gentio do Ouro	BA	Conv Novo	Em Execução
862698/2017	Coronel João Sá	BA	Conv Novo	Em Execução

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	65%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	65%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	100%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

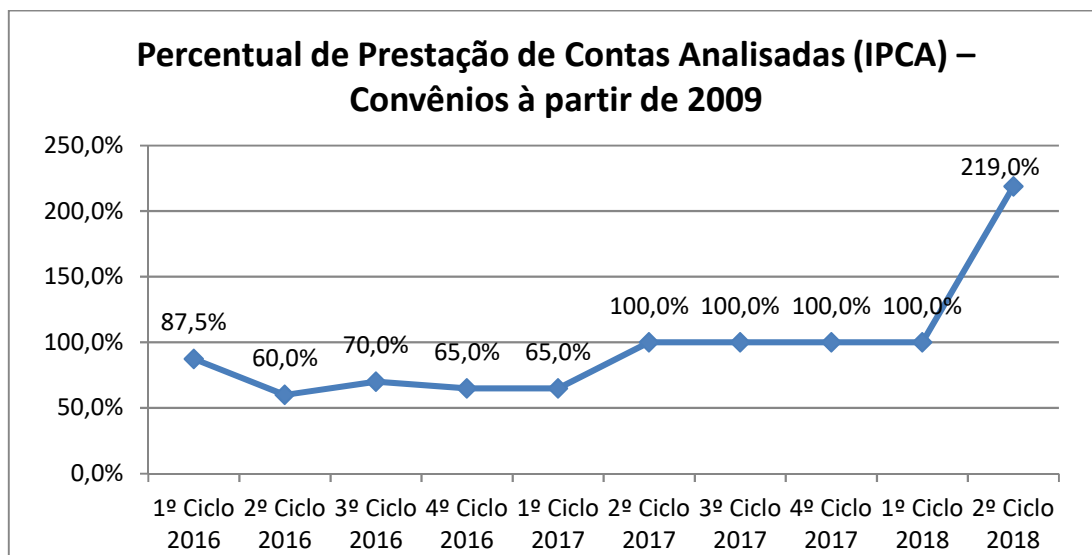

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


5. Indicadores de Gestão de Pessoas

5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{160 \times 100}{170} = 94,12\%$
- b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-Maio/2018
- f) Comentários: Para o exercício de 2018 (Janeiro-Dezembro), a meta é capacitar 160 (cento e oitenta) servidores. Até o mês de Maio/2018 foi alcançado 94,12% da meta estabelecida, capacitando 160 servidores. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 264 (duzentos e sessenta e quatro) inscrições efetivamente realizadas.
- g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	72%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	72,5%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	35%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	38%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	63%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	63%	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

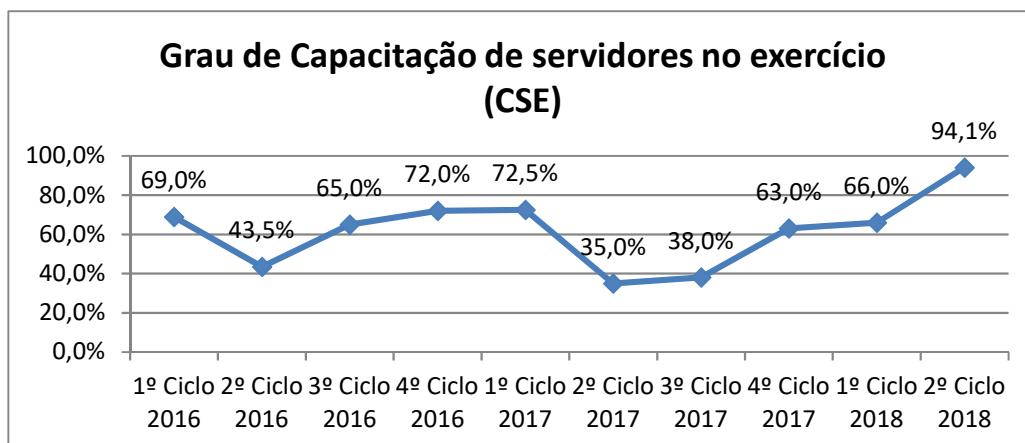

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{24 \times 100}{50} = 48\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: Jan-dez/2017
- f) Comentários: Foram realizados 24 (vinte e quatro) eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	84%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	134%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	162%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	12%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	40%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	102%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	124%	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

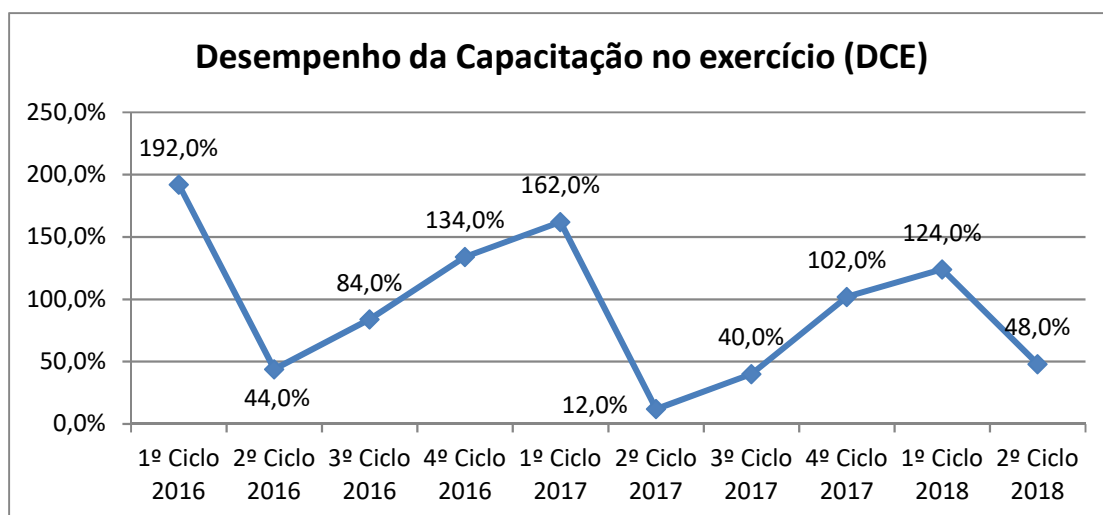

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{21.851,53 \times 100}{400.000,00} = 5,46\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-mai/2018
- f) Comentários: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais) e R\$7.001,53 com diárias e passagens, representando 5,46%.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	18,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	32,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	32,9%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,31%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	12,2%	3º ciclo 2017
Jan a nov/2017	37,7%	4º ciclo 2017
Jan a dez/2017	47,4%	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

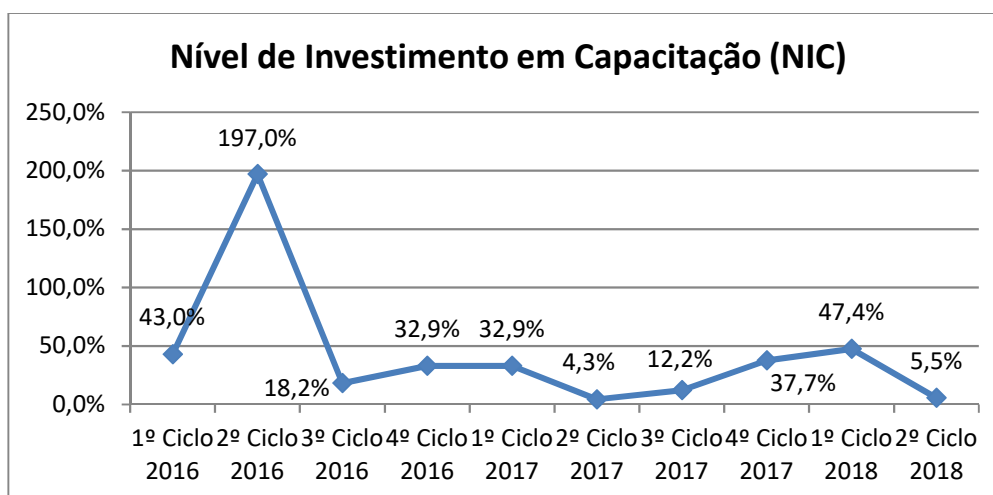

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

- a) Fórmula: Média de acessos = 27.691 acessos
(Google Analytics)
- b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. Ao analisar os números obtidos pelo site da Sudene em 2017, obteve-se uma média de 18.441 acessos por mês.


Como não há investimentos em publicidade na internet e, considerando fatores como tamanho da equipe, multidisciplinaridade de tarefas e infraestrutura tecnológica, a Ascom buscará, em 2018, um crescimento de 3% no acesso dos cidadãos ao site, tendo em vista que a reestruturação de conteúdo das páginas ainda está acontecendo.

- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018
- f) Comentários: como o período de análise é menor do que o ciclo anterior, a tendência natural é haver registros menores. No entanto, quando comparado aos ciclos anteriores, verifica-se que o valor alcançado no 2º ciclo de 2018 é o maior deste a aferição deste indicador.
- g) Resultados Anteriores (AU - site):

01/11/2016 a 01/02/2017	18.221	-
02/02/2017 a 02/05/2017	12.747	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	20.525	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	22.053	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	57.434	1º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 04/06/2018.

h) Representação gráfica:

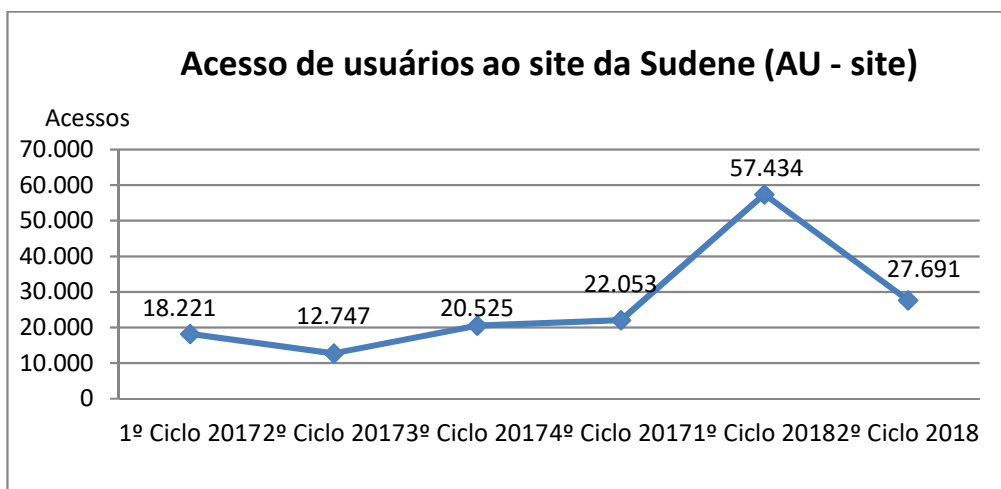

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)


- a) Fórmula: Tempo de permanência = 3'07''
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018
- f) Comentários: como o período de análise é menor do que o ciclo anterior, a tendência natural é haver registros menores. No entanto, quando comparado aos ciclos anteriores, verifica-se que o valor alcançado no 2º ciclo de 2018 está dentro da normalidade.

g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	2'40''	-
02/02/2017 a 02/05/2017	3'28''	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	2'56''	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2'55''	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	3'03''	1º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 04/06/2018.

h) Representação gráfica:

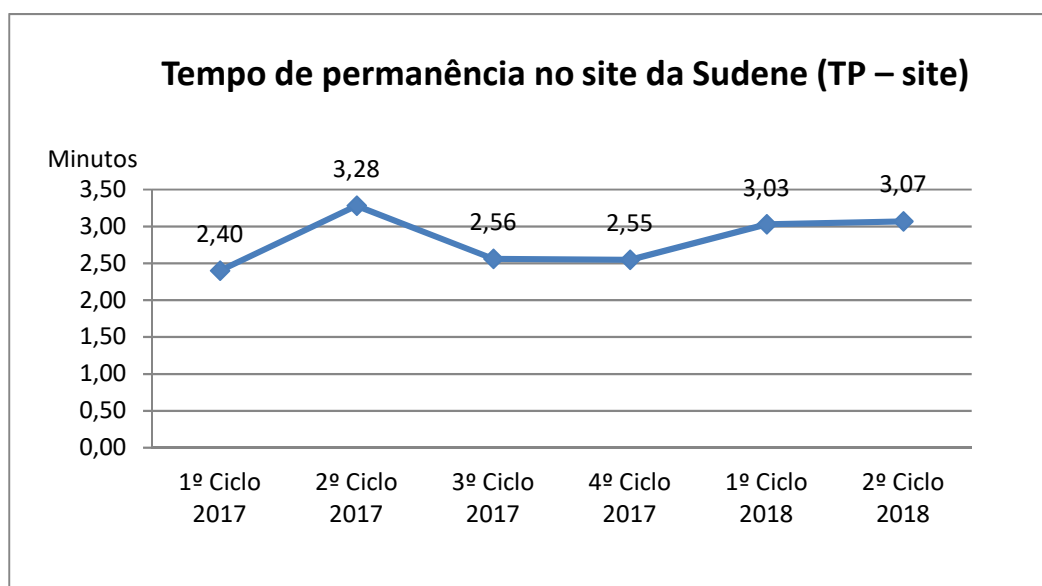

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- Fórmula: Taxa de Rejeição = 53,68%
(Google Analytics)
- Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.

De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para

registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.


f) Comentários: índices dentro da normalidade.

g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	56,09%	-
02/02/2017 a 02/05/2017	48,65%	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	53,68%	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	54,53%	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	52,69%	1º ciclo 2018

Fonte: Google Analytics. Acesso em 21/02/2018.

h) Representação gráfica:

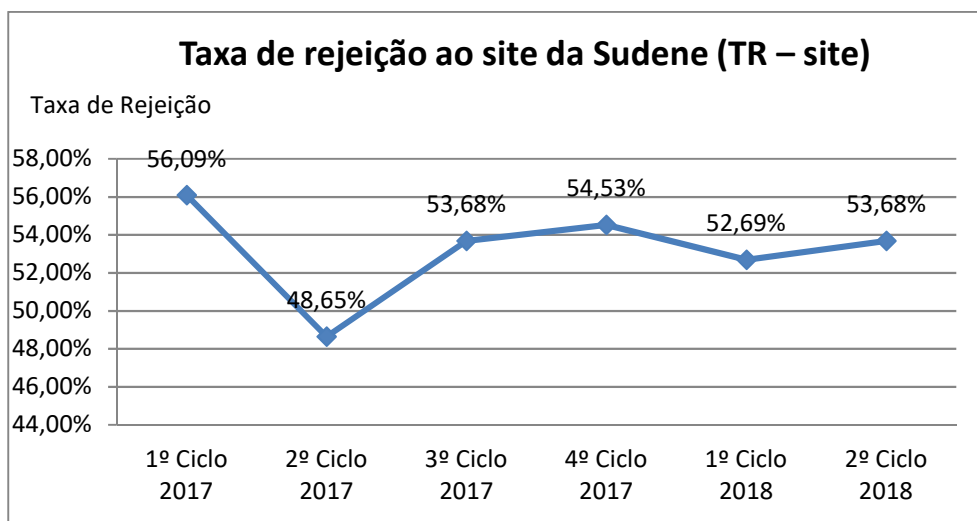

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)

a) Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.579
(Facebook)

b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral

que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.

e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018


f) Comentários: a curva de crescimento continua ascendente. Convém registrar que a Sudene não dispõe de orçamento para investir em publicidade digital.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017	2.259	-
08/06/2017	2.339	2º ciclo 2017
06/09/2017	2.413	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	2.504	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	2.520	1º ciclo 2018

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 04/06/2018.

h) Representação gráfica:

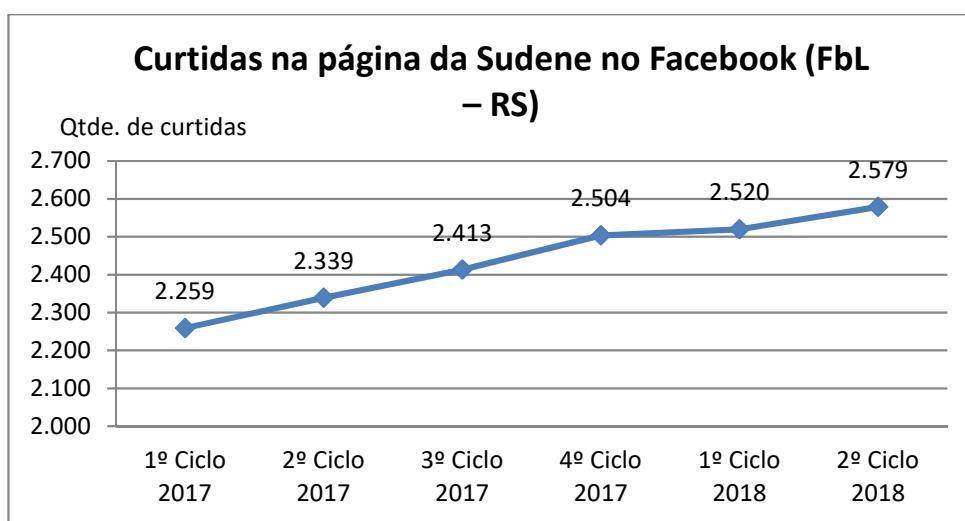

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.


6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 708
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.
- f) Comentários: não foi possível verificar o crescimento compreendido entre janeiro e dezembro por limitações do sistema online utilizado.
- g) Resultados Anteriores:

08/04/2017	467	-
08/06/2017	599	2º ciclo 2017
06/09/2017	623	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	664	4º ciclo 2017
02/02/2017 a 31/12/2017	668	1º ciclo 2018

Fonte: Twitter Analytics, acesso em 04/06/2018.

- h) Representação gráfica:

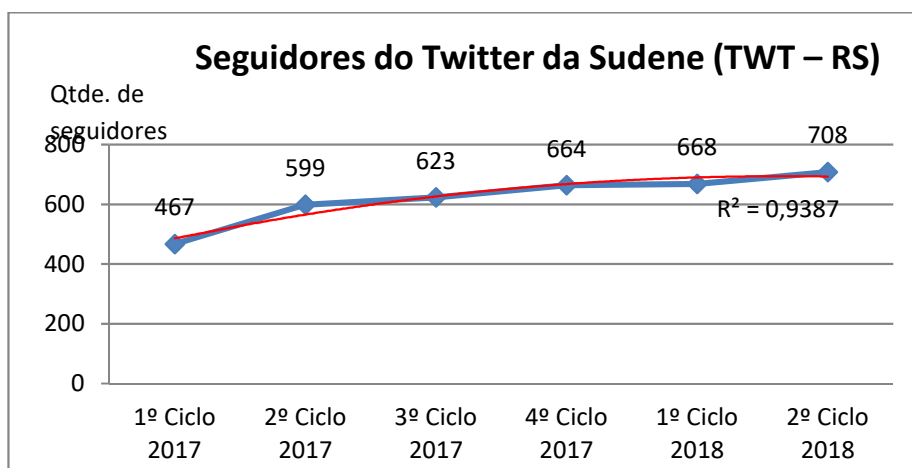

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.6 - Seguidores no Instagram da Sudene (INST – RS, ex Taxa de engajamento)

- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: 660
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após análise técnica do indicador de engajamento, a Assessoria de Comunicação decidiu requalificá-lo, passando a tratá-lo de forma semelhante ao registrado no Twitter. A mudança se fez necessária pela observação de que a métrica utilizada nas medições anteriores tenderia a registrar curvas descendentes a todo instante, distorcendo a percepção do comportamento dos usuários nesta rede social. O crescimento da quantidade de seguidores, por sua vez, indica o tamanho do alcance das publicações no Instagram e servem como termômetro para avaliar a qualidade conteúdo postado nesta rede social. Sendo assim, a partir deste ciclo, a Ascom pretende adotar o número de seguidores do Instagram como métrica, buscando registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.
- f) Comentários: Houve uma mudança na nomenclatura e fórmula do indicador. Anteriormente era denominado “taxa de engajamento do instagram da Sudene”, sendo calculado através da fórmula: qtde de curtidas/qtde de seguidores.
- g) Resultados Anteriores:

01/01/2018 a 31/05/2018	660	2º ciclo 2018

Fonte: Instagram.com, acesso em 04/06/2018.

* Como houve mudança de indicador, não foi possível mensurar os índices anteriores.

- h) Representação gráfica:

* Como houve mudança de indicador, não foi possível representar graficamente.


6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- a) Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 37 \text{ na internet} + 36 \text{ na intranet} = 73$
(Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.
- f) Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima. A quantidade cai na comparação com o ciclo anterior porque, naquela ocasião, a aferição considerou a produção no exercício 2017.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	39	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	54	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	56	4º ciclo 2017
01/02/2017 a 31/12/2017	212	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

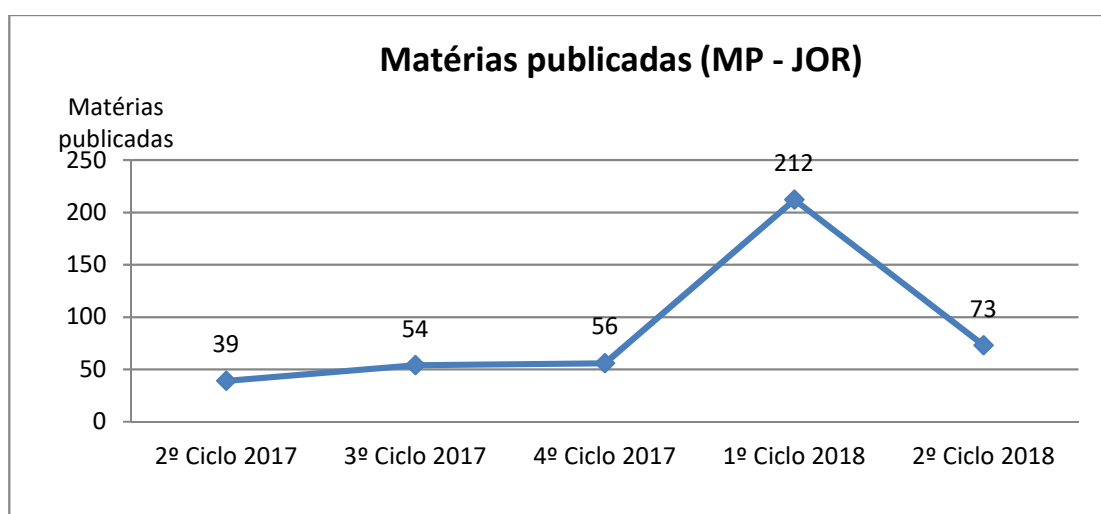

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)


- a) Fórmula: $\sum$ Sugestões de Pauta Publicadas = 14
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.

f) Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima. A quantidade cai na comparação com o ciclo anterior porque, naquela ocasião, a aferição considerou a produção no exercício 2017.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	8	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	12	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
30/03/2017 a 31/12/2017	78	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

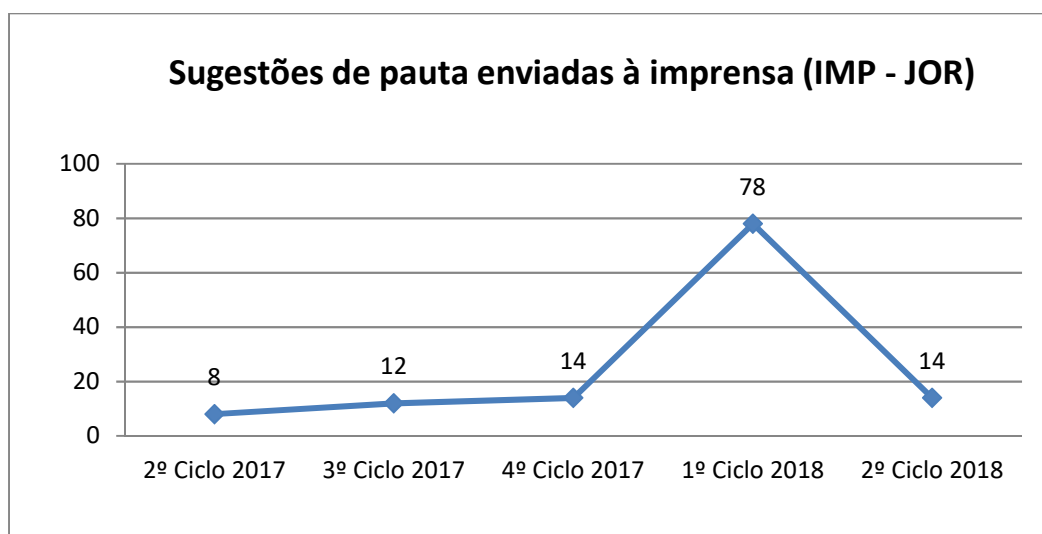

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.


6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: $\sum$ Produções em Vídeo e Áudio = 13 produções
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.
- Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima. A quantidade cai na comparação com o ciclo anterior porque, naquela ocasião, a aferição considerou a produção no exercício 2017.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	10	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	13	2º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	14	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	42	1º ciclo 2018

h) Representação gráfica:

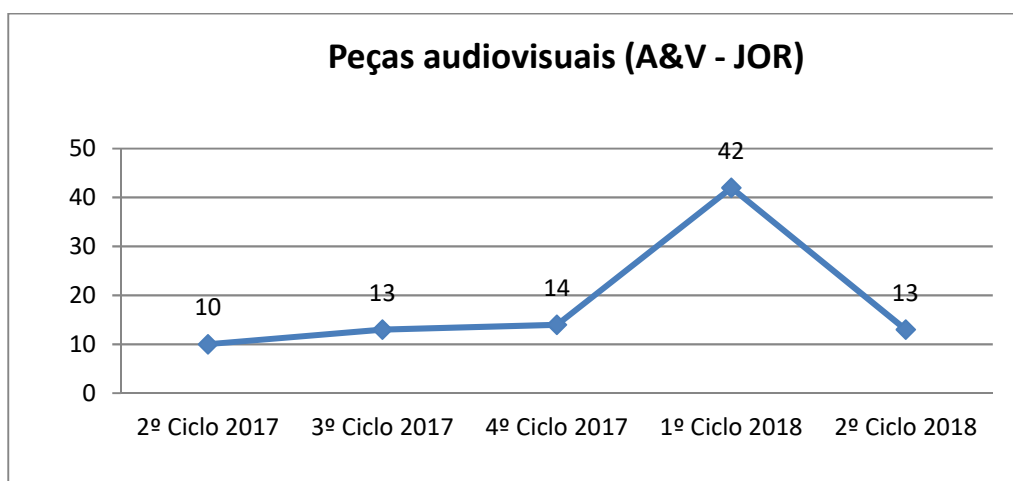

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.


6.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- a) Fórmula: $\sum \text{Produções em Ações de Publicidade e Design} = 107$
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - Produções para jornalismo;
 - Produções para demandas internas;
 - Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.

- e) Período da aferição: 01/01/2018 a 31/05/2018.
- f) Comentários: dados dentro da normalidade, considerando o período acima. A quantidade cai na comparação com o ciclo anterior porque, naquela ocasião, a aferição considerou a produção no exercício 2017.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	68	2º ciclo 2017
29/06/2017 a 31/08/2017	129	3º ciclo 2017
01/09/2017 a 30/11/2017	146	4º ciclo 2017
01/01/2017 a 31/12/2017	404	1º ciclo 2018

- h) Representação gráfica:

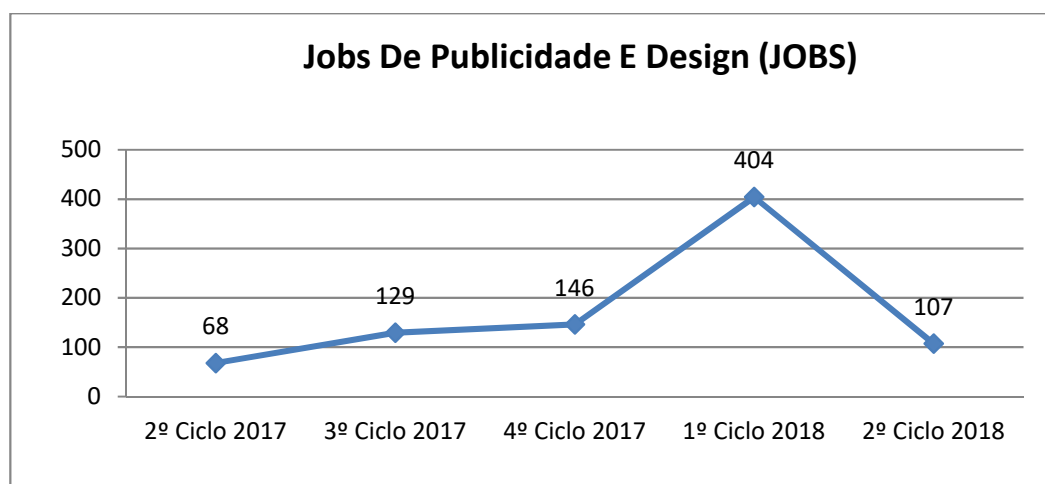

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

7. Metas de desempenho institucional para o período out/2017 - set/2018

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho aprovadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE na 288ª reunião, realizada em 19 de dezembro para o período out/2017 - set/2018, do qual participam todas as Diretorias e foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 167, de 20 de dezembro de 2017, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico

http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Portaria_SUDENE_n%C2%BA_167_2017_completaassinada.pdf.

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Metas para o período out/2017-set/2018 com base na Portaria nº 167, de 20 de dezembro de 2017

Nº Ordem	Diretriz Estratégica UDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	0%	0	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Superior)
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	52%	41,6	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Infantil)
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	87%	69,6	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Habitação)
4	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	100%	80	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Econômico - PIB)
5	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	25%	20	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Boletim Temático Ambiental - Resíduos Sólidos)
6	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Mapa digital	1 (100%)	62%	49,6	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Será elaborado um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste)
7	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para discussão	1 (100%)	12%	9,6	PO sob controle da DPLAN/CGEP (Será elaborado um texto para discussão aberta, sobre a saúde materna e infantil)
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2111 - Gestão e manutenção do MI	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 2000 - Administração da unidade	Evento	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Evento para fortalecimento da articulação e difusão da Rede Palma)

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica UDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
9	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Estudo	1 (30%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de protocolos de cultivo)
10	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Publicação	2 (50%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (1 publicação para atualização da literatura acadêmica e outra para acesso popular)
11	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.5- Fortalecer as administrações públicas, e Ação PPA 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Celebração de avenças	3 (70%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (celebração de 3 avenças (convênios ou TEDs) para capacitação de servidores municipais no uso do SICONV)
12	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, bem como a quela voltada para a inclusão da cadeia produtiva e Ação PPA 7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Local Sustentável; e, 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Análises realizadas	100 %	-	-	POs em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Análise de 100 % das propostas /projetos de emendas parlamentares recebidas no prazo legal)
13	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas	100 %	100%	80	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de pleitos em tramitação e analisados, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica UDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
14	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Propostas de Financiamentos analisados	100 %	100%	80	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de propostas de financiamento analisadas, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
15	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores.	Laudos e portarias aprovadas	365	74,8%	59,8	Lista sob controle da CGIF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base em relação de pleitos aprovados no período, para comparação entre o realizado e o previsto, na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (273 pleitos aprovados até o 2º ciclo de 2018)
16	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	87,5%	70	PO do Plano regional de Desenvolvimento do Nordeste sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (35% - 2º ciclo 2018)
17	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	100%	80	PO do Plano de Desenvolvimento da cidade de Feira de Santana/BA sob controle da DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional. (53% - 2º ciclo 2018)

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica UDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
18	D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1- Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Comitê implantado	1 (100%)	100%	80	PO de Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos da CGGI/Superintendência. O resultado percentual será apurado com base em constatação de Portaria ou instrumento equivalente, aprovado pela Diretoria Colegiada). (100% - 2º ciclo 2018)
19	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Subprojeto 1 realizado (Avaliação por competência)	1 (50%)	50%	40	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 50% para o Subprojeto 1. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional) – (25% - 2º ciclo 2018)
20			Subprojeto 2 realizado (Planejamento da Força de Trabalho)	1 (20%)	40%	32	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 20% para o Subprojeto 2. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional) – (8% - 2º ciclo 2018)
21	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Subprojeto 3 implantado (Política de desenvolvimento de pessoal)	1 (30%)	43,3%	34,7	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 30% para o Subprojeto 3. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional) – (13% - 2º ciclo 2018)
TOTAL					49,2%	39,4	-

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN); Diretoria de Administração (DAD); e, Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI)

Nota: Apuração considerada até 29/06/2018.

Observação: para identificação das siglas, acessar o endereço eletrônico:

http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

8. Conclusão

Neste 2º ciclo de monitoramento, com a ausência dos projetos novos da CGDS (aqueles oriundos das emendas parlamentares) observou-se que o número de projetos permaneceu em 124, uma vez que alguns foram retirados do ciclo, pois estavam concluídos, e outros foram acrescentados. Em relação ao mesmo período do ano passado (janeiro a maio/2017), o total de projetos teve um acréscimo, já que na ocasião eles totalizaram 80. Observa-se que a prevalência neste 2º ciclo de 2018 é dos planos operativos com o status de “em andamento”, que correspondem a 82 projetos (66,1%), os demais planos estão com status de “concluído”, “atrasado”, “cancelado” ou “paralisado”, totalizando 42 (33,9%). Fazendo um comparativo com o 2º ciclo realizado em 2017, nesse houve um equilíbrio maior entre os projetos concluídos (22), em andamento (26) e atrasados (23) que juntos corresponderam a 71 projetos.

Em relação aos projetos prioritários elencados na Resolução nº 281, de 13 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada da Sudene, permanecem nessa rodada por terem sido considerados pelas unidades responsáveis como “em execução” os seguintes planos operativos: a formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE); a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana; o acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus Planos de Trabalho; além da estruturação e acompanhamento das atividades relacionadas com a Rede Palma. Esse último projeto não foi atualizado pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS). Em 2018, foram acrescentados outros projetos considerados prioritários e importantes para o atingimento dos objetivos estratégicos institucionais, como, a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande e projetos vinculados à melhoria da agricultura familiar e à inclusão do semiárido na produção de energias renováveis, fotovoltaica e eólica.

Com a aprovação da criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles da SUDENE pela Diretoria Colegiada da SUDENE por meio da Resolução nº 293, de 11 de abril de 2018, e a aprovação de seu instrumento de funcionamento, o regimento, pela mesma Diretoria, por meio da Resolução nº 297, de 13 de junho de 2018, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional foi além da meta estabelecida para o período 2017/2018, dando por concluído o que lhe foi de competência implementar.

Por outro lado, outros projetos considerados importantes para a modernização da gestão, no tocante à promoção da excelência técnica e a melhoria da qualidade das decisões estão em curso sob a direção da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. São planos operativos ligados à avaliação por competências, política de gestão de pessoas e dimensionamento da força de trabalho.

Em relação aos indicadores de gestão de Incentivos Fiscais, o tempo médio de espera para a realização das vistorias teve um acréscimo neste ciclo, se comparado ao mesmo período em 2017. Neste ciclo, o tempo médio foi de 93,5 dias, no ciclo passado foram 59,4 dias. Tal fato, conforme detalhou a Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais neste relatório, esteve relacionado a restrições à compra de passagens aéreas no início deste ano. Um acréscimo positivo foi o desempenho da análise de pleitos de incentivos fiscais que correspondeu a 81% neste 2º ciclo. Em 2017, nesse mesmo período de análise, o desempenho atingiu 59,5%.

Considerando a importância do trabalho de monitoramento dos projetos desenvolvidas pelas diversas unidades da Sudene, para o bom andamento das atividades, compartilhamento de informações e melhoria da gestão, o não envio dos planos operativos atualizados, mesmo que por parte de apenas uma unidade, no caso a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, interferiu na execução do trabalho como um todo. Essa intercorrência afeta

principalmente aqueles projetos relacionados às metas de desempenho institucional, cujo ciclo corresponde ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018, conforme detalhado na introdução deste documento, e que precisam ter as informações acompanhadas, aferidas e consolidadas pela Coordenação-Geral de Gestão Institucional ao fim do ciclo de avaliação.

A não realização da reunião de monitoramento também resulta em perdas para as unidades envolvidas, uma vez que, durante o encontro, informações e experiências são compartilhadas, envolvendo não apenas os técnicos, como também a alta administração. Durante as reuniões, têm-se, por exemplo, a oportunidade de expor dificuldades observadas na execução de projetos e, muitas vezes, a partir dessa exposição, soluções são encontradas para tais entraves.

A agenda proposta para os próximos ciclos de 2018 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
3º	31/09/2018	5/10/2018	18/10/2018
4º	30/11/2018	7/12/2018	20/12/2018

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Planos Operativos do Monitoramento



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO 01 (ex PO 02)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.				
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	27/08/2018	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	16/02/2018	Vigência: 28/12/2012 a 30/03/2018



1º ciclo 2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente: Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente: Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								40,5%	Em Andamento		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		

6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	28/02/2016		15/11/2014	--	--	80,0%	Paralisado	Segundo informações dadas pela conveniente o processo licitatório para contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1, foi realizado e homologado no dia 07/10/2015, aguardando o repasse da segunda parcela para execução. Entretanto, devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessária a realização de um novo processo licitatório. Resta a contratação dos serviços para a realização do Seminário final.	Com a ampliação da vigência deste convênio até 30/03/2018 a Conveniente procedeu ajustes no Plano de Trabalho para atualizá-lo. Entretanto, ao tentar realizar o ajuste nas datas da Etapa 3/Meta 1 o sistema do SICONV dá uma mensagem de "Erro". Até o momento, a Conveniente não conseguiu identificar, junto aos órgãos gestores do SICONV, o que vem motivando esta mensagem. Desta forma, tem-se a informar que as datas que constam neste PO estão de acordo com o extrato emitido no SICONV que representa a posição do mesmo na data limite de Ciclo de Monitoramento. Todavia, deve-se salientar que a atualização do Plano de Trabalho é condição para dar consequência aos procedimentos necessários à liberação da segunda parcela.
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco-Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	30/03/2018		08/12/2014	--	--	40,0%	Em Andamento		
7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015		08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído		
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/02/2018	28/02/2018	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	A Iniciar	Após o atendimento de pendências pela Conveniente, foram realizadas pela equipe técnica da Concedente as análises e aprovações dos Relatórios de Execução. Entretanto, para a liberação da segunda parcela de recursos é necessário que a Conveniente realize os devidos ajustes no Plano de Trabalho, o que ainda não ocorreu devido à mensagem de "Erro" dada pelo SICONV quando a Conveniente tenta ajustar/atualizar as datas de execução desta Etapa 3/ Meta 1. Contudo, até a data limite deste ciclo de monitoramento a Conveniente não havia encontrado a motivação desta mensagem de "Erro" e consequentemente a conclusão dos ajustes no Plano de Trabalho, impossibilitando a liberação da segunda parcela de recursos.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	01/03/2018	16/03/2018		--	--	--	0,0%	A Iniciar	O processo licitatório para a execução da Etapa 2/ Meta 1 já foi realizado e homologado. Entretanto, devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessária a realização de um novo processo licitatório. A execução desta Etapa 2 está condicionada ao repasse da segunda parcela de recursos.	
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	03/10/2016	30/06/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado	Esta Etapa está condicionada à realização dos Workshops previstos. A Conveniente informou que o sistema do SICONV aponta como "Erro" ao tentar ajustar, atualizando as datas de execução desta Etapa 3/ Meta 1.	
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	30/03/2018		01/05/2014	--	--	50,0%	Em Andamento		

8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	Segundo informações prestadas por representante da Embrapa Semiárido, parceiro na realização desta Etapa1/Meta2, o trabalho de campo e processamento digital demandado foi concluído.
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	16/03/2018	26/03/2018		--	--	--	0,0%	A Iniciar	Esta Etapa2/ Meta2 está condicionada a realização das demais Etapas/Metas.
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	30/05/2018	27/08/2018		--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 265.241,25	61%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.			
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				SUDENE no Projeto		MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	
										R\$	
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90	NOV/2015	107.354,71	5.650,24	113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 207.542,62

Previsão de Conclusão:	26/01/2018	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 26/01/2018
Data Atualização:	16/02/2018	

1º ciclo 2018



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos e Gileldson Alves - CONDEPE/FIDEM.

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								59,4%	Atrasado		
8	Liberação da 1ª parcela	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	Realização do processo de licitação e contratação	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	—	—		11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído		
10	Realizar 01 seminário	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	28/11/2016	--	25/11/2015	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.1	Reuniões Técnicas	Etap 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	21/07/2016	--	25/11/2016	15/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.2	Diagnóstico e Levantamento de Dados	Etap 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	30/11/2016	20/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.3	Seminário de Lançamento do Programa de capacitação Fortalecimento Institucional	Etap 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	28/03/2016	28/11/2016	--	28/03/2017	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
No período de referência, foi aprovado													

11	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/04/2016	28/04/2016		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído	e liberada a segunda parcela dos recursos. Foi realizado aditivo de prazo, ampliando a vigência para 26/04/2018, para conclusão da execução. Entretanto, até a data limite de atualização, o Termo Aditivo de prazo, que foi assinado em 26/01/2018, não consta no Siconv como publicado. Desta forma, ainda está pendente a atualização do Plano de Trabalho, o que reflete o status do itens 13 e 13.3 como atrasados.	A equipe técnica CGDS realizou reunião em janeiro de 2018 com a conveniente e repactuou o calendário de execução/conclusão das atividades.
12	Liberação da 2ª parcela	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	01/12/2017	31/12/2017	R\$ 100.187,91	100,0%	Concluído		
13	Oficinas de Capacitação / Monitoramento	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	29/04/2016	26/01/2018		29/04/2016		--	93,0%	Atrasado		
13.1	Oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	04/07/2016	14/02/2017	--	04/07/2016	14/02/2017	--	100,0%	Concluído		
13.2	Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	25/07/2016	07/03/2017	--	25/07/2016	07/03/2017	--	100,0%	Concluído		
13.3	Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	09/08/2016	26/01/2018	--	09/08/2016	--	--	85,0%	Atrasado		
14	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/07/2016	11/08/2016	--	28/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/ SUDENE	27/11/2017	27/11/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 207.542,62	Valor realizado:		R\$ 207.542,62	79%	Atrasado	Status do Projeto	

Parcelas institucionais:

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2017 - Situação atual "Em execução", após 6º TA; retomada a análise financeira pela CCONT, relativa a 1ª parcela, com vistas a liberação da 2ª parcela (a análise apontou necessidade de ajustes/complementações). Solicitado pelo CONDEPE reunião de esclarecimento. Reunião realizada em 1º/12/2017, pela manhã, na CGDS, com CGDS, CCONT e AG. Condepe/FIDEM.

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibo.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.				
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desemboço (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
	280	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30					Pago até o ano anterior	R\$ 359.682,64
						ago/15	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ -
						nov/16	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						TOTAL	359.682,64	18.930,66	378.613,30	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 359.682,64

Previsão de Conclusão:	13/11/2018	CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)
Data Atualização:	16/02/2018	

1º ciclo 2018

Desatualizado

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Isis Moreira, Juliana de Melo Borges - SUDENE/ Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	CGDS/COF/ SUDENE	Não Informado	Não Informado	R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído		

9	e Desenvolvimento Regional Sustentável	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	22/08/2017		28/08/2015	13/11/2017		100,0%	Concluído	
	Realização do Fórum	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data: 16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.
9.1	Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.
9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em Salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	01/04/2016	30/11/2016	R\$ 138.415,08	23/02/2017	25/04/2017	R\$ 138.415,08	100,0%	Concluído	
9.6	Diretrizes Gerais e Propostas	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	21/07/2016	10/05/2017		21/07/2016	31/05/2017		100,0%	Concluído	Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016. Produto da etapa 3 entregue em 31/05/17.
9.7	Consolidação do Plano	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	11/05/2017	13/11/2017		22/08/2017	13/11/2017		100,0%	Concluído	Oficina técnica realizada em 08/11/17. Livro-resumo do Plano divulgado na Oficina. Relatório IV finalizado em 13/11/17 e entregue a Sudene.

9.8	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	08/11/2017	08/11/2017		08/11/2017	08/11/2017		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada pelas servidoras da CGDS: Maria Helena, Isis e Juliana para acompanhamento da Oficina de entrega do livreto do Plano realizada em Salgueiro.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								10,0%	Em Andamento		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	13/11/2017	13/11/2018		13/11/2017			50,0%	Em Andamento	Relatórios de execução físico do SICONV aprovados pela CGDS em 13/11/17; relatórios de execução financeiros aprovados pelo setor de convênios. Prestação de contas enviada para análise em 26/12/2017. Laudo técnico em elaboração.	
				Valor Previsto:		R\$ 359.682,64	Valor realizado:		R\$ 359.682,64	90%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:													
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM													
Observações:													
De acordo com o art. 10, § 8º, do Decreto n.º 6170/2007, o concedente tem o prazo de um ano para finalizar a análise da prestação de contas.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	04 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70	dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
						nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
							R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

Previsão de Conclusão:	30/11/2018	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	16/02/2018	Vigência até: 31/12/2017



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,6%	Atrasado	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confecção de 50 blocos multinutricionais	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		

11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	24/10/2015		-	75%	Atrasado	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	30/06/2017	-	03/12/2015		-	55%	Atrasado	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	14/09/2015		-	70%	Atrasado		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	30/06/2017	-	27/11/2015		-	60%	Atrasado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28				0%	Atrasado	Em 02/01/18 foram aprovados os relatórios de execução financeira pela CCONT e foi solicitado à conveniente que atualizasse os cronogramas físico e de desembolso, para se proceder à liberação da 2ª parcela	Aguardando os ajustes dos cronogramas físico e de desembolso pela conveniente
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	31/05/2017	-			-	0%	Atrasado	A 2ª visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das demais atividades, que estão dependendo da 2ª liberação de recursos.	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:	R\$ 206.151,42	60%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados, em sua maior parte, por procedimentos administrativos e burocráticos, tanto por parte da Emepa quanto da Sudene, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 31/10/2017, a qual foi acatada em 30/11/17. A nova data de vigência proposta pela conveniente para encerramento do convênio é **30/06/2018**.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	05 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais			Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.				
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará				
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	16/02/2018	1º ciclo 2018



Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	A realizar no exercício	R\$ -
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 771.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído	
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído	
		Execução (Peso 60%)								60,0%	Concluído	
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído	
9	Contratação	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016		100,0%	Concluído	
10	Seminários de divulgação	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016		100,0%	Concluído	
11	Cursos de capacitação	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016	26/10/2017		100,0%	Concluído	
12	Realizar 09 dias de campo	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016	13/12/2017		100,0%	Concluído	
13	Intercâmbios interestaduais	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016	05/12/2017		100,0%	Concluído	

14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído		
15	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00	10.08.2017	10.08.2017	R\$ 560.000,00	100,0%	Concluído		
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016		12/05/2017	03/07/2017		100,0%	Concluído		
		Encerramento - 20%								0,0%	A Iniciar		
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	Atrasado		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar	Aguardando o recebimento da prestação de contas para elaboração do relatório final.	
				Valor Previsto:		R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 771.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	06 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .				
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014				
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL (R\$)	

Previsão de Conclusão:	30/12/2018
Data Atualização:	16/02/2018

1º ciclo 2018



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Macira Sotero e Juliana Borges (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Paulo Marinho (coordenador)

Pago até o ano anterior	R\$	764.868,00
A realizar no exercício (RAP)	R\$	305.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	764.868,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								56,5%	Em Andamento		
8	Depósito da contrapartida	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00	
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído		
10	Visita técnica	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.	
11	Processo licitatório	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído		
12	Mobilização e divulgação	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído		
13	Contratação de entidade	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL	
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/04/2015	30/05/2016	-	Não informado	Não informado		100%	Concluído		

15	Aquisição de equipamentos e materiais	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			100%	Concluído		
16	Elaboração do Material Didático	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		20/04/2016	22/06/2016		100%	Concluído		
17	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.	
18	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/09/2016	R\$ 438.250,00	29/12/2016	29/12/2016	R\$ 438.250,00	100%	Concluído		
19	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras, auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Vaalor R\$ 371.625,00	SEMTABES	16/06/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/06/2016		100%	Concluído	Foram capacitadas 192 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras, pintora de paredes e aplicadora de gesso de Abril aJunho/2016 e 198 mulheres de Março a Junho/2017	
20	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	06/07/2017	07/07/2017	-	29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído		
21	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2017	30/09/2017	R\$ 305.000,00	05.12.2017	05.12.2017		100%	Concluído	Efetuada o repasse da quarta e ultima parcela do convênio.	
22	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 305.000,00	SEMTABES	02/05/2017	07/07/2017		16/10/2017	19/12/2017		100%	Concluído	Foram capacitadas em aulas práticas 198 mulheres no curso de aplicadora de cerâmica nos turnos da manhã, tarde e noite. As aulas teóricas foram dadas junto com a turma do curso anterior (pintora de obras).	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/03/2018	30/12/2018	-				0%	Em andamento	Até o presente momento foram inseridas 04 (quatro) mulheres no mercado de trabalho.	
24	Visita técnica	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2017	30/12/2017	-	29/11/2017	01/12/2017		100%	Concluído	Foi realizada a visita técnica de acompanhamento de 29/11 a 01/12 de 2017 para liberação da última parcela do convênio.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/2018	30/12/2018	-				0%	A Iniciar		
						Valor Previsto:	R\$ 1.069.868,00	Valor realizado:	R\$ 764.868,00	76%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES - Município de Maceió/Estado de Alagoas.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desemboço (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92	R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
						R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 852.088,92	R\$ 53.000,00		R\$ 905.088,92	Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 852.088,92

Previsão de Conclusão:	15/11/2017
Data Atualização:	16/02/2018



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		30/09/13	14/01/14	-	30/09/13	14/01/14	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/13	02/10/13	-	03/04/14	03/04/14		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/13	12/12/13	-	30/09/13	12/12/13		100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/13	26/12/13	-	26/12/13	26/12/13			Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/14	14/01/14	-	14/01/14	14/01/14		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		30/12/13	14/12/16		05/02/14			60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/14	28/02/14		05/02/14	05/02/14		100%	Concluído		
9	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/14	28/02/14	R\$ 400.000,00	13/02/14	13/02/14	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/15	30/03/15		07/04/15	07/04/15		100%	Concluído		
11	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/15	30/11/15	R\$ 300.000,00	18/11/15	18/11/15	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/15	30/12/15		27/05/16	27/05/16		100%	Concluído		
13	Liberção da 3ª parcela	Liberção da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/16	30/08/16	R\$ 152.088,92	05/08/16	05/08/16	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)	
14	Reforma do Mercado Público	Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.	Município de Saboeiro	30/12/13	16/09/16		28/02/14	14/11/16		100%	Concluído	Ver Observação (1)	

15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/16	14/12/16	-	07/12/16	09/12/16	-	100%	Concluído	O município concluiu o Objeto, mas não energizou o mercado pois o transformador da rua não suporta a nova demanda. A concessionária de energia deu uma previsão distante para solucionar o problema.	O município solicitou à concessionária de energia a substituição do transformador e está aguardando a solução.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		15/11/16	15/11/17	-				0%	Atrasado		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/16	15/11/17					0%	Atrasado	Prestação de Contas Final ainda não foi encaminhada; Ver Observações (3) e (4)	Nova solicitação de envio da Prestação de Contas Final, em 07/nov/2017, cf. Ofício nº 285/2017-DPLAN/SUDENE.
						R\$ 852.088,92	Valor realizado:	R\$ 852.088,92	80%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Saboeiro/CE

Observações:

- (1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.
- (2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R\$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.
- (6) Visita de Recebimento do Objeto em 07.12.2016 e Relatório de Visita de Recebimento do Objeto elaborado em 16.08.2017 e inserido no SICONV em 05.09.2017.
- (7) Ofício Nº 285/2017-DPLAN/SUDENE, de 07.11..2017, solicita providências relativas a apresentação da PTC e outras.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	08 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
						R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ 200.000,00
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 400.000,00

Previsão de Conclusão:	04/06/2019	
Data Atualização:	16/02/2018	1º ciclo 2018

Desatualizado

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/02/2014	15/01/2015	-	24/02/2014	09/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	05/04/2018		02/02/2015			46%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016		100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	29/09/2017	29/09/2017	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	21/03/2018		04/10/2017			34%	Em Andamento		
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/03/2018	05/04/2018	-			-	0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		04/06/2018	04/06/2019	-				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/06/2018	04/06/2019	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:	R\$ 400.000,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:												
Município de Jardim de Piranhas/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014												
(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.												
(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.												
(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.												
(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.												
(6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.												
(7) A vigência foi prorrogada para 21/03/2018												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
						R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 292.558,79

Previsão de Conclusão:	27/11/2018
Data Atualização:	16/02/2018

1º ciclo 2018

Desatualizado

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN.

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/03/2014	15/01/2015	-	06/03/2014	08/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/06/2015	28/09/2017		04/02/2015			51%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/2015	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	12/09/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído	Foi realizado ajuste que reduziu a segunda parcela para R\$ 142.558,79	O saldo remanescente de R\$ 7.441,21 somente será liberado caso haja ampliação no projeto

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	28/09/2017		19/10/2016	04/12/2017		95%	Atrasado	O atraso ocorreu porque o município deixou a parte de demolição junto a fachada do mercado para executar no final da obra. Em processo de aditamento de vigência.	Cobrada celeridade ao município. Termo aditivo em fase de conclusão.
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	14/12/2017	19/12/2017	-			-	0%	Atrasado	Atraso na etapa anterior	Cobrada celeridade ao município. Termo aditivo em fase de conclusão.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/11/2017	27/11/2018					0%	A Iniciar	Ver Observação (7)	
				Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 292.558,79	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Messias Targino/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014													
(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015													
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.													
(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.													
(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.													
(6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho													
(7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.													
(8) Foi efetuado <u>Aditamento de Vigência</u> , alterando a data de vigência do convênio para o dia 30/06/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV													
(9) Solicitado o Aditamento da Vigência para 26/01/2018													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	10 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
							R\$ 0,00		R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
						R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED 05/2015
Data Atualização:	16/02/2018	Vigência: 25/11/2017

1º ciclo 2018



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	27/11/2015		27/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COFC/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído		
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016		20/6/2016	22/6/2016		100%	Concluído	A Coordenadora de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou uma visita técnica ao Laboratório de Energias Renováveis – NREL dos Estados Unidos, que faz parte da etapa 1 do Plano de Trabalho aprovado	
11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições (Etapa 1.0)	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2017		3/12/2015	31/05/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER entregou o relatório correspondente a essa etapa.	

12	Definir a atuação da área de ensaios (Etapa 1.1)	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	30/03/2017		3/12/2015	4/5/2017		100%	Concluído	A partir dos intercâmbios realizados foram demandados alguns encaminhamentos. O mais importante deles é um acordo entre as partes para implantar uma área de ensaios de energias renováveis no Nordeste que influenciará no projeto em andamento, especificamente na etapa 1.1; Em 4/5/2017 a equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório da etapa correspondente	A universidade solicitou aditivo de prazo e de recursos, que foi acatado pela equipe técnica e está aguardando parecer das demais áreas competentes. Em 28/02/2017: Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
14	Definir a configuração da área de ensaios (Etapa 1.2)	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	30/4/2017		1/5/2016	30/10/2017		100%	Concluído	O TED teve nova prorrogação de vigência e as datas das etapas serão repactuadas.	
15	Dimensionar a área de ensaios (Etapa 1.3)	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2016	30/5/2017		1/8/2016	19/11/2017		100%	Concluído	Os relatórios das etapas 1.2 a 1.3 foram entregues por meio eletrônico antes do fim da vigência .	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final (Etapa 1.4)	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	30/5/2017		1/10/2016	20/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										6,0%	Em Andamento		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1 ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18		05/01/2018			30%	Em Andamento	A UFPE-CER irá encaminhar o relatório de cumprimento do objeto em até 30 dias após o término da vigência. A UFPE-CER encaminhou o relatório de cumprimento do objeto em 03/01/2018 o qual está em análise para elaboração do Laudo técnico final .	A Sudene encaminhou um ofício para o Reitor da UFPE com orientações para a prestação de contas.
				Valor Previsto:		R\$ 277.371,58	Valor realizado:		R\$ 277.371,58	86%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

UFPE - Centro de Energias Renováveis

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	11 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Mauricio José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
Objetivo do projeto:	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	A realizar no exercício	R\$ -
	R\$ 0,00			Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED
Data Atualização:	16/02/2018	Vigência: 25/11/2017

1º ciclo 2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)



N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído		
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia da visita de acompanhamento foi constatado que o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo".	

11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/3/2017		3/12/2015	19/4/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório referente a etapa	
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	20/9/2017		20/9/2017	2/10/2017		100%	Concluído	A UFPE e o CSEM formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica em outubro.	
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo	
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	9/10/2017		9/10/2017	22/11/2017		100%	Concluído	Devido o atraso da formalização do ACT entre UFPE e CSEM, bem como a percepção de ampliar os testes necessários para realizar o projeto em tela, a UFPE solicitou aditivo de prazo e recursos, o qual foi acatada pela equipe técnica e está aguardando o posicionamento das demais áreas competentes	Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
15	Caracterização outdoor de células e módulos	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2016	23/10/2017		23/10/2017	19/11/2017		100%	Concluído	O CER/UFPE solicitou novo aditivo de prazo, acatado pela Unidade Técnica e enviado para as demais providências junto as demais Unidades.	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	17/11/2017		20/11/2017	22/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										6,0%	Em Andamento		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18		05/01/2018			30%	Em Andamento	A UFPE-CER irá encaminhar o relatório de cumprimento do objeto em até 30 dias após o término da vigência . A UFPE-CER encaminhou o relatório de cumprimento do objeto em 03/01/2018 o	A Sudene encaminhou um ofício para o Reitor da UFPE com orientações para a prestação de contas.
				Valor Previsto:		R\$ 322.110,74	Valor realizado:		R\$ 322.110,74	86%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
UFPE - Centro de Energias Renováveis													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015
Data Atualização:	16/02/2018	Vigência: 31/03/2017



1º ciclo 2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Carlos Almiro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído		
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído		
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAA.	
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.	
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										12,0%	Em Andamento		
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017			60%	Em Andamento	Foram apresentados os produtos e as respectivas Notas Técnicas aprovando-os por parte do Ministério do Meio Ambiente, bem como, a Nota Técnica final referente aos aspectos físicos desta iniciativa. Todo este material encontra-se em processo de análise para elaboração do parecer técnico final.	
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	92%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidades responsáveis:	CGEP e CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestores das subunidades:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Maurício José de Garcia Maia		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.				
Projeto:	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

Previsão de Conclusão:	26/05/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina Pereira - CGEP/DPLAN ; Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		100%	Concluído		
2	Envio da proposta	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3	Parecer técnico	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído		
4	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
7	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								45,8%	Atrasado		
9	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1: Levantamento etnobotânico	Meta 1: Levantamento etnobotânico	UFPE	10/12/2015	26/02/2018	R\$ 76.800,00	10/03/2016	18/10/2016	R\$ 76.800,00	100%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016		10/03/2016	10/03/2016		100%	Concluído		

10.2	Visita técnica	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio de 2016	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	23/05/2016	10/11/2016		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Foi encaminhado o Ofício ao reitor da UFPE cobrando providências para complementação do relatório.
10.4	Relatório de conclusão da Meta 1	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	26/01/2018		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Foi acordado que as pendências deste relatório seriam incluídas no próximo relatório.	
11	Meta 2: Banco de dados de e sequenciamento de genes de interesse	Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico	UFPE	10/12/2015	25/04/2018	R\$ 138.000,00	18/01/2016		R\$ 138.000,00	66,7%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 25/04/2018
11.1	2º Reunião de acompanhamento	2º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016		05/09/2016	06/09/2016		100%	Concluído		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016.
11.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	13/06/2016	24/02/2018		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 24/02/2018
11.3	Relatório de conclusão da Meta 2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	25/04/2018		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordado em reunião realizada no dia 01/12/2017	Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018
12	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	UFPE	10/12/2015	25/04/2018	R\$ 373.400,00	18/01/2016		R\$ 373.400,00	66,7%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 25/04/2018
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016		08/11/2016	09/11/2016		100%	Concluído		
12.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	12/09/2016	24/02/2018		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 24/02/2018
12.3	Relatório de conclusão da Meta 3	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	25/04/2018		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordado em reunião realizada no dia 01/12/2017	Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018
13	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	UFPE	13/03/2017	25/04/2018	R\$ 160.800,00	13/03/2017		Não se aplica	75,0%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 25/04/2018
13.1	Visita técnica	Visita técnica (oficinas devolutivas)		13/03/2017	17/03/2017		13/03/2017	15/03/2017		100%	Concluído		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	20/03/2017	25/04/2018		20/03/2017			50%	Atrasado		Por questão de uniformidade de datas, corrigir a data final prevista constante neste item para 25/04/2018
14	Apresentação de relatório final	Apresentação de relatório final	UFPE	27/10/2017	25/04/2018					50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Em função da prorrogação do prazo de vigência, a data final prevista deverá ser alterada para 25/04/2018

ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	Atrasado		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	26/04/2018	26/05/2018					0%	Atrasado	Previsão para entrega do Laudo Técnico: 04/07/2018. Motivo: alteração na equipe.	
Valor Previsto:				R\$ 749.000,00		Valor realizado:		R\$ 749.000,00		66%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Deverá ser inserido um subitem na Meta 4 (Relatório de acompanhamento - com data inicial prevista em 20/03/2017 e data final prevista em 24/02/2018), a qual passará a contar com três subitens.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 16)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luís Alonso

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Emprego	Produto 3 - Boletim de Emprego	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016	27/03/2018	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/2016	09/12/2016	-	21/03/2017	30/10/2017	-	100%	Concluído	Briefing concluído. Foi dado prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.	

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/2016	22/12/2016	-	12/03/2018	27/03/2018	-	100%	Concluído	Foi necessário ajustar o texto introdutório.	
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	29/06/2018

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Rendimento	Produto 3 - Boletim de Rendimento	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016	27/03/2018	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCON	02/12/2016	09/12/2016	-	20/03/2017	27/03/2018	-	100%	Concluído	Briefing concluído. Foi dado prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.	

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	-	27/03/2018	27/03/2018	-	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 18)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Diferenças Regionais				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	14/10/2017
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luís Alonso

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Quadro com metadados dos indicadores	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/16	28/10/16	-	17/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/16	21/10/16	-	17/10/16	21/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/16	28/10/16	-	24/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Texto para Discussão - Diferenças Regionais	Produto 3 - Texto para Discussão - Diferenças Regionais	José Luiz	31/10/16	14/10/17	-	01/11/16	14/10/17	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/16	01/12/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/10/17	13/10/17	-	02/10/17	13/10/17	-	100%	Concluído		

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	14/10/17	14/10/17	-	14/10/17	14/10/17	-	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
*Boletim relativo à compreensão das diferenças regionais.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-			
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-			
Objetivo da ação:	-					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação			
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti			
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.					
Projeto:	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.					
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VIII - fortalecimento do processo de interiorização do ensino superior, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/05/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Gabriela Lins



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Dados		Gabriela Lins	20/02/2018	13/04/2018					0%	Atrasado	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES.
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Lins	20/02/2018	14/03/2018					0%	Atrasado	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Lins	02/04/2018	13/04/2018					0%	Atrasado	
2	Análise		Gabriela Lins	13/04/2018	18/05/2018					0%	Atrasado	
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Lins	13/04/2018	30/04/2018					0%	Atrasado	
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Lins	30/04/2018	18/05/2018					0%	Atrasado	
3	Publicação		Gabriela Lins	19/05/2018	30/05/2018					0%	Atrasado	
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Lins	19/05/2018	21/05/2018					0%	Atrasado	

3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Lins	22/05/2018	30/05/2018					0%	Atrasado		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	0,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII- universalização dos níveis de ensino infantil, fundamental e médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/06/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Gabriela Isabel	23/10/2017	03/04/218	-	23/10/2017	03/04/2018	-	100%	Concluído		
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Gabriela Isabel	23/10/2017	31/10/2017	-	23/10/2017	25/01/2018	-	100%	Concluído		
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Gabriela Isabel	25/01/2018	03/04/2018	-	25/01/2018	03/04/2018	-	100%	Concluído		
2.	Análise		Gabriela Isabel	04/04/2018	04/06/2018	-	04/04/2018		-	55%	Atrasado		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Gabriela Isabel	04/04/2018	27/04/2018	-	04/04/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído		
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Gabriela Isabel	30/04/2018	04/06/2018	-	11/06/2018		-	10%	Atrasado	Servidora envolvida com outras atividades: Curso FUNDAJ/PRDNE, análise de projeto - Educação - Piritiba e Perfil Agrícola.	
3.	Publicação		Gabriela Isabel	05/06/2018	25/06/2018	-			-	0%	Atrasado		
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Gabriela Isabel	05/06/2018	06/06/2018	-			-	0%	Atrasado		

3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Gabriela Isabel	07/06/2018	25/06/2018	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	51,7%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre condições de habitação, referente ao objetivo V estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo V- melhoria das condições de habitação, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	05/07/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Paula	27/11/2017	15/12/2017	-	27/12/2017	15/12/2017	-	100%	Concluído		
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Paula	27/11/2017	06/12/2017	-	27/12/2017	06/12/2017	-	100%	Concluído		
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Paula	07/12/2017	15/12/2017	-	07/12/2017	15/12/2017	-	100%	Concluído		
2.	Análise		Paula	05/02/2018	08/06/2018	-	05/02/2018		-	100%	Concluído	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como Estudos Técnicos para o FIES, projeto de arquitetura para a galeria dos Superintendentes, além de participar do Projeto de Cisternas com a CGDS	
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Paula	05/02/2018	08/05/2018	-	05/02/2018	08/05/2018	-	100%	Concluído		
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Paula	09/05/2018	08/06/2018	-	09/05/2018	11/06/2018	-	100%	Concluído		
3.	Publicação		Paula	11/06/2018	05/07/2018	-	11/06/2018		-	60%	Em Andamento		
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Paula	11/06/2018	12/06/2018	-	11/06/2018	20/06/2018	-	100%	Concluído		
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Paula	13/06/2018	05/07/2018	-	20/06/2018		-	20%	Em Andamento		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	87%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim sobre PIB e PIB per capita, referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo I - diminuição das desigualdades espaciais e interpessoais de renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	12/06/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		José Luis	26/04/2018	08/05/2018	-	26/04/2018	08/05/2018	-	100%	Concluído		
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	José Luis	26/04/2018	30/04/2018	-	26/04/2018	30/04/2018	-	100%	Concluído	A atividade " validação com a equipe", planejada nesta etapa, foi transferida para se agregar à etapa 2.2	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	José Luis	02/05/2018	08/05/2018	-	02/05/2018	08/05/2018	-	100%	Concluído		
2.	Análise		José Luis	09/05/2018	30/05/2018	-	09/05/2018	30/05/2018	-	100%	Concluído		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	José Luis e Ludmilla Calado	09/05/2018	11/05/2018	-	09/05/2018	11/05/2018	-	100%	Concluído	As atividades "elaborar tabelas" e "elaborar gráficos" já estão concluídas, faltando apenas a elaboração dos mapas..	
2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	José Luis	14/05/2018	30/05/2018	-	14/05/2018	30/05/2018	-	100%	Concluído		
3.	Publicação		José Luis	01/06/2018	12/06/2018	-	01/06/2018	12/06/2018	-	100%	Concluído		
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	José Luis	01/06/2018	05/06/2018	-	01/06/2018	05/06/2018	-	100%	Concluído		
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	José Luis	06/06/2018	12/06/2018	-	06/06/2018	12/06/2018	-	100%	Concluído		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI- universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	06/08/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogério de Melo Barbosa



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Marina Barbosa	02/05/2018	21/06/2018	-	14/05/2018		-	75%	Atrasado	Servidora envolvida com outras atividades: curso com a EIPP/Fundaj; atendimento de demandas de informação via Ouvidoria; elaboração de Nota Técnica do projeto "Viabilidade Fotovoltaica e Eólica para Inclusão Elétrica e Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido", acompanhamento da participação da Sudene no Grupo de Trabalho para revisão da PNDR; oficina de cenarização para o PRDNE; atividades relativas ao "Programa mais Gestão" – avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene.	
1.1	Identificar os indicadores	Ler documentos sobre o tema, definir questões a serem respondidas e validar com a equipe.	Marina Barbosa	02/05/2018	11/05/2018	-	14/05/2018	24/05/2018	-	100%	Concluído		
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados, coletar e tabular os dados.	Marina Barbosa	14/05/2018	21/06/2018	-	28/05/2018		-	50%	Atrasado		
2.	Análise		Marina Barbosa	22/05/2018	12/07/2018	-			-	0%	Atrasado		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, mapas e gráficos.	Marina Barbosa/Ludmilla Calado	22/05/2018	11/06/2018	-			-	0%	Atrasado		

2.2	Elaboração do texto	Analisar informações, preparar textos, validar com a equipe e revisar texto final.	Marina Barbosa	12/06/2017	12/07/2018	-			-	0%	Atrasado			
3.	Publicação		Marina Barbosa	13/07/2018	06/08/2018	-			-	0%	A Iniciar			
3.1	Elaboração do briefing	Elaborar <i>briefing</i> e encaminhar para a ASCOM.	Marina Barbosa	13/07/2018	17/07/2018	-			-	0%	A Iniciar			
3.2	Revisão e publicação	Acompanhar editoração, revisar e validar o boletim com a equipe.	Marina Barbosa	18/07/2018	06/08/2018	-			-	0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	25,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2018
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.		
Projeto:	Perfil Produtivo - Agrícola		
Objetivo do projeto:	Elaborar um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste e disponibilizar para publicação em meio digital.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	14/06/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Dados			26/02/2018	10/04/2018	-	26/02/2018	10/04/2018	-	100%	Concluído	
1.1.	Definição dos produtos	Ler documentos e informações, coletar dados (tabelas e textos), identificar ranking de produtividade agrícola, validar com a equipe)	Ludmilla Calado	26/02/2018	06/04/2018		26/02/2018	06/04/2018		100%	Concluído	
1.2.	Tratamento dos dados	Organizar dados coletados e estruturar a base cartográfica	Ludmilla Calado	09/04/2018	10/04/2018	-	09/04/2018	10/04/2018	-	100%	Concluído	
2	Análise			10/04/2018	15/05/2018	-	10/04/2018		-	87%	Atrasado	Servidora participando de capacitação FUNDAJ
2.1.	Elaboração de mapas	Elaborar mapas e análises espaciais, validar com a equipe	Ludmilla Calado	10/04/2018	19/04/2018		10/04/2018	29/06/2018		100%	Concluído	
2.2.	Elaboração de infográfico (se necessário)	Elaborar modelos e layout de infograficos com Ascom	Ludmilla Calado	19/04/2018	30/04/2018		09/05/2018	26/06/2018		100%	Concluído	
2.3.	Elaboração do texto	Analisar todas as informações, elaborar texto, validar com a equipe, realizar as correções, enviar a versão final já revisada para a ASCOM	Ludmilla Calado	19/04/2018	15/05/2018	-	13/06/2018		-	60%	Atrasado	
3	Publicação			15/05/2018	14/06/2018	-			-	0%	Atrasado	
3.1.	Criação de layout de publicação	Elaborar layout com Ascom, validar com a equipe	Ludmilla Calado	15/05/2018	21/05/2018	-			-	0%	Atrasado	
3.2.	Elaboração do briefing	Elaborar briefing e enviar para Ascom	Ludmilla Calado	21/05/2018	25/05/2018	-			-	0%	Atrasado	

3.3	Revisão e publicação	Acompanhar a editoração do Produto pela ASCOM, validar com a equipe, prosseguir com as alterações/correções e enviar a versão final para ASCOM publicar no site	Ludmilla Calado	25/05/2018	14/06/2018	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	62,2%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	-		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	-		
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Necessidade de dar continuidade ao processo de sistematização de informações para subsidiar a regionalização das políticas federais, particularmente em relação ao semiárido.				
Projeto:	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil				
Objetivo do projeto:	Oferecer um diagnóstico inicial sobre as condições de saúde materna e infantil na área de atuação da Sudene com foco no Semiárido. Tal diagnóstico, visa não apenas identificar os principais problemas associados a esses dois grupos populacionais, como também apresentar algumas evidências da literatura sobre os efeitos de um conjunto de políticas públicas realizadas no Brasil com foco na melhoria da população. Notadamente, ao investigar as condições de saúde materna e infantil busca-se compreender melhor a evolução das taxas de mortalidade desses dois grupos populacionais e quais os fatores associados a essas taxas. Em geral, melhorias nos indicadores de saúde desses grupos estão associados a um maior desenvolvimento socioeconômico de uma região e a ganhos de bem estar.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	23/08/2018
Data Atualização:	31/05/2018



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Tássia Germano de Oliveira

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Dados			02/05/2018	27/06/2018		02/05/2018			35%	Em Andamento		
1.1	Identificar os indicadores	Levantar estudos e políticas sobre o tema; ler documentos sobre o tema; definir as questões a serem respondidas; e validar com a equipe da CGEP	Tássia Germano	02/05/2018	20/06/2018	-	02/05/2018		-	70%	Em Andamento	A servidora vem desenvolvendo outros projetos, como o artigo UAB para o IPEA e Estudos Técnicos para o FIES, além de participar do Projeto de Gestão Municipal e do Projeto de Cisternas com a CGDS	
1.2	Tratamento dos dados	Elaborar metadados; coletar e tratar as informações	Tássia Germano	21/06/2018	27/06/2018	-			-	0%	A Iniciar		
2	Análise			28/06/2018	06/08/2018	-			-	0%	A Iniciar		
2.1	Elaboração de tabelas, gráficos e mapas	Elaborar tabelas, gráficos e mapas	Tássia Germano	28/06/2018	09/07/2018	-			-	0%	A Iniciar		
2.2	Elaboração do texto	Analisar todas as informações, elaborar texto, validar com a equipe, realizar as correções, enviar a versão final já revisada para a ASCOM	Tássia Germano	10/07/2018	06/08/2018	-			-	0%	A Iniciar		
3	Publicação			07/08/2018	23/08/2018	-			-	0%	A Iniciar		

3.1	Revisão e publicação	Acompanhar a editoração do TPD pela ASCOM, revisar o TPD editorado, validar com a equipe, prosseguir com as alterações/correções e enviar a versão final do TPD para ASCOM publicar no site	Tássia Germano	07/08/2018	23/08/2018	-			-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	11,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Ludmilla Callado é responsável pelos mapas e Shirley Dantas é responsável pela revisão.
SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO PROJETO FOI TRANSFERIDA PARA A DIRETORIA DE FUNDOS

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos			Número do Projeto:	PO 24 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido			Ano:	2013
Programa do PPA:	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO			Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade equitativa e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	-
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social				
Projeto:	Programa Água para Todos				
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Previsão de Conclusão:	01/05/2018
Data Atualização:	04/09/2017

3º ciclo 2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 17.238.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Termo de Cooperação	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/13	26/09/13		01/09/13	02/09/13		100%	Concluído	
2	Celebração do Termo de Compromisso	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/13	02/10/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído	
3	Abertura e Injeção dos Processos	Abertura e Injeção dos Processos	GTAPT	01/09/13	09/09/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído	
4	Recebimento de documentação - 1ª Parcela	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/13	23/12/13		01/10/13	01/10/13		100%	Concluído	
5	Análise de documentação - 1ª Parcela	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/14	30/01/14		01/11/13	01/12/13		100%	Concluído	
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 1ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/14	30/05/14		01/04/14	01/05/14		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.
7	Empenho da 1ª Parcela	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14		02/04/14	02/05/14		100%	Concluído	Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da 1ª Parcela	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14	R\$ 8.658.000,00	01/04/14	01/05/14	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.
9	Recebimento de documentação - 2ª parcela	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/15	31/07/15		01/03/15	31/07/15		100%	Concluído	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.

10	Análise dos Projetos Básicos	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15			100%	Concluído	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT nº 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP nº 01/2016.
11	Análise do Trabalho Social	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	27/05/16		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas - 1ª Parcela	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	01/02/16		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 2ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/15	03/12/15		01/12/15	02/12/15		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho da 2ª Parcela	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/15	04/12/15		03/12/15	03/12/15		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito. A SUDENE rescindiu 61 TC's.
15	Liberação da 2ª Parcela	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/15	01/05/16	R\$ 34.632.000,00	01/12/15		R\$ 9.360.000,00	60%	Atrasado	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje com os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE, a Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento.	A SUDENE continua com 17 municípios em Restos a Pagar. Infelizmente, a SUDENE não tem prioridade de gestão para com o Programa Água Para Todos. Logo, o quantitativo de recursos humanos alocados na Comissão de Força Tarefa é insuficiente para toda a demanda de trabalho. O que gerou atraso e poderá ocorrer a não liberação da segunda parcela aos entes beneficiários. Tal situação já foi relatada em relatório gerencial de 2015 e atualmente no relatório de 2017.
16	Execução das Obras	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/16	30/09/17		01/02/16			70%	Atrasado	Os municípios que receberam recursos de forma integral (30 municipalidades), em média possuem 70% das obras executadas. Estes municípios tiveram seus TC's prorrogados.	

17	Fiscalização das obras	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/15	30/05/17		10/12/15			64%	Atrasado	A Comissão fiscalizou as obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Porém resta a SUDENE fiscalizar 36% dos recursos financeiros liberados na primeira parcela, e voltar a fiscalizar aqueles que ainda não haviam licitado. Logo, a SUDENE deve fiscalizar um montante de R\$2.262.000,00 em aproximadamente 29 municípios, liberados ainda em 2013. Não há engenheiros suficientes que possa fiscalizar com eficiência todas as municipalidades que receberam recursos financeiros da Autarquia, principalmente o recurso financeiro descentralizado as municipalidades para a primeira parcela ainda no ano de 2013 e 2014.	Existem dezoito municípios, que possuem compromisso vigente e receberam a primeira parcela estão também empenhados, faltando fiscalização da 1ª parcela. A Comissão de Força Tarefa, através do Memorando nº 0050/2016-FT_PAPT/NE informou ao Gabinete da SUDENE e a Diretoria de Planejamento. Acompanhou este menorando os dez roteiros de fiscalização necessários para a ação nas municipalidades que possuem seu compromisso vigente com a Autarquia, ou seja, apenas 47 municípios. Infelizmente, não há previsão para a fiscalização dos recursos liberados em 2013 e 2014, nas outras 64 municipalidades, devido a falta de prioridade de gestão da SUDENE para com o Programa Água Para Todos.
18	Recebimento de documentação - Final	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	31/03/17	01/05/18		01/03/17			10%	Em Andamento	A SUDENE efetuou a liberação total dos recursos financeiros para 30 municipalidades. Destas recebeu-se atualmente 5 prestações de contas final para analise.	
19	Análise da Prestação de Contas final	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		01/03/17			3%	Em Andamento		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		03/04/17			10%	Em Andamento	A Comissão fiscalizou 10% das obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Com a finalidade para o recebimento de oobjeto.	
21	Encerramento do PAPT	Encerramento do PAPT	FTAPT	30/07/17	01/05/18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 43.290.000,00	Valor realizado:		R\$ 17.238.000,00	77%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretária de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.													
Observações:													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	25 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).					
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLISA					
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00		3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)./ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto												
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).												
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.												
Obs15: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO 26 (ex PO 28)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano: 2013	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)				
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	29/06/2017
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para implantação do empreendimento.

29/06/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.959.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.959.000.000,00

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído		
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído		
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído		
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído		
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído		
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

16	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Paralisado	O BB emitiu o certificado em 18/04/2017. Estamos aguardando a conclusão dos trabalhos da Auditoria-Geral para iniciar a análise.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Paralisado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.										
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.										
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.										
Obs.5:	O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.										
Obs.6:	A Auditoria Geral encontrou algumas irregularidades durante os trabalos de auditoria do projeto. A SUDENE questionou a empresa e o agente operador sobre essas situações, já foram tomadas algumas providências, enquanto aguardamos outras respostas.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	27 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)					
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	Atrasado	O BNB emitiu o Certificado em 22/06/2015 por meio do Ofício nº ANEG-2015/013. A Sudene analisou e solicitou a recomendação do documento, em face de adequações no projeto, aprovadas pelo BNB e enviadas por meio do Ofício DIRET/2015/098 de 21/07/2015, objetivando atender recomendações da CGU. As alterações foram aprovadas pela Sudene que agora aguarda a emissão de novo Certificado, o que foi novamente cobrado por meio do Ofício 1528/2017-DFIN/SUDENE de 10/11/2017.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs:1	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	28 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR					
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	42.477.417,63	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	30/11/2017
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/2017	31/05/2017	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	Cancelado	O BNB informou em 10/05/2018 que a empresa desistiu do saldo restante do financiamento.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/05/17	31/05/17	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	50%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	10/05/18	06/11/18		-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	10/05/18	06/11/18		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			10/05/18	06/11/18	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:								
Observações:								
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.							
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.							
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.							
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.							
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.							
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está pro							
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.							
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	29 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.700.000,00	Valor realizado:		59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	30 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	31 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísca I Geração e Comercialização de Energia Ltda					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.439.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.439.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído		
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	496.137,41	10/03/17	20/09/17	496.137,41	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	64.439.000,00	15/05/13	20/09/17	64.439.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 26/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		64.439.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	32 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísca II Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25.2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.864.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.864.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	428.678,72	10/03/17	20/09/17	428.678,72	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	59.864.000,00	15/05/13	20/09/17	59.864.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	00/01/00	00/01/00	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.864.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	33 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.278.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.278.000,00

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	429.090,12	10/03/17	13/09/17	429.090,12	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.278.000,00	15/05/13	13/09/17	55.278.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 05/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.278.000,00	Valor realizado:		55.278.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

2º ciclo 2018



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	34 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.273.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.273.000,00

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	1.056.552,40	10/03/17	13/09/17	1.056.552,40	100,00%	Concluído		

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.273.000,00	15/05/13	13/09/17	55.273.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o Certificado e enviou o Relatório à SUDENE em 18/04/2018. A CODF/CGDF/DFIN está analisando.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		55.273.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

2º ciclo 2018



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	35 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísca V Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27.3 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.455.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.455.000,00	Valor realizado:		64.455.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 33.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGG/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	37 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18					0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	38 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J. Emerson/ A.F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberção, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberção.	
Liberções e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	11/06/18		0,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		19/06/18	-		0,00%	Em Andamento	A CODF/CGDF/DFIN está o Relatório emitido pelo BNB.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	39 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	11/06/18		0,00%	Concluído	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		19/06/18	-		0,00%	Em Andamento	A CODF/CGDF/DFIN está o Relatório emitido pelo BNB.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	0,00	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		40.845.410,40	Valor realizado:		40.845.410,40	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	40 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18.0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		100,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento	

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	29.040.000,00	95,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/02/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		100,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		53.959.000,00	Valor realizado:		53.959.000,00	95,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.								
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	-	-	-	-		Cancelado	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	04/10/17	02/04/18		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.
Encerramento (Banco)			04/10/17	02/04/18	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		96.407.194,96	Valor realizado:		96.407.194,96	77,78%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											

Observações:											

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.
- Obs6: A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projetou passou a ser de R\$ 96.407.194,96.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	43 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2017
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ 3.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	303.000.000,00	19/04/13	-	299.869.740,06	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			303.000.000,00	Valor realizado:		299.869.740,06	72,73%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	44 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)					
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 206.292.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	Paralisado		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	Paralisado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Paralisado		

21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Paralisado		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Paralisado		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Paralisado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		270.582.240,00	Valor realizado:		30.000.000,00	22,73%	Paralisado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.												
Obs 3 O projeto encontra-se em situação de inadimplência financeira, não tendo realizado a amortização da 3ª parcela do financiamento em outubro/2017												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	45 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante		
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Fármacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	31/12/2016
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-		100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00		100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88		100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-		0,00%	Atrasado	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-		0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	60%		Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco										80%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend.	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%		A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	23.855.042,00	Valor realizado:	19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.	
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Deten Química S.A.					
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	28/12/2017
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(él)eis técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 15.808.400,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 31.256.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
11	Fiscalizações	BB	15/05/18	11/11/18		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	15/05/18	11/11/18		-	-		0,00%	Em Andamento	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	

Encerramento (Banco)	15/05/18	11/11/18	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	31.256.000,00	75,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	47 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante		
Problema (causa):						
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.					
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14	-	27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			Valor realizado:			83,33%	Em Andamento	Status do Projeto	
			61.867.350,00			61.867.350,00						

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	48 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):						
Projeto:	Braskem S.A.					
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado. A Sudene solicitou correções no documento.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			Valor realizado:			92,86%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO		49 (ex PO 51)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2014	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):		Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:		DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:		Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):							
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)						
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão:	28/06/2020
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	R\$ 80.542.146,02
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/18	31/01/18	4.731.206,91	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando o envio da Proposta de Liberação por appte da CEF.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/06/18	01/07/18	37.265.523,97	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 8	SUDENE/CEF	01/12/18	31/12/18	38.545.415,14	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 9	SUDENE/CEF	01/12/19	31/12/19	11.529.527,17	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/19	415.582.562,52	21/02/14	-	323.510.889,33	60,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 323.510.889,33	60%	Em Andamento	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs3:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs4:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs3:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	50 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):				
Projeto:	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.			
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Concluído	O BB emitiu o certificado em 18/04/2017. Estamos aguardando a conclusão dos trabalhos da Auditoria-Geral para iniciar a análise.	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Paralisado		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Paralisado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	51 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):				
Projeto:	Suzano Papel e Celulose S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00

Previsão de Conclusão:	30/07/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 260.189.953,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 260.189.953,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	18/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/01/18	260.189.953,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Atrasado		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 260.189.953,00	Valor realizado:		R\$ -	31%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Encontra-se em análise uma solicitação da empresa, já aprovada pelo BB, de incluir novos municípios no projeto originalmente aprovado.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	52 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante		
Problema (causa):					
Projeto:	Brametal S.A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão:	04/04/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 4.095.556,81
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81		100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído			
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 285/2017, de 04/10/2017, alterando algumas normas da emissão do certificado. Os bancos possuem um prazo de 6 meses a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:	R\$ 4.095.556,81	50%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

PLANO DE AÇÃO 2016				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	53 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:		2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):				
Projeto:	Placas do Brasil S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstruídos (MDF)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão:	30/01/2019
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 32.232.625,39
A realizar no exercício	R\$ 130.610.705,34
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 52.000.000,00
Saldo a liberar	R\$ 78.610.705,34
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 84.232.625,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39		100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00		100,00%	Concluído		
6	Liberação 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	-	39.500.000,00		75,00%	Em Andamento	Aguardando a disponibilização financeira do recurso pela STN.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	39.110.705,34	-	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	30/07/18	162.843.330,73	-	-	123.732.625,39	75,00%	Em Andamento			
Competência da SUDENE /Banco									88%	Em Andamento			

12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 162.843.330,73	Valor realizado:	R\$ 123.732.625,39	44%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: O BB enviou à SUDENE o pedido de liberação, mas este foi negado pois foram encontradas falhas.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	54 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2017	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante	
Problema (causa):					
Projeto:	Pedra Cheirosa I Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	21.526.754,88	148.879.173,69
	280	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/09/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 21.526.754,88
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 21.526.754,88
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	0,00%	Cancelado	A empresa formalizou a desistência do financiamento por meio de Carta sem número, datada de 20/04/2018, enviada pelo BNB em 27/04/2018.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	09/08/17	08/09/17	9.155.604,44	-	-	-	0,00%	Cancelado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	2.408.536,96	-	-	-	0,00%	Cancelado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	5.512.912,37	-	-	-	0,00%	Cancelado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.612.903,16	-	-	-	0,00%	Cancelado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	788.899,30	-	-	-	0,00%	Cancelado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	675.437,49	-	-	-	0,00%	Cancelado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	899.694,43	-	-	-	0,00%	Cancelado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	472.766,73	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	21.526.754,88	-	-	0,00	0,00%	Cancelado		
Competência da SUDENE /Banco									50%	Cancelado		

12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 21.526.754,88	Valor realizado:		R\$ -	25%	Cancelado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Devido a alterações implantadas pelo CMN nos encargos financeiros do FDNE a partir de 2018 o BNB sinalizou com a possibilidade de reanalisar o projeto												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

PLANO DE AÇÃO 2018				Número do Projeto: PO 55 (ex PO 57)	
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Ano: 2017	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Antonio Roberto Leite Cavalcante
Diretor:	Sergio Wanderley Silva				
Problema (causa):					
Projeto:	Pedra Cheirosa II Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	17.526.603,45	136.472.576,24
	144	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/09/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Antonio Roberto Leite Cavalcante

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 17.526.603,45
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 17.526.603,45
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-	100,00%	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-	100,00%	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-	100,00%	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado	A empresa formalizou a desistência do financiamento por meio de Carta sem número, datada de 20/04/2018, enviada pelo BNB em 27/04/2018.	
1	Liberação 1	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	8.129.804,65	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
5	Liberação 2	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	113.892,12	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
6	Liberação 3	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	1.902.234,82	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
7	Liberação 4	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	4.032.350,45	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
8	Liberação 5	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.217.507,54	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
9	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	620.373,25	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
10	Liberação 7	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	495.565,26	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
11	Liberação 8	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	618.539,92	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
12	Liberação 9	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	396.335,44	-	-	-	0,00%	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	17.526.603,45	-	-	0,00	0,00%	0,00%	Cancelado		
Competência da SUDENE /Banco										50%	Cancelado		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$	17.526.603,45	Valor realizado:	R\$	-	25%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.													
Obs2: Devido a alterações implantadas pelo CMN nos encargos financeiros do FDNE a partir de 2018 o BNB sinalizou com a possibilidade de reanalisar o projeto													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 56 (Ex PO 58)
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de orientações padronizadas e atualizadas para celebração de convênios.		
Projeto:	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)		
Objetivo do projeto:	Padronizar e formalizar os procedimentos para a celebração de Convênios (Checklist)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	02/04/2018 (prazo reajustado)
Data Atualização:	04/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião Prévia 1 (nivelamento conceitual)	Reunião de compartilhamento de conhecimento entre os servidores que fizeram o curso do SICONV	DPLAN	07/04/2017	07/04/2017		07/04/2017	07/04/2017		100%	Concluído		
2	Formatação de curso de capacitação sobre convênios	Reunião para discussão de formatação de capacitação para convênios.	Carmen-CGGI / DPLAN	10/04/2017	10/04/2017		10/04/2017	10/04/2017		100%	Concluído		
3	Exploração de questões legais atuais e impactos na reformulação das regras adotadas pela SUDENE	Reunião com a PRD sobre adequação de procedimentos internos para convênios e TED	Carmen-CGGI/DPLAN/PRD	18/04/2017	18/04/2017		18/04/2017	18/04/2017		100%	Concluído		
4	Pesquisa e estudo da legislação atual	Estudo e pesquisas da nova legislação para fins de atualização dos procedimentos para convênios e TED	Carmen-CGGI	09/06/2017	10/08/2017		09/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
5	Elaboração de minuta preliminar de Checklist (lista de verificação)	Elaboração da primeira minuta da lista de verificação (checklist) para convênios (balizamento das discussões preliminares)	Carmen-Carmen-CGGI	12/06/2017	10/08/2017		12/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
6	Análise de consistência e coleta de sugestões para a proposta de lista de verificação pelas áreas técnicas	Análise e coleta de sugestões para a primeira minuta da lista de verificação, com a participação da DPLAN, e elaboração da primeira minuta.	Carmen-CGGI	23/08/2017	13/09/2017		23/08/2017	13/09/2017		100%	Concluído		
7	Elaboração da proposta de Resolução da DC que regulamentará os novos procedimentos para convênios	Atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013 que trata dos procedimentos para fiscalização e acompanhamento, e prestação de contas de convênios.	Carmen-CGGI	14/09/2017	28/09/2017		14/09/2017	06/02/2018		100%	Concluído	Demanda da atualização sugerida na reunião para discussão de propostas para o check-list.	

8	Tratativas com a CCONT/DAD	Apresentação da lista de verificações à CCONT/DAD, para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	20/09/2013	20/09/2017		20/09/2013	20/09/2017		100%	Concluído		
9	Tratativas com a CGAF/DAD	Apresentação à CGAF/COCF/DAD para análise da lista de verificação e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
10	Envio de check list, às áreas envolvidas	Minuta atualizada da lista de verificação (checklist)	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
11	Tratativas com a PRD	Apresentação da lista de verificação à PRD para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
12	Discussão com a AUD	Apresentação da lista de verificação à AUD para análise e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
13	Envio da minuta de Resolução às áreas envolvidas	Minuta atualizada da Resolução a ser submetida às áreas envolvidas no processo de trabalho.	Carmen-CGGI	29/09/2017	29/09/2017		29/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído		
14	Reunião para apresentação dos resultados, ajustes finais	Fechamento da Lista de verificação e da resolução que substituirá a portaria nº69/2013, e reunião com as unidades finalísticas da DPLAN, bem como a CCONT e a CGAF/DAD	Carmen-CGGI	06/10/2010	06/10/2010		06/10/2010	06/10/2010		100%	Concluído	Sala, data e horário a confirmar.	
15	Análise pela Procuradoria da SUDENE	Envio das minutas para a análise da Procuradoria da Sudene (RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Coordenador-Geral CGGI	09/10/2017	23/10/2017		20/10/2017	27/11/2017		100%	Concluído	Passou mais de um mês para a análise ser concluída pela Procuradoria	
16	Reuniões de discussão do fluxograma simplificado de convênios	atualização do fluxograma vigente (2013)	Carmen-CGGI	29/11/2017	30/11/2017		29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído	Nessa reunião, foi solicitado ajustes (inclusão de todas as fases do processo de transferência voluntária por meio de convênios) e o envio à Dplan para verificação e sugestão	
17	Resolução ajustada	Inclusão de novos artigos que contemple as fases iniciais do trabalho de convênios	Carmen-CGGI	29/11/2017	04/12/2017		29/11/2017	04/12/2017		100%	Concluído		
18	envio à DPLAN da minuta de Resolução	Envio das minutas para a (re)análise da DPLAN RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Carmen-CGGI	04/12/2017	06/12/2017		04/12/2017	06/12/2017		100%	Concluído		
19	Conclusão do fluxograma	Fluxograma atualizado após sugestões nas reuniões.	Carmen-CGGI	01/12/2017	05/12/2017		01/12/2017	05/12/2017		100%	Concluído		
20	Reanálise pela Procuradoria da SUDENE	Envio da minuta de Resolução com os novos ajustes, em função da solicitação da área técnica (DPLAN)	Coordenador-Geral CGGI	07/12/2017	15/12/2017		07/12/2017	29/01/2018		100%	Concluído	Tempo de duração da análise pela Procuradoria, atrasou a conclusão.	

21	Reunião de Apresentação prévia	Apresentação aos Diretores, da proposta de Checklist e minuta de Resolução para fins de conhecimento e aperfeiçoamento..	Coordenador-Geral CGGI	13/12/2017	14/12/2017		22/02/2018	22/02/2018		100%	Concluído	O título da etapa foi modificado em relação ao PO anterior. Em função do não cumprimento , por parte da DPLAN, da leitura e ajustes na minuta de Resolução no decorrer do processo de discussão, será ela NOVAMENTE ajustada, resultando em adiamento na conclusão.	A reunião teve o seu objetivo alterado, passando a apresentação para fins conclusivos do trabalho, a uma apresentação para fins de coleta de novos subsídios, contrariando expectativas.
22	Ajustes na minuta	Novos ajustes na minuta de Resolução em função das observações resultantes da reunião do dia 22/2/2018	Carmen - CGGI	26/02/2018	28/02/2018		26/02/2018	07/03/2018		100%	Concluído		
23	Envio às áreas interessadas	Novo envio às áreas de Convênio e área técnica da Deplan para ajustes, conforme combinado na reunião do dia 22/02/2018	Carmen - CGGI	28/02/2018	02/03/2018		07/03/2018	07/03/2018		100%	Concluído		
24	Reunião com as áreas interessadas	Reunião com as áreas de Convênio e área técnica da DPLAN para ajustes finais	Carmen	07/03/2018	07/03/2018		12/03/2018	12/03/2018		100%	Concluído		
25	Ajustes finais e envio à Procuradoria	Ajuste final da minuta em função dos resultados das reuniões e novo envio à Procuradoria	Carmen	08/03/2018	23/03/2018		13/03/2018	13/03/2018		100%	Concluído	O processo retorno da Procuradoria em 06/04/2018 com várias recomendações.	Recomendações atendidas
26	Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.	Ajuste final da minuta em função dos resultados das observações da Procuradoria e envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.	Carmen	26/03/2018	27/03/2018		26/04/2018	26/04/2018		100%	Concluído		Foi encaminhada uma minuta de Resolução e quatro anexos, que inclui formulários para parecer financeiro, técnico, relatório de acompanhamento do convênio, check-list e fluxo.
27	Aprovação	Aprovação formal em reunião da DC da Resolução e anexos do Checklist, fluxograma na Reunião da Diretoria Colegiada	Coordenador-Geral CGGI	02/04/2018	02/04/2018		26/04/2018			10%	Atrasado	Publicização da Resolução no site da SUDENE e no Boletim Interno de Pessoal. A CGU/PE deu prazo até 02/04/2018 para conclusão desse processo.	
28	Capacitação	Capacitação promovida pela CGGI, com o apoio da CGGP, junto às unidades que integram o fluxo operacional, para absorção e aplicação dos novos procedimentos.	Coordenador-Geral CGGI	09/04/2018	09/04/2018					0%	Atrasado	(CGGI, CGGP/DAD, CCONT/DAD e DPLAN)	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	93,2%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

CGEP, CGAF/COCF, CGDS, CCONT

Observações:

1-A documentação foi encaminhada à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação, em 26/04/2018, e encontra-se aguardando decisão dos Diretores para entrada em pauta.

2-A Resolução visa a atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013, e está baseada na portaria interministerial 424/2016.

2º Ciclo 2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57 (ex PO 60)
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de normas de mitigação de riscos e de padronização nos principais processos da SUDENE.		
Projeto:	Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos.		
Objetivo do projeto:	Instituir Comitê de Governança, Gestão e risco e Controle em cumprimento ao estabelecido pela Portaria Conjunta MDG-CGU nº 01, de 10/05/2016 e Decreto nº 9.203, de 20/11/2017.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/05/2018
Data Atualização:	16/04/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Francisco Barreiros e Leonardo Galindo

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Sensibilização sobre governança, gestão de riscos e controles internos.	Curso sob governança, gestão de riscos e controles internos, promovido pela SUDENE com o apoio da CGU/PE.	AUD Sudene	22/05/2017	23/05/2017		22/05/2017	23/05/2017		100%	Concluído	Nivelamento conceitual. O curso foi estendido a todo o quadro e realizado no auditório da UFRPE dias 22 e 23/05/2017.	
2	Definição da unidade, grupo de trabalho ou Comissão que dará suporte técnico ao processo de governança, gestão de riscos e controles internos	Constituição do processo de governança da gestão de risco e dos controles internos.	AUD e Diretoria Colegiada	24/05/2017	30/06/2017		-	-		0%	Cancelado	A Diretoria Colegiada ainda não oficializou essa responsabilidade. A CGGI vem voluntariamente conduzido a organização do Comitê e seus desdobramentos, apesar de não haver designação oficial. O regulamento do Comitê de Gestão de Riscos da SUDENE prevê que essa decisão se dará pelo referido colegiado.	O processo é constituído de sensibilização interna, instalação de Comitê de Gestão de Riscos, criação do regimento de funcionamento do Comitê, criação da Política de Gestão de Riscos e do Plano de Gestão de Risco.
3	Estudo e pesquisa da legislação que rege os procedimentos do Governo Federal para governança, gestão de riscos e controles internos	Estudo e pesquisas da legislação básica: (Portaria conjunta CGU/MDG nº 01/2016, do Decreto nº 9.203/2017, Portaria MI nº 79, de 23/02/2017) e de exemplos implantados em outros órgãos.	CGGI	01/12/2017	02/12/2017		01/12/2017	04/12/2017		100%	Concluído	A CGGI, por força de compromisso e motivações institucionais, tomou a iniciativa de preparar proposta como forma de oferecer segurança à instituição perante os órgãos de controle. Foram estudados os modelos do MI, da UFSC, do MMA, da UFRPE, da COPEL Paraná, do MEC, do MI e do IBT.	
4	Envio da minuta para apreciação jurídica da PRD junto à SUDENE	Apreciação jurídica dos aspectos legais	PRD	05/12/2017	20/12/2017		05/12/2017	11/01/2018		100%	Concluído	A PRD por meio do Parecer nº 05/2018/PF-SUDENE/PGF/AGU, de 10/01/2018 sugeriu que a CGGI ouvisse formalmente, a Auditoria interna.	

5	Análise da proposta pela AUD-SUDENE para posicionamento sobre papéis no Comitê.	Emissão de parecer para possíveis ajustes	AUD	21/12/2017	29/12/2017		11/01/2018	21/02/2018		100%	Concluído	O processo 59335. 000395/2017-97 foi encaminhado pela CGGI em 11/01/2018 . Envio sugerido pela PRD para complementar instrução processual haja vista o papel da AUD no Comitê. Proesso devolvido pela AUD em 21/02/2018.	
6	Reenvio à Procuradoria para nova análise dos ajustes após inserções das propostas da PRD e da Auditoria interna.	Essa etapa objetiva conferir tranquilidade à Diretoria Colegiada.	CGGI	15/01/2018	02/02/2018		21/02/2018	23/02/2018		100%	Concluído	Em 23/02/2018 a PRD emitiu a Nota nº 01/2018/PF-SUDENE/PGF/AGU aprovando a proposta de resolução e habilitando-a à submissão à Diretoria Colegiada da SUDENE para apreciação e deliberação.	
7	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada da SUDENE para apreciação e deliberação.	Cumprimento de comepência prevista no art. 6º do Decreto nº 8.276/14 que instituiu regulamentação para a estrutura regimental.	CGGI	07/02/2018	22/05/2018		09/03/2018	09/03/2018		100%	Concluído	Em realidade, a temática (doutrina, objetivos e medidas necessárias) já havia sido discutida em 2 momentos: o primeiro, no curso promovido pela SUDENE entre 22 e 23/05/17 na UFRPE pelo instrutor Paulo Graziotin (Ministério da Transparência e CGU) para todos os técnicos e gestores, e no segundo, em exposição realizada pela CGU (Auditor Isvaldo Silveira) no auditório do 15º andar do edf. sede, dias 07 e 08/12/17 para gestores da Autarquia.	
8	Apresentação da Resolução da Diretoria Colegiada aos gestores das unidades técnicas para conhecimento das competências do CGRC e ajustes institucionais subsequentes sobre a estrutura da SUDENE.	Divulgação	Superintendente	15/03/2018	22/05/2018		11/04/2018	11/04/2018		100%	Concluído	A proposta foi aprovada por meio da Resolução nº 293, de 11/04/2018, da Diretoria Colegiada. Foi encaminhada em 12/04/2018 à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas para publicação em Boletim Interno e publicada na Seção 1, do DOU de 13/04/2018. Foi encaminhada à ASCOM em 16/04/2018 para inserção na página eletrônica "Institucional", em tópico intitulado "Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (normativos internos)", para publicação de atos correlatos.	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
AUD e membros da Diretoria Colegiada													
Observações:													
1-O Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos é uma instância colegiada deliberativa, constituída pelo Superintendente, todos os Diretores, a AUD e o Gabinete para tratar de questões relacionadas com a melhoria da eficácia e efetividade em um cenário de segurança técnica e administrativa segundo o modelo COSO de responsabilidades.													
2- O art. 14 do Decreto nº 9.203, de 22 denovembro de 2017, (DOU de 23/11/2017) estabeleceu o prazo de 180 dias contados da data de entrada em vigor do Decreto, para que as instituições do Governo Federal implantem seus Comitês internos de governança ou atribuam as competências a colegiado já existente. Esse prazo, na prática, vence em 22/05/2018.													
2º Ciclo 2018													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 58
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2018
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de normas para o funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos aprovado pela Resolução nº 293, de 11/04/2018, da Diretoria Colegiada da SUDENE.		
Projeto:	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).		
Objetivo do projeto:	Instituir, em cumprimento ao art. 7º da Resolução nº 293/2018, as regras para o funcionamento (operacionalidade) do Comitê de Governança, Gestão de risco e Controle da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	09/07/2018
Data Atualização:	04/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Francisco Barreiros e Leonardo Galindo (CGGI)

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento bibliográfico para a elaboração da proposta de funcionamento do CGRC da SUDENE	Pesquisa de modelos e cotejamento com o estabelecido pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016 e pelo Decreto nº 9.203/2017	Leonardo Galindo (CGGI)	02/01/2018	21/02/2018		02/01/2018	21/02/2018		100%	Concluído	A demora na tramitação se deveu à espera da tramitação da proposta de criação do CGRC da SUDENE e da ouvida de sugestões junto à Auditoria interna.	
2	Elaboração da proposta de Regimento Interno do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles internos	Documento de referência que define o funcionamento do Comitê, seus objetivos, competências de cada instância integrante, organização das reuniões etc.	Leonardo Galindo e Manoel Barreiros (CGGI)	16/01/2018	15/03/2018		19/02/2018	06/04/2018		100%	Concluído		
3	Encaminhamento da proposta de regimento à Procuradoria Jurídica junto à SUDENE e análise.	Análise dos aspectos jurídicos da proposta, condição para submissão à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação, e operacionalidade do CGRC.	PRD	16/04/2018	02/05/2018		16/04/2018	10/05/2018		100%	Concluído	A demora entre as etapas 2 e 3 decorreu de reuniões para organização e realização da 23ª reunião do CONDEL que aconteceu em Brasília, no Palácio do Planalto, em 04/04/2016.	Possíveis ajustes serão aplicados à proposta após a análise pela PRD e dependendo da complexidade, devolução à PRD para nova análise.
4	Apreciação e deliberação da proposta do regimento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	Condição para a operacionalidade do CGRC	CGRC	09/05/2018	09/05/2018		11/05/2018			10%	Atrasado	Inicialmente, a proposta estava para ser aprovada pelo Comitê de Gestão de Riscos, mas a PRD recomendou que fosse pela Diretoria Colegiada. A proposta foi enviada à Diretoria Colegiada em 11/05 para apreciação e deliberação e pedido reiterado em 14/05/2018.	
5	Publicização do regimento interno do CGRC pela ASCOM no site da SUDENE	Divulgação no site da SUDENE	ASCOM	10/05/2018	10/05/2018					0%	Atrasado		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	62,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
AUD, CGGI, Gabinete, CGTI/DAD, CGGP/DAD e membros da Diretoria Colegiada
Observações:
1-O art. 7º da Resolução nº 293/2018 prevê que num prazo de 90 dias a contar da data de publicação no DOU seja a proposta de regimento submetida ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da SUDENE.
A Procuradoria Jurídica da SUDENE, por meio da Nota nº 02/2018/PF-SUDENE/PGF/AGU, de 10/05/2018, recomendou o seu envio à Diretoria Colegiada ao invés do Comitê, para apreciação e deliberação.
2º Ciclo 2018

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 61)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Premanente de Convênios e TCE		
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	William Augustos de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo n.º 59335.000519/2013-81 (SIAFI n.º 789013), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (CCONT)	05/02/2018	20/02/2018	ñ se aplica	05/02/2018	05/03/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
2	Processo n.º 59335.000533-2014-66 (SIAFI n.º 813665), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (CCONT)	22/02/2018	09/03/2018	ñ se aplica	22/02/2018	08/03/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo n.º 59335.000230/2016-13 (SIAFI n.º 836220), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	20/03/2018	04/04/2018	ñ se aplica	20/03/2018	26/03/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo n.º 59335.000063/2016-01 (SIAFI n.º 827250), Análise Financeira	Clovis Emidio (CCONT)	20/03/2018	04/04/2018	ñ se aplica	20/03/2018	19/03/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo n.º 59335.000201/2016-43 (SIAFI n.º 836181), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	21/03/2018	05/04/2018	ñ se aplica	21/03/2018	03/04/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo n.º 59335.000543/2014-00 (SIAFI n.º 813986), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	19/03/2018	03/04/2018	ñ se aplica	19/03/2018	20/03/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
7	Processo n.º 59335.000058/2016-90 (SIAFI n.º 828299), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	06/04/2018	21/04/2018	ñ se aplica	06/04/2018	19/04/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo n.º 59335.000072/2016-93 (SIAFI n.º 828295), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (CCONT)	10/05/2018	25/05/2018	ñ se aplica	10/05/2018	24/05/2018	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo n.º 59335.000206/2016-76 (SIAFI n.º 839953), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	10/05/2018	25/05/2018	ñ se aplica	10/05/2018	04/06/2018	ñ se aplica	80%	Em Andamento		
10	Processo n.º 59335.000519/2013-81 (SIAFI n.º 789013), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	22/05/2018	06/06/2018	ñ se aplica	22/05/2018		ñ se aplica	0%	Paralisado	Servidor teve de interromper os trabalhos no processo em tela por conta de participação em comissão do PROCONDEL	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	88%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
2º ciclo 2018 - Jan/2018 a Mai/2018	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 60 (ex PO 62)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE	
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza	
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/08/2018	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tce teve de ser reagendada pois é necessário emitir nova análise financeira	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
2	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	31/08/2018	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Em Andamento	TCE foi reagendada pois potencial responsável solicitou mais prazo	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
3	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88, Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 59313.000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	31/08/2018	N/A	24/03/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
4	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 03055000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2018 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	31/08/2018	N/A	03/04/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
5	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	31/08/2018	N/A	18/08/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
2º ciclo 2018 - Jan/2018 a Mai/2018	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 61 (ex PO 64)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Aluízio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Avaliação de Competências		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		47.650,00

Previsão de Conclusão:	28/02/2019
Data Atualização:	22/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin, Marina Braga e Andriene Santos

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.650,00
A realizar no exercício	R\$ 39.373,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 39.373,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Estudos sobre avaliação de desempenho por competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	28/12/18	R\$ 14.373,00	01/06/17		R\$ 7.650,00	50%	Em Andamento	Participação no 20º CRIARH - Criatividade e Gestão com Pessoas. Cursos a realizar: Capacitação específica da DIDAS e no Grupo de trabalho a ser formado.	Datas repactuadas
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17	R\$ -	08/06/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para estudos e elaboração de instrumento de avaliação a serem utilizados em projeto Piloto na Sudene - Capacitação de Grupo de Estudo	CGGP	02/07/18	31/07/18	R\$ 25.000,00				0%	A Iniciar	Data repactuada	
4	Formação do Grupo de Trabalho, Capacitação e estudos para implementação do Projeto Piloto	Formação de Grupo de Trabalho a ser capacitado no tema Avaliação de desempenho por competências para socialização e discussão do tema e implementação do Projeto Piloto.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/08/18	28/12/18	R\$ -				0%	A Iniciar	Data repactuada	
5	Implementação Piloto dos instrumentos de avaliação e Monitoramento	Acompanhamento e monitoramento dos processos de avaliação de, no mínimo, 05 cursos.	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	01/11/18	28/12/18	R\$ -				0%	A Iniciar		
6	Análise dos instrumentos de avaliação	Análise dos instrumentos de avaliação dos cursos para subsidiar novo Projeto de Avaliação por Competências	CGGP e Unidades Administrativas e Facilitadores	07/01/19	28/02/19	R\$ -				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 39.373,00	Valor realizado:		R\$ 7.650,00	25%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
CENTRESAF/PE - Escola de Administração Fazendária
Observações:
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO 20º CRIARH EM SETEMBRO/2017 - ETAPA 1

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 65)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de elaborar proposta para a Política de Gestão de Pessoas		
Projeto:	Política de Gestão de Pessoas		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar proposta para implantação da Política de Gestão de Pessoas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 57.000,00

Previsão de Conclusão:	31/05/2019
Data Atualização:	22/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 57.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação CGGP	Capacitação da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - noções iniciais de Políticas de Gestão de Pessoas	CGGP	05/03/2018	31/08/2018	R\$ 7.000,00	01/06/2018			30%	Em Andamento	Datas repactuadas, treinamento remarcado para agosto/2018	
2	Elaboração do Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador e capacitações	CGGP	05/03/2018	30/03/2018	R\$ -				100%	Concluído		
3	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Contratação de empresa/facilitadores para estudos e elaboração da Política de Gestão de Pessoas	CGGP	02/07/2018	31/07/2018	R\$ 25.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas.	
4	Reuniões de orientação	Reuniões com Facilitador e Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas para capacitação sobre Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018					0%	A Iniciar	Datas repactuadas.	
5	Levantamento e análise institucional	Levantamento e análise institucional dos principais documentos para subsidiar a Política de Gestão de Pessoas e suas perspectivas para a Sudene	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	

6	Realização de Oficinas com gestores do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	Capacitação do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas sobre o tema Política de Gestão de Pessoas	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e facilitadores	04/08/2018	31/12/2018	R\$ 25.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	
7	Elaboração de proposta da Política de Gestão de Pessoas	Elaboração de documento preliminar da Política de Gestão de Pessoas	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	01/10/2018	31/12/2018					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	
8	Apresentação da proposta da Política de Gestão de Pessoas	Apresentação da Proposta Preliminar da Política de Gestão de Pessoas para apreciação / Revisão / Alterações à Diretoria Colegiada	Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas	02/01/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	
9	Aprovação da Política de Gestão de Pessoas	Apreciação Final da Política de Gestão de Pessoas	Diretoria Colegiada, Superintendência	04/02/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	
10	Publicação da Política de Gestão de Pessoas	Publicação e disponibilização da Política de Gestão de Pessoas	CGGP e ASCOM	01/03/2019	31/05/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene	
				Valor Previsto:		R\$ 57.000,00	Valor realizado:		R\$ -	13,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
CENTRESAF													
Observações:													
Correção das numerações das etapas e da fórmula de percentual. Datas repactuadas e alteração na descrição das atividades/etapas, considerando a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico da Sudene. Foi identificada a necessidade de revisão dos valores inicialmente planejamos para contratação de empresa/especialista no assunto.													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

2º ciclo 2018



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 63 (ex PO 66)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes		
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 60.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2019
Data Atualização:	22/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 60.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 20.000,00	01/03/2018		9.414.51	40%	Em Andamento		
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Definição, objetivos e etapas do Planejamento do dimensionamento da Força de Trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	30/09/2018					0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas.	
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos, elaboração de relatórios qualitativos, estudos de dimensionamento	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	31/12/2018	R\$ 20.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Necessidade de recursos para contratação de especialista no assunto.	
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	31/01/2019	R\$ 20.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas. Necessidade de recursos para contratação de especialista no assunto.	

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/02/2019	31/03/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas.		
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	01/04/2019	31/12/2019					0%	A Iniciar	Datas repactuadas, em virtude da primeira capacitação ter ocorrido em 23/05/2018, impactando no cronograma das demais etapas. Com base na capacitação recebida, realinhamento da descrição das atividades/etapas.		
				Valor Previsto:		R\$	60.000,00	Valor realizado:		R\$	-	8,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Com base na capacitação recebida, foi identificada a necessidade de revisão dos valores inicialmente planejados para contratação de especialista no assunto, tendo em vista a relevância do tema para o desenvolvimento estratégico na Sudene.													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira Exercício 2018 (Posição até 30/06/2018)

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2018 - POSIÇÃO ATÉ 30/06/2018

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2018 + CRÉDITOS (a)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (b)	ORÇAMENTO CANCELADO PELA SOF (c)	ORÇAMENTO BLOQUEADO PELA SOF (d)	ORÇAMENTO ATUALIZADO e = (a + b + c + d)	AUTORIZAÇÃO GERAL DO MI P/ EMPENHO (f)	AUTORIZAÇÃO P EMPENHO DISP NO SIAFI (g)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (h)	VALOR PAGO (i)	SALDO A RECEBER P AUTORIZAÇÃO P EMPENHO j = (f - g)	SALDO AUTORIZAÇÃO DISP P EMPENHO k = (g - h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL P EMPENHO l = (e - h)
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO						18.468.579,00	8.909.758,42	8.909.758,42	4.475.695,08	9.558.820,58	0,00	
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	18.579.632,00	0,00	-460.896,00	-6.513.174,00	11.605.562,00		7.404.745,86	7.404.745,86	3.421.003,62		0,00	4.200.816,14
1.1) Administração (Custeio Administrativo) - 2000.0001 - PO 0002 (PTRES - 100362)	18.039.632,00	0,00	-460.896,00	-6.513.174,00	11.065.562,00		7.256.219,39	7.256.219,39	3.326.377,30		0,00	3.809.342,61
1.2) Capacitação de Servidores - 2000.0001 - PO 0001 (PTRES - 093269)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		85.409,60	85.409,60	31.509,45		0,00	314.590,40
1.3) Ajuda de Custo e Auxílio Moradia - 216H.0020 (PTRES - 117323)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		63.116,87	63.116,87	63.116,87		0,00	76.883,13
2) AÇÕES FINALÍSTICAS - RP 2	30.813.075,00	0,00	-6.641.768,00	-17.845.899,00	6.325.408,00		1.505.012,56	1.505.012,56	1.054.691,46		0,00	4.820.395,44
2.1) Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional - 20WQ.0020	5.645.450,00	-411.501,00	-328.089,00	-1.290.483,00	3.615.377,00		1.290.376,40	1.290.376,40	840.376,40		0,00	2.325.000,60
2.1.1) Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional - PO 0004 (PTRES - 093272)	2.400.000,00	735.899,00	-95.522,00	0,00	3.040.377,00		1.290.376,40	1.290.376,40	840.376,40		0,00	1.750.000,60
2.1.2) Revitalização e Manutenção do Sistema Nacional de Informações - PO 0006 (PTRES - 110364)	1.500.000,00	-63.582,00	-145.935,00	-1.290.483,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.3) Fortalecimento das Políticas de Desenvolvimento - PO 0005 (PTRES 093273)	800.000,00	-722.168,00	-77.832,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.4) Elaboração de Estudos Setoriais - PO 0007 (PTRES 139632)	945.450,00	-361.650,00	-8.800,00	0,00	575.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	575.000,00
2.2) Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S.0001 (PTRES - 110363)	20.565.557,00	199.401,00	-6.094.877,00	-14.470.680,00	199.401,00		0,00	0,00	0,00		0,00	199.401,00
2.3) Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640.0020 (PTRES - 093266)	1.418.175,00	0,00	-137.975,00	-1.280.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4) Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340.0020 (PTRES - 093267)	707.426,00	212.100,00	0,00	0,00	919.526,00		0,00	0,00	0,00		0,00	919.526,00
2.5) Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - 8902.0020 (PTRES - 093268)	876.467,00	0,00	0,00	0,00	876.467,00		0,00	0,00	0,00		0,00	876.467,00
2.6) Fortalecimento das Administrações Locais - 8917.0020 (PTRES - 093265)	1.600.000,00	0,00	-80.827,00	-804.536,00	714.637,00		214.636,16	214.636,16	214.315,06		0,00	500.000,84
SUB-TOTAL	49.392.707,00		-7.102.664,00	-24.359.073,00	17.930.970,00		0,00	8.909.758,42	4.475.695,08		0,00	9.021.211,58
AUTORIZAÇÃO DO MI PARA EMPENHO	0,00					19.682.270,00	40.382.270,00	25.049.071,73	0,00	-20.700.000,00	15.333.198,27	
3) EMENDAS PARLAMENTARES	42.412.270,00		0,00	-730.000,00	41.682.270,00		40.382.270,00	25.049.071,73	0,00		15.300.000,00	16.633.198,27
3.1) Emendas Individuais - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável	19.412.270,00		0,00	-730.000,00	18.682.270,00	17.382.270,00	17.382.270,00	17.349.071,73	0,00		0,00	1.333.198,27
3.1.1) No Município de Baía da Traição/PB - André Amaral - 7K66.1360 (PTRES - 146865) - Apoio a Proj Desenv Sustentável - RP 6	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2) 7K66.0024 - No Estado do RN - 7K66.0024 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	4.940.000,00		0,00	-380.000,00	4.560.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00		0,00	500.000,00
3.1.2.1) Antonio Jacome (PTRES - 146858)	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2.2) Rafael Mota (PTRES - 146863)	260.000,00		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2.3) Zenaide Maia (PTRES - 146864)	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2.4) Rogério Marinho (PTRES - 146855)	1.680.000,00		0,00	-380.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00				500.000,00
3.1.3) No Estado da BA - 7K66.0029 - Apoio a Proj de Desenv Sustentável - RP 6	13.322.270,00		0,00	-350.000,00	12.972.270,00	12.972.270,00	12.972.270,00	12.939.071,73	0,00		0,00	33.198,27
3.1.3.1) José Carlos Aleluia (PTRES - 146853)	1.086.135,00		0,00	0,00	1.086.135,00	1.086.135,00	1.086.135,00	1.086.135,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3.2) Afonso Florence (PTRES - 146856)	836.135,00		0,00	0,00	836.135,00	836.135,00	836.135,00	802.936,73	0,00		0,00	33.198,27
3.1.3.3) Bebeto (PTRES - 146857)	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3.4) Elmar Nascimento (PTRES - 146859)	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3.5) Paulo Magalhães (PTRES - 146860)	400.000,00		0,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3.6) João Gualberto (PTRES - 146861)	3.000.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.3.7) Paulo Azi (PTRES - 146862)	4.000.000,00		0,00	-250.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.4) No Município de Cachoeirinha/PE - Silvio Costa - 8902.1596 - Promoção Invest Infraestrutura - RP 6 (146854)	800.000,00		0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00				800.000,00
3.2) Emendas - RP 2	23.000.000,00		0,00	0,00	23.000.000,00	2.300.000,00	23.000.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
3.2.1) Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável - Nacional -7K66.0001 (PTRES - 146852)	23.000.000,00		0,00	0,00	23.000.000,00	2.300.000,00	23.000.000,00	7.700.000,00	0,00		15.300.000,00	15.300.000,00
TOTAL	91.804.977,00		-7.102.664,00	-25.089.073,00	59.613.240,00	38.150.849,00	49.292.028,42	33.958.830,15	4.475.695,08		15.300.000,00	25.654.409,85

PO = Plano Orçamentário

OBS:

1) foi aberto crédito suplementar na ação 7K66.0001 no valor de R\$ 3.000.000,00

ANEXO III –

Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
2	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
3	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
4	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
5	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
6	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
7	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
8	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
9	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
10	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
12	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
13	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
14	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
15	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
16	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
17	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
18	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
19	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
20	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
21	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
22	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Falsa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
23	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
24	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
25	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
26	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
27	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
28	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
29	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
30	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
31	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
32	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
33	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%
34	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
35	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
36	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
37	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
38	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
39	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
40	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 84.232.625,39	52%
41	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
42	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
		Total do Objetivo 1.1						8.375.226.462,61	6.845.435.020,34	82%
43	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
44	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
45	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2008 - Diferenças Regionais	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
46	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Projeto piloto de base de dados de educação (analfabetismo), referente ao inciso VIII, estabelecido no Art. 15, Seção IV do Decreto 8.276, de 27/06/2014.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
47	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
48	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre PIB e PIB percapita, referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
51	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
52	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
		Total do Objetivo 1.4						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
		TOTAL DA DIRETRIZ 1						8.375.226.462,61	6.845.435.020,34	82%
53	24	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
		Total do Objetivo 2.2						43.290.000,00	17.238.000,00	40%
54	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
55	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
		Total do Objetivo 2.3						989.482,50	724.241,25	73%
		TOTAL DA DIRETRIZ 2						44.279.482,50	17.962.241,25	41%
56	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
59	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 39.373,00	R\$ 7.650,00	19%
62	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
63	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0%
		Total do Objetivo 3.1						156.373,00	7.650,00	5%
		TOTAL DA DIRETRIZ 3						156.373,00	7.650,00	5%
		TOTAL GERAL						8.419.662.318,11	6.863.404.911,59	81,5%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.
Referência dos dados: 2º Ciclo 2018
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: 29/06/2018

ANEXO IV –

Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA 2016-2019

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
3	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
5	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
8	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
9	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
10	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
11	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
13	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
19	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
20	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%
23	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
25	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%
26	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
27	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
28	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
29	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 84.232.625,39	52%
30	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
31	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 0355								8.369.574.212,41	6.840.232.645,63	82%
32	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
33	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	977.151,42	88%
34	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
P 2029 - Ação 4640								1.069.868,00	764.868,00	71%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
36	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
P 2029 - Ação 8689								989.482,50	724.241,25	73%
37	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
38	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
39	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
40	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
41	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
42	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
P 2029 - Ação 8902								2.511.253,88	2.503.812,67	100%
43	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
P 2029 - Ação 8917								207.542,62	207.542,62	100%
44	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
45	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
46	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
47	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2008 - Diferenças Regionais	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
		P 2029 - Ação 20WQ						749.000,00	749.000,00	100%
		Total do Programa 2029						8.376.215.945,11	6.846.159.261,59	82%
48	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 39.373,00	R\$ 7.650,00	19%
51	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	0%
52	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0%
		P 2111 - Ação 2000						156.373,00	7.650,00	5%
		Total do Programa 2111						156.373,00	7.650,00	5%
53	24	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
		Total do Programa 2069						43.290.000,00	17.238.000,00	40%
54	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Projeto piloto de base de dados de educação (analfabetismo), referente ao inciso VIII, estabelecido no Art. 15, Seção IV do Decreto 8.276, de 27/06/2014.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
56	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre PIB e PIB percapita, referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								8.419.662.318,11	6.863.404.911,59	81,5%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 2º Ciclo 2018

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 29/06/2018

ANEXO V –

Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 207.542,62	100%
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Construção com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 013665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
12	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
TOTAL CGDS/DPLAN								5.892.732,70	5.177.615,96	88%
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
14	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
16	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2008 - Diferenças Regionais	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Projeto piloto de base de dados de educação (analfabetismo), referente ao inciso VIII, estabelecido no Art. 15, Seção IV do Decreto 8.276, de 27/06/2014.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre Educação Infantil, referente ao objetivo VII estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Educação Superior, referente ao objetivo VIII, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim sobre PIB e PIB percapita, referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático Ambiental sobre Resíduos Sólidos, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Perfil Produtivo - Agrícola	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para Discussão - Saúde na área de atuação da Sudene: uma análise da saúde materna e infantil	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGEP/DPLAN								749.000,00	749.000,00	100%
24	24	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
TOTAL CGCP/DPLAN								43.290.000,00	17.238.000,00	40%
TOTAL DPLAN								49.931.732,70	23.164.615,96	46%
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
27	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 42.477.417,63	R\$ 42.477.417,63	100%
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
33	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 96.407.194,96	R\$ 96.407.194,96	100%
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Paralisado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
49	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
51	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
52	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
53	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 84.232.625,39	52%
54	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
55	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
TOTAL CGDF/DFIN								8.369.574.212,41	6.840.232.645,63	82%
TOTAL DFIN								8.369.574.212,41	6.840.232.645,63	82%
56	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos.	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração do Regimento de funcionamento do Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos (CGRC).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL CGGI/SUP								0,00	0,00	
SUPERINTENDÊNCIA								0,00	0,00	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 2º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2018, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
59	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CCNT/DAD								0,00	0,00	0%
61	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 39.373,00	R\$ 7.650,00	19%
61	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Política de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	0%
63	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0%
TOTAL CGGP/DAD								156.373,00	7.650,00	5%
TOTAL DAD								156.373,00	7.650,00	5%
TOTAL GERAL								8.419.662.318,11	6.863.404.911,59	81,5%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 2º Ciclo 2018

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 29/06/2018

ANEXO VI –

Planos Operativos prioritários relacionados na Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

1 – Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial			Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	José Farias Gomes Filho
Problema (causa):	Elevado número de focos de extrema pobreza e degradação ambiental, falta de competitividade de amplas porções da área de atuação da Sudene, baixos índices de educação e saúde e a falta de estrutura do setor público para as sufciencias das demandas dos cidadãos.				
Projeto:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)				
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de Atuação da SUDENE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.140.376,40	

Previsão de Conclusão:	29/05/2019
Data Atualização:	20/06/2018

**Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada**

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 1.140.376,40
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 1.140.376,40
Valor liberado no Exercício	R\$ 300.000,00
Saldo a liberar	R\$ 840.376,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 300.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Termo de Referência para realização do PRDNE	Elaboração de Termo de Referência para realização do PRDNE	SUDENE/DPLAN/C GCP	19/06/2017	31/07/2017		19/06/2017	31/07/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o PNUD	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, intitulado "Desenvolvimento Regional na área de atuação da SUDENE", que inclui diversas atividades, entre elas apoio à elaboração do PRDNE.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/08/2017	29/09/2017		01/08/2017	15/09/2017		100%	Concluído		
3	Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação.	Submissão do ACT (denominado de Produto 017/2019) a ABC ; Envio do ACT preliminar para a Procuradoria da SUDENE. Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério da Relações Exteriores	SUDENE DPLAN/CGCP	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de assinatura do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Ajustes finais para celebração	Articulação PNUD, ABC e Procuradoria SUDENE. Realização (análise) dos ajustes sugeridos pela ABC e do Parecer da Procuradoria da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	18/09/2017	22/09/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Procedendo os ajustes referendados pelas instituições partícipes	

5	Assinatura do ACT pela ABC	Assinatura e evento para firmar Acordo de cooperação Técnica (ACT) SUDENE e PNUD	SUDENE DPLAN/CGCP	20/10/2017	20/11/2017		20/10/2017	20/11/2017		100%	Concluído	Acordo aprovado e assinado	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência	Elaboração de documento com detalhamento e especificação dos produtos esperados, e sua orçamentação, visando a contratação dos serviços de consultoria de apoio à elaboração do PRDNE	SUDENE/GAB, SUDENE/CGCP e PNUD	21/11/2017	12/01/2018		20/11/2017	31/03/2018	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Aguardando processo de liberação de todos os recursos para o PNUD. TR pronto, aguardando aprovação da Diretoria Colegiada da SUDENE.	Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD; O restante R\$ 840.376,40 está em processo de empenho, com previsão para o dia 30/05/2018.
7	Realização do processo licitatório	Objetivo é a contratação de empresa com ênfase em mobilização de lideranças (incluindo comunidades), definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	30/06/2018	30/09/2018					0%	A Iniciar		Aguardando a complementação dos recursos para início do processo junto ao PNUD
8	Contração de serviços de Apoio à realização do Plano	Contratação de serviço de apoio às atividade do plano como os de logística, organização de evento e de infraestrutura física (audio, estrutura e espaço físico).	SUDENE e PNUD	30/09/2018	30/10/2018					0%	A Iniciar		Elaboramos TRs para contratação de consultorias individuais de apoio ao PRDNE. TRs prontos em 15/06/2018 e serão enviados até 30/06/2018
9	Constituição do Comitê Técnico de Acompanhamento da realização do PRDNE	Elaboração de documento com atribuições do Comitê. Realização da primeira reunião deste Comitê.	SUDENE/GAB. SUDENE/DPLAN/C GCP	05/02/2018	10/08/2018					0%	A Iniciar	Constituído por Estados, Representantes dos Municípios, Sociedade Civil Organizada e Orgãos Correlatos ao Desenvolvimento do Nordeste	Só após a aprovação da Dir Colegiada (item 6) iremos proceder as tratativas para estabelecer as condições do Comitê Técnico
10	Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma	1 Reunião do Comitê Regional de Apoio ao PRDNE (CRNE)	SUDENE, PNUD, Consultoria Contratada	30/10/2018	14/11/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
11	Aprovação do Projeto tecnico	Confecção do Plano de trabalho, metodologia e diretrizes do plano	SUDENE/DPLAN/C GCP	16/11/2018	23/11/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE.	
12	Realização da primeira etapa do PRDNE	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e interligações com a área de atuação da SUDENE. Análise e absorção das principais linhas estratégicas dos Planos Estaduais e Municipais existentes. Compatibilização com as diretrizes para o Desenvolvimento Regionoal. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/05/2018	29/07/2018	R\$ 228.075,28				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	equipe da Sudenerealizará primeiro produto com auxilio dos consultores contratados e parceiros como a Fundaj, IPEA e BNDES parte destes recursos serão destinados a consultorias individuais
13	Realização da segunda etapa do PRDNE	Produto 2: Visão Geral do desenvolvimento regional à partir da construção das Agendas para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	28/09/2018	R\$ 342.112,92				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	equipe da Sudene realizará segundo produto com auxilio dos consultores contratados e parceiros como a Fundaj, IPEA e BNDES
14	Realização da terceira etapa do PRDNE	Produto 3: PRDNE em versão preliminar discutido e aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano, com orçamentação das ações consubstanciadas nas Agendas do Desenvolvimento Regional (ADRS). Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela .	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/10/2018	30/11/2018	R\$ 342.112,92				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
15	Realização da quarta etapa do PRDNE	Produto 4: PRDNE em versão final aprovado pelos parceiros. Estruturação de projeto de Lei para encaminhamento ao Congresso Nacional. Autorização da SUDENE para Liberação da 5ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	30/01/2019	R\$ 228.075,28				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	

15	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer Final de Acompanhamento - PFA envolvendo todas as etapas do processo. Aprovação do PRDNE e sua proposta de Lei pelo CONDEL	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	31/01/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
16	Constituição do Comitê de Acompanhamento da execução do PRDNE	Constituição em conjunto com os Estados e demais atores sociais da área de atuação da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	11/03/2019	29/05/2019					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.140.376,40	Valor realizado:		R\$ 300.000,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:

(1) conforme nota de empenho n. 2017NE000549 de 20/11/2017 (pag. 38; Processo CGCP N. 59335000240/2017-21 - Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE)

(2) Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2018.

(3) Já foram alocados R\$ 300.000,00 para o exercício 2018 junto ao PNUD; Fica faltando R\$ 840.376,40 para completar o orçamento inicialmente estimado do projeto.

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

2 – Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	José Farias Gomes Filho	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana			
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 709.382,21	

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	19/06/2018

**Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada**

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 709.382,21	R\$ 0,00		R\$ 709.382,21	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 709.382,21
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 709.382,21
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 709.382,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Fiera de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de inteções para elaboarção do plano de desenvolvimnto de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído		
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimnto de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	

4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsidio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018					90%	Em Andamento	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 141.876,44				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
11	Realização da primeira do PDE de Feira de Santana	Produto 1: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	23/08/2018	26/09/2018	R\$ 141.876,44				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
12	Realização da segunda do PDE de Feira de Santana	Produto 2: PDE de Feira de Santana - BA construído em 1ª versão, em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	27/09/2018	30/11/2018	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
13	Realização da terceira do PDE de Feira de Santana	Produto 3: PDE aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	31/01/2019	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
14	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/02/2018	28/02/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
15	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	01/03/2019	30/03/2019					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 0,00	53%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articuação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.

(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2018.**

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

**3 – Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil
e com a CNI, bem como a execução de seus planos de trabalho**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:		3.1
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes				Ano:		2017
Programa do PPA:	N/A				Eixo temático (MI):	N/A	
Ação do PPA:	N/A				Objetivo estratégico (MI):	N/A	
Objetivo da ação:	N/A						
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento				Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento	
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva				Gestor da subunidade:	Antônio Roberto Cavalcanti	
Problema (causa):	N/A						
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil						
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	31/05/2018

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17		-	100%	Concluído		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	30%	Em Andamento	As empresas serão acionadas após a conclusão do plano regional de atração de investimentos	
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	40%	Em Andamento	Lista de empresas incentivadas pela Sudene foi encaminhada em outubro. O próximo passo é articular no âmbito das instituições parceiras do Roadshow (Federações e BNB)	
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/18	R\$ -	01/10/17	01/12/18	-	40%	Em Andamento	As secretarias estaduais foram contactadas. O próximo passo é sistematizar as prioridades e formar um plano regional de atração de investimentos	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	73%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	APEX-BR
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 3.2
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A	Eixo temático (MI):	N/A		
Ação do PPA:	N/A	Objetivo estratégico (MI):	N/A		
Objetivo da ação:	N/A				
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento	Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento		
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Antônio Roberto Cavalcati		
Problema (causa):	N/A				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a Confederação Nacional da Indústria				
Objetivo do projeto:	Promoção do acesso das empresas, em especial as micro, pequenas e médias empresas - MPME, aos instrumentos de ação da Sudene.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	dez-18
Data Atualização:	31/05/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior,

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jan-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído		
2	Assinatura do Acordo	Assinatura	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mai-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído		
3	Divulgação instrumentos da Sudene	Identificar agenda de eventos da CNI para divulgação dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	set-17		14/07/17	17/11/17		100%	Concluído		
4	Treinamento dos funcionários da CNI	Capacitação de funcionários da CNI para serem agentes multiplicadores dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mar-18	ago-18					0%	A Iniciar	Aguardando acordo com o BNB para formalizar o treinamento	
5	Comunicação	Divulgação ações no âmbito do Acordo de Cooperação para as Federações da Indústria na área de atuação da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	dez-18		14/07/17			75%	Em Andamento	As ações serão divulgadas na medida em que foram realizadas	
6	Discussão sobre programas de financiamento no âmbito do FNE	Discussão sobre programas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas no âmbito do FNE. Encaminhamento de sugestões da CNI ao BNB para aprimorar a concessão de crédito para MPES	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	out-17	mai-18		01/05/2018	01/08/2018		30%	Em Andamento		
7	Discussão sobre as diretrizes e prioridades de aplicação dos Fundos de apoio da Sudene	Incorporar a CNI na formulação das diretrizes e prioridades do FDNE e do FNE	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	fev-18	jun-18		01/04/2017	01/08/2018		30%	Em Andamento		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	62%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Confederação Nacional da Indústria

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

6 – Estruturação e acompanhamento das atividades relacionadas com a Rede Palma



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões
Objetivo da ação:	Criação da Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.		
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)		
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

Previsão de Conclusão:	01/06/2018
Data Atualização:	16/02/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Aildo, Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Victor Uchoa



Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma no Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE		01/05/2017	05/06/2017		01/05/2017	05/06/2017		20,0%	Concluído	
1.1	Atividades preparatórias	reserva de sala, coffee, etc.	Ascon	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.2	Divulgação	Preparação dos email marketing, Cofecção de Folders	Ascon/CGDS	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.3	Cofirmação de Presença	-	Gabinete	15/05/2017	29/05/2017		15/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.4	Contrução do Espaço no Site	-	Ascon	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.5	Elaboração da apresentação	-	CGDS	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.6	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE	Sudene e parceiros	01/06/2017	01/06/2017		01/06/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.7	Registro da reunião	Registro de presença e gravação com degravação	Ascon	01/06/2017	05/06/2017		01/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído	
2	Divulgação			06/06/2017	28/12/2017		06/06/2017			10,0%	Concluído	
2.1	Apresentação Evento do Sebrae Serra Talhada		CGDS/Ascon	06/06/2017	08/06/2017		06/06/2017	08/06/2017		100%	Concluído	
2.2	Apresentação Conselho Deliberativo do Sebrae AL		CGDS/Ascon	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017	22/06/2017		100%	Concluído	
2.3	Apresentação Sebrae PE		CGDS/Ascon	20/08/2017	27/12/2017						Cancelado	
2.4	Apresentação no Conselho dos Secretários de Agricultura (CONSEAGRI)		CGDS/Ascon	21/08/2017	28/12/2017						Cancelado	
3	Preparar a monção para o Condel			05/06/2017	27/07/2017		05/06/2017	27/07/2017		10,0%	Concluído	

3.1	Elaboração da Ata e encaminhar para CGGI		Gabinete	05/06/2017	05/06/2017		05/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído			
3.2	Elaboração de proposta de Moção de Apoio para o Condel		CCGI/Gabinete/CG DS	06/06/2017	15/07/2017		06/06/2017	15/07/2017		100%	Concluído			
3.3	Apresentação da Moção ao Comitê Técnico do Condel		CCGI/Gabinete	20/07/2017	20/07/2017		(*)	(*)			Cancelado	Cancelamento decorrente da mudança predial da Sede, impossibilitando a referida realização.		
3.4	Apresentação da Moção ao Condel		Superintendente	27/07/2017	27/07/2017		27/07/2017	27/07/2017		100%	Concluído			
4	Realização de Oficina para Formatação da Arquitetura da Rede Palma			01/08/2017	A definir		01/09/2017			12,0%	Em Andamento			
4.1	Instituição de Grupo de Trabalho da Sudene		DPLAN	01/08/2017	A definir					0%	A Iniciar			
4.2	I Reunião Técnica de Articulação		Sudene e parceiros	01/09/2017	21/09/2017		01/09/2017	26/09/2017		100%	Concluído			
4.3	Realização de Oficina		CGDS/DPLAN-Gabinete	20/02/2018	A definir					0%	A Iniciar			
4.4	Definição da Arquitetura da Rede		Sudene e parceiros	02/03/2018	A definir					0%	A Iniciar			
4.5	Elaboração de Relatório		CGDS/DPLAN	05/03/2018	A definir					0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	52%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

8 - Acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como, do apoio técnico à articulação de novas emendas.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	252.692,18

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 102.692,18	Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	A realizar no exercício	R\$ 150.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 252.692,18	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	27/03/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Marcelo Saiki

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		12/03/2016	01/03/2017	-	12/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	12/03/16	12/04/16	-	12/03/16	12/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/16	22/04/16	-	12/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	11/07/16	01/03/17	-	11/07/16	01/03/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/06/2016	01/03/2018	R\$ 250.000,00	13/06/2017		R\$ 100.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Parelhas	01/06/16	30/06/16		13/06/17	13/06/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	22/08/17	22/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Parelhas	16/08/17	30/09/17		23/08/17	31/10/17		100%	Concluído		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/17	15/10/17	R\$ 150.000,00				0%	Atrasado	O convênio está em aditvação de prazo na CCONT; falta o município presar contas da 1ª parcela; está sendo realizada visita de acompanhamento	Cobrada celeridade na prestação de contas da 1ª parcela
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Parelhas	16/10/17	31/01/18					0%	Atrasado	O convênio está em aditvação de prazo na CCONT; falta o município presar contas da 1ª parcela; está sendo realizada visita de acompanhamento	Cobrada celeridade na prestação de contas da 1ª parcela
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/02/18	01/03/18	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/04/2018	27/03/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/04/18	27/03/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Parelhas/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828299/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	267.794,30

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 7.117,72		R\$ 107.117,72	Pago até o ano anterior	R\$ 216.183,23
R\$ 150.000,00	R\$ 10.676,58		R\$ 160.676,58	A realizar no exercício	R\$ 33.085,91
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 17.794,30		R\$ 267.794,30	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 33.085,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 216.183,23

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		17/03/2016	11/06/2017	-	17/03/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	17/03/16	18/03/16	-	17/03/16	18/03/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	17/03/16	08/04/16	-	17/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	11/06/17	-	15/03/16	11/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/17	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	31/12/2017	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 216.183,23	40%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Passa e Fica	01/04/17	15/04/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/04/17	15/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Passa e Fica	16/04/17	30/06/17		14/04/17	18/05/17		100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	01/05/17	15/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 150.000,00	03/07/17	03/07/17	R\$ 116.183,23	100%	Concluído	Valor da liberação foi reduzido em virtude da verificação <i>in loco</i> de que parte da obra já havia sido executada	Será cancelado o empenho do saldo em restos a pagar e devolvido o recurso.
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Passa e Fica	16/07/17	30/11/17		04/07/17	31/12/17		100%	Concluído	Valor R\$ 116.183,23	
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela (Restante da 2ª liberação)	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	30/11/17	R\$ 33.085,91				0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; município atrasou para devolver Termo aditivo assinado.	CCONT está concluindo análise de Relatórios de execução e Prefeitura encaminhou Termo digitalizado
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 33.085,91	Município de Passa e Fica	01/12/17	31/12/17					0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; município atrasou para devolver Termo aditivo assinado.	CCONT está concluindo análise de Relatórios de execução e Prefeitura encaminhou Termo digitalizado
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	31/01/18	-				0%	Atrasado		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 216.183,23	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Passa e Fica/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827250/2016 - Proposta nº 003674/2016													
(2) Será cancelado o empenho de R\$ 730,86, visto que o objeto foi cumprido com valor inferior ao previsto													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	274.321,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 9.728,76		R\$ 109.728,76	Pago até o ano anterior	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 14.593,14		R\$ 164.593,14	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 24.321,90		R\$ 274.321,90	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	17/03/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		26/02/2016	19/12/2016	-	26/02/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	30/03/16	30/01/17	-	30/03/16	30/01/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	18/10/16	07/11/16	-	18/10/16	07/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		15/02/2017	21/02/2018	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 250.000,00	51%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	15/02/17	15/02/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Passa e Fica	30/12/16	25/07/17		30/12/16	25/07/17		100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	19/05/17	19/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	31/07/17	R\$ 150.000,00	29/11/17	29/11/2017	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Passa e Fica	30/11/17	21/01/18		30/11/17	26/12/2017		100%	Concluído		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	22/01/18	21/02/18	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		22/03/2018	17/03/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	22/03/18	17/03/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Passa e Fica/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827249/2016 - Proposta nº 003674/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	262.868,86

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 7.721,32		R\$ 107.721,32	A realizar no exercício	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.147,54		R\$ 155.147,54	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 12.868,86		R\$ 262.868,86	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	23/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	30/05/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/17	-	01/11/16	08/11/17	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	30/07/2018	R\$ 250.000,00	30/05/2017	30/11/2017	R\$ 100.000,00	21%	Em Andamento		
7	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de Tangará	01/05/17	15/05/17		30/05/17	30/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/17	15/06/17	R\$ 100.000,00	04/07/17	19/07/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Tangará	16/06/17	31/08/17		20/07/17		R\$ 40.000,00	40%	Atrasado	Atraso na licitação, devido recurso de licitante. Concluída a licitação, entretanto o município não inseriu os documentos no Siconv.	Solicitada a inclusão dos documentos da licitação e execução no SICONV;
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Tangará	01/09/17	15/09/17					0%	Atrasado	Atraso na Execução	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 150.000,00				0%	Atrasado	Atraso na Execução	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Tangará	16/09/17	29/06/18					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/06/18	30/07/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/08/2018	23/08/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/08/18	23/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	41%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Tangará/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827676/2016 - Proposta nº 015210/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.5
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN		
Objetivo do projeto:	Promoção de melhorias no acesso às comunidades, transportes/serviços públicos		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	520.935,70

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 61.299,90	R\$ 4.187,14		R\$ 65.487,04	Pago até o ano anterior	R\$ 61.299,00
R\$ 219.000,00	R\$ 5.161,00		R\$ 224.161,00	A realizar no exercício	R\$ 438.700,10
R\$ 219.700,10	R\$ 5.161,26		R\$ 224.861,36	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 14.509,40		R\$ 514.509,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 438.701,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 61.299,00

Previsão de Conclusão:	20/07/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Márcio de Castro Viana

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	01/03/2017	-	15/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	15/08/16	-	15/03/16	15/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	25/10/16	25/10/16	-	25/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	26/10/16	26/10/16	-	26/10/16	26/10/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	26/06/2018	R\$ 500.000,00	09/08/2017		R\$ 61.299,00	16%	Em Andamento		
7	Depósito 1a Parcela contrapartida	Depósito 1a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/08/17	30/08/17		09/08/17	09/08/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 61.299,90	02/10/17	02/10/17	R\$ 61.299,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 61.299,90	Município de Tibau do Sul	16/09/17	31/10/17		03/10/17			71%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa (Utilizado R\$ 43.273,14)	Cobrada celeridade ao município

10	Depósito 2a Parcela contrapartida	Depósito 2a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/11/17	30/11/17				0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	15/11/17	R\$ 219.000,00			0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 219.000,00	Município de Tibau do Sul	16/11/17	31/12/17				0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
13	Depósito 3a Parcela contrapartida	Depósito 3a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/01/18	31/01/18				0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	15/01/18	R\$ 219.700,10			0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 219.700,10	Município de Tibau do Sul	16/01/18	26/05/18				0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	27/05/18	26/06/18	-			0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		25/07/2018	20/07/2019	-			0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	25/07/18	20/07/19	-			0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 61.299,00	36%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Município deTibau do Sul/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828298/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida da comunidade em geral		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	259.000,00	259.971,60

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 971,60		R\$ 100.971,60	Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
R\$ 159.000,00			R\$ 159.000,00	A realizar no exercício	R\$ 159.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 259.000,00	R\$ 971,60		R\$ 259.971,60	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 159.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	22/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/08/2016	13/01/2017	-	22/08/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	22/08/16	13/03/17	-	22/08/16	13/03/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/03/2017	29/07/2018	R\$ 259.000,00	24/03/2017		R\$ 100.000,00	32%	Em Andamento		
7	Depósito de parcela única de contrapartida	Depósito da parcela única da contrapartida.	Município de Parazinho	01/03/17	31/03/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	31/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Parazinho	16/08/17	30/08/17		22/08/17	10/10/17		100%	Concluído		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 159.000,00				20%	Atrasado	Gerados relatórios de Execução; visita de acompanhamento agendada	Relatório de Execução em análise;
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 159.000,00	Município de Parazinho	16/09/17	28/06/18					0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	29/06/18	29/07/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/08/2018	22/08/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/08/18	22/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 259.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	52%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Parazinho/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836220/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.7
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação do PPA:	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):			
Projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.		
Objetivo do projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN como meio de fomento e consolidação da agricultura urbana orgânica no município de Natal com vistas a beneficiar e potencializar o mercado de pequenos produtores de hortifrutis orgânicos das comunidades de Gramorezinho e Planalto, localidades inseridas na Mancha de Interesse Social e por conseguinte na Área Especial de Interesse Social 03 de Segurança Alimentar, definidas no macrozoneamento do Plano Diretor de Natal, Lei Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007.		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	
	100	GND 4 (4440.42)		1.000.000,00	1.020.000,00	DEZ/2016	523.012,50	20.000,00	543.012,50	Pago até o ano anterior
						FEV/2017	446.112,50	--	446.112,50	R\$ -
						ABR/2017	30.875,00	--	30.875,00	A realizar no exercício
						TOTAL	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	R\$ 1.000.000,00
										Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)
										R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício
										R\$ -
										Valor liberado no Exercício
										R\$ -
										Saldo a liberar
										R\$ 1.000.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício
										R\$ -
										Total Liberado até o exercício
										R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos, Maria Helena Lima, Victor Uchôa Silva, José Aildo Sabino - SUDENE; Karenine Dantas Monteiro - Prefeitura de Natal/RN.

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	16/03/2016	16/03/2016	--	16/03/2016	16/03/2016	--	100%	Concluído		
2	Proposta/Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação Proposta/Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/2016	12/03/2016	--	12/03/2016	12/03/2016	--	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	01/03/2017	28/06/2017	--	01/03/2017	27/06/2017	--	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/2016	04/11/2016	--	03/11/2016	03/11/2016	--	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/2016	30/12/2016	--	30/12/2016	30/12/2016	--	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/2017	13/01/2017	--	13/01/2017	13/01/2017	--	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)				R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	8%	Atrasado		
7	Depósito de parcela única da contrapartida	Depósito de parcela única da contrapartida	Município de Natal/RN	01/12/2016	31/12/2016		28/11/2017	28/11/2017		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação pela Concedente da 1ª parcela de recursos	COFC/CGAF / DAD	01/12/2016	31/12/2016	R\$ 523.012,50				0%	Atrasado	Em aditativação da vigência; pendências do município com a CCONT	CCONT está aditando a vigência; município em processo de conversa/correção da pendências junto à CCONT
9	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira - R\$ 523.012,50	Município de Natal/RN	30/12/2016	31/05/2017					0%	Atrasado	Em aditativação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação pela Concedente da 2ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/02/2017	28/02/2017	R\$ 446.112,50				0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo
11	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio - R\$ 446.112,50	Município de Natal/RN	31/05/2017	30/09/2017					0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo
12	Liberação da 3ª parcela	Liberação pela Concedente da 3ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/04/2017	30/04/2017	R\$ 30.875,00				0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo
13	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana)	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana) - R\$ 30.875,00	Município de Natal/RN	01/06/2017	31/12/2017					0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo
14	Visita de técnica de recebimento do Objeto	Visita de técnica de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/2018	31/01/2018					0%	Atrasado	Em aditivação da vigência; pendências do município com a CCONT	O mesmo
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	01/03/2018	24/02/2019	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:			27,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Natal/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828301/2016													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.8
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.172.497,00	1.234.957,85

Previsão de Conclusão:	28/03/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 222.955,29	R\$ 6.819,30		R\$ 229.774,59	Pago até o ano anterior	R\$ 574.955,29
R\$ 352.000,00	R\$ 5.672,87		R\$ 357.672,87	A realizar no exercício	R\$ 597.541,71
R\$ 352.000,00	R\$ 24.984,34		R\$ 376.984,34	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 245.541,71	R\$ 24.984,34		R\$ 270.526,05	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.172.497,00	R\$ 62.460,85		R\$ 1.234.957,85	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 597.541,71
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 574.955,29

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		08/03/2016	30/05/2017	-	08/03/2016	21/09/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/04/16	08/08/16	-	06/04/16	08/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	06/09/16	06/09/16	-	06/09/16	06/09/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/09/16	21/09/16	-	21/09/16	21/09/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	04/03/2018	R\$ 1.172.497,00	24/03/2017		R\$ 574.955,29	24%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/04/17	15/04/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 222.955,29	13/07/17	13/07/17	R\$ 222.955,29	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 222.955,29	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/07/17	30/08/17		14/07/17	30/08/17		100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	15/05/17		22/05/17	22/05/17		100%	Concluído		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 352.000,00	30/11/17	30/11/2017	R\$ 352.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 352.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/11/17	15/12/17		30/11/17			26%	Atrasado	Consta no Siconv movimentações financeiras de apenas R\$ 89.000,00	Cobrada celeridade ao município
13	Depósito da 3ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/12/17	15/12/17					0%	Atrasado	Consta no Siconv movimentações financeiras de apenas R\$ 89.000,00	Cobrada celeridade ao município
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/12/17	15/12/18	R\$ 352.000,00				0%	Atrasado	Consta no Siconv movimentações financeiras de apenas R\$ 89.000,00	Cobrada celeridade ao município
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 352.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/12/17	01/02/18					0%	Atrasado	Consta no Siconv movimentações financeiras de apenas R\$ 89.000,00	Cobrada celeridade ao município
16	Depósito da 4ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Consta no Siconv movimentações financeiras de apenas R\$ 89.000,00	Cobrada celeridade ao município
17	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 245.541,71				0%	Atrasado	Em aditivação de vigência	CCONT está concluindo o aditamento
18	Pavimentação das Vias (Parte 4)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 245.541,71	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/01/18	01/02/18					0%	Atrasado	Em aditivação de vigência	CCONT está concluindo o aditamento
19	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	02/02/18	04/03/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		02/04/2018	28/03/2019	-				0%	A Iniciar		
20	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	02/04/18	28/03/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.172.497,00	Valor realizado:		R\$ 574.955,29	44%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de São Gonçalo do Amarante/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828296/2016 - Proposta nº 007532/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	GND 3	30	600.000,00	611.924,74	CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
						R\$ 100.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 106.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 400.000,00
						R\$ 300.000,00	R\$ 5.924,74		R\$ 305.924,74	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
						R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 600.000,00	R\$ 11.924,74		R\$ 611.924,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 400.000,00

Previsão de Conclusão:	24/06/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/09/2016	13/01/2017	-	06/09/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	06/09/16	04/11/16	-	06/09/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	06/09/16	25/11/16	-	06/09/16	25/11/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/09/16	07/02/17	-	06/09/16	07/02/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/02/2017	31/05/2018	R\$ 600.000,00	18/04/2017		R\$ 400.000,00	35%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/02/17	28/02/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	30/08/17	R\$ 100.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/09/17	30/09/17		24/08/17	14/09/17		100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito de 2ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	30/05/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído	O município depositou a segunda parcela da contrapartida em conjunto com a primeira	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	15/12/17	R\$ 300.000,00	01/12/17	21/12/17	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/12/17	31/01/18		27/12/17			24%	Atrasado	O município atrasou a execução da etapa, de acordo com o Plano de Trabalho	Cobrada celeridade ao município
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/18	17/02/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 200.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	18/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/05/18	31/05/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/06/2018	24/06/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/06/18	24/06/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 600.000,00	Valor realizado:		R\$ 400.000,00	55%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de São Gonçalo do Amarante/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 838038/2016 - Proposta nº 28265/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	251.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 125.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 126.000,00	A realizar no exercício	R\$ 125.000,00
R\$ 125.000,00			R\$ 125.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 251.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 125.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 125.000,00

Previsão de Conclusão:	23/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/07/2016	13/01/2017	-	18/07/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2016	30/07/2018	R\$ 250.000,00	17/07/2017		R\$ 125.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lucrécia/RN	01/12/16	31/12/17		17/07/17	17/07/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	31/12/17	17/07/17	R\$ 125.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 125.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 125.000,00	Município de Lucrécia/RN	18/07/17	15/09/17		24/08/17	12/12/17		100%	Concluído		
10	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/09/17	30/09/17	R\$ 125.000,00				0%	Atrasado	Gerados relatórios de execução financeira	Em análise de relatórios de execução
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 125.000,00	Município de Lucrécia/RN	01/11/17	29/06/18					0%	A Iniciar		

12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/06/18	30/07/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/08/2018	23/08/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/08/18	23/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 125.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Lucrecia/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836181/2016 - Proposta nº 026883/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	R\$ 253.654,75

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 100.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 103.654,75	A realizar no exercício	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 253.654,75	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Marcelo Saiki Braga

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	13/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	22/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	30/01/2018	R\$ 250.000,00	03/08/2017		R\$ 100.000,00	30%	Atrasado		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lagoa Danta	01/08/17	15/08/17		03/08/17	03/08/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Lagoa Danta	16/08/17	30/11/17		22/08/17			99%	Atrasado		
10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	15/12/17	R\$ 150.000,00				0%	Atrasado		

11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Lagoa Danta	16/12/17	31/12/17					0%	Atrasado		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/12/17	30/01/18	-				0%	Atrasado		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Lagoa Danta/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828295/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	503.901,97

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	Pago até o ano anterior	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 3.901,96		R\$ 503.901,96	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	13/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Victor Uchôa Ferreira da Silva

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		01/03/2016	30/11/2016	-	01/03/2016	30/11/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	03/05/17	19/05/17	-	03/05/17	19/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	22/11/16	22/11/16	-	22/11/16	22/11/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	30/11/16	30/11/16	-	30/11/16	30/11/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	19/08/2018	R\$ 500.000,00	10/08/2017		R\$ 250.000,00	19%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/08/17	15/08/17		10/08/17	10/08/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	30/08/17	30/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 250.000,00	Município de Jucurutu	16/08/17	30/08/17		01/09/17			20%	Atrasado	O município não atendeu aos requisitos para liberação da 1ª parcela no prazo previsto, o que acarretou no atraso da execução; Não foi inserido documentos da licitação no Siconv e nenhum gasto foi registrado	Aguardando município inserir documentos da licitação e da execução da obra; comunicado ao município
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/09/17	15/09/17					0%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 250.000,00				0%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 250.000,00	Município de Jucurutu	16/09/17	19/06/18					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	20/06/18	19/08/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		18/08/2018	13/08/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/08/18	13/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Jucurutu/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828297/2016 - Proposta nº 004041/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Deficiência na coleta de lixo do município		
Projeto:	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo em Campo Redondo/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida e higiene à população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	258.333,33

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	19/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		11/03/2016	13/01/2017	-	11/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/03/16	11/04/16	-	11/03/16	11/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/03/16	22/04/16	-	11/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação do Termo de Referência	CGDS/SUDENE	05/04/16	12/07/16	-	05/04/16	12/07/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	26/07/2018	R\$ 250.000,00	11/05/2017		R\$ 250.000,00	42%	Em Andamento		
7	Depósito da Parcela única da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Campo Redondo	01/05/17	15/05/17		11/05/17	11/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção dos recursos	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
9	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo - R\$ 250.000,00	Município de Campo Redondo	16/08/17	25/06/18		20/12/17			80%	Em Andamento		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	26/06/18	26/07/18	-				0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		24/08/2018	19/08/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	24/08/18	19/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:			62%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Campo Redondo/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828300/2016 - Proposta nº 010961/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	526.970,57

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,29		R\$ 263.485,29	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,28		R\$ 263.485,28	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 26.970,57		R\$ 526.970,57	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	24/09/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Marcelo Saiki Braga

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/07/2016	01/03/2017	-	28/07/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	28/07/16	16/06/17	-	28/07/16	16/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/07/2017	31/08/2018	R\$ 500.000,00	19/07/2017		R\$ 0,00	18%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela 1ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	01/07/17	15/07/17		19/07/17	19/07/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	05/12/17	05/12/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 250.000,00	Município de Upanema	16/08/17	17/02/18		20/12/17			5%	Em Andamento		
10	Depósito de Parcela 2ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	18/02/18	28/02/18					0%	A Iniciar		
11	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/02/18	28/02/18	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 250.000,00	Município de Upanema	01/03/18	31/07/18					0%	A Iniciar		

13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/08/18	31/08/18	-				0%	A Iniciar			
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/09/2018	24/09/2019	-				0%	A Iniciar			
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/09/18	24/09/19	-				0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00		Valor realizado:		R\$ 250.000,00		38%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Município de Upanema/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 839953/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal		
Objetivo do projeto:			



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	501.000,00

Previsão de Conclusão:	24/2/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 200,00	jan/18	R\$ 100.200,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 600,00	mai/18	R\$ 300.600,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 200,00	ago/18	R\$ 100.200,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 501.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Marcelo Saiki

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/3/2017	17/1/2018	-	28/3/2017	17/1/2018	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	09/08/17	24/11/17		09/08/17	24/11/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	30/10/17	24/11/17		30/10/17	24/11/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	25/11/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	29/4/2020	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Tremendal	01/01/18	31/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/01/18	31/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Tremendal	01/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Tremendal	01/05/18	31/05/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/05/18	31/05/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de Tremendal	01/06/18	30/07/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Gremendal	01/08/18	31/08/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/18	31/08/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Tremendal	01/09/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/20	15/01/20					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	29/4/2020	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/19	24/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Tremendal/BA _ Conv. 852902/2017

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.16
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2		
Objetivo do projeto:			

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.000.000,00	1.001.500,00

Previsão de Conclusão:	24/2/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 200.000,00	R\$ 300,00	01/18	R\$ 200.300,00	A realizar no exercício	R\$ 1.000.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 450,00	04/18	R\$ 300.450,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 450,00	07/18	R\$ 300.450,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 300,00	10/18	R\$ 200.300,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500,00		R\$ 1.001.500,00	Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Victor Uchoa

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		30/5/2017	17/1/2017	-	30/5/2017	17/1/2017	-	16%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	04/07/17	20/06/17		04/07/17	20/06/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/06/17	24/08/17		22/06/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	21/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	29/6/2020	R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Tremendal	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 200.000,00	Município de Tremendal	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Tremendal	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de Tremendal	01/05/18	27/04/19					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida		Não informado	Não informado					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/18	31/07/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
14	pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 300.000,00	Município de Tremendal	01/08/18	30/09/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Município de Tremendal	01/10/18	31/10/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 4ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/18	31/10/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
17	Pavimentação das Vias (Parte 4)	Pavimentação das Vias (Parte 4) - R\$ 200.000,00	Município de Tremendal	01/11/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	29/6/2020	-				0%	A Iniciar		
19	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/19	24/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Tremendal/BA-CONV. 847039/2017												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.17
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	500.800,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 160,00	jan/18	R\$ 100.160,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 400,00	ago/18	R\$ 250.400,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 240,00	mar/19	R\$ 150.240,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 800,00		R\$ 500.800,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	21/2/2021
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Victor Uchoa

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		2/8/2017	1/3/2018	-	11/8/2017	1/3/2017	-	17%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	04/07/17	10/08/17		04/07/17	10/08/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/08/17	24/08/17		11/08/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		18/01/18			30%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	11/08/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	29/12/2019	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Gentio do Ouro	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/08/18	15/08/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/08/18	30/08/18	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Gentio do Ouro	01/05/18	27/04/19					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/03/19	31/03/19					0%	A Iniciar		
14	Pavimentação das Vias	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 150.000,00	Município de Gentio do Ouro	01/05/18	29/12/19					0%	A Iniciar		
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/12/19	29/01/20					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	27/4/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/20	21/02/21	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Gentio do Ouro/BA-Conv. 850215/2017												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.18
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro		
Objetivo do projeto:			

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	385.000,00	389.379,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 385.000,00	R\$ 4.379,00	mai/18	R\$ 389.379,00	A realizar no exercício	R\$ 385.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 385.000,00	R\$ 4.379,00		R\$ 389.379,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 385.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/8/2019
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Marcelo Saiki

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIACÃO (Peso 20%)		28/12/2017	29/12/2017	-	28/12/2017	29/12/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/12/17	29/12/17		28/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/12/17	29/12/17		28/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação Termo de Referência	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
5	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/5/2018	15/7/2018	R\$ 385.000,00				0%	A Iniciar		
6	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da parcela única da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar	Licitação em execução	Cobrada celeridade ao município
7	Liberação da 1ª parcela	Liberação da parcela única	COCF /CGAF / DAD	01/05/18	31/05/18					0%	A Iniciar	Licitação em execução	Cobrada celeridade ao município
8	Aquisição do Equipamento	Aquisição de equipamentos	Município de Gentio do Ouro	01/06/18	30/06/18	R\$ 385.000,00				0%	A Iniciar		
9	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	29/12/2018	-				0%	A Iniciar		

10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/08/18	24/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 385.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Gentio do Ouro/BA – CONV. 862689/2017													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.19
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	500.800,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 100.000,00	R\$ 160,00	jan/18	R\$ 100.160,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 480,00	jul/18	R\$ 300.480,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 160,00	out/18	R\$ 100.160,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 800,00		R\$ 500.800,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/2/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		2/8/2017	17/1/2017	-	2/8/2017	17/1/2017	-	17%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/08/17	08/09/17		11/08/17	08/09/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	06/09/17	08/09/17		06/09/17	08/09/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		22/11/17			30%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	09/09/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	27/4/2019	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	31/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Gentio do Ouro	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/06/18	30/06/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		

12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de Gentio do Ouro	01/07/18	30/09/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Gentio do Ouro	01/10/18	30/10/18					0%	A Iniciar		
14	liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela-R\$ 100.000,00	COCF /CGAF / DAD	01/10/18	30/10/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 100.000,00	COCF /CGAF / DAD	01/11/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	27/4/2019	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/19	24/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Gentio do Ouro/BA-CONV 850889/2017												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.20
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		
Problema (causa):	Gargalos relacionados a Atividades Produtivas		
Projeto:	Emendas Parlamentares Individuais - Município de Icapui/CE		
Objetivo do projeto:	Capeamento/recapamento asfáltico		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.000.000,00	1.025.963,58

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 200.000,00	R\$ 25.963,58	jan/18	R\$ 225.963,58	A realizar no exercício	R\$ 1.000.000,00
R\$ 500.000,00		mar/18	R\$ 500.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00		jun/18	R\$ 300.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.000.000,00	R\$ 25.963,58		R\$ 1.025.963,58	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/2/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve Peixoto Bem e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/10/2017	17/1/2018	-	18/10/2017	17/1/2018	-	13%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/10/17	01/12/17	-	18/10/17	01/12/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/10/17	01/12/17	-	18/10/17	01/12/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18	-				0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	02/12/17	28/01/18					0%	Atrasado	Visita planejada; aguardando recursos	Visita em planejamento
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17	-	29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18	-	17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		29/12/2017	29/12/2018	R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de parcela única da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Icapui/CE	01/01/18	31/01/18		-	-		0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	31/01/18	R\$ 200.000,00	-	-		0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 200.000,00	Município de Icapui/CE	01/04/18	28/02/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/18	31/03/18	R\$ 500.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 500.000,00	Município de Icapui/CE	01/04/18	31/05/18					0%	A Iniciar		
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/18	30/06/18	R\$ 300.000,00					A Iniciar		
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de Icapui/CE	01/07/18	29/12/18					0%	A Iniciar		

15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	29/12/2018	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	13%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
Município de Icapui/CE												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.21
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	400.000,00	400.500,00

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)			
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL
R\$ 80.000,00	R\$ 50,00	Janeiro/2018	R\$ 80.050,00
R\$ 200.000,00	R\$ 250,00	Março/2018	R\$ 200.250,00
R\$ 120.000,00	R\$ 200,00	Maio/2018	R\$ 120.200,00
R\$ 400.000,00	R\$ 500,00		R\$ 400.500,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no Exercício	R\$ 400.000,00
Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 400.000,00
Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
Total liberado até o Exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/07/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Ísis Guimarães Moreira

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		23/03/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	23/03/2017		R\$ 0,00	19%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	23/03/17	05/12/17	-	23/03/17	23/11/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	23/03/17	05/12/17	-	23/03/17	23/11/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	90%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	15/10/17	31/12/17	-	08/11/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	06/12/17	04/02/18	-	24/11/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	05/02/18	24/02/18	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/06/2019	R\$ 400.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 80.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Meta 1 - Etapa 1	Pavimentação de rua no povoado de Brejão no município de Jaborandi. Rua Projetada I - trecho 1	Município de Jaborandi/BA	16/01/18	28/02/18					0%	A Iniciar		

10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 200.000,00			0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Pavimentação de rua no povoado de Brejão no município de Jaborandi. Rua Projetada I - trecho 2	Município de Jaborandi/BA	16/03/18	30/04/18				0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/05/18	31/05/18	R\$ 120.000,00			0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Pavimentação de rua no povoado de Brejão no município de Jaborandi. Rua Projetada I - trecho 3	Município de Jaborandi/BA	16/05/18	29/05/19				0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/05/19	29/06/19				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/07/2019	28/07/2020	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	29/07/19	28/07/20	-			0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 400.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	19%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:												
Município de Jaborandi/BA												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Arthur Maia/BA, consignada no OGU-SUDENE, na Ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 852856/2017.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.22
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	400.000,00	400.500,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 80.000,00	R\$ 100,00	jan/18	R\$ 80.100,00	A realizar no exercício	R\$ 400.000,00
R\$ 240.000,00	R\$ 300,00	jun/18	R\$ 240.300,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 80.000,00	R\$ 100,00	jan/19	R\$ 80.100,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 500,00		R\$ 400.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 400.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	6/8/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Mauro Póvoas

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		14/6/2017	17/1/2018	-	14/6/2017	17/1/2018	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	14/06/17	20/06/17		14/06/17	20/06/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	26/06/17	24/08/17		26/06/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	21/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	13/6/2019	R\$ 400.000,00			R\$ 0,00	0%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 80.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 80.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/06/18	30/06/18	R\$ 240.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 240.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/06/18	27/06/19					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/01/19	31/01/19					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/19	31/01/19	R\$ 80.000,00				0%	A Iniciar		
15	pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 80.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/02/19	13/06/19					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/07/19	15/07/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	13/6/2019	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	12/08/19	06/08/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 400.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Campo Alegre de Lourdes/BA													
Observações:													
Convênio nº 847045/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.23
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Resolver gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo, assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Equipamento público em condições insalubres para uso pela população		
Projeto:	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de higiene e segurança para os usuários do Mercado público		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.000.000,00	1.030.779,91

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 200.000,00	R\$ 30.779,91	Janeiro/2018	R\$ 230.779,91	A realizar no Exercício	R\$ 1.000.000,00
R\$ 500.000,00		Março/2018	R\$ 500.000,00	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00		Maio/2018	R\$ 300.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.000.000,00	R\$ 30.779,91		R\$ 1.030.779,91	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/01/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Aldo Sabino de Oliveira Júnior

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		27/05/2017	21/03/2018	R\$ 0,00	27/05/2017		R\$ 0,00	19%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	27/05/17	24/09/17	-	27/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	27/05/17	24/09/17	-	27/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	21/12/17	21/03/18	-	21/12/17		-	90%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	01/11/17	01/12/17	-	09/11/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	25/09/17	24/11/17	-	25/08/17	21/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	25/11/17	14/12/17	-	22/12/17	10/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	23/12/2018	R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (parcela única)	Depósito de Contrapartida (parcela única)	Município de Wanderley/BA	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Meta 1 - Etapa 1	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia - Parte 1	Município de Wanderley/BA	16/01/18	28/02/18					0%	A Iniciar		

10	Visita técnica de acompanhamento Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 500.000,00			0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia - Parte 2	Município de Wanderley/BA	16/03/18	30/04/18				0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/05/18	31/05/18	R\$ 300.000,00			0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia - Parte 3	Município de Wanderley/BA	16/05/18	22/11/18				0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Realização de visita técnica de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	23/11/18	23/12/18				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		22/01/2019	22/01/2020	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	22/01/19	22/01/20	-			0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	19%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Município de Wanderley/BA												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda de Comissão (CINDRA), consignada no OGU-SUDENE, na Ação 214S vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 847040/2017.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	8.24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas			Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Resolver gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo, assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	A deficiência no abastecimento de água prejudica consideravelmente o desenvolvimento da produção econômica, tanto na agricultura quanto na pecuária e nas empresas ceramistas.				
Projeto:	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA, promovendo a estruturação e dinamização das atividades produtivas.				
Objetivo do projeto:	Promover a estruturação e o aumento da produtividade da agricultura, da pecuária e da indústria ceramista, melhorando o desenvolvimento sustentável e alavancando a economia local e regional.				



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	GND 3	30	2.000.000,00	2.002.500,00	CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
						R\$ 400.000,00	R\$ 500,00	Janeiro/2018	R\$ 400.500,00	A realizar no Exercício	R\$ 1.600.000,00
						R\$ 600.000,00	R\$ 750,00	Julho/2018	R\$ 600.750,00	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
						R\$ 600.000,00	R\$ 750,00	Outubro/2018	R\$ 600.750,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 400.000,00	R\$ 500,00	Janeiro/2019	R\$ 400.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
						R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.002.500,00	Saldo a liberar	R\$ 1.600.000,00
										Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
										Total liberado até o Exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/09/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Flávio Cavalcanti Pereira do Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		26/05/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	26/05/2017		R\$ 0,00	17%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	26/05/17	23/09/17	-	26/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	26/05/17	23/09/17	-	26/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	40%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	01/11/17	01/12/17	-	07/11/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	24/09/17	23/11/17	-	25/08/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	24/11/17	13/12/17	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	26/08/2019	R\$ 2.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 400.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

9	Meta 1 - Etapa 1	Serviços Preliminares / Adutora (fase 01)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	16/01/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/07/18	31/07/18	R\$ 600.000,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Adutora (fase 02)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	16/07/18	30/09/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/10/18	15/10/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	01/10/18	15/10/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/10/18	31/10/18	R\$ 600.000,00				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Adutora (fase 03) / Rede de Distribuição	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	16/10/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
18	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 3	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
19	Depósito de Contrapartida (4ª parcela)	Depósito de Contrapartida (4ª parcela)	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
20	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 4ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/19	31/01/19	R\$ 400.000,00				0%	A Iniciar		
21	Meta 1 - Etapa 4	Reservação	Município de Oliveira dos Brejinhos/BA	16/01/19	26/07/19					0%	A Iniciar		
22	Visita de recebimento do Objeto	Realização de visita técnica de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	27/07/19	26/08/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		25/09/2019	24/09/2020	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
23	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	25/09/19	24/09/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 2.000.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Oliveira dos Brejinhos/BA												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda de Comissão (CINDRA), consignada no OGU-SUDENE, na Ação 214S vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 850213/2017.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.25
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de produção		
Projeto:	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado		
Objetivo do projeto:	Promover melhor escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.500.000,00	1.548.118,86

Previsão de Conclusão:	22/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 300.000,00	R\$ 9.600,00	jan/18	R\$ 309.600,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 450.000,00	R\$ 14.400,00	mar/18	R\$ 464.400,00	A realizar no exercício	R\$ 1.500.000,00
R\$ 450.000,00	R\$ 14.400,00	abr/18	R\$ 464.400,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 9.718,86	mai/18	R\$ 309.718,86	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.500.000,00	R\$ 48.118,86		R\$ 1.548.118,86	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena Castro Lima e Mauro Luciano Póvoas Souto

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/06/2017	01/03/2018	-	21/06/2017	01/03/2017	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	16/06/17	21/06/17		16/06/17	21/06/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/06/17	22/08/17		21/06/17	21/09/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	22/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		16/01/2018	15/01/2019	R\$ 1.500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Brumado	16/01/18	30/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 300.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Base pavimentação com brita graduada inclusive compactação - fase 1	Município de Brumado	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Brumado	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/18	15/03/18	R\$ 450.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Base pavimentação com brita graduada inclusive compactuação (fase 2)	Município de Brumado	01/04/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Brumado	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/04/18	15/04/18	R\$ 450.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3) -	Base pavimentação com brita graduada inclusive compactuação - fase 3	Município de Brumado	01/05/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
16	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Município de Brumado	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		
17	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 4ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/05/18	15/05/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
18	Pavimentação das Vias (Parte 4) Base pavimentação com brita graduada inclusive compactuação	Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30 fase final - R\$ 68.460,72 e fabricação e aplicação de pavimentação TSS R\$241.258,14	Município de Brumado	01/06/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
19	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/02/2019	22/02/2020	-				0%	A Iniciar		
20	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20	-				0%	A Iniciar		
Valor total previsto:						R\$ 1.500.000,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Brumado/BA

Observações:

Com cláusula suspensiva; convênio nº 847041/2017

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	501.000,00

Previsão de Conclusão:	26/3/2020
Data Atualização:	16/2/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 100.000,00	R\$ 200,00	jan/18	R\$ 100.200,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 600,00	mar/18	R\$ 300.600,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 200,00	out/18	R\$ 100.200,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 501.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Villeneuve e Victor Uchoa

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		9/8/2017	17/1/2017	-	9/8/2017	17/1/2017	-	17%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	09/08/17	23/11/17		09/08/17	23/11/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	09/08/17	23/11/17		09/08/2017	23/01/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		26/04/17			40%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	24/11/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		1/1/2018	29/12/2019	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto Básico em elaboração	Cobrada celeridade ao município
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 300.000,00			0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/05/18	27/04/19				0%	A Iniciar		
13	depósito da 3ª parcela da contrapartida	depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/10/18	31/10/18				0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/18	31/10/18	R\$ 100.000,00			0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Campo Alegre de Lourdes	01/11/18	31/01/19				0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/12/2017	15/4/2019	-			0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/04/19	26/03/20	-			0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	17%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Município de Campo Alegre de Lourdes/BA – Conv 852859/2017												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.27
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Falta de água potável para consumo humano e animal		
Projeto:	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1		
Objetivo do projeto:	Solucionar em parte a questão da falta de água potável para consumo humano e animal		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	320.000,00	332.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 320.000,00	R\$ 12.000,00	dez/17	R\$ 332.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 320.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 320.000,00	R\$ 12.000,00		R\$ 332.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 320.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/01/2022
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maurício Garcia e Flávio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		14/03/2017	13/12/2017	-	14/03/2017	13/12/2017	-	20%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17		14/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17		14/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico/Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	30/10/17	30/10/17		30/10/17	30/10/17	-	100%	Concluído		
4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/11/17	30/11/17		30/11/17	30/11/17	-	100%	Concluído		
5	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/12/17	13/12/17		13/12/17	13/12/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2017	30/12/2020	R\$ 320.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
6	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Jandaíra 1	01/12/17	16/12/17					0%	Atrasado		
7	Liberação da parcela	Liberação da parcela	COCF /CGAF / DAD	17/12/17	01/01/18	R\$ 320.000,00				0%	Atrasado		
8	Aquisição de máquina perfuratriz	Aquisição de máquina perfuratriz	Município de Jandaíra 1	30/11/17	30/11/20					0%	A Iniciar		
9	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/12/20	30/12/20	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/01/2021	24/01/2022	-				0%	A Iniciar		

10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/01/21	24/01/22	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 320.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Jandaíra1/RN													
Observações:													
Convênio nº 847991/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.28
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Falta de água potável para consumo humano e animal		
Projeto:	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2		
Objetivo do projeto:	Adquirir compressor para dar suporte a uma perfuratriz, no sentido de buscar minimizar a questão da falta de água potável para consumo humano e animal, em virtude da carência de precipitações pluviométricas no município de Jandaíra/RN, tendo como foco principal a população da área rural.		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100	GND 4	40	250.000,00	300.000,00					Pago até o ano anterior	R\$ -
						R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	dez/17	R\$ 300.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
										Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 300.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/01/2022
Data Atualização:	30/01/2022

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maurício Maia e Victor Uchôa Silva

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		14/03/2017	13/12/2017	-	14/03/2017	13/12/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17	-	14/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17	-	14/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico/ Termo de Referência	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17	-	14/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído		
4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/11/17	30/11/17	-	30/11/17	30/11/17	-	100%	Concluído		
5	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/12/17	13/12/17	-	13/12/17	13/12/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		30/11/2017	30/11/2020	R\$ 300.000,00	-	-	R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
6	Depósito da parcela única da contrapartida	Depósito da parcela única da contrapartida	Município de Jandaíra/RN	01/12/17	31/12/17	R\$ 50.000,00	-	-	-	0%	Atrasado	Licitação em elaboração	Cobrada celeridade ao município
7	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	31/12/17	R\$ 250.000,00	-	-	-	0%	Atrasado	Licitação em elaboração	Cobrada celeridade ao município
8	Aquisição de um compressor para perfuratriz.	Aquisição de um compressor para perfuratriz.	Município de Jandaíra/RN	01/01/18	30/11/20	R\$ 300.000,00	-	-	-	0%	A Iniciar		
9	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/11/17	30/11/20	-	-	-	-	0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		30/01/2021	30/01/2022	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	30/01/21	30/01/22	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 300.000,00		Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Município de Jandaíra/RN												
Observações:												
O objeto deste Convênio SICONV Nº 847990 (aquisição de compressor) complementa o objeto do Convênio SICONV Nº 847991/2011, que é a aquisição de uma perfuratriz.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.29
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	520.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 4.000,00	jan/18	R\$ 104.000,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 12.000,00	mar/18	R\$ 312.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 4.000,00	mai/18	R\$ 104.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 520.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/03/2021
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		23/03/2017	17/01/2018	-	23/03/2017	17/01/2018	-	13%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	23/03/17	23/11/17		23/03/17	23/11/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	23/03/17	23/11/17		23/03/17	23/11/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18				-	0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	24/11/17	28/01/18					0%	Atrasado	Visita planejada; aguardando recursos	Visita em planejamento
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	28/02/2020	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Parcela contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Matina	01/01/18	05/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/01/18	15/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação em paralelepípedo	Município de Matina	29/12/17	28/02/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito de Parcela contrapartida	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Município de Matina	01/03/18	05/03/18						A Iniciar		
11	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		

12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação em paralelepípedo	Município de Matina	01/03/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito de Parcela contrapartida	Depósito da 3ª Parcela da contrapartida	Município de Matina	01/05/18	05/05/18						A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	15/05/18	31/05/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação em paralelepípedo	Município de Matina	01/05/18	29/01/20					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/01/20	28/02/20	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/03/2020	24/03/2021	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/03/20	24/03/21	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	13%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Matina/BA

Observações:

Convênio nº 852855/2017

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.30
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Construção de Pavimentação à Paralelepípedos em ruas no Município de Francisco Dantas		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	280.000,00	280.500,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 140.000,00	R\$ 250,00	jan/18	R\$ 140.250,00	A realizar no exercício	R\$ 280.000,00
R\$ 140.000,00	R\$ 250,00	abr/18	R\$ 140.250,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 280.000,00	R\$ 500,00		R\$ 280.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 280.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	10/12/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		14/03/2017	12/01/2018	-	14/03/2017	12/01/2018	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	14/03/17	27/04/17		14/03/17	27/04/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	23/03/17	27/10/17		23/03/17	27/10/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/17					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	28/04/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	12/01/18	12/01/18		12/01/18	12/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	17/11/2018	R\$ 280.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Francisco Dantas	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 140.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Francisco Dantas	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Francisco Dantas	01/04/18	14/04/18					0%	A Iniciar			
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 140.000,00				0%	A Iniciar			
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) -	Município de Francisco Dantas	01/05/18	16/10/18					0%	A Iniciar			
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	17/10/18	17/11/18					0%	A Iniciar			
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		15/12/18	10/12/2019	-				0%	A Iniciar			
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/12/18	10/12/19	-				0%	A Iniciar			
			Valor total previsto:		R\$ 280.000,00		Valor realizado:		R\$ 0,00		16%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:														
Município de Francisco Dantas/RN														
Observações:														
Convênio nº 850586/2017														

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.31
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (M):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (M):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais na Zona Rural - Município de Maracás		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	GND 3	30	500.000,00	6.000,00	CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
						R\$ 100.000,00	R\$ 1.200,00	jan/18	R\$ 101.200,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
						R\$ 300.000,00	R\$ 3.600,00	mai/18	R\$ 303.600,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 100.000,00	R\$ 1.200,00	jul/18	R\$ 101.200,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 500.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 506.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	09/09/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Flavio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		12/06/2017	17/01/2018	-	12/06/2017	17/01/2018	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	16/06/17	23/08/17		16/06/17	23/08/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/06/17	23/08/17		12/06/17	23/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	24/08/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	18/08/2019	R\$ 500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Maracás	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 100.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais (Parte 1)	Serviços Preliminares e Terraplanagem	Município de Maracás	01/01/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Maracás	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/05/18	30/05/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
12	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais (Parte 2)	Terraplanagem e Encascalhamento	Município de Maracás	01/05/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Maracás	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/18	31/07/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais (Parte 3)	Encascalhamento e Drenagem	Município de Maracás	01/07/18	17/07/19					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	18/07/19	18/08/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		15/09/2019	09/09/2020	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/09/19	09/09/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Maracás/BA													
Observações:													
Convênio nº 847038/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.32
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Dificuldades com logística e máquinas relacionadas		
Projeto:	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Caraúbas		
Objetivo do projeto:	Dar suporte a pequenas atividades produtivas		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	296.500,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 46.500,00	jan/18	R\$ 296.500,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 46.500,00		R\$ 296.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/06/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maurício Garcia e Flávio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		29/03/2017	17/01/2018	R\$ 250.000,00	29/03/2017	17/01/2018	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	29/03/17	05/12/17		29/03/17	05/12/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	29/03/17	05/12/17		29/03/17	05/12/17		100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
5	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	30/05/2019	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
6	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da parcela da contrapartida	Município de Caraúbas	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Em processo de licitação	Cobrada celeridade ao município
7	Liberção da 1ª parcela	Liberção da parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 250.000,00				0%	Atrasado	Em processo de licitação	Cobrada celeridade ao município
8	Aquisição de caminhão basculante	Aquisição de caminhão basculante	Município de Caraúbas	29/12/17	29/04/19					0%	A Iniciar		
9	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/04/19	30/05/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/06/2019	22/06/2020	-				0%	A Iniciar		

10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/06/19	22/06/20	-			0%	A Iniciar	
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		20%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Município de Caraúbas/RN											
Observações:											
Convênio nº 853926/2017											

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.33
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Pavimentação e drenagem de estrada - Município de Doutor Severiano		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	254.374,76

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 50.000,00	R\$ 4.374,76	jan/18	R\$ 54.374,76	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00		mar/18	R\$ 100.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 100.000,00		jun/18	R\$ 100.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 4.374,76		R\$ 254.374,76	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/03/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Flavio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/08/2017	17/01/2018	-	18/08/2017	17/01/2018	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/08/17	08/09/17		18/08/17	08/09/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/08/17	30/11/17		18/08/17	30/11/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/18	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	09/09/17	28/01/19		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	27/02/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da parcela da contrapartida	Depósito da parcela da contrapartida	Município de Doutor Severiano	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Doutor Severiano	01/02/18	01/03/18					0%	A Iniciar		
10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/18	30/03/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		

11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Doutor Severiano	01/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/18	30/06/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
13	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Município de Doutor Severiano	01/05/18	27/01/19					0%	A Iniciar		
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	28/01/19	27/02/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/03/2019	22/03/2020	-				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/03/19	22/03/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Doutor Severiano/RN

Observações:

Convênio nº 853688/2017

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.34
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.500.000,00	1.510.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 300.000,00	R\$ 2.000,00	jan/18	R\$ 302.000,00	A realizar no exercício	R\$ 1.500.000,00
R\$ 450.000,00	R\$ 3.000,00	abr/18	R\$ 453.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 450.000,00	R\$ 3.000,00	jul/18	R\$ 453.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 2.000,00	out/18	R\$ 302.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.500.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 1.510.000,00	Saldo a liberar	R\$ 1.500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/08/2019
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena Castro Lima e Mauro Luciano Póvoas Souto

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/06/2017	01/03/2018	-	21/06/2017	01/03/2017	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	14/06/17	20/06/17		14/06/17	20/06/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/06/17	22/08/17		21/06/17	23/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	21/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	15/01/2019	R\$ 1.500.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de IAÇU	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 300.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Recuperação de ponte - fase 1	Município de IAÇU	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de IACU	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 450.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Recuperação de ponte -fase 2	Município de IACU	01/05/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de IACU	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/18	15/07/18	R\$ 450.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Recuperação de ponte - fase 3	Município de IACU	01/07/18	30/08/18					0%	A Iniciar		
16	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Depósito da 4ª parcela da contrapartida	Município de IACU	01/10/18	15/10/18					0%	A Iniciar		
17	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/18	15/10/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
18	Pavimentação das Vias (Parte 4)	Recuperação de ponte - fase 4	Município de IACU	01/10/18	30/11/18					0%	A Iniciar		
19	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/08/2018	24/08/2019	-				0%	A Iniciar		
20	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/08/18	24/08/19	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 1.500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de IACU/BA; convênio nº 847036/2017													
Em cláusula suspensiva													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.35
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de produção		
Projeto:	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100	GND 3	30	700.855,00	705.855,00	R\$ 140.171,00	R\$ 1.000,00	jan/18	R\$ 141.171,00	A realizar no exercício	R\$ 700.855,00
						R\$ 350.427,50	R\$ 2.500,00	mar/18	R\$ 352.927,50	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 210.256,50	R\$ 1.500,00	jun/18	R\$ 211.756,50	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 700.855,00	R\$ 5.000,00		R\$ 705.855,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 700.855,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena Castro Lima e Mauro Luciano Póvoas Souto

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/06/2017	01/03/2018	-	14/08/2017	01/03/2017	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/08/17	21/08/17		14/08/17	23/11/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/06/17	22/08/17		14/08/17	05/12/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	22/08/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	18/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	06/02/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	15/01/2019	R\$ 700.855,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de MANSIDÃO	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 140.171,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico/Aguardando
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação e drenagem de ruas diversas de Mansidão -BA (Parte 1)	Município de MANSIDÃO	01/02/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de MANSIDÃO	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 350.427,50				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação e drenagem de ruas diversas de Mansidão -BA (Parte 2) -	Município de MANSIDÃO	01/05/18	29/12/18					0%	A Iniciar		

13	Liberação da 3ª parcela de contrapartida	Pavimentação e drenagem de ruas diversas de Mansidão -BA (Parte 3) -	Município de MANSIDÃO		29/12/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/18	16/06/18	R\$ 210.256,50				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação e drenagem de ruas diversas de Mansidão -BA (Parte 4) -	Município de MANSIDÃO	01/06/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/02/2019	22/02/2020	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 700.855,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de MANSIDÃO/BA; convênio nº 852858/2017												
Observações:												
Com cláusula suspensiva												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.36
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	250.500,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 50.000,00	R\$ 500,00	jan/18	R\$ 50.500,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 200.000,00		abr/18	R\$ 200.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 500,00		R\$ 250.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/08/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Isis

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		29/12/2017	29/03/2018	-	29/12/2017	01/03/2017	-	18%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	13/03/17	27/04/17	-	29/12/17	29/06/19	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	29/12/17	27/04/17	-	29/12/17	29/06/19	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		05/04/17		-	50%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	28/04/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17	-	29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18	-	17/01/18	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		29/12/2017	29/06/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de São Miguel	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de São Miguel	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de São Miguel	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de São Miguel	01/05/18	29/06/19					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/06/19	30/07/19	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/08/2019	22/08/2020	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/08/19	22/08/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de São Miguel/RN													
Observações:													
Convênio nº 850670/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.37
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de ruas - Município de Várzea Nova		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	260.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 50.000,00	R\$ 2.000,00	jan/18	R\$ 52.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 125.000,00	R\$ 5.000,00	mai/18	R\$ 130.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 75.000,00	R\$ 3.000,00	jul/18	R\$ 78.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 260.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Isis Guimarães

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		07/08/2017	29/03/2018	-	07/08/2017	01/03/2017	-	13%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	19/07/17	05/12/17	-	19/07/17	05/12/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	07/08/17	05/12/17	-	07/08/17	05/12/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18	-			-	0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	06/12/17	28/01/18	-			-	0%	Atrasado	Visita planejada; aguardando recursos	Visita em planejamento
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17	-	29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18	-	17/01/18	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		29/12/2017	29/12/2018	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Várzea Nova	01/01/18	15/01/18	-			-	0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00			-	0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Várzea Nova	01/02/18	30/04/18	-			-	0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Várzea Nova	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/05/18	30/05/18	R\$ 125.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Várzea Nova	01/06/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Várzea Nova	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/18	30/07/18	R\$ 75.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Reforma e Ampliação (Parte 3) -	Município de Várzea Nova	01/08/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/12/18	29/01/19	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/02/2019	22/02/2020	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	13%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Várzea Nova/RN													
Observações:													
Convênio nº 853949/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.38
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Recuperação da Estrada Vicinal com piçarramento, no Trecho da Sede do Município ao Distrito de Brejinho, no Município de Araripe - Ceará.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	300.000,00	301.337,86

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 59.824,43	R\$ 267,57	Janeiro/2018	R\$ 60.092,00	A realizar no Exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 181.689,00	R\$ 802,72	Março/2018	R\$ 182.491,72	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 58.486,57	R\$ 267,57	Maio/2018	R\$ 58.754,14	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 1.337,86		R\$ 301.337,86	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/05/2021
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Mauro Luciano Póvoas Souto

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		16/03/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	16/03/2017		R\$ 0,00	15%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	16/03/17	05/12/17	-	16/03/17	05/12/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	16/03/17	05/12/17	-	16/03/17	05/12/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	60%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	15/10/17	31/12/17	-			-	0%	Atrasado	A visita prévia ainda não foi realizada por falta de recursos para viagens aéreas.	Regularizar a situação de viagens aéreas, para a realização dessa Etapa.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	06/12/17	04/02/18	-	06/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	05/02/18	24/02/18	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/04/2020	R\$ 300.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Araripe/CE	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 59.824,43				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Meta 1 - Etapa 1	Recuperação da Estrada Vicinal com piçarramento, no trecho de 1,35 km	Município de Araripe/CE	16/01/18	28/02/18					0%	A Iniciar		

10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Araripe/CE	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 181.689,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Recuperação da Estrada Vicinal com piçarramento, no trecho de 4,10 km	Município de Araripe/CE	16/03/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Araripe/CE	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/05/18	31/05/18	R\$ 58.486,57				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Recuperação da Estrada Vicinal com piçarramento, no trecho de 1,35 km	Município de Araripe/CE	16/05/18	29/03/20					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/03/20	29/04/20					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/05/2020	28/05/2021	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	28/05/20	28/05/21	-				0%	A Iniciar		
Valor total previsto:						R\$ 300.000,00	Valor total realizado:	R\$ 0,00	15%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Araripe/CE													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Ailton Cirilo/CE, consignada no OGU-SUDENE, na Ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 854312/2017.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.39
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	600.000,00	606.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 120.000,00	R\$ 1.200,00	Abril/2018	R\$ 121.200,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 3.000,00	Junho/2018	R\$ 303.000,00	A realizar no Exercício	R\$ 600.000,00
R\$ 180.000,00	R\$ 1.800,00	Setembro/2018	R\$ 181.800,00	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 600.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 606.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 600.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Victor Uchoa Ferreira da Silva

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		23/03/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	23/03/2017		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	23/03/17	05/12/17	-	23/03/17	28/12/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Intern. nº 313/2017, de 02/10/2017.
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	23/03/17	05/12/17	-	23/03/17	28/12/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Intern. nº 313/2017, de 02/10/2017.
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	10%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	01/10/17	31/12/17	-	05/10/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	06/12/17	04/02/18	-	29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	05/02/18	24/02/18	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2018	29/01/2019	R\$ 600.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar	
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Boa Vista do Tupim/BA	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar	Projeto básico em elaboração
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 120.000,00				0%	A Iniciar	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

9	Meta 1 - Etapa 1	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da zona rural (Assentamentos: Canabrava, Beira Rio e Povoado de Terra Boa), situados no município de Boa Vista do Tupim - 20%	Município de Boa Vista do Tupim/BA	16/04/18	31/05/18					0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Boa Vista do Tupim/BA	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/06/18	30/06/18	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da zona rural (Assentamentos: Canabrava, Beira Rio e Povoado de Terra Boa), situados no município de Boa Vista do Tupim - 50%	Município de Boa Vista do Tupim/BA	16/06/18	31/08/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/09/18	15/09/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Boa Vista do Tupim/BA	01/09/18	15/09/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/09/18	30/09/18	R\$ 180.000,00				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da zona rural (Assentamentos: Canabrava, Beira Rio e Povoado de Terra Boa), situados no município de Boa Vista do Tupim - 30%	Município de Boa Vista do Tupim/BA	16/09/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/12/18	29/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/02/2019	28/02/2020	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	28/02/19	28/02/20	-				0%	A Iniciar		
Valor total previsto:						R\$ 600.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Boa Vista do Tupim/BA

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Irmão Lázaro/BA, consignada no OGU-SUDENE, na Ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 850668/2017.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.40
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Equipamento público em condições insalubres para uso pela população		
Projeto:	Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Agropecuários, por meio da Reforma da Central de Abastecimento Sofia Frutuoso, no município de Assu-RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de higiene, segurança, lazer e cultura para os usuários do Mercado público		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.000.000,00	1.317.359,12

Previsão de Conclusão:	28/05/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 200.000,00	R\$ 63.471,82	Dezembro/2017	R\$ 263.471,82	A realizar no Exercício	R\$ 1.000.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 126.943,65	Abril/2018	R\$ 526.943,65	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 126.943,65	Julho/2018	R\$ 526.943,65	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.000.000,00	R\$ 317.359,12		R\$ 1.317.359,12	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Mauro Luciano Póvoas Souto

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/03/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	24/03/2017		R\$ 0,00	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	24/03/17	05/12/17	-	24/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	24/03/17	05/12/17	-	24/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.	
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	90%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	15/10/17	31/12/17	-			-	0%	Atrasado	A visita prévia ainda não foi realizada por falta de condições técnicas para tal.	A área técnica da CGDS providenciará a realização da viagem antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	06/12/17	04/02/18	-	06/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	05/02/18	24/02/18	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2017	29/04/2019	R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Assu/RN	01/12/17	15/12/17					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/12/17	31/12/17	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

9	Meta 1 - Etapa 1	Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Agropecuários, por meio da Reforma da Central de Abastecimento Sofia Frutuoso, no município de Assu-RN - 20%	Município de Assu/RN	16/12/17	31/03/18					0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Assu/RN	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 400.000,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 1	Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Agropecuários, por meio da Reforma da Central de Abastecimento Sofia Frutuoso, no município de Assu-RN - 40%	Município de Assu/RN	16/04/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Assu/RN	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/07/18	31/07/18	R\$ 400.000,00				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 1	Apoio à Produção e Comercialização de Produtos Agropecuários, por meio da Reforma da Central de Abastecimento Sofia Frutuoso, no município de Assu-RN - 40%	Município de Assu/RN	16/07/18	29/03/19					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/03/19	29/04/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/05/2019	28/05/2020	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	29/05/19	28/05/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Assu/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada na OGU-SUDENE, na Ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 850669/2017.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.41
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	350.000,00	357.500,00

Previsão de Conclusão:	27/09/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 70.000,00	R\$ 1.500,00	Janeiro/2018	R\$ 71.500,00	A realizar no Exercício	R\$ 350.000,00
R\$ 140.000,00	R\$ 3.000,00	Março/2018	R\$ 143.000,00	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 140.000,00	R\$ 3.000,00	Julho/2018	R\$ 143.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 350.000,00	R\$ 7.500,00		R\$ 357.500,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 350.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Marcelo Saiki Braga

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		16/03/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	16/03/2017		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	16/03/17	05/12/17	-	16/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	16/03/17	05/12/17	-	16/03/17	27/04/17	-	100%	Concluído	O prazo 05/12/2017 foi estipulado pela Port. Interm. nº 313/2017, de 02/10/2017.
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	60%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	15/10/17	31/12/17	-	04/12/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	06/12/17	04/02/18	-	28/04/17	29/12/17	-	100%	Concluído	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	05/02/18	24/02/18	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/08/2019	R\$ 350.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar	
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Passa e Fica/RN	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração

Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 70.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Meta 1 - Etapa 1	Pavimentação de trecho da Rua Dona Tota Cerino no município de Passa e Fica - RN.	Município de Passa e Fica/RN	16/01/18	28/02/18					0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Passa e Fica/RN	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 140.000,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapas 2 e 3	Pavimentação de trechos das Ruas Francisco Belo Nogueira e Geraldo Severino da Silva no município de Passa e Fica - RN.	Município de Passa e Fica/RN	16/03/18	30/06/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapas 2 e 3	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Passa e Fica/RN	01/07/18	15/07/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/07/18	31/07/18	R\$ 140.000,00				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapas 4 e 5	Pavimentação de trechos das Ruas João de Rosário Padilha e Praia de Ipanema no município de Passa e Fica - RN.	Município de Passa e Fica/RN	16/07/18	29/07/19					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/07/19	29/08/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/09/2019	27/09/2020	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	28/09/19	27/09/20	-				0%	A Iniciar		
Valor total previsto:						R\$ 350.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Passa e Fica/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na Ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 850628/2017.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.42
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S – Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Resolver gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo, assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	2.000.000,00	2.125.888,70

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 25.177,74	Janeiro/2018	R\$ 425.177,74	A realizar no Exercício	R\$ 2.000.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 25.177,74	Março/2018	R\$ 425.177,74	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 25.177,74	Maior/2018	R\$ 425.177,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 25.177,74	Julho/2018	R\$ 425.177,74	Valor liberado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 25.177,74	Setembro/2018	R\$ 425.177,74	Saldo a liberar	R\$ 2.000.000,00
R\$ 2.000.000,00	R\$ 125.888,70		R\$ 2.125.888,70	Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Ísis Guimarães Moreira

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		19/05/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	19/05/2017		R\$ 0,00	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	19/05/17	16/09/17	-	19/05/17	31/08/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	19/05/17	16/09/17	-	19/05/17	31/08/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	10%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A CGDS está intensificando a cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	01/11/17	01/12/17	-	08/11/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	17/09/17	16/11/17	-	01/09/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	17/11/17	06/12/17	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/01/2019	R\$ 2.000.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Sitio do Mato/BA	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/01/18	31/01/18	R\$ 400.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

9	Meta 1 - Etapa 1	Pavimentação de vias com paralelepípedo Assentamento Braz-Rua Projetada 4 e Rua Projetada 5 /Assentamento Conceição: Fase 1 - Rua Projetada A e Rua Projetada B	Município de Sítio do Mato/BA	16/01/18	28/02/18				0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Sítio do Mato/BA	01/03/18	15/03/18				0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/03/18	31/03/18	R\$ 400.000,00			0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Pavimentação de vias com paralelepípedo Assentamento Conceição: Fase 2, Rua Projetada A e Rua Projetada B / Assentamento São Caetano- Rua Principal/Assentamento Riacho dos Cavalos: Fase 1- Rua Projetada A e Rua Projetada B	Município de Sítio do Mato/BA	16/03/18	30/04/18				0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Sítio do Mato/BA	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/05/18	31/05/18	R\$ 400.000,00			0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Pavimentação de vias com paralelepípedo Assentamento Riacho dos Cavalos: Fase 2- Rua Projetada A e Rua Projetada B/Assentamento São Felipe:Fase 1- Rua Projetada A	Município de Sítio do Mato/BA	16/05/18	30/06/18				0%	A Iniciar		
18	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 3	Realização de visita técnica de acompanhamento	COCF / CGAF / DAD	01/07/18	15/07/18				0%	A Iniciar		
19	Depósito de Contrapartida (4ª parcela)	Depósito de Contrapartida (4ª parcela)	Município de Sítio do Mato/BA	01/07/18	15/07/18				0%	A Iniciar		
20	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 4ª parcela	CGDS / DPLAN	16/07/18	31/07/18	R\$ 400.000,00			0%	A Iniciar		
21	Meta 1 - Etapa 4	Pavimentação de vias com paralelepípedo Assentamento São Felipe: Fase 2- Rua Projetada A e Rua Projetada B /Assentamento Turbilhão 1: Rua Projetada A/ /Assentamento Turbilhão 2: Fase 1- Rua Projetada A	Município de Sítio do Mato/BA	16/07/18	31/08/18				0%	A Iniciar		
22	Visita técnica de acompanhamento - Etapa 4	Realização de visita técnica de acompanhamento	COCF / CGAF / DAD	01/09/18	15/09/18				0%	A Iniciar		
23	Depósito de Contrapartida (5ª parcela)	Depósito de Contrapartida (5ª parcela)	Município de Sítio do Mato/BA	01/09/18	15/09/18				0%	A Iniciar		
24	Liberação da 5ª parcela	Liberação da 5ª parcela	CGDS / DPLAN	16/09/18	30/09/18	R\$ 400.000,00			0%	A Iniciar		
25	Meta 1 - Etapa 5	Pavimentação de vias com paralelepípedo Assentamento Turbilhão 2: fase 2 - Rua Projetada A e do Assentamento Turbilhão 3: - Rua Projetada 2 e Rua Projetada 5	Município de Sítio do Mato/BA	16/09/18	29/12/18				0%	A Iniciar		
26	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	30/12/18	29/01/19				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/02/2019	28/02/2020	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
27	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	28/02/19	28/02/20	-			0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 2.000.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Município de Sítio do Mato/BA

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda de Comissão (CINDRA), consignada no OGU-SUDENE, na Ação 214S vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 847042/2017.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.43
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MJ):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S – Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas	Objetivo estratégico (MJ):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da Ação:	Resolver gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo, assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	880.000,00	890.000,00

Previsão de Conclusão:	01/03/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso previsto (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 176.000,00	R\$ 2.000,00	Dezembro/2017	R\$ 178.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 440.000,00	R\$ 5.000,00	Abril/2018	R\$ 445.000,00	A realizar no Exercício	R\$ 880.000,00
R\$ 264.000,00	R\$ 3.000,00	Junho/2018	R\$ 267.000,00	Orçamento autorizado no Exercício	R\$ -
R\$ 880.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 890.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 880.000,00
				Saldo a empenhar no Exercício	R\$ -
				Total liberado até o Exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Marcelo Saiki Braga

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades / Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/05/2017	29/03/2018	R\$ 0,00	22/05/2017		R\$ 0,00	18%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS / DPLAN	22/05/17	19/09/17	-	22/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS / DPLAN	22/05/17	19/09/17	-	22/05/17	24/08/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação do Projeto Básico	CGDS / DPLAN	29/12/17	29/03/18	-	29/12/17		-	70%	Em Andamento	O Conveniente está inserindo no SICONV os dados referentes a esta Etapa, os quais estão sendo analisados pela área técnica da CGDS.	A cobrança ao Conveniente, de modo a concluir a inserção desses dados no SICONV.
4	Visita técnica prévia	Realização de visita técnica prévia	CGDS / DPLAN	01/11/17	01/12/17	-	08/11/17		-	80%	Atrasado	A visita prévia foi realizada, necessitando tão somente de inserir o Relatório de Vistoria no SICONV.	A área técnica da CGDS providenciará a inserção do Relatório no SICONV, antes da liberação da 1ª parcela dos recursos.
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT / DAD	20/09/17	19/11/17	-	25/08/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CCONT / DAD	20/11/17	09/12/17	-	30/12/17	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2017	31/01/2019	R\$ 880.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Depósito de Contrapartida (1ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/12/17	15/12/17					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/12/17	31/12/17	R\$ 176.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Meta 1 - Etapa 1	Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Brejão etapa - parte 1 - Rua Projetada -2 a 3	Município de Jaborandi/BA	16/12/17	31/03/18					0%	A Iniciar		

10	Visita técnica de acompanhamento Etapa 1	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Depósito de Contrapartida (2ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 440.000,00				0%	A Iniciar		
13	Meta 1 - Etapa 2	Pavimentação em paralelepípedo no povoado de Brejão etapa - parte 2 Rua Projetada 4 e 5 - Planalto etapa 1 - Rua Paraíso, Rua Planalto	Município de Jaborandi/BA	16/04/18	31/05/18					0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento Etapa 2	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS / DPLAN	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
15	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Depósito de Contrapartida (3ª parcela)	Município de Jaborandi/BA	01/06/18	15/06/18					0%	A Iniciar		
16	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/06/18	30/06/18	R\$ 264.000,00				0%	A Iniciar		
17	Meta 1 - Etapa 3	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados - etapa final - Rua C	Município de Jaborandi/BA	16/06/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
18	Visita de recebimento do Objeto	Realização de visita técnica de recebimento do Objeto	CGDS / DPLAN	01/01/19	31/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		02/03/2019	01/03/2020	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas do Convênio	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS / DPLAN	02/03/19	01/03/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 880.000,00	Valor total realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Jaborandi/BA													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado por Emenda de Comissão (CINDRA), consignada no OGU-SUDENE, na Ação 214S vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 850212/2017.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.44
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Baixa produtividade dos pequenos produtores		
Projeto:	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá		
Objetivo do projeto:	Apoiar atividades produtivas da região		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	315.000,00	319.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 315.000,00	R\$ 4.000,00	jan/18	R\$ 319.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 315.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 315.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 319.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 315.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Isis Guimarães

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/12/2017	29/03/2018	-	28/12/2017	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/12/17	29/12/17		28/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/12/17	29/12/17		28/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação	CGDS/SUDENE	28/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
5	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	31/01/2019	R\$ 315.000,00				0%	A Iniciar		
6	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Cel. João Sá	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Em procedimento licitatório	cobrada celeridade ao município na apresentação da licitação
7	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 315.000,00				0%	Atrasado	Em procedimento licitatório	cobrada celeridade ao município na apresentação da licitação
8	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Cel. João Sá	01/02/18	31/12/18					0%	A Iniciar		
9	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	31/01/19					0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2019	24/02/2020	-				0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/19	24/02/20					0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 315.000,00	Valor realizado:			20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Cel. João Sá/BA													
Observações:													
Convênio nº 862698/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.45
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Estrada Vicinal com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	274.181,45

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 50.000,00	R\$ 4.836,29	jan/18	R\$ 54.836,29	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 9.672,58	fev/18	R\$ 109.672,58	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 9.672,58	abr/18	R\$ 109.672,58	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 24.181,45		R\$ 274.181,45	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Flávio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		29/03/2017	29/03/2018	-	29/03/2017	01/03/2017	-	14%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	29/03/17	05/12/17		29/03/17	05/12/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	29/03/17	05/12/17		29/03/17	05/12/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		16/08/17			30%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	06/12/17	28/01/18					0%	Atrasado	Visita planejada; aguardando recursos	Visita em planejamento
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	18/01/18		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	06/02/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/01/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Canguaretama	01/01/18	05/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	06/01/18	10/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Canguaretama	11/01/18	30/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Canguaretama	01/02/18	17/02/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	18/02/18	30/02/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Canguaretama	01/03/18	30/03/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Canguaretama	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Reforma e Ampliação (Parte 3) -	Município de Canguaretama	01/05/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/12/18	29/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/02/2019	22/02/2020	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20					0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	14%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Canguaretama/RN												
Observações:												
Convênio nº 858618/2017												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.46
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Manifestações patológicas no mercado		
Projeto:	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida à população; fomentar atividade produtiva		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	258.020,83

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 50.000,00	R\$ 1.604,17	jan/18	R\$ 51.604,17	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 6.416,66	mai/18	R\$ 206.416,66	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 8.020,83		R\$ 258.020,83	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/10/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/03/2017	29/03/2018	-	27/04/2017	01/03/2017	-	17%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/03/17	28/03/17		27/04/17	27/04/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/03/17	28/03/17		27/04/17	27/04/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		12/04/17			20%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/03/17	28/01/18		11/10/17	26/10/17		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	18/01/18		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	12/01/18	01/02/18		12/01/18	12/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/09/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de João Câmara	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de João Câmara	01/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de João Câmara	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/05/18	30/05/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de João Câmara	01/06/18	29/08/19					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/08/19	29/09/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/10/2019	22/10/2020	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/10/19	22/10/20					0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de João Câmara/RN												
Observações:												
Convênio nº 850088/2017												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.47
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	298.000,00	300.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 59.600,00	R\$ 400,00	jan/18	R\$ 60.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 238.400,00	R\$ 1.600,00	abr/18	R\$ 240.000,00	A realizar no exercício	R\$ 298.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 298.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 300.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 298.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/03/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e José Wilson

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/03/2017	29/03/2018	-	28/03/2017	01/03/2017	-	18%	Em Andamento	
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/ SUDENE	28/03/17	27/04/17		28/03/17	27/04/17		100%	Concluído	
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/ SUDENE	28/03/17	27/04/17		28/03/17	27/04/17		100%	Concluído	
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/ SUDENE	29/12/17	29/03/18		20/04/17			30%	Em Andamento	
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/ SUDENE	28/04/17	28/01/18		29/08/17	06/09/17		100%	Concluído	
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/ SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído	
6	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/ SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	27/02/2019	R\$ 298.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar	
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Extremoz	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 59.600,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Extremoz	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar	

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Extremoz	01/04/18	15/04/18				0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 238.400,00			0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Extremoz	01/05/18	27/01/19				0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/ SUDENE	28/01/19	27/02/19				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/03/2019	22/03/2020	-			0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/ SUDENE	28/03/19	22/03/20				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 298.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:												
Município de Extremoz/RN												
Observações:												
Convênio nº 850666/2017												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.48
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	252.430,48

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 50.000,00	R\$ 486,10	jan/18	R\$ 50.486,10	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 1.944,38	abr/18	R\$ 201.944,38	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 2.430,48		R\$ 252.430,48	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	21/09/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Isis Guimarães

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2017	29/03/2018	-	15/03/2017	01/03/2017	-	18%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/17	27/04/17		15/03/17	27/04/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/17	27/04/17		15/03/17	27/04/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		13/04/17			50%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	28/04/17	28/01/18		11/10/17	26/10/17		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/08/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Bom Jesus	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Bom Jesus	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Bom Jesus	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Bom Jesus	01/05/18	29/07/19					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/07/19	29/08/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/09/2019	21/09/2020	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/09/19	21/09/20					0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Bom Jesus/RN												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.49
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Estrada Vicinal com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	390.020,00	418.499,20

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 78.004,00	R\$ 5.695,84	jan/18	R\$ 83.699,84	A realizar no exercício	R\$ 390.020,00
R\$ 234.012,00	R\$ 17.087,52	mai/18	R\$ 251.099,52	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 78.004,00	R\$ 5.695,84	ago/18	R\$ 83.699,84	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 390.020,00	R\$ 28.479,20		R\$ 418.499,20	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 390.020,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	23/04/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Flávio Lago

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		16/08/2017	29/03/2018	-	16/08/2017	01/03/2017	-	13%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	16/08/17	08/09/17		16/08/17	08/09/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	16/08/17	08/09/17		16/08/17	08/09/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	09/09/17	28/01/18					0%	Atrasado	Visita planejada; aguardando recursos	Visita em planejamento
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	31/03/2019	R\$ 390.020,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Mutuípe	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 78.004,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Mutuípe	01/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Mutuípe	01/05/18	15/05/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/05/18	30/05/18	R\$ 234.012,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Mutuipe	01/06/18	30/07/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Mutuipe	01/08/18	15/08/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/08/18	30/08/18	R\$ 78.004,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Reforma e Ampliação (Parte 3) -	Município de Mutuipe	01/09/18	28/02/19					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/03/19	31/03/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/04/2019	23/04/2020	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/04/19	23/04/20					0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 390.020,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	13%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Mutuipe/BA													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.50
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Manifestações patológicas em Feira Livre		
Projeto:	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra		
Objetivo do projeto:	Recuperar e ampliar estrutura da Feira Livre		



Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	350.000,00	7.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
		Jan	R\$ 71.400,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 70.000,00	R\$ 1.400,00	Jan	R\$ 71.400,00	A realizar no exercício	R\$ 350.000,00
R\$ 210.000,00	R\$ 4.200,00	Fev	R\$ 214.200,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 70.000,00	R\$ 1.400,00	Maio	R\$ 71.400,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 350.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 357.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 350.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	21/09/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Marcelo Saiki

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		21/06/2017	29/09/2018	-	21/06/2017	29/03/2018	-	18%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	13/06/17	20/06/17		13/06/17	20/06/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	21/06/17	22/08/17		21/06/17	22/08/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		08/07/17		-	50%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	21/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18		17/01/18	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	29/07/2019	R\$ 350.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Bom Jesus da Serra	01/01/18	05/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/01/18	15/01/18	R\$ 70.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Bom Jesus da Serra	16/01/18	31/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Bom Jesus da Serra	01/02/18	10/02/18				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	11/02/18	28/02/18	R\$ 210.000,00			0%	A Iniciar			
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Bom Jesus da Serra	01/03/18	30/04/18				0%	A Iniciar			
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Bom Jesus da Serra	01/05/18	15/05/18				0%	A Iniciar			
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/05/18	30/05/18	R\$ 70.000,00			0%	A Iniciar			
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Reforma e Ampliação (Parte 3) -	Município de Bom Jesus da Serra	01/06/18	29/06/19				0%	A Iniciar			
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	30/06/19	29/07/19	-			0%	A Iniciar			
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/09/2019	21/09/2020	-			0%	A Iniciar			
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/09/19	21/09/20	-			0%	A Iniciar			
				Valor total previsto:		R\$ 350.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Município de Bom Jesus da Serra/BA													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.51
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (M):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (M):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Gargalos relacionados ao escoamento de Produção		
Projeto:	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	260.592,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 50.000,00	R\$ 2.118,40	jan/18	R\$ 52.118,40	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 8.473,60	abr/18	R\$ 208.473,60	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 10.592,00		R\$ 260.592,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	22/02/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e José Aildo

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/06/2017	01/03/2018	-	22/06/2017	01/03/2017	-	16%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	17/06/17	21/06/17		17/06/17	21/06/17		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/06/17	22/08/17		22/06/17	22/08/17		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18					0%	A Iniciar		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	22/06/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17		29/12/17	29/12/17		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/17	17/01/17		17/01/17	17/01/17		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	15/01/2019	R\$ 250.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Apurema	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 50.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Apurema	01/02/18	30/03/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Apurema	01/04/18	15/04/18					0%	A Iniciar		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/04/18	30/04/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Apuarema	01/05/18	29/12/18					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/19	15/01/19					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		27/02/2019	22/02/2020	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/02/19	22/02/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	16%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Apuarema/BA												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.52
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Estrada Vicinal com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Desatualizado

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	300.000,00	337.577,10

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 60.000,00	R\$ 7.515,42	jan/18	R\$ 67.515,42	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 18.788,55	mar/18	R\$ 168.788,55	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 90.000,00	R\$ 11.273,13	jun/18	R\$ 101.273,13	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 37.577,10		R\$ 337.577,10	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	20/06/2020
Data Atualização:	16/02/2018

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos e Victor Uchoa

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		07/08/2017	29/03/2018	-	07/08/2017	01/03/2017	-	18%	Em Andamento		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	07/08/17	05/12/17	-	07/08/17	05/12/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	07/08/17	05/12/17	-	07/08/17	05/12/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	29/12/17	29/03/18		11/08/17		-	50%	Em Andamento		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	06/12/17	28/01/18		11/10/17			80%	Atrasado	Relatório de Acompanhamento não inserido no Siconv	Cobrado ao Analista Técnico a inserção no Siconv
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	29/12/17	29/12/17	-	29/12/17	29/12/17	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/01/18	17/01/18	-	17/01/18	17/01/18	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/01/2018	27/05/2019	R\$ 300.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Cel. João Pessoa	01/01/18	15/01/18					0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 60.000,00				0%	Atrasado	Projeto básico em elaboração	Cobrada celeridade na apresentação do Projeto Básico
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Reforma e Ampliação (Parte 1) -	Município de Cel. João Pessoa	01/02/18	28/02/18					0%	A Iniciar		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Cel. João Pessoa	01/03/18	15/03/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/03/18	30/03/18	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Reforma e Ampliação (Parte 2) -	Município de Cel. João Pessoa	01/04/18	30/05/18					0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Cel. João Pessoa	01/06/18	15/062018					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/06/18	30/06/18	R\$ 90.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Reforma e Ampliação (Parte 3) -	Município de Cel. João Pessoa	01/07/18	27/04/19					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	28/04/19	27/05/19	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		26/06/2019	20/06/2020	-				0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	26/06/19	20/06/20	-				0%	A Iniciar		
				Valor total previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Cel. João Pessoa/RN												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VII –

Planos Operativos prioritários 2018, relacionados na Ata da 304^a Reunião Ordinária, da Diretoria Colegiada da SUDENE



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande e Entorno.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	José Farias Gomes Filho	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade, desigualdade econômico e social e carência de infraestrutura.			
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande 2015 e Municípios do Entorno - Fase 3 (Como fazer?)			
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, junção dos recursos de instituições públicas e privadas visando as oportunidades, e considerando segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e Entorno.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 200.000,00	

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Campina Grande e Entorno		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 0,00		R\$ 200.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 200.000,00
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 200.000,00
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	28/09/2018
Data Atualização:	21/06/2018

Ata 304ª Diretoria

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Tratativas e análises orçamentárias para fase 3 do PDE.	Tratativas e análises orçamentárias sobre a possibilidade de novo investimento da SUDENE com relação ao PDE Campina Grande e Entorno 2035 (Cidades de Fagundes, Lagoa Seca, Boa Vista, Queimadas, Massaranduba). Condicionantes técnicos e financeiros visando efetivar uma participação da SUDENE na FASE 3 do PDE Campina Grande e Municípios do Entorno.	SUDENE/ Diretoria Colegiada/DPLAN/ CGCP	01/02/2018	30/05/2018		01/02/2018	30/05/2018		100%	Concluído	Necessidade de constar em ata da Diretoria Colegiada a prioridade de financiamento da FAZE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035.	
2	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo.	Recepção pela SUDENE do Pleito de incentivo referente à terceira etapa do PDE Campina Grande e Entorno no valor de R\$200.000,00 (Produto 1 - Carteira de Projetos Estratégicos para a Cidade de Campina Grande e Municípios do Entorno). Comunicação oficial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, solicitando recursos da SUDENE visando implementar a fase 3 do plano de desenvolvimento naquela Região. Contendo Ofício e demais anexos do termo de Referência; estatuto do IFPB; Lei de criação do IFPB; certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos à tributos federais e a dívida ativa da União e Certificado de regularidade do FGTS	SUDENE/GAB	01/06/2018	05/06/2018		05/06/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Ofício n. 212/2018 - Reitoria/IFPB, assinado pelo então Reitor Cicero Nicácio do Nascimento Lopes.	
3	Elaboração de Parecer Equipe CGCP	Elaboração de Parecer SUDENE/DPLAN/CGEP referente à Procedência e adequação do PDE FASE 3 (TED) com foco nas atividades da SUDENE, em consonância com a Lei complementar 125/2007, Regimento interno e atividades fins da CGCP.	SUDENE DPLAN/CGCP	05/06/2018	15/06/2018		05/06/2018	06/06/2018		100%	Concluído		

4	Tramitação para a CCONT e Procuradoria Junto à SUDENE.	Trâmites para a formalização, celebração do TED e análise jurídica do instrumento.	SUDENE/CCONT/ PFSUDENE	15/06/2018	29/06/2018		15/06/2018			5%	Em Andamento	Enviado para a CCONT em 15/06/2018, conforme NETdoc 2018.03950.	
5	Liberação do recurso para o IFPB	Registra o TED, descentraliza o crédito para a Instituição efetiva.	SUDENE/DAD/CG AF/COC e IFPB	02/07/2018	13/07/2018					0%	A Iniciar		
6	Contração de serviços especializados para elaboração do PDE.	Objeto contratação de serviço pelo IFPB, visando a FASE 3 do plano. Solicitar documento ao IFPB para instrução do processo na SUDENE.	IFPB	13/07/2018	30/07/2018					0%	A Iniciar		
7	Acompanhamento da liberação do pagamento por produto apresentado	Autorização da SUDENE para liberação da primeira parcela	IFPB e SUDENE	30/07/2018	17/008/2018	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
8	Realização da FASE 3 do PDE Campina Grande e Entorno 2035	Produto 1: em suma, delianear cerca de 70 projetos prioritários com base nas Áreas de Resultados do do PDE Campina Grande e Entorno 2035 (FASES 1 e 2), a saber (1) cidade dinâmica, (2) cidade saudável e do bem viver,(3) cidade organizada e funcional, (4) cidade inclusiva, (5) cidade competetnte e inovadora.	IFPB	20/08/2018	31/10/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
9	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento com foco nos dois relatórios que devem ser encaminhados com as esecificações e detalhamento dos projetos prioritários.	SUDENE/DPLAN/ CGCP	01/11/2018	09/11/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 200.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	34%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
FIEP (PB) e IFPB.	
Observações:	

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	PO 4
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva		Ano:		2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Antônio Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.				
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.				
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	200.000,00	200.500,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
SET/2018	100.000,00	500,00	100.500,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
NOV/2018	100.000,00	-	100.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000,00	500,00	200.500,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	20/09/2019	Proposta SICONV 052519/2018
Data Atualização:	29/06/2018	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Elisa Teshima

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								1,7%	Em Andamento		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018			66,7%	Em Andamento		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	20/06/2018		100,0%	Em Andamento	Solicitação de ajustes enviada para o conveniente em 20/06/2018.	
1.2.2	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018					0,0%	Atrasado	Conveniente não enviou ajustes.	
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018					0,0%	Atrasado	Conveniente não enviou ajustes.	
2	Análise do projeto	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	28/06/2018	04/07/2018					0,0%	A Iniciar		
2.1	Visita técnica e emissão de Parecer	Verificação do local no qual será instalada a estação de monitoramento atmosférico padrão	CGEP/SUDENE	10/07/2018	18/07/2018					0,0%	A Iniciar		

2.2	Envio do projeto à CGDS para emissão de Parecer Técnico	Emissão de Parecer Técnico sobre os aspectos mais específicos do projeto	CGEP/SUDENE	18/07/2018	24/07/2018					0,0%	A Iniciar		
2.4	Parecer de Aprovação do projeto	Análise do projeto após ajustes	CGEP/SUDENE	25/07/2018	27/07/2018					0,0%	A Iniciar		
3	Encaminhamento para aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	30/07/2018	30/07/2018					0,0%	A Iniciar		
4	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018					0,0%	A Iniciar		
5	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	CGEP/SUDENE	13/08/2018	13/08/2018					0,0%	A Iniciar		
6	Parecer Técnico Final	Parecer Técnico final	CGEP/SUDENE	28/08/2018	31/08/2018					0,0%	A Iniciar	Considerando possíveis ajustes	
7	Envio para a CCONT para formalidades necessárias para a assinatura do convênio.	Procedimentos necessários para a assinatura do convênio.	CGEP/SUDENE	03/09/2018	03/09/2018					0,0%	A Iniciar		
8	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio	CGEP/SUDENE	06/09/2018	06/09/2018					0,0%	A Iniciar		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
9	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	10/09/2018	10/09/2018					0,0%	A Iniciar		
11	Análise/ Parecer sobre primeiro relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	12/11/2018	14/11/2018					0,0%	A Iniciar		
12	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	20/11/2018	22/11/2018					0,0%	A Iniciar		
13	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	23/11/2018	23/11/2018					0,0%	A Iniciar		
15	Análise/ Parecer sobre segundo relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	28/01/2019	30/01/2019					0,0%	A Iniciar		
18	Análise de relatório de execução - FINAL	Análise de relatório de execução - FINAL	CGEP/SUDENE	02/09/2019	06/09/2019					0,0%	A Iniciar	Até o final da vigência	
19	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento - FINAL	CGEP/SUDENE	10/09/2019	12/09/2019					0,0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
21	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGEP/SUDENE	16/09/2019	20/09/2019				--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	2%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

O projeto está em fase de análise da Proposta, por isso é provável que mudanças posteriores nas etapas sejam necessárias.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	PO 5
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva			Ano:		2018
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado e a agricultura irrigada nacional		
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		Objetivo estratégico (MI):	Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial		
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa, ainda, articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.					
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Antônio Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Ausência de dados solarimétricos e anemométricos que possam permitir a avaliação do potencial fotovoltaico e eólico para atender às demandas socioeconômicas de uma região de insuficiência e exclusão elétrica e, em sítios específicos, através de sensores de superfície instalados, medir o potencial solar e eólico e assim avaliar possíveis impactos de uma instalação solar para geração elétrica alternativa.					
Projeto:	Energia Fotovoltaica e Eólica Para Desenvolvimento Socioeconômico do Semiárido Baiano: Mapeamento de Convergência Demanda-Oferta.					
Objetivo do projeto:	Mapear o potencial solar e eólico para o atendimento de demandas socioeconômicas em regiões eletricamente excluídas do semiárido baiano.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	364.120,00	364.870,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
SET/2018	364.120,00	750,00	364.870,00	A realizar no exercício	R\$ 364.120,00
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	364.120,00	750,00	364.870,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 364.120,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	20/02/2020	Proposta SICONV 053087/2018
Data Atualização:	29/06/2018	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Germano P. Guedes

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								1,3%	Em Andamento		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	CGEP/SUDENE	08/06/2018	29/06/2018		08/06/2018			50,0%	Em Andamento		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Identificação do potencial de energia solar e eólica no Semiárido brasileiro - Código 5320320180018	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGEP/SUDENE	18/06/2018	29/06/2018		18/06/2018			50,0%	Em Andamento		
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	29/06/2018	29/06/2018		27/06/2018			50,0%	Em Andamento		
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	29/06/2018	29/06/2018					0,0%	A Iniciar		
2	Análise do projeto	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente	CGEP/SUDENE	02/07/2018	13/07/2018					0,0%	A Iniciar		
2.1	Visita técnica e emissão de Parecer	verificação do local no qual será instalada a estação de monitoramento atmosférico padrão	CGEP/SUDENE	10/07/2018	13/07/2018					0,0%	A Iniciar		

2.2	Envio do projeto à CGDS para emissão de Parecer Técnico	Emissão de Parecer Técnico sobre os aspectos mais específicos do projeto	CGDS/SUDENE	13/07/2018	13/08/2018					0,0%	A Iniciar		
2.3	Parecer de Aprovação do projeto	Análise do projeto após ajustes	CGEP/SUDENE	20/08/2018	22/08/2018					0,0%	A Iniciar		
3	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	23/08/2018	24/08/2018					0,0%	A Iniciar		
4	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CCONT/SUDENE	27/08/2018	31/08/2018					0,0%	A Iniciar		
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	03/09/2018	17/09/2018					0,0%	A Iniciar		
6	Parecer Técnico Final	Parecer Técnico final	CGEP/SUDENE	18/09/2018	19/09/2018					0,0%	A Iniciar	Considerando possíveis ajustes	
7	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CCONT/SUDENE	20/09/2018	20/09/2018					0,0%	A Iniciar		
8	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CCONT/SUDENE	21/09/2018	21/09/2018					0,0%	A Iniciar		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	SUDENE	21/09/2018	21/09/2018	R\$ 364.120,00				0,0%	A Iniciar		
10	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/11/2018	16/11/2018					0,0%	A Iniciar		
11	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	19/11/2018	21/11/2018					0,0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	SUDENE	23/11/2018	23/11/2018					0,0%	A Iniciar		
13	Envio de relatório de execução parcial	Envio de relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	12/03/2019	12/03/2019					0,0%	A Iniciar		
14	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/03/2019	18/03/2019					0,0%	A Iniciar		
15	Análise/ Parecer sobre relatório	Análise/ Parecer sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	13/06/2019	18/06/2019					0,0%	A Iniciar		
16	Envio de relatório de execução - FINAL	Envio de relatório de execução - FINAL	CGEP/SUDENE	20/09/2019	20/09/2019					0,0%	A Iniciar	Até o final da vigência	
17	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	17/09/2019	19/09/2019					0,0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
18	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGEP/SUDENE	20/02/2020	20/02/2020				--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:	R\$ 364.120,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	1%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana/BA

Observações:

O projeto está em fase de análise da Proposta, por isso é provável que mudanças posteriores nas etapas sejam necessárias.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2018**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 9
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				Ano:	2018
Programa do PPA:	-		Eixo temático (MI):	-		
Ação do PPA:	-		Objetivo estratégico (MI):	-		
Objetivo da ação:	-					
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Uma gestão fiscal eficiente é uma condição para que os municípios possam dispor de recursos e canalizá-los para o atendimento das demandas dos municípes, contribuindo para a elevação da satisfação da comunidade e para a melhoria dos índices de desenvolvimento local.					
Projeto:	Avaliação financeira dos municípios da área de atuação da Sudene					
Objetivo do projeto:	Realização de estudo para a avaliação da situação fiscal dos municípios da área de atuação da Sudene.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/09/2018
Data Atualização:	29/06/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogério de Melo Barbosa

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		Marina Barbosa	18/06/2018	31/08/2018		18/06/2018			25%	Em Andamento		
1.1	Levantamento bibliográfico	Levantamento da literatura e referencial teórico.	Marina Barbosa	18/06/2018	29/06/2018		18/06/2018	29/06/2018		100%	Concluído		
1.2	Identificação das bases de dados	Levantamento de bases de dados no excel e no access	Marina Barbosa	02/07/2018	06/07/2018					0%	A Iniciar		
1.3	Identificar os indicadores	Listar indicadores e seus respectivos metadados.	Marina Barbosa	09/07/2018	13/07/2018					0%	A Iniciar		
1.4	Tratamento dos dados	Verificar os links dos dados dos indicadores, se irão para bases de dados ou se podem ser puxados via powerbi.	Marina Barbosa	16/07/2018	31/08/2018					0%	A Iniciar		
2.	Análise		Marina Barbosa	31/08/2018	30/09/2018					0%	A Iniciar		
2.1	Calendário de atualização	Elaboração de calendário de atualização dos dados dos indicadores	Marina Barbosa	31/08/2018	15/09/2018					0%	A Iniciar		
2.2	Organização e armazenamento de dados em bases de dados	Organizar e armazenar dados em um base de dados protegida e atualizada.	Marina Barbosa	15/09/2018	30/09/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	12.5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
