

Acompanhamento da Execução Programática da Sudene



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

3º Ciclo de Monitoramento
e Avaliação 2020

RELATÓRIO



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE
3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2020**

**RECIFE/PE
2021**

Sumário

1.	Introdução	1
2.	Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários	2
3.	Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	8
4.	Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	21
5.	Indicadores de Gestão de Convênios	28
7.	Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	38
8.	Metas de desempenho institucional para o período out/2020 - set/2021	50
9.	Conclusão	59

Lista de Anexos

ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento

ANEXO II - Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até dezembro/2020)

ANEXO III - Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

ANEXO VI – Planos Operativos Prioritários

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

ANEXO VIII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA

ANEXO IX – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

1. Introdução

O presente relatório refere-se ao **3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2020** dos projetos, que aqui se denominam planos operativos. É importante destacar que o referido ciclo teve data de fixação da apuração dos dados até 31/12/2020 e manteve o processo de monitoramento de sua programação com base no planejamento estratégico vigente, tendo sido elaborado com base na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada pela 121ª reunião da Diretoria Colegiada em 01/11/2012.

Neste relatório serão apresentados os planos operativos considerados estratégicos pela administração da Sudene, por meio de planilhas em Excel (Anexos I e VI). As referidas planilhas permitem maior visibilidade do projeto tendo em vista que dispõe de informações sobre: condição da execução (recursos que são utilizados no projeto, seu alinhamento com a programação estratégica da autarquia e com a programação orçamentária do PPA), percentual de avanço, etapas, problemas verificados na execução de alguma etapa e suas medidas de mitigação de risco, bem como o status (se em andamento, atrasado, iniciando, concluído, ou paralisado). Adicionalmente, encontram-se vários indicadores de gestão das áreas meio, fim e de gestão da comunicação com a sociedade.

É importante esclarecer que devido à pandemia do coronavírus alguns projetos sofreram impactos e não corresponderam ao esperado. Tal fato é explicado pelas dificuldades enfrentadas pelas entidades convenientes, da mesma forma que órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, que concentraram seus esforços, principalmente seus recursos financeiros, naquilo que se mostrou mais imediato, que foi o combate e o socorro aos atingidos pela pandemia, influenciando isso na performance orçamentária.

Neste terceiro ciclo de 2020 foram mapeados **221** projetos, dos quais: 12 estão concluídos, 177 estão em andamento, 3 foram cancelados, 18 atrasados em sua execução, 10 paralisados e 1 está por iniciar.

De acordo com as apurações feitas até 31 de dezembro/2020, a unidade com maior quantidade de projetos foi à Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC), totalizando 153 (engloba as emendas parlamentares); a que tem menor número é a Comissão Permanente De Tomada de Contas Especial (CPTCE) com apenas 1 projeto, ambas estão vinculadas à Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN). No decorrer do relatório será apresentado um quadro com os quantitativos e status dos projetos por unidades.

Esclarecemos que internamente, a Sudene cumpriu com as normas de saúde pública ao se adaptar às restrições de mobilidades decorrentes do combate à Covid-19, tendo instituído trabalho remoto entre os meses de março a julho de 2020, e um regime de trabalho híbrido, com horário reduzido presencialmente, ao longo do restante do exercício de 2020, situação que se mantém até a elaboração deste Relatório. Diante de tal fato tornou-se inviável a realização da apresentação presencial dos resultados do 3º ciclo de monitoramento para a alta administração, coordenadores-

gerais e demais servidores responsáveis por planos operativos. Sendo assim, foi elaborado o presente relatório para divulgação interna e externa dos resultados alcançados pela Sudene

Com o objetivo de manter a transparência e o princípio da impessoalidade, o referido documento será disponibilizado no site da Sudene por meio do link: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/gestao-institucional> para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da instituição em sua área de atuação. Entende-se que dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e acesso à informação.

2. Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários

Este tópico apresentará a situação dos Planos operativos que são conduzidos pelas unidades finalísticas, de gestão, de suporte e de controle da Sudene. Entende-se como Planos Prioritários as atividades e projetos interdisciplinares e de alta complexidade ligados diretamente ao atingimento da finalidade da autarquia, que é a promoção do desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

É importante esclarecer que os planos prioritários foram submetidos e aprovados pela Diretoria Colegiada, por meio os documentos: ata da 304ª reunião da Diretoria Colegiada, de 16 de maio de 2018 e Resolução nº 281/2017. Isso explica o fato de estarem separados por anos 2017 e 2018.

2.1 – Resultados Gerenciais do 3º Ciclo de Monitoramento 2020

O quadro abaixo apresenta o quantitativo por unidades responsáveis pelos Projetos, sendo estes classificados de acordo com a sua Coordenação-Geral, com exceção dos do caso da CGDS, que dado o número de projetos, se decidiu especificar aqueles de responsabilidade da COCIC dos demais da Coordenação-Geral.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 3º ciclo 2020, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN				DFIN	DAD		TOTAL
	CGDS	CGEP	CGCP	COCIC	CGDF	CGGP	CPTCE	-
A Iniciar					1			1
Concluído	1			11				12
Em Andamento	19	12	3	137	3	2	1	177
Atrasado		2		4	12			18
Cancelado		3						3
Paralisado	4	2	1	1	2			10
TOTAL	24	19	4	153	18	2	1	221

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

As tabelas 1, 2 e 3 mostram, respectivamente, a distribuição e performance dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE; programas e ações do PPA; e, segundo as unidades administrativas. E o Gráfico 1, em sequência, apresenta a evolução ao longo dos ciclos de monitoramento de 2020, dos projetos monitorados na Sudene.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Diretrizes e Objetivos Estratégicos, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2020**

Diretriz Estratégica 1	Objetivo Estratégico 1	Projetos enquadrados 2 (Qtde)	Recursos previstos ³	Recursos liberados	STATUS ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	196	5.402.119,27	4.429.898,17		11	163	16		6	196
	1.2	1	199,40	0,00			1				1
	1.3	8	358,80	0,00	1		2	1	3	1	8
	1.4	4	864,60	864,60			3			1	4
	1.5	3	60,87	60,87			1	1		1	3
Sub-Total		212	5.403.602,94	4.430.823,64	1	11	170	18	3	9	212
2	2.1	1	0,00	0,00			1				1
	2.2	1	0,00	0,00			1				1
	2.3	2	989,48	989,48			1			1	2
Sub-Total		4	989,48	989,48	0	0	3	0	0	1	4
3	3.1	5	75,00	20,21		1	4				5
Sub-Total		5	75,00	20,21	0	1	4	0	0	0	5
TOTAL		221	5.404.667,42	4.431.833,34	1	12	177	18	3	10	221

Posição em Dezembro/2020.

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.1.** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.2.** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; **2.3**- Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2020**

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2217	0355	15	5.296.265,48	4.380.950,01			2	12		1	15
	20N7	1	343,59	343,59						1	1
	8689	2	989,48	989,48			1			1	2
	8902	3	1.693,84	339,52			3				3
	8917	3	1.030,44	1.030,44			2			1	3
	20WQ	7	6.604,42	2.937,72			6			1	7
	7K66	124	73.603,36	30.617,02		8	112	3		1	124
	214S	29	17.197,49	14.055,34		2	26	1			29
	8340	14	3.050,10	550,00		1	11			2	14
2217	4640	3	1.414,78	0,00			3				3
Sub-Total		201	5.402.192,98	4.431.813,12		11	166	16		8	201
Sub-Total		0	0,00	0,00							
2111	2000	5	75,00	20,21		1	4				5
Sub-Total		5	75,00	20,21		1	4				5
Ações Internas		15	708,30	0,00	1		7	2	3	2	15
Sub-Total		15	708,30	0,00	1		7	2	3	2	15
TOTAL		221	5.402.976,28	4.431.833,34	1	12	177	18	3	10	221

Posição em Dezembro/2020

3º Ciclo 2020

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2020-2024: **Programa 2217** - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (Ações: **20WQ** -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **8917**- Fortalecimento das Administrações Locais; **7K66** – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado -**0355** – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; **20N7** – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; **8689** – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; **8902** – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - **Ação 4640** - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; **Programa 2111** – **Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação **2000** – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. ⁴ Recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2020**

Diretoria ¹	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (Qtde)	Recursos previstos ³	Recursos liberados	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	24	8.422,24	3.253,03		1	19			4	24
	CGEP	19	4.244,80	985,00			12	2	3	2	19
	CGCP	4	4.258,46	1.952,72			3			1	4
	COCIC	2	0,00	0,00		11	137	4		1	153
Sub-Total		49	16.925,49	6.190,75	0	12	171	6	3	8	200
DFIN	CGDF/FDNE	18	5.296.265,48	4.380.950,01	1	0	3	12		2	18
Sub-Total		18	5.296.265,48	4.380.950,01	1	0	3	12	0	2	18
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				1
	CGGP	2	75,00	20,21			2				2
Sub-Total		3	75,00	20,21	0	0	3	0	0	0	3
TOTAL		70	5.313.265,97	4.387.160,97	1	12	177	18	3	10	221

Posição em Dezembro/2020.


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/siglas-outubro-2019-pdf>

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Gráfico 1 - Gráfico Comparativo dos Projetos nos ciclos anteriores

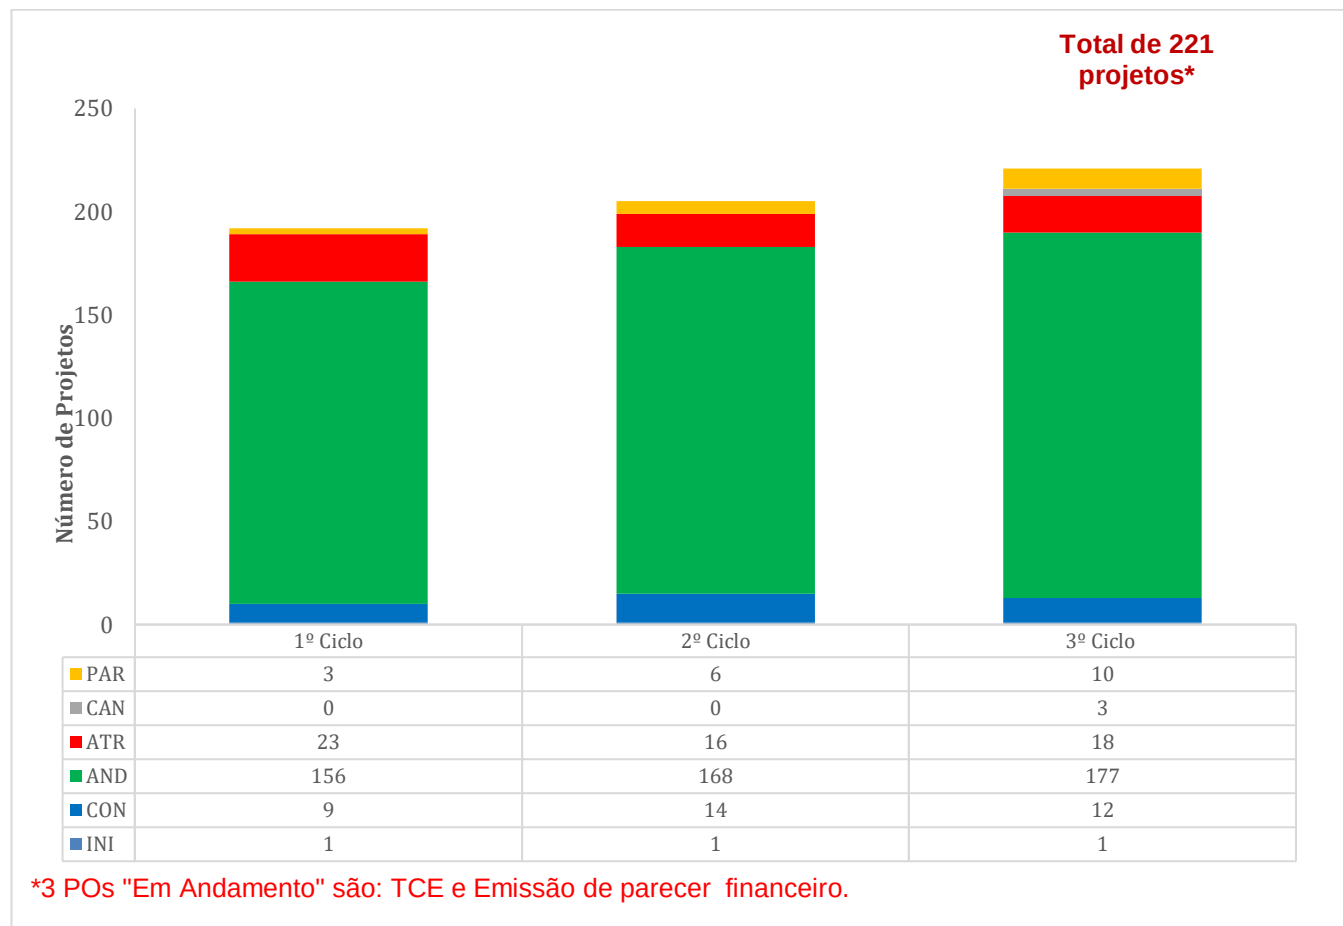

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional


3. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{20 \times 100}{20} = 100\%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Não informado
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	100%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	100%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	100%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	100%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	100%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	100%	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica

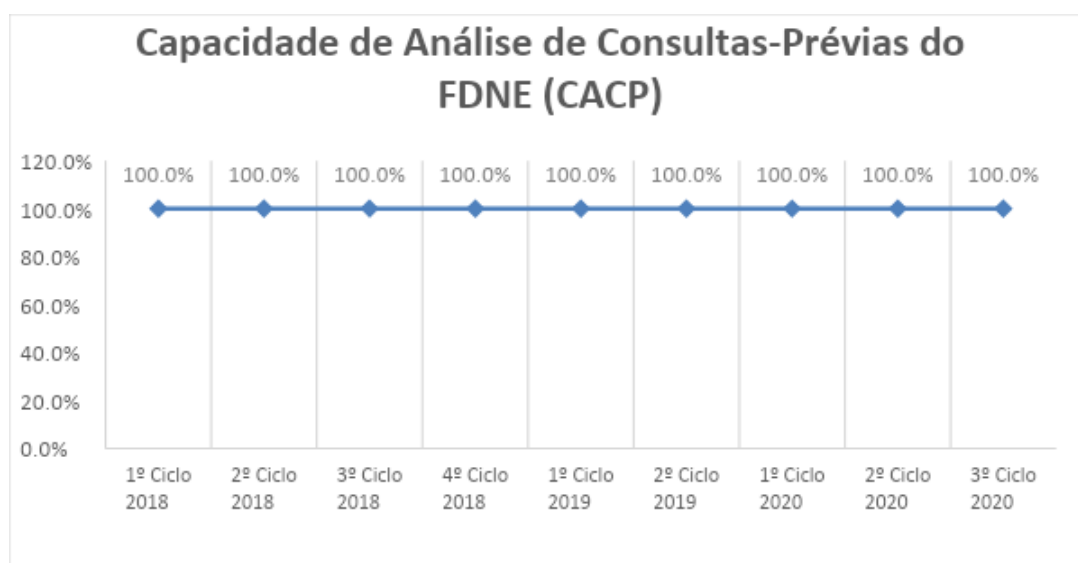

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência


não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévia do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{20}{3} = 6,7 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévia no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	16,50 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,5 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	3,67 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	4,33 análises/técnico	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	3,75 análises/técnico	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	6,33 análises/técnico	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	2,33 análises/técnico	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	4,5 análises/técnico	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica:

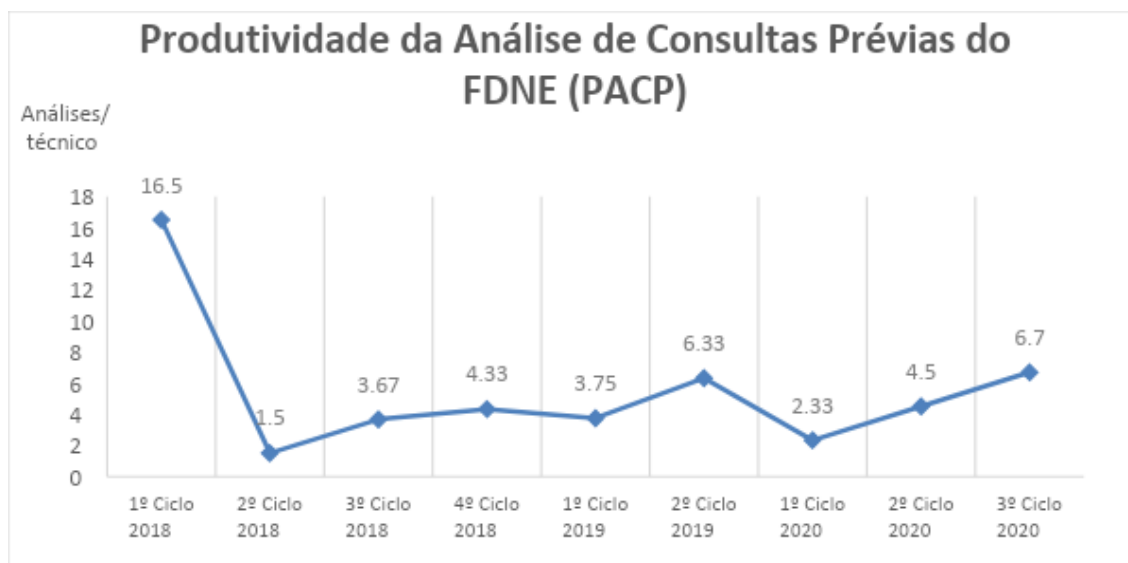

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

3.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{9 \times 100}{20} = 45,0\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	77,3%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	50%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	54,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	61,5%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	53,3%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	68,4%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	14,3%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	44,40%	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica:

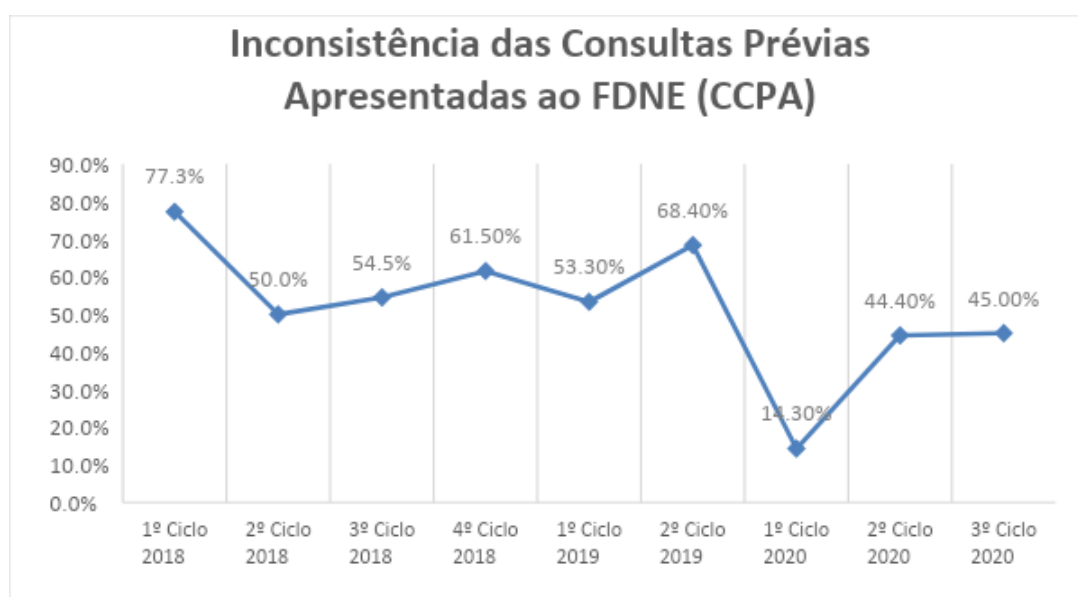

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{127,33 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,85$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

$$\text{a) Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$$


- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal (índice): igual ou menor que 1 (um).
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.

f) Comentários: O prazo considerado inclui as prorrogações legais previstas (Art. 20 do Regulamento do FDNE aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012). Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	BNB 1,39; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	BNB 0,00; BB 0,66; CEF 0,00	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	BNB 0,00; BB 0,66; CEF 0,00	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	BNB 0,00; BB 0,88; CEF 0,00	2º ciclo 2020


h) Representação gráfica:



Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

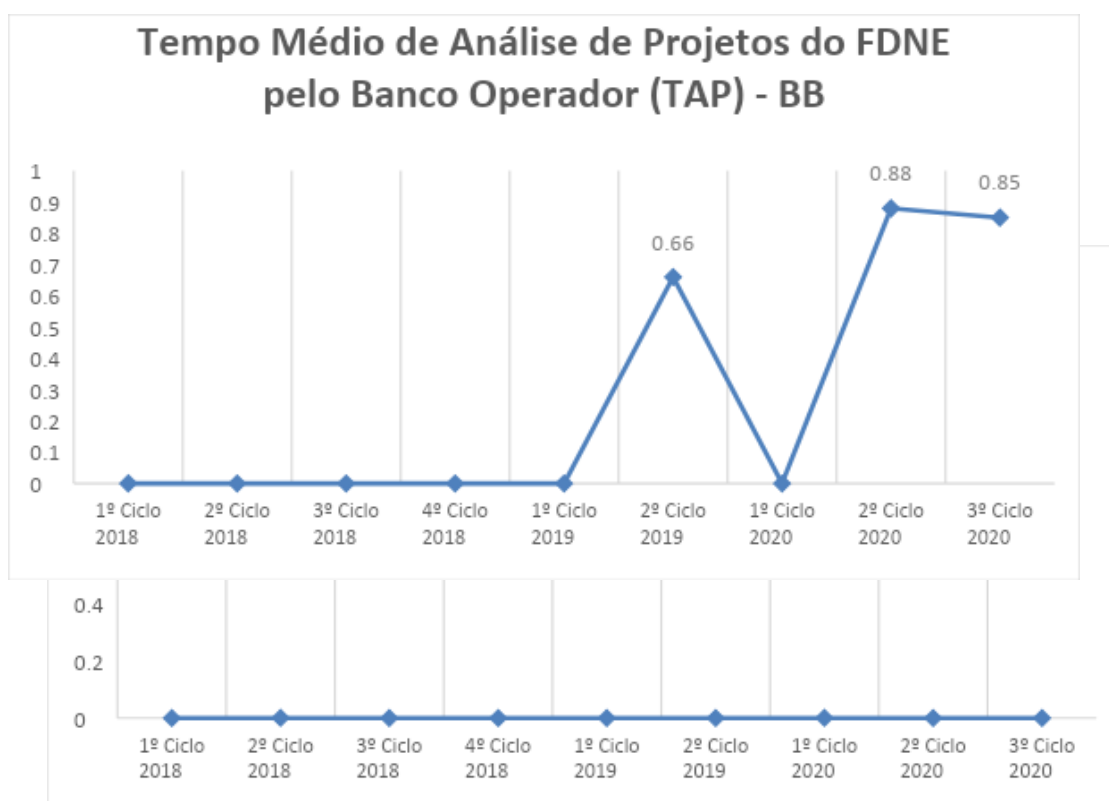

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados, podendo estender-se até 150 dias.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos despendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

3.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP).

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{6} = 0\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	BNB 0%; BB 0%; CEF 100%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º CICLO 2020

- h) Representação gráfica:


Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA) - BNB

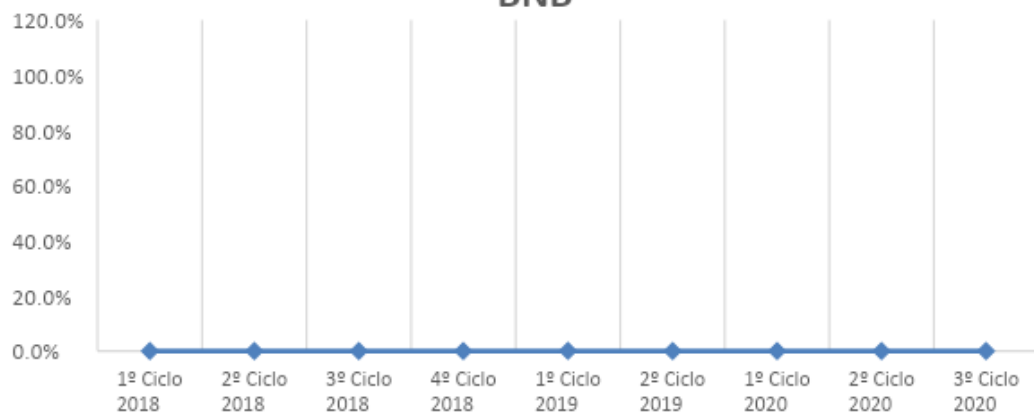

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA) - BB

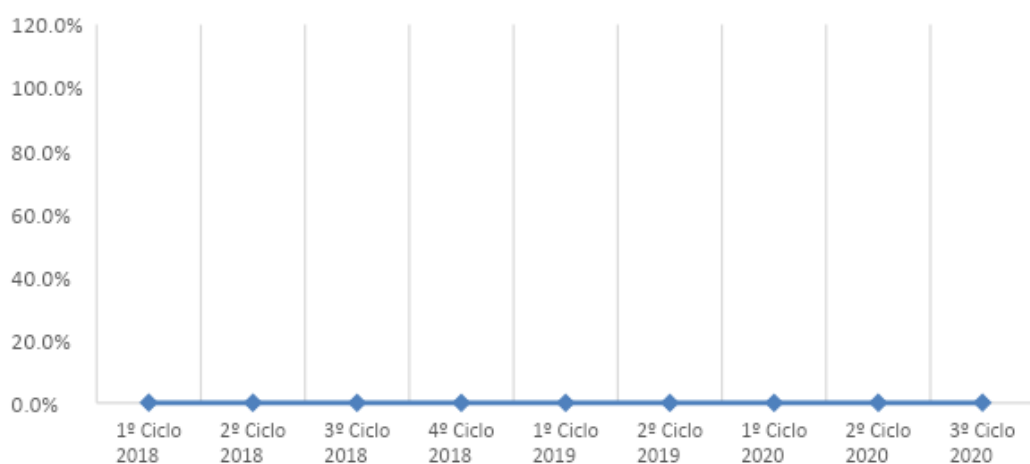

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Inconsistência dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA) - CEF

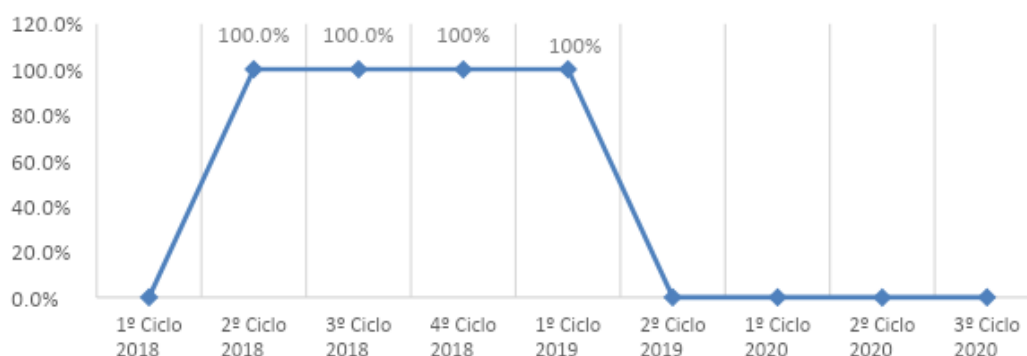

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado 2020} \times 100}{\text{Dotação 2020}} = \frac{493.382.175,01 \times 100}{2.744.106.748,00} = 17,98\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Foram utilizados os dados da Dotação total do FDNE para o exercício de 2020, que inclui o valor previsto na LOA2020 (R\$ 682.632.547,00), o Suplemento (PLN 43/2020) - Excesso de arrecadação 2020 (R\$ 376.070.213,00) e o Suplemento (PLN 43/2020) - Superávit anos anteriores (R\$ 1.685.403.988,00).
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	47,9%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	39,7%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	0,00%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	7,25%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	9,72%	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica:

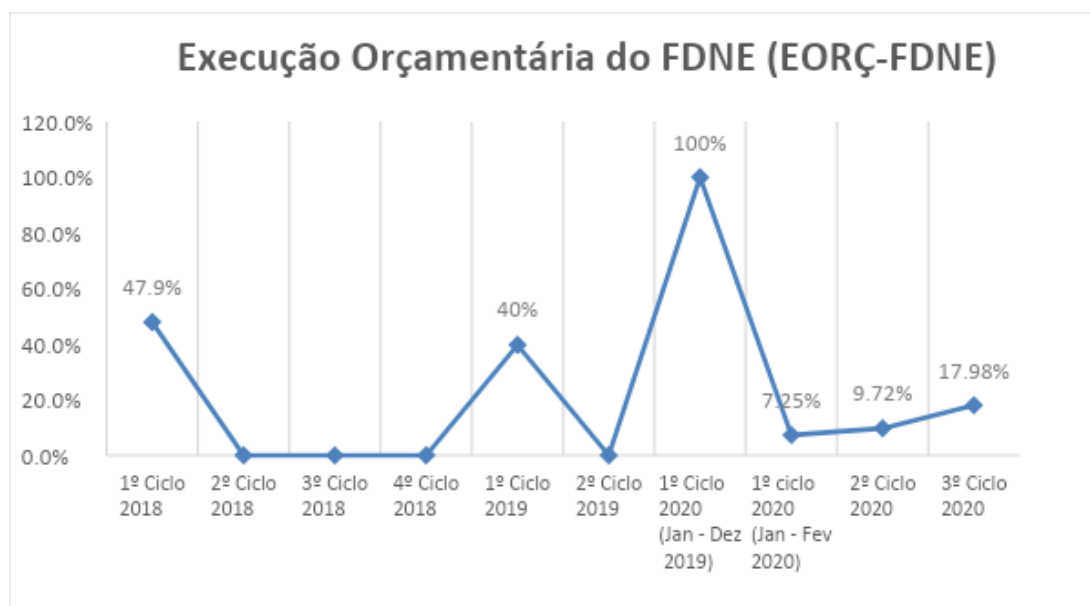

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{334.186.595,55 \times 100}{2.231.132.802,60} = 14,98\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	9,30%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	3,05%	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	5,29%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	6,77%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	6,11%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	10,26%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0,00%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	1,88%	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

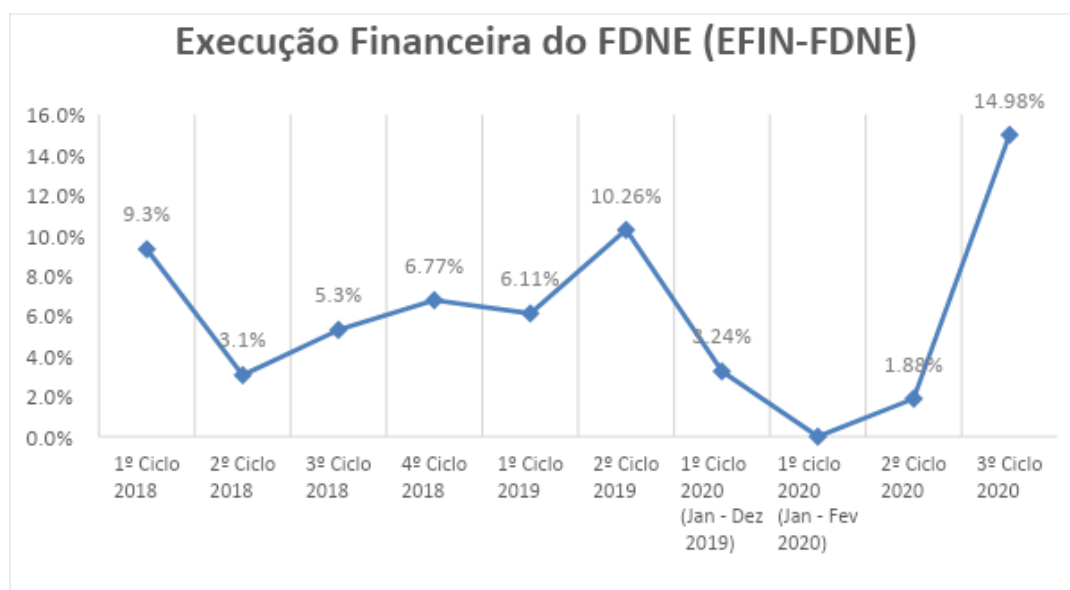

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{27}{30} = 0,90$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Quanto menor, melhor).


e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0,5	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	0,93	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0,0	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	0,93	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

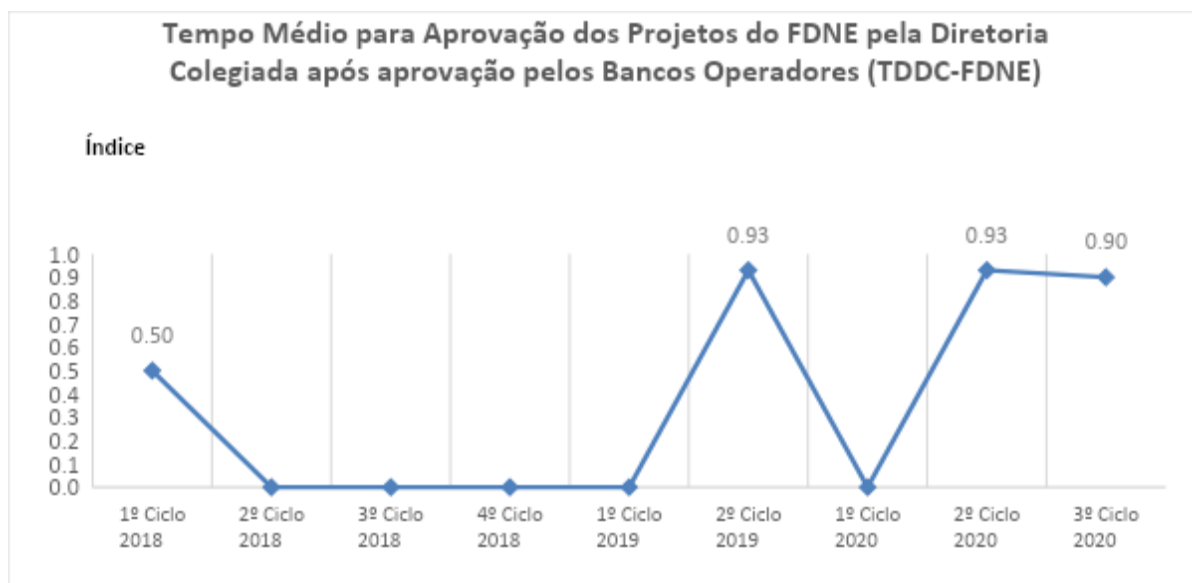

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:


¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

3.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{1938 \text{ dias}}{6 \text{ financiamentos aprovados}} = 323 \text{ dias/financiamento aprovado}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor).
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	252 dias	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,0 dias	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0 dias	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0 dias	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0 dias	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	244 dias	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0 dias	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	274	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica:

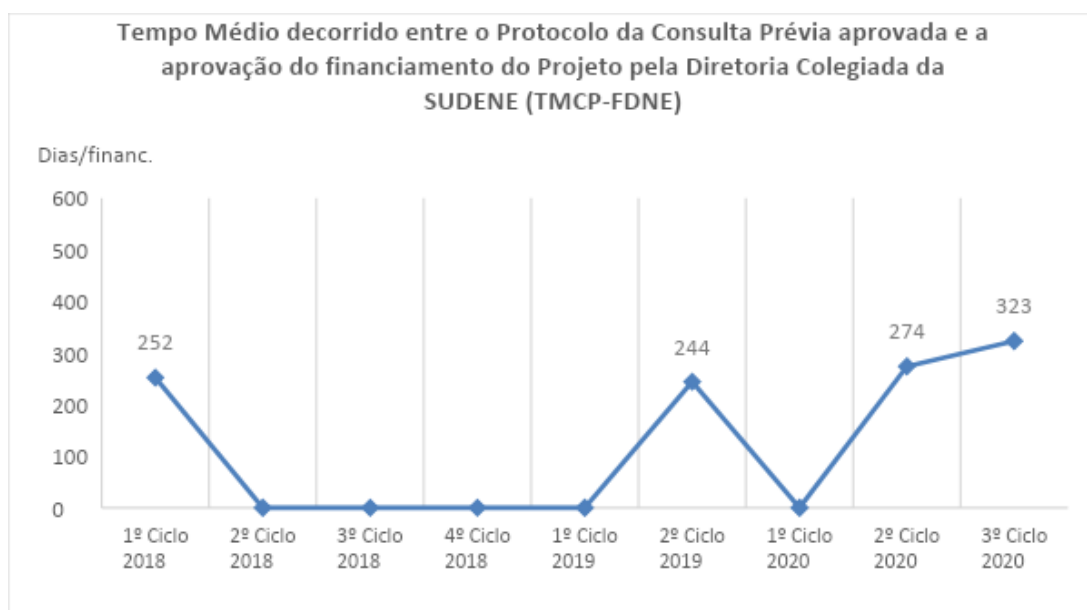

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:


- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

3.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{6}{6}$$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento.
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan a Dez/2020.
- f) Comentários: Não informado
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	1,0	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	0,0	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	0,0	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,0	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,0	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	1,0	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0,0	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	0,0	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

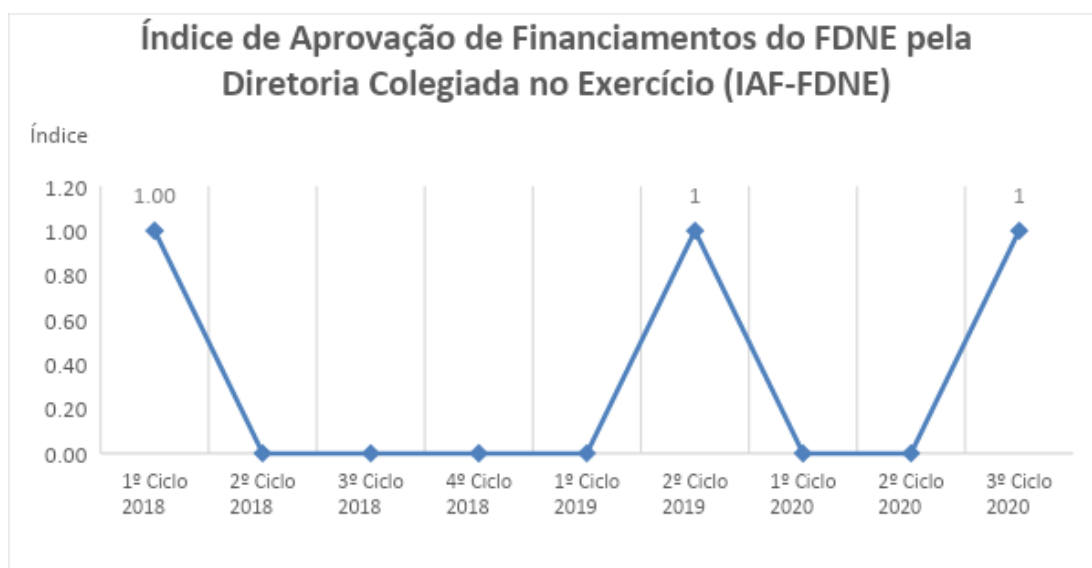

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

4. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)


- a) Fórmula: $T_1 = \frac{24.446}{N} = \frac{24.446}{157} = 155,7$ dias
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan a dez/2020.
- f) Comentários: O presente período de avaliação (janeiro a dezembro de 2020) sofreu a influência da decisão do Tribunal de Contas da União – TCU, ainda em 2019 e da Pandemia do COVID-19 por dois motivos: a decisão do TCU postergou o início das vistorias em 2019 para o mês de agosto daquele ano e a Pandemia postergou o início das vistorias em 2020 para o mês de agosto.
- g) Desse processo fazem parte 24 pleitos que foram inscritos em final de 2018, mas que somente puderam ter suas vistorias iniciadas a partir do último quadrimestre de

2019 e que somente tiveram concluídas suas análises para aprovação pela Diretoria Colegiada em 2020.

- h) O mesmo aconteceu com os 18 pleitos que, inscritos em 2019 somente tiveram seus exames concluídos em 2020, pelas razões já explicadas.
- i) Por conta disso, o prazo médio de vistoria para os 24 pleitos inscritos em 2018 foi de 504,7 dias. Para os inscritos em 2019, o prazo médio de vistoria foi de 269,6 dias, o que afetou de maneira significativa o prazo médio total dos 157 pleitos vistoriados.
- j) Com efeito, se considerarmos apenas os pleitos que ingressaram em 2020 e que foram aprovados no mesmo ano, o prazo médio de vistoria se reduziu para 73,4 dias.
- k) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	64,7 dias/processo	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	93,5 dias/processo	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	81,6 dias/processo	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	64,8 dias/processo	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	48,4 dias/processo	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	220 dias/processo	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	262,7 dias/processo	2º ciclo 2020

- l) Representação gráfica:

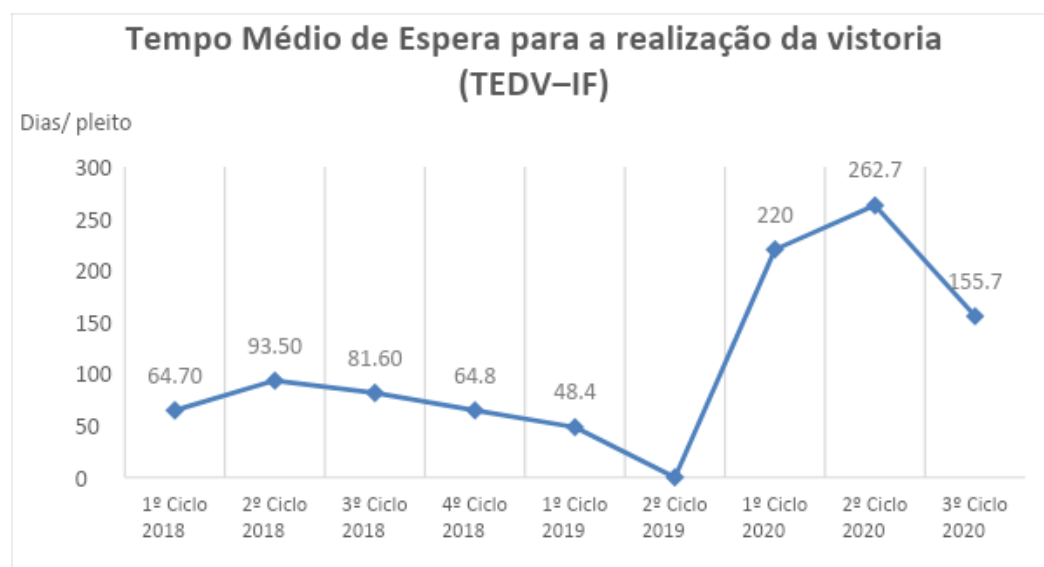

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

4.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{258} = 0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.

d) Resultado ideal (%): quanto menor melhor.


e) Periodicidade: Jan a dez/2020.

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	0,00%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	0,00%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	0,00%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	0,00%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	0,003%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0,00%	1º ciclo 2020
Jan/2020 a Set/2020	0%	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

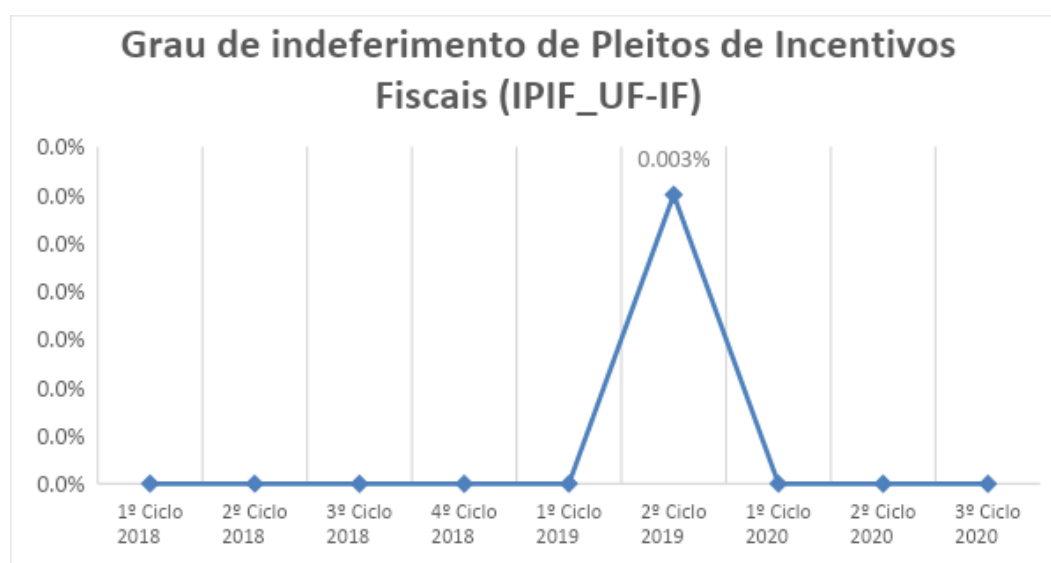

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.
- (4) o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado entre 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 (258 processos), acrescido do número de processos em exame, na referida data (53 processos).
- (5) **Importante ressaltar que os pleitos que ainda se encontram em exame devem atender a todos os requisitos estabelecidos na Resolução 555/2020, que trata da vistoria virtual. Desses 53 pleitos em exame, quase todos se encontram no aguardo da vistoria remota.**


4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF).

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{258 \times 100}{311} = 82,9\%$$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan a dez/2020.
- f) Comentários: no período, foram concluídas 258 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 82,9% dos pleitos ingressados.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	93,9 %	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	81%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	66,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	93,9%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	66,4%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	66,7%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	87,4%	1º ciclo 2020
Jan/2020 a Set/2020	47%	2º ciclo 2020

- h) Representação gráfica:

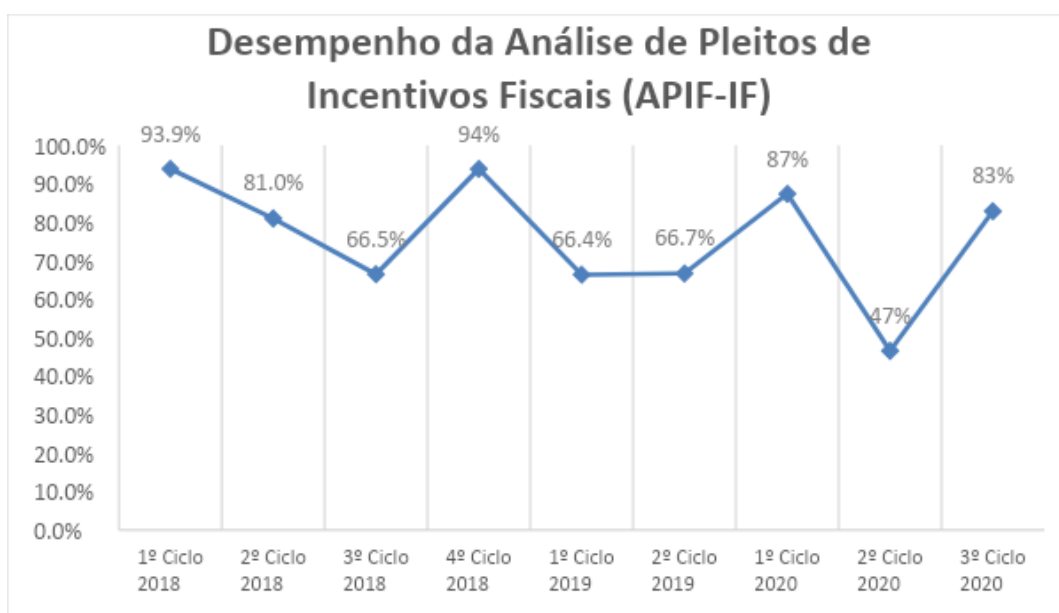

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:
$$\frac{T1}{N} = \frac{40.738}{258} = 157,9 \text{ dias}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.
- d) Resultado ideal (índice): quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: Jan a dez/2020.
- f) Comentários: aqui a mesma vale observação feita para o prazo observado entre a data de ingresso do pleito e a data da vistoria.

Convenção:


T1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	107,7 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	111,7 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	94,9 dias/pleito	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	73,9 dias/pleito	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	Não informado	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	246,9 dias/pleito	1º ciclo 2020
Jan/2020 a Set/2020	290,2 dias/pleito	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

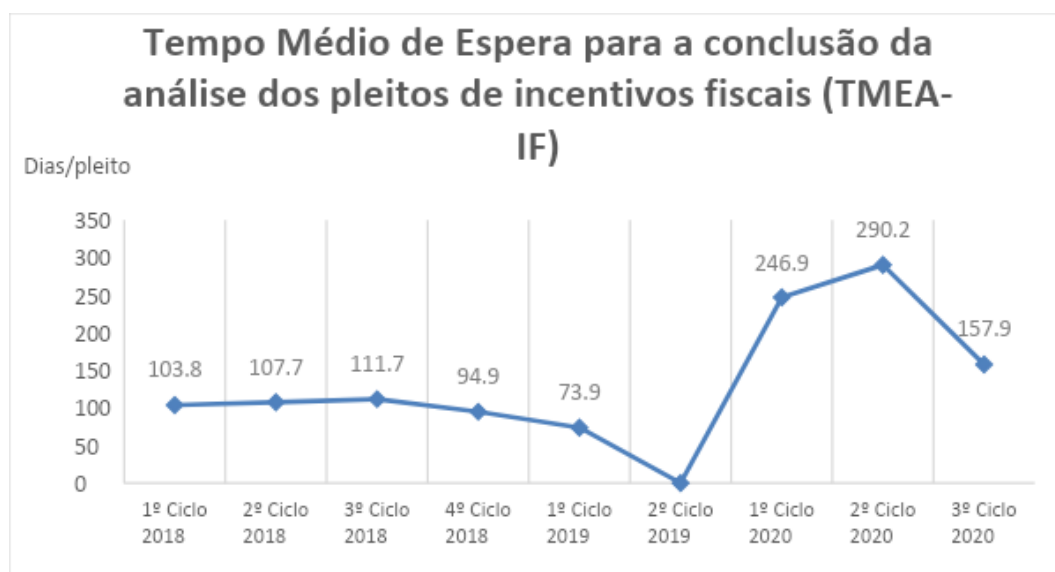

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{258}{14} = 18,4 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.

d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.


e) Periodicidade: Jan a dez/2020.

f) Comentários:

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	5,1 análises/técnico	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	12,8 análises/técnico	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	20,9 análises/técnico	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	17,4 análises/técnico	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	13,6 análises/técnico	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	10,4 análises/técnico	1º ciclo 2020
Jan/2020 a Set/2020	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

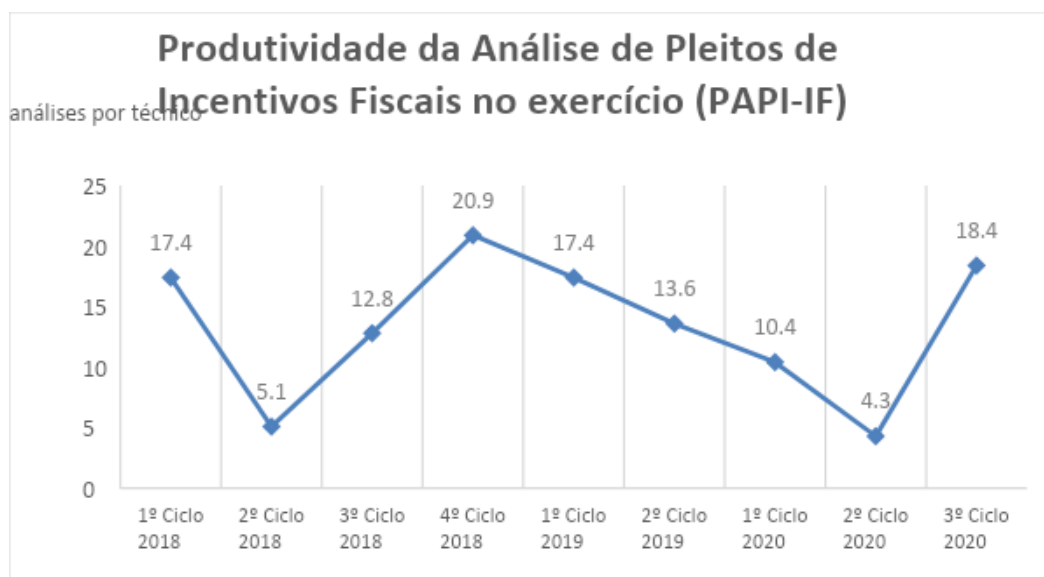

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vitórias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{157}{7} = 22,43 \text{ vitórias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.

d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.


e) Periodicidade: Jan a dez/2020.

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	25,5 vitórias/equipe	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,6 vitórias/equipe	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	17,3 vitórias/equipe	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	30,7 vitórias/equipe	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	22,5 vitórias/equipe	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	18,1 vitórias/equipe	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	16,4 vitórias/equipe	1º ciclo 2020
Jan/2020 a Set/2020	8,7 vitórias/equipe	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

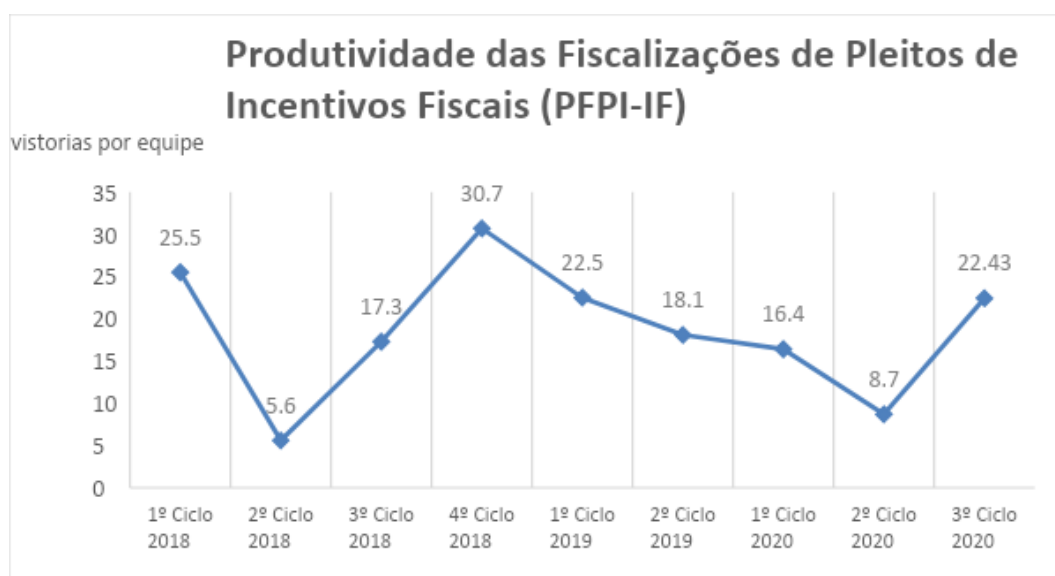

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.


5. Indicadores de Gestão de Convênios

5.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{34 \times 100}{34} = 100\%$$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).
- e) Período de aferição: Jan a set/2020.
- f) Comentários: Foram recebidos 34 pleitos no total, sendo 31 propostas de convênio com entes municipais e estaduais e 3 propostas de Termos de Execução Descentralizada. Do total, foram analisados 34 pleitos no período. Os pleitos de Convênio foram protocolados e cadastrados no Siconv, enquanto os de TED no SEI.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	86,8%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	95,5%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	67,3%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	70,6%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	100%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	100%	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

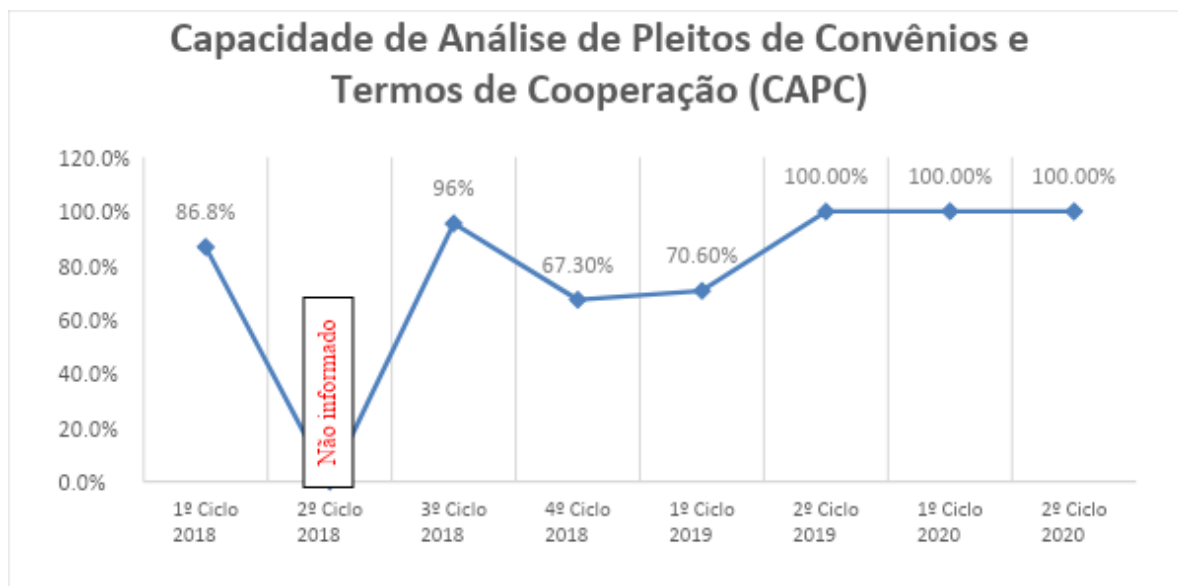

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{08 \times 100}{34} = 23,5\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan a set/2020.

f) Comentários: Foram aprovados 8 pleitos (5 convênios e 3 TEDs) de 34 analisados. Outros 15 estão aptos, mas dependem de recursos para serem contemplados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	60,6%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	61,4%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	70,8%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	77,5%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	82,6%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	61,9%	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

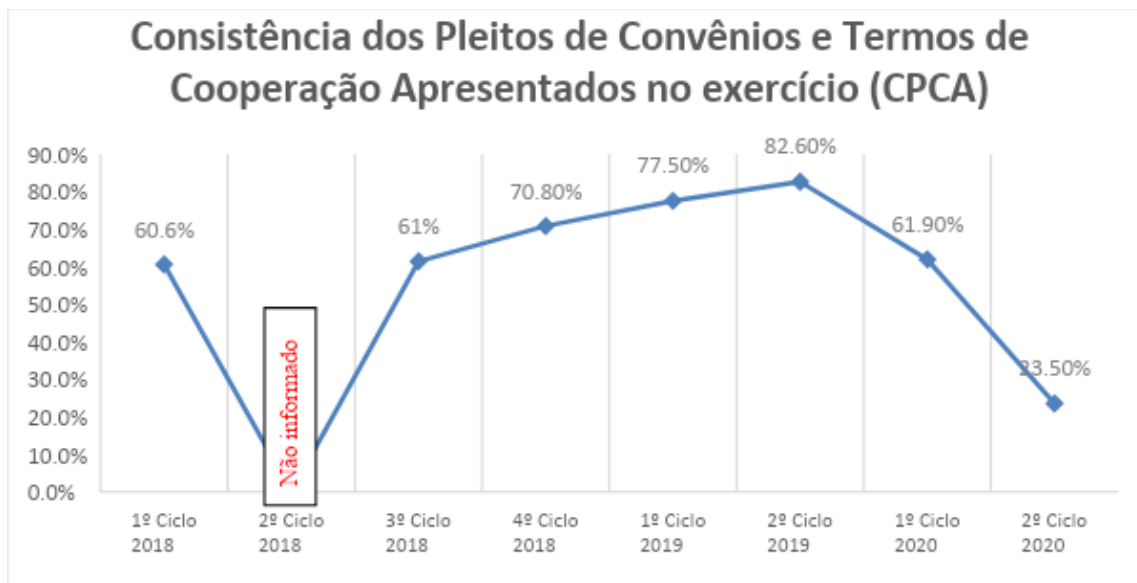

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

5.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no ex.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{11 \times 100}{34} = 32,6\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).

e) Período da aferição: Jan a set/2020.


f) Comentários: Foram rejeitados 11 pleitos referente aos convênios (10 de reúso e 01 destinado à Palma) dos 34 analisados.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	32,9%	1º ciclo 2018
Jan a maio/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	33,7%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	8,4%	4º ciclo 2018

Jan a dez/2018	18%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	15,2%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	38,7%	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

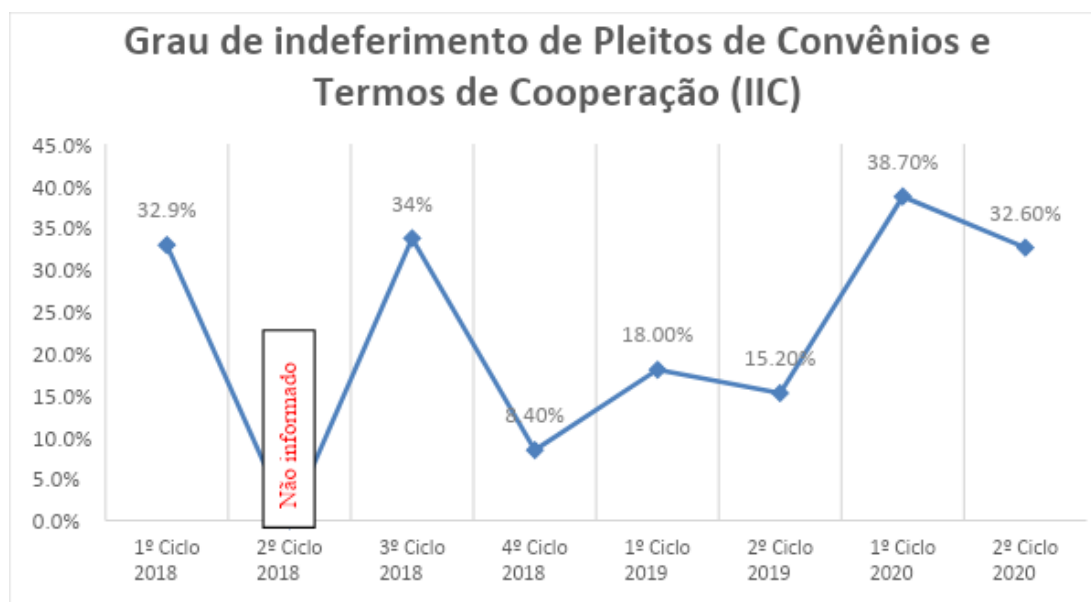

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.


5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \text{Não informado}$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan a set/2020.
- f) Comentários: Não informado.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	0,00%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	Não informado	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	Não informado	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	Não informado	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	Não informado	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	83,5%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	Não informado	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

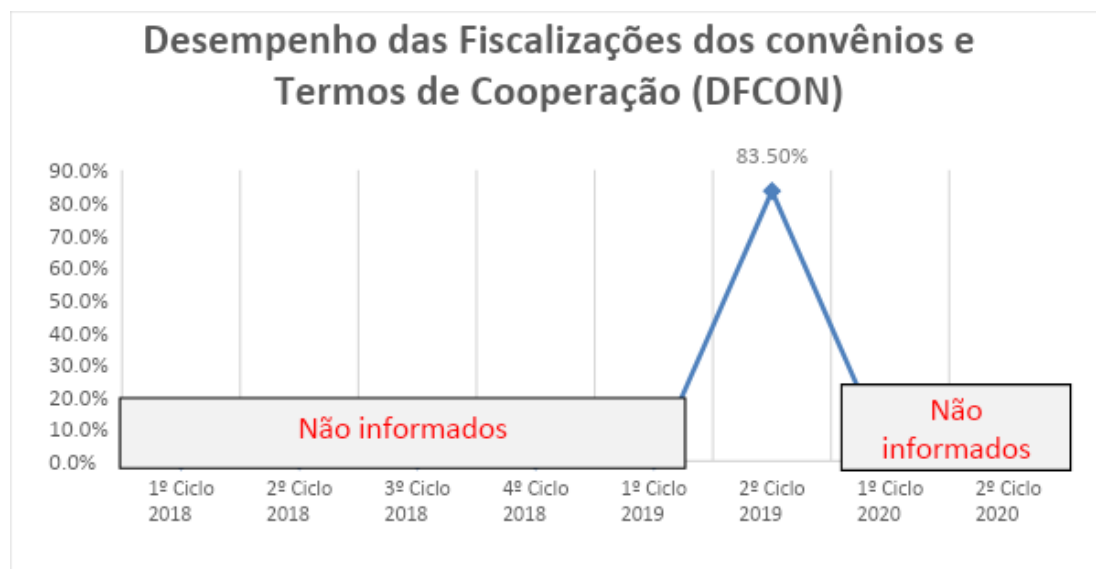

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{273}{5} = 54,60 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan a set/2020.

f) Comentários: Entre Janeiro e Setembro/2020, foram celebrados os seguintes convênios:


Nº Processo	SICONV	UF	Conveniente	Data Proposta	Data de Assinatura	Valor Repasse (R\$)	Tempo total para Celebração

59336000414202041	898221	BA	MUNICIPIO DE URUCUCA	03/03/2020	24/07/2020	500.000,00	143
59336000457202027	898397	RN	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO	12/03/2020	29/07/2020	150.000,00	139
59336000462202030	898643	RN	MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA	05/03/2020	31/08/2020	150.000,00	179
59336000374202038	898644	BA	MUNICIPIO DE BELMONTE	28/02/2020	31/08/2020	450.227,00	185
59336000452202002	898645	RN	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	04/03/2020	24/07/2020	250.000,00	142
Total Concedente(R\$) e TMTP_{conv} Real (dias)=						1.500.227,00	157,6

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	228 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	1,4 dias pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	1,8 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	27,83 dias/pleito	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	5,88 dias/pleito	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	22,27 dias/pleito	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	3,42 dias/pleito	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

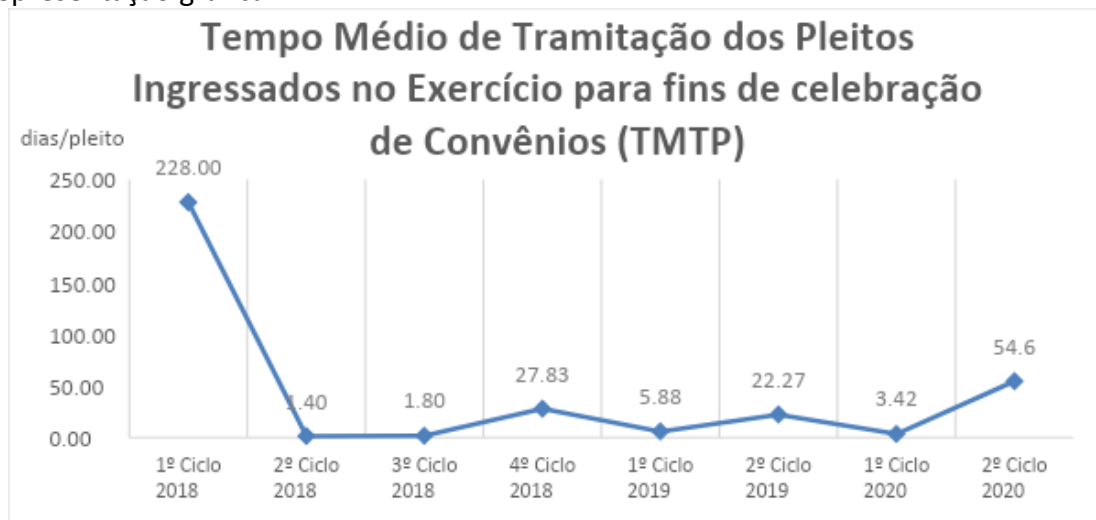

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

5.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{273}{2} = 136,5 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: Jan a set/2020.


f) Comentários: [Entre Janeiro e Setembro/2020, celebrou-se os seguintes TED:](#)

TED	Processo SEI	SIAFI	Unid. Receptora	Data Proposta	Data Assinatura	Tempo de Celebração (dias)	Valor Descentralizado (R\$)
002/2020	59336.000816/2020-46	1AABWG	INSA	21/05/2020	05/10/2020	137	479.849,09
006/2020	59336.001084/2020-10	1AABWC	INSA	14/07/2020	05/10/2020	83	298.932,28
TMTP_{TED} (dias) e TOTAL DESCENTRALIZADO (R\$)						110,00	778.781,37

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2017	0 dias/pleito	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	75 dias/pleito	2º ciclo 2018
Jan a ago/2018	48,4 dias/pleito	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	55,50 dias/pleito	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	60,83 dias/pleito	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	333 dias/pleito	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0 dias/pleito	1º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

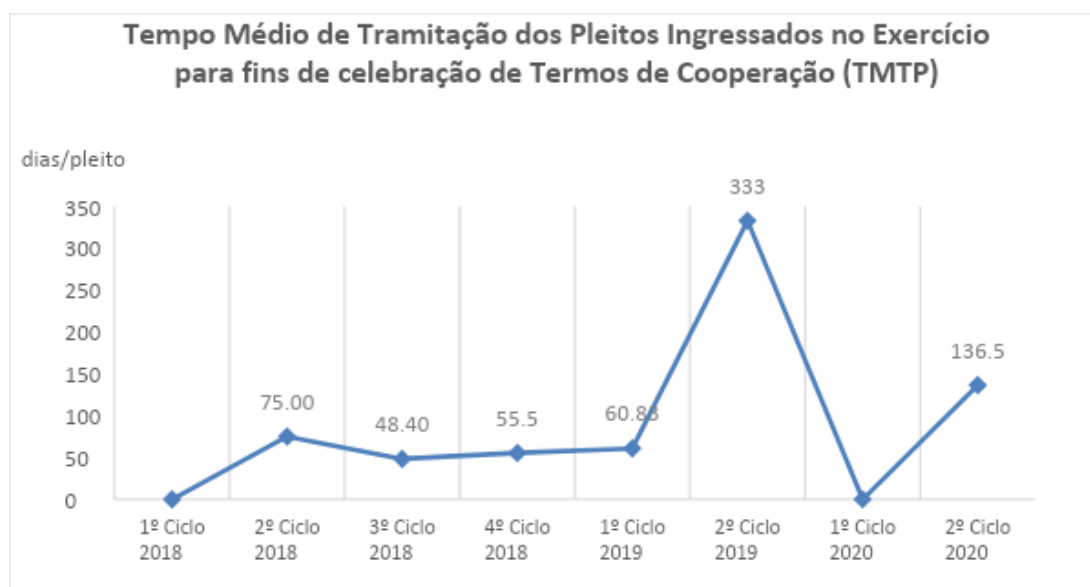

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

6. Indicadores de Gestão de Pessoas

6.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)


- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{56 \times 100}{60} = 93,33\%$
- b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100%
- e) Período da aferição: Jan a Dezembro/2020.
- f) Comentários: Foram capacitados 56 servidores no período de janeiro a dezembro de 2020, conforme PDP Sudene 2020. Importante destacar que foram registradas 111

participações de servidores em cursos. A situação de pandemia COVID/19 prejudicou a execução do PDP 2020, tanto pela disponibilidade da força de trabalho para participar de eventos, como número reduzido de oferta de cursos e também o desenho instrucional de capacitações que demandaria eventos presenciais.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	66%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	94,12%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	103,53%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	110%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	111,18%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	86,47%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	86,47%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	25%	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

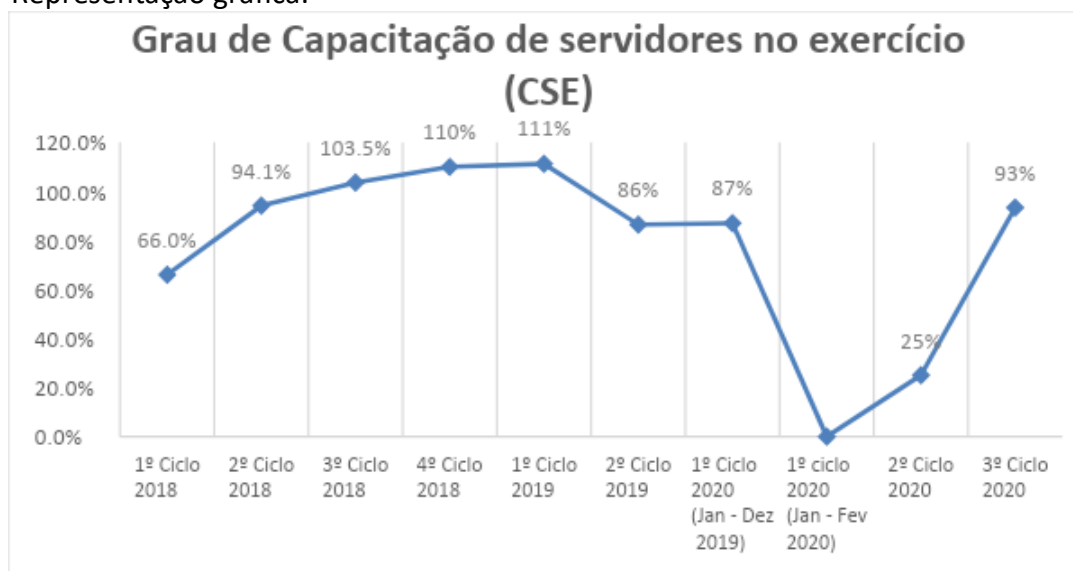

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{34 \times 100}{40} = 85\%$
- Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).
- Período da aferição: Jan a Dezembro/2020.

f) Comentários: Foram realizados 34 eventos de capacitação, considerando diferentes turmas do mesmo curso, priorizando a modalidade de ensino à distância.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	124%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	48%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	100%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	148%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	158%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	104%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	30%	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{38.048 \times 100}{400.000,00} = 9,51\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor).

e) Periodicidade: Jan a dezembro/2020.


i) Comentários: A situação de pandemia COVID/19 prejudicou a execução do PDP 2020, tanto pela disponibilidade da força de trabalho para participar de eventos, como número reduzido de oferta de cursos e também o desenho instrucional de capacitações que

demandaria eventos presenciais. Os eventos realizados priorizaram a modalidade EAD e a execução por Escola de Governo, o que minimizaram os custos.

f) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2017	47,4%	1º ciclo 2018
Jan a mai/2018	5,46%	2º ciclo 2018
Jan a set/2018	30,55%	3º ciclo 2018
Jan a nov/2018	56,78%	4º ciclo 2018
Jan a dez/2018	54,22%	1º ciclo 2019
Jan a nov/2019	31,98%	2º ciclo 2019
Dez/2019 a Fev/2020	0%	1º ciclo 2020
Jan a set/2020	0%	2º ciclo 2020

g) Representação gráfica:

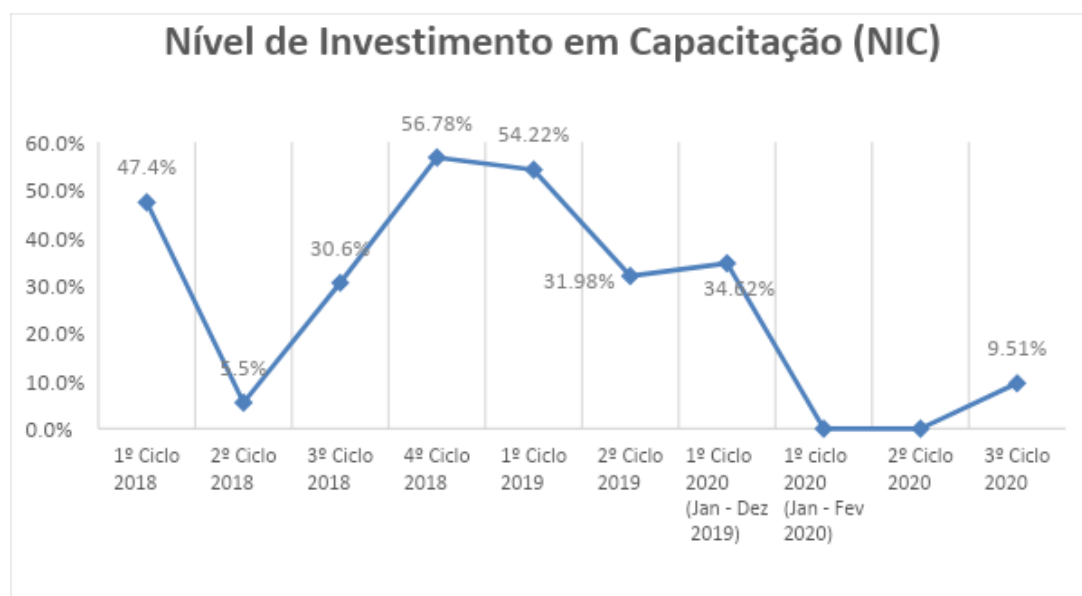

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

7.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)


- Fórmula: Média de acessos = 68.838
(Google Analytics)
- Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.

- e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020
- f) Comentários: resultados considerados positivos, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus e a migração do site para a estrutura do Gov.br, realizada em setembro de 2020.
- g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	57.434	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	27.691	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	29.984	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	68.809	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	79.346	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	79.346	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	12.842	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	82.135	2º ciclo 2020

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

- h) Representação gráfica:

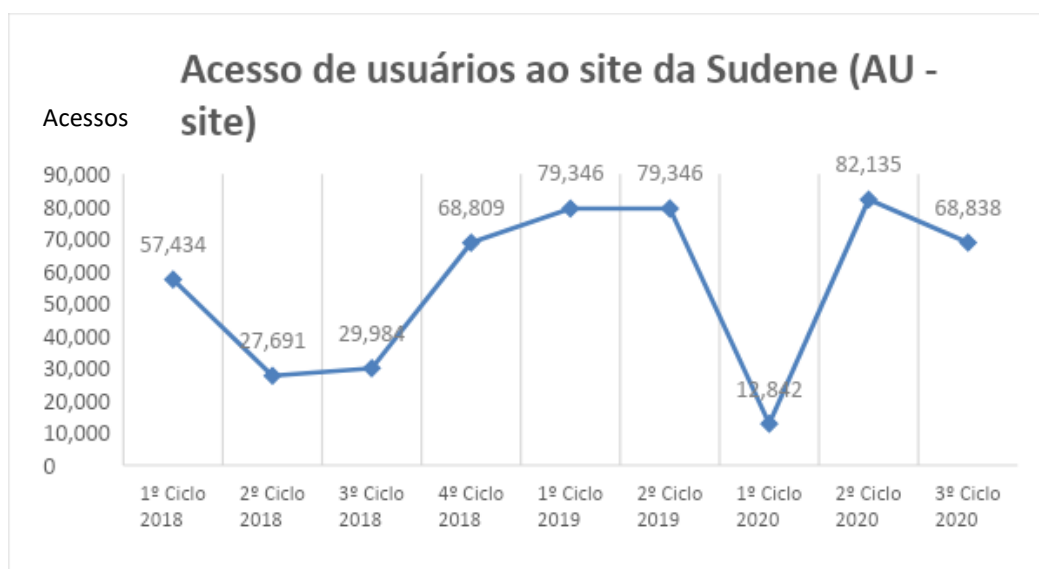

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)

- a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'28" (Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam


mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.

- e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020
- f) Comentários: resultados considerados positivos, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus e a migração do site para a estrutura do Gov.br, realizada em setembro de 2020.
- g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	3'03"	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	3'07"	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	2'58"	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2'58"	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	2'59"	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	2'48"	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	2'48"	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	2'32"	2º ciclo 2020

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

- h) Representação gráfica:

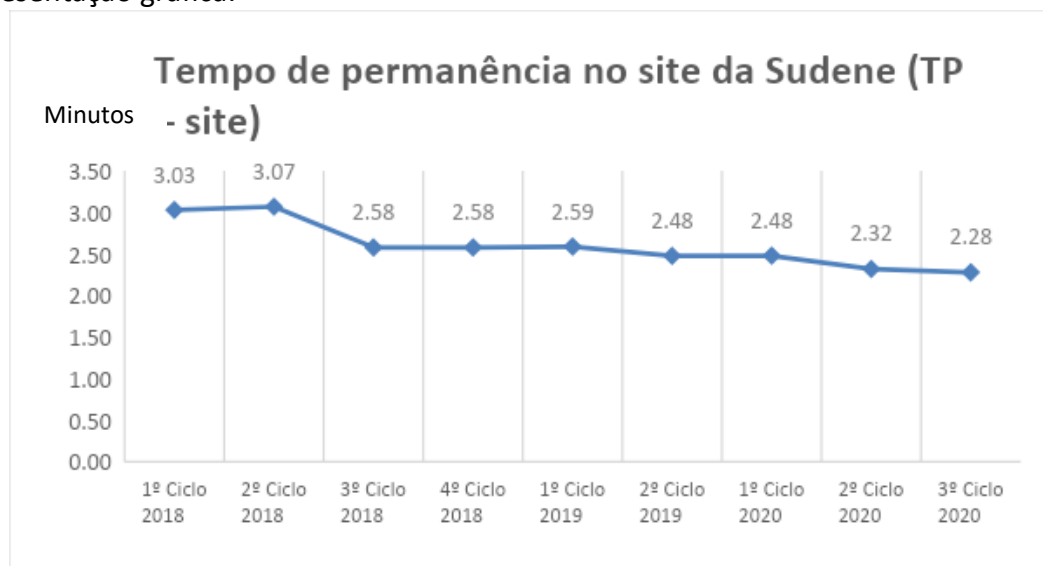

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 60,59%
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.

- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.


De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

- e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.
- f) Comentários: resultados esperados, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus. A migração do site para a estrutura do Gov.br, realizada em setembro de 2020, traz impactos para a taxa de rejeição, já que o ambiente passa por um período de organização de conteúdo e assimilação da nova estrutura por parte do público.
- g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	52,69%	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	53,68%	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	53,40%	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	53,99%	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	53,83%	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	56,33%	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	55,09%	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	60,38%	2º ciclo 2020

Fonte: Google Analytics. Acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:

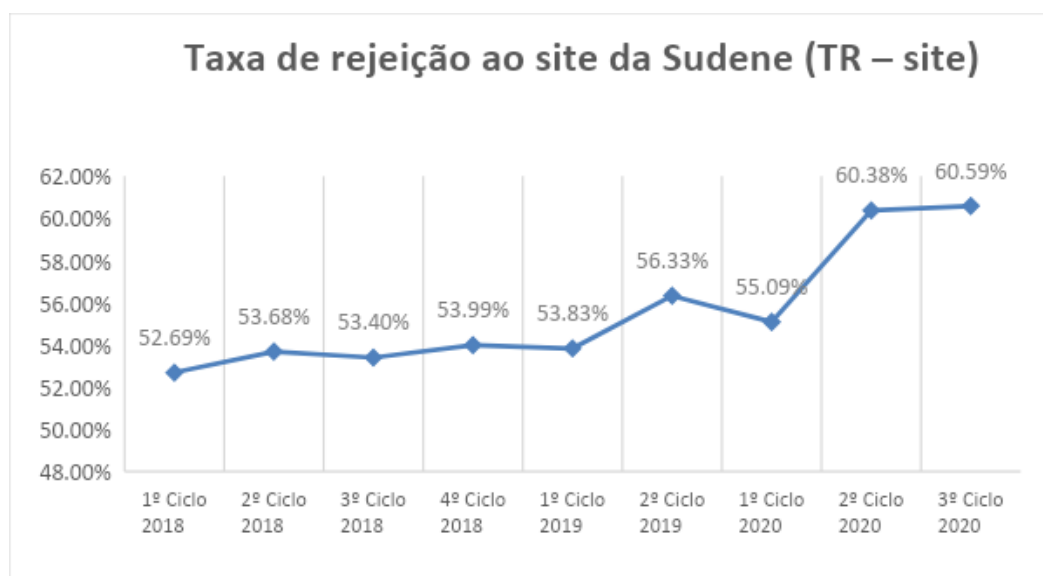

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


- a) Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.767
(Facebook)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.
- f) Comentários: resultados esperados, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus.

g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	2.520	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	2.579	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	2.551	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2.546	4º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	2.547	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	2.685	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	2.708	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	2.764	2º ciclo 2020

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:

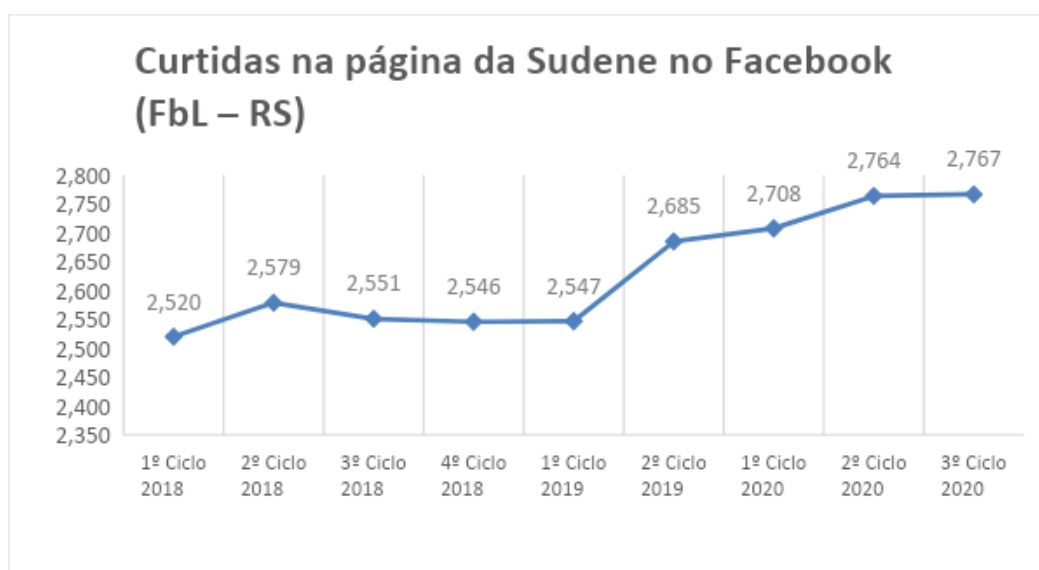

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- Fórmula: Qtde de Seguidores = 1090 (Twitter)
- Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.


f) Comentários: resultados dentro do esperado, considerando o contexto difícil da pandemia do novo coronavírus.

g) Resultados Anteriores:

02/02/2017 a 31/12/2017	668	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	708	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	732	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	744	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	744	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	867	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	892	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	1.064	2º ciclo 2020

Fonte: Twitter Analytics, acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:

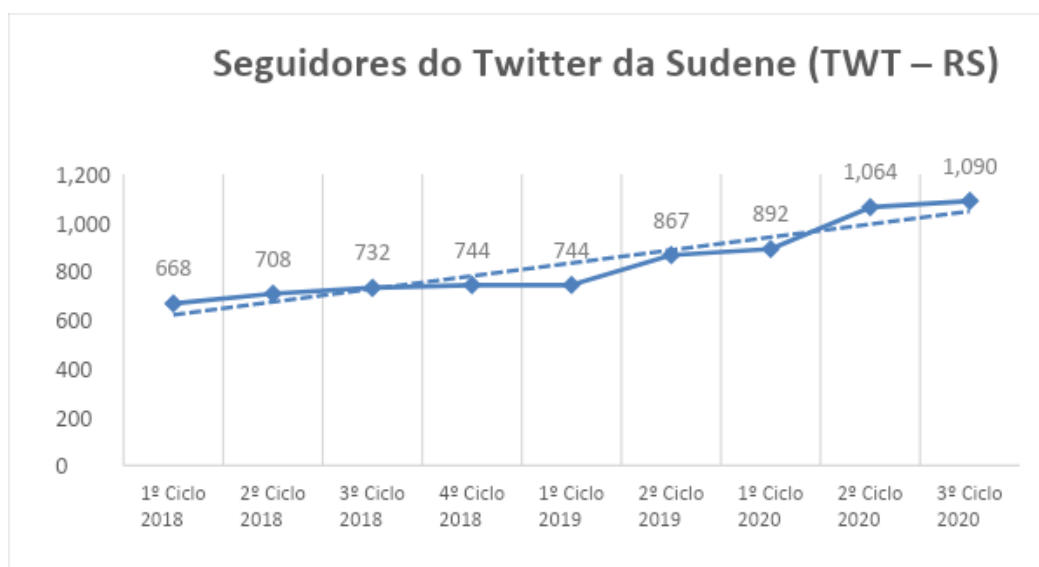

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.6 - Seguidores no Instagram da Sudene

a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: 1843.

b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.

e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.


f) Comentários: resultados positivos, considerando o contexto difícil da pandemia do novo coronavírus.

g) Resultados Anteriores:

01/01/2018 a 31/05/2018	660	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	765	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	815	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	810	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	1.087	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	1.187	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	1.587	2º ciclo 2020

Fonte: Instagram.com, acesso em 02/03/2020.

h) Representação gráfica:

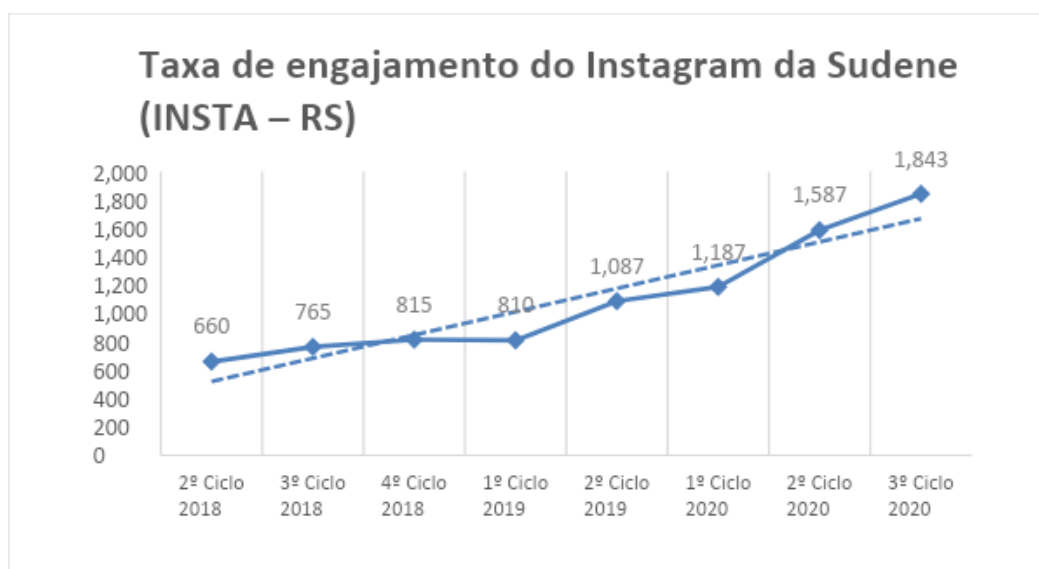

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

a) Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 109 \text{ na internet} + 44 \text{ na intranet} = 153$
(Internet + Intranet)

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.


e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.

f) Comentários: o ciclo foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, com impactos para as atividades operacionais da unidade e da Sudene como um todo. Ainda assim, registrou-se número próximo dos períodos em que não havia tal desafio.

g) Resultados Anteriores:

01/02/2017 a 31/12/2017	212	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	73	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	56	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	151	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	155	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019.	151	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	24	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	142	2º ciclo (2020)

h) Representação gráfica:

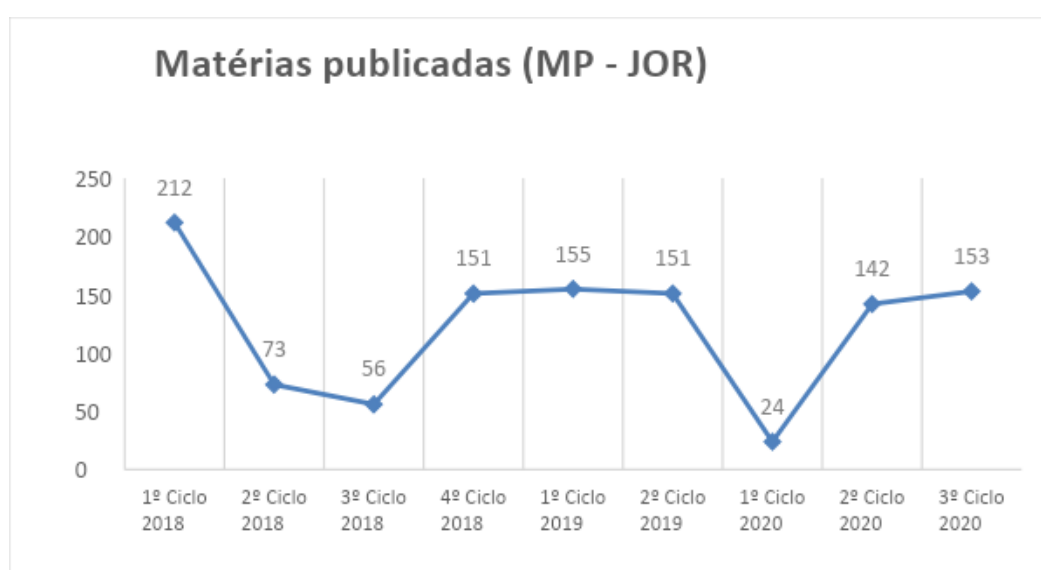

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- Fórmula: $\sum$ Sugestões de Pauta Publicadas = 56
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Comentários: produção expressiva, mesmo diante da pandemia.
- Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 31/12/2017	78	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	14	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	13	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	32	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	50	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019	51	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	9	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	39	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:

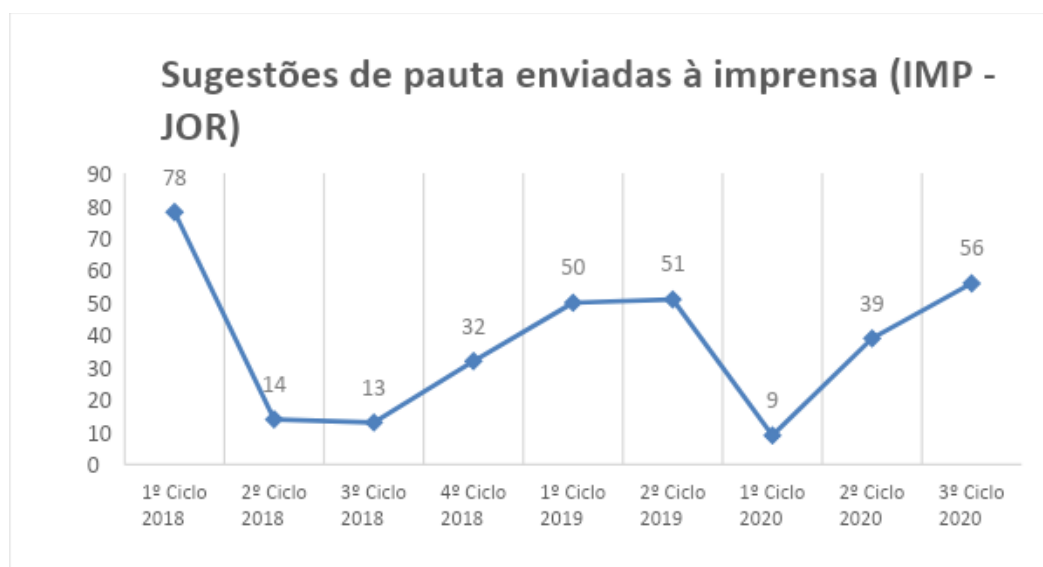

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


7.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: $\sum$ Produções em Vídeo e Áudio = 9 produções
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.
- Comentários: o ciclo foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, com impactos para as atividades operacionais da unidade e da Sudene como um todo.

f) Resultados Anteriores:

01/01/2017 a 31/12/2017	42	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	13	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	0	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	16	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	16	1º ciclo 2019
01/01/2019 a 30/11/2019.	24	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	5	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	12	2º ciclo 2020

g) Representação gráfica:

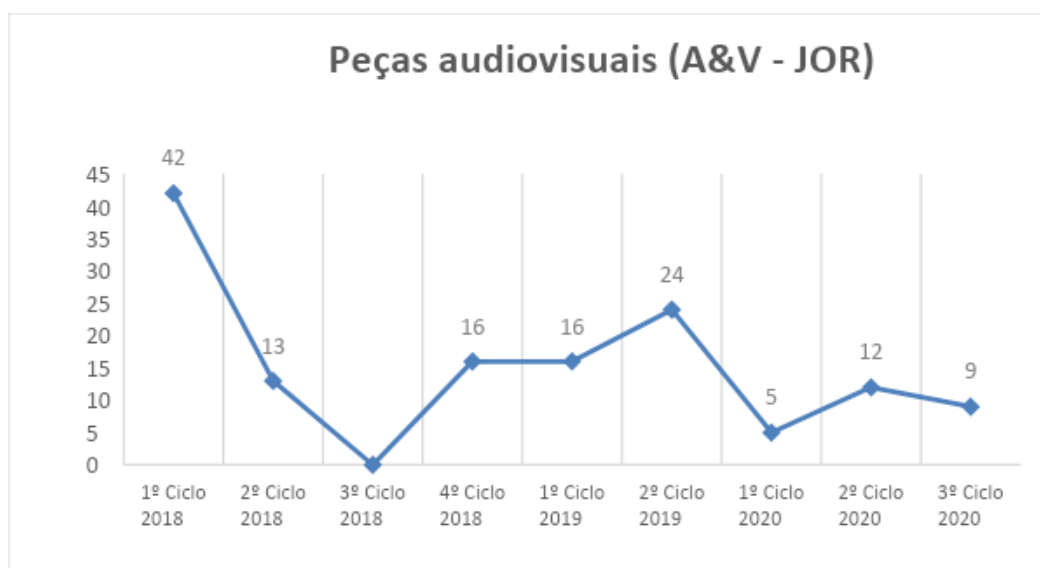

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- Fórmula: $\sum \text{Produções em Ações de Publicidade e Design} = 225$
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:

- Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
- Produções para jornalismo;
- Produções para demandas internas;
- Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
- Peças digitais / impressos.

e) Período da aferição: 01/01/2020 a 31/12/2020.

f) Comentários: produção expressiva, mesmo diante da pandemia.

g) Resultados Anteriores:

01/01/2017 a 31/12/2017	404	1º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/05/2018	107	2º ciclo 2018
01/06/2018 a 30/09/2018	166	3º ciclo 2018
30/01/2018 a 30/11/2018	247	4º ciclo 2018
01/01/2018 a 31/12/2018	244	1º ciclo 2019
30/01/2019 a 30/11/2019.	263	2º ciclo 2019
31/12/2019 a 28/02/2020	38	1º ciclo 2020
01/10/2019 a 31/08/2020	223	2º ciclo 2020

h) Representação gráfica:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

8. Metas de desempenho institucional para o período out/2020 - set/2021

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho institucional para o período de out/2020a set/2021 publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 91, de 23 de dezembro de 2020, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria912020sudene.pdf>

Número de Ordem	Projeto/Atividade ¹	Área Responsável pela execução ²	Programa PPA ³	Ação PPA ⁴	Diretriz Estratégica SUDENE ⁵	Objetivo Estratégico SUDENE ⁶	Período Total de execução ⁷	Unidade de Medida ⁸	Meta global ⁹	Meta intermediária fixada para o período ¹⁰	Observação
1	Projeto: Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste-PRDNE	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN)	PROGRAMA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 20WQ	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	out/2019 a dez/2021	Nota Técnica	7	3	Meta plurianual; No ciclo anterior de avaliação foram realizadas 3 Notas Técnicas.
2	Projeto: Articulação do Plano	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	PROGRAMA: 2217 - Desenvolvimento	Ação 20WQ	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor	out/2019 a dez/2021	Nota Técnica	6	4	Meta plurianual; No ciclo anterior de avaliação foi

	Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	(CGCP/DPLAN)	Regional, Territorial e Urbano		produtiva do Nordeste	produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.					realizada 1 Nota Técnica.
3	Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração de Estudo de Complexidade e Econômica e Plano de Ação Estratégica para as Bacias do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e área de influência do PISF.	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP/DPLAN)	PROGRAMA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 20WQ	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	out/2020 a set/2021	Contrato Firmado	1	1	Projeto Novo.
		Coordenação de									

4	Avaliação da Qualidade dos Gastos Municipais	Avaliação e Estudos da Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (DPLAN/CGEP/COAE)	Não se aplica	Não se aplica	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas	out/2020 a set/2021	Painel Divulgado	1	1	O projeto iniciou no ciclo 2018/2019, mas em virtude de dificuldades na execução, fez-se necessária alteração na metodologia.
5	Projeto: Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3.	DPLAN/CGEP	Não se aplica	Não se aplica	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturados.	out/2019 a set/2021	Relatório aprovado	7	6	Meta Plurianual; No ciclo anterior de avaliação foi realizado 1 Relatório.
6	Projeto: Atualizar a delimitação	Coordenação de Tecnologia e Inovação da Coordenação Geral de Estudos e	Não se aplica	Não se aplica	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base	Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas	out/2019 a jan/2022	Percentual do Projeto	100%	50%	Meta Plurianual: No ciclo anterior foi alcançado

	ão do Semiárido	Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (DPLAN/CGEP/COT I)			produtiva do Nordeste	políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido					17%

7	Atividade: Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: - Webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/DPLAN (tecnologias, atividades produtivas, energias renováveis, meio ambiente).	Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente/ Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CODEM/CGDS/DPLAN)	Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação. Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas.	Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Outubro/2020 a Setembro/2021.	Evento	04 Webinários	4	Projeto novo.
8	Projeto: Elaboração de proposta de reformulação do "+Gestão Municipal" a partir da PNDR (Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas) e do PRDNE.	Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente/ Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável	Programa 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.	Ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste. (Conclusão)	Fortalecer as Administrações Públicas Locais	Outubro/2019 a Setembro/2021.	Percentual do Plano Operativo	100%	48,5%	Meta Plurianual. No Ciclo anterior foi alcançado 51,5% desse Projeto.

		(CODEM/CGDS/DPLAN)									
9	Aprovação de Pleitos de incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene	Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGIF/DFIN)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			D1 - Promover a Competitividade de Sistêmica de base Produtiva do Nordeste.	outubro de 2020/ a setembro/2021	Pleito aprovado	360	360	
10	Atividade: Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	D1-Promover a Competitividade de Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;	outubro/2020 a setembro/2021	Consultas prévias do FDNE analisadas	100%	100%	

11	Atividade: Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;	outubro/2020 a setembro/2021	Propostas de financiamentos do FDNE analisados	100%	100%	
12	Atividade: Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional de Financiamento do	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN)	Não se aplica	Não se aplica	D1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a	out/2020 a set/2021	Relatórios elaborados e aprovados pela Diretoria Colegiada	4	4	

	Nordeste (FNE) pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB)					infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;					
13	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/DAD)	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração da Unidade	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores	out/2018 a dez/2021	Percentual do Projeto	100%	20%	Meta Plurianual: No Ciclo out 2018/set 2019 foi alcançado 23% dessa meta. No Ciclo out 2019/set 2020 foi alcançado 37%

14	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas	Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (CGGP/DAD)	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000-Administração da Unidade	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores	out/2019 a dez/2021	Percentual do Projeto	100%	45 %	Meta Plurianual: No Ciclo out 2019/set 2020 alcançou 5%

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUD

9. Conclusão

A finalização do 3º ciclo de monitoramento, último do ano de 2020, representa o fechamento do processo de monitoramento desse respectivo ano. Como já mencionado a pandemia da Covid-19 foi um desafio para a Sudene, e conforme observado pelos dados dos projetos e indicadores, tiveram significativo impacto no andamento dos trabalhos do órgão.

Observamos um aumento no número de projetos cancelados, paralisados e em atraso na instituição em relação ao ciclo de monitoramento anterior. Mesmo com essa realidade adversa a Sudene teve um aumento no número geral de projetos que estão em andamento, tendência que se observa em todos os ciclos do ano em referência. Isso reflete o esforço da instituição em entregar produtos à sociedade e de buscar alternativas para alavancar suas ações mesmo nesse período de pandemia, que proporcionou novos desafios, dentre eles, a adoção e adaptação ao regime de trabalho remoto e posteriormente, um regime híbrido para a execução de suas atividades.

Para o ano de 2021, a Coordenação Geral de Gestão Institucional, responsável pela metodologia e realização do processo de monitoramento da autarquia, busca aprimorar tal processo, tornando-o mais efetivo para o órgão e para os usuários. Desta forma será realizada e está em discussão interna a revisão de tal processo, alinhando com o processo de prestação de contas da unidade.

ANEXO I -

Planos Operativos do Monitoramento



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	Pago até o ano anterior	R\$ 530.482,50
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	A realizar no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 530.482,50

Previsão de Conclusão:	31/12/2021	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência: 28/12/2012 a 31/12/2021.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Victor Uchôa Silva - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								80,0%	Em Andamento		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	24/06/2020	--	15/11/2014	--	--	100,0%	Concluído	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.	
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	24/06/2020	--	08/12/2014	--	--	100,0%	Concluído		
7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído		

**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias	SEMAS/PE	09/07/2018	24/06/2020	--	09/07/2018	30/07/2019	--	100,0%	Concluído		
7.3	Realizar Seminário Nordeste	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	24/06/2020	--	--	--	--	40,0%	Paralisado	Este evento estava previsto para ser realizado em três dias, envolvendo o dia 28/04/2020. Entretanto, devido a pandemia, este evento teve sua realização adiada, com data a definir.	
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	24/06/2020	--	01/05/2014	--	--	100,0%	Concluído		
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento, Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.	O convênio foi aditivado até 31/12/2021 para finalizar os dois produtos finais: publicação e Seminário Nordeste. Entretanto, é necessário acompanhar a evolução da pandemia causada pelo COVID-19 para, mais adiante, avaliar o real período necessário para a conclusão dos trabalhos.
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	24/06/2020	--	17/02/2020	--	--	90,0%	Atrasado	O documento foi elaborado, revisado pelos parceiros e enviado para fase de diagramação, encontrando-se em fase de finalização para impressão e entrega. Está previsto evento virtual para lançamento do documento em 2021.	
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/03/2019	11/07/2019	--	20/03/2019	11/07/2019	--	100,0%	Concluído	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/01/2022	31/12/2022	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
			Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 530.482,50	77%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio realizados. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. O convênio foi aditivado ampliando a vigência para 24/06/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)			Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.				
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano				
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Previsão de Conclusão:	26/12/2021	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência até: 26/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas Souto/ Vera Lúcia Assunção - EMPAER/PB - Wandrick Haus de Sousa

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 343.585,70
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ -
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								50,5%	Paralisado		Este convênio foi aditivado, em função da pandemia, que paralisou algumas de suas atividades. Desta forma, foi aditivado, passando a ter a sua vigência até 26/12/2021.
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído		
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	

10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		
11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2020	-	24/10/2015		-	96%	Paralisado	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	22/03/2020	-	03/12/2015		-	80%	Paralisado	Paralisado devido à pandemia.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/12/2019	-	14/09/2015		-	100%	Concluído		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	22/03/2020	-	27/11/2015		-	65%	Paralisado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes, que encontram-se paralisadas devido a pandemia.	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2020	-			-	0%	Atrasado		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 343.585,70	70%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para **30/09/2019**. Devido à pandemia este convênio foi prorrogado de Ofício até **31/12/2020**, entretanto, a Conveniente ainda precisa ajustar o seu Plano de Trabalho para esse novo período de execução.

O servidor Marcelo de Castro Viana se aposentou e não está mais acompanhando este projeto;

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2015
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência: 31/03/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel / Felipe Barbosa

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		

10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		
11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAÁA.	
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído		
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAÁA.	
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído		
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAÁA.	
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.	
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										17,0%	Paralisado		
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		85%	Paralisado	Não foi possível a conclusão do parecer técnico final no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, sendo necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras.	
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	97%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

O servidor Carlos Almiro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto. O servidor José Aildo Sabino foi realocado para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas (CGEP).

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-se		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados da Bahia e Sergipe		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$60.869,41	R\$60.869,41

Previsão de Conclusão:	01/03/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção/ Amauri Nascimento (Teresa Oliveira - CGCP) / ESAF-BA: Luciano Costa e Rita Correia

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 60.869,41
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Passagens e diárias dos instrutores (recursos adm. Sudene)	R\$ 12.676,50
Total Liberado até o exercício	R\$ 60.869,41

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 12.676,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	27/11/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de turmas...	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF; CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	29/11/2018		08/05/2018			60%	Concluído		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 60.869,41	24/05/2018	24/05/2018	R\$ 60.869,41	100%	Concluído		

7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. . Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal, estaduais e e municipais	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	29/11/2018		25/05/2018	19/11/2018		100%	Concluído		
8	Acompanhamento técnico com o parceiro	Reunioes presenciais e por video para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF BA	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018	27/11/2018		100%	Concluído		
9	Realização dos cursos - Fase SALVADOR- BA	Realização de 2 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	30/07/2018	27/09/2018		30/07/2018	27/09/2018		100%	Concluído		
10	Realização dos cursos - Fase FEIRA DE SANTANA- BA	Realização de 1 Seminário, 1 turmas de Elaboração de Projetos, 1 turmas de Siconv I e 1 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	17/09/2018	27/09/2018		15/10/2018	18/10/2018		100%	Concluído		
11	Realização dos cursos - Fase VITÓRIA DA CONQUISTA- BA	Realização de 1 Seminário, 2 turma de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	16/10/2018	29/11/2018		19/11/2018	27/11/2018		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										8,0%	Paralisado		
12	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019		12/02/2019	--		80%	Paralisado	Parecer Técnico em fase de conclusão.	Dada a prioridade e prazos para elaboração do PRDNE e a relotação da técnica responsável, o relatório encontra-se na versão penultima, aguardando possibilidade de revisão e considerações, para finalização. Para tanto, é necessária, juntamente com a equipe técnica da CODEM/CGDS, a colaboração da técnica que agora se encontra em outra Coordenação que participou do período de execução desta iniciativa.
Valor Previsto:				R\$	60.869,41	Valor realizado:		R\$	60.869,41	98,0%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 05 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-	
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-	
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especia			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Aarape Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em infraestrutura para criação de cursos de formação e capacitação nas tecnologias emergente. A área de gerenciamento de Datacenters e desenvolvimento de tecnologias para a Computação em Nuvem são setores que atualmente não contam cursos especializados em Pernambuco			
Projeto:	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)			
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 425.000,00	426.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Convênio SICONV 893892/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias
	UPE	Prof. Paulo Hugo, Prof. Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 425.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 425.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								7%	A Iniciar		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	19/02/2021	30/03/2021	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar	Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância
2.2	Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	01/05/2021	30/07/2021					20,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de capacitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv
2.3	Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois despesadores e um motorista. A cada evento tem-se	UPE	01/04/2021	30/08/2021					20,0%	Em Andamento		Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Início das atividades presenciais em dezembro ou janeiro de 2021

2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	O programa de residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, oferecidas pelo IIT, e	UPE	01/07/2020	30/09/2021					40,0%	Em Andamento	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Início das aulas em fevereiro de 2021	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	10/02/2021	30/03/2021	R\$ 175.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/10/2021	10/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		16/11/2021	30/11/2021		01/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/12/2021	15/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 425.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	27%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003242/2019-24													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	-
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade			Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demanda				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalização da economia e seus impactos na indústria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carencia destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.				
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação				
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 340.000,00	R\$ 341.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Convênio SICONV 893056/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias
	UPE	Prof. Djalma Guimarães

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 340.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 340.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								15%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	30/03/2021	R\$ 260.000,00				0,0%	A Iniciar	Problemas relacionados à crise do covid19	Diante da pandemia todas as ações presenciais foram reprogramadas
2.2	Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	30/09/2020	30/05/2020		05/02/2020	15/09/2020		100,0%	Concluído	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas

2.3	Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas	UPE	30/09/2020	30/08/2021		30/09/2020		50,0%	Em Andamento	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente me fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnostico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas serão iniciadas em 20/01/2021.
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/04/2021				0,0%	A Iniciar		
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/04/2021	30/08/2021	R\$ 80.000,00			0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021				0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)							0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2021	30/10/2021				0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021				0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021				0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:									R\$ 340.000,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	35%
										Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Universidade de Pernambuco - UPE

Observações:

Processo SEI n.º 59336.003248/2019-00

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 07 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	-
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional			Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva,				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Os provedores na nuvem dependem hoje de data centers distribuídos, que hospedam servidores e dispositivos de rede. Propõe-se a criação da primeira plataforma da América Latina para preparar profissionais e empresas, uma vez que há uma carência de cursos em gerenciamento de Datacenters.				
Projeto:	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.				
Objetivo do projeto:	Capacitar estudantes e profissionais em computação na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 649.777,57	651.777,57

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	30/12/2021

Convênio SICONV 892599/2019
Vigência: 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias
	UPE	Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 649.777,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 649.777,57
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								9%	Em Andamento		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	30/30/2021	R\$ 649.777,57				0,0%	A Iniciar		
2.2	META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	30/12/2019	30/06/2021		05/02/2020			30,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio	Foi feita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem perder o objeto e objetivo do convênio

2.3	META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	01/07/2021	30/08/2021		05/02/2020			30,0%	Em Andamento	Diversas reuniões foram realizadas, sendo ultima reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência.	Envio de nova cotação, para início do processo licitatório			
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar					
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar					
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	A Iniciar					
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar					
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar					
Valor Previsto:											R\$ 649.777,57	Valor realizado:	R\$ 0,00	29%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:																
Universidade de Pernambuco - UPE																
Observações:																
Processo SEI n.º 59336.003160/2019-80																

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)		Eixo temático (MDR):		
Ação do PPA:	8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas		Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.	
Objetivo da ação:	Ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva, buscando a melhoria da produtividade e competitividade de empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	CODEM/CGDS/DPLAN	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Dificuldades de acesso a tecnologias por empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Projeto:	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte				
Objetivo do projeto:	Implantar 6 (seis) unidades piloto de produção de biogás adaptadas para empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio grande do Norte e Ceará para ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$550.000,00	R\$550.000,00

Previsão de Conclusão:	12/22
Data Atualização:	31/12/20

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/DPLAN/SUDENE - Amauri Nascimento; Leonardo Moraes / INSA: Mônica Tejo.

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 550.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 550.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	30%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	15/12/20	23/12/20		15/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/20	25/12/20		21/12/20	25/12/20		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	17/12/20	21/12/22		17/12/20	21/12/20		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	23/12/20	23/12/23		23/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	28/12/20	28/12/20		28/12/20	28/12/20		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								12%	Em Andamento		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	28/12/20	28/12/20	R\$ 550.000,00	28/12/20	28/12/20	R\$ 550.000,00	100,0%	Concluído		

2.2	META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/21	12/22					0,0%	A Iniciar	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto a ser realizada em_____.	Marcar a reunião	
2.3	META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/21	12/22					0,0%	A Iniciar			
2.4	META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/21	12/22					0,0%	A Iniciar			
2.5	META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/21	12/22					0,0%	A Iniciar			
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar			
3.1	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2022	12/22					0,0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	550.000,00	Valor realizado:		R\$	550.000,00	42,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 09
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)		Objetivo PPA 2020-2023:	Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340) - Programa SUDENE: "Tecnologia e Inovação para Convivência no Semiárido - Reuso de águas cinzas"		Objetivo estratégico (MDR):	Desenvolver a Capacidade Produtiva das Regiões	
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez de água destinada a produção da agricultura familiar devido aos grandes períodos de seca, e a falta de projetos que visem a utilização de tecnologias sustentáveis para o reuso da água em sistemas produtivos no semiárido nordestino.				
Projeto:	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.			(Convênio n.º 903159/2020. Processo SEI 59336.001156/2020-11)	
Objetivo do projeto:	Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinza com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				R\$ 476.011,69	R\$ 477.011,69

Previsão de Conclusão:	31/12/2023	CONVÊNIO Nº 903159/2020 (Proposta: 009483/2020)
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência: 28/12/2020 a 26/07/2023

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	
dez/20	R\$ 476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	A realizar no exercício RAP	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 476.011,69
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 476.011,69
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE: José Farias Raimundo Nonato: André Santos Landim	Município São

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	25/06/2020	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS			-	06/07/2020	24/07/2020	-	100%	Concluído		
4	Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS			-	01/08/2020	13/08/2020	-	100%	Concluído		
5	Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE			-	12/08/2020	28/12/2020	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	A iniciar		
6	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A iniciar		
7	Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A iniciar		
8	Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A iniciar		
9	Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A iniciar		
10	Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	01/02/2021	a definir					0%	A iniciar		

11	Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	28/12/2020	01/02/2021					0%	A iniciar		
12	Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
13	Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	01/02/2021	01/04/2021					0%	A iniciar		
14	Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
15	Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	01/04/2021	01/06/2021					0%	A iniciar		
16	Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
17	Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/06/2022					0%	A iniciar		
18	Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
19	Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/12/2021					0%	A iniciar		
20	Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
21	Meta 6. Realização de um encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de um encontro municipal com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto.	Munic.SRN-PI	01/06/2022	26/07/2022					0%	A iniciar		
22	Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
23	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	25/09/2022	25/11/2022	-			-	0%	Em Andamento		
Valor Previsto: R\$ 477.011,69											Valor realizado:	20%	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente).

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Busca-se contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	É ainda incipiente a incorporação da área de saúde digital na formação dos novos profissionais de saúde, principalmente no interior e nas áreas rurais, bem como para aqueles que já se encontram ativos ou que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. É fundamental preparar os profissionais para enfrentar os novos desafios trazidos pela incorporação tecnológica em suas práticas clínicas e ações interventivas no território, criando condições para ampliar o acesso e a qualidade da assistência ao paciente no SUS.		
Projeto:	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)		
Objetivo do projeto:	Pública do PRDNE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3	90	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00

Previsão de Conclusão:	13/05/2024	TED n.º 10/2020
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência até: 13/5/2023

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Juliana Borges e Vera Assunção; coordenação CODEM/CGDS: Victor Uchôa / UFPE: Magda Novaes (NUTES)

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 969.572,00
dez/20	R\$ 969.572,00		R\$ 969.572,00	A realizar no exercício RAP	
	R\$ 969.572,00	R\$ 0,00	R\$ 969.572,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 969.572,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
2	Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Manguê Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
	Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da 8917.	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020	-	100%	Concluído	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEN/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020	-	100%	Concluído	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEN/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020	-	100%	Concluído	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020	-	100%	Concluído	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 por meio da 363ª Reunião Extraordinária.	
7	Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020	-	100%	Concluído	Extrato publicado em 17/11/2020.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								15,00%	Em Andamento		
8	Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2020	30/11/2020	R\$ 969.572,00	16/11/2020	16/12/2020	R\$ 969.572,00	100%	Concluído	O recurso foi descentralizado em , porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária.	
9	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020	--	100%	Concluído	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
10	Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEN/SUDENE NUTES/UFPE	01/02/2021	15/03/2021						A Iniciar	Os prazos das etapas serão atualizados após a contratação da equipe e realização de 1ª reunião técnica de acompanhamento.	

11	Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	01/03/2021	31/03/2021							A Iniciar	O Ministério da Saúde será convidado, como também representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene.
12	META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre Acompanhamento Técnico	Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	01/01/2021	30/04/2021		--	--	--	0%		A Iniciar	
13		de núcleos e unidades de saúde digital no	Nutes/UFPE	01/01/2021	31/05/2021		--	--	--	0%		A Iniciar	
14		educação INDU para contemplar o Programa	Nutes/UFPE	01/03/2021	30/06/2022		--	--	--	0%		A Iniciar	
15		Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão	CODEM/SUDENE	--	--		--	--	--	0%		A Iniciar	
16	META 2 - Orientar a capacitação para	tutoria por 3 (três) meses após realização do	Nutes/UFPE	01/05/2021	31/12/2022	--	--	--	--	0%		A Iniciar	
17	2000 ACS e ACE na	avaliar e estratégia de capacitação	Nutes/UFPE	01/04/2021	13/05/2023	--	--	--	--	0%		A Iniciar	
18	Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	--	--	--	--	--	--	0%		A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%		A Iniciar	
19	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	13/05/2023	13/05/2024	-				0%		A Iniciar	
Valor Previsto:						R\$ 969.572,00	Valor realizado:		R\$ 969.572,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
UFPE/NUTES - Núcleo de Telessaúde da UFPE												
Observações:												
As articulações para formatação e viabilização desta proposta foram iniciadas no ano de 2019, porém, só começaram a se materializar, chegando à formalização, em 2020, como demonstrado nas etapas elencadas na "Iniciação".												
23/12/2020 - Sudene divulga em seu site institucional a parceria com o NUTES/UFPE para realização do projeto.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	-
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional			Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias, estudos e projetos técnicos, promoção de capacitações, formação de multiplicadores, intercâmbio de produtores, instalação de unidades demonstrativas, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismo como opção de organização social e produtiva.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	havendo carência destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.				
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação				
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 1.264.680,00	1.265.980,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Convênio SICONV 907660/2020
Vigência 30/11/2022

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias
	UPE	Prof. Djalma Guimarães, Prof. Alexandre Maciel

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.264.680,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.680,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
		Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se	CGDS	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído		
1.1		Análise jurídica	ANÁLISE e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020		100,00%	Concluído	
1.2		Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído	
1.3		Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	30/12/2020		100,00%	Concluído	
1.4		Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	02/01/2020	17/01/2020		02/01/2020	17/01/2020		100,00%	Concluído	
1.5													
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								2%	Em Andamento		
2.1		Liberção da primeira parcela de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAO / GABINETE	01/02/2021	30/03/2021	R\$ 671.664,75				0,00%	A Iniciar	
2.2		Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilização de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicação da metodologia NE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/02/2021	30/07/2021					20,00%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021
2.3		1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/06/2021	30/06/2021					0,00%	A Iniciar	
2.3		Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no	UPE	01/07/2021	30/01/2022					0,00%	A Iniciar	

2.4	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/10/2021	30/10/2021	R\$ 474.837,50				0,00%	A Iniciar		
2.5	Meta 3: Elaboração de planos de ação	Realização dos projetos/planos de ação em indústria 4.0, como resultado da Residência, em cada uma das 40 empresas participantes	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/12/2021	30/06/2022						A Iniciar		
2.6	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/01/2022	30/01/2022						A Iniciar		
2.7	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2021	30/03/2021	R\$ 118.177,75				0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,00%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	01/07/2022	15/08/2022					0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	16/08/2022	30/09/2022					0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/10/2022	30/10/2022					0,00%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 1.264.680,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	22%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Universidade de Pernambuco - UPE	
Observações:	
Processo SEI n.º 69336.002257/2020-17	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-
Ação:	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Necessidade de melhoria da qualidade do rebanho da ovinocaprinocultura nos polos do Nordeste e da assistência técnica mais próxima e adequada às necessidades dos produtores rurais		
Projeto:	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	426.466,90	426.466,90

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

TED processo 59336.000769/2020-31
Vigência: 30/11/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE: José Farias
	Embrapa Marco Bonfim

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 426.466,90
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 426.466,90
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	01/06/2020	30/11/2020		01/06/2020	30/11/2020		100,00%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	01/10/2020	30/10/2020		01/10/2020	30/10/2020		100,00%	Concluído		
1.3	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	01/10/2020	30/10/2020		01/10/2020	30/10/2020		100,00%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / UPE	01/11/2020	30/11/2020		01/11/2020	30/11/2020		100,00%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	A Iniciar		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	30/04/2020	R\$ 426.466,90				0,00%	Atrasado		
2.2	META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	30/12/2019	30/06/2021		05/02/2020			0,00%	A Iniciar		
2.3	META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiários para melhoria da qualidade da	Embrapa	01/07/2021	30/08/2021		05/02/2020			0,00%	A Iniciar		
2.4	Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	01/06/2021	30/09/2022								
2.5	Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados	Embrapa e Sudene	01/06/2021	30/12/2021					0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2022	30/10/2022					0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2022	15/11/2022					0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/11/2022	30/11/2022					0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 426.466,90	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Embrapa Ovíno e Caprinos

Observações:

Processo SEI n.º 59336.000769/2020-31

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.5 - Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Falta de avaliação sobre qualidade dos gastos dos municípios na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)		
Objetivo do projeto:	Elaboração de índice sobre gestão fiscal dos Municípios da área de atuação da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/10/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória Sistêlos

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Dados		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/01/2020	-	01/10/2019	31/01/2020		100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para os estados da área de atuação da Sudene.
1.1	Identificação do estado do projeto	Identificação dos estados e indicadores para conclusão do projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/10/2019	-	01/10/2019	31/10/2019		100%	Concluído	
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/10/2019	30/11/2019	-	31/10/2019	30/11/2019		100%	Concluído	
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	30/11/2019	31/01/2020		30/11/2019	31/01/2020		100%	Concluído	
2.	Análise		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	01/04/2020	-	31/01/2020	22/05/2020		100%	Concluído	
2.1	Padronização dos dados	Normalização dos indicadores selecionados para escala de referência	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	28/02/2020	-	31/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído	
2.2	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético composto por indicadores selecionados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	28/02/2020	13/04/2020	-	28/02/2020	22/05/2020		100%	Concluído	
2.3	Validação final do índice	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	13/04/2020	03/05/2020		13/04/2020	22/05/2020		100%	Concluído	
3.	Ranking de gestão fiscal		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	30/10/2020	-	12/05/2020	30/10/2020		82%	Atrasado	

3.1	Ranking de municípios	Elaborar ranking de municípios de acordo com resultado dos indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	17/06/2020	-	12/05/2020				Cancelado	Conforme determinação da 363ª Reunião de Diretoria Colegiada, houve análise da metodologia e dos objetivos para esta atividade. Considerando o retorno dos Tribunais de Conta dos Estados, identificou-se a inviabilidade de continuidade contemplando esse aspecto, de tal forma que garanta a disponibilização de informações recentes.	O Projeto prosseguirá com outra metodologia, para os 11 estados, adotando a metodologia do Índice elaborado pelo CFA, o qual contempla indicadores utilizados no Ranking.	
3.2	Tratativas CFA para IGM - Sudene	Participação na elaboração do ACT com CFA e definição dos recortes e detalhamento do índice para área de atuação da Sudene.	Gabriela Nascimento, Maria da Glória, Tássia Germano e Marina Rogério.	01/07/2020	30/10/2020	-	01/07/2020	30/10/2020		100%	Concluído	Considerando a adoção do novo índice (IGM/CFA) foram incluídas as etapas para conclusão do projeto.		
3.3	Tratativas Publicização do Ranking IGM-CFA	Tratativas para publicização do ranking IGM CFA para os estados da área de atuação da Sudene	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento, Tássia Germano e Maria da Glória	01/11/2020	31/12/2020		01/11/2020	18/12/2020		100%	Concluído			
3.4	Relatório de análise	Elaborar relatório final	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	17/06/2020	30/09/2020	-	11/08/2020			45%	Atrasado	Solicitação de postergação do prazo devido as novas determinações da Diretoria Colegiada a respeito do projeto e à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Pesquisa Impacto da Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 30/03/2021		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	94%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

CFA - Conselho Federal de Administração

Observações:

Trata-se de um projeto de continuidade do ciclo anterior, conforme Processo SEI 59336.002609/2019-92

Do total de 11 Estados, 5 foram integralmente conclusos, dos quais 4 foram divulgados e receberam premiação (ciclo 2018/2019) e 1 concluído no ciclo 2019/2020, com resultado a ser divulgado (aguardo fim do defeso eleitoral). Os demais (6 Estados) tiveram índice concluídos, entretanto a situação de regularidade das Contas não foram realizadas devido à não resposta dos Tribunais de Contas Estaduais. Devido a inviabilidade da continuidade da ranking considerando a verificação junto aos TCE e por determinação da 363ª Reunião da Diretoria Colegiada, prosseguiu-se com nova metodologia com uso do IGM/CFA. O mesmo apresenta um hall mais amplo de indicadores, considerando diversas dimensões e painel dinâmico.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Demanda do setor produtivo de palma por colheita mecanizada, a qual diminuirá os custos e aumentará o rendimento da produção		
Projeto:	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma		
Objetivo do projeto:	Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	29/05/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino; Joyce Silva; Marcelo Saiki

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	01/03/2019	31/03/2019	-	01/03/2019	31/03/2019	-	100%	Concluído		
2	Articulação									100%	Concluído		
2.1	1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	15/04/2019	15/04/2019	-	15/04/2019	15/04/2019	-	100%	Concluído	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2.2	2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	15/08/2019	15/08/2019	-	15/08/2019	15/08/2019	-	100%	Concluído	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)
2.3	Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	16/10/2019	16/10/2019	-	16/10/2019	16/10/2019		100%	Concluído	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii

2.4	Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100%	Concluído	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
2.5	Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	01/11/2019	31/11/2019		01/11/2019	31/11/2019		100%	Concluído		
3	Planejamento de Evento (Reunião Técnica - TECHPALMA)									100%	Concluído		
3.1	Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100%	Concluído		
3.2	Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100%	Concluído	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
3.3	Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100%	Concluído		
3.4	Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100%	Concluído		
3.5	Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100%	Concluído		
3.6	Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100%	Concluído		
3.7	Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100%	Concluído		
4	Acompanhamento									70%	Em Andamento		

4.1	Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020		100%	Concluído	Durante o evento TechPalma foi idetificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimateg e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimateg em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimateg. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheitadora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referencias culturais para o desenvolvimento da colheidora;	
4.2	Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	01/05/2020	31/12/2021		23/08/2020			40%	Em Andamento	Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021	
5	Avaliação									0%	A iniciar		
5.1	Avaliação dos resultados do projeto	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	01/10/2021	30/03/2022					0%	A iniciar	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021	
5.2	Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	30/03/2022	29/04/2022					0%	A iniciar		
5.3	Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	29/04/2022	29/05/2022					0%	A iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	74,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2019
Programa do PPA:	-			Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-			Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Com base na proposição nº 105/2017, feita pela Sudene ao CONDEL, em seu Art. 3º, o qual diz que: os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.				
Projeto:	Redelimitação do Semiárido				
Objetivo do projeto:	Discutir as bases técnicas para os estudos dos critérios técnicos e científicos para a nova redelimitação do semiárido, prevista para ocorrer em 2021.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	26/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aílido, Marcelo, Ludmila, Victor

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Planejamento das etapas	Planejamento das etapas	CGEP	01/12/2019	31/01/2020		01/12/2019	10/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Formação do GT Sudene	Formação do GT Sudene		01/02/2020	29/02/2020		10/02/2020				Cancelado		
1.3	Revisão de Literatura	Revisão de Literatura	CGEP, CGCP, CGDS	01/02/2020	15/03/2020		18/08/2020	30/09/2020		100%	Concluído		
1.4	Reunião de fechamento	Reunião de fechamento	CGEP, CGCP, CGDS	01/10/2020	01/10/2020		22/11/2020	22/11/2020		100%	Concluído		
2	Articulações com Parceiros									27%	Atrasado	"Com relação à etapa 2 (Articulações com parceiros), vale destacar que no planejamento inicial, a mesma tinha previsão de realização entre março e maio de 2020. Contudo, esse ano tem sido bastante atípico, em razão da ocorrência inesperada da pandemia do novo Coronavírus. Essa pandemia ocasionou – e vem ocasionando – profundas mudanças na questão da saúde pública mundial, com impactos nas áreas social, econômica, política etc. Desde março de 2020, as atividades de diversos setores – tanto públicos quanto privados – vêm sendo impactadas, refletindo em atrasos ou até mesmo em paralisações de projetos ou ações previstas. Como algumas das atividades previstas foram pensadas para serem executadas de forma presencial, a exemplo das reuniões técnicas de discussão, tanto as no âmbito da Sudene quanto as interinstitucionais, não houve tempo hábil para se executar tais atividades, uma vez que as instituições estão ainda se adaptando à nova forma de trabalho atualmente em uso, por meio remoto. Assim, a etapa de articulação com os parceiros tem previsão de ser executada em outubro de 2020. Para essa etapa, os parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."	

2.1	Levantamento dos parceiros	Levantamento dos parceiros	CGEP, CGCP, CGDS	02/10/2020	09/10/2020		01/10/2020			80%	Em Andamento		
2.2	Contato com os parceiros	Contato com os parceiros	CGEP, CGCP, CGDS	12/10/2020	23/10/2020					0%	Atrasado		
2.3	Recebimento de Feedback	Recebimento de Feedback	CGEP, CGCP, CGDS	26/10/2020	06/11/2020					0%	Atrasado		
3	Definição da Metodologia									0%	Atrasado		
3.1	Preparação da Reunião	Preparação da Reunião	CGEP, CGCP, CGDS	09/11/2020	13/11/2020					0%	Atrasado		
3.2	Reunião de planejamento interinstitucional	Reunião de planejamento interinstitucional	CGEP, CGCP, CGDS	16/11/2020	30/11/2020					0%	Atrasado		
3.3	Definição da Metodologia	Definição da Metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	01/12/2020	01/02/2021					0%	Atrasado		
3.4	Preparação de Reunião	Preparação de Reunião	CGEP, CGCP, CGDS	02/02/2021	15/02/2021					0%	A Iniciar		
3.5	1a Reunião de discussão técnica	1a Reunião de discussão técnica	CGEP, CGCP, CGDS	16/02/2021	28/02/2021					0%	A Iniciar		
3.6	Reunião de discussão técnica - fechamento	Reunião de discussão técnica - fechamento da metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	01/04/2021	15/04/2021								
3.7	Prepação de relatório para Condel	Prepação de relatório para Condel	CGEP, CGCP, CGDS	15/04/2021	30/04/2021					0%	A Iniciar		
3.8	Aprovação da metodologia e designação do GT da Delimitação do Semiárido no Condel	Aprovação da metodologia e designação do GT da Delimitação do Semiárido no Condel	CGEP, CGCP, CGDS	30/04/2021	20/05/2021					0%	A Iniciar		
4	Realização da Delimitação									0%	A Iniciar		
4.1	Levantamento e tabulação dos dados	Levantamento e tabulação dos dados	CGEP, CGCP, CGDS	20/05/2021	19/06/2021					0%	A Iniciar		
4.2	Aplicação da metodologia	Aplicação da metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	19/06/2021	19/07/2021					0%	A Iniciar		
4.3	Confecção dos mapas	Confecção dos mapas	CGEP, CGCP, CGDS	19/07/2021	03/08/2021					0%	A Iniciar		
4.4	Reunião técnica de apresentação de resultados	Reunião técnica de apresentação de resultados	CGEP, CGCP, CGDS	03/08/2021	18/08/2021					0%	A Iniciar		
4.5	Divulgação dos resultados preliminares	Divulgação dos resultados preliminares	CGEP, CGCP, CGDS	18/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar		
4.6	Recebimento de recursos	Recebimento de recursos	CGEP, CGCP, CGDS	02/09/2021	22/09/2021					0%	A Iniciar		
4.7	Avaliação dos Recursos	Avaliação dos Recursos	CGEP, CGCP, CGDS	22/09/2021	22/10/2021					0%	A Iniciar		
4.8	Apresentação dos resultados diretoria colegiado	Apresentação dos resultados diretoria colegiado	CGEP, CGCP, CGDS	22/10/2021	11/11/2021					0%	A Iniciar		

4.9	Divulgação do resultado final	Divulgação do resultado final	CGEP, CGCP, CGDS	11/11/2021	26/11/2021					0%	A Iniciar		
4.10	Apresentação dos resultados Condel	Apresentação dos resultados Condel	CGEP, CGCP, CGDS	26/11/2021	26/12/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	31,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Prazos repactados: "Com relação à etapa 2 (Articulações com parceiro), vale destacar que no, planejamento inicial, a mesma tinha previsão de realização entre março e maio de 2020. Contudo, esse ano tem sido bastante atípico, em razão da ocorrência inesperada da pandemia do novo Coronavírus. Essa pandemia ocasionou – e vem ocasionando - profundas mudanças na questão da saúde pública mundial, com impactos nas áreas social, econômica, política etc. Desde março de 2020, as atividades de diversos setores – tanto públicos quanto privados – vêm sendo impactadas, refletindo em atrasos ou até mesmo em paralisações de projetos ou ações previstas. Como algumas das atividades previstas foram pensadas para serem executadas de forma presencial, a exemplo das reuniões técnicas de discussão, tanto as no âmbito da Sudene quanto as interinstitucionais, não houve tempo hábil para se executar tais atividades, uma vez que as instituições estão ainda se adaptando à nova forma de trabalho atualmente em uso, por meio remoto. Assim, a etapa de articulação com os parceiros tem previsão de ser executada em outubro de 2020. Para essa etapa, os parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):			
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):			
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Segurança hídrica: um dos eixos estratégicos destacados do PRDNE; Água é fator chave para o desenvolvimento sustentável da região, especialmente na porção semiárida; No Nordeste, ocorrem frequentes situações críticas de escassez hídrica, nas quais: A demanda por água supera sua oferta; A poluição compromete a qualidade da água; Há redução do seu potencial de uso e aumento do custo com tratamentos; No Semiárido, a renovação das águas subterrâneas e superficiais sofre com os baixos e irregulares índices pluviométricos; A Sudene vem realizando articulações com instituições públicas e privadas para ações norteadoras da segurança hídrica para sua área de atuação, em especial a região semiárida. Uma destas ações consiste na implantação da Rede Estratégica de Poços no Semiárido, articulada juntamente ao Serviço Geológico do Brasil - CPRM				
Projeto:	Rede de Poços e Barragens				
Objetivo do projeto:	Promover a Segurança hídrica para os municípios do Semiárido, de forma mais duradoura e sustentável, minimizando o gasto de recursos com ações emergenciais - entre as quais se destaca a operação Carro-Pipa - e reduzindo significativamente sua dependência.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Veronilton

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									51%	Em Andamento	Atividade Parализada devido a não aprovação de recursos.	
1.1	Minuta do projeto		CGEP	11/10/2019	21/11/2019		11/10/2019	21/11/2019		100%	Concluído		
1.2	Incorporação de Geólogo à equipe		CGEP / CGGP	11/10/2019	01/02/2020		11/10/2019			1%	Paralisado	o pedido de cessão do Sevidor foi negado	refazer o pedido para lotação em Brasília
2	Articulações com Parceiros									0%	Paralisado		
2.1	Articulação com CPRM		CGEP	01/10/2019	31/03/2020		09/10/2019			1%	Paralisado	Já foi realizada uma reunião de articulação na Sudene	
2.2	Articulação com MDR		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	Paralisado		
2.3	Articulação com Comando Militar do Nordeste		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	Paralisado		
3	Formalização do Acordo com CPRM									0%	Paralisado		
3.1	Elaboração do Projeto		CPRM / CGEP	01/06/2020	01/07/2020					0%	Paralisado		

3.2	Elaboração do Plano de Trabalho		CPRM / CGEP	01/07/2020	01/08/2020					0%	Paralisado		
3.3	Elaboração do TED		CCONT / PF / CGEP	01/08/2020	01/09/2020					0%	Paralisado		
3.4	Formalização do Acordo com CPRM		CCONT / GAB	01/09/2020	30/12/2020					0%	Paralisado		
4	Acompanhamento da Execução									0%	Paralisado		
4.1	diagnóstico		CPRM / CGEP	01/01/2021	01/03/2021					0%	Paralisado		
4.2	seleção de poços a serem recuperados		CPRM / CGEP	01/03/2021	01/04/2021					0%	Paralisado		
4.3	execução		CPRM / CGEP	01/04/2021	30/10/2021					0%	Paralisado		
4.4	avaliação		CPRM / CGEP	01/11/2021	31/12/2021					0%	Paralisado		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	12,7%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

PO paralisado devido à não aprovação de recursos e à não incorporação do geólogo à equipe.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Ausência de mapeamento das empresas incentivadas através da redução de 75% do imposto sobre lucro da operação, na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).		
Objetivo do projeto:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	9/30/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão;

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Redução de 75% sobre IRPJ) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			100%	Concluído	A data prevista para conclusão do produto precisou ser alterada em virtude das dificuldades de acessos aos dados e do trabalho remoto, decorrente da Pandemia COVID19.	Previsão de conclusão até 30/12/2020.
1.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020	-	100%	Concluído		
1.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com a redução de 75% do IRPJ para o georreferenciamento e formulação de mapas da Regiões intrmediárias e municípios da pareia da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/02/2020	31/05/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	Concluído		
1.3	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/03/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	Concluído		
1.4	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Gerar tabelas e gráficos com os dados dos últimos 9 anos das principais atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	31/07/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
1.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva das empresas georreferenciadas sobre as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias e municípios, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	Concluído		

2	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Reinvestimento) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			83%	Em Andamento		
2.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020		100%	Concluído		
2.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com o reinvestimento para o georreferenciamento e formulação de mapas da regiões intermediárias e municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.3	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as regiões intermediárias	Gerar mapas dos dados dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/07/2020	31/07/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.4	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com os municípios da área da Sudene	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas pelo Reinvestimento dos municípios da área de atuação da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/08/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
2.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva dos mapas com as áreas das regiões intermediárias e municípios e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	Concluído	Existem inconsistências nos dados de Reinvestimentos do SIBF, que estão relacionados no relatório final	
2.6	Discussão dos resultados do Relatório Final com a CGEP, CGIF e CGCP	Fazer uma discussão dos resultados finais com as coordenações gerais envolvidas	Marcos Falcão	01/02/2021	30/05/2021					0%	A Iniciar	Etapa de discussão do Relatório Final acrescentada	
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:			R\$	-	91,7%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 13)
Objetivo estratégico	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Necessidade de instrumento voltado para o planejamento do desenvolvimento sustentável			
Projeto:	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE			
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.481.361,00	R\$ 1.481.361,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 120.403,17
				A realizar no exercício	R\$ 339.911,25
R\$ 1.481.361,00			R\$ 1.481.361,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 120.403,17

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise do Relatório P14	P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE (Documento de arquitetura da informação). A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para eliciação de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/09/2019	31/10/2019	R\$ 139.828,50	Não informado	10/12/2019	R\$ 120.403,17	100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudene.	
2	Análise do Relatório P15	P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE. Com a condução de especialista em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	11/11/2019	30/11/2020	R\$ 269.514,00	Não informado			40%	Atrasado	Foi entregue versão preliminar em fevereiro de 2020. A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. A versão final foi enviada à Sudene no dia 18 de dezembro. A apreciação técnica do produto se deu pela COAE/CGEP, com o envio da Nota Técnica 2 (0216636) no dia 05/01/2021. Neste momento, a CGEP e CGCP aguardam o envio do produto revisado e com os ajustes solicitados.	
3	Análise do Relatório P16	P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE. A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenhada será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	23/03/2020	31/12/2020	R\$ 70.397,25				0%		A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo	

4	Análise do Relatório P17	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a captura e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/11/2020	28/02/2021	R\$	389.177,25				0%		Repactuado conforme aditivo à carta acordo	
5	Análise do Relatório P18	P18 - Relatório descritivo dos instrumentos e mapas de conhecimento afetos à carteira de projetos do PRDNE. A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de Inteligência em CTI do CGEE para geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos de informação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/02/2021	31/05/2021	R\$	355.850,25				0%		Repactuado conforme aditivo à carta acordo	
6	Análise do Relatório P19	P19 - Relatório da capacitação instrumental e operação assistida da metodologia e ferramentas de apoio de monitoramento do PRDNE. A equipe do CGEE fará a capacitação para até 30 técnicos indicados pela Sudene na utilização de instrumentos de captação de dados e geração de informação previstos nas metodologias de Gestão de Fontes e de Mapas de Conhecimento, nas dependências da SUDENE. Está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação, bem como nos momentos posteriores para apoio no implementação da metodologia.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	30/06/2021	R\$	94.185,00				0%		Repactuado conforme aditivo à carta acordo	
7	Análise do Relatório P20	P20 - Relatório da Trilha de Inteligência. A partir de análise crítica da implementação das metodologias e insumos coletados das demais trilhas do projeto, a equipe do CGEE em conjunto com especialista em indicadores irá elaborar o resumo geral das metodologias implantadas e os resultados alcançados, bem como um documento de visão contendo especificações de alto nível de funcionalidades para um sistema de informação fundamentado nas metodologias implantadas. O trabalho irá requerer visita in loco para observação do funcionamento da metodologia, bem como coleta de percepções e discussão com a equipe da SUDENE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	31/07/2021	R\$	162.408,75				0%		Repactuado conforme aditivo à carta acordo	
				Valor Previsto:		R\$ 1.481.361,00		Valor realizado:		R\$ 120.403,17	35%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	2 - Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de regionalização das políticas públicas de educação		
Projeto:	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação		
Objetivo do projeto:	Elaboração de um índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/03/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson Brandão, Glória Sistelos, Joyce, Gabriela Isabel

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Dados		Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	Concluído		
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído	Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de	
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
1.4	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	Concluído	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019.	
2.	Análise		Glória Sistelos	02/03/2020	30/01/2021	-	24/02/2020			65%	Em Andamento		
2.1	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
2.2	Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
2.3	Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020			60%	Atrasado	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 25/10/2020	
2.4	Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	02/03/2020	30/11/2020	-	13/10/2020	28/10/2020		100%	Concluído	Os mapas foram resultados do IDEB 2019	
2.5	Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	01/04/2020	30/11/2020	-	28/10/2020			10%	Atrasado		
2.6	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/04/2020	30/12/2020	-	24/02/2020			80%	Atrasado	Falta incluir os dados do IDEB 2019	

2.7	Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	04/09/2020	30/01/2021		04/09/2020			5%	Em Andamento	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO		
3.	Panorama de Políticas Públicas de Educação		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020			67%	Em Andamento			
3.1	Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento	Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020			70%	Em Andamento			
3.2	Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas	Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020			70%	Em Andamento			
3.2	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020			60%	Em Andamento			
4	Relatório final		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	30/03/2021	-	13/07/2020			5%	Em Andamento			
4.1	Consolidação	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	28/02/2021	-	13/07/2020			10%	Em Andamento			
4.2	Revisão	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	01/03/2021	30/03/2021	-				0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	59%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Observações:

Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, foram ajustados os prazos e os percentuais de entrega das atividades, pois algumas delas precisarão ser refeitas

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO20 (EX PO 15)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social		
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Importância da cultura da Palma para o Semiárido				
Projeto:	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO				
Objetivo do projeto:	A palma forrageira (Opuntia ou Nopalea spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a resolução de alguns problemas fitossanitários.				

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
		250 e 280	3	90	R\$ 441.438,94	R\$ 441.438,94		Pago até o ano anterior	R\$ -
		250 e 280	4	90	R\$ 38.410,15	R\$ 38.410,15		A realizar no exercício	R\$ -
					R\$ 479.849,09	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)		R\$ 211.365,09	
Previsão de Conclusão:		31/03/2024				Valor Empenhado no Exercício		R\$ -	
Data Atualização:		31/12/2020				Valor liberado no Exercício	R\$ -		
Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino				Saldo a liberar	R\$ -	
		INSA:	JUCILENE SILVA ARAÚJO				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 211.365,09	
						Total Liberado até o exercício	R\$ -		

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								7%	A Iniciar		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 211.365,09	08/10/2020	14/10/2020		100,0%	Concluído	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
2.2	Subprojeto 1	Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético de opuntia spp visando a sua utilização como forrageira e prospectando novas potencialidades a partir da coleção do INSA.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 193.711,83				0,0%	A Iniciar		

2.2.1	Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromotológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 13.600,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.2	Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	16/10/2020	08/07/2022	R\$ 8.500,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.3	Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.4	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 28.400,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.5	Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	10/11/2021	08/07/2022	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.6	Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	14/01/2021	08/07/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.7	Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	11/09/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.8	Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	08/07/2022	01/10/2023	R\$ 35.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.9	Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrósporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.10	Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 13.000,00				0,0%	A Iniciar		

2.2.11	Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenilidade	INSA	14/05/2021	10/11/2021	R\$ 6.611,83				0,0%	A Iniciar		
2.2.12	Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progenies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 7.600,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.13	Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	11/10/2021	01/10/2023	R\$ 6.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.14	Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	16/10/2020	01/10/2023	Não se aplica				0,0%	A Iniciar		
2.3	Subprojeto 2	Estratégia de manejo para controle da cochonilha-de-escama em palma forrageira.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 167.850,26				0,0%	A Iniciar		
2.3.1	Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	16/10/2020	03/06/2023	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.2	Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	15/03/2021	04/05/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.3	Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	13/07/2021	04/01/2023	R\$ 35.850,24				0,0%	A Iniciar		
2.3.4	Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	13/07/2021	04/04/2023	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.5	Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	09/05/2022	03/07/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.6	Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	14/01/2021	03/02/2023	R\$ 27.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.7	Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,02				0,0%	A Iniciar		
2.4	Subprojeto 3	Manejo integrado de doenças em palma forrageira no semárido.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 118.287,00				0,0%	A Iniciar		
2.4.1	Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	16/10/2020	10/11/2021	R\$ 31.153,40				0,0%	A Iniciar		
2.4.2	Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	13/06/2021	05/12/2022	R\$ 41.240,00				0,0%	A Iniciar		

2.4.3	Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	06/10/2022	04/04/2023	R\$ 21.946,00				0,0%	A Iniciar		
2.4.4	Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	05/11/2022	04/05/2023	R\$ 9.333,60				0,0%	A Iniciar		
2.4.5	Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	05/11/2022	02/08/2023	R\$ 14.614,00				0,0%	A Iniciar		
2.4.6	Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	13/06/2021	01/10/2023	Não se aplica				0,0%	A Iniciar		
2.5	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	A Iniciar		
2.6	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 139.342,00				0,0%	A Iniciar		
2.7	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.8	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 129.142,00				0,0%	A Iniciar		
2.9	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	01/10/2023	30/11/2023					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/12/2023	30/01/2024					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/01/2024	31/03/2024					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 479.849,09	Valor realizado:		R\$ 0,00	27%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
INSA													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.000816/2020-46 - TED INSA PALMA													

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 21 (EX PO 16)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de difusão de tecnologias e capacitação dos agricultores, familiares e técnicos atuantes nas comunidades dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, localizados em áreas de fronteira.		
Projeto:	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil		
Objetivo do projeto:	Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias às populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	3	90	R\$ 251.412,28	R\$ 251.412,28
	250 e 280	4	90	R\$ 47.520,00	R\$ 47.520,00
					R\$ 298.932,28

Previsão de Conclusão:	04/08/2023
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Mauro Bezerra e Aílido Sabino
	INSA:	GEOVERGUE RODRIGUES DE MEDEIROS

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 75.397,01*
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

* Em 2020 foi descentralizado os recursos orçamentários, contudo o INSA devolveu o financeiro, ficando o orçamento em restos a pagar.

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependência da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020					100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020					100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								4%	A Iniciar		
2.1	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01				100,0%	Concluído		

2.2	Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte	Produto: diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 26.570,08				0,0%	A Iniciar		
2.3	Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	15/03/2021	08/06/2022	R\$ 12.687,37				0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	14/01/2021	05/11/2022	R\$ 22.720,81				0,0%	A Iniciar		
2.5	Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	13/02/2021	09/05/2022	R\$ 6.300,13				0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	14/01/2021	15/04/2022	R\$ 75.004,62				0,0%	A Iniciar		
2.7	Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	13/07/2021	09/05/2022	R\$ 22.530,00				0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA		04/01/2023	R\$ 23.726,04				0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados para a região da bacia hidrográfica Piranhas-Açu	Produto: Três artigos científicos	INSA	13/06/2021	03/02/2023	R\$ 4.500,00				0,0%	A Iniciar		
2.10	Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 75.000,00				0,0%	A Iniciar		

2.11	Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	14/01/2021	08/06/2022	Não se aplica				0,0%	A Iniciar		
2.12	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	A Iniciar		
2.13	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 143.114,97				0,0%	A Iniciar		
2.14	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.15	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 80.420,30				0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	03/02/2023	04/04/2023					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	05/04/2023	04/06/2023					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	05/06/2023	04/08/2023					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 298.932,28	Valor realizado:		R\$ 0,00	24%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
INSA	
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.001084/2020-10 - TED INSA LEITE. A diferença de R\$ 29.893,23 entre o valor previsto e o valor total do projeto diz respeito aos custos administrativos não inclusos no Plano de Trabalho original (Plano de Trabalho CGEP SEI 0184994)	

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 22 (EX PO 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Importância da cultura da Palma para o Semiárido				
Projeto:	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL				
Objetivo do projeto:	Realizar ensaios de longa duração no campo com adubação da palma forrageira que ao seu final permita a obtenção de dados confiáveis para a construção de tabelas de recomendação de adubação que possa subsidiar os agricultores da região semiárida no cultivo ambientalmente sustentável dessa cultura.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	-	90	R\$ 212.353,19	R\$ 212.353,19

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	30/10/2025
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	UFPB	Adailson Pereira de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 31.230,86
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 31.230,86
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								11%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/06/2020	08/09/2020		04/06/2020	08/09/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	08/09/2020	24/09/2020		08/09/2020	24/09/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	24/09/2020	09/10/2020		24/09/2020	09/10/2020		80,0%	Em Andamento	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPB	09/10/2020	24/10/2020					0,0%	Paralisado	Por falta de resposta em tempo da nova gestão da UFPB, não foi possível a formalização do	
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/10/2020	08/11/2020					0,0%	Paralisado		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	Paralisado		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	08/11/2020	23/11/2020	R\$ 31.230,86				0,0%	Paralisado		

2.2	Meta 1: Instalar, em diferentes áreas da região semiárida brasileiras, 4 (quatro) experimentos de longa duração para estudos de nutrição da palma forrageira.	Produto: experimentos instalados	UFPB	23/11/2020	02/03/2025					0,0%	Paralisado		
2.3	Meta 2: Definir faixas de recomendação de adubação com N e K em função dos níveis de fertilidade dos solos da região semiárida brasileira.	Produto: faixas de recomendação de adubação com N e K definidas	UFPB	23/11/2020	02/03/2025					0,0%	Paralisado		
2.4	Meta 3: Identificar características biométricas, fisiológicas e bioquímicas da palma forrageira sensíveis às variações do solo.	Produto: características biométricas, fisiológicas e bioquímicas identificadas	UFPB	23/11/2020	01/05/2025					0,0%	Paralisado		
2.5	Meta 4: Determinar, em cada unidade experimental, a dose de N e K que expressem a maior produtividade da palma forrageira.	Produto: Doses de N e K determinadas	UFPB	16/02/2022	02/03/2025					0,0%	Paralisado		
2.6	Meta 5: Publicar quatro artigos científicos em periódicos nacional/ internacional e 1 (um) livro sobre temas relacionados a nutrição da palma forrageira no semiárido.	Produto: Artigos publicados	UFPB	18/03/2022	01/05/2025					0,0%	Paralisado		
2.7	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	Paralisado		
2.8	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 133.901,59				0,0%	Paralisado		
2.9	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	Paralisado		
2.10	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 10.377,45				0,0%	Paralisado		
2.11	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	Paralisado		
2.12	Liberação da quarta parcela de recursos	Liberação da 4ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2023	28/02/2023	R\$ 11.232,92				0,0%	Paralisado		
2.13	4ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2024	30/01/2024					0,0%	Paralisado		
2.14	Liberação da quinta parcela de recursos	Liberação da 5ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2024	28/02/2024	R\$ 12.377,45				0,0%	Paralisado		
2.15	5ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2025	30/01/2025					0,0%	Paralisado		
2.16	Liberação da sexta parcela de recursos	Liberação da 6ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2025	28/02/2025	R\$ 13.232,92				0,0%	Paralisado		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	Paralisado		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPB	01/05/2025	30/06/2025					0,0%	Paralisado		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/07/2025	30/08/2025					0,0%	Paralisado		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/08/2025	30/10/2025					0,0%	Paralisado		
				Valor Previsto:		R\$ 212.353,19		Valor realizado:		R\$ 0,00	11%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
INSA												
Observações:												
Processo SEI n.º 59336.000888/2020-93 - TED UFPB. Plano de Trabalho em fase de detalhamento, em que serão detalhados os custos por meta												

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23 (EX PO 18)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	menor dinamismos econômico e social		
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014 Art. 4º Ao Conselho Deliberativo compete: XIII - em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE: d) definir os critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE [sic].				
Projeto:	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE				
Objetivo do projeto:	Propor ao Condel critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE e operacionalizar o edital conjunto com o BNB				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	02/03/2023
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino, Joyce Queiroz e Marcus Paz

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento									70%	Em Andamento		
1.1	Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100%	Concluído		
1.2	Aprovação da Nota Técnica em Diretoria Colegiada		CGEP	10/08/2020	10/08/2020		10/08/2020	10/08/2020		100%	Concluído	362ª ReuniãoExtraordinária daDiretoria Colegiada	
1.3	Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100%	Concluído	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	
1.4	Nota Técnica complementar com proposta de critérios e prioridades ao Condel		CGCP, CGEP	23/09/2020	23/10/2020		23/09/2020			50%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	

1.5	Reunião de fechamento com parceiros para validação dos critérios		CGEP	23/10/2020	30/10/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros		
1.6	Aprovação da NT Complementar em Diretoria Colegiada e envio para aprovação AD REFEREDUM		CGEP/Gabinete	01/11/2020	30/11/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros		
2	Formalização									0%	A Iniciar			
2.1	Assinatura de ACT Sudene, FINEP, BNB, CONFAP		CGEP, BNB, FINEP, CONFAP	01/11/2020	31/12/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros		
2.3	Preparação de Edital Conjunto Sudene-BNB		CGEP, BNB	01/11/2020	31/01/2021					0%	A Iniciar			
3	Execução									0%	A Iniciar			
3.1	Lançamento do Edital Conjunto Sudene-BNB		CGEP, BNB	01/02/2021	10/06/2021					0%	A Iniciar			
3.2	Contratação dos projetos de fomento		BNB	10/06/2021	09/08/2021					0%	A Iniciar			
3.3	Acompanhamento dos projetos contratados		CGEP, BNB	09/08/2021	04/08/2022					0%	A Iniciar			
3.4	Avaliação técnica final		CGEP, BNB	04/08/2022	03/10/2022					0%	A Iniciar			
4	Prestação de Contas									0%	A Iniciar			
4.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pelo BNB	BNB	03/10/2022	02/12/2022					0%	A Iniciar			
4.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	02/12/2022	02/03/2023					0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	17,5%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	Número do Projeto:	PO 24 (EX PO 19)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias de APLs, estimulando inovação, articulando-as a investimentos estruturadores.	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Escassez de estudos com recortes regionais abrangentes que, ao mesmo tempo, permitam obter um entendimento com maior precisão dos efeitos adversos da pandemia nos territórios e obter uma visão consolidada sobre os desafios do setor produtivo e o impacto social da crise.		
Projeto:	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36		
Objetivo do projeto:	Levantar informações sobre a atual situação do setor produtivo da região e seus desdobramentos para a sociedade, bem como quais são os desafios, demandas e perspectivas, para nortear as ações da Sudene para o adequado enfrentamento e superação da crise na região, crise essa que tem consequências tanto econômicas quanto sociais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3 - Outras despesas correntes	90	R\$ 349.500,00	R\$ 349.500,00

Previsão de Conclusão:	08/04/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria da Glória Sistêlo, Gabriela Nascimento, Tássia Germano, Marina Rogério e Miguel Vieira

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 349.500,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 349.500,00
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 349.500,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Abertura do Projeto			18/05/2020	20/05/2020	-	18/05/2020	20/05/2020	100%	Concluído		
1.1	Análise técnica da proposta inicial	Análise técnica da proposta de Estudo de Pesquisa de Opinião	CGEP	18/05/2020	20/05/2020	-	18/05/2020	20/05/2020	100%	Concluído		
2.	Trâmites de contratação			02/06/2020	03/12/2020	-	02/06/2020		100%	Concluído	Considerando a revogação do 1º Edital, a coluna K contempla as datas de execução final tanto dos documentos que não necessitam de alteração quanto daqueles relativos à tramitação do 2º edital. Ocorreu reprogramação dos prazos deste último, os quais iniciam no item 2.7.	
											Considerando a revogação do 2º Edital (SEI 0193555) para lançamento de novo pregão, uma vez que ao final da sessão todos os licitantes foram inabilitados, a coluna K contempla as datas de execução final tanto dos documentos que não necessitam de alteração quanto daqueles relativos à tramitação do 3º Edital. Ocorreu reprogramação dos prazos deste último, os quais iniciam no item 2.7., o que justifica o lapso de tempo entre os itens 2.6 e 2.7 nas colunas G e H.	
2.1	Documentação de Formalização da Demanda	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	CGEP/DPLAN	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020	100%	Concluído	A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e	
2.2	Mapeamento de Riscos	Elaboração do mapeamento de riscos do projeto	CGEP	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020	100%	Concluído	A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e adequações quanto ao conteúdo e forma.	
2.3	Estudo Técnico Preliminar	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, contemplando metodologia da pesquisa, cotação de preços	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020	100%	Concluído		
2.4	Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020	100%	Concluído		
2.5	Edital	Elaboração do Edital com base com TR	COLIC	23/06/2020	13/07/2020		06/08/2020	27/10/2020	100%	Concluído	Minuta do Edital	
2.6	Análise jurídica do Edital	Análise jurídica do Edital	Procuradoria	13/07/2020	28/07/2020		14/08/2020	06/11/2020	100%	Concluído		
2.7	Ajustes do Edital	Ajustes do Edital, de acordo com as recomendações da Procuradoria, se houver.	COLIC/CGEP	06/11/2020	09/11/2020		06/11/2020	06/11/2020	100%	Concluído	Datas reprogramadas a partir desta atividade	
2.8	Abertura do Processo Licitatório	Abertura do Processo Licitatório e respostas a possíveis questionamentos	COLIC/CGEP	10/11/2020	19/11/2020		09/11/2020	19/11/2020	100%	Concluído		

2.9	Qualificação do licitante	Análise da Qualificação Financeira e Técnica do Licitante	CGEP/COLIC	19/11/2020	23/11/2020		19/11/2020	16/12/2020		100%	Concluído	Essa etapa durou mais do que o esperado, uma vez que houve a necessidade de analisar a documentação de habilitação técnica de 8 empresas	
2.10	Finalização do Processo Licitatório	Finalização do Processo Licitatório - Homologação e Adjudicação	COLIC	23/11/2020	27/11/2020		16/12/2020	16/12/2020		100%	Concluído		
2.11	Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	COLIC	27/11/2020	03/12/2020		22/12/2020	22/12/2020		100%	Concluído		
3	Acompanhamento da execução			03/12/2020	08/04/2021	-				2%	Em Andamento	Considerando a data da assinatura do Contrato (22/12/2020) e solicitação justificada da	
3.1	Planejamento	Acompanhamento e validação do cronograma de execução, roteiros e questionários da pesquisa	CGEP	23/12/2020	24/01/2021		23/12/2020			10%	Em Andamento	Datas reprogramadas	
3.2	Pré - teste	Acompanhamento e validação do teste do instrumento da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	25/01/2021	08/02/2021					0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
3.3	Coleta de Dados	Acompanhamento e validação da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	09/02/2021	05/03/2021					0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
3.4	Base de Dados	Acompanhamento e validação da base de dados	CGEP	09/02/2021	09/03/2021					0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
3.5	Relatório de resultados	Validação dos relatórios com resultados da pesquisa (Sudene e UFs)	CGEP	19/02/2021	05/04/2021	-				0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
3.2	Resumo Executivo e Apresentação	Validação do Resumo Executivo e apresentação	CGEP	19/02/2021	08/04/2021	-				0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
				Valor Previsto:		R\$ 349.500,00	Valor realizado:		R\$ -	67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

O Edital foi revogado em 04/09/2020. Até essa data estava em análise

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 25 (EX PO 20)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	A Portaria Nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019, determina que seja realizada, anualmente, avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento.		
Projeto:	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene. - Processos SEI 59336.000658/2020-24 e 59336.000510/2020-90.		
Objetivo do projeto:	Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos incentivos fiscais como instrumento da PNDR na área de atuação da Sudene. Bem como, avaliar o retorno econômico e social da política de incentivos fiscais conduzida pela Superintendência.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
			TED		

Previsão de Conclusão:	16/10/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogerio e Miguel Araújo

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Abertura do Projeto e discussões internas para formulação de Plano de Trabalho Portaria MDR 3.145/2019		COAE/Sudene	03/02/2020	28/02/2020		17/02/2020	12/05/2020		100%	Concluído	Em razão da pandemia, foi necessário promover mudanças no ambiente e rotina de trabalho de toda a equipe. Adaptações iniciais foram necessárias. Além disso, outros projetos e atividades foram demandadas, o que comprometeu o adequado planejamento e execução dos trâmites necessários para a avaliação dos incentivos fiscais para atender aos dispositivos da Portaria 3.145/2019 conforme cronograma estimado inicialmente.	
1.1	Apreciação do projeto básico da CGEP para avaliação dos IFF da Sudene	Apresentação de proposta inicial da CGEP (2018/2019) para avaliação dos resultados do IFF. Trata-se de uma breve análise do conteúdo da Portaria Nº 3.145/2019 do MDR quanto aos seus	COAE/Sudene	03/02/2020	07/02/2020		17/02/2020	18/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Análise da Portaria Nº 3.145/2019 do MDR	Portaria Nº 3.145/2019 do MDR quanto aos seus	COAE/Sudene	10/02/2020	21/02/2020		11/03/2020	20/03/2020		100%	Concluído		
1.3	Elaboração de minuta de Plano Operativo e de estratégia da CGEP para estruturação das avaliações dos IFF da Sudene	Elaboração de Plano Operativo com a definição de atividades e cronograma para elaboração do Plano de Trabalho em resposta à Portaria MDR 3.145/2019; e contratação da avaliação dos IFF na área de atuação da Sudene.	COAE/Sudene	11/03/2020	31/03/2020		23/03/2020	31/03/2020		100%	Concluído	Em razão da pandemia, houve necessidade de readequar as atividades e o ambiente de trabalho. Adaptações foram necessárias. Adicionalmente, outros projetos e demandas surgiram nesse período, o que comprometeu a execução desse projeto no cronograma estimado inicialmente.	
1.4	Elaboração do Termo de Abertura do Projeto - Avaliação dos Incentivos Fiscais da Sudene	Elaborar o Termo de Abertura do Projeto sobre a avaliação dos incentivos fiscais da Sudene. O TAP apresenta a justificativa para execução da avaliação dos incentivos, o objetivo do projeto, o alinhamento com as diretrizes estratégicas da Sudene e as responsabilidades das partes interessadas no projeto.	COAE/Sudene	31/03/2020	09/04/2020		20/04/2020	27/04/2020		100%	Concluído		
1.5	Apreciação da Procuradoria acerca dos entendimentos sobre a Portaria MDR	Parecer jurídico da Procuradoria Federal junto a Sudene acerca das possibilidades de execução	Procuradoria Federal junto a Sudene	23/04/2020	14/05/2020		30/04/2020	12/05/2020		100%	Concluído		
2	Articulação para obtenção de dados e execução dos projetos de avaliação dos resultados dos incentivos fiscais	Articulação com Receita Federal, BNDES, Ministério da Economia e Sudam para obtenção de dados e informações que permitam a execução dos projetos de avaliação dos incentivos fiscais concedidos pela Sudene. Articulação com o IPEA visando discutir e obter subsídios para elaboração do Plano de Trabalho a ser enviado ao MDR, e celebrar TED entre Sudene e IPEA para execução da avaliação dos IFF.	COAE/Sudene	01/04/2020	30/09/2020		14/04/2020			92%	Em Andamento	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições. Adicionalmente, outros projetos e demandas surgiram nesse período, o que comprometeu o adequado planejamento e execução dos trâmites necessários para a avaliação dos incentivos fiscais para atender aos dispositivos da Portaria 3.145/2019 conforme cronograma estimado inicialmente.	

2.1	Articulação com a Receita Federal para obtenção de dados desagregados sobre os gastos tributários com os incentivos fiscais	Firmar Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Sudene e a Receita Federal para obtenção de informações relativas aos incentivos fiscais da Sudene	COAE/Sudene	01/04/2020	10/04/2020		14/04/2020	29/05/2020		87%	Concluído	
2.1.1	Articulação inicial com a Sudam	Alinhamento com a Sudam sobre o Acordo de Cooperação Técnica que esta Superintendência tem	COAE/Sudene	01/04/2020	10/04/2020		14/04/2020	08/05/2020		100%	Concluído	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.1.2	Análise do ACT da Sudam	Analisar o ACT em vigência entre Sudam e unidades regionais da Receita Federal para usar	COAE/Sudene	13/04/2020	20/04/2020		08/05/2020	13/05/2020		100%	Concluído	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.1.3	Articulação com a Receita Federal	Articulação com representante da Receita Federal para compartilhamento de dados sobre os gastos	COAE/Sudene	01/04/2020	17/04/2020		27/04/2020	04/05/2020		100%	Concluído	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.1.4	Elaboração de minuta de Ofício com solicitação de dados à Receita Federal	Elaboração de ofício solicitando à Receita Federal envio de dados desagregados sobre os gastos tributários com a política de IFF na área de atuação da Sudene, idealmente, a partir do ano 2007.	COAE/Sudene	20/04/2020	22/04/2020		07/05/2020	07/05/2020		100%	Concluído	
2.1.5	Envio de Ofício com solicitação de dados à Receita Federal	Envio de Ofício à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia com solicitação de dados sobre os gastos tributários com a política de IFF na área de atuação da Sudene.	Gabinete/Sudene	23/04/2020	28/04/2020		20/05/2020	20/05/2020		100%	Concluído	Novo Ofício foi expedido pelo Gabinete desta Superintendência em 09/06/2020. Ver Ofício 1228 (0161688) Processo SEI 59336.000658/2020-24.
2.1.6	Obtenção e validação dos dados	Análise dos dados encaminhados pela Receita Federal. Verificar se as informações compartilhadas	COAE/Sudene	01/06/2020	30/09/2020		29/07/2020			20%	Em Andamento	A Receita Federal expediu ofício em 24/07, encaminhando Nota Técnica Central/Conan. 13/5/20 que trata sobre os gastos tributários na área de
2.2	Articulação com o BNDES para obtenção de dados sobre as atividades econômicas do BNDES para obtenção de informações	Articulação com o BNDES para obtenção de dados dos financiamentos do banco para	COAE/Sudene	06/04/2020	31/08/2020		27/04/2020			88%	Atrasado	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.2.1	Contato inicial com representante do BNDES para obtenção de informações	Contato técnico com o BNDES (email, telefone e videoconferência, por exemplo) para apresentar os	COAE/Sudene	06/04/2020	17/04/2020		27/04/2020	01/05/2020		100%	Concluído	
2.2.2	Elaboração de minuta de Ofício com solicitação de dados ao BNDES	Elaboração da Minuta de Ofício a ser encaminhada para o Gabinete da Sudene solicitando ao BNDES o	COAE/Sudene	20/04/2020	22/04/2020		29/04/2020	04/05/2020		100%	Concluído	
2.2.3	Envio de Ofício com solicitação de dados ao BNDES	Envio de Ofício da Sudene para o BNDES com a solicitação de compartilhamento de dados sobre os	Gabinete/Sudene	23/04/2020	29/04/2020		20/05/2020	20/05/2020		100%	Concluído	
2.2.4	Obtenção e validação dos dados	Análise dos dados encaminhados pelo BNDES.	COAE/Sudene	01/06/2020	30/09/2020		07/05/2020			50%	Atrasado	Em 07/05/2020 o BNDES respondeu ao contato inicial por email com o compartilhamento de link para obtenção de dados sobre os financiamentos
2.3	Articulação com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia	Articulação com a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia para obtenção dos	COAE/Sudene	06/04/2020	30/09/2020		01/05/2020			93%	Concluído	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.3.1	Contato inicial com representante da Ministério da Economia para obtenção de dados identificados atualizados da Relação Anual de Informações Sociais	Contato técnico com o Ministério da Economia (email, telefone e videoconferência, por exemplo) para apresentar os objetivos/necessidades da Sudene em avaliar os instrumentos de financiamento da PNDR e de como os dados da RAIS são importantes para a execução dos projetos de avaliação.	COAE/Sudene	06/04/2020	17/04/2020		01/05/2020	08/05/2020		100%	Concluído	
2.3.2	Elaboração de Minuta de Ofício com solicitação de dados do Ministério de Economia	Elaboração da Minuta de Ofício a ser encaminhada para o Gabinete da Sudene solicitando ao Ministério da Economia compartilhamento dos microdados (identificados) mais recentes da RAIS a Sudene para auxiliar nas avaliações dos instrumentos de financiamento da PNDR na região.	COAE/Sudene	20/04/2020	22/04/2020		07/05/2020	07/05/2020		100%	Concluído	
2.3.3	Envio de Ofício com solicitação de dados do Ministério de Economia	Envio de Ofício da Sudene para o Ministério de Economia com a solicitação de compartilhamento dos microdados (identificados) mais recentes da RAIS para auxiliar nas avaliações dos instrumentos de financiamento da PNDR na região.	Gabinete/Sudene	23/04/2020	29/04/2020		20/05/2020	20/05/2020		100%	Concluído	Novo Ofício foi expedido pelo Gabinete desta Superintendência em 09/06/2020. Ver Ofício 1229 (0161760) Processo SEI 59336.000658/2020-24.
2.3.4	Obtenção e validação dos dados	Análise dos dados encaminhados pelo Ministério da Economia. Verificar se as informações compartilhadas são suficientes para a execução das avaliações desenhadas - nível de desagregação, série histórica e qualidade das informações. Verificar a necessidade de novos contatos.	COAE/Sudene	01/06/2020	30/09/2020		10/08/2020			70%	Atrasado	Necessário validar os dados encaminhados.
2.4	Articulação com o Ipea com vistas a celebração de TED para avaliação dos	Articulação com o Ipea para celebração de TED para avaliação dos	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	01/07/2020	31/08/2020		27/07/2020	31/08/2020		100%	Cancelado	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições.
2.4.1	Articulação com o IPEA visando a celebração de TED para avaliação dos	Contato inicial por email/telefone com a área técnica do IPEA responsável pela execução de estudos e	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	01/07/2020	10/07/2020		27/07/2020	29/07/2020		100%	Concluído	Com a desistência por parte do Ipea, será providenciado Edital para
2.4.2	Reuniões técnicas com o IPEA para alinhamento do Plano de Trabalho da	Reunião técnica para apresentar a necessidade de avaliar os resultados incentivos fiscais na área de	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	13/07/2020	14/08/2020		29/07/2020	27/08/2020		100%	Concluído	Foram realizadas 5 reuniões técnicas, por videoconferências, nas seguintes datas: 29/07/20; 04/08/20; 11/08/20; 18/08/20; 27/08/20. Além das
2.4.3	Apreciação do IPEA sobre o Plano de Trabalho dos IFF a ser enviado ao MDR	Análise do Ipea sobre a proposta de Plano de Trabalho dos IFF a ser enviado ao MDR. Recebimento das contribuições do Instituto após apreciação do documento.	Ipea	17/08/2020	25/08/2020		27/08/2020	31/08/2020		100%	Concluído	A equipe técnica esteve à frente de outros projetos, o que inviabilizou seguir com as atividades conforme cronograma desenhado inicialmente, comprometendo, inclusive, a apreciação do IPEA.

3	Elaboração de Plano de Trabalho para avaliação dos IFF para ser submetido ao MDR (Portaria MDR 3.145/2019)	Elaboração de Plano de Trabalho para avaliação dos IFF da Sudene no ciclo 2020/2021 à luz dos objetivos e diretrizes da Portaria Interministerial 3.145/2019.	COAE/Sudene	01/06/2020	31/08/2020		01/07/2020	31/08/2020		75%	Atrasado	Em razão da pandemia, os contatos não foram efetivos e levou mais tempo do que o esperado para troca de informações entre as instituições. Adicionalmente, outros projetos e atividades surgiram nesse período demandando, por sua vez, uma atenção e dedicação especial da equipe. Esses fatores juntos comprometeu o adequado planejamento e execução dos trâmites necessários para a avaliação dos incentivos fiscais para atender aos dispositivos da Portaria 3.145/2019 conforme cronograma estimado inicialmente.		
3.1	Revisão bibliográfica sobre a literatura de avaliação de políticas públicas no Brasil.	Pesquisa e leitura de trabalhos sobre avaliação de políticas públicas no Brasil, com foco em políticas públicas de minutas do Plano de Trabalho para avaliação dos IFF em	COAE/Sudene	01/06/2020	26/06/2020		01/07/2020	21/08/2020		100%	Concluído	A fim de atender demandas urgentes que surgiram no período, foi necessário postergar o início das atividades de estudo e pesquisa.		
3.2	Elaboração de minuta do Plano de Trabalho para avaliação dos IFF em	Elaborar minuta de Plano de Trabalho referente a Portaria MDR 3.145/2019. O documento com os	IPEA	29/06/2020	07/08/2020		27/07/2020	27/08/2020		100%	Concluído	Essa etapa ocorreu concomitante com outros projetos, articulações com o IPEA e pesquisa sobre abordagens e métodos econométricos para		
3.3	Encaminhar minuta do Plano de Trabalho em resposta à Portaria MDR 3.145/2019	DIRJUR/Ipea a minuta de Plano de Trabalho a ser	COAE/Sudene	10/08/2020	10/08/2020		26/08/2020	27/08/2020		100%	Concluído			
3.4	Ajustes na minuta do Plano de Trabalho da avaliação dos IFF	Ajustes no Plano de Trabalho a ser encaminhado para o MDR, após contribuições iniciais do Ipea	COAE/Sudene	17/08/2020	21/08/2020		31/08/2020	31/08/2020		100%	Concluído			
3.5	Encaminhamento de Plano de Trabalho da avaliação dos IFF para a DPLAN	Encaminhar Plano de Trabalho a ser encaminhado para o MDR para a apreciação da DPLAN	CGEP/Sudene	21/08/2020	26/08/2020		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Durante a formulação do Plano de Trabalho pela área técnica da CGEP, a Coordenação manteve o Diretor a par das tratativas com o IPEA para auxiliar na elaboração do Plano de Trabalho e para celebração de TED visando a execução da avaliação, bem como do desenho do Plano de Trabalho.		
3.6	Submissão de Plano de Trabalho da avaliação dos IFF para o MDR	Encaminhar ao MDR o Plano de Trabalho de avaliação dos IFF no ciclo 2020/21, conforme	Gabinete Sudene	27/08/2020	31/08/2020		31/08/2020	19/10/2020		100%	Concluído	Em 31/08/2020, a Sudene encaminhou o ofício Nº 1878/2020/GAR/SI/IDFNE, solicitando prazo adicional para entrega do		
3.7	Apreciação do MDR acerca do do Plano de Trabalho em resposta à Portaria MDR	Recebimento de parecer/nota do MDR com análise do Plano de Trabalho encaminhado pela Sudene em	MDR	21/09/2020	30/09/2020					0%	Atrasado	Em 10/11/2020, foi publicada no DOU a Portaria MDR nº 2.836 (SEI 0198292), que estabelece novos prazos para a SIUDAM e SIUDENE		
3.8	Ajustes no Plano de Trabalho da avaliação dos IFF após apreciação do MDR	Ajustar o Plano de Trabalho, caso seja necessário, após análise do MDR. Verificar a necessidade de	COAE/Sudene	01/10/2020	16/10/2020					0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	88,9%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Dada a larga expertise do IPEA com avaliação de políticas públicas, em especial com políticas regionais e com o FNE, a CGEP elegeu o IPEA como o parceiro ideal para apoiar a Sudene no primeiro ano do ciclo de avaliações do FNE. Nesse sentido, desde julho de 2020, a COAE/CGEP manteve contato direto com técnicos da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do IPEA visando a formalização de TED para execução das avaliações do FNE, que teve anuência da DIRUR para seguir com as tratativas.

No entanto, o Ipea declinou da Parceria, conforme email remetido em 30/11/2020, DOC SEI 0203737 Processo 59336.001165/2020-10, que informa a impossibilidade da Parceria para a avaliação tanto dos incentivos fiscais quanto do FNE. Além disto, ainda havia a necessidade de resposta do MDR ao Plano de Trabalho encaminhado pela Superintendencia, o que não ocorreu até ao final do exercício de 2020.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 26 (EX PO 21)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Elxo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	A Portaria Nº 3.145, de 26 de dezembro de 2019, determina que seja realizada, anualmente, avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento.		
Projeto:	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene.		
Objetivo do projeto:	Avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos incentivos fiscais como instrumento da PNDR na área de atuação da Sudene. Bem como, avaliar o retorno econômico e social da política de incentivos fiscais conduzida pela Superintendência.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3 - Outras Despesas Correntes	90	R\$ 358.800,00	R\$ 358.800,00

Previsão de Conclusão:	17/05/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marina Rogerio e Miguel Araújo

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do TED entre Sudene e Ipea	Celebração do TED entre Sudene e Ipea para execução da avaliação dos incentivos fiscais à luz do Plano de Trabalho relacionado à Portaria 3.145/2019.	SUDENE e Ipea	01/10/2020	30/10/2020					33%	A Iniciar		
1.1	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para celebração de TED com o Ipea	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias à celebração de TED com IPEA para execução da avaliação dos IFF no primeiro ano do ciclo de avaliações. Aguardar o envio da manifestação formal da Dplan sobre a celebração do TED.	COAE/Sudene	01/10/2020	03/10/2020		29/09/2020	29/09/2020		100%	Concluído	Em 27/7/2020, por meio de e-mail datado de 27/07/2020 (0185858), o IPEA manifestou interesse em firmar parceria com a Sudene para as avaliações dos incentivos fiscais. Após diversas reuniões técnicas entre as equipes da Sudene e IPEA, em 29/09/2020 a CGEP solicitou autorização para seguir com as tratativas para celebração do TED, por meio do Ofício Nº 2076/2020/CGEP/DPLAN/SUDENE. Em 02/10/2020, a autorização foi proferida pelo Gabinete da Superintendência (SEI 0186163).	
1.2	Elaborar minuta de Ofício formalizando o interesse da Sudene para celebração de TED com o IPEA	Elaborar minuta de Ofício endereçado ao Ipea formalizando o interesse da Sudene em celebrar TED para execução das atividades de avaliação dos IFF na área de atuação da Sudene no ciclo 2020/2021. A Minuta de Ofício deverá ser apreciada pela DPLAN e Gabinete/Sudene.	COAE/Sudene	06/10/2020	07/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100%	Concluído	Em 07/10/2020, a Minuta de Ofício CGEP (0187390) foi encaminhada à Dplan e ao Gabinete da Sudene.	
1.3	Apreciação pela Dplan da Minuta de Ofício para formalização do interesse da Sudene em firmar TED com o IPEA	Apreciação da minuta de Ofício endereçado ao Ipea formalizando o interesse da Sudene em celebrar TED para execução das atividades de avaliação dos IFF na área de atuação da Sudene no ciclo 2020/2021. Se aprovada, a Minuta de Ofício deverá seguir para o Gabinete/Sudene para apreciação e assinatura do Superintendente.	DPLAN/Sudene	08/10/2020	09/10/2020		08/10/2020	08/10/2020		100%	Concluído	Em 08/10/2020, o Ofício nº 2154/2020 (SEI 0188046) assinado pelo Superintendente, foi enviado ao IPEA.	
1.4	Elaborar Nota Técnica sobre o TED para avaliação dos IFF	Elaborar nota técnica com motivação e justificativa para a celebração do instrumento	COAE/Sudene	01/10/2020	06/10/2020		01/10/2020	05/10/2020		100%	Concluído	Em 05/10/2020, foi elaborada a NOTA TÉCNICA Nº 249/2020 - SEI/SUDENE recomendando a celebração da parceria entre a Sudene e o IPEA.	
1.5	Recebimento de minuta do Plano de Trabalho enviado pelo IPEA para celebração do TED	Recebimento da minuta do Plano de Trabalho formulado pelo IPEA para celebração de TED para avaliação dos IFF. O Plano de Trabalho para o TED deve considerar a proposta de avaliação do instrumento aprovado pelo MDR	SUDENE e Ipea	06/10/2020	17/10/2020		13/11/2020	13/11/2020		100%	Concluído	A Sudene não recebeu resposta formal do IPEA referente ao Ofício nº 2154/2020 (SEI 0188046), tampouco encaminhou a Proposta de Plano de Trabalho do TED, conforme disciplina a	

1.6	Apreciação técnica do Plano de Trabalho referente ao TED Sudene e Ipea	Análise do do Plano Trabalho encaminhado pelo IPEA referente à celebração do TED entre Sudene e IPEA para avaliação dos IFF. O Plano de Trabalho do TED deve considerar o Plano de Trabalho elaborado pela área técnica da Sudene e aprovado pelo MDR em resposta à Portaria MDR 3.145/2019.	COAE/Sudene	19/10/2020	23/10/2020					0%	Cancelado	Portaria Nº 269, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para TED. Apesar disso, uma vez que havia sinalização positiva do IPEA em firmar parceria com a Sudene e como as tratativas técnicas estavam em curso, em 13/11/2020 a Sudene elaborou o Plano de Trabalho para o TED (SEI 0189703), observando os dispositivos da citada portaria.	
1.7	Ajustes na versão do Plano de Trabalho para o TED	Ajustes no Plano de Trabalho a ser encaminhado pelo IPEA, após apreciação do parecer do MDR sobre o Plano de Trabalho encaminhado pela Sudene em resposta à Portaria MDR 3.145/2019.	Ipea	26/10/2020	30/10/2020					0%	Cancelado		
1.9	Elaboração da Minuta de TED entre Sudene e Ipea	Elaborar minuta de TED entre Sudene e IPEA para execução da avaliação dos resultados dos IFF na área de atuação da Sudene no ciclo de 2020/21	COCIC/Sudene e Ipea	30/10/2020	06/11/2020					0%	Cancelado		
1.10	Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho do TED na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada da Sudene	09/11/2020	13/11/2020					0%	Cancelado		
1.11	Apreciação jurídica pela Procuradoria Federal junto à Sudene do processo	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	13/11/2020	27/11/2020					0%	Cancelado		
1.12	Emissão de Parecer/Nota técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	30/11/2020	05/12/2020					0%	Cancelado		
1.13	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED entre Sudene e IPEA e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	05/12/2020	10/12/2020					0%	Cancelado		
1.14	Celebração do TED entre Sudene e Ipea	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Ipea	11/12/2020	17/12/2020					0%	Cancelado		
1.15	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Site da Sudene	Sudene	17/12/2020	18/12/2020					0%	Cancelado		
1.16	Descentralização dos recursos	Transferências dos recursos para o IPEA para execução do objeto do TED	CGAF/Sudene	21/12/2020	21/12/2020					0%	Cancelado		
2.	Acompanhamento da execução da avaliação dos IFF	Acompanhamento da execução do objeto do TED celebrado entre Sudene e Ipea para avaliação dos IFF	COAE/Sudene	22/12/2020	17/12/2021					0%	Cancelado		
2.1	1ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para discussão da execução do objeto	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	22/12/2020	22/12/2020					0%	Cancelado		
2.2	Disponibilização dos dados sobre incentivos fiscais e de outras fontes que a Sudene dispõe que subsidiarão os projetos de avaliação	Disponibilização para o Ipea da base de dados sobre a concessão de incentivos e de outras fontes, como a de estatística de gastos tributários da Receita Federal, para subsidiar a execução dos projetos de avaliação referente ao Objeto do TED.	COAE/Sudene	22/12/2020	23/12/2020					0%	Cancelado		
2.3	2ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	22/01/2021	22/01/2021					0%	Cancelado		
2.4	Entrega do Relatório de conclusão do Projeto 0 - Evidências, metodologia e diagnóstico	O projeto 0 é composto por três produtos: P1 - Revisão da literatura; P2 - Proposta de Avaliação Continuada dos Incentivos Fiscais como instrumentos da PNDR; P3 - Diagnóstico da política e caracterização socioeconômica da região.	Ipea	03/03/2021	29/03/2021					0%	Cancelado	Dada a larga expertise do IPEA com avaliação de políticas públicas, em especial com políticas regionais e com o FNE, a CGEP elegeu o IPEA como o parceiro ideal para apoiar a Sudene no primeiro ano do ciclo de avaliações dos incentivos fiscais. Nesse sentido, desde julho de 2020, a COAE/CGEP manteve contato direto com técnicos da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do IPEA visando a formalização de TED para execução das avaliações dos incentivos.	
2.5	Parecer Técnico com análise do Relatório do Projeto 0	Elaboração de Parecer Técnico com apreciação dos produtos entregues relativos ao Projeto 0 à luz do disposto no Plano de Trabalho do TED celebrado e do Plano de Trabalho aprovado pelo MDR.	COAE/Sudene	29/03/2021	16/04/2021					0%	Cancelado		
2.6	3ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	19/04/2021	19/04/2021					0%	Cancelado		
2.7	Entrega dos Relatórios Parciais dos Projeto 1, 2 e 3	Entrega dos Relatórios Parciais referentes ao: Projeto 1 - Avaliação de eficiência da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene; Projeto 2 - Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene; Projeto 3 - Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene. Disponibilização dos materiais produzidos nesses projetos (códigos de programação, tabelas, gráficos, mapas e etc).	Ipea	31/05/2021	25/06/2021					0%	Cancelado		

É importante destacar que este Plano Operativo -

2.8	Parecer Técnico com análise dos Relatórios Parciais do Projeto 1, 2 e 3	Elaboração de Parecer Técnico relativo aos Relatórios Parciais, produtos e materiais produzidos relacionados ao: Projeto 1 - Avaliação de eficiência da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene; Projeto 2 - Avaliação de eficácia da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene; Projeto 3 - Avaliação de efetividade da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene.	COAE/Sudene	25/06/2021	13/07/2021					0%	Cancelado	Emplacamento de obras que está em fase de projeto, que trata das avaliações dos incentivos em resposta ao disposto na Portaria 3.145/2019, foi desenhado para ser executado em parceria com o IPEA por meio de TED. Entretanto, como as tratativas com o IPEA foram encerradas, em face da indisponibilidade do Instituto em iniciar novos trabalhos em 2020. A CGEP segue com a reformulação do planejamento para execução das avaliações, que inclui a elaboração de Edital para seleção de instituição para a execução das avaliações por meio de TED, contratação efetiva e acompanhamento da execução do objeto de interesse.		
2.9	4ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	14/07/2021	14/07/2021					0%	Cancelado			
2.10	Entrega dos Relatórios Finais dos Projetos 1, 2 e 3	Disponibilização do Relatório detalhado e conclusivo relativo a execução dos Projetos de Avaliação 1, 2 e 3, além da entrega dos materiais produzidos nesses projetos (códigos de programação, tabelas, gráficos, mapas e etc).	Ipea	27/08/2021	21/09/2021					0%	Cancelado			
2.11	Parecer Técnico com análise dos Relatórios Finais dos Projetos 1, 2 e 3	Elaboração de Parecer Técnico relativo aos Relatórios Parciais, produtos e materiais produzidos relacionados aos Projetos 1, 2 e 3.	COAE/Sudene	21/09/2021	08/10/2021					0%	Cancelado			
2.12	5ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	11/10/2021	11/10/2021					0%	Cancelado			
2.13	Entrega dos Relatório do Projeto 4 - Análise do retorno econômico e social da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Disponibilização do Relatório detalhado e conclusivo relativo a execução dos Projetos de Avaliação 4, além da entrega dos materiais produzidos nesses projetos (códigos de programação, tabelas, gráficos, mapas e etc).	Ipea	23/11/2021	20/12/2021					0%	Cancelado			
2.14	Parecer Técnico com análise do Relatório de conclusão do Projeto 4	Elaboração de Parecer Técnico relativo aos Relatórios Parciais, produtos e materiais produzidos relacionados ao Projetos 4.	COAE/Sudene	20/12/2021	09/01/2022					0%	Cancelado			
2.15	6ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea	COAE/Sudene e DIRUR/Ipea	12/01/2022	12/01/2022					0%	Cancelado			
2.16	Entrega do Produto 5 - Análise final dos resultados da política de incentivos fiscais conduzida pela Sudene	Disponibilização do Relatório final com a síntese das avaliações executadas. Apresentação interna para a Sudene dos resultados obtidos e das conclusões de cada estudo.	Ipea	03/02/2022	23/02/2022					0%	Cancelado			
2.17	Parecer Técnico com análise do Relatório de conclusão do Projeto 5	Elaboração de Parecer Técnico relativo aos Relatórios Parciais, produtos e materiais produzidos relacionados ao Projetos 5.	COAE/Sudene	23/02/2022	15/03/2022					0%	Cancelado			
2.18	7ª reunião de acompanhamento	Reunião técnica para acompanhamento da execução dos trabalhos de avaliação pelo Ipea		16/03/2022	16/03/2022					0%	Cancelado			
2.19	Publicação e divulgação dos resultados das avaliações	Publicação e divulgação interna e externa dos resultados dos projetos de avaliação dos incentivos fiscais.	CGEP/Sudene e Ipea	17/03/2022	06/04/2022					0%	Cancelado			
2.20	Elaborar Relatório de Cumprimento do Objeto		COAE/Sudene	07/04/2022	17/05/2022					0%	Cancelado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	16,7%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Observações:

Este PO foi cancelado. O Ipea declinou da Parceria, conforme email remetido em 30/11/2020, DOC SEI 0203737 Processo 59336.001165/2020-10, que informa a impossibilidade da Parceria para a avaliação tanto dos incentivos fiscais quanto do FNE. Além disto, ainda havia a necessidade de resposta do MDR ao Plano de Trabalho encaminhado pela Superintendência, o que não ocorreu até ao final do exercício de 2020.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 27 (EX PO 22)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	eficácia, da eficiência e da efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.		
Projeto:	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.		
Objetivo do projeto:	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	270	3 - Outras Despesas Correntes	90	A definir	A definir

Previsão de Conclusão:	08/12/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Tassia Germano e Gabriela Isabel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto		Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
		PREPARAÇÃO (Peso 20%)								8%		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento com o Ipea para celebração de TED para	realização de reuniões com a equipe do Ipea para alinhamentos quanto à celebração do TED e à	COAE	29/07/2020	30/08/2020	-	29/07/2020	30/10/2020	-	100%	Concluído	
2	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do Plano de Trabalho a ser enviado aos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	COAE	29/07/2020	30/10/2020	-	29/07/2020	28/10/2020	-	100%	Concluído	Mediante solicitação de prazo adicional para envio de Plano de Trabalho (Ofício nº 2162/2020-CFO/CGGFP/DPGF/SUDECO - SEI 0206643), a Sudene encaminhou o Plano de Trabalho ao MDR por meio do Ofício nº 2319/2020-GAB/SUDENE, de 28 de outubro de 2020.
3	Ratificação do Plano de Trabalho pelo MDR e ME	Ratificação ou sugestão de mudanças do Plano de Trabalho pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	MDR e ME	30/10/2020	30/11/2020	-	30/10/2020			0%	Atrasado	Segundo os prazos da Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, os ministérios deveriam enviar a análise do Plano de Trabalho em até 30 dias. Contudo, não houve resposta no tempo estimado.
4	Alterações no Plano de Trabalho das avaliações do FNE - 2020/21	Alterações no Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) para	COAE	30/11/2020	04/12/2020					0%	Atrasado	Em 22 de dezembro de 2020, por meio do Ofício Nº 2849/2020/GAB/SUDENE, a Sudene encaminhou diretamente ao ME o Plano de Trabalho enviado ao MDR em 28/10/2020 e informou que aguardava posicionamento quanto ao novo prazo de apreciação conjunta do MDR/ME.
5	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para celebração de TED com o Ipea	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias a celebração de TED com Ipea para execução da avaliação do FNE no primeiro ano do ciclo de avaliações. Aguardar o envio da manifestação formal da Dplan sobre a celebração do TED.	COAE	01/10/2020	02/10/2020		01/10/2020	01/10/2020		100%	Concluído	Por meio do OFÍCIO Nº 2084/2020/CGEP/DPLAN/SUDENE, de 01/10/2020, a CGEP solicitou autorização da DPLAN para prosseguimento das tratativas para celebração de TED com IPEA.
6	Elaborar minuta de Ofício formalizando o interesse da Sudene para celebração de TED com o Ipea	Elaborar minuta de Ofício endereçado ao Ipea formalizando o interesse da Sudene em celebrar TED para execução das atividades de avaliação do FNE na área de atuação da Sudene no ciclo 2020/2021. A Minuta de Ofício deverá ser apreciada pela DPLAN e Gabinete/Sudene.	COAE	02/10/2020	06/10/2020		02/10/2020	07/10/2020		100%	Concluído	A autorização foi proferida pelo Gabinete da Superintendência através do Despacho SEI (0186179) de 02/10/2020.
												A Minuta de Ofício CGEP SEI (0187389), foi encaminhada para apreciação da DPLAN em 07/10/2020.

7	Apreciação pela Dplan da Minuta de Ofício para formalização do interesse da Sudene em firmar TED com o Ipea	Apreciação da minuta de Ofício endereçado ao Ipea formalizando o interesse da Sudene em celebrar TED para execução das atividades de avaliação do FNE na área de atuação da Sudene no ciclo 2020/2021. Se aprovada, a Minuta de Ofício deverá seguir para o Gabinete/Sudene para apreciação e assinatura do Superintendente.	DPLAN/Sudene	06/10/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100%	Concluído	A Minuta de Ofício CGEP SEI (0187389), foi encaminhada pela DPLAN para apreciação, anuência e assinatura do Sr. Superintendente em 07/10/2020. No dia 08/10/2020, o Gabinete da Sudene encaminhou o OFÍCIO Nº 2160/2020/GAB/SUDENE ao IPEA a fim de formalizar a intenção de celebração de TED com o Instituto.	
8	Nota Técnica sobre o TED para avaliação do FNE	Elaborar nota técnica com motivação e justificativa para a celebração do instrumento.	COAE	01/10/2020	06/10/2020		02/10/2020	07/10/2020		100%	Concluído	A Nota Técnica 251 (0187387), de 07/10/2020, recomenda a celebração de parceria com o Ipea, por meio de TED, no sentido de estabelecer a cooperação entre as partes, visando à disponibilização de informações, conjugação de esforços, competências e conhecimentos para implementar a avaliação do FNE.	
9	Recebimento de minuta do Plano de Trabalho enviado pelo Ipea para celebração do TED	Recebimento da minuta do Plano de Trabalho formulado pelo IPEA para celebração de TED para avaliação do FNE. O Plano de Trabalho para o TED deve considerar a proposta de avaliação do instrumento aprovado pelo MDR.	SUDENE e Ipea	04/12/2020	15/12/2020		16/11/2020	17/11/2020		100%	Concluído	A Sudene não recebeu resposta formal do IPEA referente ao Ofício 2319 (SEI 0192932), tampouco encaminhou a Proposta de Plano de Trabalho do TED, conforme disciplina a Portaria Nº 269, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para TED. Apesar disso, uma vez que havia sinalização positiva do IPEA em firmar parceria com a Sudene e como as tratativas técnicas estavam em curso, em 17/11/2020 a Sudene elaborou o Plano de Trabalho para o TED (SEI 0198004), observando os dispositivos da citada portaria.	
10	Apreciação técnica do Plano de Trabalho referente ao TED Sudene e Ipea	Análise do do Plano Trabalho encaminhado pelo Ipea referente à celebração do TED entre Sudene e Ipea para avaliação do FNE. O Plano de Trabalho do TED deve considerar o Plano de Trabalho elaborado pela área técnica da Sudene e aprovado pelo MDR em resposta à Portaria Interministerial nº 7/2020.	COAE	15/12/2020	18/12/2020					0%	Cancelado		
11	Elaboração da Minuta de TED entre Sudene e Ipea	Elaborar minuta de TED entre Sudene e Ipea para execução da avaliação dos resultados do FNE na área de atuação da Sudene no ciclo de 2020/21	COCIC/Sudene e Ipea	18/12/2020	04/01/2021					0%	Cancelado		
12	Apreciação e aprovação do Plano de Trabalho do TED na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada da Sudene	04/01/2021	08/01/2021					0%	Cancelado		
13	Apreciação jurídica do processo pela Procuradoria Federal junto à Sudene	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	08/01/2021	27/01/2021					0%	Cancelado		
14	Emissão de Parecer técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	27/01/2021	01/02/2021					0%	Cancelado		
15	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED entre Sudene e Ipea e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	01/02/2021	05/02/2021					0%	Cancelado		
16	Celebração do TED entre Sudene e Ipea	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Ipea	05/02/2021	11/02/2021					0%	Cancelado		
17	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Site da Sudene	Sudene	11/02/2021	15/02/2021					0%	Cancelado		
		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	Cancelado		
12	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única do TED	CGAF/COCF/Sudene	15/02/2021	15/02/2021	A definir				0%	Cancelado		
13	1ª reunião de acompanhamento	1ª reunião de acompanhamento	COAE e Ipea	01/04/2021	01/04/2021	-				0%	Cancelado		
14	Relatório de conclusão do Projeto 0	Entrega do relatório de conclusão do Projeto 0, composto pelos P1, Revisão da literatura; P2, Metodologia - estratégia empírica das avaliações e análise dos dados; P3, Diagnóstico da política.	Ipea	17/05/2021	17/05/2021	-				0%	Cancelado	Contudo, em 30/11/2020, por meio do e-mail (SEI 0203737) a Sudene tomou ciência que o IPEA não realizaria novas parcerias técnicas por meio de TED durante tempo indeterminado. Ainda segundo exposto no e-mail, o motivo alegado é que o IPEA chegou ao limite da sua capacidade nesta modalidade de parceria, devendo haver espaço para atender outros tipos de demandas do governo federal. Desta forma, foram encerradas as tratativas com o IPEA.	
15	Parecer Técnico Projeto 0	Emissão de Parecer Técnico sobre o Relatório de conclusão do Projeto 0	COAE	17/05/2021	16/06/2021					0%	Cancelado		
16	2ª reunião de acompanhamento	2ª reunião de acompanhamento	COAE e Ipea	30/06/2021	30/06/2021	-				0%	Cancelado		
17	Relatórios Parciais dos Projetos 1, 2, 3, 5 e 6	Entrega dos relatórios parciais dos Projetos 1, 2, 3, 5 e 6: P4, Avaliação de Eficácia: Relatório Parcial; P6, Avaliação de Eficiência: Relatório Parcial; P8, Avaliação de Efetividade: Relatório Parcial; P11, Avaliação do Programa FNE - Industrial; Relatório Parcial; P13, Avaliação do Programa FNE Proinfra: Relatório Parcial.	Ipea	30/06/2021	30/06/2021	-				0%	Cancelado	Buscando seguir com o planejamento e contratação das avaliações, em 23/12/2020 a Sudene enviou ao Ministério da Economia o OFÍCIO Nº 2849/2020/GAB/SUDENE (SEI 0211685) com o Plano de Trabalho que foi encaminhado ao MDR. Infelizmente, ainda sobre o	

18	Parecer Técnico Relatórios Parciais	Emissão de Parecer Técnico sobre os Relatórios Parciais	COAE	30/06/2021	30/07/2021					0%	Cancelado	Encerramento do MDR, mudança ainda sobre o novo prazo de apreciação conjunta do MDR/ME, conforme Inciso II, Art. 3º, da Portaria Interministerial nº 7/20, a fim de que possamos encaminhar a proposta com ajustes nas datas previstas no Plano de Trabalho. A CGEP segue com a reformulação do planejamento para execução dos projetos, que inclui a elaboração de Edital para seleção de instituição para a execução das avaliações por meio de TED, contratação efetiva e acompanhamento da execução do objeto de interesse..		
19	3ª reunião de acompanhamento	3ª reunião de acompanhamento	COAE e Ipea	14/08/2021	14/08/2021					0%	Cancelado			
20	Relatórios Finais dos Projetos 1, 2, 3, 5 e 6	Entrega dos relatórios finais dos Projetos 1, 2, 3, 5 e 6; P4. Avaliação de Eficácia: Relatório Parcial; P6. Avaliação de Eficiência: Relatório Parcial; P8. Avaliação de Efetividade: Relatório Parcial; P10. Análise do retorno econômico e social do FNE: Relatório Final; P12. Avaliação do Programa FNE - Industrial: Relatório Final; P14. Avaliação do Programa FNE Proinfra: Relatório Final	Ipea	16/08/2021	16/08/2021	-				0%	Cancelado			
21	Parecer Técnico Relatórios Finais	Emissão de Parecer Técnico sobre os Relatórios Finais	COAE	16/08/2021	15/09/2021					0%	Cancelado			
22	4ª reunião de acompanhamento	4ª reunião de acompanhamento	COAE e Ipea	30/09/2021	30/09/2021					0%	Cancelado			
23	Relatório de Conclusão do Projeto 4	Entrega do relatório de conclusão do Projeto 4: P10. Retorno Econômico e Social do FNE.	Ipea	16/11/2021	16/11/2021					0%	Cancelado			
24	Parecer Técnico Relatório de Conclusão do Projeto 4	Emissão de Parecer Técnico sobre o Relatório de conclusão do Projeto 4	COAE	16/11/2021	16/12/2021					0%	Cancelado			
25	5ª reunião de acompanhamento	5ª reunião de acompanhamento	COAE e Ipea	14/01/2022	14/01/2022					0%	Cancelado			
26	Relatório de Conclusão do Produto 15	Entrega do relatório de conclusão do P15. Análise final dos resultados da política de financiamentos do FNE na área de atuação da Sudene	Ipea	11/02/2022	11/02/2022					0%	Cancelado			
27	Entrega do Relatório de Cumprimento do Objeto	Entrega do Relatório de Cumprimento do Objeto do TED	Ipea	11/02/2022	11/06/2022	-				0%	Cancelado			
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	Cancelado			
28	Análise dos produtos, do Relatório de Cumprimento do Objeto e emissão do	Análise dos produtos, do Relatório de Cumprimento do Objeto e emissão do Laudo/Parecer Técnico Final	COAE	11/06/2022	08/12/2022	-				0%	Cancelado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	8,2%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Este PO foi cancelado. O Ipea declinou da Parceria, conforme email remetido em 30/11/2020, DOC SEI 0203737 Processo 59336.001165/2020-10, que informa a impossibilidade da Parceria para a avaliação tanto dos incentivos fiscais quanto do FNE. Além disto, ainda havia a necessidade de resposta do MDR ao Plano de Trabalho encaminhado pela Superintendência, o que não ocorreu até ao final do exercício de 2020.													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 28
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.		
Projeto:	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.		
Objetivo do projeto:	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	270	3 - Outras Despesas Correntes	90	A definir	A definir

Previsão de Conclusão:	07/07/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Tassia Germano e Gabriela Isabel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
1.	Planejamento - Elaboração de Plano de Trabalho FNE - 2020/21 (Peso 30%)			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1.1	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) em resposta à Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020. O Plano de Trabalho deverá ser enviado aos Ministérios do	COAE/CGEP	29/07/2020	30/10/2020	-	29/07/2020	28/10/2020	-	100%	Concluído	A Sudene encaminhou o Plano de Trabalho ao MDR por meio do Ofício nº 2319/2020-GAB/SUDENE, de 28 de outubro de 2020.	
1.2	Ratificação do Plano de Trabalho pelo MDR e ME	Ratificação ou sugestão de mudanças do Plano de Trabalho pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	MDR e ME	30/10/2020	30/11/2020	-	30/10/2020			0%	Atrasado	Segundo os prazos da Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, os ministérios deveriam enviar a análise do Plano de Trabalho em até 30 dias. Contudo, não houve resposta no tempo estimado.	Em 22 de dezembro de 2020, por meio do Ofício Nº 2849/2020/GAB/SUDENE, a Sudene encaminhou diretamente ao ME o Plano de Trabalho enviado ao MDR em 28/10/2020 e informou que aguardava posicionamento quanto ao novo prazo de apreciação conjunta do MDR/ME.
1.3	Alterações no Plano de Trabalho das avaliações do FNE - 2020/21	Alterações no Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) para inserção das	COAE/CGEP	30/11/2020	04/12/2020					0%	Atrasado		
2.	Planejamento - Edital e seleção de parceiro(s) para execução das avaliações do FNE (Peso 70%)									0%			
2.1	Elaboração de Termo de Abertura do Projeto - TAP e apresentação de proposta	Elaborar e apresentar TAP com a descrição dos objetivos, estratégias e etapas a serem seguidas para a contratação das avaliações definidas. É necessário aprovação do escopo pela Coordenação-Geral.	COAE/CGEP	17/02/2021	19/02/2021					0%	A Iniciar	Por meio do OFÍCIO Nº 2084/2020/CGEP/DPLAN/SUDENE, de 01/10/2020, a CGEP solicitou autorização da DPLAN para prosseguimento das tratativas para celebração de TED com IPEA.	
2.2	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para elaboração e lançamento de edital de chamamento público	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias elaboração e publicação de edital de chamamento público para seleção de parceiro(s) executor(es) para as avaliações do FNE do 1º ano do ciclo de avaliações (Plano de Trabalho 2020/2021).	COAE/CGEP	22/02/2021	23/02/2021					0%	A Iniciar	A autorização foi proferida pelo Gabinete da Superintendência através do Despacho SEI (0186179), de 02/10/2020.	
2.3	Apreciação da solicitação para abertura de Edital de Chamamento Público pela Diretoria Colegiada	Seguida a aprovação da DPLAN, o assunto deverá ser encaminhado ao Gabinete para ser apreciado e aprovado em reunião de Diretoria Colegiada, se for o caso.	DPLAN e Gabinete	23/02/2021	03/03/2021					0%	A Iniciar		

2.4	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital de Chamamento Público	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital para chamamento público que visa selecionar parceiro(s) para a execução das avaliações do FNE desenhadas no Plano de Trabalho 2020/21.	COAE/CGEP	22/02/2021	26/02/2021					0%	A Iniciar		
2.5	Reunião com a ASCOM para tratar sobre a divulgação do Edital	Apresentar a ASCOM os objetivos gerais do projeto e informar sobre a necessidade de divulgação da seleção nas redes das Sudene quando o edital estiver concluído.	COAE/CGEP e ASCOM	01/03/2021	01/03/2021					0%	A Iniciar		
2.6	Elaboração de Edital de chamamento público	Elaborar edital de chamamento público a fim de selecionar entidade(s)/órgão(s) da União para executar as avaliações	COAE/CGEP	01/03/2021	12/03/2021					0%	A Iniciar		
2.7	Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	08/03/2021	12/03/2021					0%	A Iniciar		
2.8	Apreciação do Edital pela Coordenação-Geral e DPLAN	Encaminhar o Edital para apreciação e deliberação da Coordenação Geral da CGEP e para a Dplan.	CGEP e DPLAN	15/03/2021	17/03/2021					0%	A Iniciar		
2.9	Ajustes no Edital	Ajustes no Edital após apreciação da CGEP e DPLAN e envio para publicação.	COAE/CGEP	18/03/2021	22/03/2021					0%	A Iniciar		
2.10	Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Solicitar apoio da Dplan para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos	CGEP	18/03/2021	25/03/2021					0%	A Iniciar		
2.11	Solicitação para a publicação do Edital	Elaboração de texto sobre o projeto e lançamento do edital para subsidiar a matéria de divulgação da ASCOM. Deve-se	COAE/CGEP	22/03/2021	23/03/2021					0%	A Iniciar		
2.12	Publicação do Edital	Publicação do Edital no site da Sudene e no DOU	GABINETE/SUDENE e ASCOM	24/03/2021	26/03/2021					0%	A Iniciar		
2.13	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	COAE/CGEP	29/03/2021	30/04/2021					0%	A Iniciar		
2.14	Divulgação do Edital de Chamamento Público	Divulgação do Edital no site e nas redes sociais da Sudene. Mobilização de possíveis parceiros por e-mail também.	ASCOM e COAE/CGEP	26/03/2021	09/04/2021					0%	A Iniciar		
2.15	Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	COAE/CGEP	09/04/2021	09/04/2021					0%	A Iniciar		
2.16	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	COAE/CGEP	09/04/2021	13/04/2021					0%	A Iniciar		
2.17	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	COAE/CGEP	13/04/2021	16/04/2021					0%	A Iniciar		
2.18	Análise técnica das propostas	Análise técnica das propostas e emissão de parecer técnico com a justificativa para celebração de TED para a(s)	COAE/CGEP	03/05/2021	28/05/2021					0%	A Iniciar	É necessário considerar um prazo maior para essa análise técnica, pois essa etapa também	
2.19	Análise e aprovação das propostas selecionadas para celebração de TED - CGEP e DPLAN	Solicitação de autorização da DPLAN para celebração de TED das propostas selecionadas.	CGEP e DPLAN	31/05/2021	01/06/2021					0%	A Iniciar		
2.20	Análise e aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	02/06/2021	09/06/2021					0%	A Iniciar		
2.21	Apreciação jurídica do processo pela Procuradoria Federal junto à Sudene	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar		
2.22	Emissão de Parecer técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	23/06/2021	25/06/2021					0%	A Iniciar		
2.23	Análise e trâmites para celebração de TED relacionados ao setor de contratos e convênios	Análise e trâmites para contratação relacionados ao setor de convênios	COCIC/Sudene	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar		
2.24	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	23/06/2021	28/06/2021					0%	A Iniciar		
2.25	Celebração do instrumento para contratação das avaliações	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Parceiro executor	28/06/2021	02/07/2021					0%	A Iniciar		
2.26	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Diário Oficial e no site da Sudene	Gabinete e ASCOM/Sudene	05/07/2021	07/07/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	10,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 29
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.	Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumentos de financiamento (FNE, FDNE).		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Segurança hídrica no semiárido		
Projeto:	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS		
Objetivo do projeto:	Avaliar o Programa Cisternas Efeitos do Programa Cisternas 1ª Água por meio de indicadores de mercado de trabalho e de saúde dos beneficiados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	-	90	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	23/04/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 384.000,00
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício	R\$ 384.000,00
Valor liberado/repassado no Exercício	R\$ 384.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 384.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Marina Barbosa
	UFPE	Breno Ramos Sampaio

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	11/11/2020	04/12/2020		11/11/2020	04/12/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	07/12/2020	22/12/2020		07/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	07/12/2020	07/12/2020		07/12/2020	07/12/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/12/2020	28/12/2020		24/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								3%	Em Andamento		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 384.000,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 384.000,00	100,0%	Concluído		

2.2	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/06/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	30/06/2021	30/07/2021					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	31/07/2021	15/08/2021					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/08/2021	30/08/2021					0,0%	A Iniciar		
2.3	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/10/2021	31/10/2021					0,0%	A Iniciar		
2.5	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/11/2021	16/11/2021					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/11/2021	02/12/2021					0,0%	A Iniciar		
	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação	UFPE	01/01/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	15/02/2022					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/02/2022	03/03/2022					0,0%	A Iniciar		
2.7	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação	UFPE	01/01/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.10	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.11	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	16/02/2022					0,0%	A Iniciar		
2.12	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/02/2022	04/03/2022					0,0%	A Iniciar		
2.13	Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	31/12/2021	31/12/2021					0,0%	A Iniciar		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	01/01/2022	02/03/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	03/03/2022	02/05/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	03/05/2022	02/07/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 384.000,00		Valor realizado:		R\$ 384.000,00	23%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Universidade Federal de Pernambuco												
Observações:												
Processo SEI 59336.001886/2020-11												

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 30
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MDR):	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de avaliar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional				
Projeto:	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO				
Objetivo do projeto:	Avaliar:O impacto do Mecanismo de Repartição dos recursos da Cota-Parte Municipal do ICMS nos resultados educacionais do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais; Os efeitos da Educação da Infantil sobre a alfabetização e, ainda, analisar a relação entre a Oferta e as Metas do PNE, a Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil; e, Os efeitos da violência a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) sobre a perda de capital humano e econômica e, ainda, avaliar os efeitos das políticas (planos e programas) adotadas pelos estados da região nordeste do Brasil.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	-	90	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	21/04/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 480.600,00
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício	R\$ 480.600,00
Valor liberado/repassado no Exercício	R\$ 480.600,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 480.600,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE: Tássia Germano	
	UFC	Guilherme Diniz Irffi

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/12/2020	16/12/2020		04/12/2020	16/12/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	17/12/2020	22/12/2020		17/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	16/12/2020	23/12/2020		16/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	23/12/2020	28/12/2020		23/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								2%	Em Andamento		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 480.600,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 480.600,00	100,0%	Concluído		

2.6	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	01/01/2021	30/04/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/05/2021	31/05/2021					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/06/2021	16/06/2021					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/06/2021	01/07/2021					0,0%	A Iniciar		
2.2	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobre o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.	UFC	01/01/2021	30/05/2021					0,0%	A Iniciar		
2.10	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do Nordeste	UFC	01/01/2021	31/05/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/06/2021	01/07/2021					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	02/07/2021	17/07/2021					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	18/07/2021	01/08/2021					0,0%	A Iniciar		
2.3	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além	UFC	01/01/2021	30/06/2021					0,0%	A Iniciar		
2.7	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos,	UFC	01/01/2021	30/06/2021					0,0%	A Iniciar		
2.11	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto: Relatório contendo as estimativas de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos	UFC	01/01/2021	30/06/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/07/2021	15/08/2021					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	16/08/2021	31/08/2021					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/09/2021	15/09/2021					0,0%	A Iniciar		
2.5	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.13	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.12	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas públicas executadas pelos estados da região Nordeste (Ceará Pacífico; Pacto pela	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	21/12/2021	04/02/2022					0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	05/02/2022	20/02/2022					0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	21/02/2022	07/03/2022					0,0%	A Iniciar		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	21/12/2021	19/02/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	20/02/2022	21/04/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	22/04/2022	21/06/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 480.600,00		Valor realizado:		R\$ 480.600,00	22%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Universidade Federal do Ceará												
Observações:												
Processo SEI 59336.002083/2020-84												

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial			Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.				
Projeto:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Objetivo do projeto:	Planejar e promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.967.929,00	R\$ 1.967.929,00

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 708.040,89
R\$ 1.967.929,00			R\$ 1.967.929,00	A realizar no exercício	R\$ 1.195.853,50
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 708.040,89

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Relatório de planejamento da estrutura de execução, articulação e monitoramento do PRDNE	Este relatório produto 1 planejará em detalhe as atividades consoantes entre as três trilhas e aprofundará os conteúdos previstos para cada produto, planejando a articulação de atores e o cronograma sincronizados de atividades; especificando os vínculos dos processos de articulação do PRDNE à trilha de inteligência.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	29/7/2019	27/9/2019	R\$ 205.154,25	29/7/2019	18/11/2019	R\$ 205.154,25	100%	Concluído		
2	Relatório estratégico de internalização do PRDNE nos Grupo de Trabalho Sudene	O produto 2 tem como alvo a internalização na Sudene da estruturação do plano à luz dos seis eixos estratégicos; constituindo uma experiência que se materializa com a formação e consolidação de grupos de trabalho (GT PRDNE Sudene) e discussão em detalhes dos eixos do PRDNE e os programas e projetos acordados no plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	2/9/2019	15/10/2019	R\$ 359.231,25	2/9/2019	18/11/2019	R\$ 347.781,25	100%	Concluído		
3	Relatório da estratégia de articulação e comunicação do PRDNE na região	O produto 3 levará em consideração os seis eixos estratégicos e apresentará uma propostas para a comunicação e o desenvolvimento de ações, em articulação com os estados e atores no escopo de atuação da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	23/9/2019	31/10/2019	R\$ 207.690,00	1/11/2019	10/12/2019	R\$ 155.105,39	100%	Concluído		

4	Detalhamento dos Projetos Prioritários	O produto 4 organiza em Fichas Técnicas os projetos prioritários do PRDNE, conforme modelo aprovado por Sudene e CGEE. Reuniões técnicas entre CGEE e os GTs da Sudene serão realizadas para aprovar as Fichas Técnicas preenchidas. Tais Fichas servirão como instrumentos de negociação além de insumos para a consolidação da metodologia de monitoramento entregue no processo de gestão da Trilha de Inteligência do PRDNE, compromisso esse firmado entre o CGEE e a Sudene. Tem como objetivo central organizar 60 (sessenta) Fichas de Projetos priorizados pelos GTs da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	28/2/2021	R\$ 385.500,25	1/8/2020			30%	Atrasado	Este produto deveria ter sido entregue em 31/12/2020, porém a consultoria contratada (CGEE) apresentou atraso em relação ao cronograma de entregas.	Em reunião presencial envolvendo a alta gestão da Sudene e a presidência do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ficou definido que a contratada apresentará um plano de trabalho detalhado para cada produto não entregue ou atrasado, além de versões parciais do produto para que a equipe técnica da Sudene valide sua construção.
5	Relatório de Reposicionamento Estratégico do PRDNE Revisado	O produto 5 é um relatório com revisão do PRDNE, analisando a pertinência das ações, a consistência interna e a viabilidade técnica, levando em conta eventuais mudanças no cenário do contexto externo. Será avaliado se a estratégia do Plano está adequada para reposicionar as prioridades, considerando as medidas formuladas pelo Governo Federal para a Região Nordeste e os esforços conjuntos das instituições, empresas e da sociedade civil que podem contribuir para alcançar resultados para a Região. O produto tem como objetivo apresentar a proposta de revisão do PRDNE, por eixo estratégico à luz da nova realidade.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 197.909,25	1/7/2020			80%	Atrasado	O CGEE encaminhou uma versão do produto em 30/09/2020 porém o conteúdo não foi aprovado pela equipe técnica (SEI 189509). Uma nova versão foi apresentada em 23/11/2020 mas o conteúdo foi insuficiente para aprovação técnica (SEI 203981).	Em reunião presencial envolvendo a alta gestão da Sudene e a presidência do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ficou definido que a contratada apresentará um plano de trabalho detalhado para cada produto não entregue ou atrasado, além de versões parciais do produto para que a equipe técnica da Sudene valide sua construção.
6	Relatório contendo insumos para revisão do PRDNE	O produto 6 será um relatório com recomendações para revisão anual do PRDNE com base em Consulta Estruturada utilizando a ferramenta Insight Survey do CGEE junto aos principais stakeholders da SUDENE em preparação a nova pactuação do PRDNE. As equipes técnicas, os consultores e equipes internas dos grupos técnicos da SUDENE dialogarão com representantes de governos dos estados da região de abrangência do PRDNE e colherão subsídios adicionais para validação das propostas. Constituem objetivo do produto a coletar insumos para revisão do PRDNE validando propostas e descrever recomendações para revisão do PRDNE com base nos insumos e inferências compiladas através de processo de Consulta Estruturada (instituições, sociedade civil, associações, IES, bancos, etc.) constituem o objetivo central deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	30/1/2020	R\$ 352.590,00	1/8/2020			30%	Atrasado	Um dos insumos do produto é a consulta estruturada, que foi realizada entre os dias 04/12/2020 a 15/12/2020. Porém, o objetivo da consulta não foi alcançado uma vez que houve pouca participação de atores estratégicos.	Em reunião presencial envolvendo a alta gestão da Sudene e a presidência do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ficou definido que a contratada apresentará um plano de trabalho detalhado para cada produto não entregue ou atrasado, além de versões parciais do produto para que a equipe técnica da Sudene valide sua construção.

7	Nova Versão Revisada do PRDNE	O produto 7 será um relatório de revisão completa do PRDNE. Apresentará uma análise por eixo estratégico do plano, assim como uma revisão no desenvolvimento das conquistas do PRDNE e seu alcance face ao novo cenário e seus impactos, contemplando a Revisão dos indicadores e das metas de resultado dos programas do Plano e avaliação da aderência do PRDNE com a ENDES e a PNDR, em especial, ao foco em reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da inovação e à estratégia territorial. É prevista a apresentação e discussão da nova versão nas Câmaras Temáticas, a não apresentação, no entanto, não implicará em prejuízo ou trará impactos na conclusão e entrega deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	30/6/2021	R\$	259.854,00			0%	A Iniciar	A iniciar			
				Valor Previsto:		R\$ 1.967.929,00		Valor realizado:		R\$ 708.040,89		63%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	ação não orçamentária		Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	ação não orçamentária		Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:	Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira	
Problema (causa):	Necessidade da otimização da prospecção de investimentos com impacto potencial sobre a economia e a qualidade de vida da população nordestina.				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.				
Objetivo do projeto:	Planejamento preliminar e implementação de ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	ação não orçamentária				

Previsão de Conclusão:	12/12/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	BNDES		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	1/10/2019	30/10/2019		30/10/2019	27/11/2019		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2019		27/11/2019	28/11/2019		100%	Concluído	Parecer Técnico nº 329/2019	
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/1/2020		17/1/2020	13/7/2020		100%	Concluído	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	30/10/2019	30/1/2020		19/12/2019	19/12/2019		100%	Concluído		

5	Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/2/2020	12/12/2022		6/1/2020			60%	Em Andamento	Trata-se de uma atividade contínua. No último trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários (o que está previsto para o Produto 10 da Carta de Acordo com o CGEE)	
6	Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/6/2022	30/7/2022					0%	A Iniciar		
7	Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/12/2022	12/12/2022					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 0,00		Valor realizado:		R\$ 0,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto

Parcelos Institucionais:
BNDES

Observações:

(1) Parecer Técnico nº 329/2019 (SEI nº 0123625)

(2) Para o ano Ciclo de Avaliação 2020, foram consideradas as atividades previstas no cronograma com prazo até 30/09/2020, tendo em vista a vigência de 2 anos do ACT, e haverá etapas a serem realizadas em 2021 e 2022, constarão como metas institucionais para os próximos ciclos de avaliação.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.581.148,75	R\$ 1.581.148,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 889.987,96
R\$ 1.581.148,75	R\$ 0,00		R\$ 1.581.148,75	A realizar no exercício	R\$ 500.666,50
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 889.987,96

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Relatório de análise do mapeamento de programas, projetos e ações	O produto 8 tem a finalidade de realizar a análise da convergência entre os Programas, Projetos e Ações do PRDNE com o PPA Federal, com os PPAs Estaduais e o PPI, preparando a SUDENE para a negociação com os órgãos federais e captação de recursos para a Região.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 235.111,50	1/7/2020	20/11/2020	R\$ 209.442,73	100%	Concluído		
2	Relatório Documento de concertação junto ao corpo parlamentar Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários	O produto 9 consuma a realização do Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários, e se materializa como um documento de concertação do PRDNE junto ao corpo parlamentar. Este produto deve ser entendido com documento guia para a concertação do PRDNE na Câmara Federal e no Senado, durante o exercício de negociação e aprovação do PPA federal.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	30/9/2019	13/12/2019	R\$ 374.928,75	30/9/2019	10/12/2019	R\$ 224.031,78	100%	Concluído		

3	Composição de Sumários Executivos de Projetos Prioritários	Sumários Executivos 20 (vinte) projetos estratégicos para o Nordeste, apontados pela SUDENE e Ministério do Desenvolvimento Regional, selecionados dentre os 60 (sessenta) projetos priorizados pela Sudene. Dessa forma, será possível ter uma visão panorâmica acerca do projeto e permitam inferir indicativos de préviabilidade de sua operacionalização, oferecendo uma visão preliminar e geral do projeto para uma melhor percepção do gestor, subsídios para a tomada de decisão, acerca de sua potencial viabilidade de execução.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	31/5/2021	R\$	291.527,50	1/12/2020		0%	A Iniciar				
4	Diretrizes estratégicas para Governança do PRDNE	O produto 11 é um documento orientador a SUDENE com vistas a fortalecer o processo de governança regional. Seu objetivo é legitimar o papel da Sudene e suas atribuições na coordenação do PRDNE em nível regional através da estratégia de articulação do PRDNE. O documento consiste num mapeamento dos principais stakeholders, caracterização e nível de integração ao PRDNE permitindo visualizar e compreender as múltiplas articulações dos atores com projetos do Plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$	227.010,00	1/7/2020	3/12/2020	R\$ 222.976,16	100%	Concluído			
5	Proposta de modelo de financiamento do PRDNE	O produto 12 apresentará um mapeamento de modelos de financiamento convergentes com os programas e projetos do PRDNE. O documento é um relatório que sistematizará um conjunto de proposições com o intuito de avançar no entendimento e no aperfeiçoamento dos modelos de financiamento existentes e em operação, permitindo avanços no entendimento e no aperfeiçoamento institucional habilitador de novos mecanismos de financiamento necessários ao PRDNE, identificando modelos convergentes à projetos estratégicos.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	15/12/2020	R\$	243.432,00	1/8/2020	14/12/2020	R\$ 233.537,29	100%	Concluído			
6	Relatório de Recomendações à melhoria da competitividade e a novos direcionamentos estratégicos ao PRDNE	O relatório produto 13 é um documento que apresentará recomendações para melhoria da competitividade da Região a partir de um diagnóstico do nível de competitividade da economia nordestina, apontando caminhos estratégicos para o aumento da competitividade do Nordeste, convergentes com o desenvolvimento, inovação e demais eixos estratégicos do PRDNE. Tem como objetivo incorporar as recomendações para melhoria da competitividade e fortalecer a implementação do PRDNE.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/3/2021	31/7/2021	R\$	209.139,00	1/3/2021		0%	A Iniciar	A iniciar			
				Valor Previsto:		R\$ 1.581.148,75		Valor realizado:		R\$ 889.987,96		67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:														
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.														
Observações:														
(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)														
(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.														
(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.														
(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenas ao processo. Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.														
(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.														

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão Física: 19/09/2016 **Data prevista para implantação do empreendimento.**

Previsão de Conclusão ADM: Não informado

Data Atualização: 31/12/2020

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	-	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		3.876.491.700,00		3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).									
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.									
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.									
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.									
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.									
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.									
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.									
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.									
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.									
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.									
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto									
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto									
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).									
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.									
Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).									
Obs17: A TLSA efetuou a recomposição do saldo da conta reserva em 23/10/19, no valor de R\$ 112.647.260,64.									
Obs18: Foi concedida prorrogação, pelo prazo de 30 dias, do vencimento da amortização programada para 19/09/2020, em caráter cautelar, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da Sudene nº 569/2020 (SEI nº 0182999).									

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2008
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)			
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,0%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	15/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").												
Obs:3 Aguardando a emissão da versão final do CCE.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.700.000,00	Valor realizado:		59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	37 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	38 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marlufo/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		

Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			-	-	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.												
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	39 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	299.869.740,06	701.131.477,00

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	0,00	-	-	-	100,00%	Concluído	Ver Observação 3.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	299.869.740,06	19/04/13	-	299.869.740,06	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Em Andamento	O BB apresentou o QUF final do projeto e o CCE. Após análise, foram solicitadas explicações e novas informações.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		299.869.740,06	Valor realizado:		299.869.740,06	81,82%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.	
Obs3: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 303.000.000,00 para R\$ 299.869.740,06, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2013NE000005 (SEI nº 0066573), no valor de R\$ 3.192.865,13 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE).	
Obs4: A empresa solicitou reperfilamento da dívida. A DFIN acatou o pleito.	
Obs5:f Resta pendente a emissão do CCE por parte do Agente Operador, tendo a SUDENE efetuado a cobrança necessária quanto à emissão do Certificado.	
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	40 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	19.539.983,88	63.051.003,61

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2016
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto

Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	-4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 5.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	19.539.983,88	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Concluído		

Competência da SUDENE /Banco										80%	Concluído	
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		19.539.983,88	Valor realizado:		19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Obs5: A SUDENE enviou Ofício ao BB em 20/04/2018, solicitando informações sobre as ações para a regularização do Projeto (descumprimento do art. 36 do Regulamento do FDNE)

Obs6: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 23.855.042,00 para R\$ 19.539.983,88, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2012NE000011 (SEI nº 0066565), no valor de R\$ 4.401.360,30 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE);

Obs7: Resta pendente a emissão do CCE por parte do Agente Operador, tendo a SUDENE efetuado a cobrança necessária quanto à emissão do Certificado.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Deten Química S.A.				
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão Física:	28/12/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 31.256.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 31.256.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

11	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		31.256.000,00	Valor realizado:		31.256.000,00	75,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi apresentado pelo BB uma nova versão do QUF do empreendimento. Após a apreciação e deliberação do assunto por parte da SUDENE, o pleito foi aprovado, restando pendente a emissão do CCE por parte do Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012	
Programa:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano					Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva							
Problema (causa):								
Projeto:	Braskem S.A.							
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	43 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):				
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)			
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão Física:	28/06/2020
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/12/2020

	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	R\$ 92.071.672,79
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60		100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94		100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19		100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00		100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60		100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	30/09/20	30/10/20	42.628.756,59	18/12/20	-			0,00%	Atrasado	A CEF apresentou à Sudene a proposta de liberação de recursos. O pleito encontra-se em análise.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/12/20	31/12/20	49.442.916,20	-	-	-		0,00%	Em Andamento		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/20	415.582.562,12	21/02/14	-	323.510.889,33	75,00%		Atrasado		

Competência da SUDENE /Banco									88%	Atrasado				
15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.			
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar				
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar				
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	415.582.562,12		Valor realizado:	R\$	323.510.889,33		69%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.												
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.												
Obs5:												
Obs5:												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa do PPA:	2217 -Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto: Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	-	0,00	0,00%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:	R\$ 39.800.940,00	71%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	45 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2016	
Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor		
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):						
Projeto:	Brametal S.A					
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/12/2020

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 4.095.556,81
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:		R\$ 4.095.556,81	50%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Placas do Brasil S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão Física:	Não informado	17/09/2019	60	16/11/2019
Previsão de Conclusão ADM:	16/11/2019			
Data Atualização:	31/12/2020			
Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva			

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 152.962.408,33
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 152.962.408,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	09/07/18	39.500.000,00	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	29.229.782,94	18/02/19		29.229.782,94	100,00%	Concluído	O BB enviou o pedido de liberação em 27/11/2018.	
9		SUDENE/BB			9.880.922,39	-	-		100,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	30/07/18	162.843.330,72	-	-	152.962.408,33	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE/Banco									100%	Concluído		
12	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Concluído		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	16/11/19	16/11/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	O BB apresentou o QUF final do projeto e o CCE. Após análise, foram solicitadas explicações e novas informações.	
Encerramento (Banco)			Não informado	16/11/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 162.843.330,72	Valor realizado:		R\$ 152.962.408,33	50%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Foi efetuada a devolução de recursos ao FDNE, referente à quinta parcela, em razão do inadimplemento da primeira parcela da operação, vencida em 01/08/2019.	
Obs3: O Banco do Brasil - BB comunicou em 22/11/2019 (SEI nº 0124210) o cancelamento do desembolso previsto da quinta e última parcela, no valor de R\$ 9.880.922,39, por solicitação da Empresa beneficiária, e a regularização da operação, mediante acordo entre as partes. Restam pendentes a apresentação do QUF Final do Projeto e a emissão do CCE por parte do Agente Operador, com base na Resolução da Diretoria Colegiada da SUDENE nº 326/2018, de 17.12.2018.	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2020. Relatórios dos períodos jan-mar/2020; jan-jun/2020; jan-set/2020 e jan-dez/2020.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2020	25/04/2020	-	01/04/2020	-	-	100%	Cancelado	A base de dados enviada pelo BNB apresentou inconsistências.	
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2020	06/05/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado	Em todas as remessas foram identificados erros que impediram a elaboração de um relatório livre de falhas. Uma minuta chegou a ser elaborada (SEI nº 0162973), entretanto, posteriormente verificamos a existência de inconsistência com outros dados encaminhado pelo banco. Desta forma, solicitamos o envio de nova remessa de dados, mas findado o prazo proposto pelo próprio banco, a base de dados não foi entregue, tendo o BNB enviado nova remessa referente ao semestre inteiro.	A Resolução nº 558/2020 da Diretoria Colegiada da Sudene promoveu ajuste da meta de número 10 do anexo à Portaria Sudene nº 165/2019, sendo reduzido de 4 para 3, com a manutenção do seu percentual de execução em 100%, referente à ação de Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, no período out/2019 - set/2020.
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2020	15/05/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2020	25/06/2020	-	01/06/2020	30/07/2020	-	100%	Concluído		

5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2020	06/07/2020	-	31/07/2020	31/08/2020	-	100%	Concluído	
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2020	15/07/2020	-	10/09/2020	10/09/2020	-	100%	Concluído	
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2020	25/10/2020	-	10/11/2020	23/12/2020	-	100%	Cancelado	A base de dados enviada pelo BNB apresentou inconsistências.
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2020	05/11/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado	Em todas as remessas foram identificados erros que impediram a elaboração de um relatório livre de falhas. Uma minuta chegou a ser elaborada (SEI nº 0204617), entretanto, posteriormente verificamos a existência de inconsistência com outros dados encaminhado pelo banco. Desta forma, solicitamos o envio de nova remessa de dados que foi entregue pelo banco em 23/12/2020, no final do quarto trimestre.
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2020	15/11/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado	
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	27/01/2021	27/01/2020	-	100%	A Iniciar	
11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	28/01/2021	11/02/2021	-	50%	A Iniciar	
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	15/02/2021	-	-	-	-		A Iniciar	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	95%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações

BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdirm@bnb.gov.br)

Observações:

Processo nº 59336.000717/2020-64

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 48 (EX PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):				
Projeto:	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.			
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 14.279.547,22
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 70.948.585,43
Saldo a liberar	R\$ 622,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 81.089.317,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 529/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/18	22/08/19	0,00	19/12/18	23/08/19	0,00	100,00%	Concluído			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-		100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	14.279.547,22	23/10/19	08/11/19	14.279.547,22		100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	8.103.276,36	08/01/20	03/03/20	8.103.276,36		100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	6.458.271,68	20/04/20	29/04/20	6.458.271,68		100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	4.138.815,59	02/07/20	12/08/20	4.138.815,59		100,00%	Concluído		
8	Liberção 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	52.248.843,99	30/10/20	12/11/20	52.248.221,80		100,00%	Concluído	Resta um saldo de R\$ 622,19 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			23/08/19	31/10/20	85.228.754,84	23/08/19	-	85.228.132,65	100,00%	Em Andamento			
Competência da SUDENE /Banco									100%	Em Andamento			

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	85.228.754,84	Valor realizado:	R\$	85.228.132,65	82%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.											
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 49 (EX PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2019
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 13.544.355,92
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 14.525.417,94
Saldo a liberar	R\$ 57.158.980,98
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 28.069.773,86

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 530/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/18	22/08/19	0,00	19/12/18	23/08/19	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	13.544.355,92	23/10/19	11/11/19	13.544.355,92	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	4.798.767,68	08/01/20	03/03/20	4.798.767,68	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	9.283.704,42	20/04/20	29/04/20	9.283.704,42	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	442.945,84	02/07/20	12/08/20	442.945,84	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	57.158.980,98	30/10/20	12/11/20	55.182.760,98	100,00%	Concluído	Resta um saldo de R\$ 1.976.220,00 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			23/08/19	31/10/20	85.228.754,84	23/08/19	12/11/20	83.252.534,84	100,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	85.228.754,84	Valor realizado:	R\$	83.252.534,84	82%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.											
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.											
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.											
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 50
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2021
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2021. Relatórios dos períodos jan-mar/2021; jan-jun/2021; jan-set/2021 e jan-dez/2021.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	2	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2022
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2021	25/04/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2021	06/05/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2021	-	-	-	-	-		A Iniciar		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2021	25/06/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2021	06/07/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2021	-	-	-	-	-		A Iniciar		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2021	25/10/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2021	05/11/2021	-	-	-	-		A Iniciar		

9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2021	-	-	-	-	-	-	A Iniciar		
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	-	-	-	-	A Iniciar		
11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	-	-	-	-	A Iniciar		
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	-	-	-	-	-	-	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	#DIV/0!	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações

BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdim@bnb.gov.br)

Observações:

Processo nº -

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 47)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2019
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres		
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/12/2019

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1 Processo nº 59335.000172/2010-24 - Grupo Gestão/PE (SIAFI nº 737121), Emissão de Parecer Financeiro 25 (Doc SEI nº 0079067)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	08/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	29/05/2019	12/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Servidor teve de paralisar a análise para elaborar os P.O. e Indicadores de Monitoramento da COCIC	
2 Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Parecer Financeiro 22 (Doc SEI nº 0078311)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/05/2019	01/06/2019	ñ se aplica	17/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
3 Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI s/n), Emissão de Nota Técnica 92 (Doc SEI nº 0077554)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	27/12/2018	11/01/2019	ñ se aplica	15/05/2019	23/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)	
4 Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 74 (Doc SEI nº 0071144)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	29/03/2019	13/04/2019	ñ se aplica	29/03/2019	17/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Análise complementar à Nota Técnica nº 47/2019-SEI/SUDENE	
5 Processo nº 59335.000176/2017-89 - Bom Jesus da Sera/BA (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 47 (Doc SEI nº 0066268)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	19/03/2019	03/04/2019	ñ se aplica	19/03/2019	29/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
6 Processo nº 59333.000262/2005-78 - AESA/PB (SIAFI nº 542944), Emissão de Nota Técnica 38 (Doc SEI nº 0065151)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/03/2019	22/03/2019	ñ se aplica	04/04/2019	04/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Convênio do Passivo da ADENE, para homologação de encerramento pela Diretoria Colegiada da SUDENE	
7 Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 33 (Doc SEI nº 0063958)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
8 Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Parecer Financeiro 26 (Doc SEI nº 0079173)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	21/05/2019	05/06/2019	ñ se aplica	30/05/2019	31/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
9 Processo nº 59335.000072/2016-93 - Lagoa D'Anta/RN (SIAFI nº 828295), Emissão de Nota Técnica 86 (Doc SEI nº 0076296)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	09/05/2019	15/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
10 Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 85 (Doc SEI nº 0076227)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/05/2019	28/05/2019	ñ se aplica	15/05/2019	17/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
11 Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 84 (Doc SEI nº 0075549)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/05/2019	24/05/2019	ñ se aplica	13/05/2019	13/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

12	Processo nº 59335.000469/2014-13 - SDA/CE (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 78 (Doc SEI nº 0074147)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	02/10/2018	17/10/2018	ñ se aplica	06/05/2019	06/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
13	Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iaçu/BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 76 (Doc SEI nº 0072006)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/04/2019	27/04/2019	ñ se aplica	24/04/2019	25/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
14	Processo nº 59335.000066/2016-36 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827249), Emissão de Nota Técnica 72 (Doc SEI nº 0070666)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	09/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	26/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
15	Processo nº 59335.000073/2016-38 - Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 68 (Doc SEI nº 0070107)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2019	05/03/2019	ñ se aplica	11/04/2019	23/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Conveniente demorou em responder às cobranças realizadas entre 18/02 e 11/04/2019
16	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 51 (Doc SEI nº 0066718)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/03/2019	12/04/2019	ñ se aplica	28/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
17	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Nota Técnica 46 (Doc SEI nº 0066049)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/03/2019	10/04/2019	ñ se aplica	26/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
18	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Nota Técnica 37 (Doc SEI nº 0064908)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	20/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
19	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 31 (Doc SEI nº 0063875)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
20	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 25 (Doc SEI nº 0060313)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	20/02/2019	07/03/2019	ñ se aplica	20/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
21	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 19 (Doc SEI nº 0059507)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	15/02/2019	20/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
22	Processo nº 59335.000073/2016-38 - Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica 16 (Doc SEI nº 0059293)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	18/02/2019	11/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
23	Processo nº 59335.000357/2013-81 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 792551), Emissão Parecer Financeiro 01 (Doc SEI nº 0059138)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2018	11/12/2018	ñ se aplica	15/02/2019	15/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
24	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 14 (Doc SEI nº 0058643)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/02/2019	23/02/2019	ñ se aplica	08/02/2019	13/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
25	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino (SIAFI nº 802144), Emissão de Nota Técnica 11 (Doc SEI nº 0057583)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	06/02/2019	21/02/2019	ñ se aplica	06/02/2019	08/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
26	Processo nº 59335.000373/2013-74 - CONDEPE/FIDEM (SIAFI nº 794329), Emissão de Nota Técnica 08 (Doc SEI nº 0056931)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	05/02/2019	05/02/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
27	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica complementar - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	25/01/2019	09/02/2019	ñ se aplica	25/01/2019	31/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
28	Processo nº 59335.000250/2017-67 - Mutuípe/BA (SIAFI nº 851669), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0055876)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	07/01/2019	25/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
29	Processo nº 59335.000073/2016-38 - Tangará/RN (SIAFI nº 827676), Emissão de Nota Técnica - 1ª parcela (Doc SEI nº 0054177)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/01/2019	22/01/2019	ñ se aplica	18/01/2019	18/01/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
30	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá/BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Nota Técnica 97 (Doc SEI nº 0078290)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/05/2019	07/06/2019	ñ se aplica	23/05/2019	27/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
31	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 81 (Doc SEI nº 0074656)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	24/04/2019	09/05/2019	ñ se aplica	08/05/2019	08/05/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
32	Processo nº 59335.000255/2017-90 - Mansidão/BA (SIAFI nº 852858), Emissão de Nota Técnica 70 (Doc SEI nº 0070625)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/04/2019	30/04/2019	ñ se aplica	15/04/2019	24/04/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

33	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 850628 , Emissão de Nota Técnica 41 (Doc SEI nº 0065269)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	21/03/2019	05/04/2019	ñ se aplica	21/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
34	COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	13/03/2019	28/03/2019	ñ se aplica	13/03/2019	26/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
35	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica /RN (SIAFI nº 850628), Emissão de Nota Técnica 22 (Doc SEI nº 0060027)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	15/02/2019	02/03/2019	ñ se aplica	19/02/2019	18/03/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
36	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Comum (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 105 (Doc SEI nº 0083467)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	19/06/2019	07/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo aberto para acompanhar a evolução do passivo de processos (convênios, acordos de cooperação e similares) ainda pendentes de conclusão. Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer
37	Processo nº 59336.001273/2019-41 - Processo de Auditoria (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 115 (Doc SEI nº 0087447)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	22/06/2019	07/07/2019	ñ se aplica	11/07/2019	15/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo aberto pela Auditoria Interna da SUDENE. Ref: RAUDINT 06
38	Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iaçua/BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 119 (Doc SEI nº 0088177)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	08/07/2019	23/07/2019	ñ se aplica	15/07/2019	22/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
39	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 125 (Doc SEI nº 089612)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/07/2019	01/08/2019	ñ se aplica	23/07/2019	24/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
40	Processo nº 59335.000188/2017-11 - Oliveira de Brejinhos/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica 129 (Doc SEI nº 090486)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/07/2019	10/08/2019	ñ se aplica	29/07/2019	29/07/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
41	Processo nº 59335.000088/2017-87 - Campo Alegre de Lourdes/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 178 (Doc SEI nº 0100357)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	04/09/2019	10/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
42	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Comum (SIAFI nº N/A), Emissão de Nota Técnica 207 (Doc SEI nº 0105816)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	27/09/2019		ñ se aplica	70%	Em Andamento	Processo aberto para acompanhar a evolução do passivo de processos (convênios, acordos de cooperação e similares) ainda pendentes de conclusão. Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer
43	Processo nº 59335.000090/2017-56 - Tremedal/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 208 (Doc SEI nº 0105978)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	12/09/2019	27/09/2019	ñ se aplica	27/09/2019	30/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
44	Processo nº 59335.000178/2017-78 - Tremedal/BA (SIAFI nº 847039), Emissão de Nota Técnica 213 (Doc SEI nº 0106549)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	01/10/2019	16/10/2019	ñ se aplica	01/10/2019	02/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
45	Processo nº 59335.000088/2017-87 - Campo Alegre de Lourdes/BA (SIAFI nº 852859), Emissão de Nota Técnica 218 (Doc SEI nº 0108368)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	08/10/2019	10/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
46	Processo nº 59335.000176/2017-89 - BOM JESUS DA SERRA/BA - (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 226 (Doc SEI nº 0112547)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	09/10/2019	24/10/2019	ñ se aplica	22/10/2019	25/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
47	Processo nº 59335.000230/2016-13 - PARAZINHO/RN - (SIAFI nº 836220), Emissão de Nota Técnica 231 (Doc SEI nº 0115916)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	01/11/2019	01/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
48	Processo nº 59335.000178/2017-78 -Tremedal/BA - (SIAFI nº 847039), Emissão de Nota Técnica 236 (Doc SEI nº 0117119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	16/10/2019	31/10/2019	ñ se aplica	06/11/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
49	Processo nº 59335.000176/2017-89 -BOM JESUS DA SERRA/BA - (SIAFI nº 847037), Emissão de Nota Técnica 238 (Doc SEI nº 0117119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	06/11/2019	21/11/2019	ñ se aplica	06/11/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
50	Processo nº 59335.000210/2012-19 - RUY BARBOSA/RN - (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica 252 (Doc SEI nº 0121671)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	21/11/2019	06/12/2019	ñ se aplica	21/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

51	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI n.º 847042), Emissão de Parecer Financeiro 30 (Doc SEI nº 0080717)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	28/05/2019	12/06/2019	ñ se aplica	06/06/2019	06/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
52	Processo nº 59313.000115/2000-21 - Instituto Anthropos/RS (SIAFI n.º 407086), Emissão de Parecer Financeiro 35 (Doc SEI nº 0082172)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	13/06/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
53	Processo nº 59335.000520/2009-20 - SAPE/RN (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro 68 (Doc SEI nº 0094117)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	09/08/2019	12/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
54	Processo nº 59335.000519/2013-81 - SABOIRO/CE (SIAFI n.º 789013), Emissão de Parecer Financeiro 76 (Doc SEI nº 0098938)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	28/08/2019	28/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
55	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro 93 (Doc SEI nº 0102258)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	11/09/2019	11/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
56	Processo nº 59335.000373/2013-74 - CONDEPE/FIDEM-PE (SIAFI n.º 794329), Emissão de Parecer Financeiro 96 (Doc SEI nº 0103878)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	02/09/2019	17/09/2019	ñ se aplica	18/09/2019	19/09/2018	ñ se aplica	100%	Concluído	
57	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI n.º N/A), Emissão de Parecer Financeiro 101 (Doc SEI nº 0104905)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	07/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)
58	Processo nº 59335.000276/2013-81 - Currais Novos/RN (SIAFI n.º 789015), Emissão de Parecer Financeiro 104 (Doc SEI nº 0106179)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2019	25/09/2019	ñ se aplica	30/09/2019	30/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
59	Processo nº 03045.000001/2000-63 - ASSEMP/PE (SIAFI n.º 399481), Emissão de Parecer Financeiro 106 (Doc SEI nº 0106250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	30/09/2019	11/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
60	Processo nº 59335.000276/2013-81 - Currais Novos/RN (SIAFI n.º 789015), Emissão de Parecer Financeiro 107 (Doc SEI nº 0106924)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	02/10/2019	17/10/2019	ñ se aplica	03/10/2019	03/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
61	Processo nº 59335.000449/2009-85 - Riachuelo/RN (SIAFI n.º 707430), Emissão de Parecer Financeiro 108 (Doc SEI nº 0106966)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	03/10/2019	07/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
62	Processo nº 59313.000115/2000-21 - Instituto Anthropos/RS (SIAFI n.º 407086), Emissão de Parecer Financeiro 110 (Doc SEI nº 0108250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	23/09/2019	08/10/2019	ñ se aplica	08/10/2019	17/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
63	Processo nº 59335.000172/2010-24 - Grupo Gestão-PE (SIAFI n.º 737121), Emissão de Parecer Financeiro 114 (Doc SEI nº 0109377)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	24/09/2019	09/10/2019	ñ se aplica	10/10/2019	10/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho , para emissão de parecer.
64	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro 127 (Doc SEI nº 0118387)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	11/11/2019	18/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
65	Processo nº 59335.000230/2016-13 - PARAZINHO/RN - (SIAFI nº 836220), Emissão de Parecer Financeiro 129 (Doc SEI nº 0120256)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	18/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
66	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá - BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Nota Técnica 112 (Doc SEI nº 0085909)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/05/2019	07/06/2019	ñ se aplica	04/07/2019	11/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
67	Processo nº 59335.000179/2017-12 - Wanderley - BA (SIAFI nº 847040), Emissão de Nota Técnica 149 (Doc SEI nº 0094402)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	10/07/2019	25/07/2019	ñ se aplica	12/08/2019	12/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
68	Processo nº 59335.000179/2017-12 - Wanderley - BA (SIAFI nº 847040), Emissão de Nota Técnica 221 (Doc SEI nº 0106497)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	01/10/2019	16/10/2019	ñ se aplica	01/10/2019	24/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
69	Processo nº 59335.000075/2017-16 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 850628 , Emissão de Nota Técnica 246 (Doc SEI nº 0119722)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	13/11/2019	28/11/2019	ñ se aplica	14/11/2019	20/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	
70	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI nº N/A), Emissão de Parecer 80 (Doc SEI nº 0104901)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	23/09/2019	ñ se aplica	80%	Em Andamento	Processo da Força-Tarefa PROCONDEL (não é convênio)
71	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT- PROCONDEL (SIAFI nº N/A), Emissão de Parecer 110 (Doc SEI nº 0123064)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	27/11/2019	31/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

72	Processo nº 59335.000469/2014-13 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA - CE - (SIAFI nº 812155), Emissão de Parecer Financeiro 71 (Doc SEI nº 0095177)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/08/2019	29/08/2019	ñ se aplica	14/08/2019	23/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
73	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino - RN (SIAFI nº 802144), Emissão de Parecer Financeiro 88 (Doc SEI nº 0101798)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	10/09/2019	09/10/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
74	Processo nº 59335.000091/2014-58 - Messias Targino - RN (SIAFI nº 802144), Emissão de Parecer Financeiro 128 (Doc SEI nº 0118650)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	11/11/2019	14/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
75	Processo nº 59335.000083/2017-54 - JABORANDI - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 99 (Doc SEI nº 0080734)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/06/2019	19/06/2019	ñ se aplica	06/06/2019	07/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
76	Processo nº 59335.000063/2016-01 - PASSA E FICA/RN (SIAFI nº 827250), Emissão de Nota Técnica 100 (Doc SEI nº 0081736)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/06/2019	18/06/2019	ñ se aplica	11/06/2019	11/06/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
77	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 156 (Doc SEI nº 0095903)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/08/2019	30/08/2019	ñ se aplica	16/08/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
78	Processo nº 59335.000182/2017-36 - CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 161 (Doc SEI nº 0096395)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	19/08/2019	03/09/2019	ñ se aplica	19/08/2019	20/08/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
79	Processo nº 59335.000083/2017-54 - JABORANDI - BA (SIAFI nº 852856), Emissão de Nota Técnica 177 (Doc SEI nº 0100501)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	04/09/2018	05/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
80	Processo nº 59335.000180/2017-47 - BRUMADO - BA (SIAFI nº 847041), Emissão de Nota Técnica 180 (Doc SEI nº 0100679)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	04/09/2018	06/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
81	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 182 (Doc SEI nº 0101264)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/09/2019	18/09/2019	ñ se aplica	06/09/2019	12/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
82	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 183 (Doc SEI nº 0101521)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/09/2019	19/09/2019	ñ se aplica	09/09/2019	09/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
83	Processo nº 59335.000180/2017-47 - BRUMADO - BA (SIAFI nº 847041), Emissão de Nota Técnica 192 (Doc SEI nº 0102723)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	13/09/2019	13/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
84	Processo nº 59335.000115/2018-01 - MORRO DO CHAPEU - BA (SIAFI nº 865843), Emissão de Nota Técnica 228 (Doc SEI nº 0114579)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	19/10/2019	03/11/2019	ñ se aplica	30/10/2019	06/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
85	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Nota Técnica 237 (Doc SEI nº 0117143)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	06/11/2019	08/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
86	Processo nº 59335.000245/2017-54 - Jaborandi/BA (SIAFI nº 850212), Emissão de Nota Técnica 244 (Doc SEI nº 0119556)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/11/2019	26/11/2019	ñ se aplica	13/11/2019	19/11/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
87	Processo nº 59335.000265/2010-59 - Tibau do Sul/RN (SIAFI nº 744654), Emissão de Parecer Financeiro 151 (Doc SEI nº 0133119)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	29/11/2019	14/12/2019	ñ se aplica	29/11/2019	31/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
88	Processo nº 59335.000256/2017-34 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850889), Emissão de Nota Técnica 262 (Doc SEI nº 0126318)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/12/2019	18/12/2019	ñ se aplica	03/12/2019	05/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
89	Processo nº 59335.000244/2017-18 - Gentio do Ouro/BA (SIAFI nº 850215), Emissão de Nota Técnica 264 (Doc SEI nº 0126511)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/12/2019	18/12/2019	ñ se aplica	03/12/2019	06/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
90	Processo nº 59335.000371/2017-17 - Icapui/CE (SIAFI nº 853282), Emissão de Nota Técnica 275 (Doc SEI nº 129439)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/12/2019	27/12/2019	ñ se aplica	12/12/2019	30/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
91	Processo nº 59335.000201/2018-13 - Ibirataia/BA (SIAFI nº 872767), Emissão de Nota Técnica 279 (Doc SEI nº 0130603)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	16/12/2019	31/12/2019	ñ se aplica	16/12/2019	19/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		

92	Processo nº 59335.000268/2017-69- Coronel João Pessoa/RN (SIAFI nº 858619), Emissão de Nota Técnica 265 (Doc SEI nº 0127494)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	06/12/2019	21/12/2019	ñ se aplica	06/12/2019	15/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	99%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.												
Observações:												
Jan/2019 a Dez/2019												

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 48)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2020
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres		
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo nº 59335.000371/2017-17 - Icapui/CE (SIAFI nº 853282), Emissão de Nota Técnica nº 275/2019 (Doc SEI nº 0119556)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	12/12/2019	27/12/2019	ñ se aplica	12/12/2019	30/01/2000	ñ se aplica	100%	Concluído	Este Processo estava aguardando digitalização. Após digitalizado, foi direto para a carga do técnico, sem despacho, para, Emissão de parecer.	
2	Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Nota Técnica nº 02/2020 (Doc SEI nº 0136462)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/01/2020	23/01/2020	ñ se aplica	08/01/2020	16/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica nº 13/2020 (Doc SEI nº 0139269)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	22/01/2020	06/02/2020	ñ se aplica	22/01/2020	29/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo nº 59335.000099/2017-67 - Caraúbas/RN (SIAFI nº 853926), Emissão de Nota Técnica nº 22/2020 (Doc SEI nº 0141740)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/02/2020	19/02/2020	ñ se aplica	04/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo nº 59335.000060/2017-40 - Jandaíra/RN (SIAFI nº 847991), Emissão de Nota Técnica 137/2020 (Doc SEI nº 0160310)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/02/2020	19/02/2020	ñ se aplica	05/02/2020	02/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	A demora na conclusão desta nota técnica deveu-se ao fato de termos detectado pendências no convênio e a pessoa que cuida da assessoria responsável pelos documentos na Plataforma +Brasil estava em férias. Quando de sua volta teve início o isolamento social por conta da pandemia, o que dificultou o acesso dele aos funcionários da prefeitura, para obter e inserir os documentos na Plataforma.	
6	Processo nº 59335.000063/2016-01 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827250), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 02/2020 (Doc SEI nº 0142534)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	05/02/2020	20/02/2020	ñ se aplica	05/02/2020	05/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
7	Processo nº 59335.000063/2016-01 - Passa e Fica/RN (SIAFI nº 827250), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 19/2020 (Doc SEI nº 0155430)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	05/02/2020	20/02/2020	ñ se aplica	30/04/2020	30/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59335.000062/2016-58 - Tibau do Sul/RN (SIAFI nº 828298), Emissão de Nota Técnica nº 59/2020 (Doc SEI nº 0145964)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	14/02/2020	05/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica nº 42/2020 (Doc SEI nº 0144112)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	14/02/2020	14/02/2020	ñ se aplica	100%	concluído		

10	Processo nº 59335.000130/2018-41 - Tanhaçu/BA (SIAFI nº 868127), Emissão de Nota Técnica 61/2020 (Doc SEI nº 0146164)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/02/2020	14/03/2020	ñ se aplica	02/03/2020	03/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Concluído com pendências a serem regularizadas pelo conveniente.	Envio de e-mail ao conveniente informando das pendências e solicitando regularização das mesmas.
11	Processo nº 59335.000130/2018-41 - Tanhaçu/BA (SIAFI nº 868127), Emissão de Nota Técnica 67/2020 (Doc SEI nº 0147351)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	03/03/2020	18/03/2020	ñ se aplica	09/03/2020	10/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59336.001938/2018-35 - São Domingos/BA (SIAFI nº 880998), Emissão de Nota Técnica 84/2020 (Doc SEI nº 0150343)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	27/03/2020	11/04/2020	ñ se aplica	27/03/2020	30/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Concluído com pendências a serem regularizadas pelo conveniente.	Envio de e-mail ao conveniente informando das pendências e solicitando regularização das mesmas.
13	Processo nº 59335.000122/2018-02 - Lucrécia/RN (SIAFI nº 865916), Emissão de Nota Técnica 90/2020 (Doc SEI nº 0151555)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	02/04/2020	17/04/2020	ñ se aplica	06/04/2020	06/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Concluído com pendências a serem regularizadas pelo conveniente.	Envio de e-mail ao conveniente informando das pendências e solicitando regularização das mesmas.
14	Processo nº 59336.001938/2018-35 - São Domingos/BA (SIAFI nº 880998), Emissão de Nota Técnica 101/2020 (Doc SEI nº 0153046)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	06/04/2020	21/04/2020	ñ se aplica	15/04/2020	16/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
15	Processo nº 59335.000099/2017-67 - Caraúbas/RN (SIAFI nº 853926), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 15/2020 (Doc SEI nº 0152211)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/04/2020	22/04/2020	ñ se aplica	09/04/2020	06/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	A demora na conclusão deste Parecer técnico financeiro deveu-se de o conveniente ter tido problemas junto ao Banco da conta do convênio, para efetuar a devolução do saldo remanescente do convênio.	
16	Processo nº 59335.000122/2018-02 - Lucrécia/RN (SIAFI nº 865916), Emissão de Nota Técnica 107/2020 (Doc SEI nº 0154968)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	17/04/2020	02/05/2020	ñ se aplica	28/04/2020	29/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo nº 59335.000199/2018-74 - Brumado/BA (SIAFI nº 872768), Emissão de Nota Técnica 112/2020 (Doc SEI nº 0155578)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	22/04/2020	07/05/2020	ñ se aplica	30/04/2020	11/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Nota Técnica 115/2020 (Doc SEI nº 0157123)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	30/04/2020	15/05/2020	ñ se aplica	12/05/2020	19/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
19	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica 131/2020 (Doc SEI nº 0159944)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	22/05/2020	06/06/2020	ñ se aplica	28/05/2020	29/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
20	Processo nº 59335.000079/2017-96 - Boa Vista do Tupim/BA (SIAFI nº 850668), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 29/2020 (Doc SEI nº 0161596)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	22/05/2020	06/06/2020	ñ se aplica	08/06/2020	22/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	A demora na conclusão deste Parecer técnico financeiro deveu-se ao fato de termos detectado pendências no convênio e a pessoa que cuida da assessoria responsável pelos documentos na Plataforma +Brasil estava em férias. Quando de sua volta teve início o isolamento social por conta da pandemia, o que dificultou o acesso dele aos funcionários da prefeitura, para obter e inserir os documentos na Plataforma.	
21	Processo nº 59335.000130/2018-41 - Tanhaçu/BA (SIAFI nº 868127), Emissão de Nota Técnica 143/2020 (Doc SEI nº 0162099)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	02/06/2020	17/06/2020	ñ se aplica	10/06/2020	18/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
22	Processo nº 59335.000060/2017-40 - Jandaíra/RN (SIAFI nº 847991), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 30/2020 (Doc SEI nº 0163589)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/06/2020	23/06/2020	ñ se aplica	19/06/2020	01/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
23	Processo nº 59335.000199/2018-74 - Brumado/BA (SIAFI nº 872768), Emissão de Nota Técnica 158/2020 (Doc SEI nº 0164753)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	16/06/2020	01/07/2020	ñ se aplica	29/06/2020	29/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
24	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João/BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica 154/2020 (Doc SEI nº 0164405)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	23/06/2020	08/07/2020	ñ se aplica	25/06/2020	25/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Nota técnica emitida para responder dúvidas do conveniente levantadas em ofício.	
25	Processo nº 59335.000199/2018-74 - Brumado/BA (SIAFI nº 872768), Emissão de Nota Técnica 182/2020 (Doc SEI nº 0172405)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	29/07/2020	13/08/2020	ñ se aplica	03/08/2020	04/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
26	Processo nº 59335.000078/2017-41 - Matina/BA (SIAFI nº 852855), Emissão de Nota Técnica 193/2020 (Doc SEI nº 0175459)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/08/2020	22/08/2020	ñ se aplica	14/08/2020	21/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		
27	Processo nº 59335.000128/2018-71 - Pindobaçu/BA (SIAFI nº 865841), Emissão de Nota Técnica 203/2020 (Doc SEI nº 0177430)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/08/2020	26/08/2020	ñ se aplica	26/08/2020	02/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído		

28	Processo nº 59335.000085/2017-43 - São Miguel/RN (SIAFI nº 850670), Emissão de Nota Técnica 202/2020 (Doc SEI nº 0177186)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	17/08/2020	01/09/2020	ñ se aplica	25/08/2020	28/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
29	Processo nº 59335.000200/2018-61 - Itapetinga/BA (SIAFI nº 872771), Emissão de Nota Técnica 207/2020 (Doc SEI nº 0179479)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	01/09/2020	16/09/2020	ñ se aplica	03/09/2020	03/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
30	Processo nº 59335.000201/2018-13 - Ibirataia/BA (SIAFI nº 872767), Emissão de Nota Técnica 241/2020 (Doc SEI nº 0185436)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/09/2020	30/09/2020	ñ se aplica	29/09/2020	01/10/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
31	Processo nº 59335.000115/2018-01 - Morro do Chapéu/BA (SIAFI nº 865843), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 278/2020 (SEI 0191795)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/09/2020	30/09/2020	ñ se aplica	24/09/2020	23/10/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	A demanda não foi iniciado na data prevista, porque o servidor estava em gozo de férias no período de 08 a 22/09/2020 e não foi concluída no previsto, devido às pendências elencadas nos
32	Processo nº 59335.000113/2018-11 - Urucuá/BA (SIAFI nº 865731), Emissão de Nota Técnica 113/2020 (Doc SEI nº 0156858)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	11/05/2020	01/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
33	Processo nº 59335.000064/2017-28 - Jandaíra/RN (SIAFI nº 847990), Emissão de Nota Técnica nº 57/2020 (Doc SEI nº 0145830)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	18/02/2020	10/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
34	Processo nº 59335.000064/2017-28 - Jandaíra/RN (SIAFI nº 847990), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 23/2020 (Doc SEI nº 0157163)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	12/05/2020	10/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
35	Processo nº 59335.000119/2018-81 - Jundiá/RN (SIAFI nº 865927), Emissão de Nota Técnica 108/2020 (Doc SEI nº 0155088)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	07/04/2020	22/04/2020	ñ se aplica	29/04/2020	19/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
36	Processo nº 59335.000134/2018-29 - Rafael Jambeiro/BA (SIAFI nº 868125), Emissão de Nota Técnica 106/2020 (Doc SEI nº 0154589)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	09/04/2020	24/04/2020	ñ se aplica	27/04/2020	03/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
37	Processo nº 59336.000737/2020-35 - Demanda Externa (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 120/2020 (Doc SEI nº 0157283)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	11/05/2020	26/05/2020	ñ se aplica	13/05/2020	14/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
38	Processo nº 59335.000179/2017-12 - Wanderley/BA (SIAFI nº 847040), Emissão de Nota Técnica 145/2020 (Doc SEI nº 0162552)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	14/06/2020	29/06/2020	ñ se aplica	14/06/2020	17/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
39	Processo nº 59335.000202/2018-50 - Vitória da Conquista/BA (SIAFI nº 872770), Emissão de Nota Técnica 165/2020 (Doc SEI nº 0168280)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	02/07/2020	17/07/2020	ñ se aplica	13/07/2020	24/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
40	Processo nº 59335.000195/2018-96 - Jacaraci/BA (SIAFI nº 875543), Emissão de Nota Técnica 167/2020 (Doc SEI nº 0168707)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	10/07/2020	25/07/2020	ñ se aplica	15/07/2020	23/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
41	Processo nº 59335.000119/2018-81 - Jundiá/RN (SIAFI nº 865927), Emissão de Nota Técnica 174/2020 (Doc SEI nº 0169702)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	21/07/2020	05/08/2020	ñ se aplica	21/07/2020	23/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
42	Processo nº 59335.000106/2018-10 - Barra do Choça-BA (SIAFI nº 865925), Emissão de Nota Técnica 184/2020 (Doc SEI nº 0172717)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	31/07/2020	15/08/2020	ñ se aplica	04/08/2020	19/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
43	Processo nº 59335.000118/2018-36 - Ouro Branco/RN (SIAFI nº 865930), Emissão de Nota Técnica 185/2020 (Doc SEI nº 0172978)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	04/08/2020	19/08/2020	ñ se aplica	05/08/2020	10/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
44	Processo nº 59335.000401/2017-87 - Coronel João Sá/BA (SIAFI nº 862698), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 40/2020 (Doc SEI nº 0182682)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	16/09/2020	01/10/2020	ñ se aplica	16/09/2020	17/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
45	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT-PROCONDEL (Sem SIAFI), Emissão de Parecer 11/2020 (Doc SEI nº 0152468)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	11/10/2018	26/10/2018	ñ se aplica	12/04/2020	13/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da FT-PROCONDEL. Não é convênio
46	Processo nº 03054.000025/1998-26 - PNUD (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 110/2020 (Doc SEI nº 0155363)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/12/2018	01/01/2019	ñ se aplica	30/04/2020	04/05/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
47	Processo nº 59313.000115/2000-21 - Instituto Anthropol/RS (SIAFI nº 407086), Emissão de Parecer 13/2020 (Doc SEI nº 0157629)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	15/05/2019	30/05/2019	ñ se aplica	15/05/2020	27/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
48	Processo nº 59335.000210/2012-19 - Ruy Barbosa/RN (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica nº 26/2020 (Doc SEI nº 0142508)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/11/2019	11/12/2019	ñ se aplica	26/11/2019	07/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
49	Processo nº 59335.000520/2009-20 - SAPE/RN (SIAFI nº 710365), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 01/2020 (Doc SEI nº 0142300)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	24/12/2019	08/01/2020	ñ se aplica	24/12/2019	06/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	

50	Processo nº 59335.000188/2017-11 - OLIVEIRA DOS BREJINHOS/BA (SIAFI nº 850213), Emissão de Nota Técnica nº 17/2020 (Doc SEI nº 0139996)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/12/2019	10/01/2020	ñ se aplica	26/12/2019	31/01/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
51	Processo nº 59335.000126/2018-82 - Itajá/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica nº 29/2020 (Doc SEI nº 0142932)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	04/02/2020	19/02/2020	ñ se aplica	04/02/2020	17/12/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
52	Processo nº 59335.000210/2012-19 - Ruy Barbosa/RN (SIAFI nº 770860), Emissão de Nota Técnica nº 07/2020 (Doc SEI nº 0145519)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/02/2020	22/02/2020	ñ se aplica	07/02/2020	21/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
53	Processo nº 59335.000058/2016-90 - Parelhas/RN (SIAFI nº 828299), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 20/2020 (Doc SEI nº 0155945)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	14/02/2020	29/02/2020	ñ se aplica	05/05/2020	10/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
54	Processo nº 59335.000126/2018-82 - Itajá/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica nº 54/2020 (Doc SEI nº 0145727)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	17/02/2020	03/03/2020	ñ se aplica	17/02/2020	26/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
55	Processo nº 59335.000124/2018-93 - Filadélfia/BA (SIAFI nº 865860), Emissão de Nota Técnica nº 55/2020 (Doc SEI nº 0145780)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	18/02/2020	04/03/2020	ñ se aplica	18/02/2020	28/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
56	Processo nº 59335.000124/2018-93 - Filadélfia/BA (SIAFI nº 865860), Emissão de Nota Técnica 62/2020 (Doc SEI nº 0146175)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	28/02/2020	14/03/2020	ñ se aplica	02/03/2020	02/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
57	Processo nº 59335.000094/2014-91 - Jardim de Piranhas/RN (SIAFI nº 802415), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 8/2020 (Doc SEI nº 0146952)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	28/02/2020	14/03/2020	ñ se aplica	05/03/2020	24/03/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
58	Processo nº 59336.001273/2019-41 - Demanda Externa (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 97/2020 (Doc SEI nº 0152461)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/04/2020	22/04/2020	ñ se aplica	12/04/2020	22/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Demanda Externa. Não é Convênio.
59	Processo nº 59335.000449/2009-85 - Riachuelo/RN (SIAFI nº 707430), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 17/2020 (Doc SEI nº 0154614)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	27/04/2020	12/05/2020	ñ se aplica	27/04/2020	27/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
60	Processo nº 59335.000094/2014-91 - Jardim de Piranhas/RN (SIAFI nº 802415), Emissão de Parecer Técnico Financeiro 24/2020 (Doc SEI nº 0160291)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	26/05/2020	10/06/2020	ñ se aplica	01/06/2020	01/06/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
61	Processo nº 59336.003220/2019-64 - Surubim/PE (SIAFI nº 897165), Emissão de Nota Técnica 150/2020 (Doc SEI nº 0163741)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	15/06/2020	30/06/2020	ñ se aplica	20/06/2020	04/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
62	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT-PROCONDEL (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 179/2020 (Doc SEI nº 0171036)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	01/07/2020	16/07/2020	ñ se aplica	28/07/2020	28/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da FT-PROCONDEL. Não é convênio
63	Processo nº 59336.003220/2019-64 - Surubim/PE (SIAFI nº 897165), Emissão de Nota Técnica 166/2020 (Doc SEI nº 0168513)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	05/07/2020	20/07/2020	ñ se aplica	14/07/2020	15/07/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
64	Processo nº 59335.000284/2018-32 - Barreiras/BA (SIAFI nº 879067), Emissão de Nota Técnica 183/2020 (Doc SEI nº 0172637)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	15/07/2020	30/07/2020	ñ se aplica	04/08/2020	04/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
65	Processo nº 59335.000126/2018-82 - ITAJÁ/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica 188/2020 (Doc SEI nº 0173716)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	07/08/2020	22/08/2020	ñ se aplica	10/08/2020	12/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
66	Processo nº 59335.000126/2018-82 - ITAJÁ/RN (SIAFI nº 865923), Emissão de Nota Técnica 194/2020 (Doc SEI nº 0175743)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	22/08/2020	06/09/2020	ñ se aplica	18/08/2020	18/08/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
67	Processo nº 59335.000124/2018-93 - Filadélfia/BA (SIAFI nº 865860), Emissão de Nota Técnica 237/2020 (Doc SEI nº 0184825)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	11/09/2020	26/09/2020	ñ se aplica	26/09/2020	03/11/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	A demora na conclusão deste parecer técnico financeiro deveu-se ao fato de termos detectado pendências no convênio como a ausência do termo aditivo ao contrato com a vencedora do certamente licitatório, o que foi apresentado posteriormente.
68	Processo nº 59335.000146/2018-53 - Espírito Santo/RN (SIAFI nº 865847), Emissão de Nota Técnica 238/2020 (Doc SEI nº 0184828)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	15/09/2020	30/09/2020	ñ se aplica	27/09/2020	27/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
69	Processo nº 59335.000047/2018-71 - FT-PROCONDEL (Sem SIAFI), Emissão de Parecer 80/2020 (Doc SEI nº 0104901)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	23/09/2019	23/09/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo da FT-PROCONDEL. Não é convênio
70	Processo nº 03045.000001/2000-63 - ASSEMP/PE (SIAFI nº 399481), Emissão de Parecer Financeiro nº 106/2019/2020 (Doc SEI nº 0106250)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	30/09/2019	11/12/2019	ñ se aplica	100%	Concluído	

71	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Evolução do Passivo de Processos da extinta SUDENE de posse da COCIC (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 180/2020 (Doc SEI nº 0171903)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	30/07/2020	02/10/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	
72	Processo nº 59336.001401/2020-90 - Processo 07.34.008/80 BNCC (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 208/2020 (Doc SEI nº 0180862)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	07/09/2020	08/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
73	Processo nº 59336.001408/2020-10 - Processo 28.110.65008/84-DV - Fundação João Pinheiro/MG (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 210/2020 (Doc SEI nº 0181169)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	09/09/2020	09/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
74	Processo nº 59336.001420/2020-16 - Processo nº 15.010/82 (Min. Agricultura) (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 214/2020 (Doc SEI nº 0181514)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	10/09/2020	10/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
75	Processo nº 59336.001448/2020-53 - Processo nº 07.34.004/80 - BNCC (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 218/2020 (Doc SEI nº 0182467)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	16/09/2020	16/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
76	Processo nº 59336.001469/2020-79 - Processo nº 65.013/83 - CEPAPB (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 224/2020 (Doc SEI nº 0183215)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	19/09/2020	20/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
77	Processo nº 59336.001479/2020-12 - Processo nº 36.027/80 - Gov. MG (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 226/2020 (Doc SEI nº 0183345)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	21/09/2020	21/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
78	Processo nº 59336.001478/2020-60 - Processo nº 15.001/82 - CEPAPB (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 225/2020 (Doc SEI nº 0183291)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	21/09/2020	21/09/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
79	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Processo Ordinário (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica nº 44/2020 (Doc SEI nº 0144270)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	06/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
80	Processo nº 03057.000009/1997-13 - Acordo de Cooperação Técnica SUDENE/FAO (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica nº 56/2020 (Doc SEI nº 0145812)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	29/04/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Processo pertencente ao passivo de processos da extinta SUDENE
81	Processo nº 59336.001361/2019-42 - Chã de Alegria/PE (SIAFI nº 368692), Emissão de Nota Técnica nº 60/2020 (Doc SEI nº 0146039)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	28/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Recomposição processual de convênio desaparecido
82	Processo nº 59336.001361/2019-42 - Chã de Alegria/PE (SIAFI nº 368692), Emissão de Parecer Técnico Financeiro nº 03/2020 (Doc SEI nº 0142544)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	N/A	26/02/2020	ñ se aplica	100%	Concluído	Recomposição processual de convênio desaparecido
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

2º ciclo 2020 - Jan/2020 a Set/2020

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 49)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2020
Programa:	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CPTCE - Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial		
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	n se aplica
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Glauco Pereira Maciel

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE nº 59335.000035/2011-70, Ref. Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020		N/A	50%	Em Andamento	TCE encaminhada em 2019 à CGU e devolvida pela CGU em abril/2020, para reanálise. Renálise da TCE em andamento	
2	Processo TCE nº 59335.000102/2011-57, Ref. Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	30/06/2021	N/A	09/04/2020		N/A	10%	Em Andamento	TCE em andamento	
3	Processo TCE n.º 59335.000720/2010-16, Ref. Conv. SIAFI n.º 406373 (Processo n.º 59313.000114/00-87) - Emissão de Relatório de TCE nº /2020 (em elaboração) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020		N/A	66%	Em Andamento	Tce iniciada durante a pandemia COVID/19	
4	Processo TCE n.º 59335.000153/2012-60 Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03054.000042/97-64) - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo Alves de Souza, Eliane Maria Bezerra Acioly (CPTCE)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	50%	Em Andamento	TCE suspensa devido a falta de Computador para dar andamento ao Home Office.	
5	Processo de TCE nº 59335.000184/2010-59, ref. Conv. SIAFI nº 348984 (proc. Nº 03055.000025/98-34), Governo do Estado de Alagoas. - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	04/02/2020	31/12/2020	N/A	04/02/2020		N/A	50%	Em Andamento		
6	Processo de TCE nº 59335.000040/2012-64, Ref. Conv SIAFI nº 337714 (Processo nº 03057.000033/97-06) CEFET MA - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	17/02/2020	31/12/2020	N/A	17/02/2020		N/A	10%	Em Andamento	Em reanálise, pois a priori, o convênio não reuniu os pressupostos para instauração de TCE	
7	Processo de TCE nº 59335.000049/2010-11, ref. Conv SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	17/02/2020	31/12/2020	N/A	17/02/2020		N/A	20%	Em Andamento		
8	Processo de TCE nº 59335.000005/2012-45, ref. Conv. SIAFI nº 406129 (proc. Nº 59313.000006/2000-12), Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	13/04/2020	Não informado	N/A	13/04/2020		N/A	20%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		n se aplica	Valor realizado:		n se aplica		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
P.O. - 3º ciclo/2020	

Fonte: CPTCE (Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 25.000,00

Previsão de Conclusão:	01/06/2021
Data Atualização:	11/02/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 9.414,51
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R\$ -	30/07/2018	17/05/2019	R\$ -	100%	Concluído	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R\$ 15.000,00	19/07/2018	31/08/2019	R\$ -	100%	Concluído	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas	
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Elaboração de oficinas de Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Facilitador	01/03/2019	30/06/2021	R\$ -	05/04/2020			58%	Em Andamento	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	CGGP	01/01/2020	31/12/2020					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019. Considerando ainda o estado de pandemia do COVID-19.		
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/03/2020	01/06/2021					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.		
				Valor Previsto:		R\$	25.000,00	Valor realizado:		R\$	9.414,51	60%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

No ano de 2018 foi alcançado 23% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 50% em 2019. O objetivo deste PO é alcançar 70% em 2020

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2020
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI			Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade			Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Aluizio Pinto de Oliveira			Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais				
Projeto:	Indicadores de Gestão de Pessoas				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 50.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	11/02/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Santos de Melo, Marlene Franklin e Marina Braga

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 50.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 10.800,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 10.800,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 10.800,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre Indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas	Estudos sobre o tema indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas - pesquisas de modelos, pesquisa na literatura	CGGP	01/09/20	30/09/20		01/09/20	30/09/20		100%	Concluído	Estudos para compreensão do tema - prévia a capacitação formal	
2	Capacitação da Equipe e Elaboração de Plano de Ação	Participação em evento de capacitação e Elaboração de Projeto/Plano de Ação para execução do projeto	CGGP	01/09/20	29/10/20	R\$ 50.000,00	01/09/20	29/10/20	R\$ 10.800,00	100%	Concluído	Foi gasto com capacitação no exercício de 2020, o valor de R\$10.800,00, não estando previstos outros gastos com este PO.	
3	Análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP	Estudo e análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP, assim como normativos referenciais para auxiliar na definição de processos críticos de monitoramento - conforme regimento interno.	CGGP (Gestores e Técnicos)	01/02/21	31/03/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Data repactuada	
4	Seleção dos processos críticos para monitoramento - CGGP	Definir Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP/DIDAS/DICAD para monitoramento	CGGP (Gestores)	01/04/21	30/04/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Data repactuada	

5	Definir Ordem de estudos das subunidades da CGGP	Definir ordem de trabalho para definição de indicadores (CGGP, DICAD, DIDAS)	CGGP (Gestores)	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
6	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 1	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
7	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 1	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
8	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 1	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
9	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 1	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	01/05/21	30/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
10	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 1	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	01/06/21	11/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
11	Apresentação dos resultados - Subunidade 1	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	14/06/21	14/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
12	Ajustes e validação - Subunidade 1	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	15/06/21	30/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
13	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 2	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/07/21	30/07/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
14	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 2	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	02/08/21	13/08/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
15	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 2	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/08/21	17/08/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
16	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 2	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	18/08/21	10/09/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
17	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 2	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	13/09/21	30/09/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	

18	Apresentação dos resultados - Subunidade 2	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/10/21	01/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
19	Ajustes e validação - Subunidade 2	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	04/10/21	15/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
20	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 3	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	18/10/21	29/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
21	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 3	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/11/21	12/11/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
22	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 3	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/11/21	17/11/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
23	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 3	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	22/11/21	03/12/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
24	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 3	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	06/12/21	17/12/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
25	Apresentação dos resultados - Subunidade 3	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	20/12/21	20/12/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
26	Ajustes e validação - Subunidade 3	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	20/12/21	30/12/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Data repactuada	
				Valor Previsto:		R\$	50.000,00	Valor realizado:		R\$	10.800,00	8%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Projeto com início em 2020 e previsão de conclusão em 2021.

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II –

Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até dezembro/2020)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2020 - POSIÇÃO ATÉ 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2020 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E CANCELAMENTOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL f = (c - d)
AUTORIZAÇÃO DO MDR PARA EMPENHO					25.517.115,13		0,00	
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	8.778.506,00	36,7	-111.649,00	8.666.857,00	7.389.634,82	29,0	5.871.882,91	1.277.222,18
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO0000 - PTRES 174449	8.273.799,00	34,6	251.790,00	8.525.589,00	7.261.317,42	28,4	5.756.953,51	1.264.271,58
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO0001 - PTRES 174454	400.000,00	1,7	-362.312,00	37.688,00	37.688,00	0,1	37.688,00	0,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020 - PTRES 174450	104.707,00	0,4	-1.127,00	103.580,00	90.629,40	0,4	77.241,40	12.950,60
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	10.453.601,00	43,7	8.334.495,00	18.788.096,00	18.127.480,31	0,0	3.106.180,15	660.615,69
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0020	2.200.000,00	9,2	8.391.041,00	10.591.041,00	10.012.543,76	0,0	13.941,25	578.497,24
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0020 - PO 0000 - PTRES 174452	1.850.000,00		8.454.278,00	10.304.278,00	9.725.781,66		13.941,25	578.496,34
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0020 - PO 0001 - PTRES 174457	350.000,00		-63.237,00	286.763,00	286.762,10		0,00	0,90
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20QW.0020	4.500.000,00	18,8	-670.427,00	3.829.573,00	3.829.573,00	15,0	864.600,00	0,00
Elaboração Estudos e Planos de Desenvolvimento - 20WQ/0020 - PO 0004 - PTRES 174460	1.900.000,00		715.473,00	2.615.473,00	2.615.473,00		0,00	0,00
Fortalecimento das Políticas Desenvolvimento- 20WQ/0020 - PO 0005 - PTRES 174461	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Revitalização e Manutenção Sistema Nacional- 20WQ/0020 - PO 0006 - PTRES 174462	800.000,00		-800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0020 - PO 0007 - PTRES 174463	300.000,00		49.500,00	349.500,00	349.500,00		0,00	0,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos - 20WQ/0020 - PO 0008 - PTRES 174464	400.000,00		464.600,00	864.600,00	864.600,00		864.600,00	0,00
Apoio a Delimitação do Semiárido - 20WQ.0020 - PO 0009 - PTRES 174465	100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	1.000.000,00	4,2	2.367.482,00	3.367.482,00	3.315.791,55	0,0	1.258.066,90	51.690,45
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000 - PTRES 174453	600.000,00		2.767.482,00	3.367.482,00	3.315.791,55		1.258.066,90	51.690,45
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas no Estado de Alagoas - 214S/0027 - RP 6 - Rodrigo Cunha - PTRES 183633	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Manutenção de Contrato de Gestão com OS (Lei nº 9.637/1998) - 212H/0020	1.753.601,00	7,3	-1.753.601,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Promoção do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - 212H/0020 - PO 0001 - PTRES 174456	1.204.026,00		-1.204.026,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Construção de Portfolio e Plataforma de Tecnologia - 212H/0020 - PO 0002 - PTRES 174459	549.575,00		-549.575,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020	1.000.000,00	4,2	0,00	1.000.000,00	969.572,00	0,0	969.572,00	30.428,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0020 - PO 0000 - PTRES 174451	800.000,00		200.000,00	1.000.000,00	969.572,00		969.572,00	30.428,00
Estruturação e Gestão do Programa + Gestão Municipal - 8917/0020 - PO - 0001 - PTRES 174455	100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Acompanhamento e Fiscalização do + Gestão Municipal - 8917/0020 - PO 0002 - PTRES 174458	100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SUB-TOTAL	19.232.107,00	80,4	8.222.846,00	27.454.953,00	25.517.115,13	100,0	8.978.063,06	1.937.837,87
AUTORIZAÇÃO DO MDR PARA EMPENHO	0,00				4.700.227,00		0,00	
3) EMENDAS PARLAMENTARES (3) - 15.244.2217.7K66.0000	4.700.227,00	19,6	0,00	4.700.227,00	4.700.227,00		0,00	0,00
Apoio a Proj de Desenv Sustentável no RN - 7K66.0024 - RP 6 - Rafael Motta - PTRES 183628	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00
Apoio a Proj de Desenv Sustentável em Uruçuca/BA - 7K66.2328 - RP 6 - Abílio Santana - PTRES 183629	500.000,00		0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00
Apoio a Proj de Desenv Sustentável no RN - 7K66.0024 - RP 6 - Zenaide Maia - PTRES 183630	750.000,00		0,00	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00
Apoio a Proj de Desenv Sustentável na BA - 7K66.0029 - RP 6 - Raimundo Costa - PTRES 183631	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00
Apoio a Proj de Desenv Sustentável na BA - 7K66.0029 - RP 6 - Raimundo Costa - PTRES 183632	450.227,00		0,00	450.227,00	450.227,00		0,00	0,00
TOTAL	23.932.334,00	100,0	8.222.846,00	32.155.180,00	30.217.342,13	0,0	8.978.063,06	1.937.837,87

31/12/2020

PO = Plano Orçamentário

ANEXO III –

Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
2	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
5	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e reuso de águas cinzas domiciliares para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
6	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 447.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
8	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
9	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 0,00	0%	CGDS
10	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
11	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
12	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 0,00	-	CGEP
13	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	-	CGEP
14	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
17	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
18	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
19	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
20	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
21	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embucaça Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
22	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
23	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
24	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
25	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
26	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
27	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
28	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
29	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
30	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
31	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piacas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
32	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
33	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
Total do Objetivo 1.1								5.308.052.646,85	4.384.531.599,62	83%	
34	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
35	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene. - Processos SEI 59336.000658/2020-24 e 59336.000510/2020-90.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
36	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 358.800,00	R\$ 0,00	-	CGEP
37	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
38	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
39	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
40	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3								358.800,00	0,00	-	
41	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
42	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
43	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
44	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
Total do Objetivo 1.4								R\$ 864.600,00	R\$ 864.600,00	0%	
45	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
46	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.5								R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1								5.309.336.916,26	4.385.457.069,03	83%	
47	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.1								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
48	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.2								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
49	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
50	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	989.482,50	100%	
TOTAL DA DIRETRIZ 2								989.482,50	989.482,50	100%	
51	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC
52	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COIC
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
54	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
55	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
Total do Objetivo 3.1								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL DA DIRETRIZ 3								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL GERAL								5.310.401.398,76	4.386.466.766,04	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
								Cancelado			
								Paralisado			

ANEXO IV –

Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
2	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
3	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
4	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
5	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
6	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
7	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
8	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
9	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
10	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
11	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
12	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
14	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
15	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
		P 2217 - Ação 0355						5.296.265.479,68	4.380.950.009,90	83%	
16	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 20N7						343.585,70	343.585,70	100%	
17	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
18	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 8689						989.482,50	989.482,50	100%	
19	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
20	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 8917						1.030.441,41	1.030.441,41	100%	
21	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
22	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
23	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
24	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
25	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
26	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
		P 2217 - Ação 20WQ						5.895.038,75	2.583.032,02	44%	
27	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
28	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
29	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
		P 2217 - Ação 4640						1.414.777,57	0,00	0%	
30	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
31	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 447.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
32	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	0%	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
33	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 0,00	0%	CGEP
34	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	0%	CGEP
		P 2217 - Ação 8340						1.988.146,25	550.000,00	28%	
35	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
36	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 0,00	0%	CGDS
		P 2217 - Ação 214S						1.691.146,90	0,00	0%	
		total do Programa 2217						5.309.618.098,76	4.386.446.551,53	83%	
37	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
38	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
39	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPICE
40	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
41	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
		P 2111 - Ação 2000						75.000,00	20.214,51	27%	
		Total do Programa 2111						75.000,00	20.214,51	27%	
42	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
43	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
44	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
45	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
46	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
47	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
48	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
49	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
50	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene. - Processos SEI 59336.000658/2020-24 e 59336.000510/2020-90.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
51	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 358.800,00	R\$ 0,00	-	CGEP
52	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
53	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
54	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
55	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								708.300,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL								5.310.401.398,76	4.386.466.766,04	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020
Posição: Dezembro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO V –

Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	1	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
2	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
3	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Paralisado	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 447.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
12	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 0,00	0%	CGDS
TOTAL CGDS/DPLAN								6.466.445,77	2.913.509,61	45%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
14	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2020	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
TOTAL COCIC/DPLAN								0,00	0,00	-	
15	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
18	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
19	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
20	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
21	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
22	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	-	CGEP
23	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 0,00	-	CGEP
24	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	-	CGEP
25	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
26	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
27	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene. - Processos SEI 59336.000658/2020-24 e 59336.000510/2020-90.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
28	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos resultados obtidos e dos impactos econômicos e sociais decorrentes da fruição dos incentivos fiscais de redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis e de reinvestimento, na Área de Atuação da Sudene.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 358.800,00	R\$ 0,00	-	CGEP
29	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
30	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
31	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
32	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
TOTAL CGEP/DPLAN								4.045.395,56	985.003,17	24%	
33	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
34	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
35	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
TOTAL CGCP/DPLAN								3.549.077,75	1.598.028,85	45%	
TOTAL DPLAN								14.060.919,08	5.496.541,63	39%	
36	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
38	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
39	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
40	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
41	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
42	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
43	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
44	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
45	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
46	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
47	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
48	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
50	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
51	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
52	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF/DFIN								5.296.265.479,68	4.380.950.009,90	83%	
TOTAL DFIN								5.296.265.479,68	4.380.950.009,90	83%	
53	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPICE
TOTAL CPICE/DAD								0,00	0,00	0%	
54	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
55	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
TOTAL CGGP/DAD								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL DAD								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL GERAL								5.310.401.398,76	4.386.466.766,04	82,6%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 2º Ciclo 2020
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: Setembro/2020

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO VI –

Planos Operativos Prioritários

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2018

**Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
16 de maio de 2018**



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO	PO 4
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva		Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-as a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.			
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.			
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

Previsão de Conclusão:	29/01/2022	Proposta SICONV 052519/2018	Nível Siconv IV
Data Atualização:	31/12/2020	Pré Convênio nº 875549/2018	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
ABR/2019	106.536,26	500,00	107.036,26	Pago até o ano anterior	R\$ -
Diárias	1.062,00		1.062,00	A realizar no exercício	R\$ 199.399,80
FEV/2020	90.385,54		90.385,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Diárias	1.416,00		1.416,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
TOTAL	199.399,80	500,00	199.899,80	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Conveniente	Elisa Teshima

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV N° 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	
1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)
2	Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)

2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo estará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								2,0%	A Iniciar		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			50,0%	Atrasado	A Universidade iniciou varios processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de setembro de 2019 até o mês de abril de 2020 e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, conveniente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	Atrasado	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.	
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26				0,0%	Atrasado	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório	
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		
13	Etapa 1.2 _Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		
14	Meta 2 _ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		

15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019				0,0%	Atrasado		
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020				0,0%	Atrasado		
17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020				0,0%	Atrasado		
18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00			0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00	
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R\$ 90.385,54			0,0%	Atrasado		
20	Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020				0,0%	A Iniciar		
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00			0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R\$ 177,00	
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020				0,0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)							0,0%	A Iniciar		
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021				0,0%	A Iniciar		
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022			--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 199.399,80	Valor realizado:		R\$ 0,00	22%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Contatos: Profa Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 6.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).				
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.				
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ -	R\$ -

Previsão de Conclusão:	07/06/2021
Data Atualização:	31/12/2020

**Ata 304ª Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Mauro Póvoas Souto- CODEM/CGDS

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a atualização de um documento técnico da Emparn.	
2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	Concluído	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.	

2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	Concluído	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como encaminhamento a formalização da parceria.		
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
3.1	Parceria com a Emparn		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	-	Cancelado			
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/11/2019	--	10/09/2018	31/11/2019	--	100%	Concluído	Foi retomada a articulação com o IPA com o agendamento de reunião com a presença de gestores, pesquisadores e técnicos. Dela decorreram outros encontros até a apresentação de conteúdo. Assim, com a elaboração do conteúdo técnico pelos autores/pesquisadores do IPA e da UFRPE, com as sugestões da SUDENE, foi então editada a cartilha/livreto intitulado A Palma Forrageira no Nordeste do Brasil.		
3.3	Sudene			01/10/2019	10/11/2019		01/10/2019	10/11/2019		100%	Concluído	Edição de 1.000 cartilhas, distribuição a agricultores e técnicos. Foi realizado o lançamento do Livreto		
4	Relatório Técnico		--	03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	6%	Atrasado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	30%	Atrasado	Relatório Técnico descritivo em elaboração (a concluir). Obs.: O projeto/ação em seu objeto foi integralmente concluído, restando finalizar o relato do processo, que não avançou em razão de outras prioridades.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	86%	Em Andamento	

Parceiros institucionais:

(Emparn) IPA-PE.

Observações:

ATUALIZADO

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 6.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).				
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.				
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	30/03/2018
Data Atualização:	31/12/2020

**Ata 304ª Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Victor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por	
2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecologia del cultivo, manejo y usos de la palma" produzida pela	
2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial em Brasília/DF	
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil	
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%	
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de	

4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%	convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação.	
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralizada.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Embrapa; FAO.													
Observações:													
Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.													
ATUALIZADO - PROJETO PARALIZADO													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento(Fonte: Cadastro SIOP).		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa interação/ diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da qual a palma forrageira é integrante.		
Projeto:	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma		
Objetivo do projeto:	Propiciar o diálogo e o intercambio de informações entre os diversos interessados na palma forrageira, cultura de importancia fundamental no semiárido.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

**Ata 304, da Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	
Valor Empenhado no Exercício (1)	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/06/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS	Mauro Póvoas, Vera Assunção, Victor Uchoa (Coordenador)

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	PRÉ-EVENTO	PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Organização e preparação do evento	Realização de reuniões com equipe e coordenação, para definição de ações e responsáveis	CODEM/CGDS	14/10/2019	30/10/2019		14/10/2019	30/10/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Articulação e negociação para definição de data e local da Reunião Rede Palma	Contatos e tratativas com Embrapa Semiárido	CGDS	14/10/2019	14/11/2019		14/10/2019	14/11/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Definição da programação e participações na 3ª Reunião da Rede Palma	Elaboração da apresentação e participações da equipe; revisão de materiais de divulgação. Identificação dos convidados.Revisão do material; Envio dos convites.	CODEM/CGDS	14/10/2019	14/11/2019		14/10/2019	14/11/2019		100,0%	Concluído		
2	EVENTO	EXECUÇÃO (Peso 70%)								70%	Concluído		
2.1	Realização da 3ª Reunião de Articulação da Rede Palma	- Apresentação Sudene: Victor, Aildo, Mauro, Vera: contextualização, projeto coletânea, proposta de pesquisa da Epamig para pesquisa da palma forrageira no norte de minas, fomentada pela Sudene e balanço das ações da Rede.	CODEM/CGDS; CGEP/CGDS	20/11/2019	20/11/2019		20/11/2019	20/11/2019		100,0%	Concluído		
		- Lançamento da "Cartilha" da Palma e distribuição de cartilhas a agricultores da BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE,PI, visitantes do Semiárido Show.	CODEM/CGDS	24/11/2019	20/11/2019		20/11/2019	20/11/2019		100,0%	Concluído		
3	PÓS-EVENTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								10,0%	Concluído		
3.1	Elaboração de Relatório Final	Consolidação das informações, considerações do evento e registros fotográficos.		20/11/2019	30/06/2020		01/09/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído		
Valor Previsto:				R\$ 0,00			Valor realizado:	R\$ 0,00			100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Embrapa Semiárido, SDA-PE, IPA-PE, EMPAER-PB, SDA-CE

Observações:

Processo SEI n.º 59336.002145/2019-14 "Semiárido Show 2019".

A Rede Palma é uma iniciativa da Autarquia. Tem por objetivo fomentar o diálogo e a articulação entre instituições de desenvolvimento regional, universidades, pesquisadores e membros da iniciativa privada para analisar cenários, propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro. Desde sua criação em 2017, pode-se destacar entre as atividades associadas a Rede, o poio a projetos mediante utilização de recursos do OGU, a realização de eventos/encontros, a exemplo das reuniões técnicas de articulação, em sua 3ª edição, e produção de material de difusão do conhecimento, como a "cartilha" da palma, elaborada em parceria com instituições de ensino/pesquisa, IPA-PE, UFRPE. A 3ª Reunião de Articulação da Rede Palma, de que trata o presente projeto, foi realizada em Petrolina, no dia 20/11/2019, em meio a programação da maior feira da agricultura familiar "Semiárido Show" 2019, uma organização e realização da Embrapa Semiárido, apoiada por diversas instituições, entre elas a SUDENE, e empresas.

PROJETO 100% CONCLUÍDO. EXCLUIR.

Fonte: CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.4 (ex PO 6.1)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	
Ação:	DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO (8340) - REDE PALMA		Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.			
Projeto:	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.			
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
	280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00	mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
							R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
										Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/12/2021	CONVÊNIO Nº 878402/2018
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência: 27/12/2018 a 25/12/2021

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Atrasado		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	--	--	--	0%	Atrasado	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	
8	Liberação 1ª parcela (única)	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	R\$ 255.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação da 1ª parcela dos recursos, depende/está condicionada, a realização do processo licitatório pela conveniente e o aceite pela concedente.	
9	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	Atrasado		
9.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	A Iniciar		

10.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	Atrasado		
10.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	Atrasado		
11.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.1	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13	Desenvolvimento da palma torrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico	Desenvolvimento da palma torrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	Atrasado		
14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/24/2022	24/04/2022	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 255.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Observações:

ATUALIZADO.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.5 (ex po 6.2)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2019
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340)		Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.			
Projeto:	Implantação de dois campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochinilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.			
Objetivo do projeto:	Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochinilha do carmim, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido.distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 206.730,00	R\$ 207.730,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO Nº 892981/2019
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 206.730,00
	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	--	--	--	0%	Atrasado	A Conveniente atendeu a todas as condições Cláusulas Suspensiva e está iniciando os procedimentos licitatórios.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e o aceite pela concedente. Assim, faz-se necessária a revisão/adequação a nova previsão de realização do processo licitatório.	
9	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84	--	--	--	0%	A Iniciar		

12	Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Eventos de Transferência e Difusão deTecnoloia	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/03/2023	01/05/2023	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 206.730,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												
ATUALIZADO												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 6.6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da coconilha-do-carmim.		
Projeto:	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a coconilha-do-carmim no RN.		
Objetivo do projeto:	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da coconilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	UDENE no Projeto (R\$)	Total do Projeto (R\$)
Dados Orçamentários	250532030	3: 4	30	R\$ 199.412,43	R\$ 199.612,04

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903995/2020
Data Atualização:	31/12/2020	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Juliana Borges; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN

Cronograma de Desemboço				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
fev/21	R\$ 100.000,00	R\$ 199.61	R\$ 100.199,61	Pago até o ano anterior	R\$ -
set/21	99.412,43		R\$ 99.412,43	A realizar no exercício RAP	R\$ 199.412,43
total			R\$ 199.612,04	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODM/CGDS/SUD ENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2		Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	Concluído	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDE NE			-	11/12/2020	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,00%	A Iniciar		
6	Realização de proc. Licitatório	serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021		--	--	--	0%	A Iniciar		
7	Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 199,61	--	--	--	0%	A Iniciar		
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Visita técnica de acompanhamento	palma forrageira voltados aos extensionistas,	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 9.441,80	--	--	--	0%	A Iniciar		
		aos produtores selecionados pelas entidades	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 8.202,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Relatório de Execução referente a 1ª parcela	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11		Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Liberação 2ª parcela	E condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43							
13	mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com	irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de 2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 150.827,07	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita técnica de acompanhamento		SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 31.141,17							
15	Relatório de Execução referente a 2ª parcela	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16		Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica	SAPE/RN - CODM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		

17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-		-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 199.612,04	Valor realizado:	R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC												
Observações:												

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2020



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 6.7
Objetivo estratégico:		1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos		Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.				
Projeto:	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carimim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.				
Objetivo do projeto:	Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jaíba, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	144000000 / 0250532030	4	30	R\$ 200.000,00	R\$ 201.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903996/2020
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência até: 31/12/2023

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Juliana Borges; Coordenação: Victor Uchôa; EPAMIG/MG

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/21	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 201.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 200.000,00
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	Concluído	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COIC/SUDENE			-	11/12/0200	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 5/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,00%	A Iniciar		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
8	Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 1.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaíba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas;	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 102.957,48	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Meta 2 - Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratamentos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 39.119,12	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 30.918,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 28.004,90	--	--	--	0%	A Iniciar		

14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 201.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 6.8
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da coconilha-do-carmim.		
Projeto:	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a coconilha-do-carmim no RN.		
Objetivo do projeto:	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da coconilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	SUDENE no Projeto (R\$)	Total do Projeto (R\$)
	250532030	3; 4	30	R\$ 199.412,43	R\$ 199.612,04

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903995/2020
Data Atualização:	31/12/2020	Vigência até: 31/12/2023

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Juliana Borges; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
fev/21	R\$ 100.000,00	R\$ 199,61	R\$ 100.199,61	A realizar no exercício RAP	R\$ 199.412,43
set/21	99.412,43		R\$ 99.412,43	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
total			R\$ 199.612,04	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE			-	10/09/2020	11/12/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE			-	11/12/2020	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,00%	A Iniciar		
6	Realização de proc. Licitatório	serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
7	Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 199,61	--	--	--	0%	A Iniciar		
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	meta 1 - capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores. Visita técnica de acompanhamento	palma forrageira voltados aos extensionistas, aos produtores selecionados pelas entidades	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 9.441,80	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Relatório de Execução referente a 1ª parcela	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Liberação 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à coconilha do carmim por ano, com visita técnica de acompanhamento	E condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43							
13		irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 150.827,07	--	--	--	0%	A Iniciar		
14		2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a coconilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 31.141,17							
15		Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Relatório de Execução referente a 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		

17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-		-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 199.612,04	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:												
SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC												
Observações:												

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 8
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	
Objetivo da ação:	Construção de um programa para desenvolver competências estratégicas, técnicas, administrativas e comportamentais para gestores e servidores públicos municipais visando a melhoria do desempenho e a entrega de resultados aos cidadãos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Lyra
Problema (causa):	Estruturação de um programa para atender a fragilidade das capacidades técnico-gerenciais da gestão municipal na área de atuação da Sudene.		
Projeto:	Projeto: Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"		
Objetivo do projeto:	Elaboração de proposta de reformulação do +Gestão Municipal a partir da PNDR (Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas), do PRDNE e do Programa Fortalecimento das Administrações Locais		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/09/2021
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Amauri, Vera Lúcia Assunção, Juliana Boges. Coord. CODEM/CGDS: Victor Uchôa Silva.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 20%)					00/01/00			20%	Concluído		
1	Planejamento Interno - CODEM	Realização de reuniões internas de planejamento, para detalhamento do projeto. Produto: Elaboração do TAP	Equipe Codem	01/11/2019	24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	Concluído		
2	Identificação de parcerias	Levantamento dos potenciais parceiros com vistas ao apoio na prestação de serviços especializados, de consultoria e assessoramento, para reformulação/elaboração do Programa de Melhoria da Gestão Municipal "+ Gestão Municipal" e promoção do desenvolvimento regional, territorial e local sustentável	Equipe Codem		24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 70%)								32%	Atrasado		
5	Articulação e definição da parceria	Realização de reuniões técnicas com os potenciais parceiros e definição do parceiro.	Equipe Codem	27/04/2020	14/05/2020		27/04/2020	19/05/2020		100%	Concluído		
6	Tratativas para formação da parceria	Articulação com parceiro escolhido, e realização dos procedimentos administrativos para a parceria.	Equipe Codem e Coordenadores	15/05/2020	29/05/2020		15/05/2020	29/09/2020		100%	Concluído		
6.1	Formalização de contratação do instrutor	Contratação via GECC do profissional para construção da proposta de programa	CODM/CGGP/ Parceiro Externo	23/06/2020	15/04/2021		23/06/2020			45%	Em Andamento		

7	Elaboração do Escopo e Conteúdo do projeto (planejamento metodológico)	Reuniões técnicas para elaboração de escopo e conteúdo. Produto: Elaboração do CANVAS do projeto	Equipe Codem e Parceiro Externo	01/06/2020	15/04/2021		01/06/2020			70%	Em Andamento	Foi realizada reunião para apresentação da proposta do curso para técnicos da DPLAN e CGGI em 23/9/20, como também foi elaborada a primeira versão do Canvas do projeto.	Por conta de demandas diversas, a execução desta Meta será concluída no período 2020-2021. A proposta está sendo adaptadas às necessidades da IN.
8	Construção da proposta de Reformulação + Gestão Municipal ;	Desenvolvimento das atividades com especialistas e consultores, elaboração da proposta de reformulação do Programa + Gestão Municipal	Equipe Codem e Parceiro Externo	03/05/2020	16/08/2021					0%	A Iniciar		
9	Apresentação da proposta com os atores sobre a reformulação do programa;	Consulta com instituições e gestores da DPLAN	Equipe Codem e Coordenadores	23/08/2021	10/09/2021					0%	A Iniciar		
10	Revisão da Proposta	Ajustes finais para incorporação das sugestões após as apresentações e validação com os atores. Produto: Minuta de Portaria	Equipe Codem	13/09/2021	23/09/2021					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										0%	A Iniciar		
11	Formatação da proposta de Reformulação do + Gestão Municipal Versão Final.	Envio à apreciação e aprovação da Proposta via Portaria do Programa +Gestão Municipal;	CGDS	25/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	51,5%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Capacitação para formulação do Programa +GM realizada pela docente Brunna Carvalho (via GECC).

Observações:

Trata-se da revisão e (re)formulação do Programa + Gestão Municipal, iniciado em 2018, considerando-se a PNDR, o PFCG, o PRDNE e o foco na Melhoria da Gestão Pública Municipal e o apoio ao desenvolvimento regional, territorial e local sustentáveis.

Processo: nº 59336.000751/2020-39

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 9.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social	
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Economica.				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental				
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018				
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraubas/RN.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

**Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018**

Previsão de Conclusão:	31/12/2023
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS, Coordenação: Victor Uchôa
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraubas/RN

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)								13%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraubas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraubas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	Não informado		100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraubas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019	21/08/2020		100,0%	Concluído	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapas previstas nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019		31/08/2020	19/10/2020		100,0%	Concluído	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	

1.5	Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	01/10/2020	30/11/2020		29/10/2020			50,0%	Em Andamento	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Conveniente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020. Todas as datas do cronograma físico e de desembolso serão ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022, conforme solicitação de ajuste de PT apresentado pelo conveniente na Plataforma + Brasil.	
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Caraúbas	26/07/2019	09/08/2019	R\$ 20.000,00				0,0%	Atrasado	Parcela prevista para janeiro.	
1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	16/08/2019	30/08/2019	R\$ 99.673,80				0,0%	Atrasado	Termo aditivo de convênio prevê visita técnica para liberação de 2ª parcela.	
2	Execução (Peso 60%)									0%	Atrasado		
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	Atrasado	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO.	
2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2019	28/02/2019					0,0%	Atrasado	Será realizado ajuste do cronograma físico, conforme etapa 1.5 desse PO.	
1.7	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A definir	A definir					0,0%	Atrasado	Termo de convênio prevê visita técnica para liberação de 1ª parcela. Contudo, diante do contexto de restrição de viagens por motivo da pandemia e pela natureza do convênio não se tratar de obra, esta etapa deverá ser adiada.	
2.3	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	Atrasado	Será definido após ajuste de PT, conforme etapa 1.5 desse PO.	
2.4	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2019	30/09/2019	R\$ 444.472,52				0,0%	Atrasado		
2.5	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A definir	A definir					0,0%	Atrasado		
2.6	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/03/2019	30/12/2019					0,0%	Atrasado		
2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2019	29/02/2020					0,0%	Atrasado		
2.8	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/05/2020	31/05/2020					0,0%	Atrasado		
2.10	Liberação da 3ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 3ª parcela	CGDS/ COCF	01/01/2020	31/01/2020	R\$ 3.223,00				0,0%	Atrasado		
2.11	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/02/2020	29/02/2020					0,0%	Atrasado		
3	Encerramento (peso 20%)									0%	Atrasado		
3.1	3ª Prestação de contas parciais	Envio e análise dos relatórios de execução	Caraúbas/ CGDS	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	Atrasado		
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	20/09/2020	20/11/2020					0,0%	Atrasado		
3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/12/2020	20/06/2021					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	20/06/2021	20/09/2021					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 567.369,32	Valor realizado:		R\$ 0,00	13%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Prefeituras de Caraúbas
Observações:
Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020. 2º Termo de convênio prorroga para 31/12/2020. Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 9.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social	
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental				
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO				
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Bioágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 326.467,00	R\$ 326.467,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	31/12/2020

**Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 302.767,00
A realizar no exercício	R\$ 23.700,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 36.750,00
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 36.750,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 36.750,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 339.517,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Juliana Borges, Mauro Póvoas
	EMBRAPA SEMIÁRIDO:	Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Valor	Realizado		Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim		Início	Fim				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)							20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018	100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018	100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018	100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / EMBRAPA	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018	100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019	100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)							36%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 90.000,00	07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído	
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018	R\$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019	100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	

2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 20.275,00	13/02/2019		R\$ 1.200,00	70,0%	Em Andamento	Etapa referente à preparação do material para publicação ainda será realizada.	
2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.410,00	13/02/2019		R\$ 19.410,00	20,0%	Em Andamento		
2.5	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 4.973,00	01/09/2020			30,0%	Em Andamento	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20.	
2.6	Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/06/2021	R\$ 188.081,86	13/02/2019		R\$ 62.190,00	60,0%	Em Andamento	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação.	
2.7	Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar. Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.000,00	01/10/2019	22/11/2019	R\$ 7.200,00	50,0%	Em Andamento	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. As outras atividades da meta, como os cursos, ainda serão realizadas.	
2.8	Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	30/06/2021	R\$ 33.139,14				0,0%	A Iniciar	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução foi atualizado para nova vigência do projeto.	
2.9	Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 1.196,00				0,0%	A Iniciar	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução foi atualizado para nova vigência do projeto.	
2.10	Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	30/06/2021	R\$ 31.592,00				0,0%	A Iniciar		
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100,0%	Concluído		

2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00	05/06/2019	21/06/2019	R\$ 212.767,00	100,0%	Concluído	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R\$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED.
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020		100,0%	Concluído	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.
2.14	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00	14/03/2020	09/09/2020	R\$ 36.750,00	100,0%	Concluído	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R\$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.
2.15	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 326.467,00	Valor realizado:		R\$ 339.517,00	56%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros Institucionais:													
Embrapa Semiárido													
Observações:													
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido													
O projeto foi apresentado no 1º Webinar de Reúso de Água da Sudene promovido pela Codem/CGDS em 9/6/2020. O projeto foi prorrogado para 30/06/2021, conforme 2º Termo Aditivo assinado em 21/08/2020.													
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)													

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	9.3
Objetivo estratégico:	1.1. Fortalecer as Administrações Públicas			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social		
Finalidade da ação:	Difusão do conhecimento, por meio da colaboração interinstitucional, propiciando divulgação de ações da Sudene. Visa articular diferentes atores baseando-se na informação, inovação e conhecimento com o foco de fortalecer as administrações públicas municipais				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Arraripe Bezerra de Menezes Lyra		
Problema (causa):	A fragilidade das capacidades tecnico-gerenciais da gestão municipal na área de atuação da Sudene.				
Projeto:	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)				
Objetivo do projeto:	Contribuir com a construção de uma política pública de reuso de águas em articulação e integração com outras tecnologias e políticas intersetoriais.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

**Ata 304, da Diretoria
Colegiada 2018**

Previsão de Conclusão:	30/09/21
Data Atualização:	31/12/20

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS/SUDENE:	Juliana Borges, José Farias, Mauro Povoas, Amauri Nascimento, Vera Lúcia Assunção - CODEM/CGDS
	Coordenação	Víctor Uchôa

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	PLANEJAMENTO (Peso 20%)											
1.1	Planejamento do Projeto / Meta Institucional	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, metodologia, definição dos eventos, focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	14/01/2021	14/05/2021					3%	Concluído	
1.2	Definição de modus operandi e Plataforma para realização dos eventos On line	Definição junto com Ascom e CGTI de ferramenta para realização dos eventos on line que permita participação do público e gravação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	22/02/2021	26/02/2021					0%	A Iniciar	Marcar reuniões técnicas (na semana de 22 a 26/02/2021) com a participação da Ascom e CGTI.
1.3	Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta.	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	22/04/2021	14/05/2021					0%	A Iniciar	
1.4	Plano de Divulgação do Projeto: incluindo os quatro eventos.	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	22/04/2021	14/05/2021					0%	A Iniciar	
2	Realização dos eventos (PESO 60%)											
2.1	Evento On Line 1	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	15/04/2021	08/06/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: Programa + GM (apresentação como fio condutor da série de webinars linkados aos temas de trabalho da CODEM)
2.2	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	15/04/2021	17/05/2021					0%	A Iniciar	
2.3	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	15/04/2021	24/05/2021					0%	A Iniciar	Quem serão os palestrantes e de que instituições?
2.4	Divulgação dos eventos via redes sociais.	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	15/04/2021	03/06/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.
2.5	Preparação de materiais para apresentação.	Apresentações serão elaboradas pela CODEM/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	15/04/2021	03/06/2021					0%	A Iniciar	
2.6	Realização do 1º evento on line.	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	18/05/2021	08/06/2021					0%	A Iniciar	1º evento realizado em ____.
2.7	Evento On Line 2	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	09/06/2021	22/07/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: Saúde Digital e + GM
2.8	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar	
2.9	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	09/06/2021	25/06/2021					0%	A Iniciar	NUTES convidado como palestrante.
2.10	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/07/2021	09/07/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.

2.11	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/07/2021	09/07/2021					0%	A Iniciar	
2.12	Realização do 2º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	12/07/2021	15/07/2021					0%	A Iniciar	2º evento realizado em ____.
2.13	Evento On Line 3	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	16/07/2021	24/08/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: +GM e Reúso e/ou Economia Circular..
2.14	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021					0%	A Iniciar	
2.15	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021					0%	A Iniciar	
2.16	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	13/08/2021	17/08/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.
2.17	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	13/08/2021	17/08/2021					0%	A Iniciar	
2.18	Realização do 3º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	23/08/2021	24/08/2021					0%	A Iniciar	3º evento realizado em ____.
2.19	Evento On Line 4	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	26/08/2021	16/09/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: GM e Palma e/ou TIC
2.20	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar	
2.21	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar	
2.22	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/09/2021	09/09/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.
2.23	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/09/2021	09/09/2021					0%	A Iniciar	
2.24	Realização do 4º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/09/2021	16/09/2021					0%	A Iniciar	4º evento realizado em ____.
3 Relatório Técnico e Publicação (Peso 20%)										0%	A Iniciar	
3.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 3 eventos.	A meta institucional do ciclo 2019/2020 será concluída com um relatório que contemple os três eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	20/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar	O relatório descritivo contextualiza o projeto, descreve as etapas, contém os links de acesso aos webinars, bem como todas as informações dos eventos.
Valor Previsto: R\$ 0,00 Valor realizado: R\$ 0,00										3%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

NUTES/UFPE...												
Observações:												
https://docs.google.com/document/d/163CW-CuSDNXN6y5XF28GZ-ir5VieNgYMk_PAQL3QRU/edit - link da tempestade de ideias realizada na reunião dia 14/01/2021.												
Essa meta conta com a colaboração de Amauri Nascimento, servidor da Codem/CGDS.												
O processo n.º 59336.000749/2020-15 reflete toda a execução da meta do ano de 2020, incluindo o relatório descritivo que contextualiza o projeto, descreve as etapas, como também os links de acesso aos webinars.												
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2017

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial			Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.				
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana				
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (1)			Valores Orçamentários/ Financeiros	
						SUDENE	Feira de Santana	TOTAL		
	280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21				Pago até o ano anterior	R\$ 354.691,11
									A realizar no exercício	R\$ 354.691,11
						R\$ 709.382,21	R\$ 0,00	R\$ 709.382,21	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
									Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
									Valor liberado no Exercício	R\$ -
									Saldo a liberar	R\$ -
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ 354.691,11

Previsão de Conclusão:	31/08/2019
Data Atualização:	31/12/2020

**Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno, que são Conceição Jaculpe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jaculpe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído		

3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceria com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contratação de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividades do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao Produto 1: Plano de Trabalho	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto 1 havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais. Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.

13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas.Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			0%	Paralisado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município. A Sudene solicitou ajustes no produto IV, apresentado pela consultoria Ernst Young, no entanto, a consultoria não os atendeu. Isto posto, a equipe técnica da Sudene não aprovou o produto IV. Devido ao não atendimento do plano de trabalho pela contratada, a Sudene não aprovou o produto IV e não autorizou a prorrogação do contrato, cuja vigência se encerrou em 30 de outubro de 2019. O PNUD já foi comunicado e está providenciando a rescisão do contrato. Rescisão ainda não foi realizada. Nova contratação só poderá ser realizada após rescisão do atual contrato.	Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.
14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019			0%	Paralisado	A conclusão da elaboração do Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana se dará por meio da contratação de nova consultoria.	Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22				0%	A Iniciar		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	03/08/2019	15/08/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019					0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 354.691,11	71%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações: Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.

(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**

(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2020**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	3.1
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A			Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A			Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A				
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento			Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda
Problema (causa):	N/A				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil				
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	31/12/2020

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17	01/10/17	-	100%	Concluído		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/19	R\$ -	01/11/17		-	85%	Paralisado		
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	100%	Concluído		
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/19	R\$ -	01/10/17		-	85%	Paralisado		
Valor Previsto:						R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	96%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
APEX-BR

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Emendas 3º ciclo 2020																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2016	1	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.692,18	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	02/12/19	Concluído
2016	2	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 267.794,30	R\$ 249.269,14	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	20/05/19	Concluído
2016	3	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.321,90	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	27/08/19	Atrasado
2016	4	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 262.868,86	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2016	5	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 514.509,40	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2016	6	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 259.000,00	R\$ 259.971,60	R\$ 259.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	27/07/20	Concluído
2016	7	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 523.012,50	52%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2016	8	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.957,85	R\$ 926.955,29	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2016	9	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 611.924,74	R\$ 559.952,79	93%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/10/22	Em Andamento
2016	10	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	19/02/20	Atrasado
2016	11	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 503.901,97	R\$ 250.000,00	50%	Concluído	Concluído	Atrasado	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2016	12	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 526.970,57	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	06/09/19	Atrasado
2017	13	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	1	1.1	2217	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2017	14	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	1	1.1	2217	214S	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	25/05/22	Em Andamento
2017	15	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2217	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/21	Em Andamento
2017	16	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2217	214S	R\$ 385.000,00	R\$ 436.300,00	R\$ 186.190,69	48%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2017	17	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2217	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Atrasado	Atrasado	23/12/20	Atrasado
2017	18	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	19/04/21	Em Andamento
		Pavimentação de diversas ruas no Município de																		

Emendas 3º ciclo 2020																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2018	53	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.755.787,09	R\$ 1.773.344,96	R\$ 841.262,37	48%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/09/22	Em Andamento	
2018	54	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/09/22	Em Andamento	
2018	55	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	56	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 451.239,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento	
2018	57	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	58	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 490.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	59	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	R\$ 250.000,00	25%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	60	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.607,22	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	61	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Concluído	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento	
2018	62	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.743,89	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	63	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	64	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	65	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2217	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,48	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento	
2018	66	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2217	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 258.523,52	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	25/05/23	Em Andamento	
2018	67	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	BA	1	1.1	2217	2145	R\$ 802.936,73	R\$ 811.047,20	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	68	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2217	2145	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 210.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	

[illegible]

Emendas 3º ciclo 2020																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orcamentários					Status								
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2018	83	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2217	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 256.187,08	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento	
2018	84	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	85	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	86	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.502.000,00	R\$ 1.187.711,25	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	87	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/03/23	Em Andamento	
2018	88	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.060.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/10/22	Em Andamento	
2018	89	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,22	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/09/22	Em Andamento	
2018	90	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.636,67	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/10/22	Em Andamento	
2018	91	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 300.400,00	R\$ 180.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/05/22	Em Andamento	
2018	92	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	93	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/22	Em Andamento	
2018	94	Aquisição de caminhão tratorado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraúbas/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 332.853,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	95	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	17/08/21	Em Andamento	
2018	96	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2217	8902	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento	
2018	97	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	98	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.065.661,71	R\$ 2.810.590,05	94%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	

[illegible]

Emendas 3º ciclo 2020																				
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2019	113	do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66		R\$ 1.707.445,09	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	114	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 607.328,74	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	115	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	06/12/23	Em Andamento
2019	116	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.863,57	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	05/12/22	Em Andamento
2019	117	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 52.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	22/07/23	Em Andamento
2019	118	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	04/02/24	Em Andamento
2019	119	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,45	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	22/02/23	Em Andamento
2019	120	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 311.465,97	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2019	121	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	14/12/22	Em Andamento
2019	122	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 2.410.387,00	R\$ 2.855.543,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	123	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.143.083,07	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	21/01/24	Em Andamento
2019	124	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.999,99	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	11/02/23	Em Andamento
2019	125	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,36	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	126	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Açúcar das Bicas no	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.756,73	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento

Emendas 3º ciclo 2020																								
Dados do Projeto			SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status													
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE		Valor Total		Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Inicição		Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	
																1ª	2ª	3ª	4ª					
		Comunidade Rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.																						
2019	127	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.040.000,00	R\$	681.404,45	68%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/23	Em Andamento
2019	128	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.015.646,71	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/24	Em Andamento
2019	129	Construção do Mercado Público Municipal - Ipananguçu/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$	250.000,00	R\$	259.999,21	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		18/12/23	Em Andamento
2019	130	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.027.825,85	R\$	820.183,29	82%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/24	Em Andamento
2019	131	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	2.000.000,00	R\$	2.216.519,98	R\$	400.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		23/01/24	Em Andamento
2019	132	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.005.000,00	R\$	400.001,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/23	Em Andamento
2019	133	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$	300.000,00	R\$	310.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		23/01/23	Em Andamento
2019	134	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	600.000,00	R\$	602.867,51	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		22/02/24	Em Andamento
2019	135	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	700.000,00	R\$	770.735,13	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		22/02/24	Em Andamento
2019	136	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$	300.000,00	R\$	310.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		23/02/24	Em Andamento
2019	137	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	1.000.000,00	R\$	1.010.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/24	Em Andamento
2019	138	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$	350.000,00	R\$	378.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		21/02/24	Em Andamento
2019	139	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	1	1.1	2217	7K66	R\$	800.000,00	R\$	801.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/02/24	Em Andamento
2020	140	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$	500.000,00	R\$	500.500,50	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		24/09/24	Em Andamento
2020	141	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$	250.000,00	R\$	259.039,60	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		23/09/24	Em Andamento
2020	142	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$	150.000,00	R\$	152.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		22/09/23	Em Andamento
		Construção de Cais e Pavimentação com																						

Emendas 3º ciclo 2020																				
Dados do Projeto			SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status									
Ano	Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª	2ª	3ª	4ª				
2020	143	Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/23	Em Andamento
2020	144	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/23	Em Andamento
2020	145	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	146	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,05	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	147	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 266.402,82	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	148	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2020	149	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/04/23	Em Andamento
2020	150	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 350.167,88	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/25	Em Andamento
2020	151	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$	- 0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/25	Em Andamento
TOTAL							R\$ 91.535.279,52	R\$ 95.331.181,00	R\$ 44.672.361,41											

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
	Não se Aplica

ANEXO VII –

Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
2	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academi a.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	6.4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	6.5	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	6.6	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
7	6.7	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
8	6.8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
9	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS
10	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS
11	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
12	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CCCP
13	1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
15	3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
16	4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
17	5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
18	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
19	7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
20	8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
21	9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
22	10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
23	11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
24	12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
25	13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
26	14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
27	15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
28	16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	CGDS
29	17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
30	18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
31	19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
32	20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	CGDS
33	21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	90%	CGDS
34	22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
35	23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
36	24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
37	25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
38	26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
39	27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Carauabas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
40	28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IACU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	CGDS
41	29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	CGDS
42	30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
43	31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	CGDS
44	32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
45	33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	CGDS
46	34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
47	35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
48	36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	CGDS
49	37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
50	38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
52	40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
53	41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
54	42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
55	43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	CGDS
56	44		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A FRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
57	45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucuá	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
58	46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS
59	47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	CGDS
60	48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	CGDS
61	49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
62	50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADELFA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	CGDS
63	51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
64	52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
65	53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	CGDS
66	54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
67	55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
68	56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
69	57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS
70	58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	CGDS
71	59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	CGDS
72	60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS
73	61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	CGDS
74	62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
76	64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
78	66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
81	69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
82	70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
83	71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS
84	72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	CGDS
85	73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
86	74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
88	76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	CGDS
89	77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	CGDS
90	78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	CGDS
91	79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	CGDS
92	80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
93	81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
94	82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
96	84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.001,00	20%	CGDS
98	86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.187.711,25	79%	CGDS
99	87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
100	88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS
102	90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	CGDS
104	92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
105	93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Caraubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS
106	94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
107	95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
108	96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocan – LOTE 02.zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	CGDS
110	98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	CGDS
111	99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
112	100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
113	101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
114	102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
115	103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
116	104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
118	106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
119	107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
120	108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
121	109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	CGDS
122	110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
123	111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
124	112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
125	113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
126	114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
127	115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
128	116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
129	117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	CGDS
130	118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	CGDS
131	119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
132	120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
133	121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	CGDS
134	122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
135	123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
136	124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
137	125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
138	126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
139	127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	CGDS
140	128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
141	129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
142	130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	CGDS
143	131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	20%	CGDS
144	132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	CGDS
145	133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
146	134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
147	135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
148	136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
149	137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
150	138	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
151	139	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
152	140	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuba/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
153	141	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
154	142	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
155	143	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
156	144	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
157	145	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha. Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
158	146	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
159	147	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
160	148	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
161	149	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
162	150	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
163	151	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00		CGDS
Total do Objetivo 1.1									94.066.625,60	45.366.570,32	48%	
164	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
Total do Objetivo 1.2									199.399,80	0,00	0%	
165	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3									0,00	0,00	0%	
166	8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "4ª Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total do Objetivo 1.5									R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DA DIRETRIZ 1									94.266.025,40	45.366.570,32	48%	
TOTAL GERAL									94.266.025,40	45.366.570,32	48,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020

ANEXO VIII –

Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
Total da Ação 20WQ									709.382,21	354.691,10	0%	
2	1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
3	2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	CGDS
4	3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
5	4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
6	5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
7	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	CGDS
8	7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	CGDS
9	8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	CGDS
10	9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	CGDS
11	10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
12	11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	CGDS
13	12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
15	24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	CGDS
16	25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
17	26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
18	27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Tração 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ Município de Carauabas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
19	29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	CGDS
20	30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
21	31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	CGDS
22	32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
23	36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	CGDS
24	37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
25	38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	CGDS
26	39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Bom Jesus	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	CGDS
27	43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	44		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
29	45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucuá	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
30	46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS
31	50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	CGDS
32	51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
33	52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
34	53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	CGDS
35	54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
36	55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TANHAU BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
37	56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
38	57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS
39	58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	CGDS
40	59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	CGDS
41	60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
42	61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	CGDS
43	62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
44	63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
45	64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
46	70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
47	71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS
48	72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	CGDS
49	73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
50	74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
51	75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
52	76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	CGDS
53	77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	CGDS
54	78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	CGDS
55	79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
56	80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	CGDS
57	81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	CGDS
58	82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
59	84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
60	85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.001,00	20%	CGDS
61	86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.187.711,25	79%	CGDS
62	87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	CGDS
63	88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
64	89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	CGDS
65	90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
66	91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	CGDS
67	92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
68	93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
69	94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
70	95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos-Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
71	97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02.zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	CGDS
72	98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	CGDS
73	99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
74	100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
75	101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
76	102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
77	103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
78	104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
79	105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
80	106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
81	107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
82	108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
83	109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	CGDS
84	110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
85	111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
86	112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
87	113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
88	114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
89	115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
90	116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
91	117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	CGDS
92	118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	CGDS
93	119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
94	120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
95	121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	CGDS
96	122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
98	124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
99	125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
100	126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
101	127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	CGDS
102	128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
103	129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
104	130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	CGDS
105	131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	20%	CGDS
106	132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	CGDS
107	133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
108	134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
109	135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
110	136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
112	138	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUG),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
113	139	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
114	140	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçua/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
115	141	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
116	142	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
117	143	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA, (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
118	144	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
119	145	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
120	146	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		CGDS
121	147	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		CGDS
122	148	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00		CGDS
123	149	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		CGDS
124	150	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00		CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
125	151	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00		CGDS
Total da Ação 7k66									73.603.361,26	30.617.024,53	42%	
126	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
127	13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	CGDS
128	14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	CGDS
129	15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
130	16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	CGDS
131	17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
132	19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	CGDS
133	20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	CGDS
134	21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	90%	CGDS
135	22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	CGDS
136	23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	CGDS
137	28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	CGDS
138	33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre caxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
139	34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	CGDS
140	35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	CGDS
141	40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	CGDS
142	41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	CGDS
143	42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
144	47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADOS E LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	CGDS
145	48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADO E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	CGDS
146	49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
147	65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	CGDS
148	66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
149	67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	CGDS
150	68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	CGDS
151	69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	CGDS
152	83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	CGDS
Total da Ação 214S									17.197.491,53	14.055.337,69	82%	

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
153	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
154	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
155	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
156	6.4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
157	6.5	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
158	6.6	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
159	6.7	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
160	6.8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
161	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total da Ação 8340									1.061.954,08	0,00	0%	
162	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS
163	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS
164	96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
Total da Ação 8902									1.693.836,32	339.517,00	20%	

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
165	8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
			Total da Ação 8917						0,00	0,00		
			TOTAL DO PROGRAMA 2217						94.266.025,40	45.366.570,32	48%	
166	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
			Total das Ações Internas/ Não se aplicam						0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									94.266.025,40	45.366.570,32	48,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020

ANEXO IX –

Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
2	6.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	6.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	6.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização do evento: 3ª Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	6.4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	6.5	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	6.6	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
8	6.7	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
9	6.8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO - REDE PALMA	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
10	8	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
11	9.1	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS
12	9.2	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	9.3	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
TOTAL CGDS									1.955.790,40	339.517,00	17%	
16	1	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
17	2	2016	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 249.269,14	100%	COIC
18	3	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
19	4	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
20	5	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COIC
21	6	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 259.000,00	R\$ 259.000,00	100%	COIC
22	7	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	COIC
23	8	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COIC
24	9	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COIC
25	10	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
26	11	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COGIC
27	12	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC
28	13	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COGIC
29	14	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COGIC
30	15	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC
31	16	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	COGIC
32	17	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC
33	18	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COGIC
34	19	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COGIC
35	20	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COGIC
36	21	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	90%	COGIC
37	22	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COGIC
38	23	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
39	24	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de uma perfuratriz. - Município de Jandaíra 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	100%	COGIC
40	25	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um compressor para perfuratriz. - Município de Jandaíra 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COGIC
41	26	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COGIC
42	27	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Caminhão Traçado 6X2 equipado com Caçamba Basculante 10m³ - Município de Carauabas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COGIC
43	28	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Ponte - Município de IAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 1.439.000,00	R\$ 1.439.000,00	100%	COGIC
44	29	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COGIC
45	30	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COGIC
46	31	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas da zona rural do município de Boa Vista do Tupim - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	100%	COGIC
47	32	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COGIC
48	33	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COGIC
49	34	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	COGIC
50	35	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Equipamentos Agrícolas - Município de Coronel João Sá	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	100%	COGIC
51	36	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
52	37	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COGIC
53	38	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	COGIC
54	39	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas Município de Bom Jesus	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 189.013,59	76%	COGIC
55	40	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	COGIC
56	41	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COGIC
57	42	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COGIC
58	43	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COGIC
59	44		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COGIC
60	45	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucuçã	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COGIC
61	46	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COGIC
62	47	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	COGIC
63	48	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COGIC
64	49	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
65	50	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COGIC
66	51	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COGIC
67	52	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
68	53	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COGIC
69	54	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
70	55	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COGIC
71	56	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
72	57	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COGIC
73	58	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COGIC
74	59	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	COGIC
75	60	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COGIC
76	61	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COGIC
77	62	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
78	63	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC
79	64	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
80	65	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COGIC
81	66	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
82	67	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COGIC
83	68	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COGIC
84	69	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COGIC
85	70	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COGIC
86	71	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COGIC
87	72	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COGIC
88	73	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COGIC
89	74	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
90	75	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
91	76	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovias em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	COGIC
92	77	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	COGIC
93	78	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COGIC
94	79	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COGIC
95	80	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COGIC
96	81	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COGIC
97	82	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
98	83	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COGIC
99	84	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COGIC
100	85	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.001,00	20%	COGIC
101	86	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.187.711,25	79%	COGIC
102	87	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
103	88	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
104	89	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COGIC
105	90	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
106	91	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COGIC
107	92	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COGIC
108	93	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Camaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COGIC
109	94	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
110	95	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Texeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COGIC
111	96	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
112	97	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COGIC
113	98	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COGIC
114	99	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COGIC
115	100	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
116	101	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
117	102	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
118	103	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
119	104	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
120	105	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
121	106	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
122	107	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
123	108	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
124	109	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Públicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	COIC
125	110	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
126	111	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
127	112	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC
128	113	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
129	114	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
130	115	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
131	116	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
132	117	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	COGIC
133	118	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COGIC
134	119	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
135	120	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
136	121	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COGIC
137	122	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
138	123	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
139	124	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
140	125	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
141	126	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
142	127	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	COGIC
143	128	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
144	129	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
145	130	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	COGIC
146	131	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	20%	COGIC
147	132	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	COGIC
148	133	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
149	134	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
150	135	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
151	136	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
152	137	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
153	138	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC
154	139	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COGIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
155	140	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
156	141	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
157	142	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
158	143	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
159	144	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
160	145	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
161	146	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
162	147	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
163	148	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00		COCIC
164	149	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
165	150	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00		COCIC
166	151	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00		COCIC
TOTAL COCIC									91.401.452,99	44.672.362,22	49%	
1	4	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Serião, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
TOTAL CGEP									199.399,80	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2020, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
TOTAL CGCP									709.382,21	354.691,10		
TOTAL DPLAN									92.310.235,00	45.027.053,32	49%	
15	3.1	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF									0,00	0,00		
TOTAL DFIN									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									94.266.025,40	45.366.570,32	48,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020
