


Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

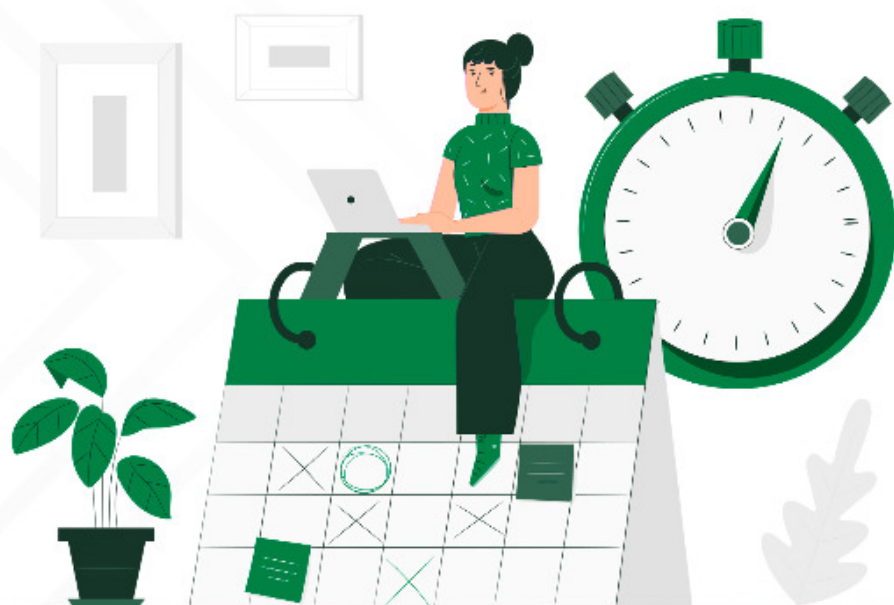

1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2021

Sumário

1.	Introdução	1
2.	Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários	2
3.	Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	9
4.	Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	21
5.	Indicadores de Gestão de Convênios	27
6.	Indicadores de Gestão de Pessoas	34
7.	Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	36
9.	Conclusão	48

Lista de Anexos

ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento

ANEXO II - Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até março/2021)

ANEXO III - Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

ANEXO VI – Planos Operativos Prioritários

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

ANEXO VIII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA

ANEXO IX – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

1. Introdução

O presente relatório refere-se ao **1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2020** dos projetos, que aqui se denominam planos operativos. É importante destacar que o referido ciclo teve data de fixação da apuração dos dados até 31/03/2021 e manteve o processo de monitoramento de sua programação com base no planejamento estratégico vigente, tendo sido elaborado com base na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada pela 121ª reunião da Diretoria Colegiada em 01/11/2012.

Neste relatório serão apresentados os planos operativos considerados estratégicos pela administração da Sudene, por meio de planilhas em Excel (Anexos I e VI). As referidas planilhas permitem maior visibilidade do projeto tendo em vista que dispõe de informações sobre: condição da execução (recursos que são utilizados no projeto, seu alinhamento com a programação estratégica da autarquia e com a programação orçamentária do PPA), percentual de avanço, etapas, problemas verificados na execução de alguma etapa e suas medidas de mitigação de risco, bem como o status (se em andamento, atrasado, iniciando, concluído, ou paralisado). Adicionalmente, encontram-se vários indicadores de gestão das áreas meio, fim e de gestão da comunicação com a sociedade.

É importante esclarecer que em virtude da permanência da pandemia do coronavírus alguns projetos ainda sofrem impactos e não correspondem ao esperado. Tal fato é explicado pelas dificuldades enfrentadas pelas entidades convenientes, da mesma forma que órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, que concentraram seus esforços, principalmente seus recursos financeiros, naquilo que se mostrou mais imediato, que foi o combate e o socorro aos atingidos pela pandemia, influenciando isso na performance orçamentária.

Neste primeiro ciclo de 2021 foram mapeados **214** projetos, dos quais: 5 foram concluídos, 182 estão em andamento, 2 foram cancelados, 17 atrasados em sua execução, 7 paralisados e 1 está por iniciar.

De acordo com as apurações feitas até 31 de março/2021, a unidade com maior quantidade de projetos permanece sendo à Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC), totalizando 142 (engloba as emendas parlamentares), unidade vinculada à Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN). Os demais projetos e suas unidades responsáveis serão detalhados no decorrer do relatório.

Com o objetivo de manter a transparência e o princípio da impessoalidade, o referido documento será disponibilizado no site da Sudene por meio do link: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/gestao-institucional> para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da instituição em sua área de atuação. Entende-se que dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e acesso à informação.

2. Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários

Este tópico apresentará a situação dos Planos operativos que são conduzidos pelas unidades finalísticas, de gestão e de suporte da Sudene. Entende-se como Planos Prioritários as atividades e projetos interdisciplinares e de alta complexidade ligados diretamente ao atingimento da finalidade da autarquia, que é a promoção do desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

É importante esclarecer que os planos prioritários foram submetidos e aprovados pela Diretoria Colegiada, por meio dos documentos: ata da 304ª reunião da Diretoria Colegiada, de 16 de maio de 2018 e Resolução nº 281/2017. Isso explica o fato de estarem separados por anos 2017 e 2018.

2.1 – Resultados Gerenciais do 1º Ciclo de Monitoramento 2021

O quadro abaixo apresenta o quantitativo por unidades responsáveis pelos Projetos, sendo estes classificados de acordo com a sua Coordenação-Geral, com exceção dos do caso da CGDS, que dado o número de projetos, se decidiu especificar aqueles de responsabilidade da COCIC dos demais da Coordenação-Geral.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 1º ciclo 2021, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN			COCIC	DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP		CGDF	CGGP	CPTCE	-
A Iniciar					1			1
Concluído	1			1	3			5
Em Andamento	19	11	3	135	11	2	1	182
Atrasado		3		5	9			17
Cancelado		1			1			2
Paralisado	3	1	1	1	1			7
TOTAL	23	16	4	142	26	2	1	214

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

As tabelas 1, 2 e 3 mostram, respectivamente, a distribuição e performance dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE; programas e ações do PPA; e, segundo as unidades administrativas. E o Gráfico 1, em sequência, apresenta a evolução ao longo dos ciclos de monitoramento de 2020 e o primeiro ciclo de 2021, dos projetos monitorados na Sudene.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Diretrizes e Objetivos Estratégicos, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	193	6.459.604,75	4.747.253,79	0	3	169	15	1	5	193
	1.2	1	199,30	0,00	0	0	1	0	0	0	1
	1.3	5	0,00	0,00	1	1	1	1	1	0	5
	1.4	4	864,60	864,60	0	0	3	0	0	1	4
	1.5	3	60,87	60,87	0	1	1	1	0	0	3
Sub-Total		206	6.460.729,52	4.748.179,26	1	5	175	17	2	6	206
2	2.1	1	0,00	0,00			1				1
	2.2	1	0,00	0,00			1				1
	2.3	2	989,48	989,48			1			1	2
Sub-Total		4	989,48	989,48	0	0	3	0	0	1	4
3	3.1	4	75,00	20,21		0	4				4
Sub-Total		4	75,00	20,21	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		214	6.461.794,00	4.749.188,96	1	5	182	17	2	7	214

Posição em Março/2021.

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.1.** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.2.** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; **2.3**- Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029/2017	0355	23	6.357.760,44	4.700.429,99		2	11	9		1	23
	20N7	1	343,59	343,59						1	1
	8689	2	989,48	989,48			1			1	2
	8902	3	1.693,84	339,52			3				3
	8917	3	1.030,44	1.030,44		1	2				3
	20WQ	6	6.604,42	2.937,72			4	1		1	6
	7K66	116	71.063,41	29.089,74		1	112	2		1	116
	214S	28	17.773,65	12.917,04			25	3			28
	8340	13	3.345,33	1.091,24			11		1	1	13
	4640	2	765,00	-			2				2
Sub-Total		197	6.461.369,60	4.749.168,76		4	171	15	1	6	197
2111	2000	4	75	20,21			4				4
Sub-Total		4	75,00	20,21			4				4
Ações Internas		13	349,5	0	1	1	7	2	1	1	13
Sub-Total		13	349,50	0,00	1	1	7	2	1	1	13
TOTAL		214	6.461.794,097	4.749.188,976	1	5	182	17	2	7	214

Posição em Março/2021

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2020-2024: **Programa 2217** - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (Ações: **20WQ** -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **8917**- Fortalecimento das Administrações Locais; **7K66** – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado -**0355** – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; **20N7** – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; **8689** – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; **8902** – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - **Ação 4640** - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; **Programa 2111** – **Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação **2000** – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. ⁴ Recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2021**

Diretoria	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	23	8.717,46	4.145,33	0	1	19	0	0	3	23
	CGEP	16	3.886,00	1.060,40	0	0	11	3	1	1	16
	CGCP	4	4.258,46	1.952,72	0	0	3	0	0	1	4
	COCIC	142	87.096,74	41.580,32	0	1	135	5	0	1	142
Sub-Total		185	103.958,66	48.738,77	0	2	168	8	1	6	185
DFIN	CGDF/FDNE	26	6.357.760,44	4.700.429,99	1	3	11	9	1	1	26
Sub-Total		26	6.357.760,44	4.700.429,99	1	3	11	9	1	1	26
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00	0	0	1	0	0	0	1
	CGGP	2	75,00	20,21	0	0	2	0	0	0	2
Sub-Total		3	75,00	20,21	0	0	3	0	0	0	3
TOTAL		214	6.461.794,10	4.749.188,98	1	5	182	17	2	7	214


Posição em Março/2021

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: <https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/siglas-outubro-2019-pdf>

³Os dados sobre “Recursos Previstos” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Gráfico 1 - Gráfico Comparativo dos Projetos nos ciclos anteriores

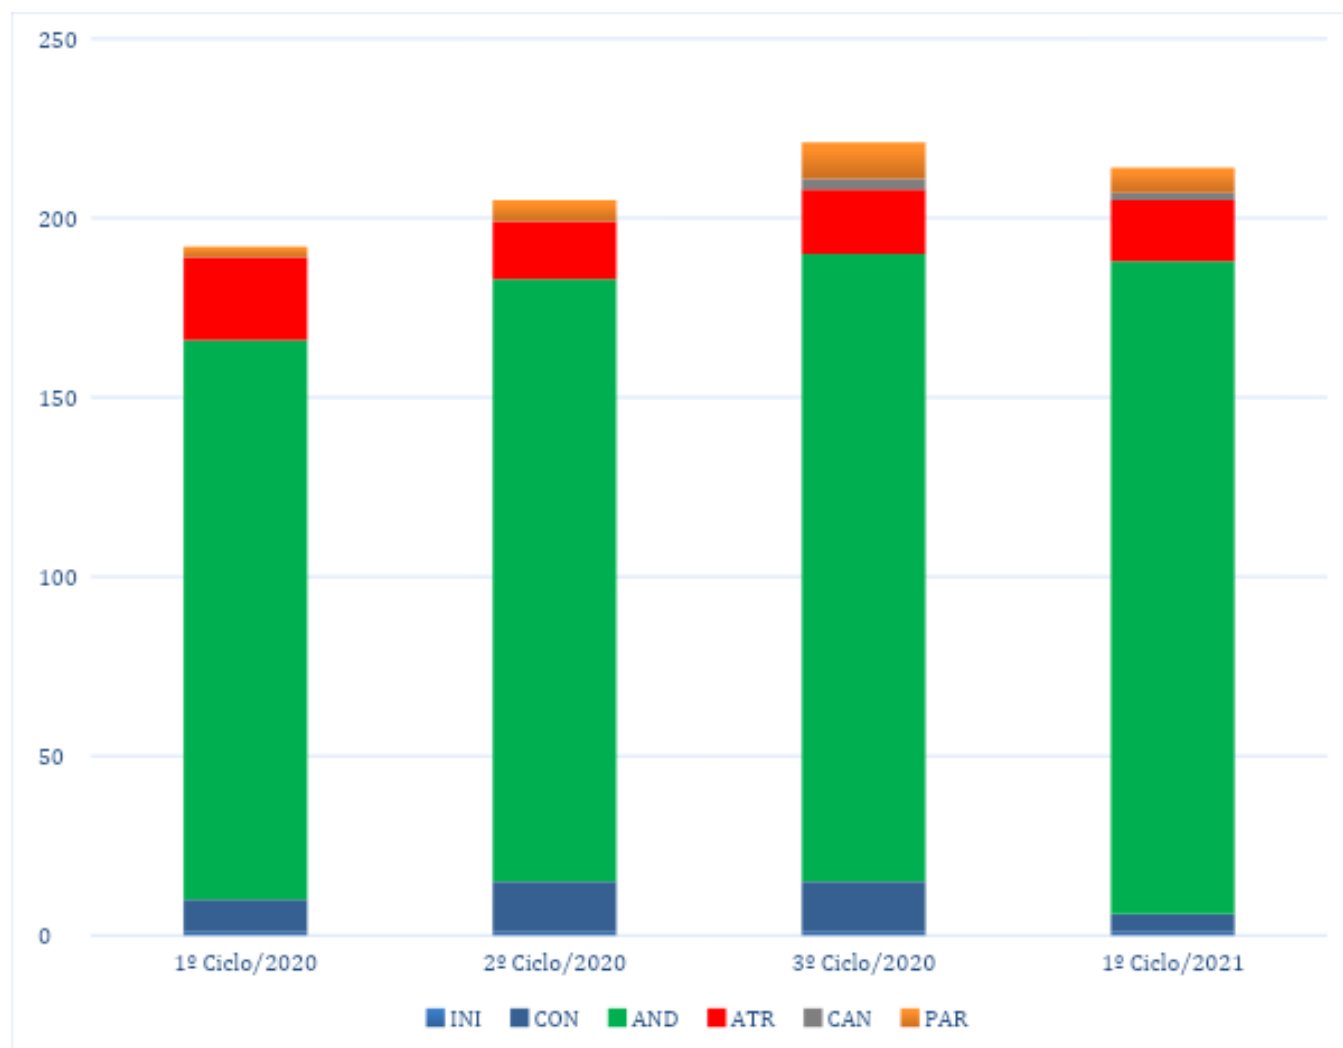

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

3. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{18 \times 100}{18} = 100\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 100,00 %

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica de resultados:

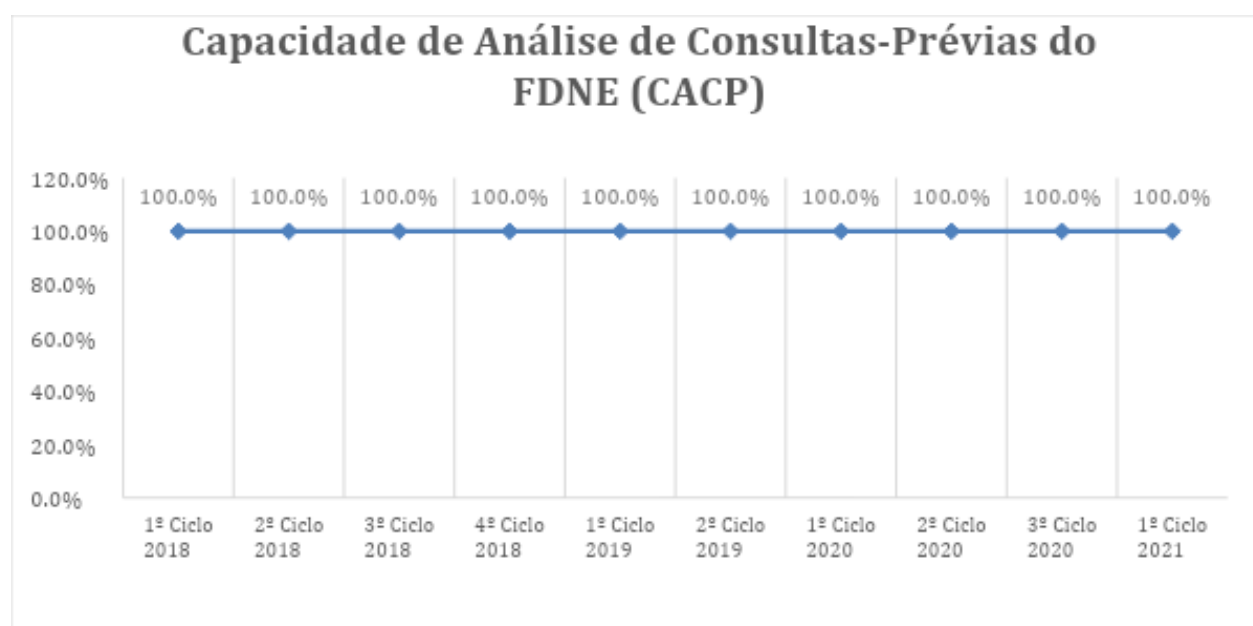


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévia em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévia do FDNE (PACP, ex-PACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{18}{3} = 6,00$ análises/técnico
- b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévia no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor).
- e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Representação gráfica dos resultados:

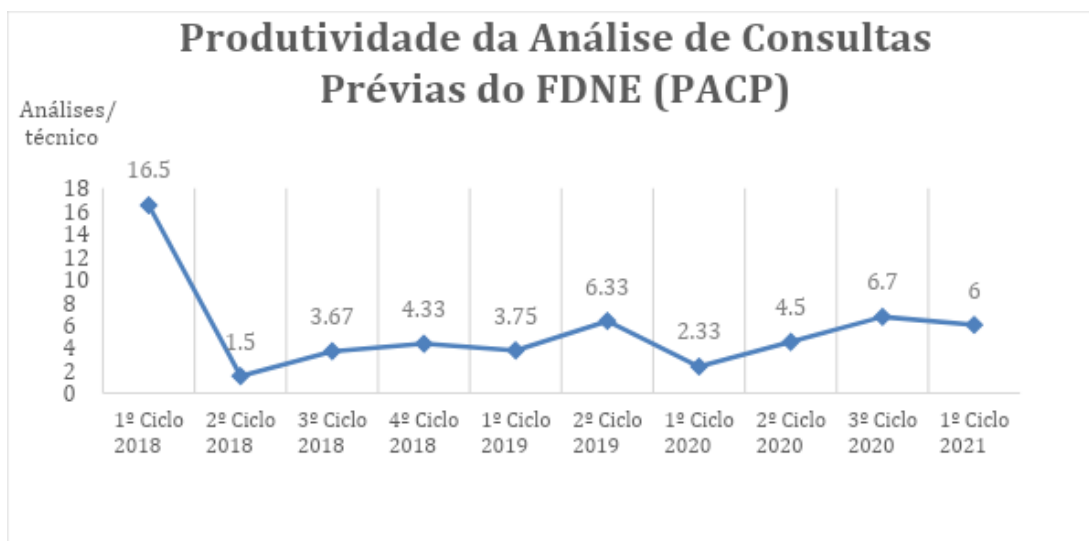


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

3.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{4 \times 100}{18} = 22,2\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Representação gráfica dos resultados:

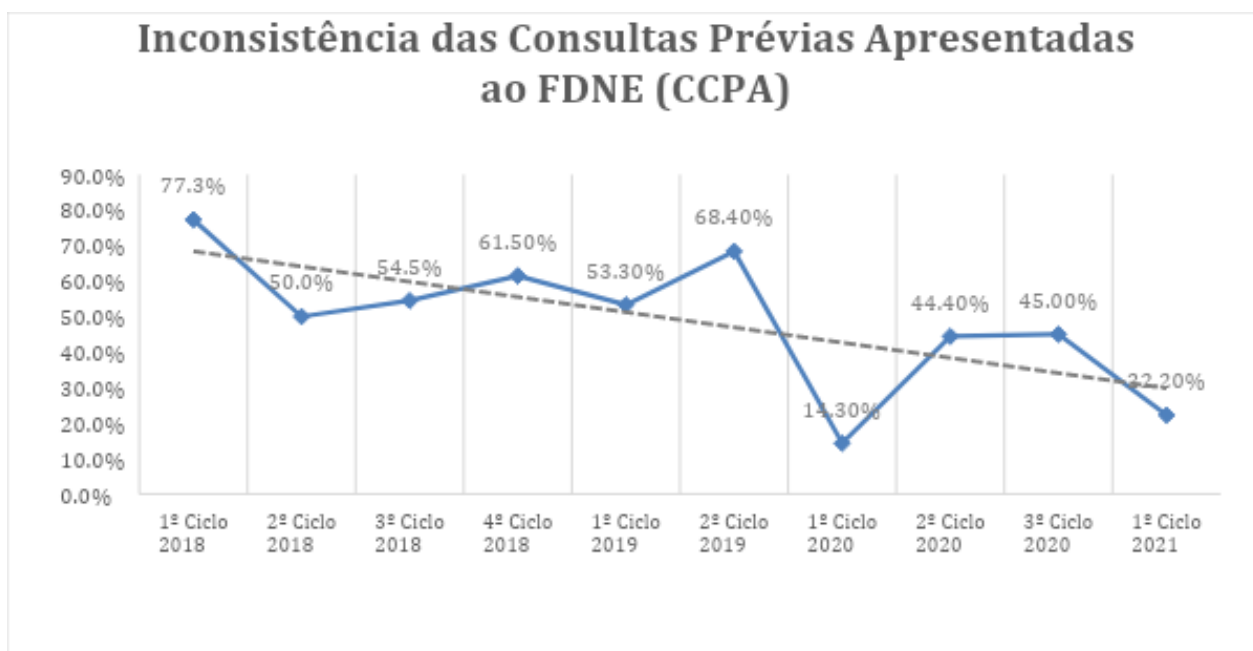

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{35,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,23$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): igual ou menor que 1 (um).

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

f) Comentários: O prazo considerado inclui as prorrogações legais previstas (Art. 20 do Regulamento do FDNE aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012). Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF.


g) Representação gráfica dos resultados:

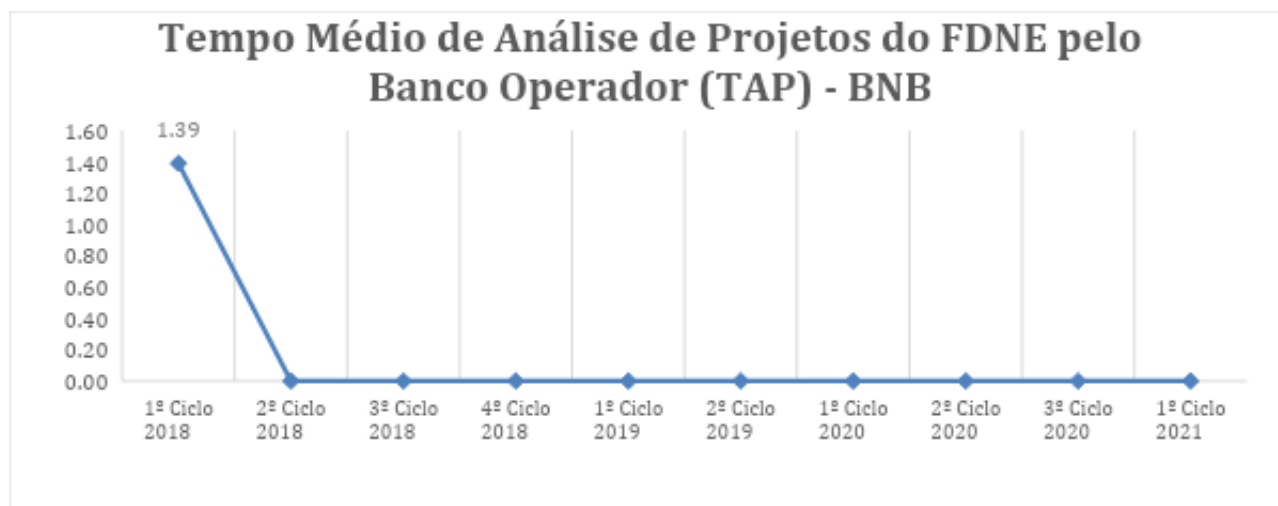

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP) - BB

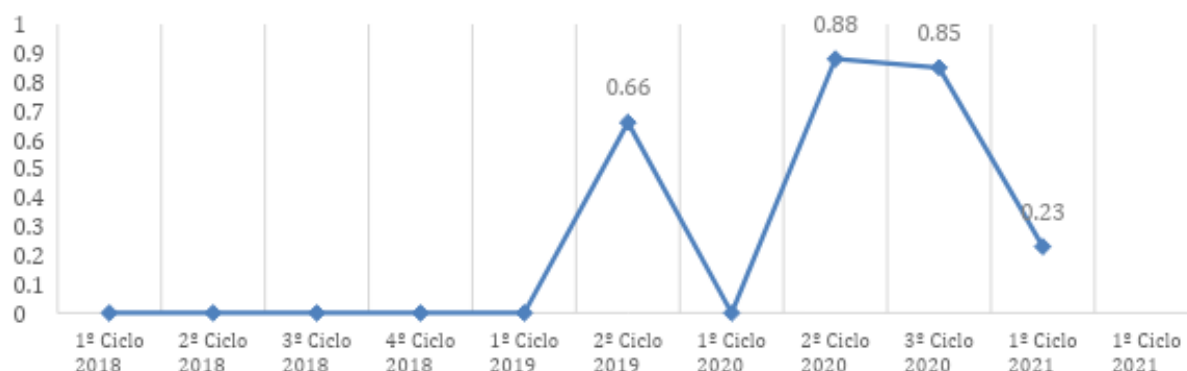

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP) - CEF

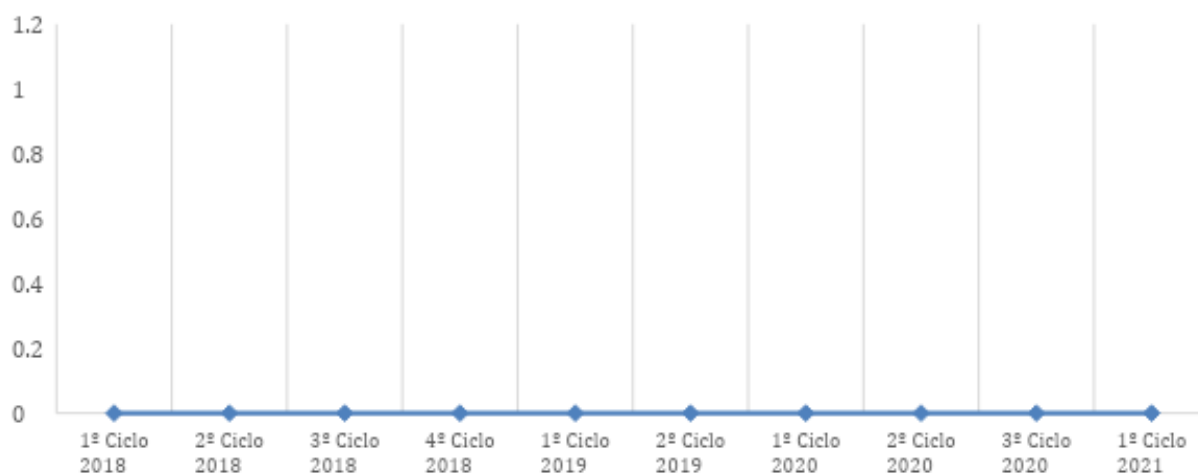

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados, podendo estender-se até 150 dias.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos despendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

3.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP).

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$


a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{3} = 33,3\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.
- g) Representação gráfica dos resultados:

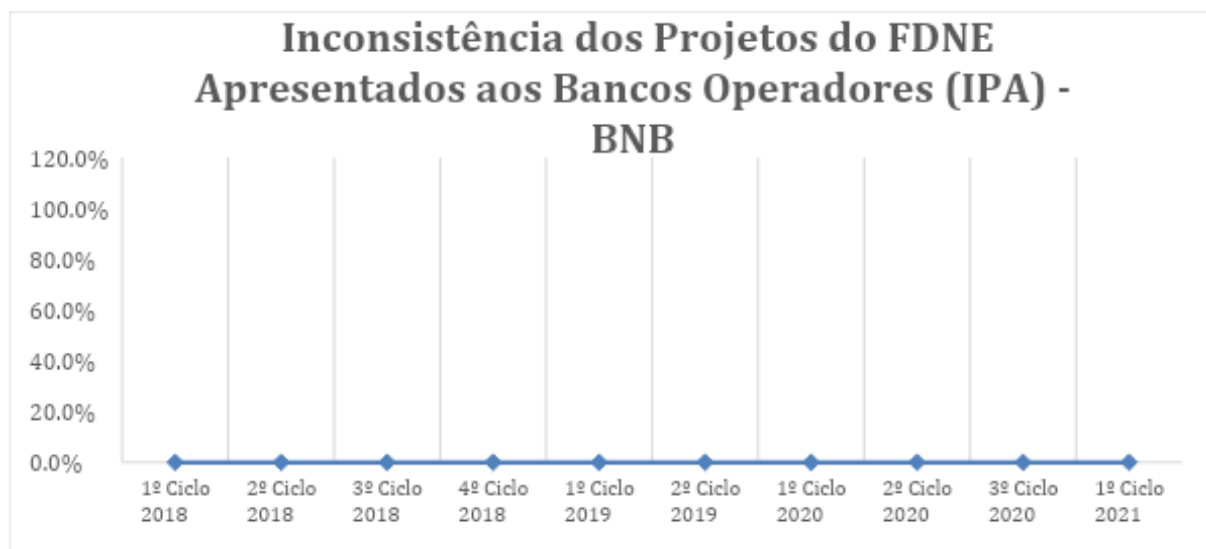


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

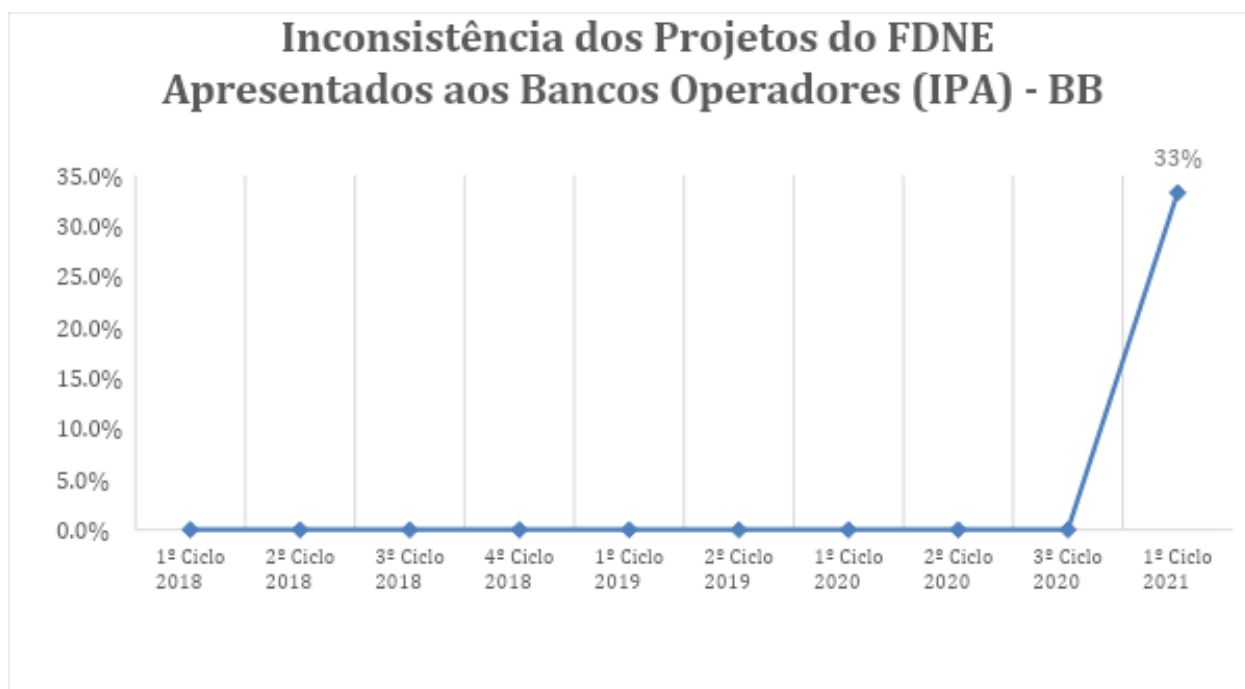

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

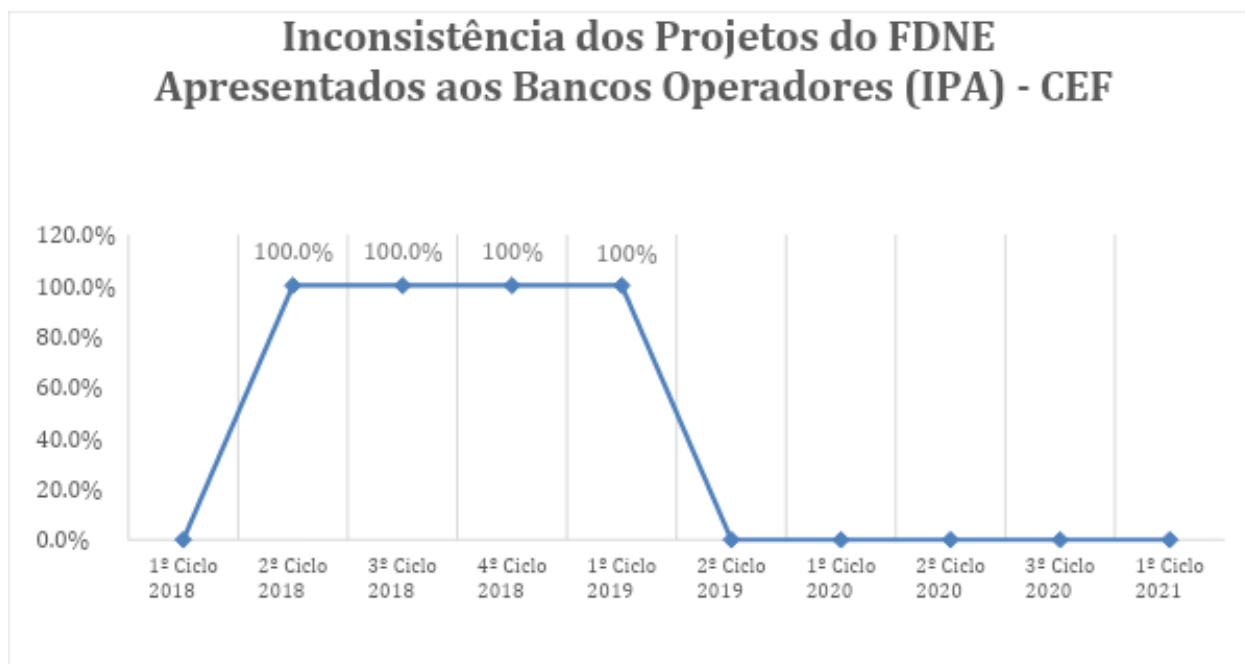


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE).

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado 2021} \times 100}{\text{Dotação 2021}} = \frac{27.379.707,24 \times 100}{824.715.187,00} = 3,32\%$

- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: Foram utilizados os dados do orçamento do FDNE previsto no PLOA 2021, visto que a LOA 2021 ainda não foi sancionada (16/04/2021).
- g) Representação gráfica dos resultados:

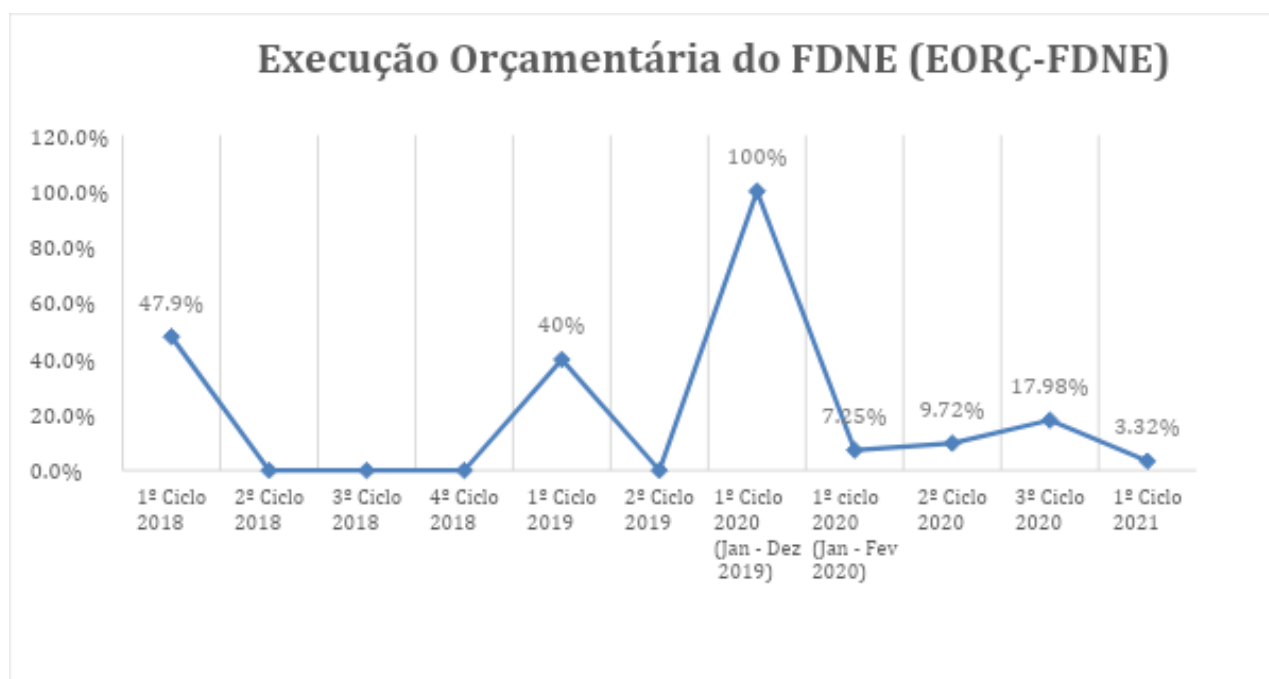

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE).

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{27.180.194,51 \times 100}{1.907.189.914,29} = 1,43\%$$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento CGDF/DFIN.
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

- g) Representação gráfica dos resultados:

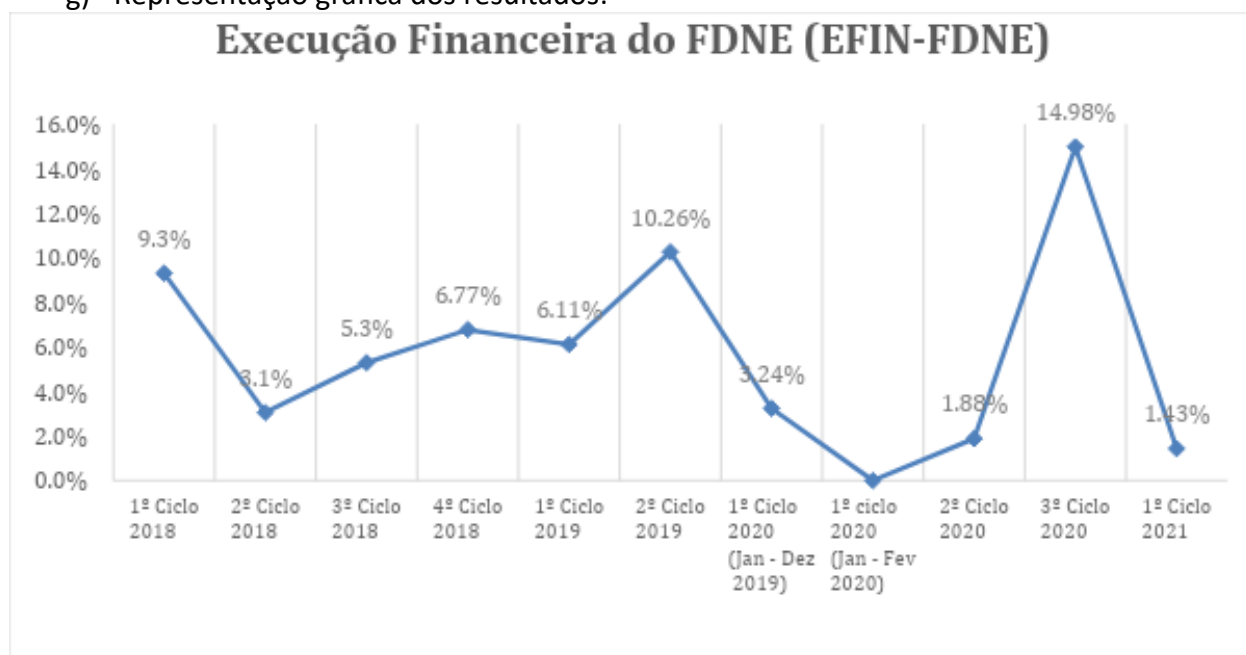

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{17}{30} = 0,57$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor).

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Representação gráfica dos resultados:

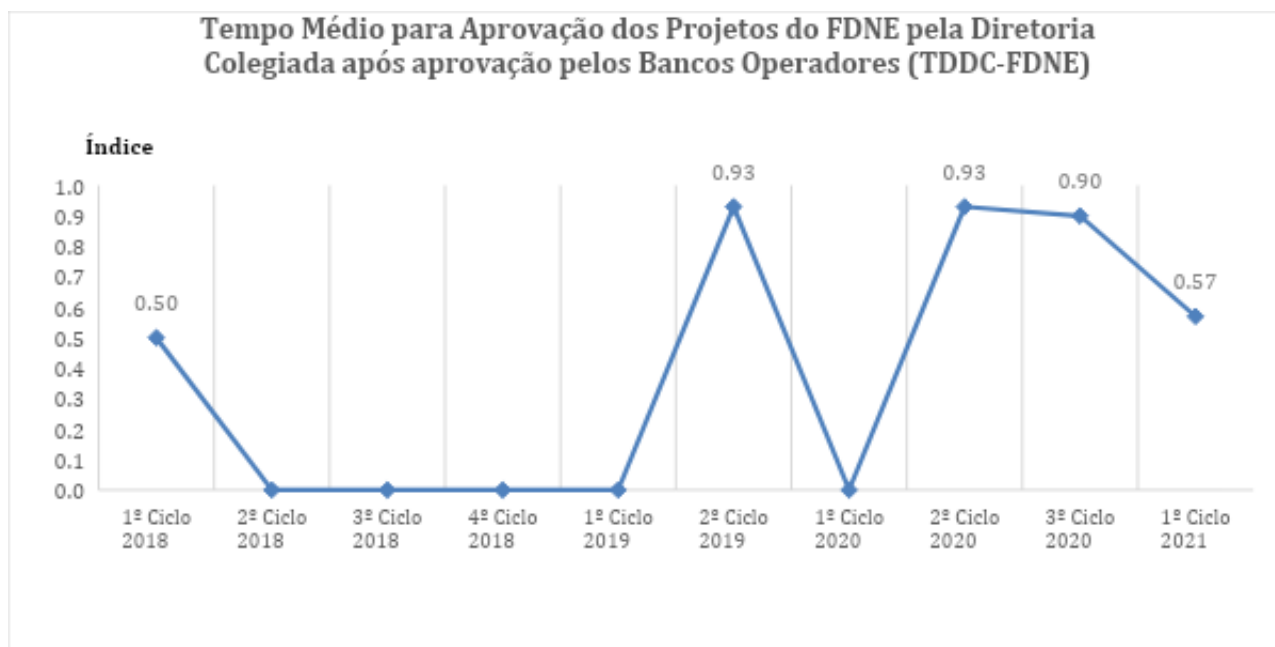

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.


3.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{370 \text{ dias}}{2 \text{ financiamentos aprovados}} = 185 \text{ dias/financiamento aprovado}$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor).
- e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Representação gráfica dos resultados:

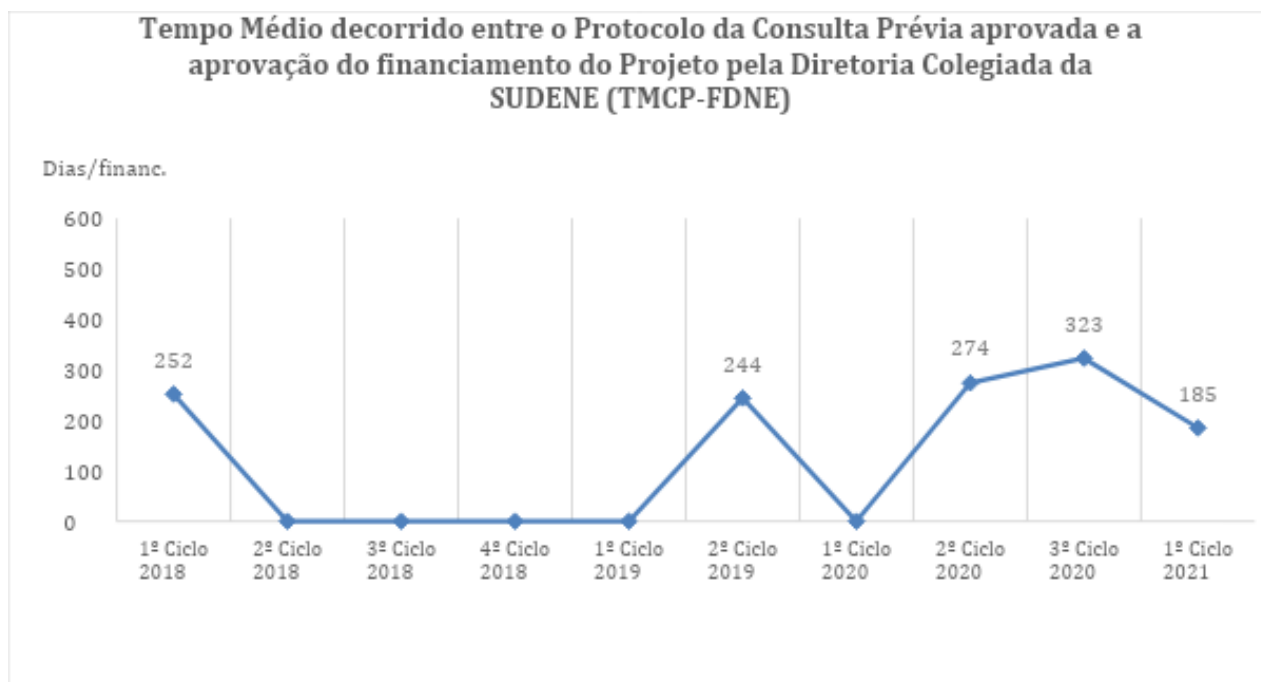

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

3.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{2}{2} = 1,00$$
- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor).

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica dos resultados:

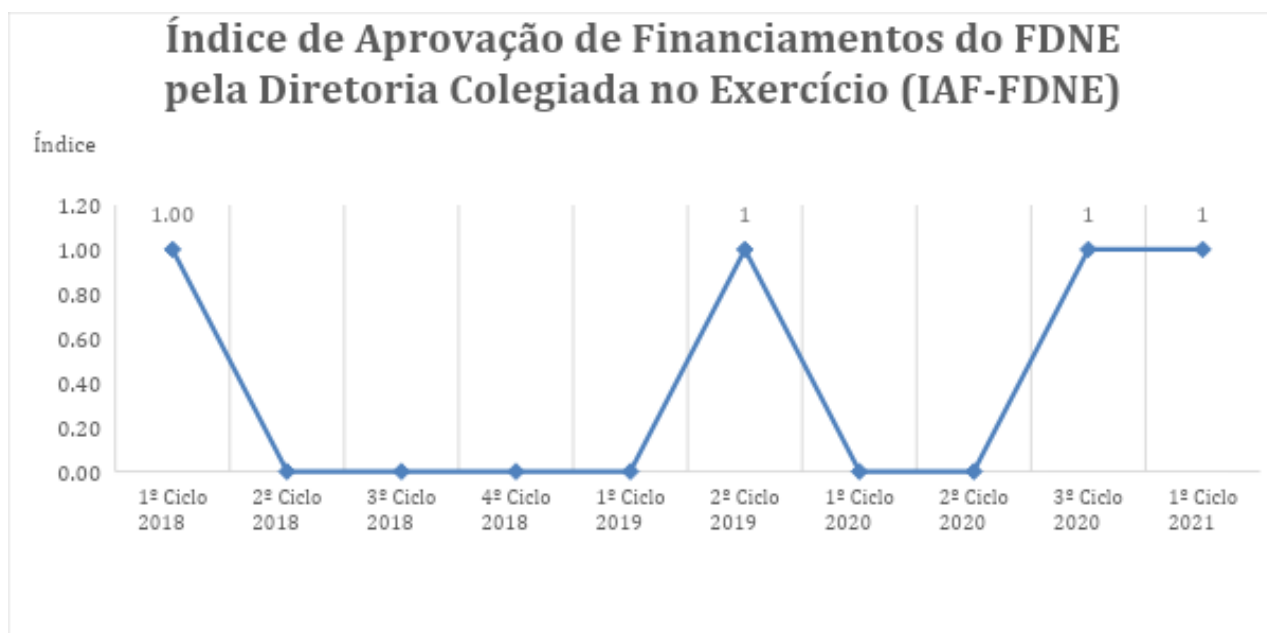

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

4. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

a) Fórmula: $T_1 = \frac{2.313}{N \cdot 24} = 96,4$ dias

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.


c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.

d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.

e) Periodicidade: Jan a mar/2021.

f) Comentários: O presente período de avaliação (janeiro a março de 2021) sofreu a influência Pandemia do COVID-19, tendo em vista que a Pandemia postergou o início das vistorias em 2020 para o mês de agosto/2020. Isso porque no mês de julho de 2020 a Diretoria Colegiada aprovou proposta de vistoria remota feita pela DFIN/CGIF, como forma de examinar os pleitos em carteira, em virtude da impossibilidade de presença física por parte dos técnicos. Mesmo assim, diversos pleitos considerados aptos para a vistoria tiveram conclusão, em média de 74 dias, por conta da demora das empresas em encaminhar os vídeos e a documentação solicitada. Das 24 vistorias, 9 foram feitas com prazo abaixo de 32 dias, prazo considerado **razoável**. Desse processo fazem parte 24 pleitos que foram inscritos ao longo de 2020, mas que somente puderam ter suas vistorias iniciadas a partir do último quadrimestre de 2020. Esse prazo de 96,4 dias foi bastante afetado por conta de 5 pleitos que despenderam 278 dias para atendimento às solicitações de envio de documentação, como foi o caso da Coopersshoes (435 dias) e da Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte (361 dias). Por conta disso, iremos solicitar autorização da Diretoria para devolver os pleitos não atendidos em um prazo de até 45 dias (mediante prévia comunicação ao interessado, por ocasião do momento em que o pleito esteja apto para a vistoria). A medida poderá se dar através de alteração da Resolução nº 555/2020. A proposta será no sentido de se informar ao interessado que o pleito por ele encaminhado está apto para a vistoria e que, sendo assim, ele disporá de prazo para encaminhamento da documentação necessária à vistoria (vídeos, fotos, documentos solicitados, etc.). Com isso teremos como melhorar o atendimento e diminuir o prazo de espera.

g) Representação gráfica dos resultados:

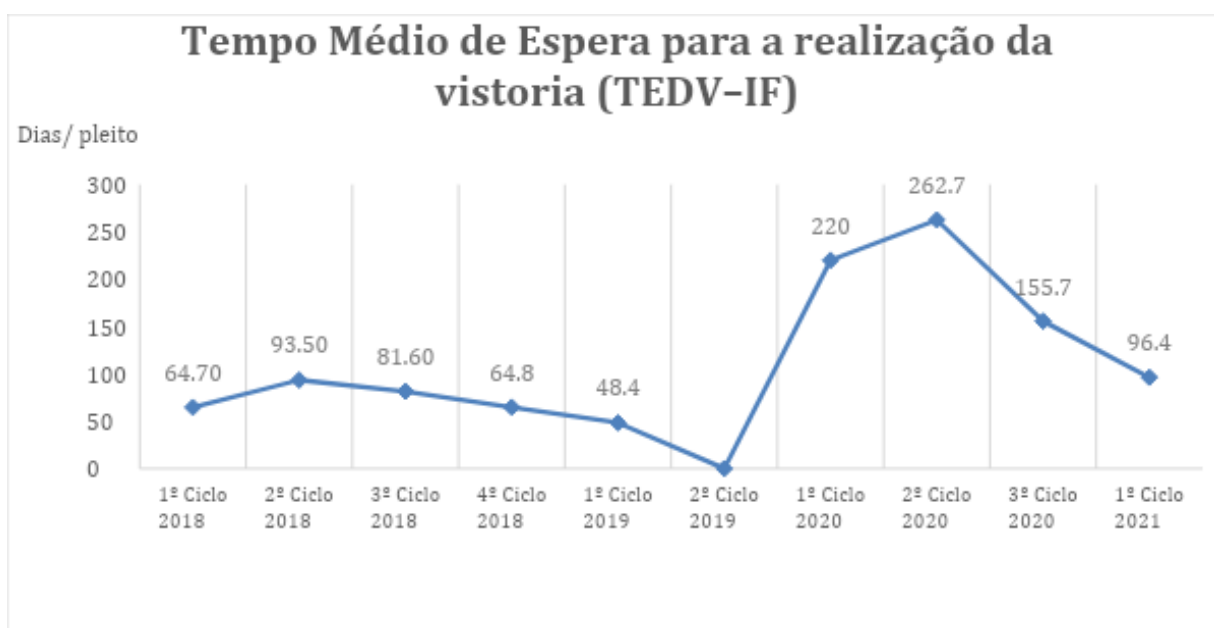

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T1 = Média aritmética do © do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

4.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{51} = 0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais.

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: Jan a mar/2021.

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica dos resultados:

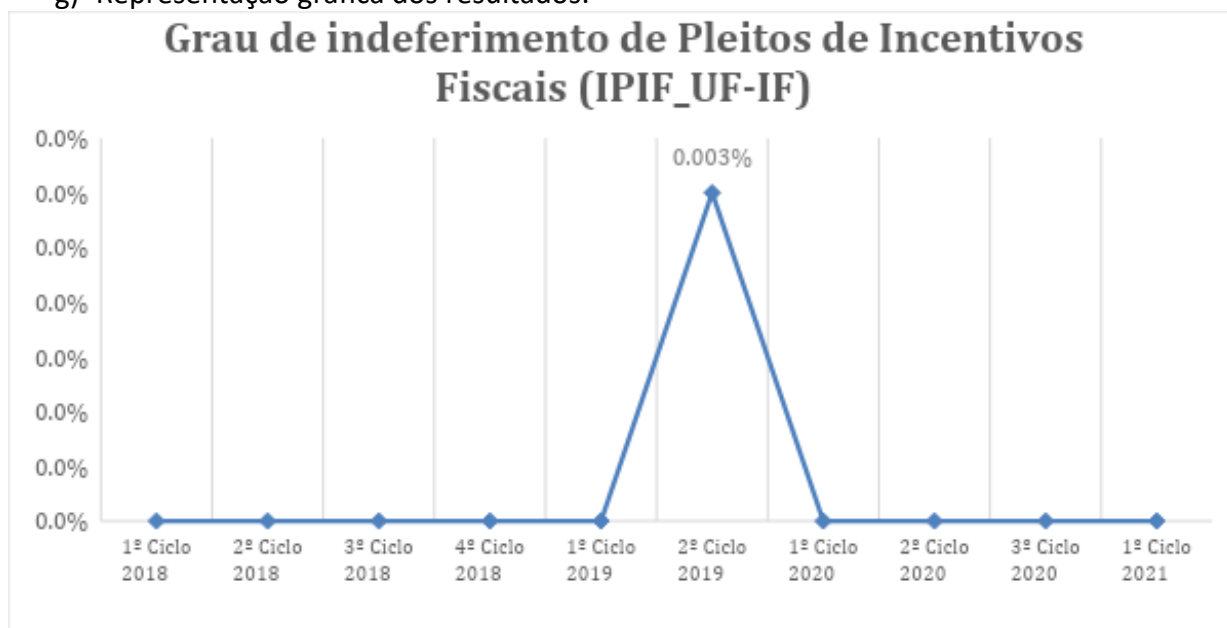

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

(4) o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado entre 1º de janeiro de 2021 até 31 de março de 2021 (31 processos, acrescido dos ainda em exame).

4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF).

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{31 \times 100}{51} = 60,8\%$$

b) Objetivo: (re) orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.


c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais-CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor.

e) Periodicidade: Jan a mar/2021.

f) Comentários: no período, foram concluídas 258 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 82,9% dos pleitos ingressados.

g) Representação gráfica dos resultados:

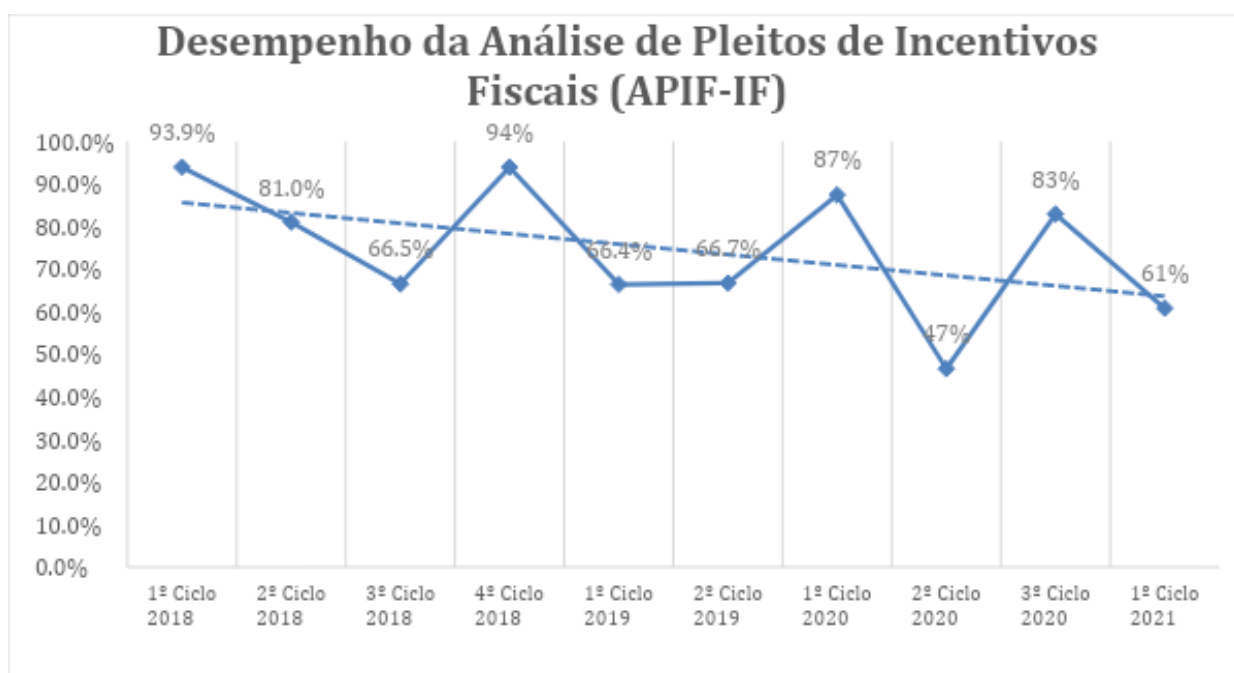

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF).

- a) Fórmula: $\frac{T1}{N} = \frac{2.880}{31} = 92,9$ dias
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: Jan a mar/2021.
- f) Comentários: aqui a mesma vale observação feita para o prazo observado entre a data de ingresso do pleito e a data da vistoria.

Convenção:

T1 = Média aritmética da © do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

g) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


Convenção:

T1 = © do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF).

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{31}{13} = 2,4 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: (re) orientar a programação de análise ou a (re) organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: Jan a mar/2021.
- f) Comentários: não informado.
- g) Representação gráfica dos resultados:

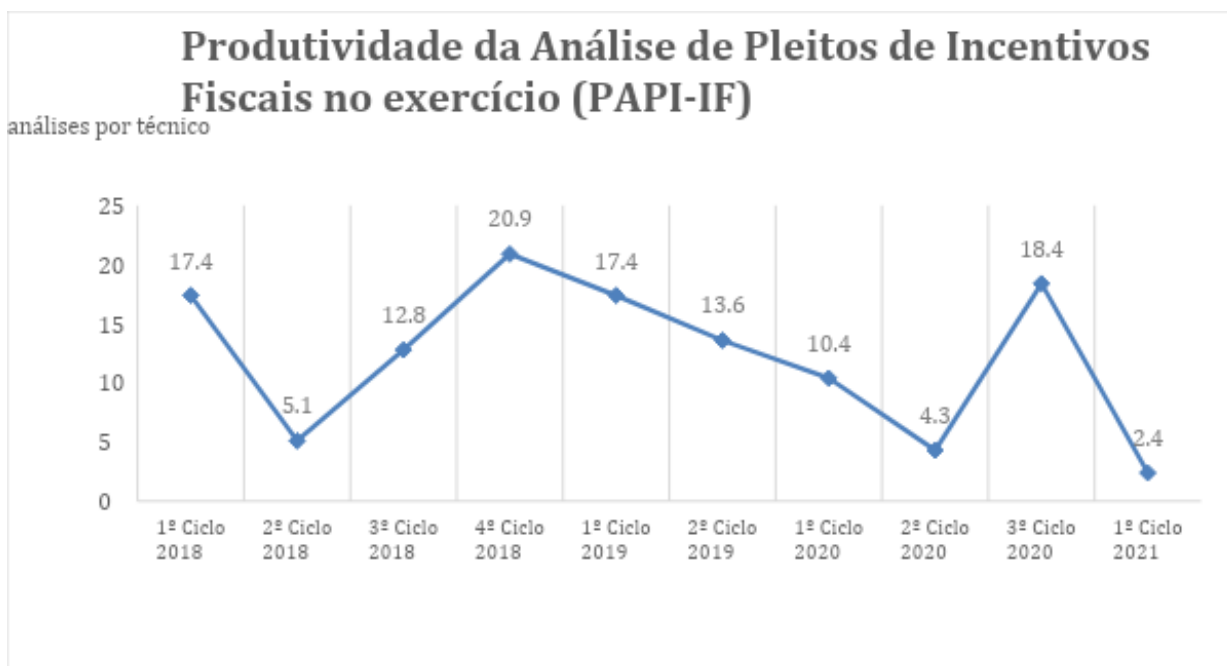


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{31}{7} = 4,4 \text{ vistorias/equipe}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.
- d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.
- e) Periodicidade: Jan a mar/2021.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Representação gráfica dos resultados:

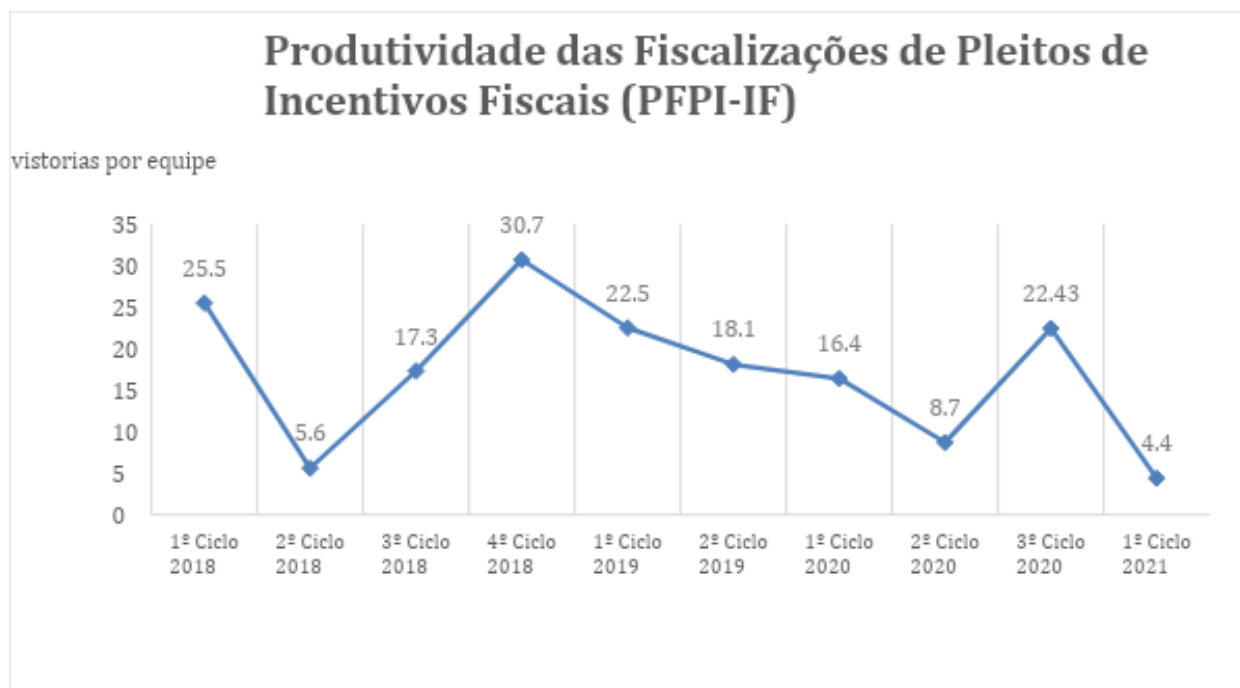

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos. O resultado observado no início de cada ano é sempre inferior ao observado nos demais períodos por força das férias regulamentares.

5. Indicadores de Gestão de Convênios

5.1 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{08 \times 100}{34} = 23,5\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 100 %

e) Período da aferição: Jan a set/2020.

f) Comentários: Foram aprovados 8 pleitos (5 convênios e 3 TEDs) de 34 analisados. Outros 15 estão aptos, mas dependem de recursos para serem contemplados.

g) Representação gráfica dos resultados:

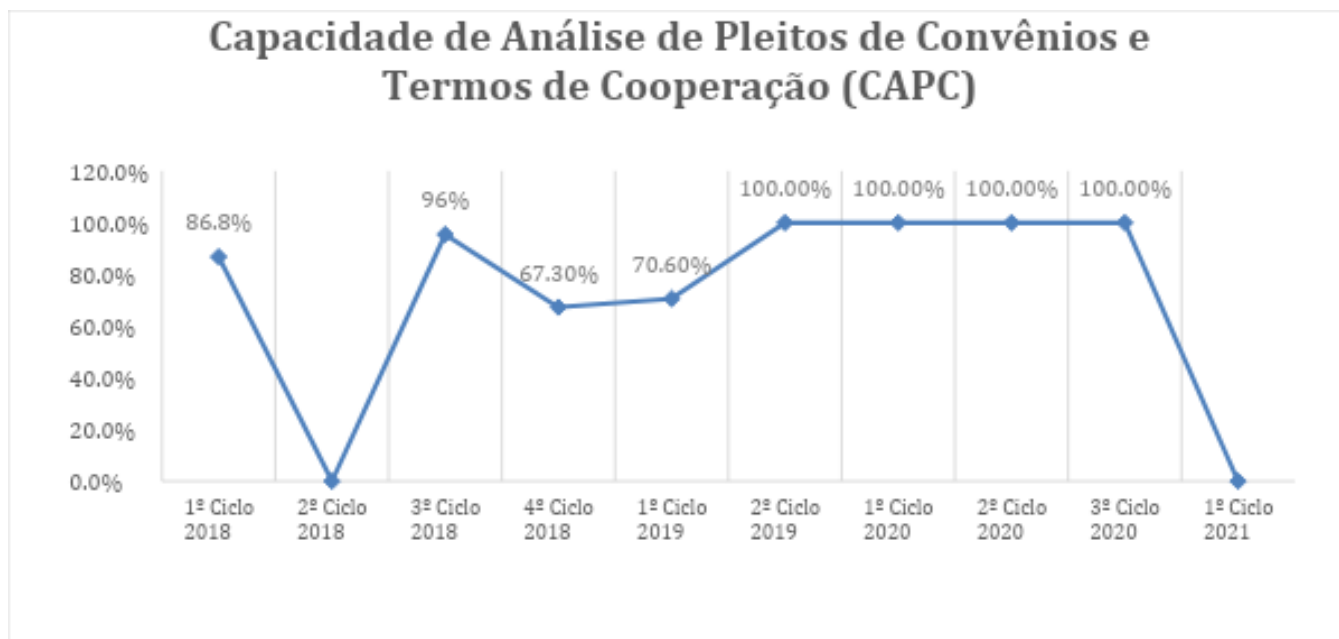

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

5.3 – Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{0}{0}$ = não houve

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.

d) Resultado ideal (%): 100 %

e) Período da aferição: Jan a mar/2021.

a) Comentários: Até o momento, devido ao atraso na votação do orçamento, não recebemos quaisquer propostas de convênios.

f) Representação gráfica dos resultados:

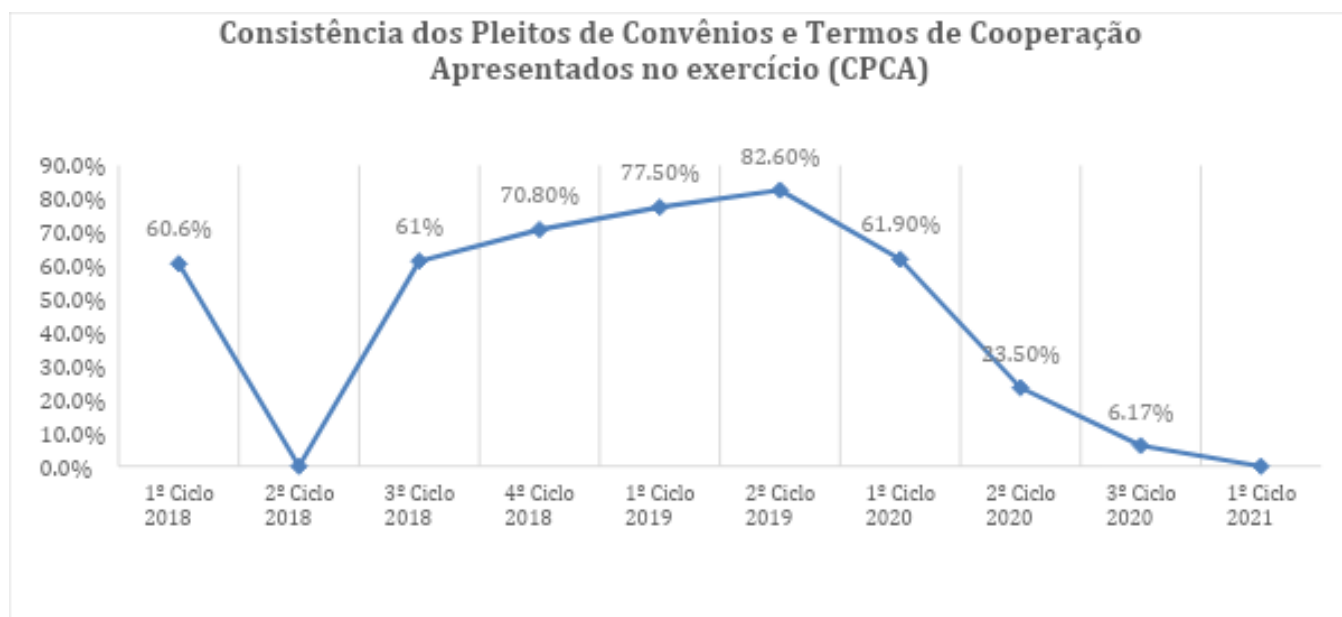

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

5.4 - Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv. e Termos de Coop. rejeitados no ex.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{0}{0} = \text{não houve}$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.


d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).

e) Período da aferição: Jan a mar/2021.

f) Comentários: Não foram recebidos pleitos no período aferido.

g) Representação gráfica dos resultados:

Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

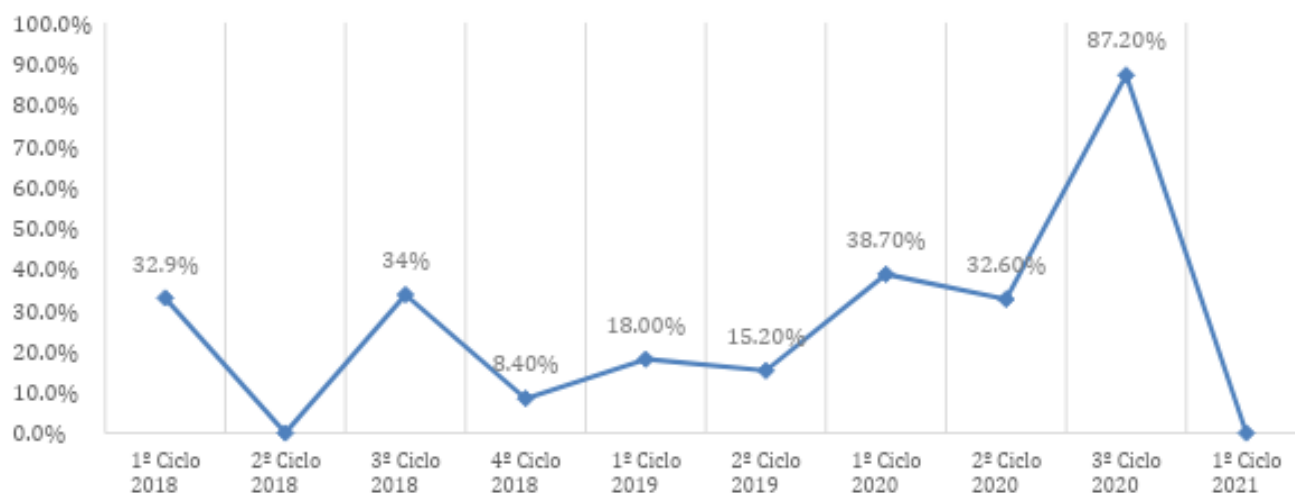

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{0}{10} = \text{Não houve.}$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.


c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %

e) Período da aferição: Jan a mar/2021.

f) Comentários: havia 10 visitas programadas para o período, porém nenhuma foi realizada, devido aos impedimentos/entraves gerados pela Pandemia do COVID-19.

g) Representação gráfica dos resultados:

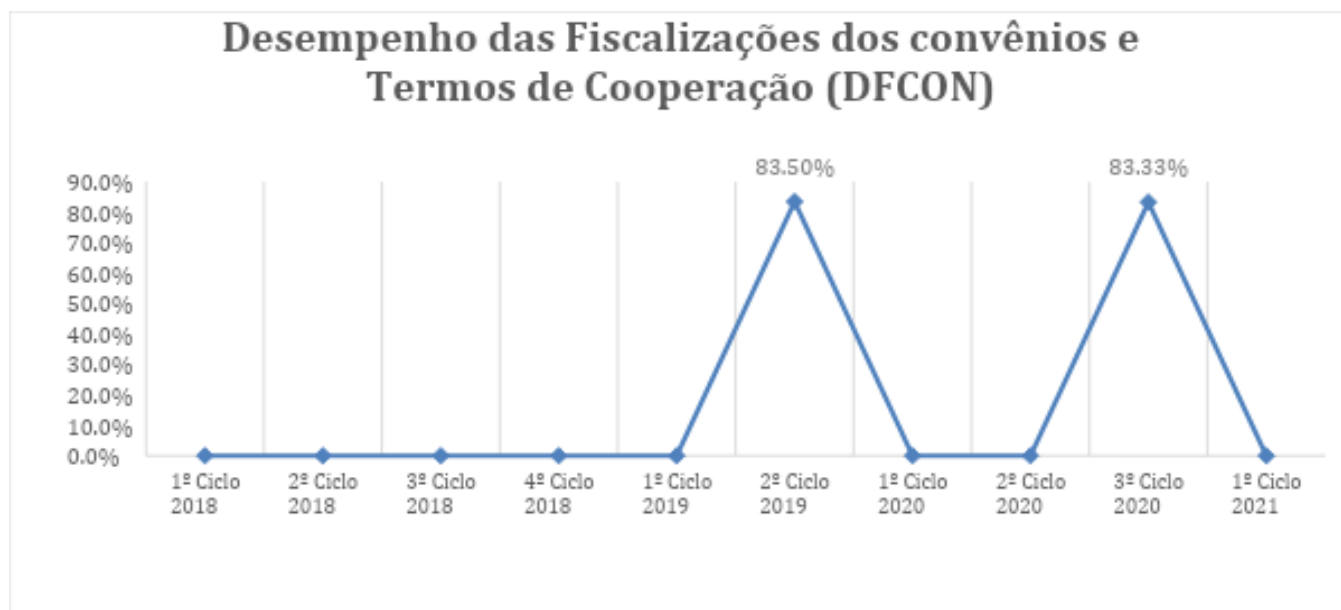

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{90 \text{ dias/pleito}}{\text{Não houve}} = \text{não houve medição.}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

f) Comentários: Entre Janeiro e Março/2021, não foram recebidos convênios para celebração.

g) Representação gráfica dos resultados:

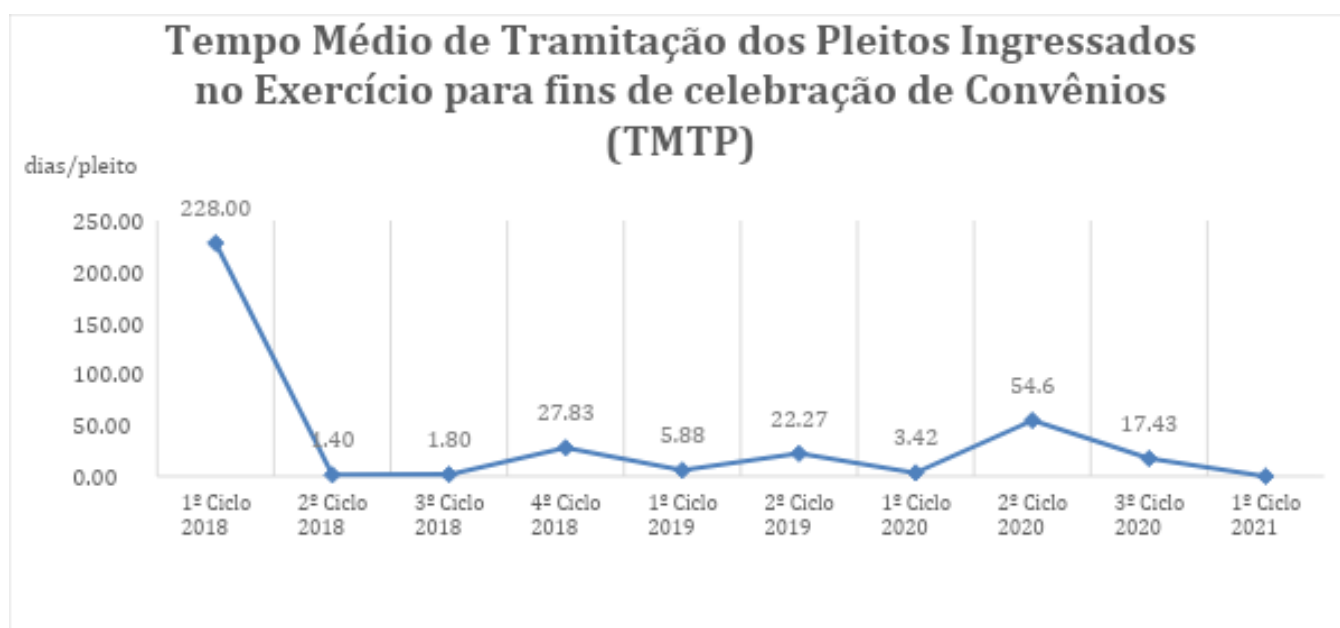

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

5.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{90}{\text{Não Houve}} = \text{dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).


c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan a Mar/2021.

h) Comentários: Entre Janeiro e Março/2021 não foram recebidos Termos de Execução Descentralizada para celebração.

f) Representação gráfica dos resultados anteriores:

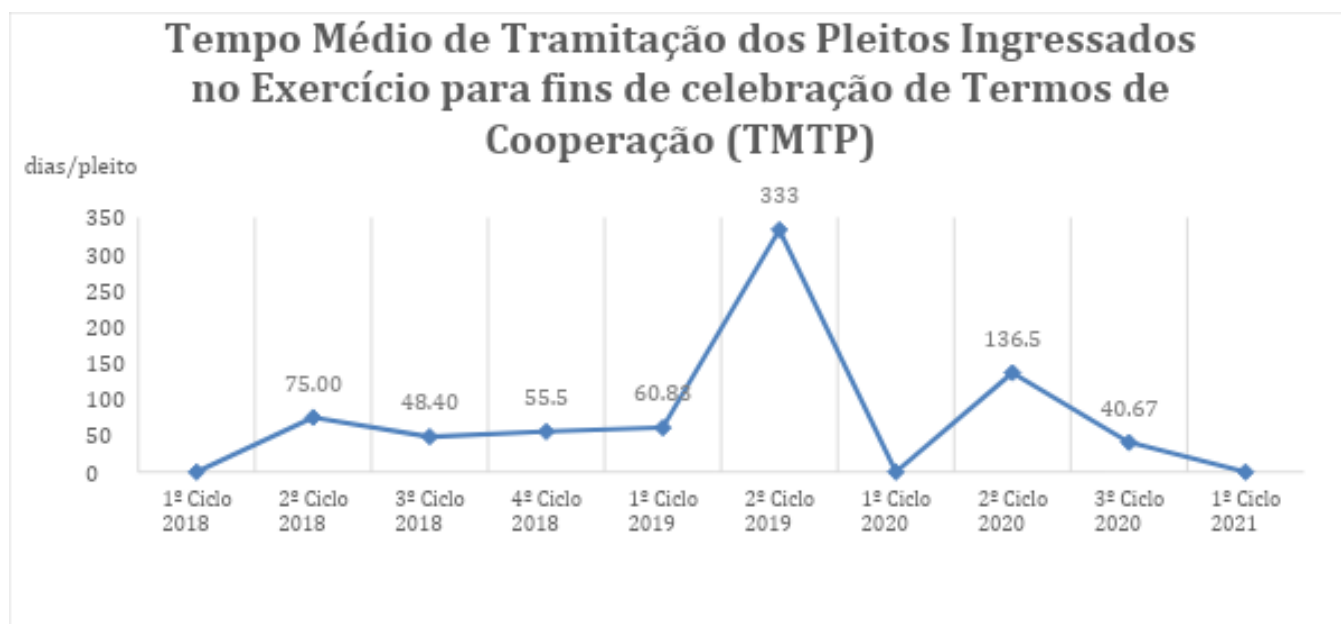

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).


Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

6. Indicadores de Gestão de Pessoas

6.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{0 \times 100}{60} = 0\%$
- b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.
- d) Resultado Ideal (%): 100%
- e) Período da aferição: Jan a Março/2021.
- f) Comentários: Devido à necessidade de revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021, encaminhada ao Órgão Central no início de março/2021, cuja análise retornou no início de abril/2021, alguns cursos não foram iniciados e outros já aprovados foram iniciados, mas ainda não concluídos no período.
- g) Representação gráfica dos resultados:

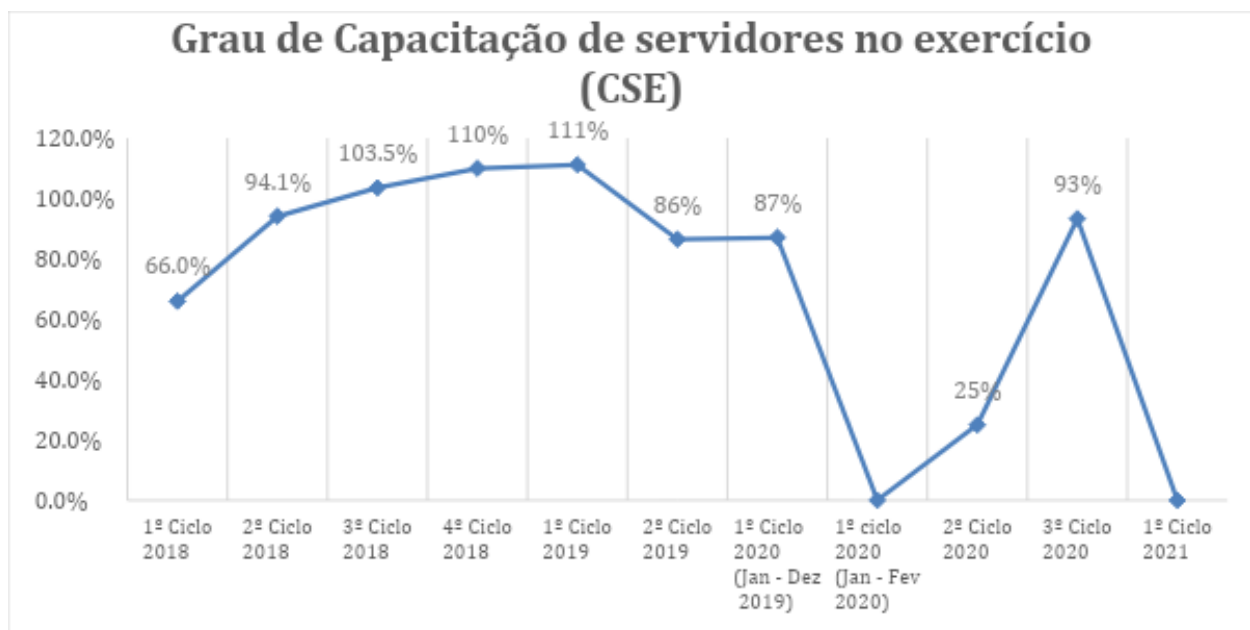


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{0 \times 100}{40} = 0\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).
- e) Período da aferição: Jan a Março/2021.
- h) Comentários: Devido à necessidade de revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021, encaminhada ao Órgão Central no início de março/2021, cuja análise retornou no início de abril/2021, alguns cursos não foram iniciados e outros já aprovados foram iniciados, mas ainda não concluídos no período.
- f) Representação gráfica dos resultados:

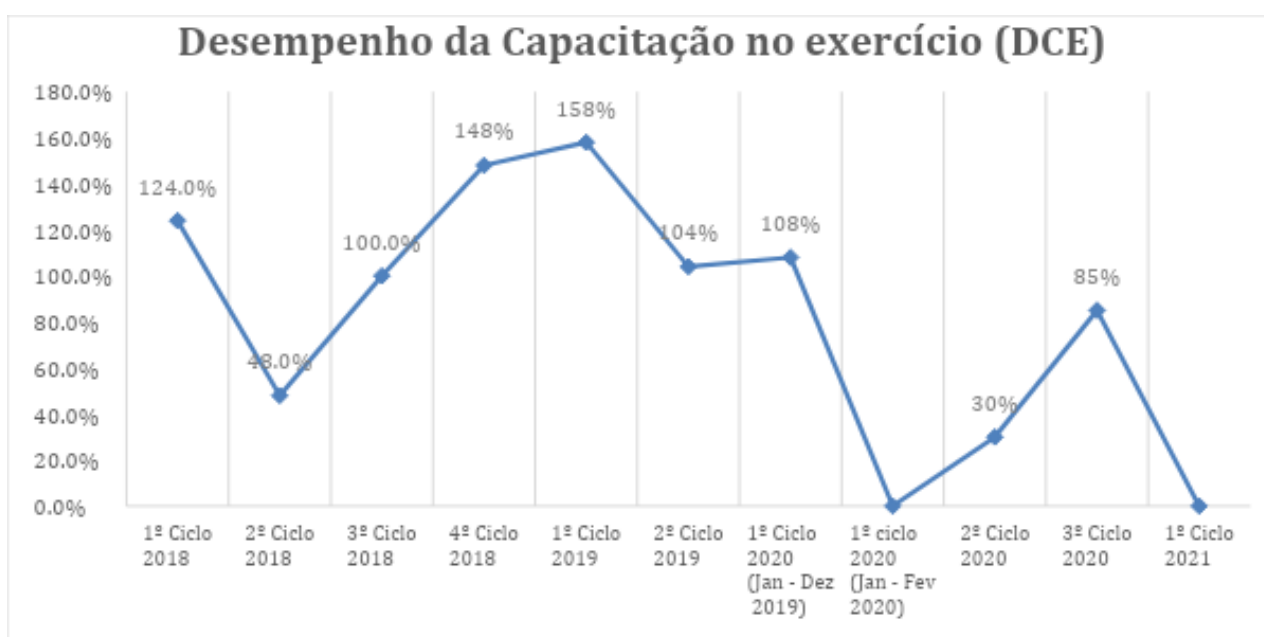

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{0 \times 100}{200.000,00} = 0\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor).
- e) Periodicidade: Jan a março/2021.

f) Comentários: Devido à necessidade de revisão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP 2021, encaminhada ao Órgão Central no início de março/2021, cuja análise retornou no início de abril/2021, alguns cursos não foram iniciados e outros já aprovados foram iniciados, mas ainda não concluídos no período.

g) Representação gráfica dos resultados:

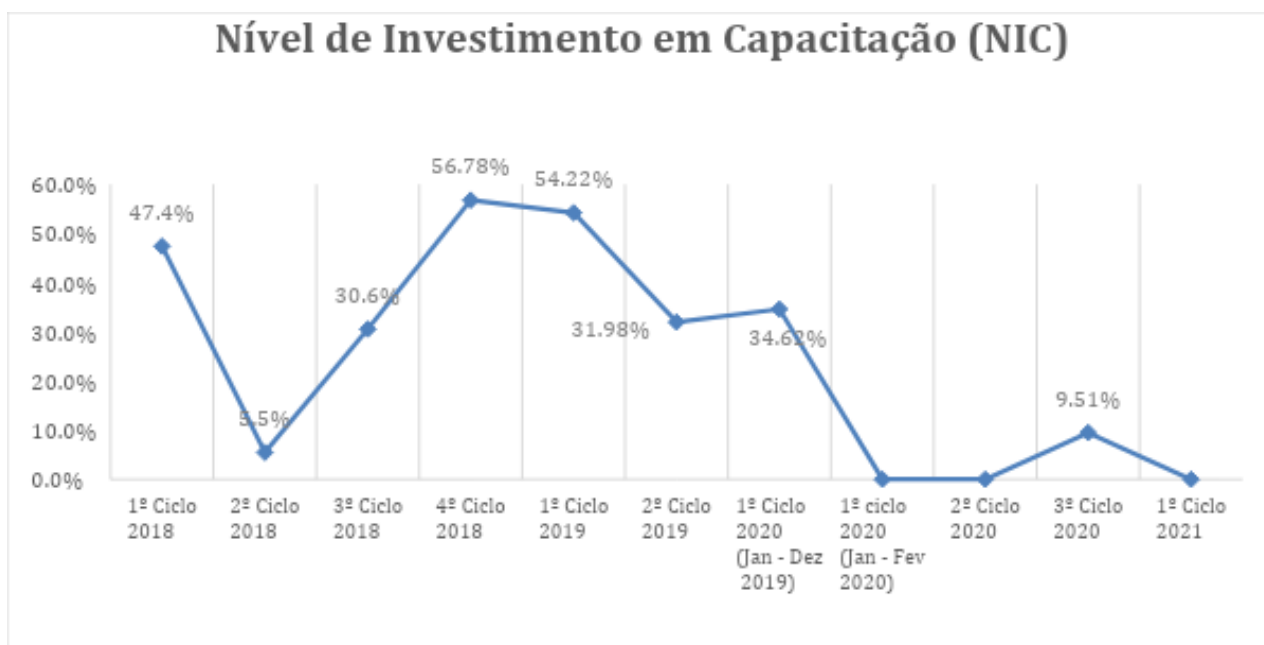

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

7.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

a) Fórmula: Média de acessos = **16.231**
(Google Analytics)

b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.


c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.

e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.

f) Comentários: dados dentro do esperado. Período marcado pelo início da assimilação, público, do novo site criado na plataforma Gov.br.

g) Representação gráfica dos resultados:

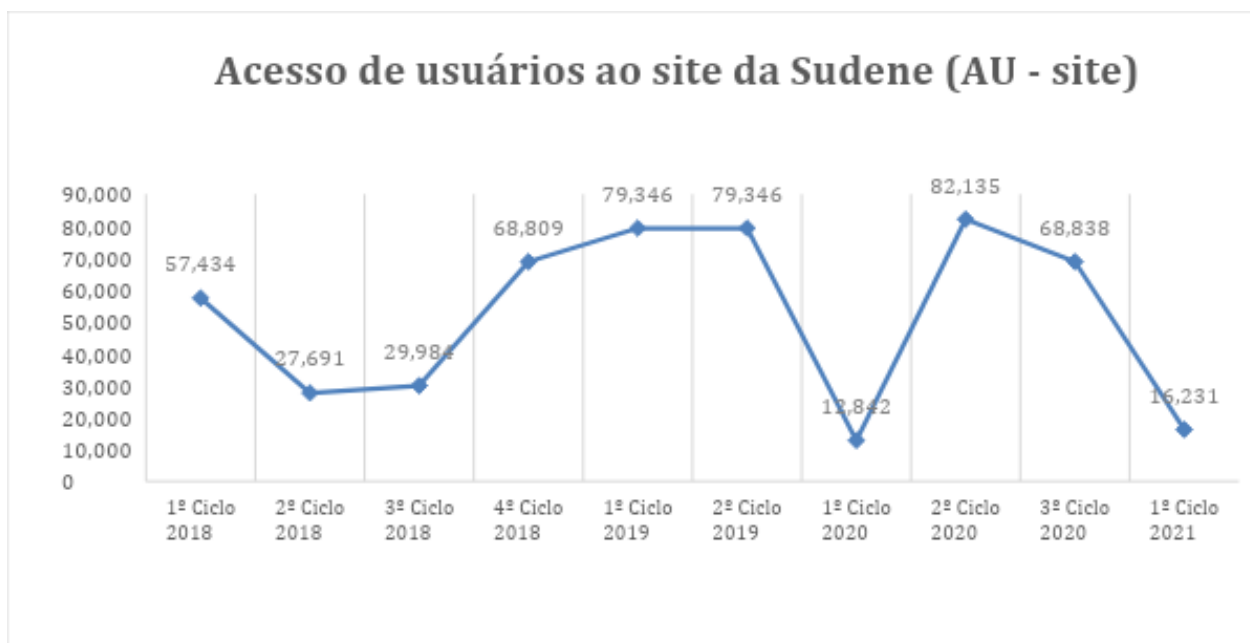


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

7.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site).

- a) Fórmula: Tempo de permanência = **2'09"**
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados considerados positivos, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus e a migração do site para a estrutura do Gov.br, realizada em setembro de 2020.
- g) Representação gráfica dos resultados:

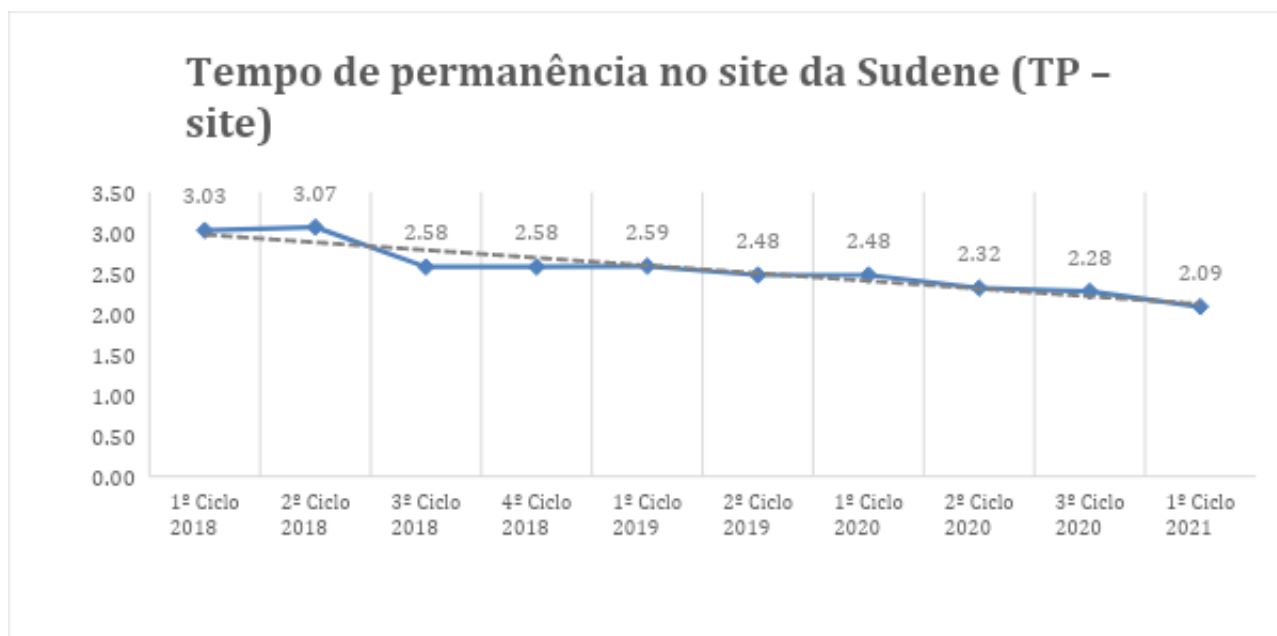


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = **57,64%**
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.
Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes. De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados esperados, mesmo em virtude da pandemia do novo coronavírus. A migração do site para a estrutura do Gov.br, realizada em setembro de 2020, traz impactos para a taxa de rejeição, já que o ambiente passa por um período de organização de conteúdo e assimilação da nova estrutura por parte do público.

g) Representação gráfica dos resultados:

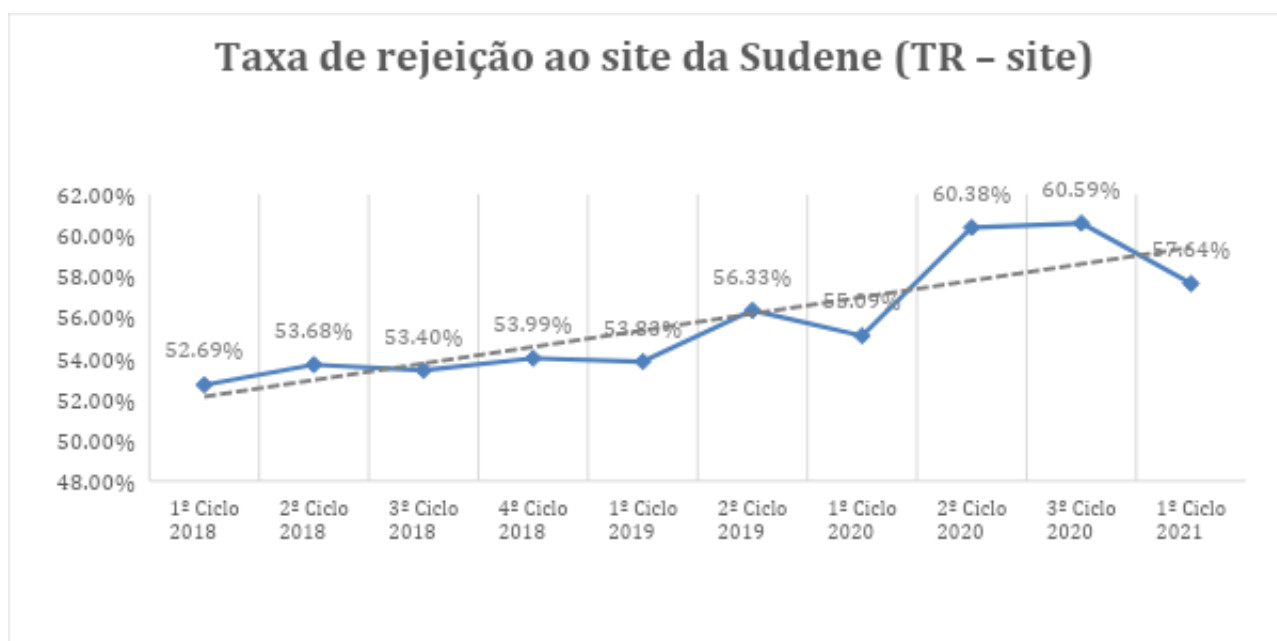


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Curtidas = **2.789**.
(Facebook)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados esperados, comprovando tendência global de predileção dos usuários pelo Instagram em detrimento do Facebook.

g) Representação gráfica dos resultados:

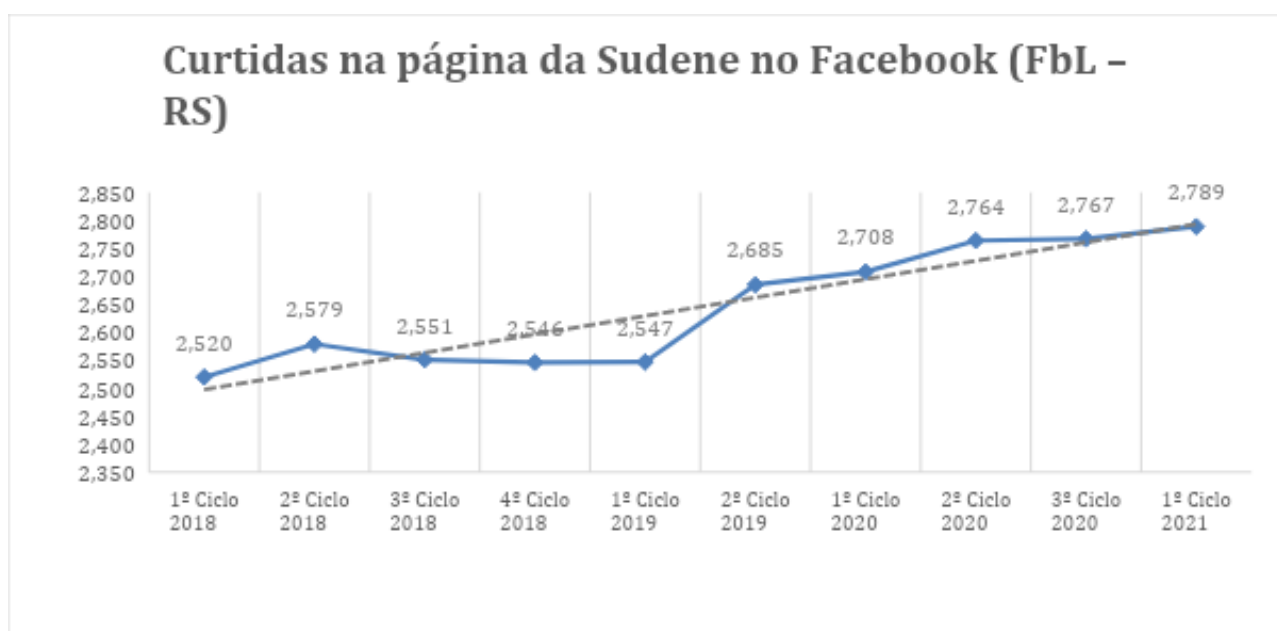


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 1.110.
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados esperados, comprovando tendência global de predileção dos usuários pelo Instagram em detrimento de outras redes sociais.
- g) Representação gráfica dos resultados:

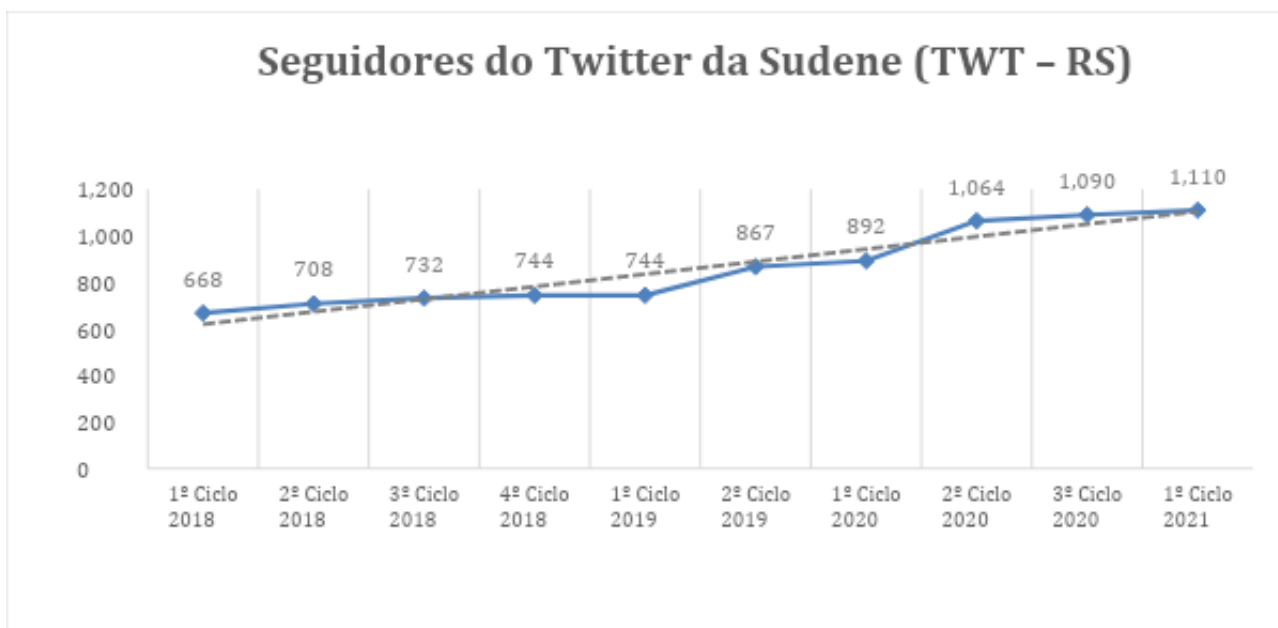


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.6 - Seguidores no Instagram da Sudene

- a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: **2.027**.
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados positivos, evidenciando tendência global de aumento de engajamento no Instagram.
- g) Representação gráfica dos resultados:

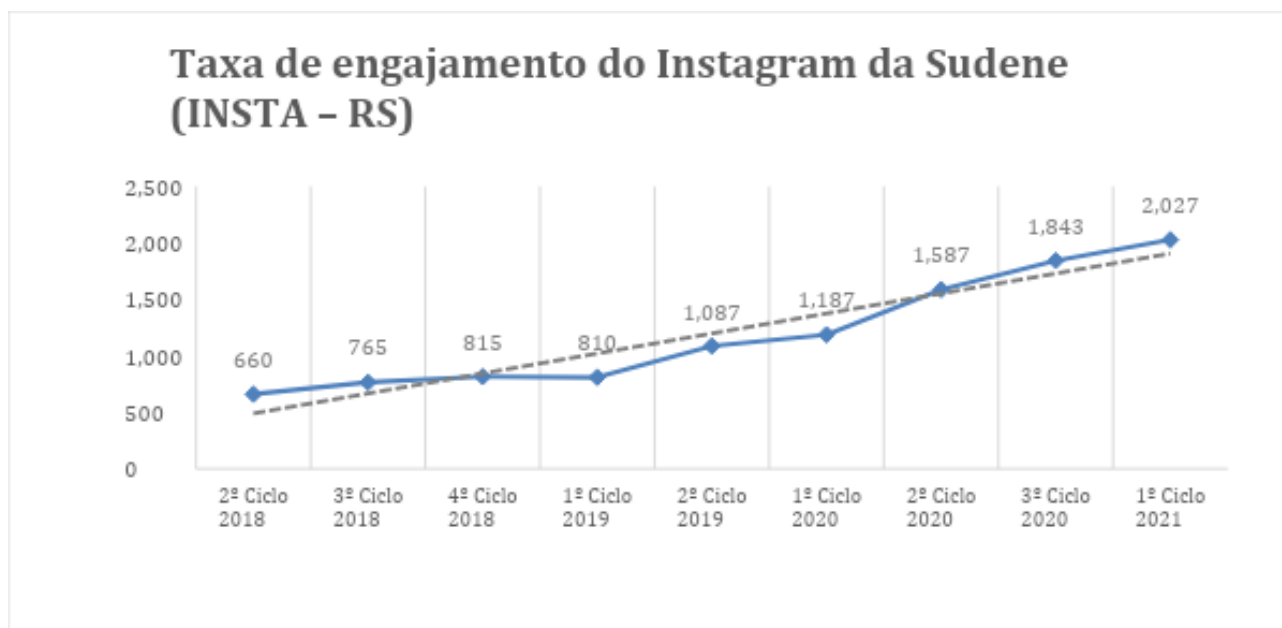


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- a) Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 23 \text{ na internet} + 11 \text{ na intranet} = 34$
(Internet + Intranet)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados positivos.
- g) Representação gráfica dos resultados:

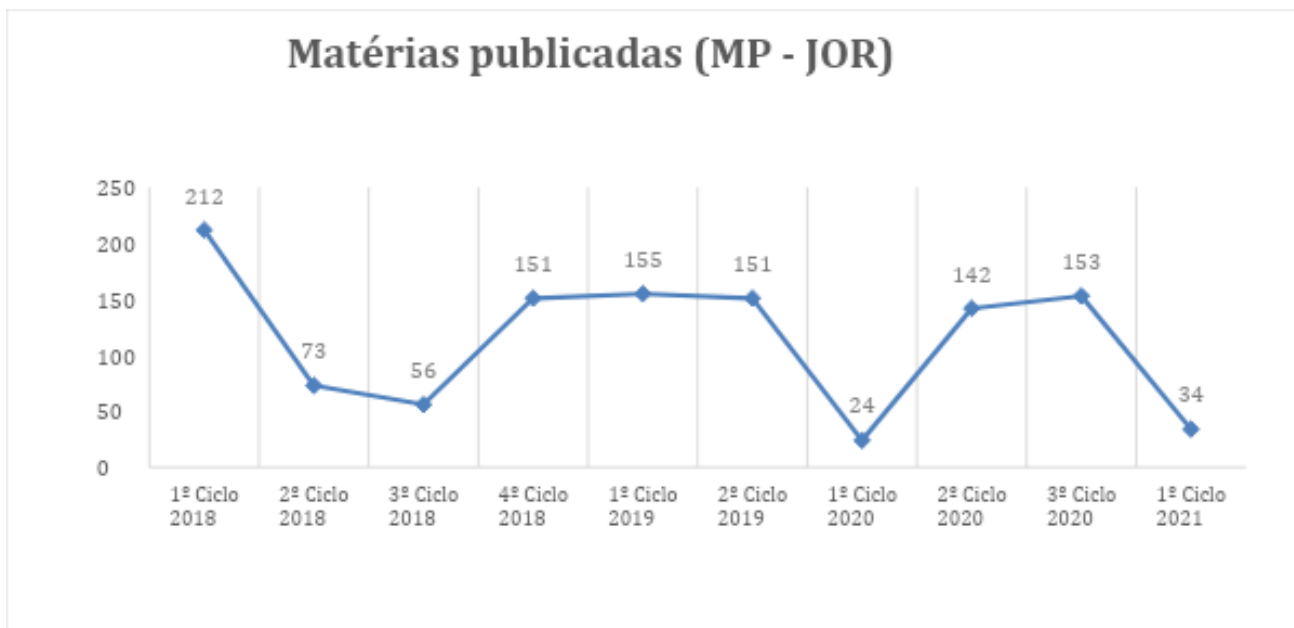


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- a) Fórmula: $\sum$ Sugestões de Pauta Publicadas = 22
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: produção dentro do esperado.

g) Representação gráfica dos resultados:

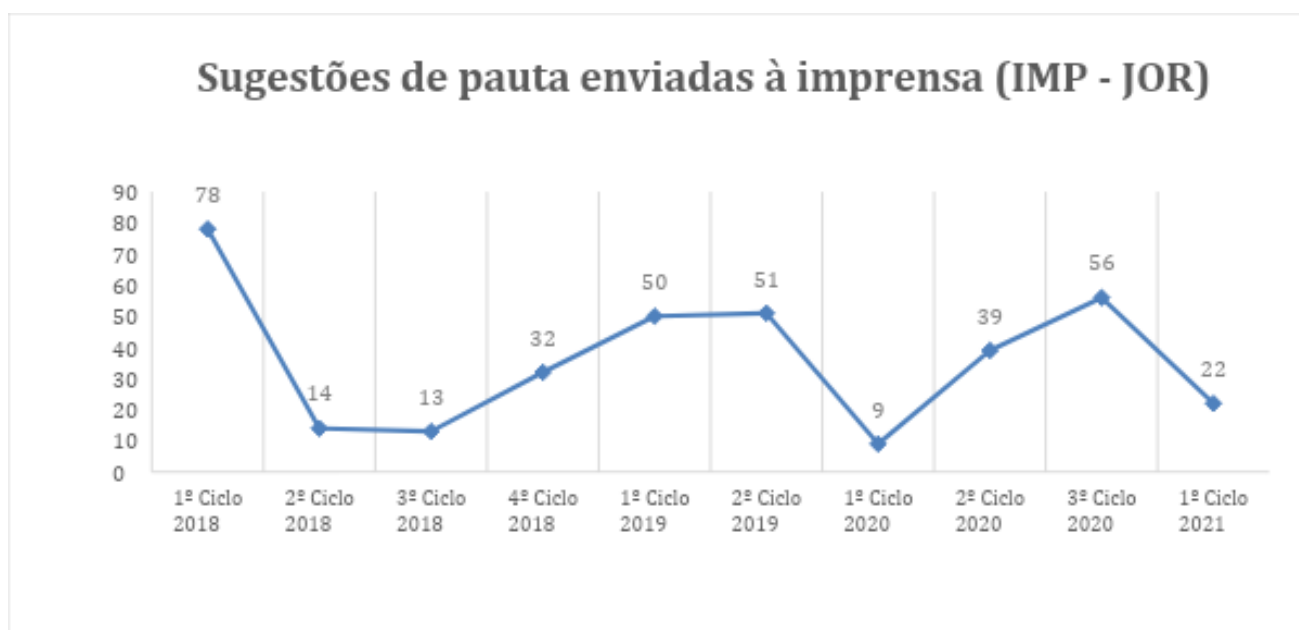


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- a) Fórmula: $\sum$ Produções em Vídeo e Áudio = 0 produções (ver observações).
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- h) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- e) Comentários: o período de pandemia dificulta a viabilização de produção audiovisuais em virtude da necessidade de distanciamento e do uso de equipamentos in loco. Espera-se a retomada gradual das produções tão logo os efeitos da pandemia passem.
- f) Representação gráfica dos resultados:

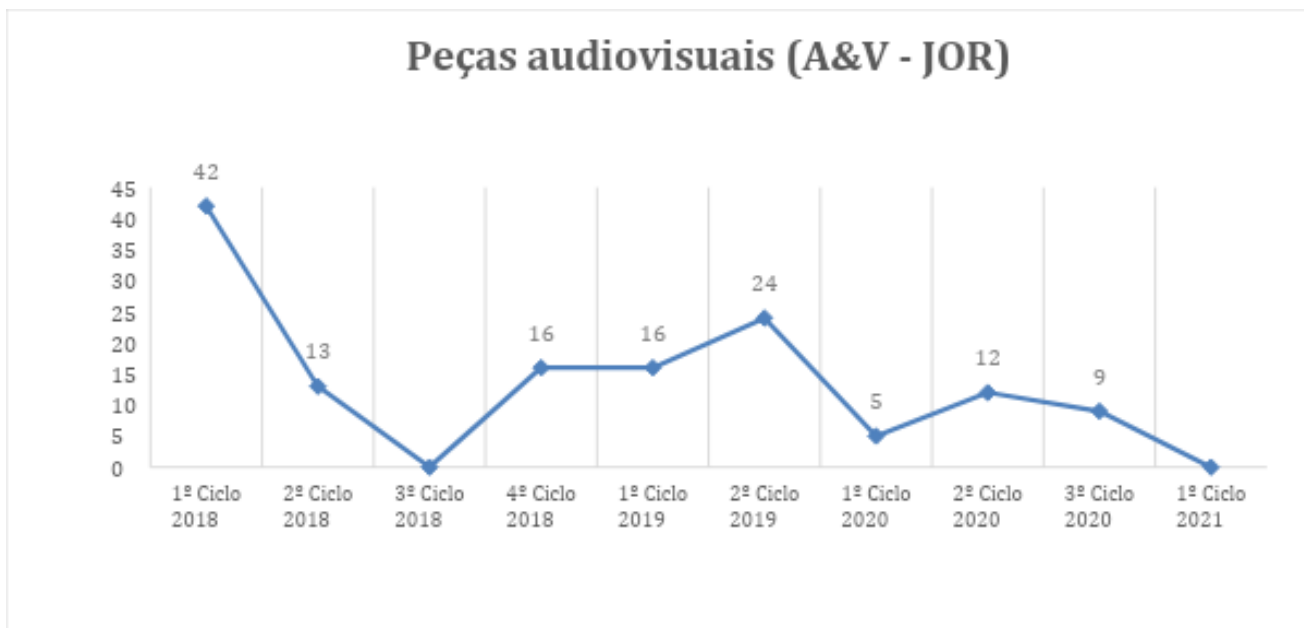

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- a) Fórmula: $\sum$ Produções em Ações de Publicidade e Design = **44** (Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.
- d) Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
- Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - Produções para jornalismo;
 - Produções para demandas internas;
 - Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.
- e) Período da aferição: 01/01/2021 a 31/03/2021.
- f) Comentários: resultados dentro do esperado.

g) Representação gráfica dos resultados:



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

8. Conclusão

A finalização desse 1º ciclo representa o início do processo de monitoramento desse respectivo ano. Como já mencionado a pandemia do Covid-19 está sendo um desafio para a Sudene, e conforme observado pelos dados dos projetos e indicadores, tiveram significativo impacto no andamento dos trabalhos do órgão.

Outro fator relevante que impactou nos resultados, a exemplo dos indicadores de Gestão de Convênios, foi o atraso na sanção e publicação do orçamento.

Contudo, apesar dos entraves acima mencionados, observou-se que neste ciclo de monitoramento, houve uma evolução em relação aos status dos projetos do anterior, mais precisamente os que estão em **andamento**, **paralisados** e **atrasados**, conforme o quadro abaixo:

Status Projetos	3º ciclo/2020	1º ciclo/2021
Em Andamento	177	182
Atrasados	18	17
Paralisados	10	7

Isso reflete o esforço da instituição em entregar produtos à sociedade e de buscar alternativas para alavancar suas ações mesmo nesse período de pandemia, bem como a necessidade de adaptação aos novos desafios.

A fim de tornar esse processo de monitoramento mais efetivo para o órgão e para os usuários, a Coordenação Geral de Gestão Institucional, responsável pela metodologia e realização desse processo na autarquia, permanece em busca de aprimorar o acompanhamento, revisão e ajuste dos projetos para atender aos objetivos de desempenho definidos nas metas institucionais.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto: PO	CGDS/2012001
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental		Ano:	2012
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.			
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE			

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
		100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	31/03/2021	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Victor Uchôa Silva - SUDENE
		Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 530.482,50
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 530.482,50

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	31/03/2021	Vigência: 28/12/2012 a 31/12/2021.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Victor Uchôa Silva - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								80,0%	Em Andamento		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	24/06/2020	--	15/11/2014	06/12/2019	--	100,0%	Concluído	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordeste.	
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	24/06/2020	--	08/12/2014		--	100,0%	Concluído	A célula K7 representa a data do encerramento da Meta 1. Portanto, ela só poderá ser preenchida quando a Etapa 3 for concluída (célula K45).	

7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	Concluído	
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	R\$ 265.241,25	20/08/2018	20/08/2018	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias	SEMAS/PE	09/07/2018	24/06/2020	--	09/07/2018	30/07/2019	--	100,0%	Concluído	
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	24/06/2020	--	--	--	--	40,0%	Paralisado	Este evento estava previsto para ser realizado em três dias, envolvendo o dia 28/04/2020. Entretanto, devido a pandemia, este evento teve sua realização adiada, com data a definir.
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	24/06/2020	--	01/05/2014	04/03/2021	--	100,0%	Concluído	
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	Concluído	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	24/06/2020	--	17/02/2020	04/03/2021	--	100,0%	Concluído	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/03/2019	11/07/2019	--	20/03/2019	11/07/2019	--	100,0%	Concluído	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/01/2022	31/12/2022	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 530.482,50	77%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.												
Observações:												
* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público N° 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio realizados. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. O convênio foi aditivado ampliando a vigência para 24/06/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020.												
ATUALIZADO												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDS/2014001 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Previsão de Conclusão:	26/12/2021	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	31/03/2021	Vigência até: 26/12/2021

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 343.585,70
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ -
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 343.585,70

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas Souto/ Vera Lúcia Assunção - EMPAER/PB - Wandrick Haus de Sousa
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								50,5%	Paralisado		Este convênio foi aditivado, em função da pandemia, que paralisou algumas de suas
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído		
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		

11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/03/2020	-	24/10/2015		-	96%	Paralisado	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	13/10/2015	22/03/2020	-	03/12/2015		-	80%	Paralisado	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/12/2019	-	14/09/2015		-	100%	Concluído	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento	
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	22/03/2020	-	27/11/2015		-	65%	Paralisado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R\$ 137.434,28	100%	Concluído	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes, que encontram-se paralizadas devido a pandemia.	Aguardando a resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2020	-			-	0%	Atrasado		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 343.585,70	70%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:
Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para **30/09/2019**. Devido à pandemia este convênio foi prorrogado de Ofício até **31/12/2020**, entretanto, a Conveniente ainda precisa ajustar o seu Plano de Trabalho para esse novo período de execução.

* Vigência do CV ampliada até 26/12/2021, considerando a pandemia do COVID-19 e a conclusão das atividades pendentes. ** Agendada e realizada reunião de acompanhamento, em 19/03/2021, pela manhã, entre coordenações técnicas, EMPAER e CODEM/CGDS e equipe técnica CODEM, para saber dos impactos da pandemia na região envolvida e das perspectivas/alternativas de retomada e conclusão das atividades pendentes, paralizadas pela pandemia.

ATUALIZADO

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO CGDS/2015001 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2015
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada N° 002/2015
Data Atualização:	31/03/2021	Vigência: 31/03/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel / Felipe Barbosa

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAA.
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído	
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAA.
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										17,0%	Paralisado	
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		85%	Paralisado	Não foi possível a conclusão do parecer técnico final no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, sendo necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Além disso, este processo teve a sua digitalização concluída recentemente. Assim, pretende-se retomar a elaboração para conclusão deste parecer técnico final.
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	97%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Observações:
O servidor Carlos Almira Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto. O servidor José Aildo Sabino foi realocado para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas (CGEP).

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDS/2018006 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2018
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa maneira, busca-se contribuir p		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV e na elaboração de projetos		
Projeto:	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais dos Estados da Bahia e Sergipe		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valor utilizado	Valor devolvido
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$60.869,41	R\$60.869,41	R\$ 48.486,1	R\$ 12.383,31

Previsão de Conclusão:	00/01/1900
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção/ Amauri Nascimento (Teresa Oliveira - CGCP) / ESAF-BA: Luciano Costa e Rita Correia
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 60.869,41
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Passagens e diárias dos instrutores (recursos adm. Sudene)	R\$ 12.676,50
Total Liberado até o exercício	R\$ 60.869,41

*Outros recursos vinculados ao projeto (que não foram descentralizados, mas que a Sudene arcou diretamente - como passagens e diárias para os instrutores dos cursos) = R\$ 12.676,50

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)		15/01/18	30/12/18	-	17/01/18	27/11/18	-	30%	Concluído		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017 e Definição das Metas Institucionais para o Ciclo 2017/2018	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/10/2017		13/06/2017	20/12/2017		100%	Concluído	Meta nº 11: Articulação e formalização de instrumentos (Convênios, TEDs) para capacitação de servidores de municípios com vistas ao Fortalecimento Institucional, com foco em captação de recursos federais via SICONV	
2	Definição da estratégia de atuação	Elaboração de pesquisa para definição das cidades polos de oferta de curso, municípios alvo prioritários, definição de métodos de avaliação da política	DPLAN/CGEP + CGDS	15/01/2018	07/02/2018		17/01/2018	19/02/2018		100%	Concluído	Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a coordenação de Estudos e Pesquisas - CGEP	
3	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto, o conteúdo dos cursos, o plano de trabalho, definição da quantidade de turmas...	DPLAN / CGDS	15/01/2018	19/02/2018		17/01/2018	18/04/2018		100%	Concluído		
4	Instrução Processual e trâmites jurídicos administrativos	A etapa refere-se a todo o procedimento elaboração de pareceres técnicos, junção de documentos obrigatórios, parecer jurídico, verificação de disponibilidade financeira	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CGAF, CONJUR-SUDENE	29/01/2018	30/03/2018		27/02/2018	-		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/04/2018	29/11/2018		08/05/2018			60%	Concluído		
5	Assinatura do Termo de Descentralização	Formalização do Instrumento	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/04/2018	02/04/2018		08/05/2018	08/05/2018		100%	Concluído		
6	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	03/04/2018	03/04/2018	R\$ 60.869,41	24/05/2018	24/05/2018	R\$ 60.869,41	100%	Concluído		
7	Mobilização e Divulgação dos Cursos	Elaboração da Estratégia de Mobilização/Comunicação e Divulgação e sua implementação. . Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a assessoria de comunicação da Sudene e outros parceiros institucionais do governo federal, estaduais e e municipais	CGDS/DPLAN/ASCOM	25/01/2018	29/11/2018		25/05/2018	19/11/2018		100%	Concluído		

8	Acompanhamento tecnico com o parceiro	Reunioes presenciais e por video para ajustes das atividades	CGDS - CENTRESAF BA	02/04/2018	30/12/2018		08/05/2018	27/11/2018		100%	Concluído			
9	Realização dos cursos - Fase SALVADOR- BA	Realização de 2 Seminário, 4 turmas de Elaboração de Projetos, 4 turmas de Siconv I e 4 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	30/07/2018	27/09/2018		30/07/2018	27/09/2018		100%	Concluído			
10	Realização dos cursos - Fase FEIRA DE SANTANA- BA	Realização de 1 Seminário, 1 turmas de Elaboração de Projetos, 1 turmas de Siconv I e 1 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	17/09/2018	27/09/2018		15/10/2018	18/10/2018		100%	Concluído			
11	Realização dos cursos - Fase VITÓRIA DA CONQUISTA- BA	Realização de 1 Seminário, 2 turma de Elaboração de Projetos, 2 turmas de Siconv I e 2 turmas de Siconv II	CENTRESAF-BA	16/10/2018	29/11/2018		19/11/2018	27/11/2018		100%	Concluído			
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										#ERROR!	Concluído			
12	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2019	01/03/2019		12/02/2019	05/04/2021		100%	Concluído	Parecer Técnico 48, de análise da prestação de contas final, do TED 003/2018,concluído, por equipe CODEM/CGDS,com posicionamento favorável a sua aprovação. Encaminhado à apreciação superior e outras providências.		
				Valor Previsto:		R\$	60.869,41	Valor realizado:		R\$	60.869,41	#VALOR!	Concluído	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:													
CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA													
Observações:													
ATUALIZADO													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO CGDS/2020005 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:		1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2020
Programa:		2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-	
Ação:		4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-	
Finalidade da ação:		Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado.			
Diretoria responsável:		DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:		Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):		A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em infraestrutura para criação de cursos de formação e capacitação nas tecnologias emergente. A área de gerenciamento de Datacenters e desenvolvimento de tecnologias para a Computação em Nuvem são setores que atualmente não contam cursos especializados em Pernambuco			
Projeto:		Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)			
Objetivo do projeto:		Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 425.000,00	426.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Convênio SICONV 893892/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Morais
	UPE	Prof. Paulo Hugo, Prof. Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 425.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 425.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)								9%	Em Andamento		
2.1	Liberção da primeira parcela de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/04/2021	30/04/2021	R\$ 320.000,00	--	--		0%	A Iniciar	Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021. A previsão atual é de que ocorra a primeira liberação de recursos em maio/2021.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
2.2	Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Manguê Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo Manguê Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	01/05/2021	30/11/2021		05/02/2020	--		30,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de capacitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv

2.3	Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Manguê Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	01/04/2021	30/10/2021		28/08/2020	--		30,0%	Em Andamento	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distância, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Primeiro evento em Julho/2021. último em outubro, eventos quinzenais.
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	O programa de residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e	UPE	01/07/2020	30/09/2021		07/01/2021			40,0%	Em Andamento	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Início das aulas em 07 de janeiro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/07/2021	31/07/2021	R\$ 105.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/10/2021	10/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		16/11/2021	30/11/2021		01/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/12/2021	15/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 425.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	29%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003242/2019-24													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDS/2020006 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-		
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MDR):	-		
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra		
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistêmica em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalização da economia e seus impactos na indústria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carência destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.				
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação - PE 4.0				
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construção de planos de ação prática em 10 indústrias de setores diversos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 340.000,00	R\$ 341.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Convênio SICONV 893056/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias, Juliana Borges
	UPE	Prof. Djalma Guimarães

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 340.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 340.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)											
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)											
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	30/03/2021	R\$ 260.000,00				100,0%	Concluído	Problemas relacionados à crise do covid19	parcela para em 16/03
2.2	Meta 1: Mobilização de empresas e aplicação da metodologia PE 4.0	Serão identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e início do estudo e aplicação da metodologia	UPE	30/09/2020	30/05/2020		05/02/2020	15/09/2020		100,0%	Concluído	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi feito com novas datas
2.3	Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no	UPE	30/09/2020	30/08/2021		30/09/2020			50,0%	Em Andamento	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente me fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020.	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas serão iniciadas em 20/01/2021.

2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/04/2021					0,0%	A Iniciar		
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/04/2021	30/08/2021	R\$ 80.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 340.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	45%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003248/2019-00													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO CGDS/2020007 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-	
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-	
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Os provedores na nuvem dependem hoje de data centers distribuídos, que hospedam servidores e dispositivos de rede. Propõe-se a criação da primeira plataforma da América Latina para preparar profissionais e empresas, uma vez que há uma carência de cursos em gerenciamento de Datacenters.			
Projeto:	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.			
Objetivo do projeto:	Capacitar estudantes e profissionais em computação na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 649.777,57	651.777,57

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Convênio SICONV 892599/2019

Vigência: 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Moraes
	UPE:	Bruno Carvalho

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 649.777,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 649.777,57
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								9%	Em Andamento		
2.1	Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	31/12/2020	30/30/2021	R\$ 649.777,57				0,0%	A Iniciar		
2.2	META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	30/12/2019	30/06/2021		05/02/2020			30,0%	Em Andamento	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio	Foi refeita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem perder o objeto e objetivo do convênio
2.3	META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	01/07/2021	30/08/2021		05/02/2020			30,0%	Em Andamento	Diversas reuniões foram realizadas, sendo última reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência.	Envio de nova cotação, para início do processo licitatório

2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 649.777,57		Valor realizado:		R\$ 0,00		29%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros Institucionais:													
Universidade de Pernambuco - UPE													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.003160/2019-80													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDS/2020008
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)		Eixo temático (MDR):		
Ação do PPA:	8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas		Objetivo estratégico (MDR):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.	
Objetivo da ação:	Ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva, buscando a melhoria da produtividade e competitividade de empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	CODEM/CGDS/DPLAN	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	Dificuldades de acesso a tecnologias por empreendimentos agros de médio e pequeno porte				
Projeto:	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte				
Objetivo do projeto:	Implantar 6 (seis) unidades piloto de produção de biogás adaptadas para empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio grande do Norte e Ceará para ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R\$550.000,00	R\$550.000,00

Previsão de Conclusão:	12/22
Data Atualização:	31/03/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDSDPLAN/SUDENE - Amauri Nascimento; Leonardo Morais / INSA: Mônica Tejo.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 550.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 550.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	30%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	15/12/20	23/12/20		15/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/20	25/12/20		21/12/20	25/12/20		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	17/12/20	21/12/22		17/12/20	21/12/20		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	23/12/20	23/12/23		23/12/20	23/12/20		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	28/12/20	28/12/20		28/12/20	28/12/20		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								12%	Em Andamento		
2.1	Liberção da parcela única de recursos	Liberção da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	28/12/20	28/12/20	R\$ 550.000,00	28/12/20	26/2/21	R\$ 550.000,00	100,0%	Concluído	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021.	

2.2	META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/01/21	31/12/22					0,0%	A Iniciar	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto ainda a ser realizada.	Marcar a reunião.	
2.3	META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	01/04/21	31/12/22					0,0%	A Iniciar			
2.4	META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/09/21	31/12/22					0,0%	A Iniciar			
2.5	META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	01/01/21	31/12/22					0,0%	A Iniciar			
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar			
3.1	Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	01/01/2022	12/22					0,0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	550.000,00	Valor realizado:		R\$	550.000,00	42,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDS/2020009
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)			Objetivo PPA 2020-2023:	Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340) - Programa SUDENE: "Tecnologia e Inovação para Convivência no Semiárido - Reuso de águas cinzas"			Objetivo estratégico (MDR):	Desenvolver a Capacidade Produtiva das Regiões
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez de água destinada a produção da agricultura familiar devido aos grandes períodos de seca, e a falta de projetos que visem a utilização de tecnologias sustentáveis para o reuso da água em sistemas produtivos no semiárido nordestino.				
Projeto:	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense. (Convênio n.º 903159/2020. Processo SEI 59336.001156/2020-11)				
Objetivo do projeto:	Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinza com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				R\$ 476.011,69	R\$ 477.011,69

Previsão de Conclusão:	31/12/2023	CONVÊNIO Nº 903159/2020 (Proposta: 009483/2020)
Data Atualização:	31/3/2021	Vigência: 28/12/2020 a 26/07/2023

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	
dez/20	R\$ 476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	A realizar no exercício RAP	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$476.011,69	R\$ 1.000,00	R\$ 477.011,69	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 476.011,69
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 476.011,69
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE: José Farias e Juliana Borges Município São Raimundo Nonato: André Santos Landim
--	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	25/06/2020	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS			-	06/07/2020	24/07/2020	-	100%	Concluído		
4	Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS			-	01/08/2020	13/08/2020	-	100%	Concluído		
5	Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE			-	12/08/2020	28/12/2020	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	A iniciar		
6	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	01/03/2021	30/05/2021					10%	A iniciar	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório	Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitatório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04.
7	Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	A iniciar		
8	Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A iniciar		

9	Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	A iniciar		
10	Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	01/02/2021	a definir					0%	A iniciar		
11	Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	28/12/2020	01/02/2021					0%	A iniciar		
12	Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
13	Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	01/02/2021	01/04/2021					0%	A iniciar		
14	Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
15	Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	01/04/2021	01/06/2021					0%	A iniciar		
16	Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
17	Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/06/2022					0%	A iniciar		
18	Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
19	Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/12/2021					0%	A iniciar		
20	Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
21	Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	01/06/2022	26/07/2022					0%	A iniciar		
22	Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS							0%	A iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
23	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	25/09/2022	25/11/2022	-			-	0%	Em Andamento		
Valor Previsto: R\$ 477.011,69										20%	Status do Projeto		

Parceiros Institucionais:													
Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.													
Observações:													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente).

Legenda	
	A iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDS/2020010
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Busca-se contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	É ainda incipiente a incorporação da área de saúde digital na formação dos novos profissionais de saúde, principalmente no interior e nas áreas rurais, bem como para aqueles que já se encontram ativos ou que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. É fundamental preparar os profissionais para enfrentar os novos desafios trazidos pela incorporação tecnológica em suas práticas clínicas e ações interventivas no território, criando condições para ampliar o acesso e a qualidade da assistência ao paciente no SUS.		
Projeto:	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)		
Objetivo do projeto:	Saúde Pública do PRDNE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3	90	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00

Previsão de Conclusão:	13/5/2024	TED n.º 10/2020
Data Atualização:	31/3/2021	13/5/2023

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Juliana Borges, Amauri Nascimento e Vera Assunção; coordenação CODEM/CGDS: Victor Uchôa / UFPE: Magdala Novaes (NUTES)
---	---

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	
dez/20	R\$ 969.572,00		R\$ 969.572,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 969.572,00
	R\$ 969.572,00	R\$ 0,00	R\$ 969.572,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 969.572,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota Técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da 8917.	
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020	-	100%	Concluído	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020	-	100%	Concluído	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene, adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020	-	100%	Concluído	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto nº 10.426/2020 que regulamentou a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODM emite parecer técnico nº 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020	-	100%	Concluído	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 por meio da 363ª Reunião Extraordinária.	
7	Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020	-	100%	Concluído	Extrato publicado em 17/11/2020.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								15,00%	Em Andamento		
8	Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2020	30/11/2020	R\$ 969.572,00	18/11/2020	15/12/2020	R\$ 969.572,00	100%	Concluído	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
9	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020	-	100%	Concluído	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	

10	Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	01/02/2021	15/3/2021		2/2/2021	3/3/2021		100%	Concluído	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência dos municípios em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE, a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.	
11	Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	01/03/2021	31/03/2021		3/3/2021				Em Andamento	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Será transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento.	
12	META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	01/01/2021	30/04/2021		--	--	--	0%	A Iniciar		
13		Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	01/01/2021	31/05/2021		--	--	--	0%	A Iniciar		
14		Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	01/03/2021	30/06/2022		--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	--	--		--	--	--	0%	A Iniciar		
16	META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	01/05/2021	31/12/2022		--	--	--	0%	A Iniciar		
17		Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar a estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	01/04/2021	13/05/2023		--	--	--	0%	A Iniciar		
18	Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	--	--		--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
19	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	13/05/2023	13/05/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:				R\$ 969.572,00		Valor realizado:				R\$ 969.572,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto
Institucionais:													
UFPE/NUTES - Núcleo de Telessaúde da UFPE													
Observações:													
As articulações para formação e viabilização desta proposta foram iniciadas no ano de 2019, porém, só começaram a se materializar, chegando à formalização, em 2020, como demonstrado nas etapas elencadas na "Iniciação".													
23/12/2020 - Sudene divulga em seu site institucional a parceria com o NUTES/UFPE para realização do projeto.													
ATUALIZADO													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

PLANO DE AÇÃO 2021				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO CGDS/2020011
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos		Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-	
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-	
Finalidade da ação:	desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias, estudos e projetos técnicos, promoção de capacitações, formação de multiplicadores, intercâmbio de produtores, instalação de unidades demonstrativas, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismo como opção de organização social e produtiva.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra	
Problema (causa):	havendo carência destes cursos em Pernambuco e no Nordeste.			
Projeto:	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação-NE 4.0			
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalização da indústria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construção de planos de ação prática em 40 indústrias de setores diversos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 1.264.680,00	1.265.980,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Convênio SICOV 907660/2020
Vigência 30/11/2022

Responsável(e)s técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE: José Farias, Juliana Borges
	UPE: Prof. Djalma Guimarães, Prof. Alexandre Maciel

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 1.264.680,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.680,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)							20%	Concluído		
1.1	análise técnica da	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios	CGDS	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020	100,00%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020	100,00%	Concluído		
1.3	Termo de Convênio	Elaboração do termo de Convênio	CCONT	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020	100,00%	Concluído		
1.4	Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	30/12/2020	100,00%	Concluído		
1.5	Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	02/01/2020	17/01/2020		02/01/2020	17/01/2020	100,00%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 70%)							2%	Andamento		
2.1	primeira parcela de	transferência de recursos financeiros	CGAF /DAD /	01/02/2021	30/05/2021				10,00%	A Iniciar		
2.2	Lançamento do	transferência de recursos financeiros para participantes do projeto, escolha dos alunos	da Paraíba, Ceará,	01/02/2021	30/07/2021				40,00%	Andamento	foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do	Núcleo Estadual montado.
2.3	contas parcial	convênio referente à 1ª parcela	UPE	01/06/2021	30/06/2021				0,00%	A Iniciar		
2.3	Capacitação de	programa de residência de desenvolvimento pelo IIT e contará com a	UPE	01/06/2021	30/03/2022				10,00%	Andamento		construção do edital de seleção dos
2.4	segunda parcela de	transferência de recursos financeiros	CGAF /DAD /	01/10/2021	30/10/2021				0,00%	A Iniciar		
2.5	de planos de ação	realização dos projetos/pilotos de ação em indústria 4.0, como resultado da Residência,	da Paraíba, Ceará,	01/12/2021	30/06/2022					A Iniciar		
2.6	contas parcial	convênio referente à 2ª parcela	UPE	01/01/2022	30/01/2022					A Iniciar		
2.7	terceira parcela de	transferência de recursos financeiros	CGAF /DAD /	01/03/2021	30/03/2021				0,00%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)							0,00%	A Iniciar		
3.1	contas final	convênio de prestação de contas entre as partes	UPE	01/07/2022	15/08/2022				0,00%	A Iniciar		
3.2	Relatório Final	Análise da prestação de contas sob ponto de vista de execução física	CGDS	16/08/2022	30/09/2022				0,00%	A Iniciar		
3.3	prestação de	Análise da prestação de contas sob ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/10/2022	30/10/2022				0,00%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		Valor realizado:			R\$ 0,00	22%	Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Universidade de Pernambuco - UPE	
Observações:	
Processo SEI n.º 59336.002257/2020-17	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

	PLANO DE AÇÃO 2021				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDS/2020012
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-		
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Objetivo estratégico (MDR):	-		
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva,				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra		
Problema (causa):	Necessidade de melhoria da qualidade do rebanho da ovinocaprinocultura nos polos do Nordeste e da assistência técnica mais próxima e adequada às necessidades dos produtores rurais				
Projeto:	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica				
Objetivo do projeto:	Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos do Rota do Cordeiro no Nordeste.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	426.466,90	426.466,90

Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

TED processo 59336.000769/2020-31

Vigência: 30/11/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas, Amauri Nascimento.
	Embrapa	Marco Bonfim

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 426.466,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 0
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 426.466,90

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	19/05/2020	31/7/2020		19/05/2020	22/6/2020		100,00%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	01/07/2020	30/9/2020		01/07/2020	02/09/2020		100,00%	Concluído		
1.3	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	29/06/2020	29/7/2020		29/06/2020	23/7/2020		100,00%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	5/19/2020	10/30/2020		05/09/2020	10/20/2020		100,00%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%			
2.1	Liberção da parcela única de recursos	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 426.466,90	25/11/2020	30/12/2020	R\$ 426.466,90	100,00%	Concluído		
2.2	META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	01/11/2020	30/06/2021		05/02/2020			0,00%	Em Andamento		
2.3	META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiários para melhoria da qualidade da	Embrapa	01/07/2021	30/08/2021		05/02/2020			0,00%	Em Andamento		
2.4	Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	01/06/2021	30/09/2022						Em Andamento		
2.5	Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados	Embrapa e Sudene	01/06/2021	30/12/2021					0,00%	Em Andamento		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,00%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		01/10/2022	30/10/2022				0,00%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2022	15/11/2022				0,00%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/11/2022	30/11/2022				0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 426.466,90		Valor realizado:		426.466,90	20%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:												
Embrapa Ovino e Caprinos												
Observações:												
Processo SEI n.º 59336.000769/2020-31 Atualizado.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDS/2020013
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	Eixo temático (MDR):			
Ação do PPA:	8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MDR):			
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, inform				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CODEM/CGDS/DPLAN		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra CGDS/DPLAN		
Problema (causa):	A agricultura familiar está sendo impactada pela pandemia do Covid-19. O desconhecimento de técnicas e ferramentas por grande parte dos produtores rurais evidencia a inexistência do papel de empreendedor que agrega valor aos seus produtos e impulsiona seu negócio				
Projeto:	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ACELERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO PÓS PANDEMIA DE COVID-19				
Objetivo do projeto:	econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED 11/2020	R\$465.839,00	R\$465.839,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2022
Data Atualização:	31/03/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDSDPLAN/SUDENE - Vera Lúcia Assunção, Amauri Nascimento/ INSA: Mônica Tejo.
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 465.839,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 465.839,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	30%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	15/10/2020	24/11/2020		15/10/2020	24/11/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	19/11/2020	19/11/2020		19/11/2020	19/11/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	26/11/2020	26/11/2020		26/11/2020	26/11/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	30/11/2020	30/11/2020		30/11/2020	30/11/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								7%	Em Andamento		
2.1	Descentralização dos créditos	Transferência de créditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	30/11/2020	30/11/2020	R\$ 465.839,00	30/11/2020	10/02/2021*	R\$ 465.839,00	100,0%	Concluído	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208, de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	

2.2	Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semiário brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa;	INSA	01/12/2020	31/12/2021		--	--		0,0%	A Iniciar	Até o momento, a Sudene não foi informada da realização deste atividade.			
2.3	Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semiário que fazem parte dos estados participantes do programa; Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo	INSA	01/02/2021	31/03/2021		--	--		0,0%	Atrasado	Na data de atualização de PO (31/03/2021) este evento ainda não havia ocorrido. Entretanto, o Evento on line de lançamento e divulgação do Edital de seleção de empreendimentos rurais com a participação de possíveis parceiros ocorreu em 07/04/2021, inclusive, com a participação do Superintendente da Sudene.			
2.4	Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semiário, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	01/03/2021	31/03/2021		--	--		0,0%	Atrasado	Até o momento, a Sudene não foi informada da realização deste atividade.			
2.5	Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semiário contemplados no programa.	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas; Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e	INSA	01/12/2020	30/11/2022		--	--		0,0%	A Iniciar				
2.6	Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;	INSA	01/12/2020	31/01/2022		--	--		0,0%	A Iniciar				
2.7	Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	01/02/2021	31/01/2022		--	--		0,0%	A Iniciar				
2.8	Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiário participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de	INSA	01/03/2021	30/11/2022		--	--		0,0%	A Iniciar				
2.9	Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	01/12/2020	30/11/2022		--	--		0,0%	A Iniciar				
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0%	A Iniciar				
3.1	Prestação de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED,.	CGDS	01/02/2022	30/04/2022					0,0%	A Iniciar				
				Valor Previsto:		R\$	465.839,00		Valor realizado:		R\$	465.839,00	36,7%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIO - INSA

Observações:

Processo: nº 59336.001673/2020-90

ATUALIZADO

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2019001 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.5 - Fortalecer as administrações públicas.			Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-		
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Falta de avaliação sobre qualidade dos gastos dos municípios na área de atuação da Sudene				
Projeto:	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)				
Objetivo do projeto:	Elaboração de índice sobre gestão fiscal dos Municípios da área de atuação da Sudene				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/10/2020
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória Sistêlos
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Dados		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/01/2020	-	01/10/2019	31/01/2020		100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para os estados da área de atuação da Sudene.	
1.1	Identificação do estado do projeto	Identificação dos estados e indicadores para conclusão do projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/10/2019	-	01/10/2019	31/10/2019		100%	Concluído		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/10/2019	30/11/2019	-	31/10/2019	30/11/2019		100%	Concluído		
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	30/11/2019	31/01/2020		30/11/2019	31/01/2020		100%	Concluído		
2	Análise		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	01/04/2020	-	31/01/2020	22/05/2020		100%	Concluído		
2.1	Padronização dos dados	Normalização dos indicadores selecionados para escala de referência	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	28/02/2020	-	31/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
2.2	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético composto por indicadores selecionados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	28/02/2020	13/04/2020	-	28/02/2020	22/05/2020		100%	Concluído		
2.3	Validação final do índice	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	13/04/2020	03/05/2020		13/04/2020	22/05/2020		100%	Concluído		
3	Ranking de gestão fiscal		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	30/10/2020	-	12/05/2020	30/10/2020		90%	Atrasado		

3.1	Ranking de municípios	Elaborar ranking de municípios de acordo com resultado dos indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	17/06/2020	-	12/05/2020				Cancelado	Conforme determinação da 363ª Reunião de Diretoria Colegiada, houve análise da metodologia e dos objetivos para esta atividade. Considerando o retorno dos Tribunais de Conta dos Estados, identificou-se a inviabilidade de continuidade contemplando esse aspecto, de tal forma que garanta a disponibilização de informações recentes.	O Projeto prosseguirá com outra metodologia, para os 11 estados, adotando a metodologia do Índice elaborado pelo CFA, o qual contempla indicadores utilizados no Ranking.
3.2	Tratativas CFA para IGM - Sudene	Participação na elaboração do ACT com CFA e definição dos recortes e detalhamento do índice para área de atuação da Sudene.	Gabriela Nascimento, Maria da Glória, Tássia Germano e Marina Rogério.	01/07/2020	30/10/2020	-	01/07/2020	30/10/2020		100%	Concluído	Considerando a adoção do novo índice (IGM/CFA) foram incluídas as etapas para conclusão do projeto.	
3.3	Tratativas Publicização do Ranking IGM-CFA	Tratativas para publicização do ranking IGM CFA para os estados da área de atuação da Sudene	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento, Tássia Germano e Maria da Glória	01/11/2020	31/12/2020		01/11/2020	18/12/2020		100%	Concluído		
3.4	Relatório de análise	Elaborar relatório final	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	17/06/2020	30/09/2020	-	11/08/2020			70%	Atrasado	Solicitação de postergação do prazo devido as novas determinações da Diretoria Colegiada a respeito do projeto e à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Pesquisa Impacto da Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 30/03/2021. O projeto encontra-se atrasado devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Pesquisa Impacto da Covid-19). Tem-se como novo prazo previsto para conclusão o dia 30/06/2021.	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	97%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

CFA - Conselho Federal de Administração

Observações:

Trata-se de um projeto de continuidade do ciclo anterior, conforme Processo SEI 59336.002609/2019-92

Do total de 11 Estados, 5 foram integralmente conclusos, dos quais 4 foram divulgados e receberam premiação (ciclo 2018/2019) e 1 concluído no ciclo 2019/2020, com resultado a ser divulgado (aguardo fim do defeso eleitoral). Os demais (6 Estados) tiveram índice concluídos, entretanto a situação de regularidade das Contas não foram realizadas devido à não resposta dos Tribunais de Contas Estaduais. Devido a inviabilidade da continuidade da ranking considerando a verificação junto aos TCE e por determinação da 363ª Reunião da Diretoria Colegiada, prosseguiu-se com nova metodologia com uso do IGM/CFA. O mesmo apresenta um hall mais amplo de indicadores, considerando diversas dimensões e painel dinâmico.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO CGEP/2019002 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Demanda do setor produtivo de palma por colheita mecanizada, a qual diminuirá os custos e aumentará o rendimento da produção		
Projeto:	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma		
Objetivo do projeto:	Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	29/05/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino; Joyce Silva; Marcelo Saiki
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	01/03/2019	31/03/2019	-	01/03/2019	31/03/2019	-	100%	Concluído		
2	Articulação									100%	Concluído		
2.1	1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	15/04/2019	15/04/2019	-	15/04/2019	15/04/2019	-	100%	Concluído	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2.2	2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	15/08/2019	15/08/2019	-	15/08/2019	15/08/2019	-	100%	Concluído	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapil)
2.3	Reunião de articulação entre Sudene e Embrapil	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapil (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	16/10/2019	16/10/2019	-	16/10/2019	16/10/2019		100%	Concluído	Articulação entre Sudene e Embrapil, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapil

2.4	Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100%	Concluído	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
2.5	Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	01/11/2019	31/11/2019		01/11/2019	31/11/2019		100%	Concluído		
3	Planejamento de Evento (Reunião Técnica - TECHPALMA)									100%	Concluído		
3.1	Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100%	Concluído		
3.2	Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100%	Concluído	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe técnica da CGEP	
3.3	Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100%	Concluído		
3.4	Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100%	Concluído		
3.5	Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100%	Concluído		
3.6	Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100%	Concluído		
3.7	Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100%	Concluído		
4	Acompanhamento									70%	Em Andamento		

4.1	Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os participantes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020		100%	Concluído	Durante o evento TechPalma foi identificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financiar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concluída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheidora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referencias culturais para o desenvolvimento da colheidora;	
4.2	Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	01/05/2020	31/12/2021		23/08/2020			40%	Em Andamento	Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lançar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021	
5	Avaliação									0%	A iniciar		
5.1	Avaliação dos resultados do projeto	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	01/10/2021	30/03/2022					0%	A iniciar	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021	
5.2	Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	30/03/2022	29/04/2022					0%	A iniciar		
5.3	Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	29/04/2022	29/05/2022					0%	A iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	74,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO CGEP/2019003 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:		2019
Programa do PPA:	-		Eixo temático (MDR):			
Ação do PPA:	-		Objetivo estratégico (MDR):			
Objetivo da ação:	-					
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves		
Problema (causa):	Com base na proposição nº 105/2017, feita pela Sudene ao CONDEL, em seu Art. 3º, o qual diz que: os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.					
Projeto:	Redelimitação do Semiárido					
Objetivo do projeto:	Discutir as bases técnicas para os estudos dos critérios técnicos e científicos para a nova redelimitação do semiárido, prevista para ocorrer em 2021.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	26/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Ludmila, Victor
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento									100%	Concluído		
1.1	Planejamento das etapas	Planejamento das etapas	CGEP	01/12/2019	31/01/2020		01/12/2019	10/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Formação do GT Sudene	Formação do GT Sudene		01/02/2020	29/02/2020		10/02/2020				Cancelado		
1.3	Revisão de Literatura	Revisão de Literatura	CGEP, CGCP, CGDS	01/02/2020	15/03/2020		18/08/2020	30/09/2020		100%	Concluído		
1.4	Reunião de fechamento	Reunião de fechamento	CGEP, CGCP, CGDS	01/10/2020	01/10/2020		22/11/2020	22/11/2020		100%	Concluído		
2	Articulações com Parceiros									27%	Atrasado	"Com relação à etapa 2 (Articulações com parceiro), vale destacar que no planejamento inicial, a mesma tinha previsão de realização entre março e maio de 2020. Contudo, esse ano tem sido bastante atípico, em razão da ocorrência inesperada da pandemia do novo Coronavírus. Essa pandemia ocasionou – e vem ocasionando - profundas mudanças na questão da saúde pública mundial, com impactos nas áreas social, econômica, política etc. Desde março de 2020, as atividades de diversos setores – tanto públicos quanto privados – vêm sendo impactadas, refletindo em atrasos ou até mesmo em paralisações de projetos ou ações previstas. Como algumas das atividades previstas foram pensadas para serem executadas de forma presencial, a exemplo das reuniões técnicas de discussão, tanto as no âmbito da Sudene quanto as interinstitucionais, não houve tempo hábil para se executar tais atividades, uma vez que as instituições estão ainda se adaptando à nova forma de trabalho atualmente em uso, por meio remoto. Assim, a etapa de articulação com os parceiros tem previsão de ser executada em outubro de 2020. Para essa etapa, os parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."	
2.1	Levantamento dos parceiros	Levantamento dos parceiros	CGEP, CGCP, CGDS	02/10/2020	09/10/2020		01/10/2020			80%	Atrasado		
2.2	Contato com os parceiros	Contato com os parceiros	CGEP, CGCP, CGDS	12/10/2020	23/10/2020					0%	Atrasado		

2.3	Recebimento de Feedback	Recebimento de Feedback	CGEP, CGCP, CGDS	26/10/2020	06/11/2020					0%	Atrasado		
3	Definição da Metodologia									0%	Atrasado		
3.1	Preparação da Reunião	Preparação da Reunião	CGEP, CGCP, CGDS	09/11/2020	13/11/2020					0%	Atrasado		
3.2	Reunião de planejamento interinstitucional	Reunião de planejamento interinstitucional	CGEP, CGCP, CGDS	16/11/2020	30/11/2020					0%	Atrasado		
3.3	Definição da Metodologia	Definição da Metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	01/12/2020	01/02/2021					0%	Atrasado		
3.4	Preparação de Reunião	Preparação de Reunião	CGEP, CGCP, CGDS	02/02/2021	15/02/2021					0%	Atrasado		
3.5	1a Reunião de discussão técnica	1a Reunião de discussão técnica	CGEP, CGCP, CGDS	16/02/2021	28/02/2021					0%	Atrasado		
3.6	Reunião de discussão técnica - fechamento	Reunião de discussão técnica - fechamento da metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	01/04/2021	15/04/2021								
3.7	Prepação de relatório para Condel	Prepação de relatório para Condel	CGEP, CGCP, CGDS	15/04/2021	30/04/2021					0%	A Iniciar		
3.8	Aprovação da metodologia e designação do GT da Delimitação do Semiárido no Condel	Aprovação da metodologia e designação do GT da Delimitação do Semiárido no Condel	CGEP, CGCP, CGDS	30/04/2021	20/05/2021					0%	A Iniciar		
4	Realização da Delimitação									0%	A Iniciar		
4.1	Levantamento e tabulação dos dados	Levantamento e tabulação dos dados	CGEP, CGCP, CGDS	20/05/2021	19/06/2021					0%	A Iniciar		
4.2	Aplicação da metodologia	Aplicação da metodologia	CGEP, CGCP, CGDS	19/06/2021	19/07/2021					0%	A Iniciar		
4.3	Confecção dos mapas	Confecção dos mapas	CGEP, CGCP, CGDS	19/07/2021	03/08/2021					0%	A Iniciar		
4.4	Reunião técnica de apresentação de resultados	Reunião técnica de apresentação de resultados	CGEP, CGCP, CGDS	03/08/2021	18/08/2021					0%	A Iniciar		
4.5	Divulgação dos resultados preliminares	Divulgação dos resultados preliminares	CGEP, CGCP, CGDS	18/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar		
4.6	Recebimento de recursos	Recebimento de recursos	CGEP, CGCP, CGDS	02/09/2021	22/09/2021					0%	A Iniciar		
4.7	Avaliação dos Recursos	Avaliação dos Recursos	CGEP, CGCP, CGDS	22/09/2021	22/10/2021					0%	A Iniciar		
4.8	Apresentação dos resultados diretoria colegiado	Apresentação dos resultados diretoria colegiado	CGEP, CGCP, CGDS	22/10/2021	11/11/2021					0%	A Iniciar		

4.9	Divulgação do resultado final	Divulgação do resultado final	CGEP, CGCP, CGDS	11/11/2021	26/11/2021					0%	A Iniciar		
4.10	Apresentação dos resultados Condel	Apresentação dos resultados Condel	CGEP, CGCP, CGDS	26/11/2021	26/12/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	31,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Prazos repactudados: "Com relação à etapa 2 (Articulações com parceiro), vale destacar que no planejamento inicial, a mesma tinha previsão de realização entre março e maio de 2020. Contudo, esse ano tem sido bastante atípico, em razão da ocorrência inesperada da pandemia do novo Coronavírus. Essa pandemia ocasionou – e vem ocasionando - profundas mudanças na questão da saúde pública mundial, com impactos nas áreas social, econômica, política etc. Desde março de 2020, as atividades de diversos setores – tanto públicos quanto privados – vêm sendo impactadas, refletindo em atrasos ou até mesmo em paralisações de projetos ou ações previstas. Como algumas das atividades previstas foram pensadas para serem executadas de forma presencial, a exemplo das reuniões técnicas de discussão, tanto as no âmbito da Sudene quanto as interinstitucionais, não houve tempo hábil para se executar tais atividades, uma vez que as instituições estão ainda se adaptando à nova forma de trabalho atualmente em uso, por meio remoto. Assim, a etapa de articulação com os parceiros tem previsão de ser executada em outubro de 2020. Para essa etapa, os parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGEP/2019004 (ex PO 16)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2019
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Segurança hídrica: um dos eixos estratégicos destacados do PRDNE; Água é fator chave para o desenvolvimento sustentável da região, especialmente na porção semiárida; No Nordeste, ocorrem frequentes situações críticas de escassez hídrica, nas quais: A demanda por água supera sua oferta; A poluição compromete a qualidade da água; Há redução do seu potencial de uso e aumento do custo com tratamentos; No Semiárido, a renovação das águas subterrâneas e superficiais sofre com os baixos e irregulares índices pluviométricos; A Sudene vem realizando articulações com instituições públicas e privadas para ações norteadoras da segurança hídrica para sua área de atuação, em especial a região semiárida. Uma destas ações consiste na implantação da Rede Estratégica de Poços no Semiárido, articulada juntamente ao Serviço Geológico do Brasil - CPRM		
Projeto:	Rede de Poços e Barragens		
Objetivo do projeto:	Promover a Segurança hídrica para os municípios do Semiárido, de forma mais duradoura e sustentável, minimizando o gasto de recursos com ações emergenciais - entre as quais se destaca a operação Carro-Pipa - e reduzindo significativamente sua dependência.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Veronilton
--	------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									51%	Em Andamento	Atividade Parализada devido a não aprovação de recursos.	
1.1	Minuta do projeto		CGEP	11/10/2019	21/11/2019		11/10/2019	21/11/2019		100%	Concluído		
1.2	Incorporação de Geólogo à equipe		CGEP / CGGP	11/10/2019	01/02/2020		11/10/2019			1%	Paralisado	o pedido de cesão do Sevidor foi negado	refazer o pedido para lotação em Brasília
2	Articulações com Parceiros									0%	Paralisado		
2.1	Articulação com CPRM		CGEP	01/10/2019	31/03/2020		09/10/2019			1%	Paralisado	Já foi realizada uma reunião de articulação na Sudene	
2.2	Articulação com MDR		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	Paralisado		
2.3	Articulação com Comando Militar do Nordeste		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	Paralisado		
3	Formalização do Acordo com CPRM									0%	Paralisado		

3.1	Elaboração do Projeto		CPRM / CGEP	01/06/2020	01/07/2020					0%	Paralisado		
3.2	Elaboração do Plano de Trabalho		CPRM / CGEP	01/07/2020	01/08/2020					0%	Paralisado		
3.3	Elaboração do TED		CCONT / PF / CGEP	01/08/2020	01/09/2020					0%	Paralisado		
3.4	Formalização do Acordo com CPRM		CCONT / GAB	01/09/2020	30/12/2020					0%	Paralisado		
4	Acompanhamento da Execução									0%	Paralisado		
4.1	diagnóstico		CPRM / CGEP	01/01/2021	01/03/2021					0%	Paralisado		
4.2	seleção de poços a serem recuperados		CPRM / CGEP	01/03/2021	01/04/2021					0%	Paralisado		
4.3	execução		CPRM / CGEP	01/04/2021	30/10/2021					0%	Paralisado		
4.4	avaliação		CPRM / CGEP	01/11/2021	31/12/2021					0%	Paralisado		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	12,7%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
PO paralisado devido à não aprovação de recursos e à não incorporação do geólogo à equipe.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGEP/2020001 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:		Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Ausência de mapeamento das empresas incentivadas através da redução de 75% do imposto sobre lucro da operação, na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Estudo de georreferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).		
Objetivo do projeto:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						Pago até o ano anterior	R\$ -
						A realizar no exercício	R\$ -
						Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/09/2020
Data Atualização:	31/12/2020

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão;
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Redução de 75% sobre IRPJ) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			100%	Concluído	A data prevista para conclusão do produto precisou ser alterada em virtude das dificuldades de acessos aos dados e do trabalho remoto, decorrente da Pandemia COVID19.	Previsão de conclusão até 30/12/2020.
1.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020	-	100%	Concluído		
1.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com a redução de 75% do IRPJ para o georreferenciamento e formulação de mapas da Regiões intermediárias e municípios da para da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/02/2020	31/05/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	Concluído		
1.3	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/03/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	Concluído		
1.4	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Gerar tabelas e gráficos com os dados dos últimos 9 anos das principais atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	31/07/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído		
1.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva das empresas georreferenciadas sobre as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias e municípios, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	Concluído		

2	Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Reinvestimento) da Área de Atuação da Sudene			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			83%	Em Andamento			
2.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020		100%	Concluído			
2.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com o reinvestimento para o georreferenciamento e formulação de mapas da regiões intermediárias e municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído			
2.3	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as regiões intermediárias	Gerar mapas dos dados dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/07/2020	31/07/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído			
2.4	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com os municípios da área da Sudene	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas pelo Reinvestimento dos municípios da área de atuação da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/08/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	Concluído			
2.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva dos mapas com as áreas das regiões intermediárias e municípios e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	Concluído	Existem inconsistências nos dados de Reinvestimentos do SIBF, que estão relacionados no relatório final		
2.6	Discussão dos resultados do Relatório Final com a CGEP, CGIF e CGCP	Fazer uma discussão dos resultados finais com as coordenações gerais envolvidas	Marcos Falcão	01/02/2021	30/05/2021					0%	A Iniciar	Etapa de discussão do Relatório Final acrescentada		
Valor Previsto:						R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	91,7%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO CGEP/2019005 (ex PO 18)
Objetivo estratégico 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2019
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial			Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de instrumento voltado para o planejamento do desenvolvimento sustentável				
Projeto:	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE				
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.481.361,00	R\$ 1.481.361,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Alildo Sabina, Miguel Araujo, Tassia Geramano, Gabriela Isabel, Mauro Bezerra, Marina Roguerio, Robson Brandão, Joyce Queiroz
---	---

Cronograma de Desemboiso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 120.403,17
R\$ 1.481.361,00			R\$ 1.481.361,00	A realizar no exercício	R\$ 339.911,25
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 120.403,17

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise do Relatório P14	P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE (Documento de arquitetura da informação). A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para elicitación de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/09/2019	31/10/2019	R\$ 139.828,50	Não informado	10/12/2019	R\$ 120.403,17	100%	Concluído	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudene.	
2	Análise do Relatório P15	P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE. Com a condução de especialista em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	11/11/2019	30/11/2020	R\$ 269.514,00	Não informado			50%	Atrasado	Foi entregue versão preliminar em fevereiro de 2020. A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. A versão final foi enviada à Sudene no dia 18 de dezembro. A apreciação técnica do produto se deu pela COAE/CGEP, com o envio da Nota Técnica 2 (0216636) no dia 05/01/2021. Neste momento, a CGEP e CGCP aguardam o envio do produto revisado e com os ajustes solicitados. Em 31/03/2021, foi realizada reunião com CGEE para alinhar as solicitações realizadas na Nota Técnica 2 (SEI 0216636). Dentro os encaminhamentos da reunião, as partes acordaram que a nova versão do produto com os ajustes apontados na Nota Técnica se dará até o dia 20/04/2021.	
3	Análise do Relatório P16	P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE. A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenhada será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	23/03/2020	31/12/2020	R\$ 70.397,25				0%	Atrasado	A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 12/04/2021 (início) a 21/05/2021 (término)	

4	Análise do Relatório P17	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a captura e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/11/2020	28/02/2021	R\$	389.177,25				0%	Atrasado	Repactuado conforme aditivo à carta acordo.No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 17/05/2021 (início) a 22/09/2021 (término)
5	Análise do Relatório P18	P18 - Relatório descritivo dos instrumentos e mapas de conhecimento afetos à carteira de projetos do PRDNE. A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de inteligência em CTI do CGEE para a geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos de informação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/02/2021	31/05/2021	R\$	355.850,25				0%	A Iniciar	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 02/06/2021 (início) a 11/11/2021 (término)
6	Análise do Relatório P19	P19 - Relatório da capacitação instrumental e operação assistida da metodologia e ferramentas de apoio de monitoramento do PRDNE. A equipe do CGEE fará a capacitação para até 30 técnicos indicados pela Sudene na utilização de instrumentos de captação de dados e geração de informação previstos nas metodologias de Gestão de Fontes e de Mapas de Conhecimento, nas dependências da SUDENE. Está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação, bem como nos momentos posteriores para apoio no implementação da metodologia.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	30/06/2021	R\$	94.185,00				0%	A Iniciar	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 11/10/2021 (início) a 18/11/2021 (término)
7	Análise do Relatório P20	P20 - Relatório da Trilha de Inteligência. A partir de análise crítica da implementação das metodologias e insumos coletados das demais trilhas do projeto, a equipe do CGEE em conjunto com especialista em indicadores irá elaborar o resumo geral das metodologias implantadas e os resultados alcançados, bem como um documento de visão contendo especificações de alto nível de funcionalidades para um sistema de informação fundamentado nas metodologias implantadas. O trabalho irá requerer visita in loco para observação do funcionamento da metodologia, bem como coleta de percepções e discussão com a equipe da SUDENE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	31/07/2021	R\$	162.408,75				0%	A Iniciar	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 13/09/2021 (início) a 30/11/2021 (término)
				Valor Previsto:		R\$ 1.481.361,00	Valor realizado:		R\$ 120.403,17	38%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:													
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos													
Observações:													

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	2 - Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO CGEP/2020002 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de regionalização das políticas públicas de educação		
Projeto:	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação		
Objetivo do projeto:	Elaboração de um índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/07/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson Brandão, Glória Sistelos, Joyce, Gabriela Isabel
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Dados		Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	Concluído		
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	Concluído		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído	Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no levantamento	
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
1.4	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	Concluído	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019	
2	Análise		Glória Sistelos	02/03/2020	30/01/2021	-	24/02/2020			100%	Em Andamento		
2.1	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
2.2	Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	Concluído		
2.3	Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 25/10/2020	
2.4	Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	02/03/2020	30/11/2020	-	13/10/2020	28/10/2020		100%	Concluído	Os mapas foram resultados do IDEB 2019	
2.5	Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	01/04/2020	30/11/2020	-	28/10/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
2.6	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/04/2020	30/12/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Falta incluir os dados do IDEB 2019	

2.7	Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	04/09/2020	30/01/2021		04/09/2020	30/01/2021		100%	Concluído	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO	
3.	Panorama de Políticas Públicas de Educação		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020			100%	Em Andamento		
3.1	Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento do IDEB	Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
3.2	Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas encontradas	Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
3.2	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	Concluído		
4	Relatório final		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	30/07/2021	-	13/07/2020			30%	Em Andamento	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19). Novo prazo acordado: 30/07/2021	
4.1	Consolidação	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	30/07/2021	-	13/07/2020			60%	Em Andamento		
4.2	Revisão	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	01/03/2021	30/07/2021	-				0%	Em Andamento		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	83%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Observações:

Em virtude da divulgação do resultado do IDEB 2019 em 15/09/20, foram ajustados os prazos e os percentuais de entrega das atividades, pois algumas delas precisarão ser refeitas

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2020003 (EX PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Importância da cultura da Palma para o Semiárido				
Projeto:	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIÁRIDO				
Objetivo do projeto:	A palma forrageira (Opuntia ou Nopalea spp.) é a principal planta xerófila cultivada no Brasil, sendo a base alimentar dos rebanhos, especialmente na época de estiagem, entretanto estudos que visem o desenvolvimento de novas cultivares/variedades ainda são escassos, assim como a resolução de alguns problemas fitossanitários.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	3	90	R\$ 441.438,94	R\$ 441.438,94
	250 e 280	4	90	R\$ 38.410,15	R\$ 38.410,15
	R\$ 479.849,09				

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	31/03/2024
Data Atualização:	31/03/2021

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 211.365,09
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 211.365,09
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	INSA:	JUCILENE SILVA ARAÚJO

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								7%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 211.365,09	08/10/2020	14/10/2020		100,0%	Concluído	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
2.2	Subprojeto 1	Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético de opuntia spp visando a sua utilização como forrageira e prospectando novas potencialidades a partir da coleção do INSA.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 193.711,83				6,1%	Em Andamento		

2.2.1	Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromotológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 13.600,00	11/02/2021	31/03/2021		50,0%	Em Andamento		
2.2.2	Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	16/10/2020	08/07/2022	R\$ 8.500,00	11/02/2021	31/03/2021		5,0%	Em Andamento		
2.2.3	Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 15.000,00	11/02/2021	31/03/2021		10,0%	Em Andamento		
2.2.4	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R\$ 28.400,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.5	Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	10/11/2021	08/07/2022	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.6	Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	14/01/2021	08/07/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.7	Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	11/09/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.8	Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	08/07/2022	01/10/2023	R\$ 35.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.9	Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnológicos usando cultura de micrósporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 10.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.10	Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R\$ 13.000,00				0,0%	A Iniciar		

2.2.11	Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenilidade	INSA	14/05/2021	10/11/2021	R\$ 6.611,83				0,0%	A Iniciar		
2.2.12	Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progênies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 7.600,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.13	Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	11/10/2021	01/10/2023	R\$ 6.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.2.14	Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	16/10/2020	01/10/2023	Não se aplica	11/02/2021			20,0%	Em Andamento		
2.3	Subprojeto 2	Estratégia de manejo para controle da cochonilha-de-escama em palma forrageira.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 167.850,26				3,6%	A Iniciar		
2.3.1	Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	16/10/2020	03/06/2023	R\$ 15.000,00	11/02/2021			10,0%	Em Andamento		
2.3.2	Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	15/03/2021	04/05/2023	R\$ 25.000,00	11/02/2021			15,0%	Em Andamento		
2.3.3	Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto: Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	13/07/2021	04/01/2023	R\$ 35.850,24				0,0%	A Iniciar		
2.3.4	Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	13/07/2021	04/04/2023	R\$ 15.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.5	Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	09/05/2022	03/07/2023	R\$ 25.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.6	Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	14/01/2021	03/02/2023	R\$ 27.000,00				0,0%	A Iniciar		
2.3.7	Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R\$ 25.000,02				0,0%	A Iniciar		
2.4	Subprojeto 3	Manejo integrado de doenças em palma forrageira no semiárido.		16/10/2020	01/10/2023	R\$ 118.287,00				1,7%	A Iniciar		
2.4.1	Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	16/10/2020	10/11/2021	R\$ 31.153,40	11/02/2021			10,0%	Em Andamento		
2.4.2	Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	13/06/2021	05/12/2022	R\$ 41.240,00				0,0%	A Iniciar		

2.4.3	Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	06/10/2022	04/04/2023	R\$ 21.946,00				0,0%	A Iniciar		
2.4.4	Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	05/11/2022	04/05/2023	R\$ 9.333,60				0,0%	A Iniciar		
2.4.5	Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematóides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	05/11/2022	02/08/2023	R\$ 14.614,00				0,0%	A Iniciar		
2.4.6	Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	13/06/2021	01/10/2023	Não se aplica				0,0%	A Iniciar		
2.5	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	A Iniciar		
2.6	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 139.342,00				0,0%	A Iniciar		
2.7	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	A Iniciar		
2.8	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 129.142,00				0,0%	A Iniciar		
2.9	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	A Iniciar		
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	01/10/2023	30/11/2023					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/12/2023	30/01/2024					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/01/2024	31/03/2024					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 479.849,09	Valor realizado:		R\$ 0,00	27%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:													
INSA													
Observações:													
Processo SEI n.º 59336.000816/2020-46 - TED INSA PALMA													

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO CGEP/2020004 (EX PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social	
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Necessidade de difusão de tecnologias e capacitação dos agricultores, familiares e técnicos atuantes nas comunidades dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, localizados na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil			
Projeto:	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil			
Objetivo do projeto:	Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafoclimáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas tecnologias às populações produtoras, dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba; Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, os quais possuem seus territórios limitados pelas margens do rio e têm representatividade na região em termos de produção de leite bovino.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	3	90	R\$ 251.412,28	R\$ 251.412,28
	250 e 280	4	90	R\$ 47.520,00	R\$ 47.520,00
					R\$ 298.932,28

Ata 360a Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	04/08/2023
Data Atualização:	31/03/2021

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 26.570,11
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 75.397,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 75.397,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 75.397,01

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Mauro Bezerra e Aildo Sabino
	INSA:	GEOVERGUE RODRIGUES DE MEDEIROS

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								5%	A Iniciar		

2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R\$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R\$ 75.397,01	100,0%	Concluído	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	
2.2	Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R\$ 26.570,08	19/02/2021			5,0%	Em Andamento		
2.3	Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	15/03/2021	08/06/2022	R\$ 12.687,37				0,0%	A Iniciar		
2.4	Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	14/01/2021	05/11/2022	R\$ 22.720,81				0,0%	A Iniciar		
2.5	Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	13/02/2021	09/05/2022	R\$ 6.300,13				0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	14/01/2021	15/04/2022	R\$ 75.004,62				0,0%	A Iniciar		
2.7	Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	13/07/2021	09/05/2022	R\$ 22.530,00				0,0%	A Iniciar		
2.8	Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA		04/01/2023	R\$ 23.726,04				0,0%	A Iniciar		

2.9	Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados para a região da bacia hidrográfica Piranhas-Açu	Produto: Três artigos científicos	INSA	13/06/2021	03/02/2023	R\$ 4.500,00				0,0%	A Iniciar	
2.10	Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	15/12/2020	14/01/2021	R\$ 75.000,00	05/03/2021			10,0%	Em Andamento	A data de início, da coluna "Realizado" foi influenciada] pela data da transferência dos recursos.
2.11	Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	14/01/2021	08/06/2022	Não se aplica	19/02/2021			10,0%	Em Andamento	
2.12	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	A Iniciar	
2.13	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 143.114,97				0,0%	A Iniciar	
2.14	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	A Iniciar	
2.15	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 80.420,30				0,0%	A Iniciar	
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)									0,0%	A Iniciar	
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	03/02/2023	04/04/2023					0,0%	A Iniciar	
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	05/04/2023	04/06/2023					0,0%	A Iniciar	
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	05/06/2023	04/08/2023					0,0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 298.932,28	Valor realizado:		R\$ 75.397,01	25%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:											
INSA											
Observações:											
Processo SEI n.º 59336.001084/2020-10 - TED INSA LEITE. A diferença de R\$ 29.893,23 entre o valor previsto e o valor total do projeto diz respeito aos custos administrativos não incluídos no Plano de Trabalho original (Plano de Trabalho CGEP SEI 0184994)											

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2020005 (EX PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Importância da cultura da Palma para o Semiárido				
Projeto:	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL				
Objetivo do projeto:	Realizar ensaios de longa duração no campo com adubação da palma forrageira que ao seu final permita a obtenção de dados confiáveis para a construção de tabelas de recomendação de adubação que possa subsidiar os agricultores da região semiárida no cultivo ambientalmente sustentável dessa cultura.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	-	90	R\$ 212.353,19	R\$ 212.353,19

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	30/10/2025
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	UFPB	Adailson Pereira de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 31.230,86
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 31.230,86
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								11%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/06/2020	08/09/2020		04/06/2020	08/09/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	08/09/2020	24/09/2020		08/09/2020	24/09/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	24/09/2020	09/10/2020		24/09/2020	09/10/2020		80,0%	Em Andamento	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPB	09/10/2020	24/10/2020					0,0%	Cancelado	Por falta de resposta em tempo da nova gestão da UFPB, não foi possível a formalização do TED.	
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/10/2020	08/11/2020					0,0%	Cancelado		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	Cancelado		
2.1	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	08/11/2020	23/11/2020	R\$ 31.230,86				0,0%	Cancelado		

2.2	Meta 1: Instalar, em diferentes áreas da região semiárida brasileiras, 4 (quatro) experimentos de longa duração para estudos de nutrição da palma forrageira.	Produto: experimentos instalados	UFPB	23/11/2020	02/03/2025					0,0%	Cancelado		
2.3	Meta 2: Definir faixas de recomendação de adubação com N e K em função dos níveis de fertilidade dos solos da região semiárida brasileira.	Produto: faixas de recomendação de adubação com N e K definidas	UFPB	23/11/2020	02/03/2025					0,0%	Cancelado		
2.4	Meta 3: Identificar características biométricas, fisiológicas e bioquímicas da palma forrageira sensíveis às variações do solo.	Produto: características biométricas, fisiológicas e bioquímicas identificadas	UFPB	23/11/2020	01/05/2025					0,0%	Cancelado		
2.5	Meta 4: Determinar, em cada unidade experimental, a dose de N e K que expressem a maior produtividade da palma forrageira.	Produto: Doses de N e K determinadas	UFPB	16/02/2022	02/03/2025					0,0%	Cancelado		
2.6	Meta 5: Publicar quatro artigos científicos em periódicos nacional/ internacional e 1 (um) livro sobre temas relacionados a nutrição da palma forrageira no semiárido.	Produto: Artigos publicados	UFPB	18/03/2022	01/05/2025					0,0%	Cancelado		
2.7	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB	01/01/2021	30/01/2021					0,0%	Cancelado		
2.8	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 133.901,59				0,0%	Cancelado		
2.9	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2022	30/01/2022					0,0%	Cancelado		
2.10	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	R\$ 10.377,45				0,0%	Cancelado		
2.11	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	Cancelado		
2.12	Liberação da quarta parcela de recursos	Liberação da 4ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2023	28/02/2023	R\$ 11.232,92				0,0%	Cancelado		
2.13	4ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2024	30/01/2024					0,0%	Cancelado		
2.14	Liberação da quinta parcela de recursos	Liberação da 5ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2024	28/02/2024	R\$ 12.377,45				0,0%	Cancelado		
2.15	5ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UFPB/CGEP	01/01/2025	30/01/2025					0,0%	Cancelado		
2.16	Liberação da sexta parcela de recursos	Liberação da 6ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2025	28/02/2025	R\$ 13.232,92				0,0%	Cancelado		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	Cancelado		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPB	01/05/2025	30/06/2025					0,0%	Cancelado		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/07/2025	30/08/2025					0,0%	Cancelado		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/08/2025	30/10/2025					0,0%	Cancelado		
				Valor Previsto:		R\$ 212.353,19		Valor realizado:		R\$ 0,00	11%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:												
INSA												
Observações:												
Processo SEI n.º 59336.000888/2020-93 - TED UFPB. Plano de Trabalho em fase de detalhamento, em que serão detalhados os custos por meta												
O Projeto não prosperou porque a UFPB, no final de 2020, não teve condições de cumprir com os requisitos da celebração a tempo, e o Superintendente Evaldo Cavalcanti teve que realocar os recursos para outro projeto na CGDS/DPLAN. A UFPB foi avisada da decisão por meio do ofício Sudene nº 2768/2020/DPLAN/SUDENE de 11/12/2020 (Doc SEI 0207040-pasta III), enviado ao Reitor Valdíney Veloso Gouveia, Processo SEI SUDENE 59336.000888/2020-93,												
Fonte: CGEP												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2020006 (EX PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	econômico e social		
Objetivo da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014 Art. 4º Ao Conselho Deliberativo compete: XIII - em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE: d) definir os critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE [sic].				
Projeto:	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE				
Objetivo do projeto:	Propor ao Condel critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE e operacionalizar o edital conjunto com o BNB				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	02/03/2023
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino, Joyce Queiroz e Marcus Paz
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento									70%	Em Andamento		
1.1	Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100%	Concluído		
1.2	Aprovação da Nota Técnica em Diretoria Colegiada		CGEP	10/08/2020	10/08/2020		10/08/2020	10/08/2020		100%	Concluído	362ª ReuniãoExtraordinária daDiretoria Colegiada	
1.3	Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100%	Concluído	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1º semestre de 2021.	
1.4	Nota Técnica complementar com proposta de critérios e prioridades ao Condel		CGCP, CGEP	23/09/2020	23/10/2020		23/09/2020			50%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	
1.5	Reunião de fechamento com parceiros para validação dos critérios		CGEP	23/10/2020	30/10/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	

1.6	Aprovação da NT Complementar em Diretoria Colegiada e envio para aprovação AD REFEREDUM		CGEP/Gabinete	01/11/2020	30/11/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros			
2	Formalização									0%	A Iniciar				
2.1	Assintura de ACT Sudene, FINEP, BNB, CONFAP		CGEP, BNB, FINEP, CONFAP	01/11/2020	31/12/2020					0%	Paralisado	PO será reprogramado, após negociações com parceiros			
2.3	Preparação de Edital Conjunto Sudene-BNB		CGEP, BNB	01/11/2020	31/01/2021					0%	A Iniciar				
3	Execução									0%	A Iniciar				
3.1	Lançamento do Edital Conjunto Sudene-BNB		CGEP, BNB	01/02/2021	10/06/2021					0%	A Iniciar				
3.2	Contratação dos projetos de fomento		BNB	10/06/2021	09/08/2021					0%	A Iniciar				
3.3	Acompanhamento dos projetos contratados		CGEP, BNB	09/08/2021	04/08/2022					0%	A Iniciar				
3.4	Avaliação técnica final		CGEP, BNB	04/08/2022	03/10/2022					0%	A Iniciar				
4	Prestação de Contas									0%	A Iniciar				
4.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pelo BNB	BNB	03/10/2022	02/12/2022					0%	A Iniciar				
4.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	02/12/2022	02/03/2023					0%	A Iniciar				
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:				R\$	-	17,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	Número do Projeto:	PO CGEP/2020007 (EX PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias de APLs, estimulando inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	-
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Escassez de estudos com recortes regionais abrangentes que, ao mesmo tempo, permitam obter um entendimento com maior precisão dos efeitos adversos da pandemia nos territórios e obter uma visão consolidada sobre os desafios do setor produtivo e o impacto social da crise.		
Projeto:	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36		
Objetivo do projeto:	Levantar informações sobre a atual situação do setor produtivo da região e seus desdobramentos para a sociedade, bem como quais são os desafios, demandas e perspectivas, para nortear as ações da Sudene para o adequado enfrentamento e superação da crise na região, crise essa que tem consequências tanto econômicas quanto sociais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3 - Outras despesas correntes	90	R\$ 349.500,00	R\$ 349.500,00

Previsão de Conclusão:	14/06/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Maria da Glória Sistêto, Gabriela Nascimento, Tássia Germano, Marina Rogério e Miguel Vieira
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 349.500,00
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 349.500,00
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 349.500,00
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Abertura do Projeto			18/05/2020	20/05/2020	-	18/05/2020	20/05/2020		100%	Concluído		
1.1	Análise técnica da proposta inicial	Análise técnica da proposta de Estudo de Pesquisa de Opinião	CGEP	18/05/2020	20/05/2020	-	18/05/2020	20/05/2020		100%	Concluído		
2.	Trâmites de contratação			02/06/2020	03/12/2020	-	02/06/2020			100%	Concluído	Considerando a revogação do 1º Edital, a coluna K contempla as datas de execução final tanto dos documentos que não necessitaram de alteração quanto daqueles relativos à tramitação do 2º edital. Ocorreu reprogramação dos prazos deste último, os quais iniciam no item 2.7. Considerando a revogação do 2º Edital (SEI 0193555) para lançamento de novo edital, uma A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e adequações quanto ao conteúdo e forma.	
2.1	Documentação de Formalização da Demanda	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	CGEP/DPLAN	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020		100%	Concluído		
2.2	Mapeamento de Riscos	Elaboração do mapeamento de riscos do projeto	CGEP	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020		100%	Concluído	A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e adequações quanto ao conteúdo e forma.	
2.3	Estudo Técnico Preliminar	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, contemplando metodologia da pesquisa, cotação de preços	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020		100%	Concluído		
2.4	Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020		100%	Concluído		
2.5	Edital	Elaboração do Edital com base com TR	COLIC	23/06/2020	13/07/2020		06/08/2020	27/10/2020		100%	Concluído	Minuta do Edital	
2.6	Análise jurídica do Edital	Análise jurídica do Edital	Procuradoria	13/07/2020	28/07/2020		14/08/2020	06/11/2020		100%	Concluído		
2.7	Ajustes do Edital	Ajustes do Edital, de acordo com as recomendações da Procuradoria, se houver.	COLIC/CGEP	06/11/2020	09/11/2020		06/11/2020	06/11/2020		100%	Concluído	Datas reprogramadas a partir desta atividade	
2.8	Abertura do Processo Licitatório	Abertura do Processo Licitatório e respostas a possíveis questionamentos	COLIC/CGEP	10/11/2020	19/11/2020		09/11/2020	19/11/2020		100%	Concluído		
2.9	Qualificação do licitante	Análise da Qualificação Financeira e Técnica do Licitante	CGEP/COLIC	19/11/2020	23/11/2020		19/11/2020	16/12/2020		100%	Concluído	Essa etapa durou mais do que o esperado, uma vez que houve a necessidade de analisar a documentação de habilitação técnica de 8 empresas	
2.10	Finalização do Processo Licitatório	Finalização do Processo Licitatório - Homologação e Adjudicação	COLIC	23/11/2020	27/11/2020		16/12/2020	16/12/2020		100%	Concluído		
2.11	Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	COLIC	27/11/2020	03/12/2020	R\$ 349.500,00	22/12/2020	22/12/2020	R\$ -	100%	Concluído	valor empenhado em 17/12/2020. o valor será pago com a entrega dos produtos.	

3	Acompanhamento da execução			03/12/2020	14/06/2021	-	22/12/2020	00/01/1900		59%	Em Andamento	Considerando a data da assinatura do Contrato (22/12/2020) e solicitação justificada da Contratada para reprogramação dos prazos (Doc SEI 0216910), as datas das atividades abaixo foram reprogramadas. De acordo com os documentos SEI (0229350, 0229351, 0229438, 0233780) houve necessidade de uma nova reprogramação das datas devido a fatores não previstos que envolviam a coleta de dados e que impactaram na execução do projeto. Destaque-se que a reprogramação se deu para as etapas seguintes do projeto, incluindo a própria etapa de coleta de dados.	
3.1	Planejamento	Acompanhamento e validação do cronograma de execução, roteiros e questionários da pesquisa	CGEP	23/12/2020	24/01/2021		23/12/2020	25/01/2021		100%	Concluído		
3.2	Pré - teste	Acompanhamento e validação do teste do instrumento da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	25/01/2021	08/02/2021		28/01/2021	04/03/2021		100%	Concluído	Datas reprogramadas	
3.3	Coleta de Dados	Acompanhamento e validação da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	09/02/2021	30/03/2021		09/02/2021			85%	Atrasado	Datas reprogramadas	
3.4	Base de Dados	Acompanhamento e validação da base de dados	CGEP	09/02/2021	30/03/2021		09/02/2021			70%	Atrasado	Datas reprogramadas	
3.5	Relatório de resultados	Validação dos relatórios com resultados da pesquisa (Sudene e UFs)	CGEP	13/04/2021	14/05/2021	-				0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
3.2	Resumo Executivo e Apresentação	Validação do Resumo Executivo e apresentação	CGEP	14/05/2021	14/06/2021	-				0%	A Iniciar	Datas reprogramadas	
				Valor Previsto:	R\$	349.500,00	Valor realizado:	R\$	-	86%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
O Edital foi revogado em 04/09/2020. Até essa data estava em análise

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2020008 (EX PO 28)
Objetivo estratégico:	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2020
Programa do PPA:				Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.				
Projeto:	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.				
Objetivo do projeto:	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	170	3 - Outras Despesas Correntes	90	A definir	A definir

Previsão de Conclusão:	07/07/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Tassia Germano e Gabriela Isabel
---	----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1.	Planejamento - Elaboração de Plano de Trabalho FNE - 2020/21 (Peso 30%)									100%	Concluído		
1.1	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) em resposta à Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020. O Plano de Trabalho deverá ser enviado aos Ministérios do Desenvolvimento Regional	COAE/CGEP	29/07/2020	30/10/2020	-	29/07/2020	28/10/2020	-	100%	Concluído	A Sudene encaminhou o Plano de Trabalho ao MDR por meio do Ofício nº 2319/2020-GAB/SUDENE, de 28 de outubro de 2020.	
1.2	Ratificação do Plano de Trabalho pelo MDR e ME	Ratificação ou sugestão de mudanças do Plano de Trabalho pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	MDR e ME	30/10/2020	30/11/2020	-	30/10/2020	04/02/2021		100%	Concluído	Seguindo os prazos da Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, os ministérios deveriam enviar a análise do Plano de Trabalho em até 30 dias.	Em 22 de dezembro de 2020, por meio do Ofício Nº 2849/2020/GAB/SUDENE, a Sudene encaminhou diretamente ao ME o Plano de Trabalho enviado ao MDR em 28/10/2020 e informou que aguardava posicionamento quanto ao
1.3	Alterações no Plano de Trabalho das avaliações do FNE - 2020/21	Alterações no Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliações do FNE (2020/21) para inserção das considerações realizadas pelo MDR e ME.	COAE/CGEP	30/11/2020	04/12/2020		01/03/2021	19/03/2021		100%	Concluído	Por meio do OFÍCIO Nº 573/2021/GAB/SUDENE, de 19 de março de 2021, a Sudene respondeu às considerações apontadas no Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-MDR, de fevereiro de 2021.	Em paralelo à análise das considerações para aprimoramento do Plano Trabalho sobre a avaliação do FNE neste primeiro ano, que foram apontadas no Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-
2.	Planejamento - Edital e seleção de parceiro(s) para execução das avaliações do FNE (Peso 70%)									0%			
2.1	Elaboração de Termo de Abertura do Projeto - TAP e apresentação de proposta	Elaborar e apresentar TAP com a descrição dos objetivos, estratégias e etapas a serem seguidas para a contratação das avaliações definidas. É necessário aprovação do escopo pela Coordenação-Geral.	COAE/CGEP	17/02/2021	19/02/2021					0%	Atrasado		
2.2	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para elaboração e lançamento de edital de chamamento público	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias elaboração e publicação de edital de chamamento público para seleção de parceiro(s) executor(es) para as avaliações do FNE do 1º ano do ciclo de avaliações (Plano de Trabalho 2020/2021).	COAE/CGEP	22/02/2021	23/02/2021					0%	Atrasado		
2.3	Apreciação da solicitação para abertura de Edital de Chamamento Público pela Diretoria Colegiada	Seguida a aprovação da DPLAN, o assunto deverá ser encaminhado ao Gabinete para ser apreciado e aprovado em reunião de Diretoria Colegiada, se for o caso.	DPLAN e Gabinete	23/02/2021	03/03/2021					0%	Atrasado	As atividades foram comprometidas devido a priorização para dar seguimento aos projetos: (i) Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19 na área de atuação da Sudene (Processo 58336.000790/2020-36); (ii) Índice de Confiança do Consumidor e de Expectativa do Empresário Industrial para os estados da região Nordeste; (iii) Plano de Ações e estudo sobre os desafios e potencialidades do setor têxtil em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.	
2.4	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital de Chamamento Público	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital para chamamento público que visa selecionar parceiro(s) para a execução das avaliações do FNE desenhadas no Plano de Trabalho 2020/21.	COAE/CGEP	22/02/2021	26/02/2021					0%	Atrasado	Além disso, no mês de março uma das servidoras alocadas no projeto gozou férias e a outra esteve envolvida com as atividades dos Cursos Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União – MEG-Tr e	

2.5	Reunião com a ASCOM para tratar sobre a divulgação do Edital	Apresentar a ASCOM os objetivos gerais do projeto e informar sobre a necessidade de divulgação da seleção nas redes das Sudene quando o edital estiver concluído.	COAE/CGEP e ASCOM	01/03/2021	01/03/2021					0%	Atrasado	de Planejamento Estratégico.	
2.6	Elaboração de Edital de chamamento público	Elaborar edital de chamamento publico a fim de selecionar entidade(s)/orçã(o)s da União para executar as avaliações	COAE/CGEP	01/03/2021	12/03/2021					0%	Atrasado		
2.7	Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consultar os preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo	COAE/CGEP	08/03/2021	12/03/2021					0%	Atrasado		
2.8	Apreciação do Edital pela Coordenação Geral e DPLAN	Encaminhar o Edital para apreciação da Coordenação Geral, da CGEP e para a DPLAN	CGEP e DPLAN	15/03/2021	17/03/2021					0%	Atrasado		
2.9	Ajustes no Edital	Adequações no Edital após apreciação da CGEP e DPLAN e envio para publicação	COAE/CGEP	18/03/2021	22/03/2021					0%	Atrasado		
2.10	Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Seleção da comissão técnica para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP.	CGEP	18/03/2021	25/03/2021					0%	Atrasado		
2.11	Solicitação para a publicação do Edital	Elaboração de texto sobre o projeto e lançamento do edital para subsidiar a matéria de divulgação da ASCOM. Deve-se	COAE/CGEP	22/03/2021	23/03/2021					0%	Atrasado		
2.12	Publicação do Edital	Publicação do Edital no site da Sudene e no DOU	GABINETE/SUDENE e ASCOM	24/03/2021	26/03/2021					0%	Atrasado		
2.13	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	COAE/CGEP	29/03/2021	30/04/2021					0%	A Iniciar		
2.14	Divulgação do Edital de Chamamento Público	Divulgação do Edital no site e nas redes sociais da Sudene. Mobilização de possíveis parceiros por e-mail também.	ASCOM e COAE/CGEP	26/03/2021	09/04/2021					0%	A Iniciar		
2.15	Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	COAE/CGEP	09/04/2021	09/04/2021					0%	A Iniciar		
2.16	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	COAE/CGEP	09/04/2021	13/04/2021					0%	A Iniciar		
2.17	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	COAE/CGEP	13/04/2021	16/04/2021					0%	A Iniciar		
2.18	Análise técnica das propostas	Análise técnica das propostas e emissão de parecer técnico com a justificativa para celebração de TED para a(s) proposta(s)	COAE/CGEP	03/05/2021	28/05/2021					0%	A Iniciar	é necessário considerar um prazo maior para essa análise técnica, pois essa etapa também envolve reuniões, reuniões e reuniões de grupo.	
2.19	Análise e aprovação das propostas selecionadas para celebração de TED - CGEP e DPLAN	Solicitação de autorização da DPLAN para celebração de TED das propostas selecionadas.	CGEP e DPLAN	31/05/2021	01/06/2021					0%	A Iniciar		
2.20	Análise e aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	02/06/2021	09/06/2021					0%	A Iniciar		
2.21	Apreciação jurídica do processo pela Procuradoria Federal junto à Sudene	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar		
2.22	Emissão de Parecer técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	23/06/2021	25/06/2021					0%	A Iniciar		
2.23	Análise e trâmites para celebração de TED relacionados ao setor de contratos e convênios	Análise e trâmites para contratação relacionados ao setor de convênios	COCIC/Sudene	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar		
2.24	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	23/06/2021	28/06/2021					0%	A Iniciar		
2.25	Celebração do instrumento para contratação das avaliações	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Parceiro executor	28/06/2021	02/07/2021					0%	A Iniciar		
2.26	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Diário Oficial e no site da Sudene	Gabinete e ASCOM/Sudene	05/07/2021	07/07/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO CGEP/2020009 (EX PO 29)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.		Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		Objetivo estratégico (MDR):	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumentos de financiamento (FNE, FDNE).			
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Segurança hídrica no semiárido			
Projeto:	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS			
Objetivo do projeto:	Avaliar o Programa Cisternas Efeitos do Programa Cisternas 1ª Água por meio de indicadores de mercado de trabalho e de saúde dos beneficiados.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	-	90	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	23/04/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE: Marina Barbosa
	UFPE Breno Ramos Sampaio

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 384.000,00
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício	R\$ 384.000,00
Valor liberado/repassado no Exercício	R\$ 384.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 384.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	11/11/2020	04/12/2020		11/11/2020	04/12/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	07/12/2020	22/12/2020		07/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	07/12/2020	07/12/2020		07/12/2020	07/12/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/12/2020	28/12/2020		24/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								6%	Em Andamento		
2.1	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 384.000,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 384.000,00	100,0%	Concluído		

2.2	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021		50,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	30/06/2021	30/07/2021			0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	31/07/2021	15/08/2021			0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/08/2021	30/08/2021			0,0%	A Iniciar		
2.3	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/09/2021			30,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.4	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/10/2021	31/10/2021			0,0%	A Iniciar		
2.5	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/11/2021	16/11/2021			0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/11/2021	02/12/2021			0,0%	A Iniciar		
	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021			30,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021			0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021			0,0%	A Iniciar		
	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022			0,0%	A Iniciar		
	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	15/02/2022			0,0%	A Iniciar		
	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/02/2022	03/03/2022			0,0%	A Iniciar		
2.7	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021			15,0%	Em Andamento	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.8	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021			0,0%	A Iniciar		
2.9	Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021			0,0%	A Iniciar		
2.10	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022			0,0%	A Iniciar		
2.11	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	16/02/2022			0,0%	A Iniciar		
2.12	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/02/2022	04/03/2022			0,0%	A Iniciar		
2.13	Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	31/12/2021	31/12/2021			0,0%	A Iniciar		

3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	01/01/2022	02/03/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	03/03/2022	02/05/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	03/05/2022	02/07/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 384.000,00		Valor realizado:		R\$ 384.000,00	26%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:	
Universidade Federal de Pernambuco	
Observações:	
Processo SEI 59336.001886/2020-11	

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGEP/2020010 (EX PO 30)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.			Ano:	2020
Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MDR):	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de avaliar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional				
Projeto:	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO				
Objetivo do projeto:	Avaliar: O impacto do Mecanismo de Repartição dos recursos da Cota-Parte Municipal do ICMS nos resultados educacionais do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais; Os efeitos da Educação da Infantil sobre a alfabetização e, ainda, analisar a relação entre a Oferta e as Metas do PNE, a Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil; e, Os efeitos da violência a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) sobre a perda de capital humano e econômica e, ainda, avaliar os efeitos das políticas (planos e programas) adotadas pelos estados da região nordeste do Brasil.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 e 280	-	90	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	21/06/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGEP/SUDENE:	Tássia Germano
	UFC	Guilherme Diniz Irff

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 480.600,00
Valor Empenhado/Descartado no Exercício	R\$ 480.600,00
Valor liberado/repassado no Exercício	R\$ 480.600,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 480.600,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A dependência da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/12/2020	16/12/2020		04/12/2020	16/12/2020		100,0%	Concluído		
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	17/12/2020	22/12/2020		17/12/2020	22/12/2020		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	16/12/2020	23/12/2020		16/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	23/12/2020	28/12/2020		23/12/2020	28/12/2020		100,0%	Concluído		
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								5%	Em Andamento		
2.1	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	R\$ 480.600,00	28/12/2020	28/12/2020	R\$ 480.600,00	100,0%	Concluído		

2.2	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matriculas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	01/01/2021	30/04/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.3	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/05/2021	31/05/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/06/2021	16/06/2021					0,0%	A Iniciar		
2.5	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/06/2021	01/07/2021					0,0%	A Iniciar		
2.6	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobre o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.	UFC	01/01/2021	30/05/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.7	Meta 3: Nordeste Pacifico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do Nordeste	UFC	01/01/2021	31/05/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.8	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/06/2021	01/07/2021					0,0%	A Iniciar		
2.9	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	02/07/2021	17/07/2021					0,0%	A Iniciar		
2.10	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	18/07/2021	01/08/2021					0,0%	A Iniciar		
2.11	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.	UFC	01/01/2021	30/06/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.12	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).	UFC	01/01/2021	30/06/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.13	Meta 3: Nordeste Pacifico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 2: Relatório contendo as estimações de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste	UFC	01/01/2021	30/06/2021					15,0%	Em Andamento	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
2.14	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/07/2021	15/08/2021					0,0%	A Iniciar		
2.15	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	16/08/2021	31/08/2021					0,0%	A Iniciar		
2.16	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/09/2021	15/09/2021					0,0%	A Iniciar		

2.17	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política de distribuição de cota parte municipal do ICMS, estratégia de identificação e estimação dos efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos da cota parte municipal do ICMS com base em resultados educacionais.	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.18	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.19	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas públicas executadas pelos estados da região Nordeste (Ceará Pacífico; Pacto pela Vida - Pernambuco, etc)	UFC	01/04/2021	20/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.20	Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.21	Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.22	Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	A Iniciar		
2.23	Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	21/12/2021	04/02/2022					0,0%	A Iniciar		
2.24	Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	05/02/2022	20/02/2022					0,0%	A Iniciar		
2.25	Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	21/02/2022	07/03/2022					0,0%	A Iniciar		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	21/12/2021	19/02/2022					0,0%	A Iniciar		
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	20/02/2022	21/04/2022					0,0%	A Iniciar		
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	22/04/2022	21/06/2022					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 480.600,00	Valor realizado:		R\$ 480.600,00	25%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal do Ceará

Observações:

Processo SEI 59336.002083/2020-84

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGCP/2020001 (EX PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Objetivo do projeto:	Planejar e promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.967.929,00	R\$ 1.967.929,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/3/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE			TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 708.040,89
R\$ 1.967.929,00			R\$ 1.967.929,00	A realizar no exercício	R\$ 1.195.853,50
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 708.040,89

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Relatório de planejamento da estrutura de execução, articulação e monitoramento do PRDNE	Este relatório produto 1 planejará em detalhe as atividades consoantes entre as três trilhas e aprofundará os conteúdos previstos para cada produto, planejando a articulação de atores e o cronograma sincronizados de atividades; especificando os vínculos dos processos de articulação do PRDNE à trilha de inteligência.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	29/7/2019	27/9/2019	R\$ 205.154,25	29/7/2019	18/11/2019	R\$ 205.154,25	100%	Concluído		
2	Relatório estratégico de internalização do PRDNE nos Grupo de Trabalho Sudene	O produto 2 tem como alvo a internalização na Sudene da estruturação do plano à luz dos seis eixos estratégicos; constituindo uma experiência que se materializa com a formação e consolidação de grupos de trabalho (GT PRDNE Sudene) e discussão em detalhes dos eixos do PRDNE e os programas e projetos acordados nos planos.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	2/9/2019	15/10/2019	R\$ 359.231,25	2/9/2019	18/11/2019	R\$ 347.781,25	100%	Concluído		
3	Relatório da estratégia de articulação e comunicação do PRDNE na região	O produto 3 levará em consideração os seis eixos estratégicos e apresentará uma proposta para a comunicação e o desenvolvimento de ações, em articulação com os estados e atores no escopo de atuação da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	23/9/2019	31/10/2019	R\$ 207.690,00	1/11/2019	10/12/2019	R\$ 155.105,39	100%	Concluído		
4	Detalhamento dos Projetos Prioritários	O produto 4 organiza em Fichas Técnicas os projetos prioritários do PRDNE, conforme modelo aprovado por Sudene e CGEE. Reuniões técnicas entre CGEE e os GTs da Sudene serão realizadas para aprovar as Fichas Técnicas preenchidas. Tais Fichas servirão como instrumentos de negociação além de insumos para a consolidação da metodologia de monitoramento entregue no processo de gestão da Trilha de Inteligência do PRDNE, compromisso esse firmado entre o CGEE e a Sudene. Tem como objetivo central organizar 60 (sessenta) Fichas de Projetos priorizados pelos GTs da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	28/2/2021	R\$ 385.500,25	1/8/2020			30%	Atrasado	Este produto deveria ter sido entregue em 31/12/2020, porém a consultoria contratada (CGEE) apresentou atraso em relação ao cronograma de entregas.	A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20.

5	Relatório de Reposicionamento Estratégico do PRDNE Revisado	O produto 5 é um relatório com revisão do PRDNE, analisando a pertinência das ações, a consistência interna e a viabilidade técnica, levando em conta eventuais mudanças no cenário do contexto externo. Será avaliado se a estratégia do Plano está adequada para reposicionar as prioridades, considerando as medidas formuladas pelo Governo Federal para a Região Nordeste e os esforços conjuntos das instituições, empresas e da sociedade civil que podem contribuir para alcançar resultados para a Região. O produto tem como objetivo apresentar a proposta de revisão do PRDNE, por eixo estratégico à luz da nova realidade.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 197.909,25	1/7/2020			80%	Atrasado	O CGEE encaminhou uma versão do produto em 30/09/2020 porém o conteúdo não foi aprovado pela equipe técnica (SEI 189509). Uma nova versão foi apresentada em 23/11/2020 mas o conteúdo foi insuficiente para aprovação técnica (SEI 203981).	A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 5, 6 7,10,13,16,17,18, 19 e 20.
6	Relatório contendo insumos para revisão do PRDNE	O produto 6 será um relatório com recomendações para revisão anual do PRDNE com base em Consulta Estruturada utilizando a ferramenta Insight Survey do CGEE junto aos principais stakeholders da SUDENE em preparação a nova pactuação do PRDNE. As equipes técnicas, os consultores e equipes internas dos grupos técnicos da SUDENE dialogarão com representantes de governos dos estados da região de abrangência do PRDNE e colherão subsídios adicionais para validação das propostas. Constituem objetivo do produto a coletar insumos para revisão do PRDNE validando propostas e descrever recomendações para revisão do PRDNE com base nos insumos e inferências compiladas através de processo de Consulta Estruturada (instituições, sociedade civil, associações, IES, bancos, etc.) constituem o objetivo central deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	30/1/2020	R\$ 352.590,00	1/8/2020			30%	Atrasado	Um dos insumos do produto é a consulta estruturada, que foi realizada entre os dias 04/12/2020 a 15/12/2020. Porém, o objetivo da consulta não foi alcançado uma vez que houve pouca participação de atores estratégicos.	A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 5, 6 7,10,13,16,17,18, 19 e 20.
7	Nova Versão Revisada do PRDNE	O produto 7 será um relatório de revisão completa do PRDNE. Apresentará uma análise por eixo estratégico do plano, assim como uma revisão no desenvolvimento das conquistas do PRDNE e seu alcance face ao novo cenário e seus impactos, contemplando a Revisão dos indicadores e das metas de resultado dos programas do Plano e avaliação da aderência do PRDNE com a ENDES e a PNDR, em especial, ao foco em reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da inovação e à estratégia territorial. É prevista a apresentação e discussão da nova versão nas Câmaras Temáticas, a não apresentação, no entanto, não implicará em prejuízo ou trará impactos na conclusão e entrega deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	30/6/2021	R\$ 259.854,00				0%	A Iniciar	A iniciar	A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 5, 6 7,10,13,16,17,18, 19 e 20.
				Valor Previsto:		R\$ 1.967.929,00	Valor realizado:		R\$ 708.040,89	63%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGCP/2020002 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa:	ação não orçamentária	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	ação não orçamentária	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		
Finalidade da ação:	Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira		
Problema (causa):	Necessidade da otimização da prospecção de investimentos com impacto potencial sobre a economia e a qualidade de vida da população nordestina.				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.				
Objetivo do projeto:	Planejamento preliminar e implementação de ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	ação não orçamentária				

Previsão de Conclusão:	12/12/2022
Data Atualização:	31/3/2021

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	BNDES		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	1/10/2019	30/10/2019		30/10/2019	27/11/2019		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2019		27/11/2019	28/11/2019		100%	Concluído	Parecer Técnico nº 329/2019	
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/1/2020		17/1/2020	13/7/2020		100%	Concluído	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	30/10/2019	30/1/2020		19/12/2019	19/12/2019		100%	Concluído		

5	Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/2/2020	12/12/2022		6/1/2020			60%	Em Andamento	Trata-se de uma atividade contínua. No último trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários (o que está previsto para o Produto 10 da Carta de Acordo com o CGEE)	Está em negociação com o CGEE a entrega de alguns produtos previstos para o ano, dentre eles o P4 que detalha alguns projetos, e cancelamento de outros, dentre os quais o P10, que aprofunda o detalhamento em Sumários Executivos. Após a negociação será possível avaliar nova contratação para suprir informações de projetos e retomar contato com o BNDES com vistas a articulação para estruturação.
6	Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/6/2022	30/7/2022					0%	A Iniciar		
7	Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/12/2022	12/12/2022					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 0,00		Valor realizado:		R\$ 0,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:
BNDES

Observações:

(1) Parecer Técnico nº 329/2019 (SEI nº 0123625)

(2) Para o ano Ciclo de Avaliação 2020, foram consideradas as atividades previstas no cronograma com prazo até 30/09/2020, tendo em vista a vigência de 2 anos do ACT, e haverá etapas a serem realizadas em 2021 e 2022, constarão como metas institucionais para os próximos ciclos de avaliação.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGCP/2020003 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 1.581.148,75	R\$ 1.581.148,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/3/2021

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 889.987,96
R\$ 1.581.148,75	R\$ 0,00		R\$ 1.581.148,75	A realizar no exercício	R\$ 500.666,50
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 889.987,96

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Relatório de análise do mapeamento de programas, projetos e ações	O produto 8 tem a finalidade de realizar a análise da convergência entre os Programas, Projetos e Ações do PRDNE com o PPA Federal, com os PPAs Estaduais e o PPI, preparando a SUDENE para a negociação com os órgãos federais e captação de recursos para a Região.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 235.111,50	1/7/2020	20/11/2020	R\$ 209.442,73	100%	Concluído		
2	Relatório Documento de concertação junto ao corpo parlamentar Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários	O produto 9 consuma a realização do Seminário PRDNE - Eixos estruturantes e carteira de projetos prioritários, e se materializa como um documento de concertação do PRDNE junto ao corpo parlamentar. Este produto deve ser entendido com documento guia para a concertação do PRDNE na Câmara Federal e no Senado, durante o exercício de negociação e aprovação do PPA federal.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	30/9/2019	13/12/2019	R\$ 374.928,75	30/9/2019	10/12/2019	R\$ 224.031,78	100%	Concluído		

3	Composição de Sumários Executivos de Projetos Prioritários	O produto 10 detalha sob o formato de Sumários Executivos 20 (vinte) projetos estratégicos para o Nordeste, apontados pela SUDENE e Ministério do Desenvolvimento Regional, selecionados dentre os 60 (sessenta) projetos priorizados pela Sudene. Dessa forma, será possível ter uma visão panorâmica acerca do projeto e permitam inferir indicativos de préviabilidade de sua operacionalização, oferecendo uma visão preliminar e geral do projeto para uma melhor percepção do gestor, subsídios para a tomada de decisão, acerca de sua potencial viabilidade de execução.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	31/5/2021	R\$ 291.527,50	1/12/2020		0%	A Iniciar		A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 7,10,13,16,17,18 e 19.
4	Diretrizes estratégicas para Governança do PRDNE	O produto 11 é um documento orientador a SUDENE com vistas a fortalecer o processo de governança regional. Seu objetivo é legitimar o papel da Sudene e suas atribuições na coordenação do PRDNE em nível regional através da estratégia de articulação do PRDNE. O documento consiste num mapeamento dos principais stakeholders, caracterização e nível de integração ao PRDNE permitindo visualizar e compreender as múltiplas articulações dos atores com projetos do Plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R\$ 227.010,00	1/7/2020	3/12/2020	R\$ 222.976,16	100%	Concluído	
5	Proposta de modelo de financiamento do PRDNE	O produto 12 apresentará um mapeamento de modelos de financiamento convergentes com os programas e projetos do PRDNE. O documento é um relatório que sistematizará um conjunto de proposições com o intuito de avançar no entendimento e no aperfeiçoamento dos modelos de financiamento existentes e em operação, permitindo avanços no entendimento e no aperfeiçoamento institucional habilitador de novos mecanismos de financiamento necessários ao PRDNE, identificando modelos convergentes à projetos estratégicos.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	15/12/2020	R\$ 243.432,00	1/8/2020	14/12/2020	R\$ 233.537,29	100%	Concluído	
6	Relatório de Recomendações à melhoria da competitividade e a novos direcionamentos estratégicos ao PRDNE	O relatório produto 13 é um documento que apresentará recomendações para melhoria da competitividade da Região a partir de um diagnóstico do nível de competitividade da economia nordestina, apontando caminhos estratégicos para o aumento da competitividade do Nordeste, convergentes com o desenvolvimento, inovação e demais eixos estratégicos do PRDNE. Tem como objetivo incorporar as recomendações para melhoria da competitividade e fortalecer a implementação do PRDNE.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/3/2021	31/7/2021	R\$ 209.139,00	1/3/2021		0%	A Iniciar	A iniciar	A contratada apresentou um Plano de Trabalho em 17/03/2021 que, no entendimento da equipe técnica, não atende aos itens mínimos necessários para a sua aprovação. Ainda está em negociação com a contratada a revisão dos produtos já entregues. Será solicitado o cancelamento dos produtos 7,10,13,16,17,18, 19 e 20.
Valor Previsto:						R\$ 1.581.148,75	Valor realizado:		R\$ 889.987,96	67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afetos ao tema.

Observações:

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.

(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. **Acordo de Cooperação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.**

(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	CGDF/2008001 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLISA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão Física:	19/09/2016
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$	811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	-	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00			3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto												
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).												
Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.												
Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).												
Obs17: A TLSA efetuou a recomposição do saldo da conta reserva em 23/10/19, no valor de R\$ 112.647.260,64.												
Obs18: Foi concedida prorrogação, pelo prazo de 30 dias, do vencimento da amortização programada para 19/09/2020, em caráter cautelar, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da Sudene nº 569/2020 (SEI nº 0182999).												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO CGDF/2008002 (ex PO 35)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano: 2008	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,0%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			17/06/14	15/02/19	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").											
Obs:3 Aguardando a emissão da versão final do CCE.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	CGDF/2011001 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):					
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Cancelado	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.700.000,00	Valor realizado:		59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2011002 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto: Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Cancelado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			-	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2011003 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Cancelado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluia/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			-	-	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6: Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.											
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2012001 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	299.869.740,06	701.131.477,00

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	0,00	-	-	-	100,00%	Concluído	Ver Observação 3.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	299.869.740,06	19/04/13	23/09/16	299.869.740,06	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não Informado		100,00%	Concluído	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		26/01/21	26/01/21		100,00%	Concluído	Ver Observação 5.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	Não informado	26/01/21	0,00	100%	Concluído		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		299.869.740,06	Valor realizado:		299.869.740,06	100,00%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.
- Obs3: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 303.000.000,00 para R\$ 299.869.740,06, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2013NE000005 (SEI nº 0066573), no valor de R\$ 3.192.865,13 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE).
- Obs4: A empresa solicitou reperfilamento da dívida. A DFIN acatou o pleito.
- Obs5:fO Certificado de Conclusão do Empreendimento segue acostado ao Processo nº 59334.002783/2012-89 no documento SEI nº 0220551.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2012002 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	19.539.983,88	63.051.003,61

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2016
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	-4.037.814,18	-	-	-	0,00%	Concluído	Ver Observação 5.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	19.539.983,88	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										80%	Concluído	
9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		19.539.983,88	Valor realizado:		19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.	
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)	
Obs5: A SUDENE enviou Ofício ao BB em 20/04/2018, solicitando informações sobre as ações para a regularização do Projeto (descumprimento do art. 36 do Regulamento do FDNE)	
Obs6: Foi reduzido o valor de participação do FDNE no projeto de R\$ 23.855.042,00 para R\$ 19.539.983,88, devido ao cancelamento em 28/03/2019, do saldo do Empenho 2012NE000011 (SEI nº 0066565), no valor de R\$ 4.401.360,30 (incluídas as despesas acessório-legais - 2% da SUDENE);	
Obs7: Resta pendente a emissão do CCE por parte do Agente Operador, tendo a SUDENE efetuado a cobrança necessária quanto à emissão do Certificado.	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2012003 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Deten Química S.A.					
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão Física:	28/12/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	31.256.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	31.256.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	Concluído	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	15/05/18	31.256.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

7	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	

Encerramento (Banco)	Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	31.256.000,00	75,00%	Atrasado	Status do Projeto			
Parceiros institucionais:										
Observações:										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2: Foi apresentado pelo BB uma nova versão do QUF do empreendimento. Após a apreciação e deliberação do assunto por parte da SUDENE, o pleito foi aprovado, restando pendente a emissão do CCE por parte do Banco.										
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)										

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2012004 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Braskem S.A.					
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19	-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO CGDF/2014001 (ex PO 43)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/06/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 323.510.889,33
A realizar no exercício	R\$ 18.917.623,86
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 92.071.673,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 323.510.889,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/12/20	31/12/20	5.905.378,38	15/12/20	-	5.675.760,33	25,00%	Em Andamento	A empresa encontra-se com dificuldades para emitir algumas certidões de regularidade.	
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/01/21	31/01/21	42.628.756,59					A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/CEF	01/05/21	31/05/21	30.525.292,34					A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/CEF	01/12/21	31/12/21	13.012.245,48	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/21	415.582.562,12	21/02/14	-	323.510.889,33	78,13%	Em Andamento		

Competência da SUDENE /Banco									89%	Em Andamento		
14	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	R\$	415.582.562,12	Valor realizado:	R\$	323.510.889,33	71%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:										
Observações:										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.										
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.										
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.										
Obs5:										
Obs5:										

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	CGDF/2015001 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015	
Programa do PPA:	2217 -Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.				
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emit-lo.	
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).												
Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	CGDF/2016001 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira		
Problema (causa):					
Projeto:	Brametal S.A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 4.095.556,81
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	0,00%	Atrasado	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emití-lo.
Encerramento (Banco)			Não informado	15/02/19	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	4.095.556,81		Valor realizado:	R\$	4.095.556,81	
									50%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

PLANO DE AÇÃO 2021						
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	CGDF/2016002 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2016	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Placas do Brasil S/A					
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão Física:	Não informado	17/09/2019	60	16/11/2019
Previsão de Conclusão ADM:	16/11/2019			
Data Atualização:	31/03/2021			

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 152.962.408,33
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 152.962.408,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	52.000.000,00	23/01/18	12/04/18	52.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	19/04/18	19/05/18	39.500.000,00	19/04/18	09/07/18	39.500.000,00	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	30/06/18	30/07/18	29.229.782,94		18/02/19	29.229.782,94	100,00%	Concluído	O BB enviou o pedido de liberação em 27/11/2018.	
9		SUDENE/BB			9.880.922,39	-	-	-	100,00%	Cancelado	A empresa renunciou ao saldo a liberar destinado ao projeto (R\$ 9.880.922,39). Com isso, a Sude ne efetuou o cancelamento do saldo do empenho inscrito em Restos a Pagar.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	30/07/18	162.843.330,72	-	18/02/19	152.962.408,33	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE/Banco									100%	Concluído		

10	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	100,00%	Concluído	De acordo com o modelo de Certificado de Conclusão de Empreendimento (CCE) aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 326/2018, deixou de ser obrigatória a informação sobre as datas das fiscalizações realizadas para emissão do CCE.	
11	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	16/11/19	16/11/19		05/03/21	05/03/21	-	100,00%	Concluído	QUF foi aprovado na 318ª reunião da DC, no dia 18/03	
Encerramento (Banco)			Não informado	16/11/19	0,00	Não informado	05/03/21	0,00	100,00%	Concluído		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 162.843.330,72	Valor realizado:		R\$ 152.962.408,33	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi efetuada a devolução de recursos ao FDNE, referente à quinta parcela, em razão do inadimplemento da primeira parcela da operação, vencida em 01/08/2019.

O Banco do Brasil - BB comunicou em 22/11/2019 (SEI nº 0124210) o cancelamento do desembolso previsto da quinta e última parcela, no valor de R\$ 9.880.922,39, por solicitação da Empresa beneficiária, e a regularização da operação, mediante acordo entre as partes. Restam pendentes a apresentação do QUF Final do Projeto e a emissão do CCE por parte do Agente Operador, com base na

Obs3: Resolução da Diretoria Colegiada da SUDENE nº 326/2018, de 17.12.2018.

Obs4: O Certificado de Conclusão do Empreendimento segue acostado ao Processo nº 59334.003156/2015-16 no documento SEI nº 0227830.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDF/2020001 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2020
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2020. Relatórios dos períodos jan-mar/2020; jan-jun/2020; jan-set/2020 e jan-dez/2020.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2020	25/04/2020	-	01/04/2020	-	-	100%	Cancelado	A base de dados enviada pelo BNB apresentou inconsistências.	
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2020	06/05/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado	Em todas as remessas foram identificados erros que impediram a elaboração de um relatório livre de falhas. Uma minuta chegou a ser elaborada (SEI nº 0162973), entretanto, posteriormente verificamos a existência de inconsistência com outros dados encaminhado pelo banco. Desta forma, solicitamos o envio de nova remessa de dados, mas findado o prazo proposto pelo próprio banco, a base de dados não foi entregue, tendo o BNB enviado nova remessa referente ao semestre inteiro.	A Resolução nº 558/2020 da Diretoria Colegiada da Sudene promoveu ajuste da meta de número 10 do anexo à Portaria Sudene nº 165/2019, sendo reduzido de 4 para 3, com a manutenção do seu percentual de execução em 100%, referente à ação de Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, no período out/2019 - set/2020.
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2020	15/05/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2020	25/06/2020	-	01/06/2020	30/07/2020	-	100%	Concluído		
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2020	06/07/2020	-	31/07/2020	31/08/2020	-	100%	Concluído		

6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2020	15/07/2020	-	10/09/2020	10/09/2020	-	100%	Concluído		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2020	25/10/2020	-	10/11/2020	23/12/2020	-	100%	Cancelado	A base de dados enviada pelo BNB apresentou inconsistências.	
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2020	05/11/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado	Em todas as remessas foram identificados erros que impediram a elaboração de um relatório livre de falhas. Uma minuta chegou a ser elaborada (SEI nº 0204617), entretanto, posteriormente verificamos a existência de inconsistência com outros dados encaminhado pelo banco. Desta forma, solicitamos o envio de nova remessa de dados que foi entregue pelo banco em 23/12/2020, no final do quarto trimestre.	
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2020	15/11/2020	-	-	-	-	100%	Cancelado		
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2020	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	27/01/2021	27/01/2020	-	100%	Concluído		
11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2019.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	28/01/2021	11/02/2021	-	100%	Concluído		
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	15/02/2021	-	18/03/2021	18/03/2021	-	100%	Concluído		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:			R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações

BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdir@bnb.gov.br)

Observações:

Processo nº 59336.000717/2020-64

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2019001 (EX PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2019
Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	31/07/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 85.228.132,65
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ 622,19
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 85.228.132,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 529/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/18	22/08/19	0,00	19/12/18	23/08/19	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	14.279.547,22	23/10/19	08/11/19	14.279.547,22	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	8.103.276,36	08/01/20	03/03/20	8.103.276,36	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	6.458.271,68	20/04/20	29/04/20	6.458.271,68	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	4.138.815,59	02/07/20	12/08/20	4.138.815,59	100,00%	Concluído		
8	Liberção 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	52.248.843,99	30/10/20	12/11/20	52.248.221,80	100,00%	Concluído	Resta um saldo de R\$ 622,19 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			23/08/19	31/10/20	85.228.754,84	23/08/19	-	85.228.132,65	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 85.228.754,84	Valor realizado:		R\$ 85.228.132,65	82%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2019002 (EX PO 49)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2019	
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira	
Problema (causa):						
Projeto:	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.					
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	31/07/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 83.252.534,84
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ 1.976.220,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 83.252.534,84

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 530/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/18	22/08/19	0,00	19/12/18	23/08/19	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	13.544.355,92	23/10/19	11/11/19	13.544.355,92	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	4.798.767,68	08/01/20	03/03/20	4.798.767,68	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	9.283.704,42	20/04/20	29/04/20	9.283.704,42	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	442.945,84	02/07/20	12/08/20	442.945,84	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	57.158.980,98	30/10/20	12/11/20	55.182.760,98	100,00%	Concluído	Resta um saldo de R\$ 1.976.220,00 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			23/08/19	31/10/20	85.228.754,84	23/08/19	12/11/20	83.252.534,84	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 85.228.754,84	Valor realizado:		R\$ 83.252.534,84	82%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDF/2021001 (EX PO 50)
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Ano:	2021
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2021. Relatórios dos períodos jan-mar/2021; jan-jun/2021; jan-set/2021 e jan-dez/2021.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	2	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2021	25/04/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
2	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2021	06/05/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
3	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2021	-	-	-	-	-	A Iniciar		
4	Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2021	25/06/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
5	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2021	06/07/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
6	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2021	-	-	-	-	-	A Iniciar		
7	Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2021	25/10/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
8	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2021	05/11/2021	-	-	-	-	A Iniciar		
9	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2021	-	-	-	-	-	A Iniciar		
10	Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	-	-	-	A Iniciar		

11	Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	-	-	-		A Iniciar		
12	Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	-	-	-	-	-		A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	#DIV/0!	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações												
BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdir@bnb.gov.br)												
Observações:												
Processo nº -												

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2020002
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Ventos de São Fernando IV Energia S/A				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	228.672.439,20	361.120.732,00

Previsão de Conclusão Física:	31/03/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/09/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 186.977.152,86
A realizar no exercício	#REF!
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 26.647.249,52
Saldo a liberar	R\$ 15.048.036,82
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 213.624.402,38

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	27/12/20	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	26/05/20	23/10/20	-	26/05/20	13/08/20	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	13/08/20	12/09/20	-	13/08/20	11/09/20	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	12/09/20	0,00	11/12/19	11/09/20	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	11/09/20	10/11/20		11/09/20	22/09/20			100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/10/20	26/11/20	105.116.695,74	27/10/20	12/11/20	105.116.695,74		100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	13/11/20	13/12/20	37.312.882,51	13/11/20	26/11/20	37.312.882,51		100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	03/12/20	02/01/21	44.547.574,61	03/12/20	28/12/20	44.547.574,61		100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	22/01/21	21/02/21	21.149.995,99	22/01/21	05/02/21	21.149.995,99		100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	11/02/21	13/03/21	5.497.253,53	11/02/21	26/02/21	5.497.253,53		100,00%	Concluído		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	15.048.036,82					0,00%	A Iniciar	Existe saldo pendente de R\$ 15.048.036,82	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			11/09/20	01/05/21	228.672.439,20	11/09/20	26/02/21	213.624.402,38	85,71%		Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										93%	Em Andamento		

11	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 228.672.439,20	Valor realizado:		R\$ 213.624.402,38	75%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO CGDF/2020003	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Central Eólica Boqueirão I S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	113.680.904,39	189.470.934,65

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2022
Previsão de Conclusão ADM:	30/06/2023
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 73.284.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 113.680.904,39
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	19/10/20	0,00	11/12/19	19/10/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	31/01/21	1.046.000,00				0,00%	A Iniciar	A empresa está em negociação com o banco para apresentação das garantias evolutivas atreladas à liberação de recursos.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	19.656.000,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	10.960.000,00				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	41.622.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	1.450.000,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	01/05/22	5.516.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	31/07/22	23.037.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/22	31/10/22	9.890.000,00				0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	01/12/22	31/12/22	503.904,39				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/20	31/12/22	113.680.904,39	19/10/20	-	0,00	10,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									55%	Em Andamento		

14	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 113.680.904,39	Valor realizado:	R\$ -	27%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: A Sudene aprovou a alteração do quadro de usos e fontes e do cronograma de desembolso do projeto, vide documento SEI nº 0222442.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2020004
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Central Eólica Boqueirão II S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	102.312.813,95	170.523.841,18

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2022
Previsão de Conclusão ADM:	30/06/2023
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 57.289.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 102.312.813,95
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 577/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			11/12/19	19/10/20	0,00	11/12/19	19/10/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	31/01/21	818.000,00				0,00%	A Iniciar	A empresa está em negociação com o banco para apresentação das garantias evolutivas atreladas à liberação de recursos.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	15.366.000,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	8.568.000,00				0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	32.537.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	1.617.000,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	01/05/22	6.148.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	31/07/22	25.676.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/22	31/10/22	11.023.000,00				0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	01/12/22	31/12/22	559.813,95				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/10/20	31/12/22	102.312.813,95	19/10/20	04/12/20	0,00	10,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									55%	Em Andamento		

14	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 102.312.813,95	Valor realizado:		R\$ -	27%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A Sudene aprovou a alteração do quadro de usos e fontes e do cronograma de desembolso do projeto, vide documento SEI nº 0222442.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO CGDF/2020005
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque edílico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	103.459.637,40	172.432.729,00

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	31/07/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	
A realizar no exercício	R\$ 27.928.637,40
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 70.157.041,59
Saldo a liberar	R\$ 33.302.595,81
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 70.157.041,59

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Diego Veras	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	29/12/19	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	19/10/20	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 583/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	18/11/20	0,00	29/11/19	17/11/20	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	09/12/20			100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/20	31/12/20	75.531.000,00	19/03/21		70.157.041,59		50,00%	Em Andamento		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	7.223.000,00			0,00		0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	20.705.637,40			0,00		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/11/20	31/10/21	103.459.637,40	17/11/20		70.157.041,59		37,50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco										69%	Em Andamento		

8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 103.459.637,40	Valor realizado:		R\$ 70.157.041,59	50%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		PO CGDF/2020006
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:		2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Eixo temático (MDR):		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
			Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		DFIN/CGDF		
Problema (causa):			Gestor da subunidade:		
Projeto:	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.		Breno Arruda Soares de Oliveira		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	90.858.400,56	151.430.667,60

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	31/07/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 31.050.400,56
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 19.807.254,22
Saldo a liberar	R\$ 71.051.146,34
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.807.254,22

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	20/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 585/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	18/11/20	0,00	29/11/19	17/11/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	09/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/20	31/12/20	59.808.000,00	19/03/21		19.807.254,22	50,00%	Em Andamento		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	8.031.000,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	23.019.400,56				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/11/20	31/07/21	90.858.400,56	17/11/20		0,00	37,50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									69%	Em Andamento		

8	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 90.858.400,56	Valor realizado:		R\$ -	50%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2020007
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.786.889,22	92.978.148,60

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	31/07/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 17.338.889,22
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 15.891.285,35
Saldo a liberar	R\$ 39.895.603,87
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.891.285,35

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	15/10/20	14/11/20	-	15/10/20	11/12/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 584/2020.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/11/19	14/11/20	0,00	29/11/19	11/12/20	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/20	31/12/20	38.448.000,00	19/03/21		15.891.285,35	50,00%	Em Andamento		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	4.484.000,00				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	12.854.889,22				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/12/20	31/10/21	55.786.889,22	19/03/21		0,00	37,50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									69%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar				
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.			
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar				
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$	55.786.889,22		Valor realizado:		R\$	-	50%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:														
Observações:														
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.														

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2021002
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Canudos II SPE S.A.				
Objetivo do projeto:	Implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	31/10/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
--	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 165.633.388,94
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 13.421.425,12
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 13.421.425,12
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 183.361.938,16
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	03/02/21	03/07/21	-	03/02/21	08/02/21	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	03/03/21	-		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 610/2021.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/08/20	10/03/21	0,00	24/08/20	03/03/21	0,00	100,00%		Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	06/04/21			100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50					0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44					0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22					0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/03/21	31/01/22	183.361.938,16	04/03/21	06/04/21	0,00	25,00%		Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%		Em Andamento		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$	183.361.938,16	Valor realizado:	R\$	-	44%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2021003
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2021
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MDR):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Canudos III SPE S.A.				
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

Previsão de Conclusão Física:	30/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	31/10/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva
---	-----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 165.633.388,94
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 13.421.425,12
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 13.421.425,12
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 183.361.938,16
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/02/21	04/07/21	-	04/02/21	08/02/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	03/03/21	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 611/2021.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/08/20	10/03/21	0,00	24/08/20	03/03/21	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	06/04/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50				0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44				0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22				0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			04/03/21	31/01/22	183.361.938,16	04/03/21	06/04/21	0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									63%	Em Andamento		

9	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 183.361.938,16	Valor realizado:		R\$ -	44%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:											
Observações:											
Obst: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO COCIC/2021001 (EX POs 51 e 52)
Sub-Obj. estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2021
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	n se aplica
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1 Processo nº 59335.000284/2018-32 - Barreiras/BA (SIAFI nº 879067), Emissão de Nota Técnica 12/2021 (Doc SEI nº 0220045)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	18/01/2021	02/02/2021	n se aplica	26/01/2021	26/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
2 Processo nº 59335.000110/2018-70 - Maxaranguape - RN (SIAFI nº 865859), Emissão de Nota Técnica 13/2021 (Doc SEI nº 0220253)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	26/01/2021	10/02/2021	n se aplica	27/01/2021	27/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
3 Processo nº 59335.000175/2017-34 - Iguçu - BA (SIAFI nº 847036), Emissão de Nota Técnica 09/2021 (Doc SEI nº 0218200)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/12/2020	12/01/2021	n se aplica	21/01/2021	21/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
4 Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Nota Técnica nº 01/2021 (Doc SEI nº 0216598)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	28/12/2020	12/01/2021	n se aplica	06/01/2021	06/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
5 Processo nº 59335.000181/2017-91 - Sítio do Mato/BA (SIAFI nº 847042), Emissão de Nota Técnica nº 08/2021 (Doc SEI nº 0217508)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	06/01/2021	21/01/2021	n se aplica	11/01/2021	11/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
6 Processo nº 59336.000568/2019-08 - Mulungu do Morro - BA (SIAFI nº 883046), Emissão de Nota Técnica nº 05/2021 (Doc SEI nº 0217180)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	05/01/2021	20/01/2021	n se aplica	11/01/2021	11/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
7 Processo nº 59336.000568/2019-08 - Mulungu do Morro - BA (SIAFI nº 883046), Emissão de Nota Técnica nº 10/2021 (Doc SEI nº 0219034)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/01/2021	26/01/2021	n se aplica	19/01/2021	11/01/2021	n se aplica	100%	Concluído		
8 Processo nº 59335.000202/2018-50 - Vitória da Conquista/BA (SIAFI nº 872770), Emissão de Nota Técnica 17/2021 (Doc SEI nº 0168280)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	20/01/2021	04/02/2021	n se aplica	04/02/2021	-	n se aplica	75%	Atrasado	Processo está atrasado, mas encontra-se em andamento.	
9 Processo nº 59336.001934/2018-57 - Sátiro Dias - BA (SIAFI nº 881046), Emissão de Nota Técnica 19/2021 (Doc SEI nº 0222294)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	20/01/2021	04/02/2021	n se aplica	05/02/2021	05/02/2021	n se aplica	100%	Concluído		
10 Processo nº 59336.001934/2018-57 - Sátiro Dias - BA (SIAFI nº 881046), Emissão de Nota Técnica 23/2021 (Doc SEI nº 0224149)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	05/02/2021	20/02/2021	n se aplica	23/02/2021	23/02/2021	n se aplica	100%	Concluído		

11	Processo nº 59336.001184/2019-02 - Evolução do Passivo de Processos da extinta SUDENE de posse da COCIC (Sem SIAFI), Emissão de Nota Técnica 22/2021 (Doc SEI nº 0223671)	Heber Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	N/A	N/A	ñ se aplica	12/02/2021	12/02/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59335.000067/2016-81 - Natal - RN (SIAFI nº 828301), Emissão de Nota Técnica 47/2021 (Doc SEI nº 0232613)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	19/03/2021	03/04/2021	ñ se aplica	26/03/2021	26/03/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
13	Processo nº 59335.000195/2018-96 - Jacaraci/BA (SIAFI nº 875543), Emissão de Nota Técnica 33/2021 (Doc SEI nº 0226639)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	23/02/2021	25/07/2021	ñ se aplica	01/03/2021	-	ñ se aplica	75%	Em Andamento		
14	Processo nº 59335.000218/2018-82 - Município de Marcelino Vieira-RN (SIAFI nº 875547), Emissão de Nota Técnica Nº46/2021 (Doc SEI nº 0232535)	Fernanda Ferrário(COCIC - Núcleo de Análise)	15/03/2021	30/03/2021	ñ se aplica	26/03/2021	-	ñ se aplica	75%	Atrasado	Processo está atrasado, mas encontra-se em andamento.	
15	Processo nº 59335.000371/2017-17 - Icapui/CE (SIAFI nº 853282), Emissão de Nota Técnica nº 36/2021 (Doc SEI nº 0228335)	Clovis Emidio (COCIC - Núcleo de Análise)	04/03/2021	19/03/2021	ñ se aplica	09/03/2021	09/03/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
16	Processo nº 59335.000124/2018-93 - Filadélfia/BA (SIAFI nº 865860), Emissão de Nota Técnica nº 50/2021 (Doc SEI nº 0233184)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	24/03/2021	08/04/2021	ñ se aplica	30/03/2021	30/03/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo nº 59335.000125/2018-38 - Município de Paulo Afonso - BA (SIAFI nº 865861), Emissão de Nota Técnica Nº 51/2021 (Doc SEI nº 0233680)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	29/03/2021	13/04/2021	ñ se aplica	29/03/2021	05/04/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59336.000183/2021-57 - Acordo de Cooperação Técnica (ACT) - Ministério da Economia, Emissão de Nota Técnica Nº 35/2021 (Doc SEI nº 0227608)	William Augusto de Souza(COCIC)	25/02/2021	12/03/2021	ñ se aplica	10/03/2021	10/03/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
19	Processo nº 59335.000068/2017-14 - Município de Bom Jesus - RN (SIAFI nº 850667), Emissão de Nota Técnica Nº 301/2020 (Doc SEI nº 199741)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	03/08/2020	18/08/2020	ñ se aplica	20/11/2020		ñ se aplica	75%	Atrasado	Processo atrasado, mas está em andamento.	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	95%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.												
Observações:												
1º ciclo 2021 - Jan/2020 a Março/2021												
Os POs 51 (2019) e 52 (2020) foram consolidados nessa planilha.												

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO CPTCE/2020001 (ex PO 53)
Sub-Obj. estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2020
Programa:	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo			Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade			Objetivo estratégico (MDR):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração			Subunidade responsável:	CPTCE - Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira			Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo TCE nº 59335.000035/2011-70, Ref. Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85) - Relatório de TCE nº 001/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020	12/03/2021	N/A	100%	Concluído	TCE encaminhada em 2019 à CGU e devolvida pela CGU em abril/2020, para reanálise. Reanálise da TCE concluída em 12/03/2021	
2	Processo TCE nº 59335.000102/2011-57, Ref. Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	30/06/2021	N/A	09/04/2020		N/A	90%	Em Andamento	TCE em andamento	
3	Processo TCE nº 59335.000032/2010-56, Ref. Conv. DPS nº 038/97, SIAFI nº 338592, Morno Cabeça no Tempo-PI (Processo Convênio nº 03057.000045/97-87) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	31/03/2021	29/06/2021	N/A	31/03/2021		N/A	66%	Em Andamento	TCE em andamento	
4	Processo TCE nº 59335.000720/2010-16, Ref. Conv. SIAFI nº 406373 (Processo nº 59313.000114/00-87) - Emissão de Relatório de TCE nº 2020 (em elaboração) - Elaboração de Relatório de TCE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020		N/A	66%	Em Andamento	Tce iniciada durante a pandemia COVID/19	
5	Processo TCE nº 59335.000153/2012-60 Ref. Conv. SIAFI nº 335319 (Processo nº 03054.000042/97-84) - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo Alves de Souza, Eliane Maria Bezerra Acioly (CPTCE)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	50%	Em Andamento	TCE suspensa devido a falta de Computador para dar andamento ao Home Office.	
6	Processo de TCE nº 59335.000184/2010-59, ref. Conv. SIAFI nº 348984 (proc. Nº 03055.000025/98-34), Governo do Estado de Alagoas. - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	04/02/2020	31/12/2020	N/A	04/02/2020		N/A	50%	Em Andamento		
7	Processo de TCE nº 59335.000040/2012-64, Ref. Conv. SIAFI nº 337714 (Processo nº 03057.000033/97-06) CEFET MA - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	17/02/2020	31/12/2020	N/A	17/02/2020		N/A	25%	Em Andamento	Em reanálise, pois a priori, o convênio não reuniu os pressupostos para instauração de TCE	
8	Processo de TCE nº 59335.000049/2010-11, ref. Conv. SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	17/02/2020	31/12/2020	N/A	17/02/2020		N/A	25%	Em Andamento		
9	Processo de TCE nº 59335.000005/2012-45, ref. Conv. SIAFI nº 406129 (proc. Nº 59313.000006/2000-12), Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo/Eliane Acioly	13/04/2020	Não informado	N/A	13/04/2020		N/A	25%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

P.O. - 1º ciclo/2021

Fonte: CPTCE (Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO CGGP/2018001 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2018
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade		Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	
Diretor:	Aluizio Pinto de Oliveira		Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes	
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R\$ 25.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 9.414,51
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 9.414,51

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R\$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R\$ 9.414,51	100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R\$ -	30/07/2018	17/05/2019	R\$ -	100%	Concluído	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R\$ 15.000,00	19/07/2018	31/08/2019	R\$ -	100%	Concluído	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas	
4	Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Elaboração de oficinas de Planejamento da Força de Trabalho, consolidação dos resultados dos relatórios	Facilitador	01/03/2019	31/08/2021	R\$ -	05/04/2020			58%	Em Andamento	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	

5	Apresentação do Resultado do Projeto para aprovação	Apresentação do Resultado do Projeto do Planejamento do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada e Superintendente para aprovação	CGGP	01/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019. Considerando ainda o estado de pandemia do COVID-19.	
6	Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/10/2021	31/12/2021					0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
				Valor Previsto:	R\$	25.000,00	Valor realizado:	R\$	9.414,51	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
No ano de 2018 foi alcançado 23% da meta física e o objetivo deste PO é de alcançar 50% em 2019. O objetivo deste PO é alcançar 70% em 2020

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO CGGP/2020001 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2020
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MDR):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MDR):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
Diretor :	Aluizio Pinto de Oliveira	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes		
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais				
Projeto:	Indicadores de Gestão de Pessoas				
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 50.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Santos de Melo, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 50.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 10.800,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 10.800,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 10.800,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre Indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas	Estudos sobre o tema indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas - pesquisas de modelos, pesquisa na literatura	CGGP	01/09/20	30/09/20		01/09/20	30/09/20		100%	Concluído	Estudos para compreensão do tema - prévia a capacitação formal	
2	Capacitação da Equipe e Elaboração de Plano de Ação	Participação em evento de capacitação e Elaboração de Projeto/Plano de Ação para execução do projeto	CGGP	01/09/20	29/10/20	R\$ 50.000,00	01/09/20	29/10/20	R\$ 10.800,00	100%	Concluído	Foi gasto com capacitação no exercício de 2020, o valor de R\$10.800,00, não estando previstos outros gastos com este PO.	
3	Análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP	Estudo e análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP, assim como normativos referenciais para auxiliar na definição de processos críticos de monitoramento - conforme regimento interno.	CGGP (Gestores e Técnicos)	01/02/21	31/03/21	R\$ -	01/02/21	31/03/21	-	100%	Concluído	Dados repactuados e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
4	Seleção dos processos críticos para monitoramento - CGGP	Definir Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP/DIDAS/DICAD para monitoramento	CGGP (Gestores)	01/04/21	30/04/21	R\$ -	12/04/21			10%	Em Andamento	Dados repactuados e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
5	Definir Ordem de estudos das subunidades da CGGP	Definir ordem de trabalho para definição de indicadores (CGGP, DICAD, DIDAS)	CGGP (Gestores)	01/05/21	31/05/21	R\$ -	26/04/21			10%	Em Andamento	Dados repactuados e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	

6	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 1	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
7	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 1	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
8	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 1	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	01/05/21	31/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
9	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 1	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	01/05/21	30/05/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
10	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 1	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	01/06/21	11/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
11	Apresentação dos resultados - Subunidade 1	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	14/06/21	14/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
12	Ajustes e validação - Subunidade 1	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	15/06/21	30/06/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
13	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 2	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/07/21	30/07/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
14	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 2	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	02/08/21	13/08/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
15	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 2	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/08/21	17/08/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
16	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 2	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	18/08/21	10/09/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
17	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 2	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	13/09/21	30/09/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
18	Apresentação dos resultados - Subunidade 2	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/10/21	01/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
19	Ajustes e validação - Subunidade 2	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	04/10/21	15/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
20	Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 3	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	18/10/21	29/10/21	R\$	-				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	

21	Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 3	Elaboração da Ficha Técnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas.	CGGP	01/11/21	12/11/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
22	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 3	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/11/21	17/11/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
23	Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 3	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	22/11/21	03/12/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
24	Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 3	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	06/12/21	17/12/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
25	Apresentação dos resultados - Subunidade 3	Apresentação dos resultados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	20/12/21	20/12/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
26	Ajustes e validação - Subunidade 3	Apresentação final da formação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	20/12/21	30/12/21	R\$ -				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
				Valor Previsto:		R\$ 50.000,00	Valor realizado:		R\$ 10.800,00	12%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Projeto com início em 2020 e previsão de conclusão em 2021.

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II - Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até março/2021)

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ORÇAMENTO 2021 - POSIÇÃO ATÉ 31/03/2021

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2021 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E CANCELAMENTOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
					2.848.671,82		0,00	
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	12.521.996,00	73,2	0,00	12.521.996,00	2.848.671,82	100,0	1.029.739,52	9.673.324,18
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	11.968.051,00	69,9	0,00	11.968.051,00	2.727.710,44	95,7	1.005.790,00	9.240.340,56
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO0001	400.000,00	2,3	0,00	400.000,00	77.838,54	2,7	0,00	322.161,46
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020	153.945,00	0,9	0,00	153.945,00	43.122,84	1,5	23.949,52	110.822,16
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	4.592.735,00	26,8	0,00	4.592.735,00	0,00	0,0	0,00	4.592.735,00
<i>Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001</i>	1.072.735,00	6,3	0,00	1.072.735,00	0,00	0,0	0,00	1.072.735,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	672.735,00		0,00	672.735,00	0,00		0,00	672.735,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00
<i>Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001</i>	1.900.000,00	11,1	0,00	1.900.000,00	0,00	0,0	0,00	1.900.000,00
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Fortalecimento das Políticas Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0005	1,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
Serviços Especializados de Informação - 20WQ/0001 - PO 0006	1,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	499.998,00		0,00	499.998,00	0,00		0,00	499.998,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	900.000,00		0,00	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00
<i>Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001</i>	600.000,00	3,5	0,00	600.000,00	0,00	0,0	0,00	600.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00		0,00	600.000,00
<i>Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001</i>	400.000,00	2,3	0,00	400.000,00	0,00	0,0	0,00	400.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00
<i>Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001</i>	620.000,00	3,6	0,00	620.000,00	0,00	0,0	0,00	620.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00		0,00	600.000,00
Acompanhamento e Fiscalização "+ Gestão Municipal" - 8917/0001 - PO 0002	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
TOTAL	17.114.731,00	100,0	0,00	17.114.731,00	2.848.671,82	100,0	1.029.739,52	14.266.059,18

31/03/2021
PO = Plano Orçamentário

ANEXO III - Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
2	CGDS/2014001 (ex PO 2)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
5	CGDS/2020005 (ex PO 5)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvm)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	CGDS/2020006 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	CGDS/2020007 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
8	CGDS/2020008 (ex PO 8)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
9	CGDS/2020009 (ex PO 9)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
10	CGDS/2020010 (ex PO 10)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
11	CGDS/2020011 (ex PO 11)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da Indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
12	CGDS/2020012 (ex PO 12)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS
19	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
21	CGEP/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	-	CGEP
22	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 75.397,01	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
23	CGEP/202005 (ex PO 22)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	-	CGEP
24	CGEP/202006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
25	CGEP/202007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
29	CGCP/202001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
30	CGCP/202002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
31	CGCP/202003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
32	CGDF/200801 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
33	CGDF/200802 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
34	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
35	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
36	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
37	CGDF/2012001 (ex PO 39)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
38	CGDF/2012002 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
39	CGDF/2012003 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
40	CGDF/2012004 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
41	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
42	CGDF/2015001 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
43	CGDF/2016001 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
44	CGDF/2016002 (ex PO 46)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
49	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 70.157.041,59	68%	CGDF
50	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 19.807.254,22	22%	CGDF
52	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
53	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
46	CGDF/2020002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 228.672.439,20	R\$ 213.624.402,38	93%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
48	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
13	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
51	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 15.891.285,35	28%	CGDF
55	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
56	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
47	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
		Total do Objetivo 1.1						6.370.042.446,89	4.704.979.286,07	74%	
18	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
26	CGEP/2020008 (ex PO 27)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
45	CGDF/2020001 (ex PO 47)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
54	CGDF/2021001 (ex PO 50)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
		Total do Objetivo 1.3						0,00	0,00	-	
16	CGEP/2019003 (ex PO 15)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
27	CGEP/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	CGEP/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
Total do Objetivo 1.4								R\$ 864.600,00	R\$ 864.600,00	0%	
4	CGDS/2018006 (ex PO 4)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
14	CGEP/2019001 (ex PO 13)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 1.5								R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	0%	
TOTAL DA DIRETRIZ 1								6.370.967.916,30	4.705.904.755,48	74%	
20	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.1								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
15	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
Total do Objetivo 2.2								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	
1	CGDS/2012001 (ex PO 1)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
3	CGDS/2015001 (ex PO 3)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Região Nordeste.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	989.482,50	100%	
TOTAL DA DIRETRIZ 2								989.482,50	989.482,50	100%	
57	COCIC/2021001 (ex PO 51)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1.2 Modernizar a Gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
58	CPTCE/2020001 (ex PO 53)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1.2. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
59	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
60	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
Total do Objetivo 3.1								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL DA DIRETRIZ 3								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL GERAL								6.372.032.398,80	4.706.914.452,49	73,9%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 1º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Abril/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
32	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
33	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
34	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
35	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF
36	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
37	CGDF/2012001 (ex PO 39)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
38	CGDF/2012002 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
39	CGDF/2012003 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
40	CGDF/2012004 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
41	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
42	CGDF/2015001 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
43	CGDF/2016001 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
44	CGDF/2016002 (ex PO 46)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
46	CGDF/2020002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 228.672.439,20	R\$ 213.624.402,38	93%	CGDF
47	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
48	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
49	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 70.157.041,59	68%	CGDF
50	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 19.807.254,22	22%	CGDF
51	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 15.891.285,35	28%	CGDF
52	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
53	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
55	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
56	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
P 2217 - Ação 0355								6.357.760.440,72	4.700.429.993,44	74%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
2	CGDS/2014001 (ex PO 2)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
P 2217 - Ação 20N7								343.585,70	343.585,70	100%	
1	CGDS/2012001 (ex PO 1)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
3	CGDS/2015001 (ex PO 3)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
P 2217 - Ação 8689								989.482,50	989.482,50	100%	
4	CGDS/2018006 (ex PO 4)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
10	CGDS/2020010 (ex PO 10)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
P 2217 - Ação 8917								1.030.441,41	1.030.441,41	100%	
19	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
27	CGEP/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
28	CGEP/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
29	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
31	CGCP/2020003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
P 2217 - Ação 20WQ								5.895.038,75	2.583.032,02	44%	
5	CGDS/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Promotoras de Saúde	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGD
6	CGDS/2020006 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de nós	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
P 2217 - Ação 4640								765.000,00	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós-Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
8	CGDS/2020008 (ex PO 8)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
9	CGDS/2020009 (ex PO 9)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
21	CGEP/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	-	CGEP
22	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 75.397,01	-	CGEP
23	CGEP/2020005 (ex PO 22)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	-	CGEP
P 2217 - Ação 8340								2.482.985,25	1.091.236,01	44%	
11	CGDS/2020011 (ex PO 11)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020007 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
12	CGDS/2020012 (ex PO 12)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS
P 2217 - Ação 214S								2.340.924,47	426.466,90	18%	
Total do Programa 2217								6.371.607.898,80	4.706.894.237,98	74%	
57	COCIC/2021001 (ex PO 51)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
58	CPTCE/2020001 (ex PO 53)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
59	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
60	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
P 2111 - Ação 2000								75.000,00	20.214,51	27%	
Total do Programa 2111								75.000,00	20.214,51	27%	
14	CGEP/2019001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Quantitativa dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	CGEP/2019003 (ex PO 15)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
18	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
20	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
24	CGEP/2020006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
25	CGEP/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
26	CGEP/2020008 (ex PO 27)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
45	CGDF/2020001 (ex PO 47)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
30	CGCP/2020002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
54	CGDF/2021001 (ex PO 50)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								349.500,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL								6.372.032.398,80	4.706.914.452,49	73,9%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2021

Posição: Abril/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/ 201200 1 (ex PO 1)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 530.482,50	100%	CGDS
2	CGDS/ 201400 1 (ex PO 2)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Paralisado	R\$ 343.585,70	R\$ 343.585,70	100%	CGDS
3	CGDS/ 201500 1 (ex PO 3)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%	CGDS
4	CGDS/ 201800 6 (ex PO 4)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Projeto +GESTÃO MUNICIPAL: Capacitação de servidores municipais do Estados da Bahia e Sergipe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R\$ 60.869,41	R\$ 60.869,41	100%	CGDS
5	CGDS/ 202000 5 (ex PO 5)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 425.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
6	CGDS/ 202000 6 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	CGDS/ 202000 7 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 649.777,57	R\$ 0,00	-	CGDS
8	CGDS/ 202000 8 (ex PO 8)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	100%	CGDS
9	CGDS/ 202000 9 (ex PO 9)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 476.011,69	R\$ 0,00	0%	CGDS
10	CGDS/ 202001 0 (ex PO 10)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 969.572,00	R\$ 969.572,00	100%	CGDS
11	CGDS/ 202001 1 (ex PO 11)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 1.264.680,00	R\$ 0,00	0%	CGDS
12	CGDS/ 202001 2 (ex PO 12)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R\$ 426.466,90	R\$ 426.466,90	100%	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 465.839,00	R\$ 465.839,00	100%	CGDS
TOTAL CGDS/DPLAN								6.961.284,77	3.805.815,51	55%	
57	COCIC/2021001 (ex PO 51)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1.2 Modernizar a Gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	COCIC
TOTAL COCIC/DPLAN								0,00	0,00	-	
14	CGEP/2019001 (ex PO 13)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
15	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
16	CGEP/2019003 (ex PO 15)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
17	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
18	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
19	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Atrasado	R\$ 1.481.361,00	R\$ 120.403,17	8%	CGEP
20	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
21	CGEP/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 479.849,09	R\$ 0,00	-	CGEP
22	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 298.932,28	R\$ 75.397,01	-	CGEP
23	CGEP/2020005 (ex PO 22)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Cancelado	R\$ 212.353,19	R\$ 0,00	-	CGEP
24	CGEP/2020006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	CGEP/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	-	CGEP
26	CGEP/2020008 (ex PO 27)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGEP
27	CGEP/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	100%	CGEP
28	CGEP/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 480.600,00	R\$ 480.600,00	100%	CGEP
TOTAL CGEP/DPLAN								3.686.595,56	1.060.400,18	29%	
29	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.967.929,00	R\$ 708.040,89	36%	CGCP
30	CGCP/2020002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGCP
31	CGCP/2020003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R\$ 1.581.148,75	R\$ 889.987,96	56%	CGCP
TOTAL CGCP/DPLAN								3.549.077,75	1.598.028,85	45%	
TOTAL DPLAN								14.196.958,08	6.464.244,54	46%	
32	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TISA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
33	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%	CGDF
34	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%	CGDF
35	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
36	CGDF/ 201100 3 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
37	CGDF/ 201200 1 (ex PO 39)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 299.869.740,06	R\$ 299.869.740,06	100%	CGDF
38	CGDF/ 201200 2 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 19.539.983,88	R\$ 19.539.983,88	100%	CGDF
39	CGDF/ 201200 3 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 31.256.000,00	100%	CGDF
40	CGDF/ 201200 4 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%	CGDF
41	CGDF/ 201400 1 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 323.510.889,33	78%	CGDF
42	CGDF/ 201500 1 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%	CGDF
43	CGDF/ 201600 1 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%	CGDF
44	CGDF/ 201600 2 (ex PO 46)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 162.843.330,73	R\$ 152.962.408,33	94%	CGDF
45	CGDF/ 202000 1 (ex PO 47)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2020	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
46	CGDF/ 202000 2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 228.672.439,20	R\$ 213.624.402,38	93%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
47	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 113.680.904,39	R\$ 0,00	0%	CGDF
48	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 102.312.813,95	R\$ 0,00	0%	CGDF
49	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 103.459.637,40	R\$ 70.157.041,59	68%	CGDF
50	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 90.858.400,56	R\$ 19.807.254,22	22%	CGDF
51	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.786.889,22	R\$ 15.891.285,35	28%	CGDF
52	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 85.228.132,65	100%	CGDF
53	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 85.228.754,84	R\$ 83.252.534,84	98%	CGDF
54	CGDF/2021001 (ex PO 50)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a adaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
55	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
56	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 183.361.938,16	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF/DFIN								6.357.760.440,72	4.700.429.993,44	74%	
TOTAL DFIN								6.357.760.440,72	4.700.429.993,44	74%	
58	CPTCE/2020001 (ex PO 53)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1.2. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CPTCE
TOTAL CPTCE/DAD								0,00	0,00	0%	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
59	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 9.414,51	38%	CGGP
60	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 50.000,00	R\$ 10.800,00	22%	CGGP
TOTAL CGGP/DAD								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL DAD								75.000,00	20.214,51	27%	
TOTAL GERAL								6.372.032.398,80	4.706.914.452,49	73,9%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão
Referência dos dados: 1º Ciclo 2021
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: Abril/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2018

**Ata da 304ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada
16 de maio de 2018**



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	CGEP/2018001 (Ex PO 4)
Objetivo estratégico:	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva		Ano:	2018	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Objetivo estratégico (MDR):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos		Gestor da subunidade:	Marcos Falcão Gonçalves	
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.				
Projeto:	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.				
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80

Processo SEI 59335.000222/2018-21

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	Proposta SICONV 052519/2018	Nível Siconv IV
Data Atualização:	31/03/2021	Pré Convênio nº 875549/2018	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
ABR/2019	106.536,26	500,00	107.036,26	A realizar no exercício	R\$ 199.399,80
Diárias	1.062,00		1.062,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
FEV/2020	90.385,54		90.385,54	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Diárias	1.416,00		1.416,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
TOTAL	199.399,80	500,00	199.899,80	Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Conveniente	Elisa Teshima

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV N° 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	Concluído		
1.4	Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	Concluído	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	

2	Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	
2.1	Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	Concluído	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo estará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
4	Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	Concluído		
5	Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	Concluído	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	Concluído	Publicação no DOU 11/01/2019	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								2,0%	Atrasado		
8	Licitação		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			50,0%	Atrasado	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de setembro de 2019 até o mês de abril de 2020 e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, conveniente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022, a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
9	Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	Atrasado	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.	
10	Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R\$ 106.536,26				0,0%	Atrasado	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório	
11	Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado		
13	Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		
14	Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado		

15	Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	Atrasado	
16	Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	Atrasado	
17	1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	Atrasado	
18	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.062,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
19	Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R\$ 90.385,54				0,0%	Atrasado	
20	Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	Atrasado	
21	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R\$ 1.416,00				0,0%	A Iniciar	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R\$ 177,00
22	2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	Atrasado	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
23	Prestação de Contas Final		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	Atrasado	
24	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022				--	0,0%	Atrasado	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 199.399,80	Valor realizado:		R\$ 0,00	22%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Contatos: Profa Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	CGDS/2018001 (ex PO 6.1)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	-		
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	-		
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra		
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).				
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.				
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ -	R\$ -

Previsão de Conclusão:	07/06/2021
Data Atualização:	31/03/2021

**Ata 304ª Diretoria
Colegiada 2018**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Mauro Póvoas Souto- CODEM/CGDS
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a atualização de um documento técnico da Emparn.	
2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	Concluído	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.	
2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	Concluído	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como encaminhamento a formalização da parceria.	

3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
3.1	Parceria com a Emparn		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	-	Cancelado			
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/11/2019	--	10/09/2018	31/11/2019	--	100%	Concluído	Foi retomada a articulação com o IPA com o agendamento de reunião com a presença de gestores, pesquisadores e técnicos. Dela decorreram outros encontros até a apresentação de conteúdo. Assim, com a elaboração do conteúdo técnico pelos autores/pesquisadores do IPA e da UFRPE, com as sugestões da SUDENE, foi então editada a cartilha/livreto intitulado A Palma Forrageira no Nordeste do Brasil.		
3.3	Sudene			01/10/2019	10/11/2019		01/10/2019	10/11/2019		100%	Concluído	Edição de 1.000 cartilhas, distribuição a agricultores e técnicos. Foi realizado o lançamento do Livreto		
4	Relatório Técnico		--	03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	6%	Atrasado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	30%	Atrasado	Relatório Técnico descritivo em elaboração (a concluir). Obs.: O projeto/ação em seu objeto foi integralmente concluído, restando finalizar o relato do processo, que não avançou em razão de outras prioridades.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	86%	Em Andamento	

Parceiros institucionais:
(Emparn) IPA-PE.
Observações:
ATUALIZADO

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação do PPA:	8340 - Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e utilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	30/03/2018
Data Atualização:	31/03/2021

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Victor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		20%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	Reuniões Externas	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
1.2	Reuniões Internas (CGDS)	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	100%	Concluído	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
2	Articulações com Parceiros.	-	CGDS/DPLAN							40%	Concluído	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	Concluído	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por	
2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Foi identificada a publicação "Ecologia del cultivo, manejo y usos de la palma" produzida pela	
2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	Concluído	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	Concluído	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	
3	Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações	-	CGDS/DPLAN							2%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	

3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	Cancelado	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	Em função da prioridade apresentada para elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação.	
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	Paralisado	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.		
4	Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	4%	Paralisado	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.		
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	Paralisado	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralizada.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	66%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Embrapa; FAO.													
Observações:													
Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.													
ATUALIZADO - PROJETO PARALIZADO													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO (8340) - REDE PALMA	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 255.000,00	R\$ 256.000,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 255.000,00
	R\$ 255.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 256.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Previsão de Conclusão:	24/12/2021	CONVÊNIO Nº 878402/2018
Data Atualização:	31/03/2021	Vigência: 27/12/2018 a 25/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Atrasado		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	--	--	--	0%	Atrasado	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	Agendamento e realização de reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório. Processos em elaboração.
8	Liberação 1ª parcela (única)	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	R\$ 255.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação da 1ª parcela dos recursos, depende/está condicionada, a realização do processo licitatório pela conveniente e o aceite pela concedente.	
9	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 49.510,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.250,00	--	--	--	0%	Atrasado		

9.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 31.260,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 48.890,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 24.890,00	--	--	--	0%	Atrasado		
10.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 24.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiárido mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 24.350,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
11.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 18.350,00	--	--	--	0%	Atrasado		
11.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 6.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.1	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 40.600,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 29.900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 29.000,00	--	--	--	0%	Atrasado		
13.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 900,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R\$ 62.750,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14.1	Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R\$ 34.050,00	--	--	--	0%	Atrasado		
14.2	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R\$ 28.700,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

16	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/24/2022	24/04/2022	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 255.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMI/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												
ATUALIZADO.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2019
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340)	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Implantação de dois campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochenilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochenilha do carmim, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido.distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 206.730,00	R\$ 207.730,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	CONVÊNIO Nº 892981/2019
Data Atualização:	31/03/2021	Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/19	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 206.730,00
	R\$ 206.730,00	R\$ 1.000,00	R\$ 207.730,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	--	--	--	0%	Atrasado	A Conveniente atendeu a todas as condições Cláusulas Suspensiva e está iniciando os procedimentos licitatórios.	Agendamento e realização de reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 163.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e o aceite pela concedente. Assim, faz-se necessária a revisão/adequação a nova previsão de realização do processo licitatório.	
9	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 43.730,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 102.180,63	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 56.453,84	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 33.160,29	--	--	--	0%	A Iniciar		

13	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R\$ 15.940,51	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/03/2023	01/05/2023	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 206.730,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												
ATUALIZADO												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2020001
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	(ex PO 6.6) 2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da coconilha-do-carmim.		
Projeto:	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a coconilha-do-carmim no RN.		
Objetivo do projeto:	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da coconilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250532030	3, 4	30	R\$ 199.412,43	R\$ 199.612,04

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	CONVÊNIO N° 903995/2020
Data Atualização:	31/3/2020	Vigência até: 31/12/2023

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Juliana Borges; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN
---	--

Cronograma de Desembolso (R\$1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
fev/21	100.000,00	199,61	100.199,61	A realizar no exercício RAP	R\$ 199.412,43
set/21	99.412,43	0,00	99.412,43	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
total	199.412,43	199,61	199.612,04	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 199.412,43
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	6/4/2020	25/5/2020	-	06/04/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	05/06/2020	05/07/2020	-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	06/07/2020	30/11/2020	-	06/07/2020	03/11/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020	-	10/09/2020	23/12/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020	-	6/7/2020	31/12/2020	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 4/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,00%	A Iniciar		
6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021	-	--	--	--	0%	Atrasado	Processo licitatório ainda não foi apresentado à Sudene para análise.	
7	Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 199,61	--	--	--	0%	Atrasado	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 100.000,00	--	--	--	0%	Atrasado	Liberação da primeira parcela depende da análise e aprovação pela Sudene do processo licitatório, que ainda não foi apresentado.	
	Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 9.441,80	--	--	--	0%	A Iniciar		
9		1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 8.202,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Liberação 2ª parcela	E condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R\$ 99.412,43							

13	mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carimim por ano, com	Irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de 2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carimim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 150.827,07	--	--	--	0%	A Iniciar		
14			SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R\$ 31.141,17							
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,00%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 199.612,04	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC												
Observações:												
Atualizado.												

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

1º ciclo 2021



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Ano:	2020
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos anos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochenilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.		
Objetivo do projeto:	Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jalba, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	144000000 / 0250532030	4	30	R\$ 200.000,00	R\$ 201.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	CONVÊNIO Nº 903996/2020
Data Atualização:	31/3/2021	Vigência até: 31/12/2023

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Juliana Borges; Coordenação: Victor Uchôa, EPAMIG/MG
---	--

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
mar/21	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 201.000,00	A realizar no exercício RAP	R\$ 200.000,00
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,00%	Concluído		
1	Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	Concluído	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	Concluído	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	Concluído	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	Concluído	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COGIC/SUDENE			-	11/12/2020	05/01/2021	-	100%	Concluído	Convênio celebrado em 31/12/2020, e extrato publicado em 5/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,00%	A Iniciar		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	--	--	--	0%	A Iniciar	Processo licitatório em elaboração.	Agendamento e realização de reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/05/2020	R\$ 1.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jalba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas; 1.3)	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 102.957,48	--	--	--	0%	A Iniciar		

11	Meta 2 -Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 39.119,12	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 30.918,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R\$ 28.004,90	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0.00%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 201.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.												
Observações:												

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

ATUALIZADO

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	CGDS/2020003 (ex PO 8)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas			Ano:	2020
Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano			Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais			Objetivo estratégico (MI):	
Objetivo da ação:	Contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos			Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Lyra
Problema (causa):	Estruturação de um programa para atender a fragilidade das capacidades técnico-gerenciais da gestão municipal na área de atuação da Sudene.				
Projeto:	Projeto: Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"				
Objetivo do projeto:	Elaborar proposta de reformulação do +Gestão Municipal a partir da PNDR (Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas), do PRDNE e da realidade, com vistas ao fortalecimento das administrações locais.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/09/2021
Data Atualização:	31/03/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Amauri, Vera Lúcia Assunção, Juliana Boges. Coord. CODEM/CGDS: Victor Uchôa Silva.
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 20%)					00/01/00			20%	Concluído		
1	Planejamento Interno - CODEM	Realização de reuniões internas de planejamento, para detalhamento do projeto. Produto: Elaboração do TAP	Equipe Codem	01/11/2019	24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	Concluído		
2	Identificação de parcerias	Levantamento dos potenciais parceiros com vistas ao apoio na prestação de serviços especializados, de consultoria e assessoramento, para reformulação/elaboração do Programa de Melhoria da Gestão Municipal "+ Gestão Municipal" e promoção do desenvolvimento regional, territorial e local sustentável	Equipe Codem		24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 70%)								32%	Em Andamento		
5	Articulação e definição da parceria	Realização de reuniões técnicas com os potenciais parceiros e definição do parceiro.	Equipe Codem	27/04/2020	14/05/2020		27/04/2020	19/05/2020		100%	Concluído		
6	Tratativas para formatação da parceria	Articulação com parceiro escolhido, e realização dos procedimentos administrativos para a parceria.	Equipe Codem e Coordenadores	15/05/2020	29/05/2020		15/05/2020	29/09/2020		100%	Concluído		

6.1	Formalização de contratação do instrutor	Contratação via GECC do profissional para construção da proposta de programa	CODEM/CGGP/ Parceiro Externo	23/06/2020	15/04/2021		23/06/2020			45%	Em Andamento	Complementação de informações em atendimento a nova IN atendidas. Processo encaminhado para os tramites da CGGP/DAD.	Reunião de entendimento entre CGDS e CGGP, para atendimento e encaminhamentos, considerando a janela de 05/03/2021. Complementação de informações realizadas pela CODEM, enviadas a CGGP. Aguardando retorno.
7	Elaboração do Escopo e Conteúdo do projeto (planejamento metodológico)	Reuniões técnicas para elaboração de escopo e conteúdo. Produto: Elaboração do CANVAS do projeto	Equipe Codem e Parceiro Externo	01/06/2020	15/04/2021		01/06/2020			70%	Em Andamento	Foi realizada reunião para apresentação da proposta do curso para técnicos da DPLAN e CGGI em 23/9/20, como também foi elaborada a primeira versão do Canvas do projeto.	Por conta de demandas diversas, a execução desta Meta será concluída no período 2020-2021. A proposta foi adaptada às necessidades da mais recente IN SGP-ENAP/SEDGG/ME N°21, de 1/02/2021, que estabelece orientações aos órgãos do SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNPD, de que trata o Decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019 e aguarda retorno da CGGP/DAD.
8	Construção da proposta de Reformulação + Gestão Municipal ;	Desenvolvimento das atividades com especialistas e consultores, elaboração da proposta de reformulação do Programa + Gestão Municipal	Equipe Codem e Parceiro Externo	03/05/2020	16/08/2021					0%	A Iniciar		
9	Apresentação da proposta com os atores sobre a reformulação do programa;	Consulta com instituições e gestores da DPLAN	Equipe Codem e Coordenadores	23/08/2021	10/09/2021					0%	A Iniciar		
10	Revisão da Proposta	Ajustes finais para incorporação das sugestões após as apresentações e validação com os atores. Produto: Minuta de Portaria	Equipe Codem	13/09/2021	23/09/2021					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 10%)										0%	A Iniciar		
11	Formatação da proposta de Reformulação do + Gestão Municipal Versão Final.	Envio à apreciação e aprovação da Proposta via Portaria do Programa +Gestão Municipal;	CGDS	25/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	51,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Capacitação para formulação do Programa +GM realizada pela docente Brunna Carvalho (via GECC).

Observações:

Trata-se da revisão e (re)formulação do Programa + Gestão Municipal, iniciado em 2018, considerando-se a PNDR, o PFCG, o PRDNE e o foco na Melhoria da Gestão Pública Municipal e o apoio ao desenvolvimento regional, territorial e local sustentáveis.

Processo: nº 59336.000751/2020-39

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano				
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social		
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)		
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra		
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordeste: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental				
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018				
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caráúbas/RN.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1.00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 547.369,48	567.369,48

Previsão de Conclusão:	31/12/2023
Data Atualização:	31/03/2021

**Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018**

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS, Coordenação: Victor Uchôa
	Conveniente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Carábas/RN

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 547.369,48
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		CONTRATAÇÃO (Peso 20%)								15%	Em Andamento		
1.1	Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Carábas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	Concluído	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Carábas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	Não informado		100,0%	Concluído		
1.3	Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Carábas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019	21/08/2020		100,0%	Concluído	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
1.4	Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019		31/08/2020	19/10/2020		100,0%	Concluído	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	
1.5	Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Carábas/ Codem	01/10/2020	30/11/2020		29/10/2020	03/02/2021		100,0%	Concluído	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Conveniente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R\$ 99.673,80 para R\$ 102.896,80.	
1.6	Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Carábas	01/01/2021	30/09/2021	R\$ 20.000,00	27/01/2021			33,0%	Em Andamento	1ª parcela no valor de R\$ 1.387,00 paga pelo conveniente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.	

1.8	Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/02/2021	28/02/2021	R\$ 102.896,80	01/02/2021			0,0%	Paralisado	Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento técnico para o repasse.	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COICIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016).
2	Execução (Peso 60%)									0%	Paralisado		
2.1	Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2021	28/02/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.2	Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2021	31/03/2021					0,0%	Paralisado	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.3	Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2021	30/11/2021					0,0%	A Iniciar		
2.4	Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar	O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da instalação dos sistemas de reúso.	
2.5	1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	A Iniciar	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COICIC/CGDS/DPLAN/SUDENE, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias sem movimentação (Art. 41º, § 15º da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016).	
2.6	Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2021	30/09/2021	444.472,52				0,0%	A Iniciar		
2.7	Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/09/2021	31/07/2022					0,0%	A Iniciar		
2.8	Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/08/2022	31/08/2022					0,0%	A Iniciar		
2.9	2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A definir	A definir					0,0%	A Iniciar		
2.10	2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/09/2022	31/12/2022					0,0%	A Iniciar		
3	Encerramento (peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.2	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	01/01/2023	28/02/2023					0,0%	A Iniciar		
3.3	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/01/2023	30/06/2023					0,0%	A Iniciar		
3.4	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	01/07/2023	31/12/2023					0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 567.369,32	Valor realizado:		R\$ 0,00	15%	Paralisado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:													
Prefeituras de Caraúbas													
Observações:													
Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio nº 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto nº 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020. 2º Termo de convênio prorroga para 31/12/2022 Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.													

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGDS/2018005 (ex PO 9.2)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2018
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MDR):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Econômica.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO		
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Biótopo, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	R\$ 326.467,00	R\$ 326.467,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	31/03/2021

Ata 304, da
Diretoria Colegiada
2018

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 302.767,00
A realizar no exercício	R\$ 23.700,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 36.750,00
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 36.750,00
Valor liberado no Exercício	R\$ 36.750,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 339.517,00

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas e Juliana Borges (CODEM/CGDS); Coordenação CODEM: Victor Uchôa
	EMBRAPA SEMIÁRIDO:	Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		PLANEJAMENTO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1.1	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018		100,0%	Concluído	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018		100,0%	Concluído		
1.3	Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018		100,0%	Concluído	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
1.4	Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018		100,0%	Concluído		
1.5	Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019		100,0%	Concluído	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato de TED
2		EXECUÇÃO (Peso 60%)								36%	Em Andamento		
2.1	Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018	R\$ 90.000,00	07/12/2018	13/02/2019	R\$ 90.000,00	100,0%	Concluído		
2.2	Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018	R\$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019		100,0%	Concluído	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	
2.3	Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solo, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Preparar material para publicação.	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 20.275,00	13/02/2019		R\$ 1.200,00	70,0%	Em Andamento	Etapa referente à preparação do material para publicação ainda será realizada.	

2.4	Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando a sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.410,00	13/02/2019		R\$ 19.410,00	20,0%	Em Andamento	
2.5	Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 4.973,00	01/09/2020			50,0%	Em Andamento	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, segundo mensagem encaminhada em fevereiro/2021.
2.6	Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/06/2021	R\$ 188.081,86	13/02/2019		R\$ 62.190,00	60,0%	Em Andamento	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reuso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo serão novamente suspensas.
2.7	Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R\$ 19.000,00	01/10/2019	22/11/2019	R\$ 7.200,00	50,0%	Em Andamento	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. As outras atividades da meta, como os cursos, ainda serão realizadas.
2.8	Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológicas do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	30/06/2021	R\$ 33.139,14				0,0%	A Iniciar	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução foi atualizado para nova vigência do projeto.
2.9	Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R\$ 1.196,00				0,0%	A Iniciar	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução foi atualizado para nova vigência do projeto.
2.10	Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	30/06/2021	R\$ 31.592,00				0,0%	A Iniciar	
2.11	1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100,0%	Concluído	
2.12	Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	R\$ 212.767,00	05/06/2019	21/06/2019	R\$ 212.767,00	100,0%	Concluído	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.
2.13	2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020		100,0%	Concluído	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.

2.14	Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	R\$ 23.700,00	14/03/2020	09/09/2020	R\$ 36.750,00	100,0%	Concluído	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R\$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.	
2.15	3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar			
3		PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)									0,0%	A Iniciar		
3.1	Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar			
3.2	Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar			
3.3	Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	A Iniciar			
Valor Previsto:						R\$ 326.467,00	Valor realizado:		R\$ 339.517,00	56%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros Institucionais:														
Embrapa Semiárido														
Observações:														
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido														
O projeto foi apresentado no 1º Webinar de Reúso de Água da Sudene promovido pela Codem/CGDS em 9/6/2020. O projeto foi prorrogado para 30/06/2021, conforme 2º Termo Aditivo assinado em 21/08/2020.														
Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)														

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	CGDS/2020004 (ex PO 9.3)	
Objetivo estratégico:	1.1. Fortalecer as Administrações Públicas			Ano:	2020	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MDR):	I.11 Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social			
Finalidade da ação:	Difusão do conhecimento, por meio da colaboração interinstitucional, propiciando divulgação de ações da Sudene. Visa articular diferentes atores baseando-se na informação, inovação e conhecimento com o foco de fortalecer as administrações públicas municipais					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)			
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra			
Problema (causa):	A fragilidade das capacidades tecnico-gerenciais da gestão municipal na área de atuação da Sudene.					
Projeto:	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)					
Objetivo do projeto:	Contribuir com a construção de uma política pública de reuso de águas em articulação e integração com outras tecnologias e políticas intersetoriais.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-		

**Ata 304, da Diretoria
Colegiada 2018**

Previsão de Conclusão:	30/09/21
Data Atualização:	31/03/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/CGDS/SUDENE:	Juliana Borges, José Farias, Mauro Povoas, Amauri Nascimento, Vera Lúcia Assunção - CODEM/CGDS
	Coordenação	Victor Uchôa

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
				Início	Fim	Valor	Início	Fim					Valor
1	PLANEJAMENTO (Peso 20%)									5%	Concluído		
1.1	Planejamento do Projeto - Meta Institucional 7, ciclo 2020/2021	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, metodologia, definição dos eventos, focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	14/01/2021	14/05/2021					50%	Em Andamento	Será concluído com a aprovação do TAP.	
1.2	Definição de modus operandi e Plataforma para realização dos eventos On line	Definição junto com Ascom e CGTI de ferramenta para realização dos eventos on line que permita participação do público e gravação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	22/02/2021	26/02/2021					50%	Em Andamento	Marcar reuniões técnicas com a participação da Ascom e CGTI.	
1.3	Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta.	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	22/04/2021	14/05/2021					25%	Em Andamento		
1.4	Plano de Divulgação do Projeto: incluindo os quatro eventos.	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	22/04/2021	14/05/2021					0%	A Iniciar		
2	Realização dos eventos (PESO 60%)									3%	Em Andamento		
2.1	Evento On Line 1	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	15/04/2021	08/06/2021					60%	Em Andamento	GM e Saúde Digital	
2.2	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	15/04/2021	17/05/2021					30%	Em Andamento		
2.3	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	15/04/2021	24/05/2021					0%	A Iniciar	Nutes e convidados	
2.4	Divulgação dos eventos via redes sociais.	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	15/04/2021	03/06/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.	
2.5	Preparação de materiais para apresentação.	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	15/04/2021	03/06/2021					0%	A Iniciar		
2.6	Realização do 1º evento on line.	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	18/05/2021	08/06/2021					0%	A Iniciar	1º evento realizado em ____.	
2.7	Evento On Line 2	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	09/06/2021	22/07/2021					0%	A Iniciar		
2.8	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	09/06/2021	23/06/2021					0%	A Iniciar		
2.9	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	09/06/2021	25/06/2021					0%	A Iniciar		
2.10	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/07/2021	09/07/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.	

2.11	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/07/2021	09/07/2021					0%	A Iniciar		
2.12	Realização do 2º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	12/07/2021	15/07/2021					0%	A Iniciar	2º evento realizado em ____.	
2.13	Evento On Line 3	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	16/07/2021	24/08/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: +GM e Reúso e/ou Economia Circular .	
2.14	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021					0%	A Iniciar		
2.15	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021					0%	A Iniciar		
2.16	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	13/08/2021	17/08/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.	
2.17	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	13/08/2021	17/08/2021					0%	A Iniciar		
2.18	Realização do 3º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	23/08/2021	24/08/2021					0%	A Iniciar	3º evento realizado em ____.	
2.19	Evento On Line 4	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	26/08/2021	16/09/2021					0%	A Iniciar	Sugestão: GM e Palma e/ou TIC	
2.20	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar		
2.21	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021					0%	A Iniciar		
2.22	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/09/2021	09/09/2021					0%	A Iniciar	Webinar poderá ficar disponível no YouTube da Sudene.	
2.23	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/09/2021	09/09/2021					0%	A Iniciar		
2.24	Realização do 4º evento <i>on line</i>	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	01/09/2021	16/09/2021					0%	A Iniciar	4º evento realizado em ____.	
3	Relatório Técnico e Publicação (Peso 20%)									0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 3 eventos.	A meta institucional do ciclo 2019/2020 será concluída com um relatório que contemple os três eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	20/09/2021	30/09/2021					0%	A Iniciar	O relatório descritivo contextualiza o projeto, descreve as etapas, contém os links de acesso aos webinars, bem como todas as informações dos eventos.	
Valor Previsto: R\$ 0,00										Valor realizado: R\$ 0,00	8%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:	
NUTES/UFPE...	
Observações:	
https://docs.google.com/document/d/163CW-CuSDNXN6v5XF28GZ-Ir6VleNajYMk_PAGL3QRU/edit - link da tempestade de ideias realizada na reunião dia 14/01/2021.	
O processo n.º 59336.000748/2020-15 reflete toda a execução da meta do ano de 2020, incluindo o relatório descritivo que contextualiza o projeto, descreve as etapas, como também os links de acesso aos webinars.	

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

PROJETOS PRIORITÁRIOS 2017

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	CGCP/2017001 (ex PO 2)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Eixo temático (MDR):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MDR):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	Gestor da subunidade:	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R\$ 709.382,21	R\$ 709.382,21

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL		
R\$ 709.382,21	R\$ 0,00		R\$ 709.382,21	Pago até o ano anterior	R\$ 354.691,11
				A realizar no exercício	R\$ 354.691,11
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 354.691,11

Previsão de Conclusão:	31/08/2019
Data Atualização:	31/03/2021

**Res. DC nº 281/2017
E Ata 304ª Reunião da
Diretoria Colegiada**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacupe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacupe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído		
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		

5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	Recursos liberados para o PNUD no dia 30/01/2018
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018		100%	Concluído	Processo iniciado através de envio de TdR ao PNUD para abertura de processo concorrencial	
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Finalização do processo até 15 de junho e envio para Procuradoria da Sudene para análise	
9	Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018		100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao Produto 1: Plano de Trabalho	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R\$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	R\$ 70.938,22	100%	Concluído	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Produto aprovado, em vias de pagamento.	Solicitou-se ajuste no produto I havendo demora na resposta da contratada. Realizou-se aditamento de contrato.
11	Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)	Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R\$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Diagnóstico com várias inconsistências contou com 2 pareceres técnicos solicitando ajustes antes da sua aprovação. Aditamento do contrato realizado.	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
12	Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana	Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais. Em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R\$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	R\$ 141.876,44	100%	Concluído	Oficinas realizadas e aprovadas após segundo parecer técnico	Pareceres técnicos solicitando ajustes. Realizou-se reunião por videoconferência com contratada, PNUD e prefeitura de Feira de Santana.
13	Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R\$ 212.814,66	01/05/2019			0%	Paralisado	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local. Segundo aditamento do contrato realizado para a data de 31 de agosto de 2019. Baixa participação da prefeitura de Feira de Santana na avaliação do produto entregue e dos trabalhos realizados pela contratada em oficinas realizadas no município. A Sudene solicitou ajustes no produto IV, apresentado pela consultoria Ernst Young, no entanto, a consultoria não os atendeu. Isto posto, a equipe técnica da Sudene não aprovou o produto IV. Devido ao não atendimento do plano de trabalho pela contratada, a Sudene não aprovou o produto IV e não autorizou a prorrogação do contrato, cuja vigência se encerrou em 30 de outubro de 2019. O PNUD já foi comunicado e está providenciando a rescisão do contrato. Rescisão ainda não foi realizada. Nova contratação só poderá ser realizada após rescisão do atual contrato.	Apresentação com escopo do Termo de Referência realizada ao Diretor da DPLAN e Superintendente em //.. Até o presente momento não houve disponibilidade na agenda do prefeito para reunião de apresentação do projeto. Foi agendada uma reunião técnica com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Planejamento do município para a primeira quinzena de Abril/2021.

14	Realização da quarta etapa do PDES de Feira de Santana	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira versão	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	28/06/2019	05/07/2019	R\$ 70.938,22	25/06/2019		0%	Paralisado	A conclusão da elaboração do Plano de Desenvolvimento de Feira de Santana se dará por meio da contratação de nova consultoria.	Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.
15	Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R\$ 70.938,22			0%	A Iniciar		
16	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	03/08/2019	15/08/2019				0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
17	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019				0%	A Iniciar	ATA da Diretoria Colegiada aprovando o Plano.	
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 354.691,11	71%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações: Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao PNUD e Prefeitura de Feira de Santana em data a ser agendada.

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articuação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.

(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.

(5) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021**

Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO CGDF/2017001 (ex PO3.1)
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A			Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A			Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A				
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento			Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Breno Arruda
Problema (causa):	N/A				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil				
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	31/03/2021

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior
---	----------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17	01/10/17	-	100%	Concluído		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/19	R\$ -	01/11/17		-	85%	Cancelado		
6	Promoção de exportações	Mapeamento/identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17	01/12/18	-	100%	Concluído		
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/19	R\$ -	01/10/17		-	85%	Cancelado	O projeto foi cancelado visto que as prioridades setoriais foram definidas no âmbito do PRDNE.	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	96%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

APEX-BR

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				% Orç./ Fin.	Status								
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado		Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
														1ª	2ª	3ª	4ª				
2016	COCIC/2016001	1	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.321,90	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Concluído	Atrasado	22/03/19	Atrasado
2016	COCIC/2016002	2	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 262.868,86	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar		
2016	COCIC/2016003	3	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 514.509,40	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2016	COCIC/2016004	4	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.020.000,00	R\$ 523.012,50	52%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2016	COCIC/2016005	5	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.172.497,00	R\$ 1.234.957,85	R\$ 926.955,29	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2016	COCIC/2016006	6	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 611.924,74	R\$ 559.952,79	93%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	27/10/22	Em Andamento
2016	COCIC/2016007	7	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Concluído	Concluído	19/02/20	Concluído
2016	COCIC/2016008	8	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 503.901,97	R\$ 250.000,00	50%	Concluído	Concluído	Atrasado	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento
2016	COCIC/2016009	9	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 526.970,57	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Concluído	Atrasado	06/09/19	Atrasado
2017	COCIC/2017001	10	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2017	COCIC/2017002	11	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.500,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	25/05/22	Em Andamento
2017	COCIC/2017003	12	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	Atrasado	28/02/21	Atrasado
2017	COCIC/2017004	13	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 385.000,00	R\$ 436.300,00	R\$ 186.190,69	48%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2017	COCIC/2017005	14	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 500.000,00	R\$ 500.800,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Atrasado	Atrasado	23/12/20	Atrasado
2017	COCIC/2017006	15	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Concluído	Em Andamento	19/04/21	Em Andamento
2017	COCIC/2017007	16	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 400.000,00	R\$ 400.500,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Atrasado	Atrasado	10/02/21	Atrasado
2017	COCIC/2017008	17	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.079.514,86	R\$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	21/01/22	Em Andamento
2017	COCIC/2017009	18	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-	BA	1	1.1	2029	2145	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.991.738,23	R\$ 1.989.238,23	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	30/08/22	Em Andamento

Emendas 1º ciclo 2021																						
Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status								
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	
														1ª	2ª	3ª	4ª					
			BA.																			
2017	COCIC/2017010	19	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.548.118,86	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	01/03/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017011	20	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Atrasado	A Iniciar	09/11/21	Em Andamento	
2017	COCIC/2017012	21	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 520.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/11/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017013	22	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.855,00	R\$ 705.855,00	R\$ 490.598,50	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017014	23	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.500,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017015	24	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 357.500,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	24/06/21	Em Andamento	
2017	COCIC/2017016	25	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.125.888,70	R\$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	28/02/22	Concluído	
2017	COCIC/2017017	26	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 880.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 880.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Em Andamento	28/02/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017018	27	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.181,45	R\$ 44.381,79	18%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/05/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017019	28	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 274.341,55	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/11/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017020	29	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 264.608,17	R\$ 266.608,17	R\$ -	0%	Concluído	Atrasado	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/04/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017021	30	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 390.020,00	R\$ 433.930,65	R\$ 314.012,00	81%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017022	31	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 350.000,00	R\$ 357.000,00	R\$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	17/08/21	Em Andamento	
2017	COCIC/2017023	32	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 260.592,00	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	29/08/21	Em Andamento	
2017	COCIC/2017024	33	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.493,20	R\$ 260.930,41	R\$ 210.000,00	84%	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/06/22	Em Andamento	
2017	COCIC/2017025	34	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.963,58	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018001	35	Pavimentação - Município de Urucuça	BA	1	1.1	2029	7k66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.002.500,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento	

Emendas 1º ciclo 2021																						
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status								
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE		Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª		2ª	3ª	4ª					
2018	COCIC/2018002	36	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/07/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018003	37	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 586.135,00	R\$ 633.025,80	R\$ 386.135,00	66%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018004	38	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/05/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018005	39	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 251.628,29	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018006	40	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.025.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/08/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018007	41	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.673.298,27	R\$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018008	42	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/10/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018009	43	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.755.787,09	R\$ 1.773.344,96	R\$ 841.262,37	48%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/09/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018010	44	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 167.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	Não-se- Aplica	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/09/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018011	45	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 400.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018012	46	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 451.239,86	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018013	47	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018014	48	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.500,00	R\$ 490.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018015	49	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.001.100,00	R\$ 250.000,00	25%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018016	50	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 258.607,22	R\$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
2018	COCIC/2018017	51	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não-se- Aplica	Não-se- Aplica	Não-se- Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/22	Em Andamento	
2018	COCIC/2018018	52	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.743,89	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se- Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento	
			Pavimentação em paralelepípedo e em																			

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
														1ª	2ª	3ª	4ª				
2018	COCIC/2018019	53	concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018020	54	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018021	55	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 259.298,48	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018022	56	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 250.000,00	R\$ 258.523,52	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/05/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018023	57	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 802.936,73	R\$ 811.047,20	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018024	58	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2029	214S	R\$ 300.000,00	R\$ 303.000,00	R\$ 210.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018025	59	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R\$ 150.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	22/10/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018026	60	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.000,00	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018027	61	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 512.500,00	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018028	62	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.031,31	R\$ 115.000,00	46%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018029	63	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018030	64	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Paralisado
2018	COCIC/2018031	65	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 253.240,98	R\$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018032	66	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.425.196,50	R\$ 2.672.979,19	89%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	23/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018033	67	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 380.000,00	R\$ 381.000,00	R\$ 190.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/22	Em Andamento

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Inicição	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
												1º		2º	3º	4º					
2018	COCIC/2018034	68	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.000,00	R\$ 420.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018035	69	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 267.527,38	R\$ 159.708,52	61%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	Em Andamento	A Iniciar	17/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018036	70	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 700.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	23/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018037	71	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.004.800,00	R\$ 1.000.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018038	72	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	Não-se-Apply	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	21/11/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018039	73	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2029	2145	R\$ 250.000,00	R\$ 256.187,08	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	28/02/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018040	74	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018041	75	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 505.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018042	76	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.440.476,88	R\$ 1.187.711,25	83%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018043	77	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	29/03/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018044	78	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.060.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	26/10/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018045	79	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.980,22	R\$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	10/09/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018046	80	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.636,67	R\$ -	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	22/10/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018047	81	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 300.400,00	R\$ 180.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não-se-Apply	A Iniciar	A Iniciar	20/11/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018048	82	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	30/12/22	Em Andamento
	COCIC/201		Pavimentação e Drenagem Superficial de																		

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
														1ª	2ª	3ª	4ª				
2018	COCIC/2018049	83	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018050	84	Aquisição de caminhão trucao com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraubas/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 332.853,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018051	85	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos-Teixeira de Freitas	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	17/08/21	Em Andamento
2018	COCIC/2018052	86	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2029	8902	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/21	Em Andamento
2018	COCIC/2018053	87	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 600.000,00	60%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018054	88	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.065.661,71	R\$ 2.810.590,05	94%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018055	89	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 501.000,00	R\$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018056	90	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 350.500,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/12/22	Em Andamento
2018	COCIC/2018057	91	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2018	COCIC/2018058	92	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/02/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019001	93	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 255.996,10	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019002	94	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 312.836,25	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019003	95	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.836,76	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/06/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019004	96	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 257.704,50	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/12/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019005	97	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019006	98	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de DARIUS HAS	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 850.000,00	R\$ 855.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/23	Em Andamento

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários					Status							
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
														1º	2º	3º	4º				
2019	COCIC/2019007	99	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 320.000,00	R\$ 393.325,11	R\$ 64.000,00	20%	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/11/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019008	100	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 351.158,15	R\$ -	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	30/12/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019009	101	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 900.000,00	R\$ 1.064.313,40	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	08/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019010	102	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019011	103	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.707.445,09	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/25	Em Andamento
2019	COCIC/2019012	104	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 607.328,74	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019013	105	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 301.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019014	106	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 254.863,57	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/12/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019015	107	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 260.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 52.000,00	20%	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/07/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019016	108	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 100.000,00	R\$ 101.000,00	R\$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019017	109	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 703.867,45	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019018	110	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 311.465,97	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019019	111	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 306.000,00	R\$ 300.000,00	100%	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/22	Em Andamento
2019	COCIC/2019020	112	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.410.387,00	R\$ 3.237.722,30	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento

Emendas 1º ciclo 2021																					
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status								
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
													1ª	2ª	3ª	4ª					
2019	COCIC/2019021	113	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.237.065,05	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019022	114	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 250.999,99	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/02/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019023	115	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.723.118,36	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019024	116	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.756,73	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019025	117	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.040.000,00	R\$ 681.404,45	68%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019026	118	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.015.646,71	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/03/21	Em Andamento
2019	COCIC/2019027	119	Construção do Mercado Público Municipal - Ipaguaçu/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.999,21	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019028	120	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.027.825,85	R\$ 820.183,29	82%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019029	121	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.519,98	R\$ 1.000.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/01/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019030	122	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$ 400.001,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019031	123	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/01/23	Em Andamento
2019	COCIC/2019032	124	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 600.000,00	R\$ 602.867,51	R\$ 240.000,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019033	125	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 700.000,00	R\$ 770.735,13	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019034	126	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019035	127	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento
2019	COCIC/2019036	128	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2029	7K66	R\$ 350.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/24	Em Andamento

Emendas 1º ciclo 2021																							
Dados do Projeto				SUDENE			PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status										
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação				Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status		
														1º	2º	3º	4º						
2019	COCIC/2019037	129	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R\$ 800.000,00	R\$ 801.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/24	Em Andamento	
2020	COCIC/2020001	130	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 500.000,00	R\$ 500.500,50	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020002	131	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 259.039,60	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/09/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020003	132	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 152.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020004	133	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 450.227,00	R\$ 460.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020005	134	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020006	135	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020007	136	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 251.669,05	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/24	Em Andamento
2020	COCIC/2020008	137	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 266.402,82	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/06/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020009	138	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 150.000,00	R\$ 154.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020010	139	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 250.000,00	R\$ 252.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/04/23	Em Andamento
2020	COCIC/2020011	140	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R\$ 300.000,00	R\$ 350.167,88	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/25	Em Andamento
2020	COCIC/2020012	141	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	1	1.1	2217	7K66	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.005.000,00	R\$	-	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/25	Em Andamento
TOTAL								R\$	87.280.073,99	R\$	91.414.909,61	R\$	41.580.316,91										

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
	Não se Aplica

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2018 001 (ex PO 6.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
2	CGDS/2018 002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academi a.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
3	CGDS/2018 003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
4	CGDS/2019 001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
5	CGDS/2020 001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
6	CGDS/2020 002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
7	CGDS/2018 004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS
8	CGDS/2018 005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS
9	CGDS/2020 004 (ex PO 9.3)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
10	CGCP/2017 001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
11	COCIC/201 6001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
12	COCIC/201 6002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
13	COCIC/201 6003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	COCIC
15	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COCIC
16	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COCIC
17	COCIC/2016007 (ex PO 10)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
18	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
19	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
20	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
21	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
22	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
23	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	COCIC
24	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
26	COCIC/2017007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
27	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
28	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
29	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
30	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
31	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
32	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC
33	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
34	COCIC/2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
35	COCIC/2017016 (ex PO 33)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
36	COCIC/2017017 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	COCIC
37	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC
38	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
39	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	COCIC
40	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	COCIC
41	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
42	COCIC/2017023 (ex PO 42)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apurema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
43	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
44	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
45	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Urucuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
46	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PE DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
47	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	COCIC
48	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
49	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
50	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
51	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
52	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
53	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC
54	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
55	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
56	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
57	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
58	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
59	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	COCIC
60	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
61	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
62	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
63	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
64	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
65	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
66	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
67	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COCIC
68	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COCIC
69	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator produtivo, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
70	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
71	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
72	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
73	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
74	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
75	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
76	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila. Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	COCIC
77	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	COCIC
78	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
79	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
80	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
81	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
82	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
83	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
84	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
85	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
86	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC
87	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
88	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
89	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
90	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
91	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
92	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
93	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
94	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRACÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
95	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
96	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
97	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
98	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC
99	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
100	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
101	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
102	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
104	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
108	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
109	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	COCIC
110	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
112	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
114	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
115	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
116	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
117	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	COCIC
118	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
119	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
120	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
121	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
122	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
123	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
124	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
125	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
126	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
127	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
128	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
129	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
130	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	COCIC
131	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
132	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	COCIC
133	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAEM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
134	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
135	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
136	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
138	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
139	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
140	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuba/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
141	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
142	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
143	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
144	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
145	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
146	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
147	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
148	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00		COCIC
149	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
150	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00		COCIC
151	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00		COCIC
Total do Objetivo 1.1									89.562.301,23	42.274.524,82	47%	
152	CCEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CCEP
Total do Objetivo 1.2									199.399,80	0,00	0%	
153	CGDF/2017001 (ex PO 3.1)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total do Objetivo 1.3									0,00	0,00	0%	
154	CGDS/2020003 (ex PO 8)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total do Objetivo 1.5									R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL DA DIRETRIZ 1									89.761.701,03	42.274.524,82	47%	
TOTAL GERAL									89.761.701,03	42.274.524,82	47,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020

ANEXO VIII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	2	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP
Total da Ação 20WQ									709.382,21	354.691,10	0%	
2	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
5	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	COCIC
6	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COCIC
7	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COCIC
8	COCIC/2016007 (ex PO 10)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
9	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
10	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
11	COCIC/2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
12	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
13	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
15	COCIC/2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
16	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC
17	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
18	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	COCIC
19	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
20	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
21	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
22	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
23	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
24	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
26	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC
27	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
29	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
30	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
31	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
32	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	COCIC
33	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
34	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
35	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
36	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
37	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
38	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
39	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
40	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
41	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
42	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
43	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
44	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	COCIC
45	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	COCIC
46	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC
47	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lago do Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
48	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
49	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
50	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajupe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
51	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
52	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
53	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC
54	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
55	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
56	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
57	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
58	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
59	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
60	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Caraubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
61	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
62	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Texeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
63	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02 zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
64	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC
65	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
66	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
67	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
68	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
69	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
70	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
71	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
72	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
73	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
74	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
75	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	COCIC
76	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripap de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
77	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
78	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
79	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Torilama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
80	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
81	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
82	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
83	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	COCIC
84	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
85	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
86	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
87	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
88	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
89	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
90	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
91	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
92	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
93	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	COCIC
94	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
95	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
96	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
98	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	COCIC
99	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
100	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
101	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
102	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
104	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
108	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
109	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	COCIC/20 20006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
112	COCIC/20 20007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
113	COCIC/20 20008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
114	COCIC/20 20009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00		COCIC
115	COCIC/20 20010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraila e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00		COCIC
116	COCIC/20 20011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00		COCIC
117	COCIC/20 20012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00		COCIC
Total da Ação 7k66									71.063.410,70	29.089.740,80	41%	
118	CGEP/20 18001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
119	COCIC/20 17001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
120	COCIC/20 17002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
121	COCIC/20 17003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
122	COCIC/20 17004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	COCIC
123	COCIC/20 17005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
124	COCIC/20 17007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
125	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
126	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC
127	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
128	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
129	COCIC/2017016 (ex PO 33)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sítio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
130	COCIC/2017017 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	COCIC
131	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	COCIC
132	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
133	COCIC/2017023 (ex PO 42)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apuarema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
134	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	COCIC
135	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
136	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
138	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
139	COIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COIC
140	COIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COIC
141	COIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COIC
142	COIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COIC
			Total da Ação 214S						15.432.729,76	12.490.575,92	81%	
143	CGDS/2018001 (ex PO 6.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
144	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
145	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
146	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
147	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmin no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
148	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmin para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
149	CGDS/2020004 (ex PO 9.3)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
			Total da Ação 8340						862.342,04	0,00	0%	
150	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
151	CGDS/2018005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTELECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS
152	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
Total da Ação 8902									1.693.836,32	339.517,00	20%	
153	CGDS/2020003 (ex PO 8)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
Total da Ação 8917									0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA 2217									89.761.701,03	42.274.524,82	47%	
154	CGDF/2017001 (ex PO 3.1)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
Total das Ações Internas/ Não se aplicam									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									89.761.701,03	42.274.524,82	47,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020

ANEXO IX – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da SUDENE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
2	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 523.012,50	52%	COCIC
5	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.172.497,00	R\$ 926.955,29	79%	COCIC
6	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 559.952,79	93%	COCIC
7	COCIC/2016007 (ex PO 10)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
8	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	50%	COCIC
9	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
10	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
11	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
12	COCIC/2017003	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encaaschamento de Aquisição de equipamentos para o	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
13	COCIC/2017004	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 385.000,00	R\$ 186.190,69	48%	COCIC
14	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
15	COCIC/2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
16	COCIC/2017007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
17	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	100%	COCIC
18	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.989.238,23	R\$ 1.989.238,23	100%	COCIC
19	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
20	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
21	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto, nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
22	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.855,00	R\$ 490.598,50	70%	COCIC
23	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
24	COCIC/2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/2017016 (ex PO 33)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias com paralelepípedo sobre coxim de areia em assentamento do INCRA do município de Sitio do Mato/BA, visando fortalecer as atividades produtivas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%	COCIC
26	COCIC/2017017 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 880.000,00	R\$ 880.000,00	100%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
27	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 44.381,79	18%	COCIC
28	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
29	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 264.608,17	R\$ 0,00	0%	COCIC
30	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 390.020,00	R\$ 314.012,00	81%	COCIC
31	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	100%	COCIC
32	COCIC/2017023 (ex PO 42)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais - Município de Apuarema	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
33	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.493,20	R\$ 210.000,00	84%	COCIC
34	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
35	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
36	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
37	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 586.135,00	R\$ 386.135,00	66%	COCIC
38	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 175.000,00	70%	COCIC
39	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
40	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
41	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	100%	COCIC
42	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
43	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.755.787,09	R\$ 841.262,37	48%	COCIC
44	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
45	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%	COCIC
46	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
47	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
48	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 490.000,00	70%	COCIC
49	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 250.000,00	25%	COCIC
50	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	80%	COCIC
51	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
52	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
53	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
54	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
55	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
56	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
57	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 802.936,73	R\$ 0,00	0%	COCIC
58	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 210.000,00	70%	COCIC
59	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
60	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC
61	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
62	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 115.000,00	46%	COCIC
63	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%	COCIC
64	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
65	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 50.000,00	20%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
66	COCIC/201803 2 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.672.979,00	89%	COCIC
67	COCIC/201803 3 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 380.000,00	R\$ 190.000,00	50%	COCIC
68	COCIC/201803 4 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 420.000,00	70%	COCIC
69	COCIC/201803 5 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagoado Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 159.708,52	61%	COCIC
70	COCIC/201803 6 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%	COCIC
71	COCIC/201803 7 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
72	COCIC/201803 8 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itaiúna	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
73	COCIC/201803 9 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%	COCIC
74	COCIC/201804 0 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
75	COCIC/201804 1 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC
76	COCIC/201804 2 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.438.556,24	R\$ 1.187.711,25	83%	COCIC
77	COCIC/201804 3 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 100.000,00	20%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
78	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
79	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 350.000,00	70%	COCIC
80	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
81	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 180.000,00	60%	COCIC
82	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	50%	COCIC
83	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	20%	COCIC
84	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
85	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Texeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	100%	COCIC
86	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
87	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02, zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 600.000,00	60%	COCIC
88	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.810.590,05	94%	COCIC
89	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	80%	COCIC
90	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Bala da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
91	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
92	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
93	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sitio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
94	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sitio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
95	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
96	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
97	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
98	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 850.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
99	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 320.000,00	R\$ 64.000,00	20%	COCIC
100	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripard de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
101	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
102	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
104	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 260.000,00	R\$ 52.000,00	20%	COCIC
108	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	100%	COCIC
109	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
111	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	100%	COCIC
112	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.410.387,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
114	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
115	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
116	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
117	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 681.404,45	68%	COCIC
118	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na área urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
119	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
120	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 820.183,29	82%	COCIC
121	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	50%	COCIC
122	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.001,00	40%	COCIC
123	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
124	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 600.000,00	R\$ 240.000,00	40%	COCIC
125	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
126	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
127	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
128	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CUBUQ), na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 350.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
129	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
130	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
131	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
132	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
133	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 450.227,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
134	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
135	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guabim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
136	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
138	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
139	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
140	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
141	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	0%	COCIC
TOTAL COCIC									87.096.740,66	41.580.316,72	48%	
142	CGDS/2018001 (ex PO 6.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
143	CGDS/2 018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
144	CGDS/2 018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 255.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
145	CGDS/2 019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do camim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 206.730,00	R\$ 0,00	-	CGDS
146	CGDS/2 020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-camim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 199.612,04	R\$ 0,00	-	CGDS
147	CGDS/2 020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do camim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 201.000,00	R\$ 0,00	-	CGDS
148	CGDS/2 020003 (ex PO 8)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
149	CGDS/2 018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 567.369,32	R\$ 0,00	-	CGDS
150	CGDS/2 018005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 326.467,00	R\$ 339.517,00	104%	CGDS
151	CGDS/2 020004 (ex PO 9.3)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDS
TOTAL CGDS									1.756.178,36	339.517,00	19%	
152	CGEP/2 018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R\$ 199.399,80	R\$ 0,00	0%	CGEP
TOTAL CGEP									199.399,80	0,00	0%	
153	CGCP/2 017001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R\$ 709.382,21	R\$ 354.691,10	50%	CGCP

RELAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
TOTAL CGCP									709.382,21	354.691,10		
TOTAL DPLAN									89.761.701,03	42.274.524,82	47%	
154	CGDF/2017001 (ex PO 3.1)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF									0,00	0,00		
TOTAL DFIN									0,00	0,00	0%	
TOTAL GERAL									89.761.701,03	42.274.524,82	47,1%	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2020

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Dezembro/2020
