



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2015

**Recife
07 de abril de 2015**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	6
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	11
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	25
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	32
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	57
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	61
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014	64
8 – Observações e Deliberações em plenária de 07/04/2015	65
9 – Conclusão	66
Anexo I – Quadros do monitoramento	68
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014	186
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	188
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	193

Introdução

Neste relatório encontram-se os resultados do monitoramento conduzido pela SUDENE no período janeiro – dezembro, para fins de cálculo dos indicadores, e a posição acumulada até março de 2015 para os projetos acompanhados por meio dos conhecidos “Planos Operativos”, situação que constituiu o 1º Ciclo de 2015. Foram considerados neste ciclo 66 projetos.

Os trabalhos foram abertos pelo Superintendente José Márcio, tendo ao seu lado o Diretor de Administração, Marcos Robalinho, o Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco, além da presença dos Coordenadores-Gerais, Coordenadores e responsáveis pelos projetos.

As reuniões de monitoramento são coordenadas pela Coordenação Geral de Gestão Institucional (CGGI). O evento aconteceu no dia 07 de abril de 2015, na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar, às 9h, oportunidade na qual foi apresentado um balanço dos resultados de 2014 e as apurações até março de 2015.

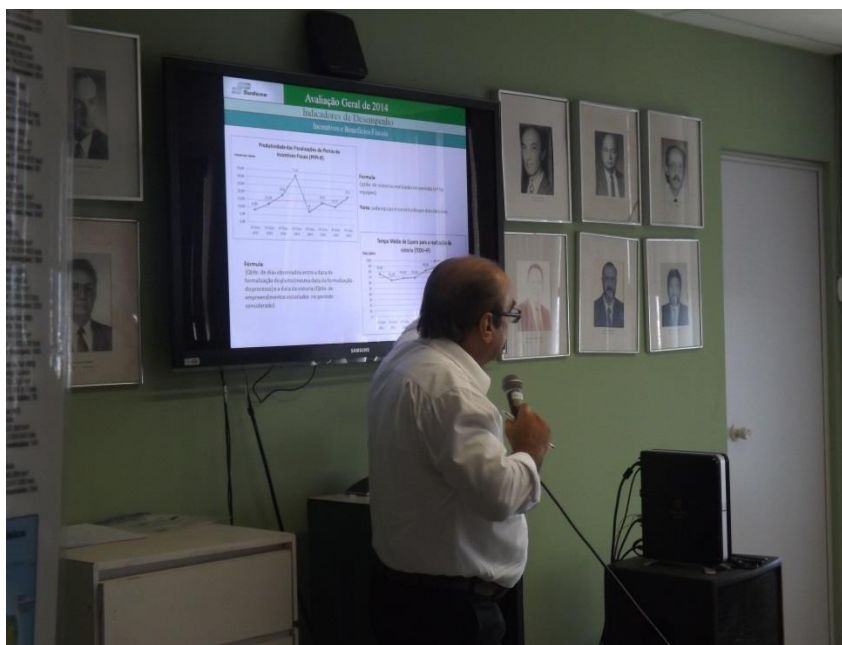


Foto 1 – Momento da apresentação dos resultados alcançados em 2014 para todos os gestores e responsáveis por projetos durante reunião do 1º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE.

A reunião foi aberta com as boas vindas do Superintendente, que ressaltou a importância do momento vivido, sendo passada a palavra para o Coordenador Geral da CGGI que a iniciou com a apresentação dos resultados alcançados em 2014, destacando a influência do acréscimo dos novos servidores nos resultados revelados pelos indicadores de produtividade e de capacidade, passando a palavra, na sequência, para os responsáveis pelos Planos Operativos, que centraram suas atenções em projetos que estavam na situação de atraso ou com etapas nessa condição.

A referência na apresentação dos resultados alcançados em 2014 foi o plano estratégico e suas diretrizes.

Nesse ciclo a etapa referente à emissão do Parecer Financeiro foi retirada de todos os POs de convênios, item que passará a constituir um PO específico da unidade de gestão de convênios, e que no próximo ciclo constará como específico, sendo ele referenciado pelo código do SIAFI e pelo número do processo, tendo em vista tratar-se de responsabilidade da unidade de gestão de convênios (CGC).

Por sua vez, em consequência da legislação que não estabelece prazo para os bancos operadores emitirem o Certificado de Empreendimento Implantado de projetos financiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), a Diretoria Colegiada da SUDENE aprovou a Resolução nº 214, de 05 de fevereiro de 2015, disciplinando a concessão do CEI. Em razão disso, os Planos Operativos passaram a apresentar uma diferenciação dos demais. A partir de agora ficam separadas as etapas nas quais SUDENE e Banco atuam conjuntamente, normalmente as atinentes ao processo de liberação, daquela referente à emissão do CEI, de competência exclusiva do agente operador. E o status considerado para fins de monitoramento passa a ser o das etapas com atuação conjunta, muito embora tenha sido mantido no PO o campo para o “resultado geral”, revelando projetos que ainda apresentam a situação de “atraso” ou etapas nessa condição, apesar de estarem concluídos, mas tendo que aguardar o cumprimento de um rito por parte do agente operador, que não tem prazo estabelecido para isso.



Foto 2 – Técnicos e Diretoria Colegiada debatendo os resultados do 1º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE



Foto 3 – Técnicos e Diretoria Colegiada debatendo os resultados do 1º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE

Os procedimentos metodológicos de verificação da consistência se mantiveram os mesmos do ano anterior, lembrando que projetos que apresentaram etapas na situação de “Atraso”, desde que o prazo geral de execução não esteja vencido na data do “travamento das informações” são considerados “Em Andamento”.

Por sua vez, pela primeira vez foram apresentados pela Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, da DPLAN alguns encaminhamentos na forma de projetos (dois) a serem monitorados, que apresentam características de insumos para melhoria da ação governamental, como: a elaboração de metodologia geral para avaliação de planos, programas e projetos; e a avaliação de um projeto piloto (a ser escolhido) para fins de aplicação da metodologia antes definida. Assim, objetivando enquadrar tais projetos, foi apropriado do Plano Plurianual do Governo Federal o conceito de “Medida Institucional Normativa (MIN)”, que é aquela que, de acordo com o PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.

Para fins de enquadramento estratégico são considerados os referenciais do planejamento aprovado pela Diretoria Colegiada em sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013, elaborado conjuntamente com as Diretorias de Planejamento, de Fundos e Incentivos, de Administração e a então Assessoria de Gestão Institucional. Naquela oportunidade foi assumido como marco estratégico para referenciar e habilitar os projetos, as diretrizes e objetivos para o período 2013-2015, adiante descritos. São ao todo, 4 diretrizes e 14 objetivos, todos convergentes com as atribuições estabelecidas para a SUDENE pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007. São eles:

1.1 - Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva;

Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

1.2 - Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;

Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

1.3 - Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

Sub-objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;

Sub-objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;

Sub-objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;

Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

1.4 - Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:

- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.


- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

Os planos operativos que se constituem em medidas que contribuam para o alcance de um objetivo ou diretriz estratégica foram classificados como “Medida Institucional Normativa” e neste ciclo somam duas, todas da CGEP/DPLAN.

As deliberações e encaminhamentos da alta administração constam de capítulo específico deste relatório.


1- Resultados do monitoramento

1.1 – Retrospectiva 2014

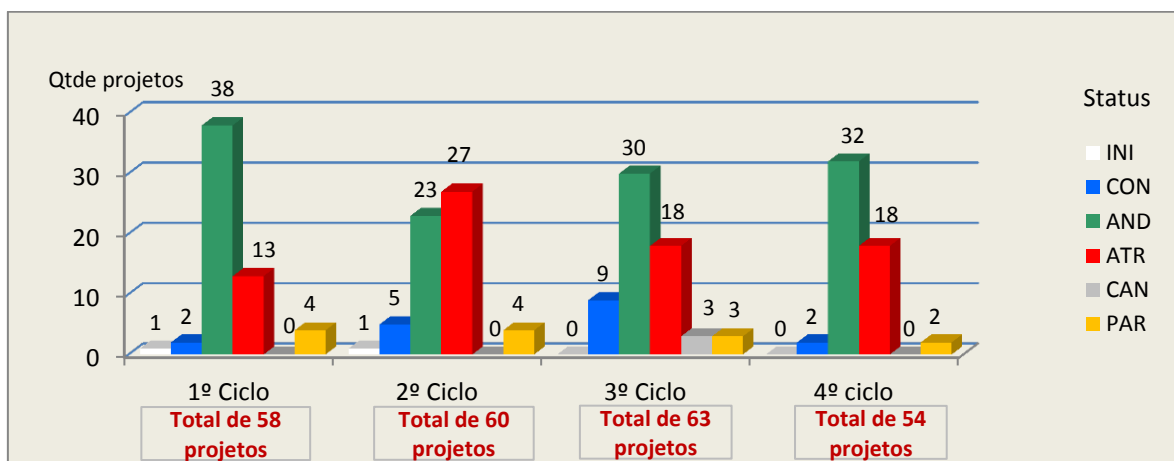


Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação do andamento dos Projetos segundo os Ciclos de Monitoramento de 2014

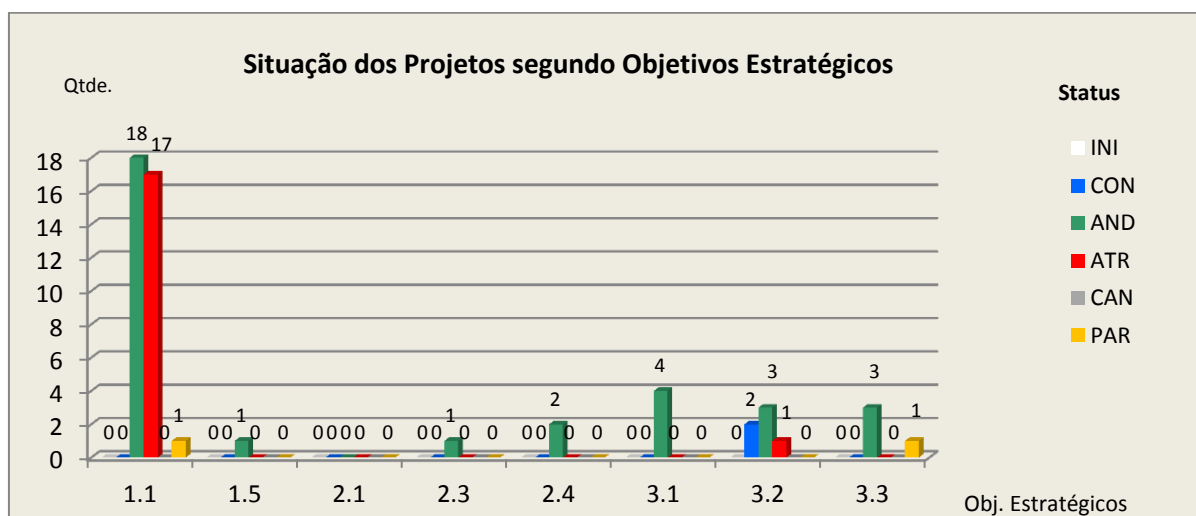

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Gráfico 2 – Situação Projetos em 2014, quanto ao andamento, segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo 2014- 54 projetos)

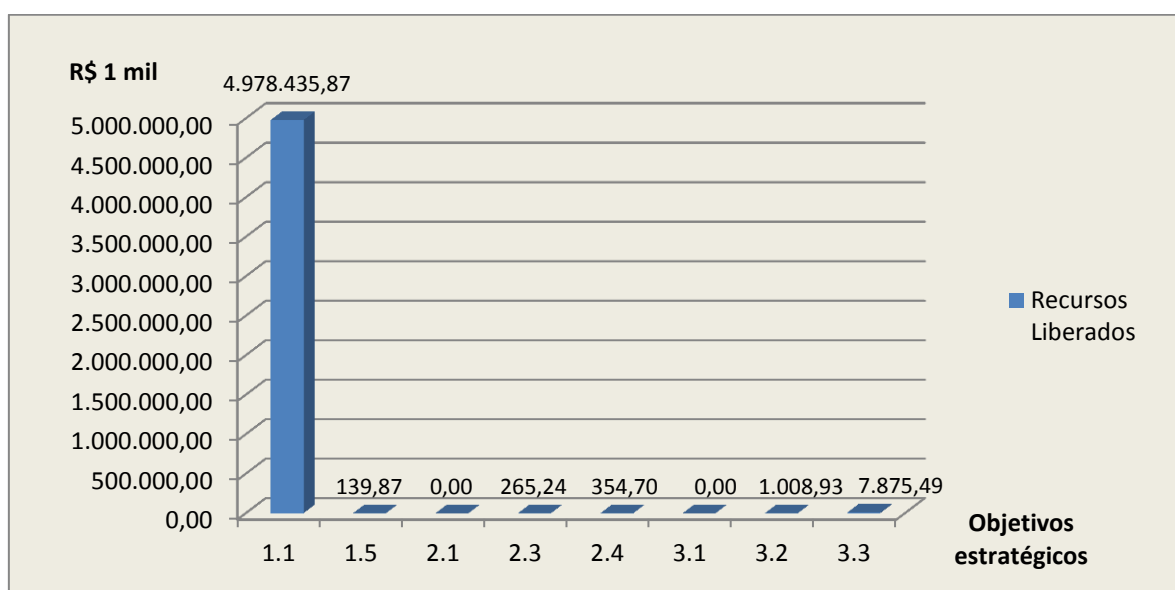

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Gráfico 3 –Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo 2014 – 54 projetos)

1.2 – Resultados Gerenciais – 1º Ciclo 2015

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2015

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ou MIN	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
1	1.1	44	9.167.212,74	5.472.311,56	-	8	22	14	-	-	44
	1.4	2	0,00	0,00			2				2
	1.5	1	234,11	139,87	-	-	1	-	-	-	1
Sub-Total		49	9.167.446,85	5.472.451,42	0	8	25	14	0	0	47
2	2.3	2	1.366,31	265,24	-	-	2	-	-	-	2
	2.4	2	579,78	518,98	-	-	2	-	-	-	2
Sub-Total		4	1.946,08	784,22	0	0	4	0	0	0	4
3	3.1	5	61,60	1,60	-	-	5	-	-	-	5
	3.2	4	1.349,89	1.008,93	-	1	2	-	-	1	4
	3.3	4	21.303,82	8.310,23	-	-	3	-	-	1	4
	MIN	2	0,00	0,00	-	1	-	1	-	-	2
Sub-Total		13	22.715,31	9.320,76	0	1	10	1	0	2	15
TOTAL		66	9.192.108,24	5.482.556,40	0	10	39	15	0	2	66

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Posição: 13/03/2015

Convenções:

- (1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes, objetivos estratégicos ou Medidas Institucionais Normativas são as seguintes: 1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.4 – Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 2.4-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; 3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho. MIN – Medida Institucional Normativa (são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade).
- (2) INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Observações:

- 1- Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.
- 2- Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 13/03/2015 (1º Ciclo de monitoramento-2015)

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2015**

	Ação do PPA ou MIN (Código)	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
2029	0355	27	9.151.082,96	5.464.768,18		8	8	11			27
	4640	2	2.252,99	1.183,12			2				2
	8340	2	2.857,02	2.134,02			2				2
	8689	2	1.366,31	265,24			2				2
	8902	8	8.827,10	3.564,29			6	2			8
	8917	2	617,75	107,35			2				2
	8918	1	694,46	694,46				1			1
20N7		2	1.114,58	0,00			2				2
Sub-Total		46	9.174.013,16	5.472.716,66	0	8	24	14	0	0	46
2040	8172	2	579,78	518,98			2				2
Sub-Total		2	579,78	518,98	0	0	2	0	0	0	2
2111	2000	13	22.715,31	9.320,76		1	10	0		2	13
Sub-Total		13	22.701,45	9.320,76	0	1	10	0	0	2	13
Interno	Interno	3	0,00	0,00			3				3
	MIN	2	0,00	0,00		1		1			2
Sub-Total		5	0,00	0,00	0	1	3	1	0	0	5
TOTAL		66	9.192.108,24	5.482.556,40	0	10	39	15	0	2	66

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Posição: 13/03/2015


Convenções:

- (1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria); Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade); Ações internas - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e quando relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional continuam como internas, e quando destinam-se a fornecer insumo para a melhoria da qualidade da gestão são chamadas de MIN – Medida Institucional Normativa.
- (2) INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Observações:

- 1- Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.
- 2- Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


Referência: 13/03/2015 (1º Ciclo de monitoramento 2015)

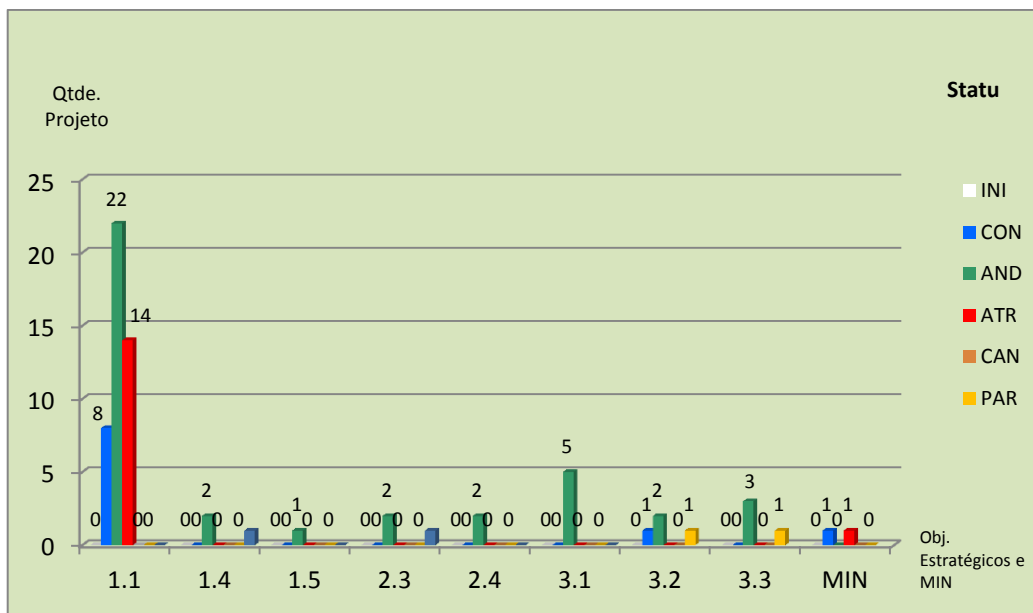

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Convenções: Obj. Estratégicos: 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2.3- Promover a sustentabilidade ambiental; 2.4-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; 3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho. **MIN** – Medida Institucional Normativa.

Gráfico 4 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º Ciclo – 2015 – 66 projetos)

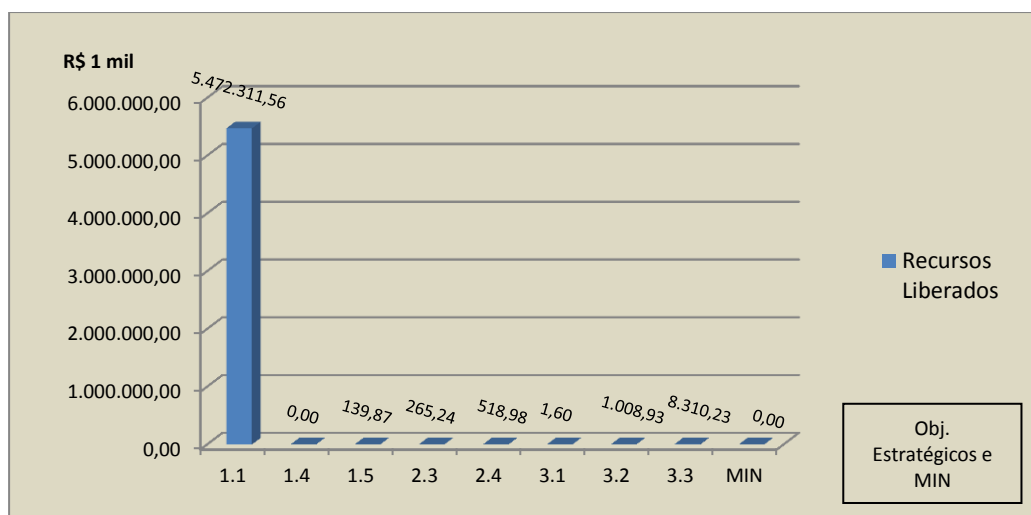

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Convenções dos Obj. Estratégicos: 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 2.4-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; 3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho. **MIN** –

Gráfico 5 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º Ciclo – 2015)

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{25 \times 100}{25} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 98,6 %.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 57,14% (1º Ciclo 2013).

Jun/2013 = 100% (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 100 % (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 100% (4º Ciclo 2013)


Mar/2014 = 100% (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 100% (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 100% (3º Ciclo 2014)

Nov/2014 = 100% (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica

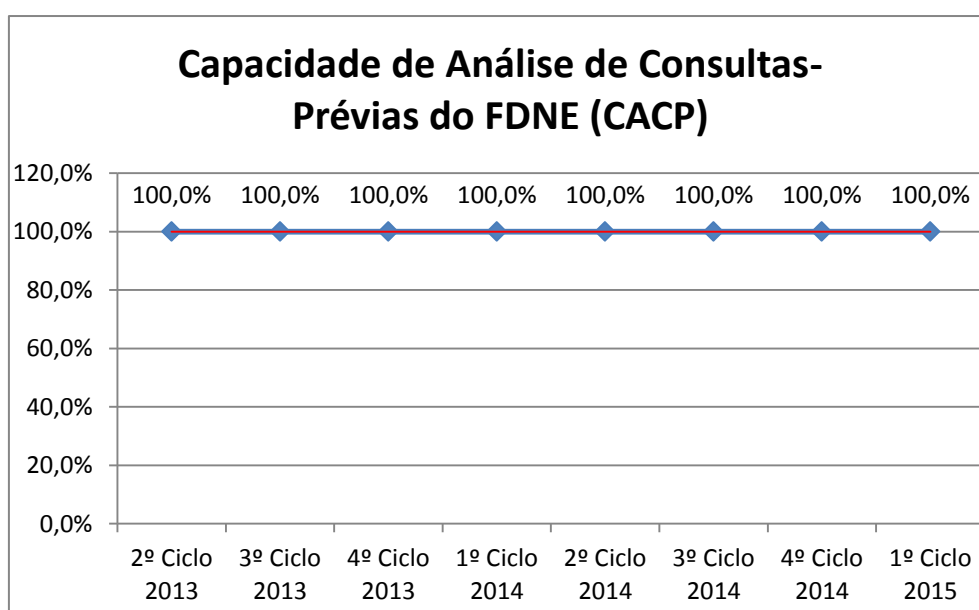

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{25}{7} = 3,57$ análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: A partir de julho de 2014 foram incorporados 5 novos técnicos, o que reduziu a média de consultas prévias analisadas por cada técnico. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 2,05 análises/técnico (2011)

Nov/2012 = 0,67 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 2,67 análises/técnico (1º Ciclo 2013).

Jun/2013 = 6,00 análises/técnico (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 6,50 análises/técnico (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 11,67 análises/técnico (4º Ciclo 2013)


Mar/2014 = 11,67 análises/técnico (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 3,50 análises/técnico (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 7 análise/técnico (3º Ciclo 2014)

Nov/2014 = 3,4 análise/técnico (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

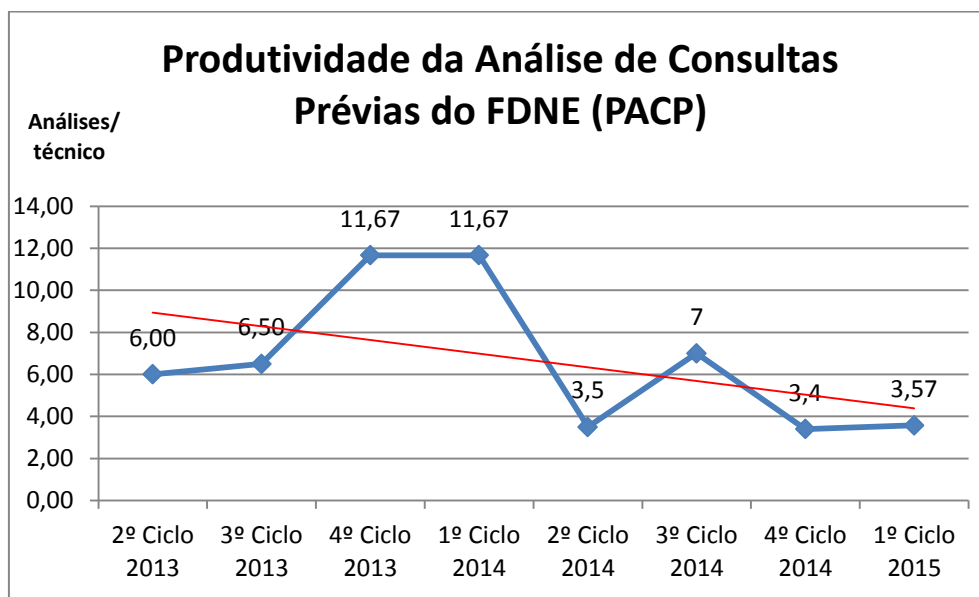


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{10 \times 100}{25} = 40\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2014
- f) Comentários: A devolução de 62,5% Consultas Prévias protocoladas foi decorrente de ausência de documentos necessários à conclusão da análise e/ou preenchimento inadequado do formulário padrão estabelecido. A DFIN/CGDF buscará ampliar as discussões prévias com os interessados em apresentar propostas.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = 40,80 %.
 - Nov/2012 = 100,00 % (1º e único Ciclo 2012).
 - Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013).
 - Jun/2013 = 50,00 % (2º Ciclo 2013).
 - Ago/2013 = 46,15 % (3º Ciclo 2013).
 - Nov/2013 = 40% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 40% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 71,43% (2º Ciclo 2014)
 - Ago/2014 = 71,43% (3º Ciclo 2014)
 - Nov/2014 = 62,50% (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

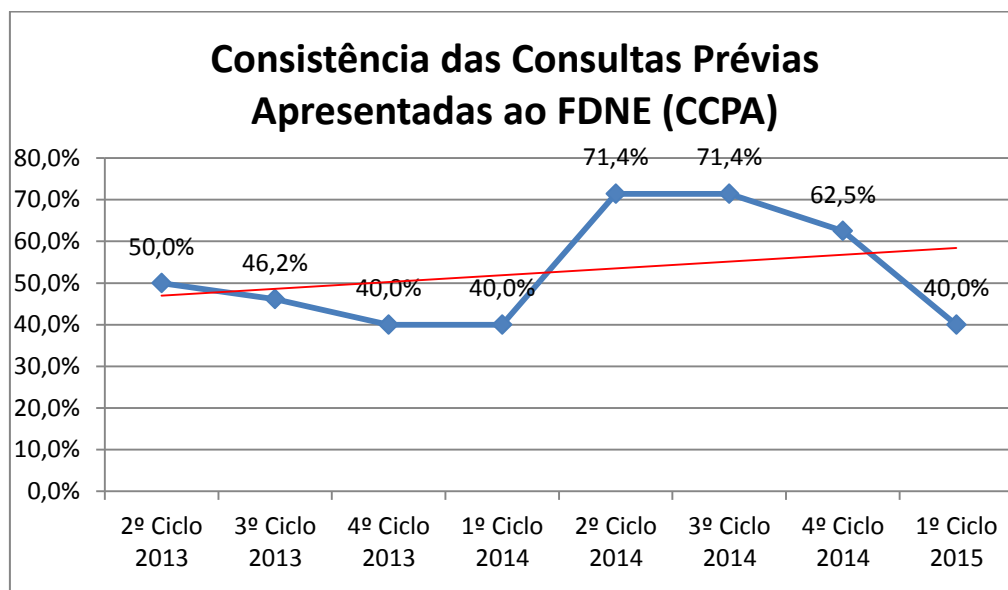

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$ (não há projeto em análise)

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{117 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,30$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{136,5 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,52$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão. Sugestão de novo nome para o indicador (em estudo): Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = Cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = Cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º Ciclo 2013). Incluía até então, apenas o BNB.

Jun/2013 = BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63 (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (4º Ciclo 2013)


Mar/2014 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67 (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67 (3º Ciclo 2014)


Nov/2014 = BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56 (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

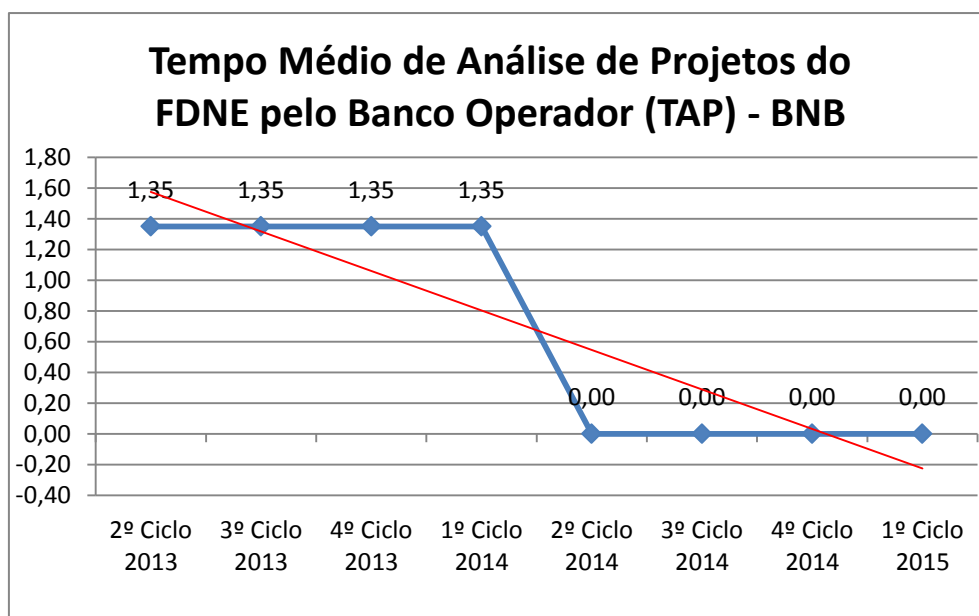


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

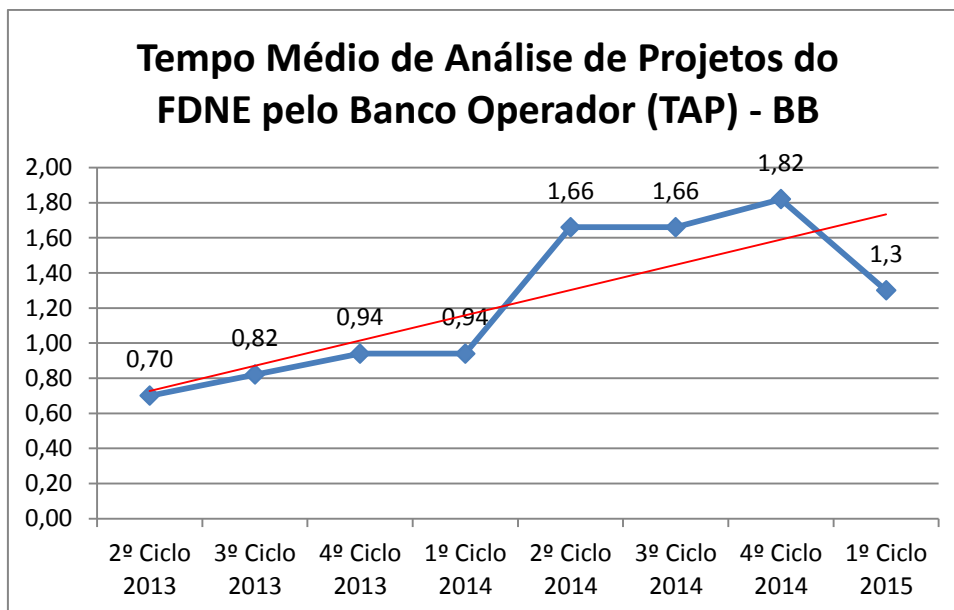

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

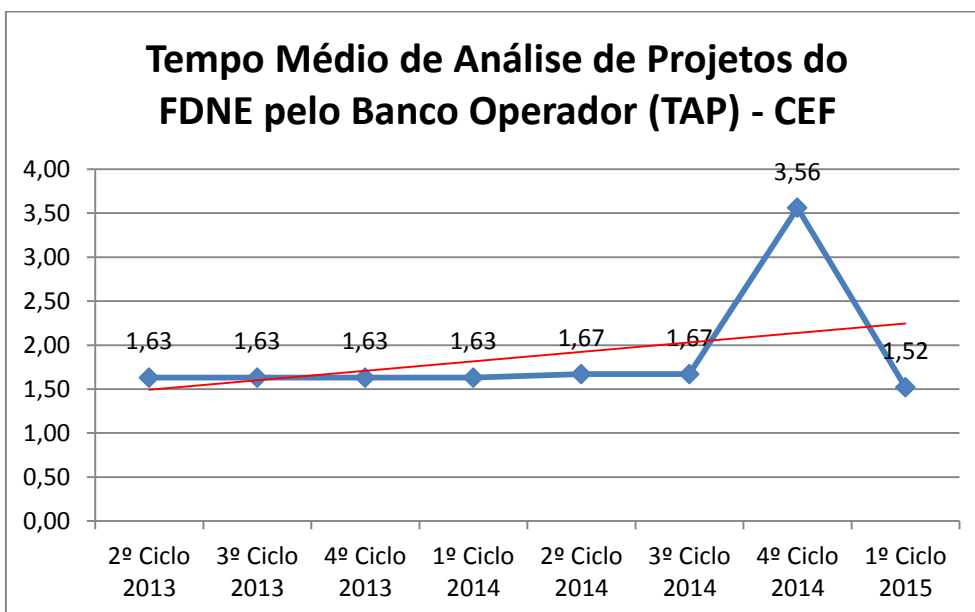

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{1} = 100\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB


$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{4 \times 100}{6} = 66,67\%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{3} = 33,33\%$$


- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2014
- f) Comentários:.
- g) Resultados anteriores:
 - Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012)
 - Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013) (incluía até então, apenas o BNB).
 - Jun/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (2º Ciclo 2013).
 - Ago/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (3º Ciclo 2013).
 - Nov/2013 = BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00% (2º Ciclo 2014)
 - Ago/2014 = BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00% (3º Ciclo 2014)
 - Nov/2014 = BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00% (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

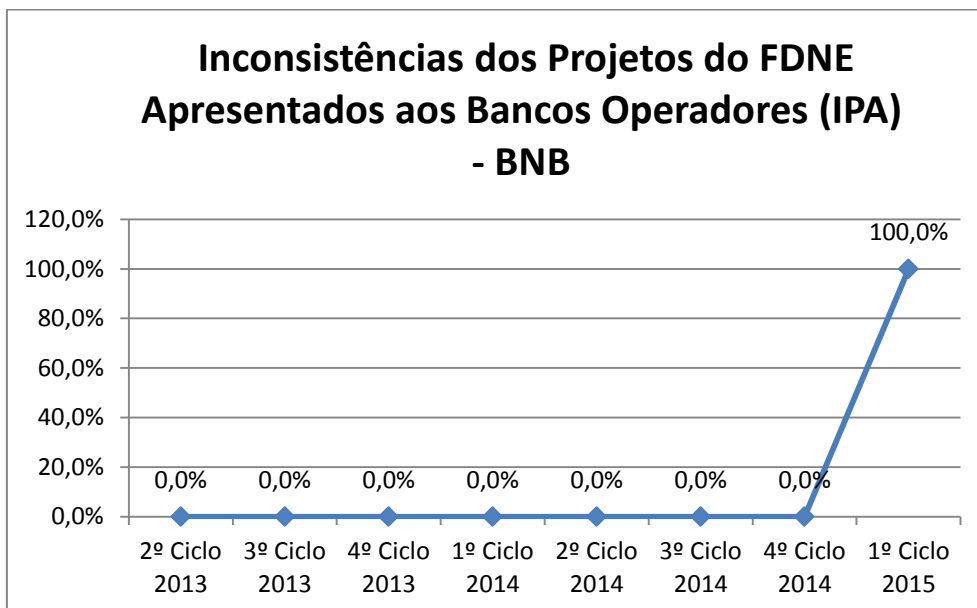


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

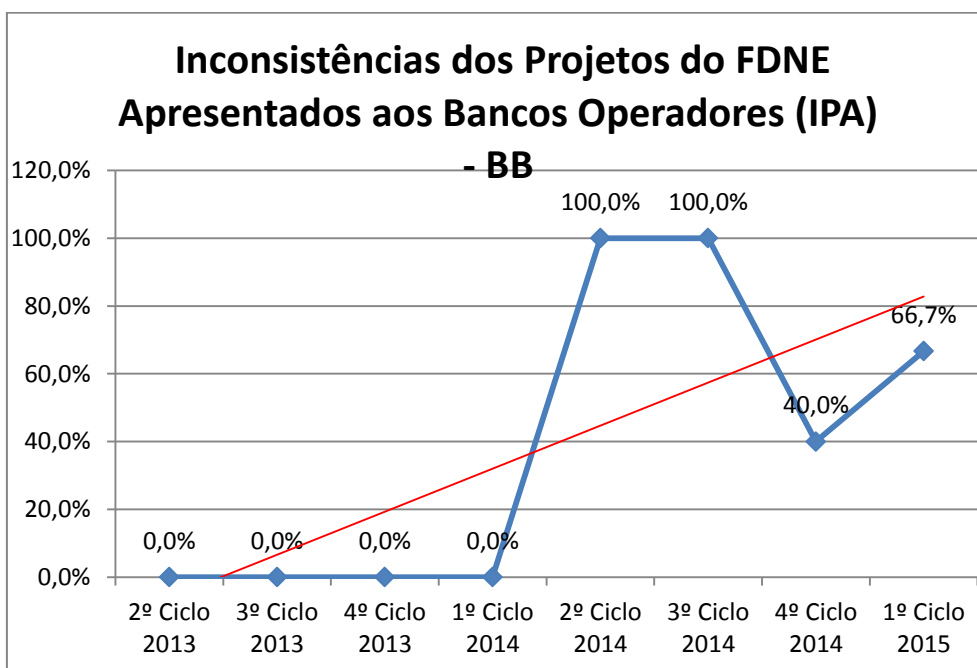

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

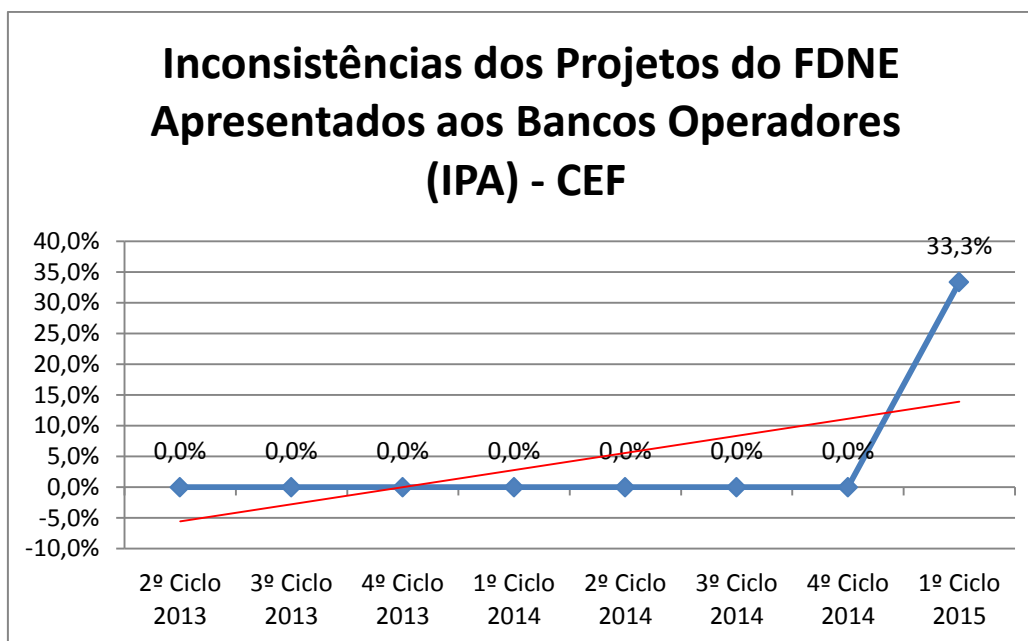


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA}} = \frac{1.889.550.145,85 \times 100}{1.889.550.145,85} = 100\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2014
- f) Comentários: Devido à falta de arrecadação foram cancelados empenhos no valor R\$ 132.931.489,15, reduzindo a disponibilidade do Fdne.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = 100,0 %
 - Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)
 - Abr/2013 = 99,14 % (referência LOA 2012 e RAPs) (1º Ciclo 2013)
 - Jun/2014 = 61,24 % (2º Ciclo 2013)
 - Ago/2013 = 61,24 % (3º Ciclo 2013)
 - Nov/2013 = 56,26% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 100% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 2,52% (2º Ciclo 2014)
 - Ago/2014 = 93,3% (3º Ciclo 2014)
 - Nov2014 = 100,% (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

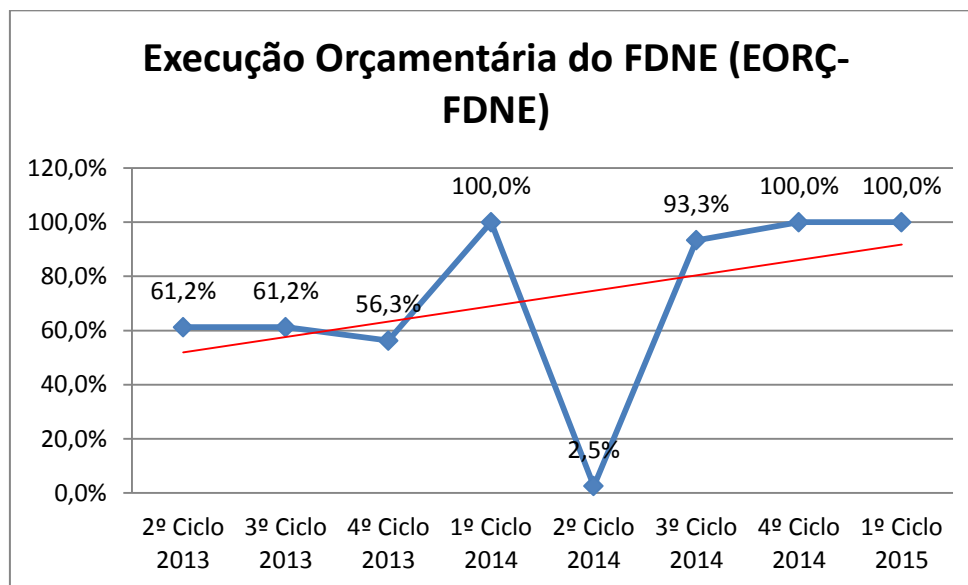

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Recursos Empenhados}} = \frac{2.671.425.231,31 \times 100}{6.516.423.328,14} = 41,00\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2014
- f) Comentários: O desempenho é prejudicado em virtude da necessidade de empenhar o valor total do projeto, em contraponto a desembolsos que ocorrem em mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = 14,2 %
 - Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)
 - Abr/2013 = 3,25 % (1º Ciclo 2013)
 - Jun/2013 = 11,70 % (2º Ciclo 2013)
 - Ago/2013 = 11,70 % (3º Ciclo 2013)
 - Nov/2013 = 18,43% (4º Ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 18,43% (1º Ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 8,46% (2º Ciclos 2014)

Ago/2014 = 24,68% (3º Ciclo 2014)

Nov/2014 = 36,50% (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

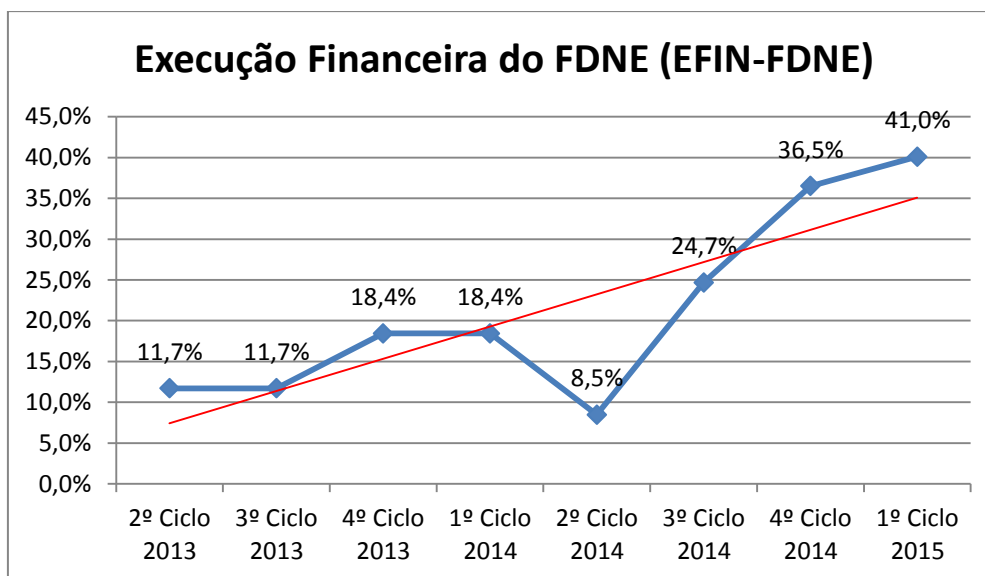

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}} = \frac{19}{30} = 0,63$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas uma fração do tempo máximo legal para tanto. Sugestão de novo nome para o indicador: Indicador de Performance na Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada pelo Bancos Operadores.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 0,37 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 0,37 (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 0,35 (4º Ciclo 2013)


Mar/2014 = 0,35 (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 0,10 (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 0,27 (3º Ciclo 2014)

nov/2014 = 0,65 (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

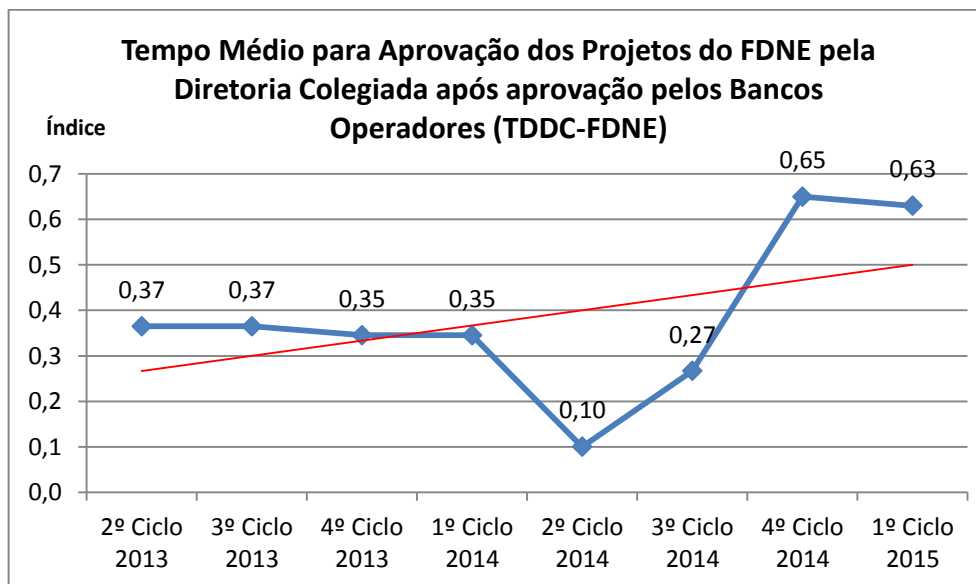

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{1\ 161}{4} = 290,25$ dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 300 dias (igual ou menor que 300 dias e quanto menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 138,4 dias (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 138,4 dias (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 501 dias (4º Ciclo 2013)


Mar/2014 = 501 dias (1º Ciclo 2014)

Mai/2014 = 260,5 dias (2º Ciclo 2014)

Ago/2014 = 264,67 dias (3º Ciclo 2014)

Nov/2014 = 291,75 dias (4º Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

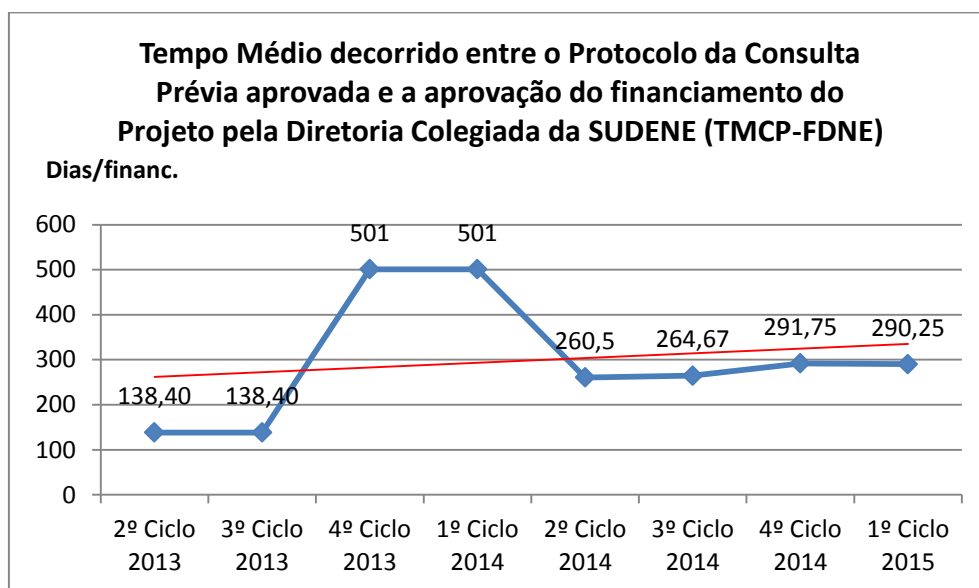

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{4}{4} = 1,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: todos os projetos aprovados pelos Agentes Operadores (BB, BNB e CEF) tiveram o financiamento aprovado pela SUDENE.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 1,0 (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 1,0 (3º Ciclo 2013)

Nov/2012 = 1,0 (4º ciclo 2013)


Mar/2014 = 1,0 (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 1,0 (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 1,0 (3º ciclo 2014)

Nov/2014 = 1,0 (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

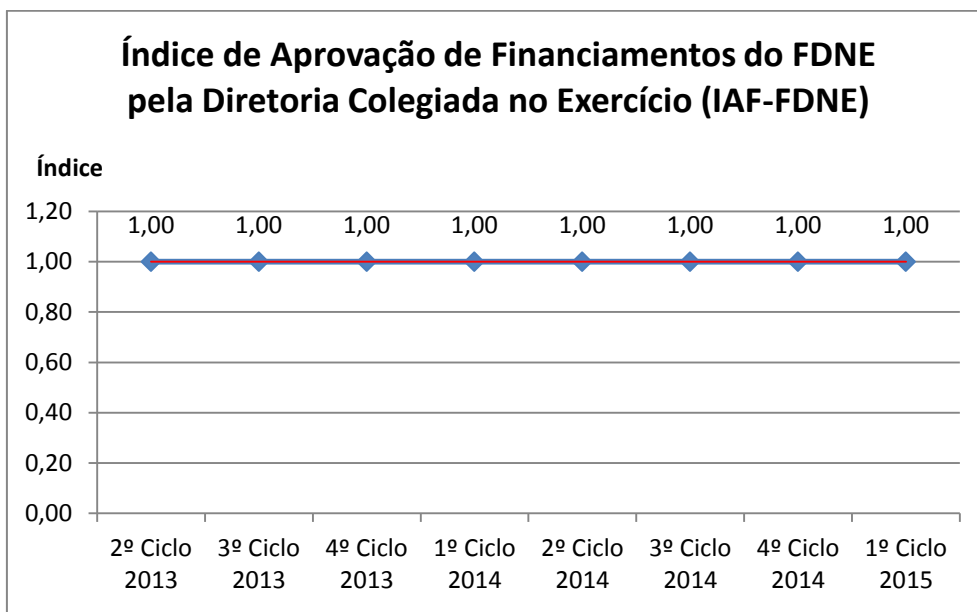

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{14.227 \text{ dias}}{190 \text{ pleitos}} = 74,9 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Status Hierárquico (uso interno ou público):
- e) Periodicidade: jan-dez/2014.
- f) **Comentários:** no período iniciado em 1º de janeiro de 2014 e encerrado em 31 de dezembro de 2014, foram **vistoriados 193 estabelecimentos dos 278 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos protocolados no período (quadro I)**. A diferença, de 85 pleitos, refere-se a 61 processos que se encontravam em fase de exame em 31.12.2014 e a 24 processos de transferência de benefício e retificação por mudança de razão social, que não se submetem ao procedimento de vistoria.

Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu a 74,9 dias (69,2 dias entre janeiro e dezembro de 2013)**, considerando uma amostra de 190 vistorias, dada a exclusão dos pleitos de interesse das empresas de informática anteriormente referidas.

Nada obstante o aumento verificado no prazo de espera em relação a 2013, observou-se ao longo de 2014 uma melhora nesse indicador uma vez que no monitoramento de janeiro a 31 de maio de 2014 tal prazo era de 83 dias e no monitoramento de janeiro a 31 de agosto, de 89,7 dias.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 293 dias (Arroz Antunes Ltda.). O prazo mínimo, de 8 dias, foi observado no processo de interesse das empresas Aratêxtil Ltda. e Autopel Ltda. O maior número de observações (54) situou-se no prazo de até 30 dias. Também foi significativo o número de observações entre 31 e 60 dias (51 vistorias) e entre 61 e 90 dias (34 vistorias).

Quadro I – Distribuição das Vistorias por Prazo

Prazo em dias	Número de vistorias
Até 30 dias	54
De 31 a 60 dias	51
De 61 a 90 dias	34
De 91 a 120 dias	13
De 121 a 150 dias	11
De 151 dias a 180 dias	12
De 181 a 210 dias	5
Acima de 210 dias	13

Fonte: Coordenação Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = 64,60 dias/pleito. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 30,10 dias/pleito. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 76,00 dias/pleito. (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 64,40 dias/pleito. (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 68,50 dias/pleito. (4º ciclo 2013)


Mar/2014 = 69,20 dias/pleito. (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 83,00 dias/pleito. (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 89,70 dias/pleito (3º ciclo 2014)

Nov/2014 = 90 dias/pleito (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

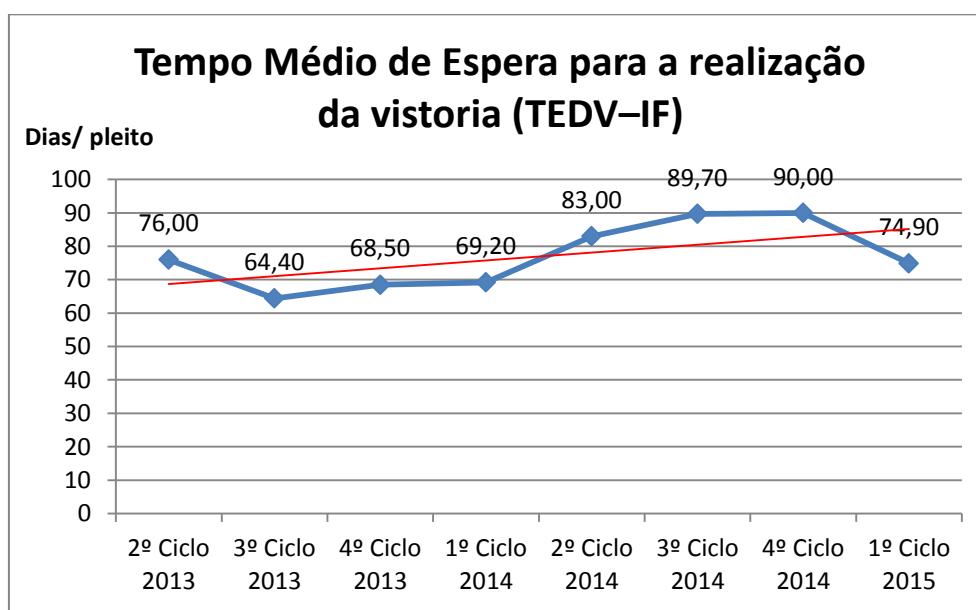

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

$T_1 = \Sigma$ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0}{413} = 0 \%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2014

f) Comentários: Dos 413 pleitos protocolados, 324 foram aprovados e 89 se encontravam em exame em 31/dez/14. A interpretação dada ao indicador foi a de que nessa data não haviam pleitos indeferidos no portfólio considerado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 2,36 % (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 0,00 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,00% (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 0,00% (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 0,00% (4º ciclo 2013)


Mar/2014 = 0,00% (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 0,00% (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 0% (3º ciclo 2014)

Nov/2014 = 0% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

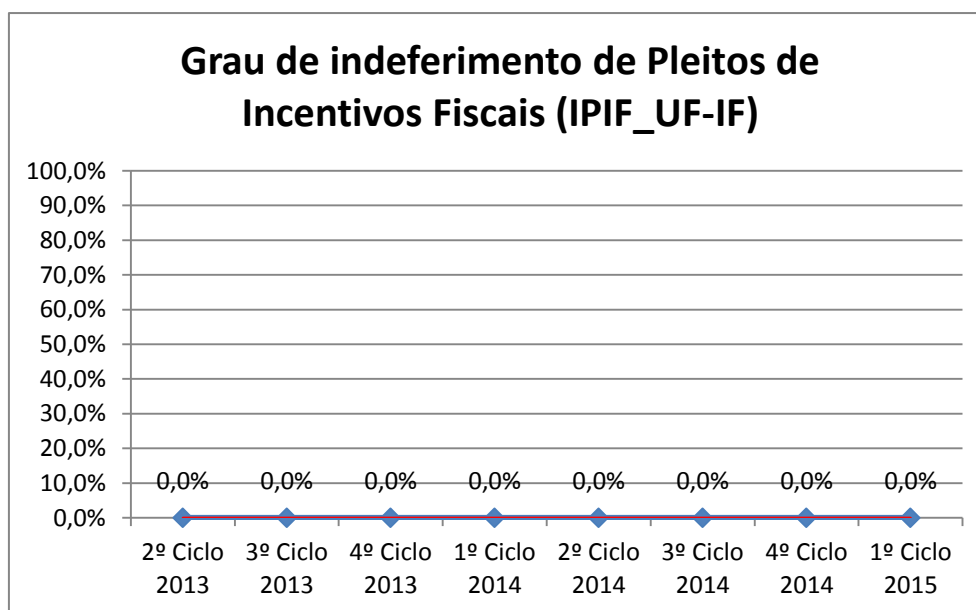

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:


(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} = \frac{324 \times 100}{413} = 78,4 \%$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: No período, dos 413 pleitos protocolados foram concluídas 324 análises de pleitos diversos, sendo 217 de redução de 75% do IRPJ, 76 de AFRMM, 27 de reinvestimento, 1 de depreciação acelerada e 3 de redução de 12,5% do imposto de renda, significando percentual de êxito de **78,4%** dos pleitos formalizados (413) entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014.
- g) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 77,16 %. (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 90,00% (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 100,00% (2º Ciclo 2013)
 Jan-ago/2013 = 75,4% (3º ciclo 2013)
 Jan-nov/2013 = 62,9% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 67,3% (1º ciclo 2014)
 Mai/2014 = 66,4 % (2º ciclo 2014)
 Ago/2014 = 63,70% (3º ciclo 2014)
 Nov/2014 87,3% (4º ciclo 2014)
- h) Representação gráfica:

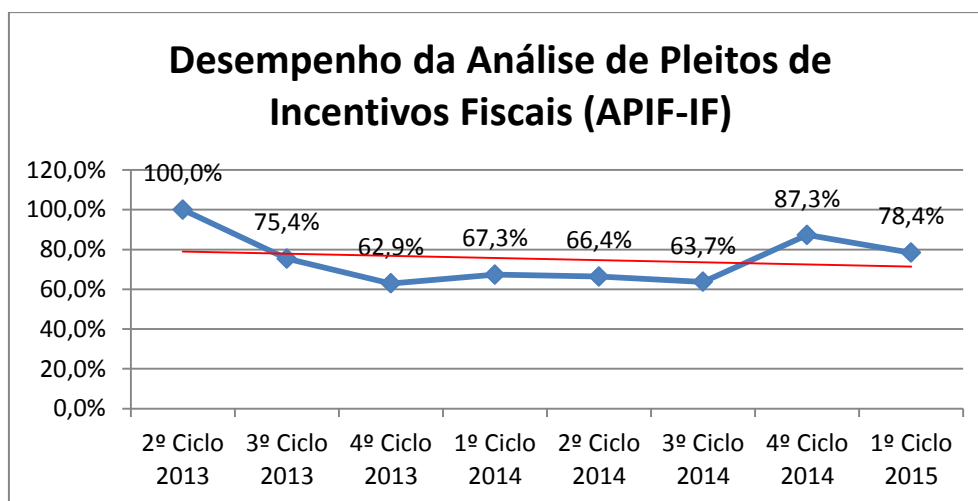

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{T1}{N} = \frac{30.920}{324} = 95,4 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (média): Quanto menor melhor

e) Periodicidade: jan-dez/2014

f) Comentários: Neste indicador, dos 413 pleitos protocolados foram considerados apenas os 324 pleitos com processos aprovados, pois como já informado, 89 ainda estavam em exame em 31/dez/2014. Ou seja, o prazo médio observado, de 95,4 dias (**76,7 dias no exercício de 2013**) decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos doze meses de 2014 (324). Individualmente, o prazo médio que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 126,2 dias, sendo de 54 dias o prazo médio para os processos de isenção do AFRMM e de 106 dias o prazo médio para exame dos processos de reinvestimento. 42 processos foram aprovados ao longo de 2014 e demandaram prazo acima de 190 dias para sua conclusão, o que contribuiu sobremaneira para a ampliação do tempo médio de espera.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 52,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 67,7 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 62,2 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 70,2 dias/pleito (4º ciclo 2013)


Mar/2014 = 76,7 dias/pleito (1º ciclo 2014)

Mai/2014 = 113,3 dias/pleito (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 105,6 dias/pleito (3º ciclo 2014)

Nov/2014 = 86,9 dias/pleito (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

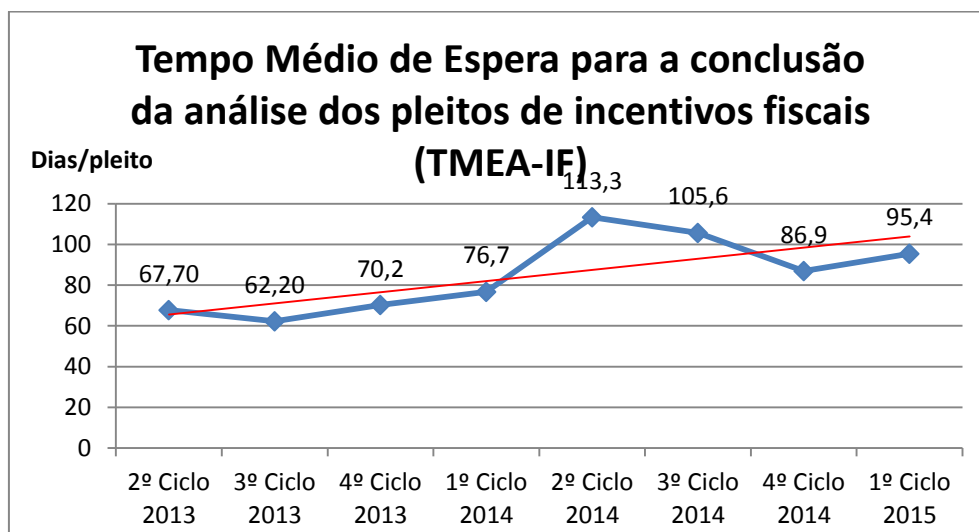

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.


N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{324}{21} = 15,4 \text{ análises/técnico}$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: o número observado, de 15,4 análises por técnico, a nosso ver é amplamente satisfatório uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo.
- g) Resultados anteriores:
 - Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012)
 - Jul a dez/2012 = 14,4 análises/técnico (1º Ciclo 2013)
 - Jan a mai/2013 = 9,6 análises/técnico (2º Ciclo/2013)
 - Jan a ago/2013 = 15 análises/técnico (3º ciclo 2013)
 - Jan a nov/2013 = 21,6 análises/técnico (4º ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 29,8 análise/técnico (1º ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 8,5 análise/técnico (2º ciclo 2014)

Ago/2014 = 15,1 análise/técnico (3º ciclo 2014)
Nov/2014 = 11,4 análise/técnico (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

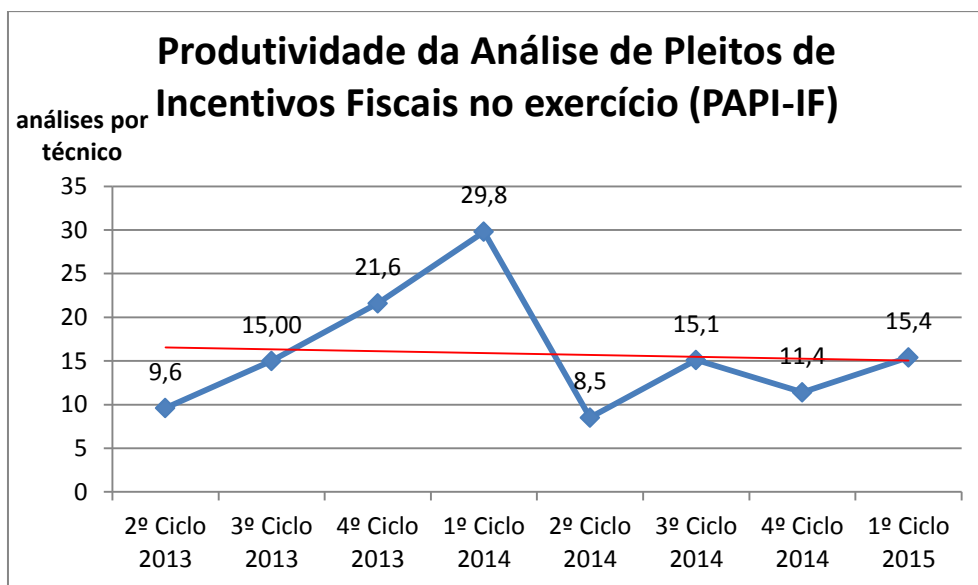


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de vitorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{193}{10} = 19,3$ vitorias/equipe
- Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)
- Periodicidade: jan-dez/2014
- Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 193 vitorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- Resultados anteriores:
 - Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vitorias/equipe. (1º e único Ciclo 2012)
 - Jul a dez/2012 = 18,2 vitorias/equipe (1º Ciclo 2013)
 - Jan a mai/2013 = 8 vitorias/equipe (2º Ciclo 2013)
 - Jan a ago/2013 = 12,4 vitorias/equipe (3º ciclo 2013)
 - Jan a nov/2013 = 18,6 vitorias/equipe (4º ciclo 2013)
 - Mar/2014 = 32,4 vitorias/equipe (1º ciclo 2014)
 - Mai/2014 = 8 vitorias/equipe (2º ciclo 2014)
 - Ago/2014 = 14,6 vitorias/equipe (3º ciclo 2014)
 - Nov/2014 = 12,3 vitorias/equipe (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

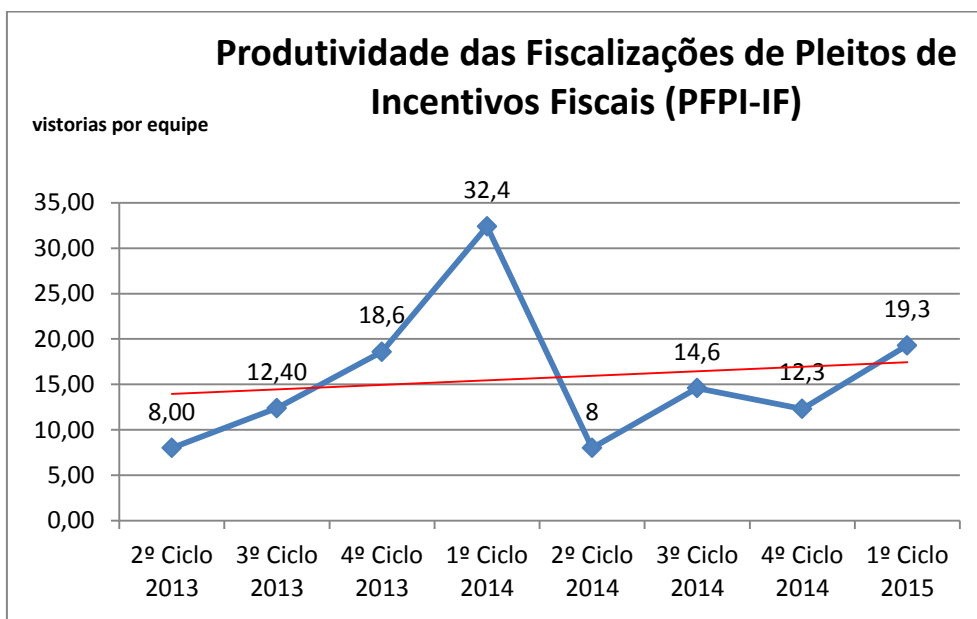

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{108 \times 100}{117} = 92,31 \%$$


b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período de aferição: jan-dez/2014.

f) Comentários: Foram cadastradas 128 propostas no exercício de 2014, porém 11 dessas propostas foram imediatamente canceladas pelo proponente, restando assim 117 propostas para análise, das quais até o fim do exercício 108 foram analisadas.

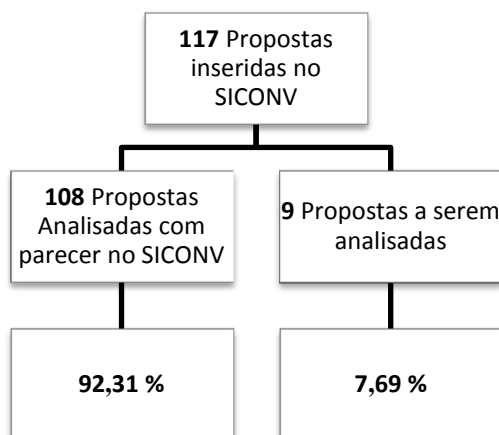

h) Resultados Anteriores (CAPC):

Dez/2011 = 100,0 %

Jan a nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0% (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/ 2013 = 86,79 % (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013= 92,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 73,33% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 54,17 % (3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 71,13 % (4º ciclo 2014)

g) Representação gráfica:

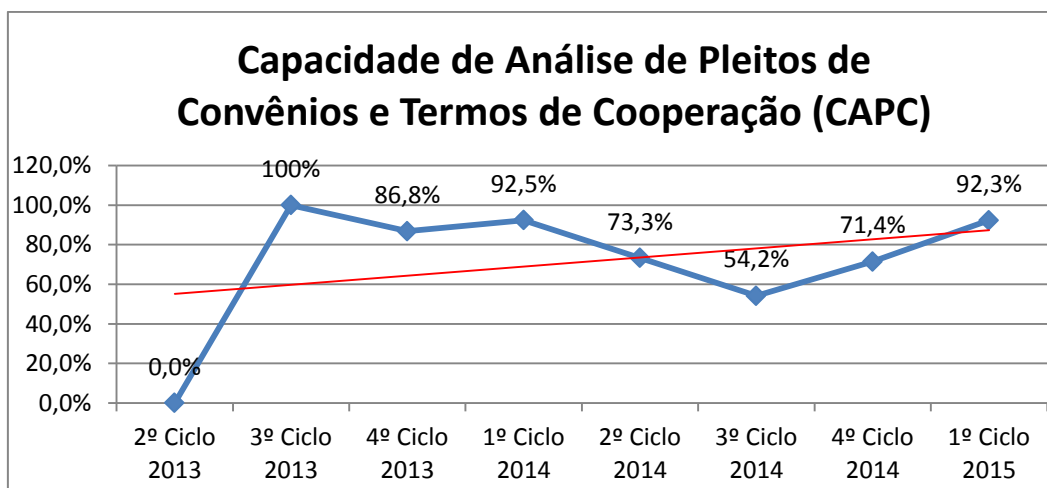

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{10 \times 100}{117} = 8,55 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2014

f) Comentários: Até o encerramento deste período, foram aprovados 10 propostas, das 117 analisadas. Entretanto, cabe ressaltar que 1 propostas foram aprovadas porém o plano de trabalho encontra-se em complementação pelo proponente, e 1, após serem complementadas, aguardam nova análise técnica desta SUDENE.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = 14,6 %

Jan a nov/2012 = 21,74 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 38,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 25,0% (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 23,91 % (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 22,45% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 18,18% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 7,69% (3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 3,75% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

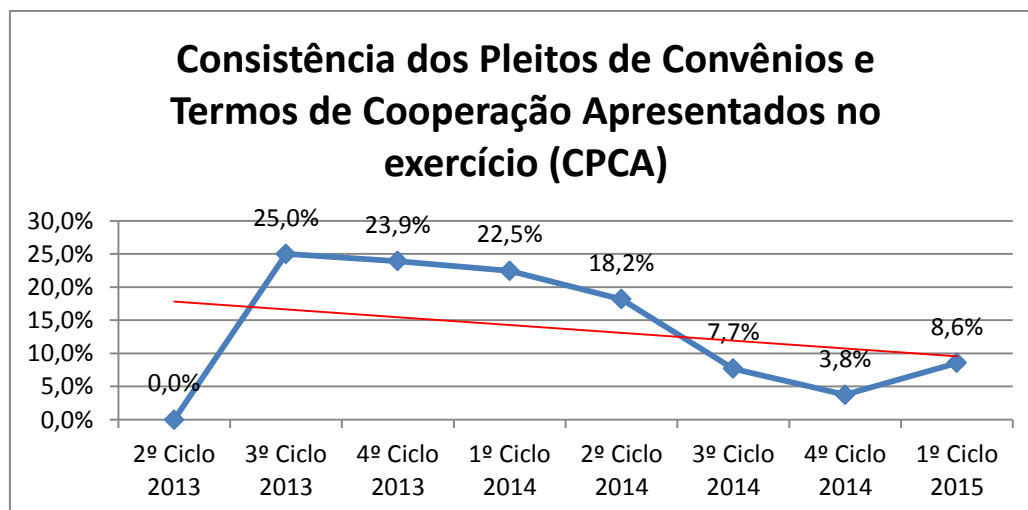

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$

$$= \frac{95 \times 100}{117} = 81,20 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2014

f) Comentários: Das 95 propostas formalmente rejeitadas, 89 foram devido aos recursos previstos não viabilizados pelo governo federal, e 6 foram por impedimento técnico. Outras 12 ainda não tinham parecer de posicionamento em 31/dez/2014.

g) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 13,04 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 74,6 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 75,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 56,6 % (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 62,26% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 60,0% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 16,67% (3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 11,61% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

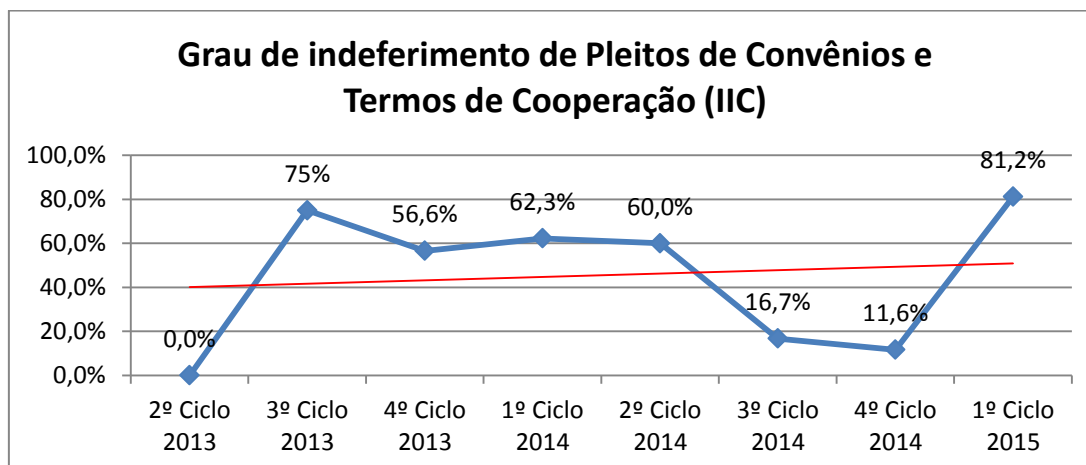

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{21 \times 100}{21} = 100 \%$$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)
- e) Período da aferição: jan-dez/2014
- f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 21 viagens de acompanhamento da parte física dos convênios sob a responsabilidade da Coordenação Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável.
- g) Resultados Anteriores (DFCON):
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Jan a nov/2012 = não informado pela unidade. (1º e único Ciclo 2012)
Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)
Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)
Jan a nov/2013 = 100,0 % (4º ciclo 2013)
Jan a dez/2013 = 100,0% (1º ciclo 2014)
Jan a mai/2014 = 100,0% (2º ciclo 2014)
Jan a ago/2014 = 100,0% (3º ciclo 2014)
Jan a nov/2014 = 100,0% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

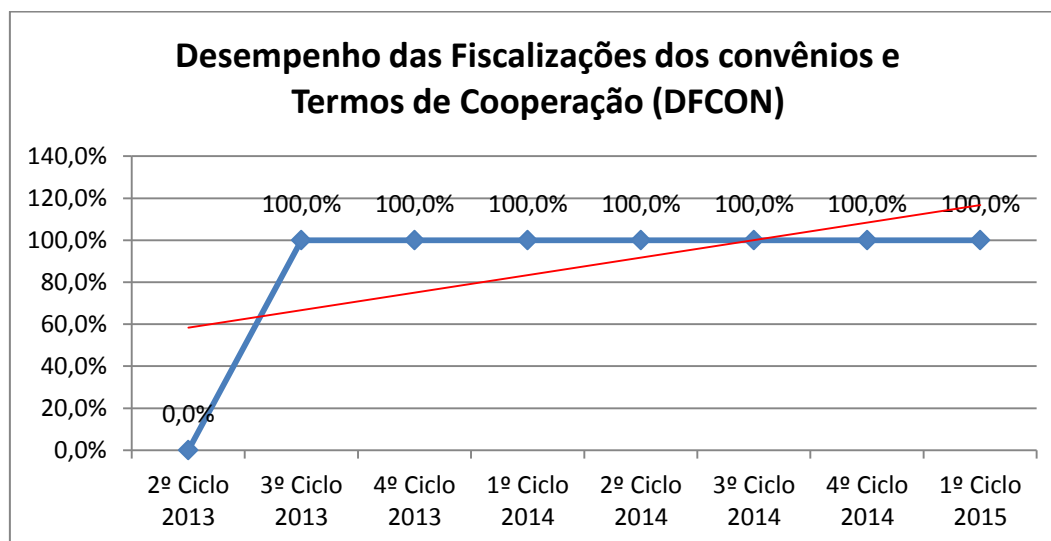

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ANO 2014

1. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura.
Período: 28 à 31.01.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Araripina, Serra Talhada, Moreilândia – PE.
2. Realizar visita técnica de acompanhamento do convênio nº 770741/2012 que trata do Projeto de Capacitação dos Integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Estado da Paraíba
Período: 30.01.2014
Técnicos: Juliana Borges e Macira Sotero
Local João Pessoa – PB.
3. Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura no Estado de PE
Período: 04 a 06.02.2014
Técnico: Marcelo Viana
Local: Floresta e São José do Egito – PE.
4. Realizar visita de acompanhamento final do Projeto Aprisco Seridó, convênio SICONV 710365/2009 – Região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte – RN
Período 1102 a 13.02.2014-03-31 Técnico: Victor Uchoa
Local: Natal e Jardim do Seridó – RN.

5. Visita Técnica para emissão de Laudo Técnico do convênio SICONV 744654/2010 – ao município de Timbau do Sul, no Estado do Rio Grande do Norte.
Período: 20 a 21.02.2014.
Técnica: Maria Helena Castro
Local: Timbau do Sul – RN.
6. Realizar supervisão final do convênio nº 767485/2011, celebrado com o Município de Riacho de Santana, no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a emissão de Laudo Técnico
Período: 19 a 21.03.2014.
Técnico Agrimon Marcos
Local Riacho de Santana – RN.
7. Realização dos trabalhos de vistoria de campo nos convênios da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedra/RN – SICONV nº 737691/2010 (conclusão de obras de urbanização), Prefeitura Municipal de Assu/RN – SICONV 768007/2011 (obras de pavimentação em asfalto CBUQ em ruas) e Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa-RN, SICONV 770860/2012 (construção de uma ponte de concreto armado) para emissão de Laudo técnico.
Período: 09.04 a 11.04.2014
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Lagoa de Pedra, Assu e Ruy Barbosa – RN.
8. Verificar no local onde vai se realizar as reformas dos mercados públicos de Messias Targino/RN e Jardim de Piranhas/RN, a viabilidade de realização de convênios.
Período: 06.05 a 08.05.2014.
Técnico: Edson Laranjeiras
Local: Messias Targino-RN e Jardim de Piranhas – RN.
9. Viagem de acompanhamento ao termo de Cooperação entre SUDENE e IFPB “Qualificação Profissional de Mulheres para a Construção Civil, nº 59.335.000213/2013-25”.
Período 31.07.2014.
Técnicos: Macira Sotero e Edson Laranjeiras.
Local: João Pessoa – PB.
10. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura Processo nº 59.335.000124/2012-6 – SICONV 769783/2012
Período 07 a 08.08.2014.
Técnico: Marcelo Viana.
Local: Serra Talhada e Sertânia – PE.
11. Supervisionar as ações do Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das estruturas Produtivas da caprinocultura e Apicultura convênio 59.335.000124/2012-6 - SICONV 769783/2012
Período: 20 a 22.08.2014.
Técnicos: Marcelo Viana e Marcelo Saiki.
Local: Parnamirim e Custódia – PE.

12. Realizar vistoria às obras de Pavimentação de Vias Urbanas na Sede do Município para emissão de Laudo Técnico do Convênio SICONV 750323/2010 – Prefeitura Municipal de Assu/RN.
Período: 01 a 02.09.2014
Técnicos: José Villeneuve e Givanildo Ramos
Local: Assú – RN
13. Reunião no IFPB para socializar as informações pertinentes à continuidade do Projeto “Mulheres na Construção Civil, convênio 59.335000213/2013-25.
Período: 08.09.2014
Técnicos: Edson Laranjeiras e Macira Sotero
Local: João Pessoa-PB
14. fiscalizar a reforma do mercado público e serviços de urbanização das ruas em volta do mercado público da Prefeitura Municipal de Saboeiro/CE – SICONV 78901/2013
Período: 10 a 12.09.14
Técnicos: Edson Laranjeiras e Givanildo Ramos
Local: Saboeiro – CE
15. Realizar supervisão final do convênio nº 786583/2013, celebrado com o município de Brejinho, estado de PE, com vistas à emissão de Laudo Técnico
Período: 24 a 26.09.2014
Técnicos: Agrimon Marcos
Local: Brejinho – PE
16. Acompanhamento técnico para o convênio nº 770355/2012 Capacitação e Reequipamento das Coordenadorias de Defesa Civil.
Período: 20 a 22.10.2014
Técnicos: Macira Sotero e Marcelo Viana
Local: Fortaleza e Tianguá – CE
17. Acompanhamento técnico do Projeto especificamente a capacitação em Cabedelo e reunião no IFPB sobre as outras ações constantes do Termo de Execução Descentralização entre SUDENE e o IFPB-PB - convênio 59.335.000033/2014-24
Período: 24 a 25.11.2014
Técnicos: Macira Sotero e Juliana Borges
Local: João Pessoa – PB
18. Acompanhar atividades aos primeiros eventos, denominados Encontros, do Convênio SICONV nº 770859/2012 que trata do Zoneamento de Áreas Vulneráveis à Desertificação no Estado de PE.
Período: 10 a 11.12.2014
Técnicos: Victor Uchoa e Renato Vaz
Local: Paelas, São Bento do Una – PE

19. Acompanhar Participar do I Fórum Internacional sobre Evidências Sísmicas no Ceará – I FIESCE, Em execução do Convênio do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará.
Período: 10 a 14.12.2014
Técnicos: Macira Sotero
Local: Fortaleza – CE
20. Fiscalização no Município de Ruy Barbosa-RN para averiguar a conclusão da construção da ponte de concreto para fins de emissão de Laudo Técnico de encerramento convênio SICONV nº 770860/12.
Período: 11 a 12.12.2014
Técnicos: Edson Laranjeiras e Givanildo Ramos
Local: Ruy Barbosa – RN
21. Realização do Fórum para apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Salgueiro e Entorno, objeto do Convênio 59.335.000357/2013-81 SUDENE/CONDEPE/FIDEM
Período: 15 a 17.12.2014
Técnicos: Maria Helena, Vera Assunção, Isis Guimarães e Manoel Jardim
Local: Salgueiro - PE

PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO À NOVEMBRO / 2014

NÚMERO DA PROPOSTA		Nome do Proponente	UF do Proponente	Programa	Possui Parecer	Situação
1	055151/2014	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE	BA	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
2	055150/2014	VALENTE PREFEITURA	BA	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
3	055130/2014	MUNICIPIO DO RECIFE	PE	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
4	055083/2014	UMBURANAS PREFEITURA	BA	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise

5	054848/2014	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	AL	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
6	054649/2014	MUNICIPIO DE ALCOBACA	BA	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
7	054577/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Sim	Em execução
8	054215/2014	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	MT	029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
9	052390/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Em execução
10	052160/2014	SAO JOSE DE MIPIBU PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
11	051994/2014	SAO PAULO DO POTENGI PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
12	051990/2014	GOIANINHA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
13	051989/2014	BOM JESUS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
14	051987/2014	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
15	051929/2014	VARZEA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

16	051925/2014	MUNICIPIO DE MONTANHAS	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
17	051797/2014	PEDRO VELHO PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
18	051500/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N9 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO - Plano Brasil sem Miséria - Programação	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise
19	051299/2014	SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT	PB	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 8689 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO - PROGRAMAÇÃO	Sim	Em execução
20	051298/2014	RIACHUELO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
21	051297/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
22	051296/2014	NOVA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
23	051291/2014	VERA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
24	051229/2014	LAGOA DE VELHOS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
25	051188/2014	SAO PEDRO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

26	051187/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
27	051186/2014	MUNICIPIO DE ARES	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
28	051171/2014	MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
29	051169/2014	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
30	051151/2014	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
31	051150/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
32	051112/2014	VILA FLOR PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
33	051111/2014	TIBAU DO SUL PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
34	051105/2014	MUNICIPIO DE SERRINHA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
35	051104/2014	MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
36	051102/2014	LAGOA DE PEDRAS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

37	051101/2014	SAO TOME PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
38	051096/2014	PASSA E FICA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
39	051094/2014	MUNICIPIO DE PASSAGEM	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
40	051093/2014	LAGOA SALGADA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
41	051091/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
42	051090/2014	BOA SAUDE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
43	051072/2014	BAIA FORMOSA PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
44	048821/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
45	047621/2014	MUNICIPIO DE TANGARA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
46	047615/2014	CAMPO REDONDO PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
47	047161/2014	PORTO DO MANGUE PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementaç ão

48	047104/2014	MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
49	044157/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
50	043883/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL	RN	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
51	043574/2014	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
52	043406/2014	PENDENCIAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
53	043352/2014	GROSSOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
54	043346/2014	MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
55	043339/2014	SAO JOSE DE MIPIBU PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
56	043338/2014	MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
57	043325/2014	VARZEA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
58	043317/2014	MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

59	043316/2014	EXTREMOZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
60	043302/2014	SAO GONCALO DO AMARANTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
61	043286/2014	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
62	043270/2014	TIBAU DO SUL PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
63	043235/2014	GOIANINHA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
64	042663/2014	BOM JESUS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
65	042552/2014	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
66	042522/2014	CAICARA DO RIO DO VENTO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
67	042505/2014	RIO DO FOGO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
68	042247/2014	MONTE DAS GAMILEIRAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
69	042067/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

70	041924/2014	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
71	041922/2014	JAPI PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
72	041915/2014	MUNICIPIO DE LAGOA DANTA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
73	041907/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DE ANGICOS	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
74	041899/2014	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
75	041894/2014	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
76	041885/2014	ALMINO AFONSO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
77	041879/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
78	041874/2014	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados
79	041872/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
80	041871/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
81	041870/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
82	041869/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
83	041868/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados





84	041867/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
85	041866/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
86	041865/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
87	041864/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL	AL	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Não	Proposta/Plano de Trabalho Cancelados
88	041858/2014	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
89	041853/2014	MUNICIPIO DE ACARI	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
90	041821/2014	NOVA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
91	041736/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
92	041668/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
93	041665/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
94	041664/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
95	041663/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
96	041654/2014	MUNICIPIO DE SERRA DO MEL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

97	041652/2014	LAGOA DE VELHOS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
98	041648/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
99	041647/2014	MUNICIPIO DE JUCURUTU	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
100	041645/2014	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
101	041644/2014	AREIA BRANCA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
102	041545/2014	MUNICIPIO DE CRUZETA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
103	041482/2014	MAJOR SALES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
104	040009/2014	VERA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
105	040008/2014	SANTA CRUZ PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
106	040007/2014	LAJES PINTADAS PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
107	040005/2014	PARAZINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

108	040003/2014	JANDAIRA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
109	040001/2014	JACANA PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
110	040000/2014	CURRAIS NOVOS PREFEITURA	RN	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
111	039978/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
112	039973/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
113	039971/2014	MUNICIPIO DE BREJINHO	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
114	039733/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
115	039665/2014	MUNICIPIO DE CERRO CORA - PREFEITURA MUNICIPAL	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
116	039638/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
117	039633/2014	MUNICIPIO DE FLORANIA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico

118	036529/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação
119	036442/2014	ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA	SE	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho em Complementação
120	036438/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	MG	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
121	036339/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
122	036275/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Em execução
123	036138/2014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	PE	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 8689 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO - PROGRAMAÇÃO	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
124	034868/2014	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	PE	PROGRAMA 2029 – DESENVOLVIMENTO, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. AÇÃO 8340 – DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
125	024010/2014	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Em execução
126	023207/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Em execução
127	023169/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs - Plano Brasil sem Miséria	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados

128	020551/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Em execução
-----	-------------	--	----	---	-----	-------------

LEGENDA	
	PROPOSTAS ANALISADAS E APROVADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS E CANCELADAS
	PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS POR IMPEDIMENTO TÉCNICO
	PROPOSTAS EM PROCESSO DE ANÁLISE
	PROPOSTAS A SEREM ANALISADAS

4.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)_{Conv}

- a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{365 \text{ dias}}{128 \text{ pleitos}} = 2,85 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: as 128 propostas registradas entre jan e dez/2014 estão assim distribuídas:

Contagem de Situação	UF do Proponente										Total Global
Situação	AL	BA	CE	MG	MT	PB	PE	RN	SE		
Em execução	1		1			3		2			7
Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado em Análise						1					1
Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação						1					1
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados							1				1
Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados	2	2					1				5
Proposta/Plano de Trabalho Cancelados	10				1						11
Proposta/Plano de Trabalho em Complementação								2	1		3
Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise		2		1				1			4
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados			1	3		1	1				6
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico								89			89
Total Global	13	4	2	4	1	6	3	94	1		128

Fonte: SICONV

Obs: os dados acima ficaram iguais ao ciclo anterior, pois em dezembro/2014 não houve novas propostas.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = 13,8 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 13,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 0 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 0 dias/pleito (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 16,27 dias/pleito (1º ciclo 2014)

Jan a Mai/2014 = 59,66 dias/pleito (2º ciclo 2014)

Jan a Ago/2014 = 2,66 dias/pleito (3º ciclo 2014)

Jan a Nov/2014 = 2,60 dias/pleito (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

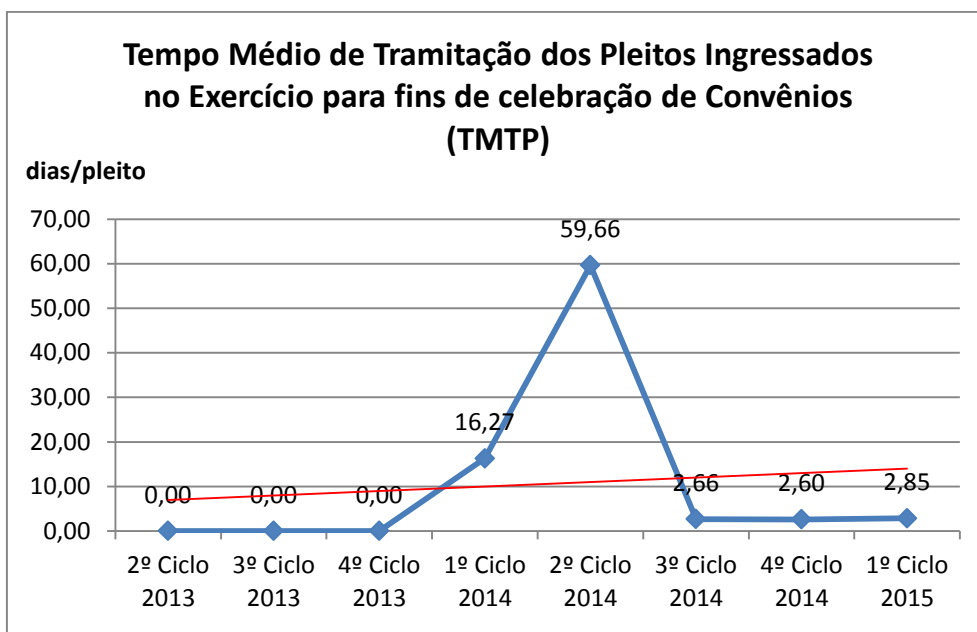

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{54 \text{ dias}}{3 \text{ pleitos}} = 18 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)

i) Periodicidade: jan-dez/2014

e) Comentários: Os tempos foram calculados com base nas datas de tramitação no NETDOC. Como não houve tramitação de novas execuções descentralizadas em dezembro/2014, o valor desse índice ficou igual ao do 4º ciclo.

f) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = Não existia o indicador (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = Não existia o indicador (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 5 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 5 dias/pleito (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 5 dias/pleito (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 5 dias/pleito (2º ciclo 2014)

Jan a Ago/2014 = 12 dias/pleito (3º ciclo 2014)

Jan a Nov/2014 = 18 dias/pleito (4º ciclo 2014).

g) Representação gráfica:

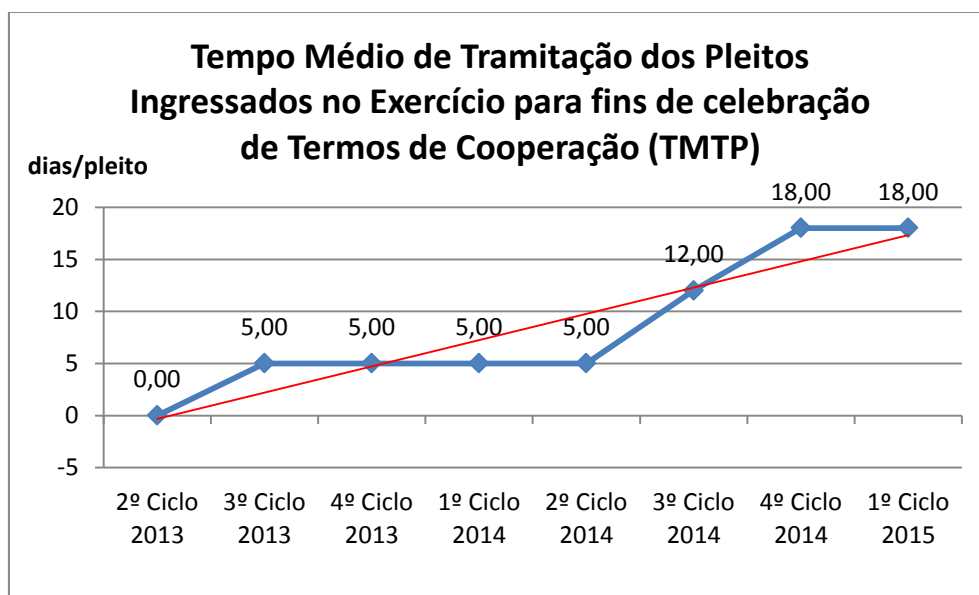

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).


Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \frac{33 \times 100}{33} = 100\%$$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios, com o apoio da Comissão Permanente de TCE.
- d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: no ciclo em análise, não houve redução do saldo de convênios “a aprovar” do passivo de convênios da extinta SUDENE por conta da aproximação do final de ano, que normalmente demanda em maior esforço da CGC na celebração de novos convênios e na análise da prestação de contas dos convênios que expiraram vigência (novos do SICONV) ou que carecem da aprovação da prestação parcial para liberação de novas parcelas, afetando assim o desempenho na redução do passivos de convênios da extinta SUDENE. Fonte SIAFI
- g) Resultados anteriores:
- Dez/2011 = não existia o indicador.
- Jan a out/2012 = não foi apurado. (1º e único Ciclo 2012)
- Jan a dez/2012 = 80,4 % (1º Ciclo 2013)
- Jan a mai/2013 = 95,1 % (2º Ciclo 2013)
- Jan a ago/2013 = 92,7 % (3º Ciclo 2013)
- Jan a Nov/2013 = 87,8% (4º Ciclo 2013)
- Jan a dez/2013 = 87,8% (1º Ciclo 2014)
- Jan a mai/2014 = 87,8% (2º Ciclo 2014)
- Jan a ago/2014 = 94,4% (3º Ciclo/2014)
- Jan a nov/2014 = 97,05% (4º Ciclo/2014)

h) Representação gráfica:

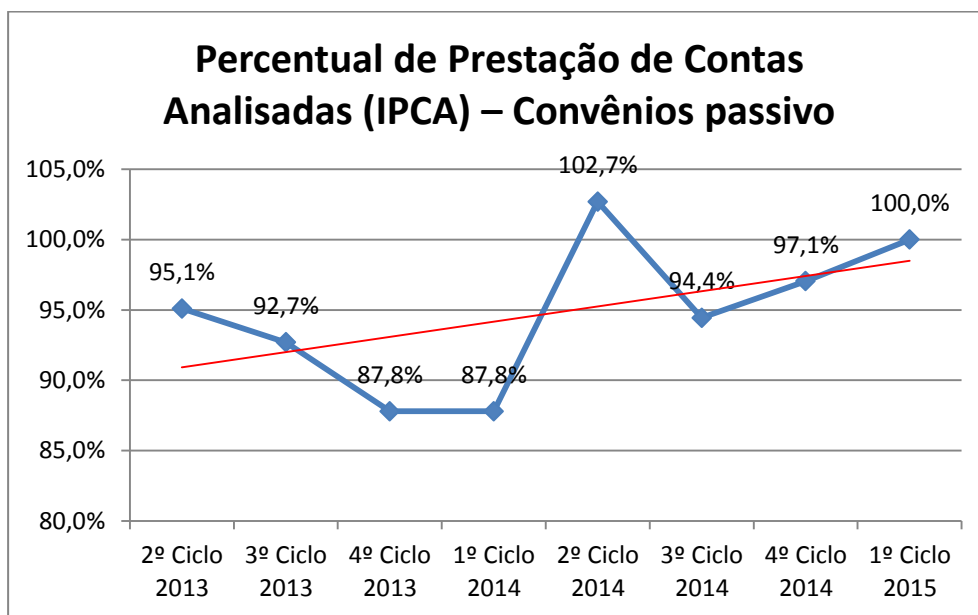

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"}}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} \times 100 = \frac{13 \times 100}{13} = 100\%$$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- d) Resultado Ideal (%): % (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: A SUDENE está adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico (CGDS), emissão de Análise Financeira (CGC) e notificação aos convenientes (CGC), entretanto tem dificuldades de pessoal. Lembramos, outrossim, as dificuldades dos convenientes na operacionalização do SICONV. O conveniente só deve encaminhar a Prestação de Contas, no SICONV, após; o encaminhamento, a análise e aprovação dos Relatórios de Execução, em cumprimento aos Manuais de operacionalização do SICONV. A tendência atual deste percentual tem sido de aumento, haja vista a celebração de novos convênios em cada exercício, ou seja, tem entrado mais convênios para análise da prestação que a capacidade de análise. Fonte: SICONV.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = 92,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 75,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 71,4% (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 57,1 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 57,1% (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 57,1% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 200% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 125%(3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 130% (4 Ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

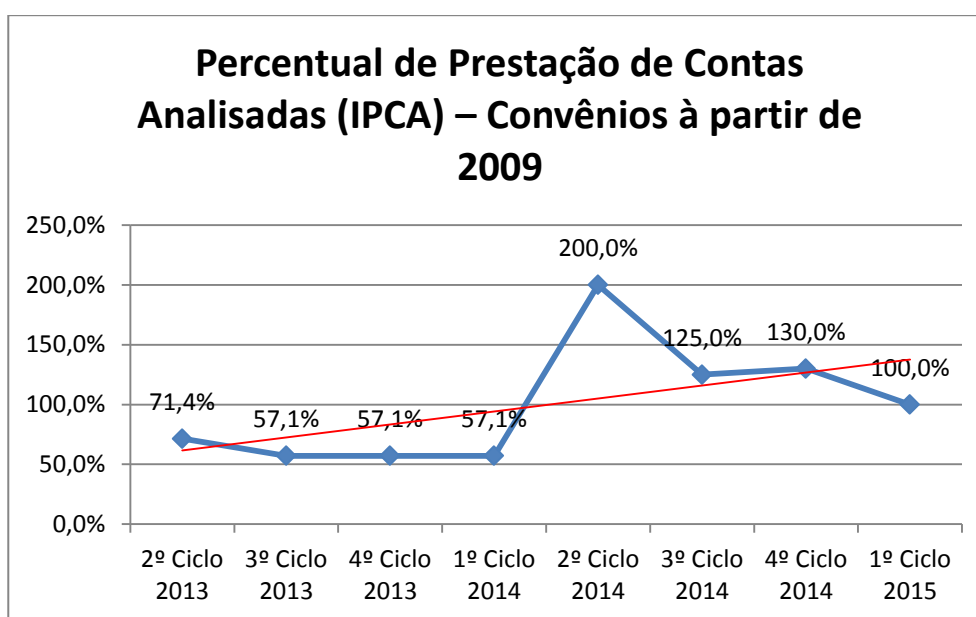

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{173 \times 100}{199} = 86,93\%$$

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-dez/2014

f) Comentários: A unidade centrou suas ações na promoção de eventos *in company*. As ações de capacitação oportunizaram o aumento significativo da participação de servidores,

com ênfase na capacitação gerencial e técnica, consolidando os objetivos previstos no Plano de Capacitação/2014. Ressalte-se que a promoção de capacitação para implementar um modelo de gestão por competências, marcou a reflexão sobre a necessidade de alinhar a capacitação às diretrizes estratégicas de desenvolvimento de pessoas e objetivos da instituição. A capacitação fomentou o estímulo ao autodesenvolvimento associado ao desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, **a meta prevista para capacitar 199 (cento e noventa e nove) servidores, foi parcialmente atingida, alcançando 173 (cento e setenta e três) servidores, representando 86,93%**. Considerando que **a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registra-se 678 (seiscentas e setenta e oito) inscrições efetivamente realizadas**.

g) Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2012 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 71,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,65 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 18,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 38,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 45,4 % (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 47% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 60% (3º ciclo 2014)

Jan a Nov/2014 = 85,43% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

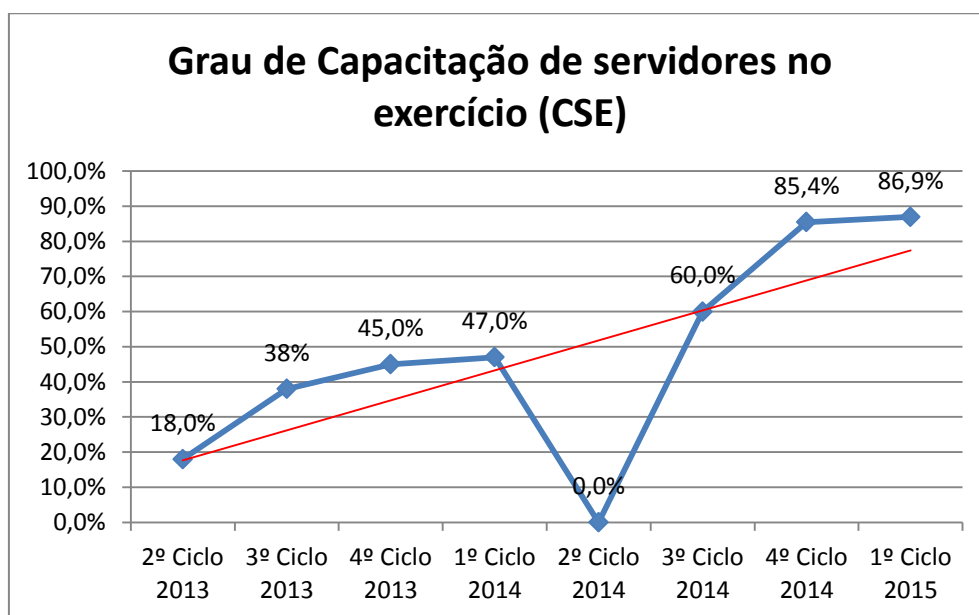

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{112 \times 100}{40} = 280\%$$

b) **Objetivo:** Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) **Responsabilidade de Aferição:** Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) **Resultado Ideal (%):** 100 % (Quanto maior melhor)

e) **Período da aferição:** jan-dez/2014

f) **Comentários:** A inclusão de novos servidores no quadro de pessoal da Sudene impulsionou a realização de eventos de capacitação, expandindo-se as capacitações na área técnica, configuradas como preparação para o exercício profissional e para o desenvolvimento das competências exigidas para execução das atribuições específicas das unidades administrativas. **Foram realizados 112 (noventa e nove) eventos de capacitação, superando a meta prevista de 40 (quarenta) eventos de capacitação. O número representa 280% de realização, ou seja, 180% a maior da previsão.** Esse dado reflete o aumento da força de trabalho na Sudene e, especificamente na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, que contribuiu significativamente para a promoção dos eventos.

g) **Resultados Anteriores:**

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan-nov/2012 = 66,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 80,0 % (1º Ciclo 2013)

Jan a mai/2013 = 17,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 60,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 157,0 % (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 174% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 90% (3º ciclo 2014)

Jan a Nov/2014 = 247,5% (4º ciclo 2014)

h) **Representação gráfica:**

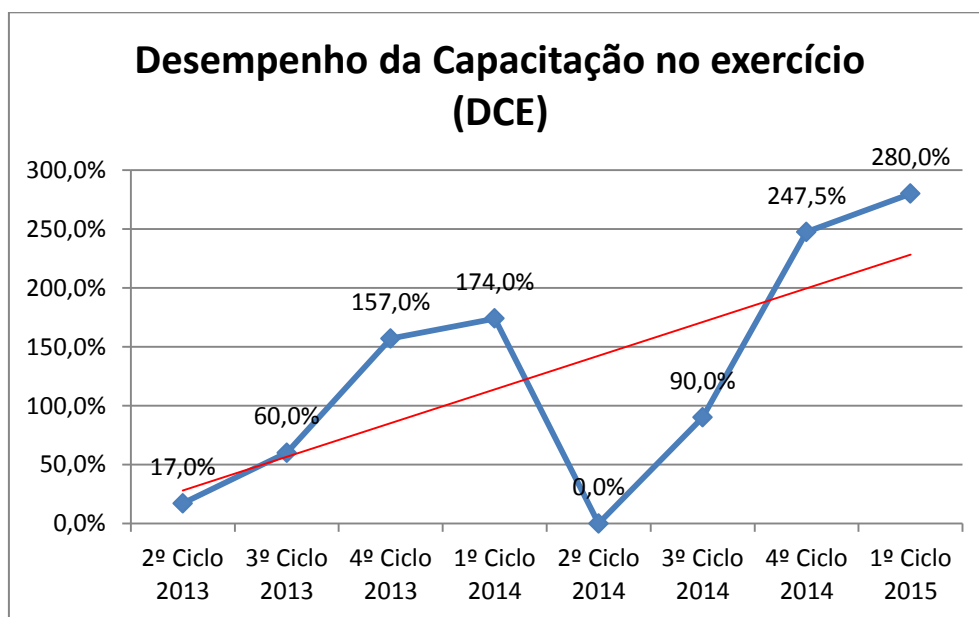


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{420.205,05 \times 100}{500.000,00} = 84,04\%$$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-dez/2014
- f) Comentários: O incremento na realização de capacitações *in company* refletiu nas metas do número de servidores atingidos, na quantidade de capacitações realizadas e no investimento. Ressalte-se que a Sudene arcou com o pagamento de capacitações, quer sejam individuais quer sejam de grupos, no valor de R\$ 226.324,44 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e vinte quatro reais e quarenta e quatro centavos). Some-se a isso os custos com passagens e diárias no montante de R\$ 193.880,61 (cento e noventa e três mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), perfazendo assim, o total de R\$ 420.205,05 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinco reais e cinco centavos), representando 84,04% do valor previsto para o investimento em capacitação. Conclui-se, portanto, que a promoção de eventos fechados, que alcança um maior número de servidores, reduz os afastamentos que implicam gastos com passagens e diárias. Embora não tenha alcançado o valor previsto para o investimento em capacitações, a experiência traduz êxito, economia e racionalidade com o dinheiro público.
- g) Resultados Anteriores (NIC):
- Dez/2011 = Não existia o indicador.
 - Jan-nov/2012 = 27,8 % (1º e único Ciclo 2012)
 - Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)
 - Jan a mai/2013 = 8,49 % (2º Ciclo 2013)
 - Jan a ago/2013 = 29,0 % (3º Ciclo 2013)
 - Jan a nov/2013 = 37% (4º ciclo 2013)
 - Jan a dez/2013 = 38,25% (1º ciclo 2014)
 - Jan a mai/2014 = -- (2º ciclo 2014)
 - Jan a ago/2014 = 24,56% (3º ciclo 2014)
 - Jan a Nov/2014 = 74,54% (4º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

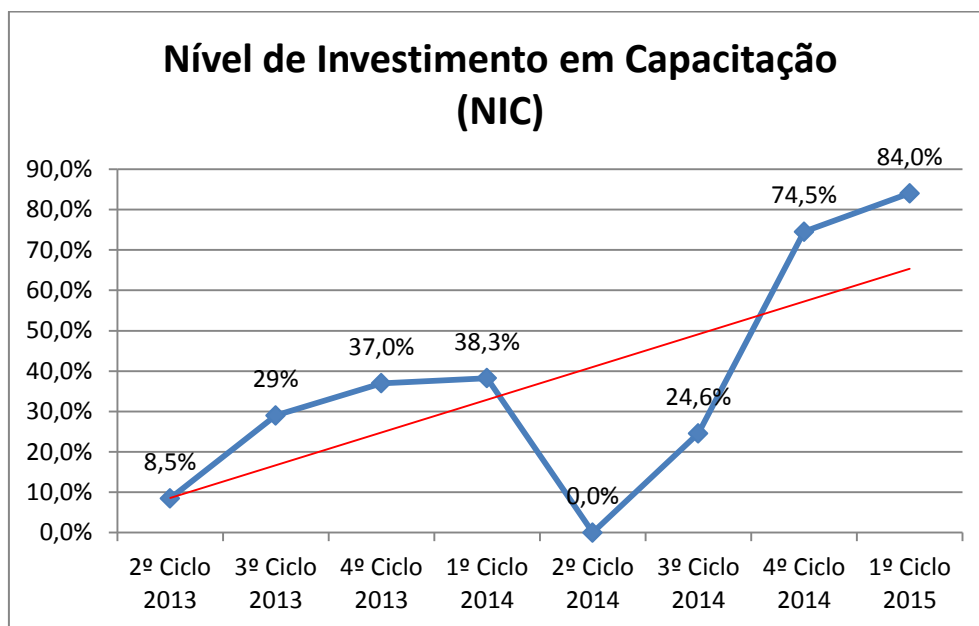

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{58\% + 18,4\% + 88\% + 25,87\%}{4} = 47,57\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 20/03/2015

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (58%); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (18,4%); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (88%); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (25,87%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento previsto desses projetos) (1º Ciclo 2013)

Até mai/2013 = 43,67% (2º Ciclo 2013)

Até ago/2013 = 61,7% (3º Ciclo 2013)

Até nov/2013 = 38,55% (4º ciclo 2013)


Jan a dez/2013 = 41,63% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 43,99% (2º ciclo 2014)

Jan a ago/2014 = 45,64% (3º ciclo 2014)

Jan a Nov/2014 = 46,8% (4º ciclo 2014)

i) Representação gráfica

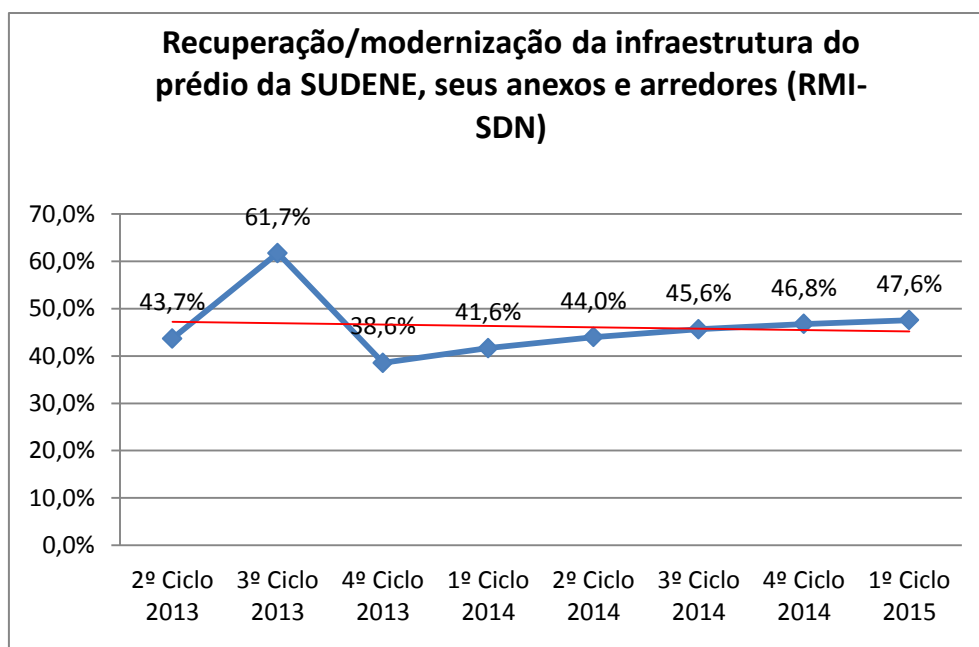

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido do respectivo Plano Operativo interno.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\sum \text{dos montantes aplicados nos Projetos}}{\sum \text{dos limites autorizados para os Projetos}} \times 100 =$

$$\frac{(2.630.114,65+30.000,00+5.550.115,55+100.000,00)}{3.185.975,65+30.000,00+8.312.145,73+148.000,00} \times 100 = 71,2 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, sistema de combate a incêndio, recuperação das fundações do prédio sede e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 20/mar/2015

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.630.114,65 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.185.975,65); f.2) sistema de combate a incêndios do Edif. Sudene e anexos (aplicado acumulado de R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 30.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edif. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 5.550.115,55 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.312.145,73); f.4) modernização das subestações elétricas do Edif. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

Mai/2013 = 60,4 % (2º ciclo 2013)

Ago/2013 = 42,6 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 73,92 % (4º ciclo 2013)

Jan a dez/2013 = 53,56% (1º ciclo 2014)

Jan a mai/2014 = 67,37% (2º Ciclo 2014)


Jan a ago/2014 = 67,37% (3º ciclo 2014)

Jan a nov/2014 = 68,2% (4º ciclo 2014)

Nota:

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

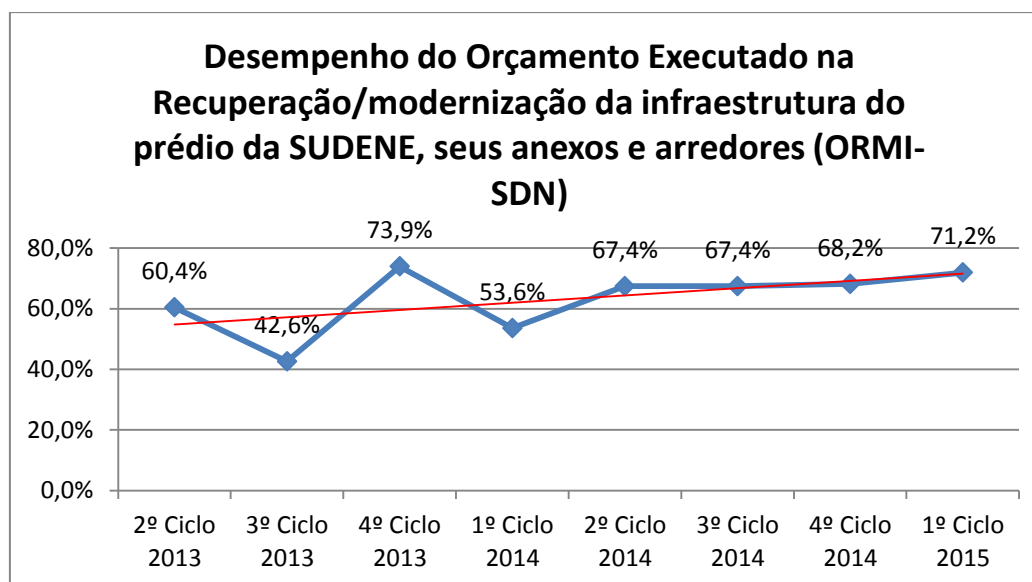

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) dos projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executado das metas e dos projetos¹ =

$$\frac{100\% + 46\% + 7\% + 8\% + 0\% + 0\% + 0\% + 0\% + 0\% + 31\% + 0\% + 36\%}{12} = 19\%$$

Metas de Desempenho Institucional
Situação calculada entre out/2014 e mar/2015

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	4572- Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada	50	100%	80	DAD/CGGP-Auto-explicável
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos aprovados	296	46%	37	DFIN/Incent Fiscais -Pleitos aprovados efetivamente pela Diretoria Colegiada
	0355- Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R\$ 1.820.000.000	7%	6	DFIN/FDNE-Cálculo computado após aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Acréscimos a projetos em execução, desde que aprovados pelo mesmo colegiado, poderão ser computados no cálculo da meta física.
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.1-Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatórios elaborados	50%	8%	6	DPLAN - (1) - Diretrizes para regionalização da política industrial. (2) - Prioridades e critérios de aplicação dos recursos de 1,5% calculados sobre o produto do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE e vinculado ao desenvolvimento científico e tecnológico. (execução de 50 % das etapas, obtido da média aritmética dos projetos).
		Plano elaborado	1	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Elaboração de plano de fomento à capacitação de gestão de projetos de desenvolvimento sub-regional.
		Eventos realizados	2	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS - Organização de eventos de difusão de conhecimentos sobre as potencialidades da região (Fórum SUDENE de energia e Seminário SUDENE APLs no semiárido)
		Projeto apoiado	2	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS - Apoio à implementação de projetos para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, com prioridade para o semiárido

Continua

		Oficina realizada	1	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Promoção de evento de articulação de parceiros do desenvolvimento local com atuação na região com vistas ao diagnóstico e identificação de demandas de fortalecimento institucional.
		Fórum realizado	2	Informação em processo de elaboração.	0	DPLAN/CGDS-Organização de fóruns do meio ambiente com objetivo de troca de experiência de programas e projetos voltados a conservação, preservação e recuperação do meio ambiente e uso sustentável.
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	5	31%	24	DAD/CGGP-(1) Projeto de gestão por competências; (2) Projeto de Desenvolvimento de lideranças; (3) Projeto "Investindo nos Sonhos". CGGI - (1) Realinhamento estratégico; (2) Mapeamento de processos
		Projeto elaborado	1	Informação em processo de elaboração.	0	DAD/CGAF-Projeto do Sistema de monitoramento de despesas administrativas em programa de gerenciamento de custos.
		Sistema disponibilizado	2	36%	29	DAD/CGTI-(1) Sistema de Fundos (módulo de projeto) e (2) sistema de Incentivos Fiscais (módulo de acesso público).
MÉDIA ARITMÉTICA				19%	15,20	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Observações:

* Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.

Notas:

a) Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada.

b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional.

c) O presente cálculo refere-se ao 6º Ciclo de avaliação GDPGE e 3º Ciclo de avaliação GDACE, cuja contagem começou em 01 de outubro de 2014 e irá até 30 de setembro de 2015 conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.

b) Representação gráfica:

Não foi possível a construção gráfica por que a apuração conta com apenas um ponto, cujo resultado revela que entre out/2014 e 13/mar/2015 foram alcançados 19%, ou 15,2 pontos de um limite que vai até 80 pontos. Outrossim, esta é uma apuração especial, cujo período completo começou em out/2014 e vai até set/2015 conforme estabelecido pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 07/04/2015

As deliberações ou encaminhamentos foram postas na ordem de seu surgimento na reunião do dia 07/abr/15, daí o sequenciamento das declarações vinculadas a POs.

- O Diretor de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Henrique Tinoco, lembrou mais uma vez, à Coordenação Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN) e à Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), diante de preocupação explicitada face aos atrasos decorrentes de licitações conduzidas pelos convenientes,

gerando apreciável retardo na execução de projetos, particularmente na CGDS, que adote como sugestão, que os prazos previstos nos Planos Operativos sejam gerenciais e que a unidade os considere como factíveis, e quando a alteração for necessária, explicar em nota de observação que os prazos estão diferentes do cronograma em função do entendimento da unidade sobre os prazos previstos não serem factíveis. Acrescentou ainda, que o processo de monitoramento é de gestão, e sendo assim, todos os projetos aprovados pela Diretoria Colegiada devem ser monitorados.

- O Coordenador-Geral da Gestão Institucional, Manoel Barreiros, citou a baixa qualidade da gestão dos convênios por parte dos convenientes, pois problemas nas licitações continuam a surgir no processo de execução e ainda surpreendem a área técnica interna. Sobre a adoção de prazos gerenciais recomendou que eles sejam antes submetidos à apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada.

- O Diretor Henrique sugeriu que as unidades finalísticas promovam capacitação dos convenientes como forma de superar “gargalos” na execução ou na formulação das propostas. Sugeriu às mesmas unidades que pensem um dispositivo jurídico que exija que estados e municípios institucionalizem instâncias responsáveis por avenças, para que estas concentrem os controles sobre convênios.

- O Superintendente José Márcio lembrou que alguns estados e a grande parte dos municípios do Nordeste não possuem qualificação mínima para esse tipo de institucionalização desejada. Outro problema que destacou foi o erro praticado por muitos municípios, de adquirirem pacotes de capacitação que na maioria das vezes em nada contribuem para uma organização mais aprimorada de seus controles, e sugeriu às unidades finalísticas que preparem um conjunto de critérios a serem apresentados às prefeituras, que possam ser por elas adotados para facilitar a contratação de serviços com essa finalidade.

- O Coordenador de Gestão de convênios, Heber Nunes, esclareceu que os problemas relacionados aos convenientes são percebidos no decorrer da execução do convênio. Os poucos projetos que passam na pré-análise quase sempre apresentam problemas posteriormente e necessitam de aditivo.

- O Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Frederico Cavalcanti, Comentou que o processos licitatório está demorando muito tempo a ser realizado pelo conveniente. E sugeriu adotar alguma forma de “punir” o conveniente, caso ocorra aditamento do cronograma, com a finalidade de evitar maiores demoras na execução.

- A Servidora, Macira Sotero, sugeriu que fosse feita uma visita ao conveniente com uma pauta bem elaborada, a partir da experiência dos servidores da SUDENE, com a finalidade de pontuar alguns possíveis problemas dentro do projeto.

- Por fim, Vera Lúcia, sugeriu um cadastro de convenientes com potencial de execução, para evitar os riscos de insucesso.

- O Coordenador Geral de Logística, Administração, Finanças (DAD/CGAF), Hildo Júnior, renovou o pedido a exclusão do projeto “Combate a Incêndio” tendo em vista a sua inexequibilidade em 2015.

9 – Conclusão

Compulsando os relatórios sobre os resultados dos primeiros ciclos de 2013 e de 2014, observa-se uma frequência de projetos na situação de “em andamento” maior no último ano. Isso se deve em parte a uma preocupação maior das unidades em aprimorar o seu controle face ao constrangimento que situações de “atraso”, mesmo provocadas pelos agentes executores, provocam no corpo gerencial, mas também, pela melhoria do processo de acompanhamento, consequência, em parte, do aumento do quadro após a admissão dos novos servidores.

Também se observa um aumento na quantidade de projetos em execução. No final de 2012 (1º ciclo de 2013) eram 46 projetos. No final de 2013 (1º ciclo 2014), a SUDENE estava executando 58 projetos. No final de 2014 (1º ciclo 2015), eram 66 projetos.

Entre recursos de “Restos a Pagar” de exercícios anteriores e do exercício orçamentário vigente, tinha-se liberado até o final de 2012 (1º ciclo 2013), em números acumulados, incluindo o FDNE, cerca de R\$ 1,68 bilhão. Até o final de 2013 (1º ciclo 2014), esse total era de cerca de R\$ 3,03 bilhões acumulando anos anteriores. E até o final de 2014 (1º ciclo 2015), era de R\$ 5,48 bilhões. Uma análise considerando o desempenho de cada ano revela que em 2013 foram liberados R\$ 1,35 bilhão e em 2014, R\$ 2,45 bilhões. Esses resultados estão concentrados em atividades finalísticas e estratégicas com a missão da SUDENE, como as diretrizes 1- Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos.

Os recursos aplicados nas demais diretrizes estão vinculados a atividades meio e não são representativos o suficiente para alterar o resultado acima descrito. As aplicações estão, portanto, alinhadas com o planejamento estratégico e a missão institucional.

Quanto aos efeitos do processo sobre o operacional, nota-se uma consciência de sua importância como instrumento de gestão. As resistências à sua adoção ainda não desapareceram por completo e ainda há a equivocada percepção de que se trata de um instrumento que expõe a unidade negativamente quando os atrasos de alguma etapa precisam ser tornados públicos. Certa vez alguém chegou a propor a não aplicação do monitoramento a convênios devido às dificuldades que os convenientes atravessavam e isso expunha a unidade e o responsável pelo projeto. O que na prática se constituiria em não monitorar a execução orçamentária finalística, já que praticamente 99% da execução orçamentária finalística se dá via convênio.

Um outro aspecto a se considerar é a necessidade de se promover a melhoria de alguns indicadores para convênios e gestão de pessoas. As unidades já haviam sido contactadas no final de 2013 e novamente no início de 2014, mas os avanços foram insignificantes. Pretende-se, este ano a substituição de alguns para um melhor acompanhamento do desempenho delas.

Quanto á agenda os próximos eventos de 2015, são os seguintes:

**Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos
de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2015**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
2º	29/05/15	05/06/15	18/06/15
3º	28/08/15	04/09/15	25/09/15
4º	27/11/15	04/12/15	17/12/15

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 01 (ex PO 02)
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.				
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 234.105,49	R\$ 246.426,82

Previsão de Conclusão:	16/06/2015	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012) Vigência: 18/12/12 a 16/06/2015
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15
R\$ 139.865,15	R\$ 7.361,32	mai/12	R\$ 147.226,47	A realizar no exercício (2014) RAP 2012	R\$ 94.240,34
R\$ 94.240,34	R\$ 4.960,01	jun/12	R\$ 99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 234.105,49	R\$ 12.321,33	-	R\$ 246.426,82	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 94.240,34
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							50,0%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	6/2/2015		1/12/2013			50%	Em Andamento	
9.1	Etapas I: Proposta metodológica e mobilização social (R\$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/1/2014		1/12/2013	14/3/2014		100%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100%	Concluído	
9.3	Etapas II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	30/9/2014		14/3/2014	5/3/2015		100%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro. Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.

9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		04/03/2015	5/3/2015		100%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	a definir	a definir	R\$ 94.240,34				0%	A Iniciar	Data será repactuada a partir de nova agenda devido ao aditamento da vigência do convênio.	
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	17/06/2015	17/09/2015					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 234.105,49	Valor realizado:		R\$ 139.865,15	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM												
Observações:												
4º Ciclo - 2014. Alterações realizadas na etapa 9.1, 9.3. e 9.4												
Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião tecnica de acompanhamento entre os tecnicos da CGDS e os tecnicos do CONDEP/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. O conveniente enviará produto final da Etapa II para que a equipe técnica manifeste seu parecer.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto:	PO 02 (ex PO 03)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.			
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 530.482,50	R\$ 589.425,00

Previsão de Conclusão:	31/08/2015	CONVENIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
R\$ 265.241,25	R\$ 58.942,50	DEZ/2012	R\$ 324.183,75	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ 265.241,25
R\$ 265.241,25	--	MAIO/2013	R\$ 265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 530.482,50	R\$ 58.942,50	-	R\$ 589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Ferreira da Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								31,8%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100%	Concluído		
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado		--	65%	Em Andamento	A Conveniente informou que já foram iniciadas as providências para a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops previstos na Etapa 2 de Meta 1, com a elaboração de um Termo de Referência e o encaminhamento para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) para os procedimentos licitatório desses eventos.	

7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir	--	08/12/2014	--	--	27%	Em Andamento		
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir	--	08/12/2014	--	--	36%	Em Andamento	Foi iniciada, em 08/12/2014, a execução dos Encontros, tendo sido realizados neste período 22 eventos dos 61 previstos.	
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	A definir	A definir	R\$ 265.241,25				0%	A Iniciar		Foi solicitado pela Conveniente, sendo objeto de análise e aprovação da área técnica, uma prorrogação do período de vigência do Convênio, tendo sido ampliado até 31/08/2015. Salienta-se que a Conveniente ainda não procedeu os ajustes necessários para a atualização do Plano de Trabalho. Apesar de as datas que constam neste Plano Operativo indicarem atraso na execução, a concessão da dilatação do prazo de vigência permite à Conveniente uma repactuação na qual as Metas/Etapas na data da atualização encontrem-se com o status "em andamento" ou "a iniciar".
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir		Não informado			20%	Em Andamento		
8.1	META 2/ETAPA1 – Realizar a identificação/caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00).	SEMAS/PE	A definir	A definir		Não informado			40%	Em Andamento		
8.2	META2/ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/11/2015	27/02/2016					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
Valor Previsto:			R\$ 530.482,50		Valor realizado:			R\$ 265.241,25		51,8%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

1º ciclo 2015

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 03 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.			
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.			
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desemboço				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100/250	GND 3 e 4	30	R\$ 694.459,19	R\$ 771.621,32	R\$ 419.104,63	R\$ 77.162,13	dez/12	R\$ 496.266,76	Pago até o ano anterior	R\$ 556.781,91
						R\$ 137.677,28	--	jan/13	R\$ 137.677,28	A realizar no exercício (2015)	R\$ -
						R\$ 137.677,28	--	abr/13	R\$ 137.677,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
						R\$ 694.459,19	R\$ 77.162,13	-	R\$ 771.621,32	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ 137.677,28
										Saldo a liberar (2015)	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 694.459,19

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Marcelo de Castro Viana, Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não Informado	10/05/2012		Não Informado	10/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
8	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100%	Concluído		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	Não Informado	R\$ 419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	R\$ 419.104,63	100%	Concluído		
9	Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013	15/09/2014		100%	Concluído		
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014			100%	Concluído		

	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	Não Informado		28/01/2014	06/02/2014		100%	Concluído	(*)	
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	R\$ 137.677,28	09/04/2104	19/05/2014	R\$ 137.677,28	100%	Concluído		
11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014			07/08/2014	22/08/2014		100%	Concluído	(**)	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	R\$ 137.677,28	16/01/2015	25/02/2015	R\$ 137.677,28	100%	Concluído		
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa desoperculadora de favos e Tanque decantador para mel (R\$ 204.702,72)	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	18/08/2014	02/01/2015					0%	Atrasado	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
			Valor Previsto:		R\$ 694.459,19	Valor realizado:		R\$ 694.459,19	80,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:

Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014

(*) A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto

(**) A viagem de supervisão foi realizada no período de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 05)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.			
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 100	3330.41	30	R\$ 1.794.595,93	R\$ 2.000.000,00

Previsão de Conclusão:	28/05/2014	CONVÊNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 1.794.595,93
R\$ 732.887,59	R\$ 79.238,97	nov/12	R\$ 812.126,56	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
R\$ 527.102,12	R\$ 67.204,78	nov/13	R\$ 594.306,90	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 534.606,22	R\$ 58.960,32	dez/13	R\$ 593.566,54	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.794.595,93	R\$ 205.404,07	-	R\$ 2.000.000,00	Valor liberado no Exercício (2013)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.794.595,93

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel de Sá Jardim Neto - SUDENE / Gustavo Nogueira e Luiz Carlos Soares - SEPLAG-PB
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	14/12/2012	18/12/2012		14/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	02/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído	O convênio foi prorrogado "de ofício" após a data de referência do PO para 28/05/14.	
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	01/11/2012	30/11/2012	R\$ 732.887,59	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/2013	25/07/2013		100%	Concluído	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob nº 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais de grande circulação e diários oficiais. Contrato com a empresa vencedora assinado em 25/07/13, mas só registrado no SICONV após formalização do 2º Termo Aditivo.	
9	Meta I: Estruturação do Plano Estratégico da Micrologística do Transporte de Cargas do Estado da Paraíba (R\$ 274.617,39)	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
9.1	Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	01/08/2013	27/09/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.2	Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte de cargas do estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	11/10/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
9.3	Priorização dos Projetos Estratégicos Micrologísticos para o estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	12/11/2013		100%	Concluído		

9.4	Relatório Intermediário do Plano de Micrologística do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	08/11/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2013	30/11/2013	R\$ 527.102,12	25/11/2013	02/12/2013	R\$ 527.102,12	100%	Concluído		
9.5	Relatório Final do Plano de Micrologística do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
10	Meta II: Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Estado da Paraíba (R\$ 463.979,98)	SEPLAG/PB	30/08/2013	28/01/2014		30/08/2013	11/02/2014		100%	Concluído		
10.1	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas	SEPLAG/PB	30/08/2013	18/10/2013		30/08/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
10.2	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	13/09/2013	08/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
10.3	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	01/11/2013	22/11/2013		01/11/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
10.4	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	22/11/2013	06/12/2013		22/11/2013	11/02/2014		100%	Concluído		
10.5	Relatório Intermediário do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	22/11/2013		01/08/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
10.6	Relatório Final do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	11/02/2014		100%	Concluído		
11	Meta III: Plano Estratégico de Energia do Estado da Paraíba (R\$ 298.553,40)	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
11.1	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia da Paraíba	SEPLAG/PB	13/09/2013	25/10/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
11.2	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	11/10/2013	08/11/2013		11/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
11.3	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos em energia na Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	22/11/2013		25/10/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
11.4	Realização de 2ª visita técnica de acompanhamento	CGDS/SEPLAG	12/12/2013	12/12/2013		12/12/2013	12/12/2013		100%	Concluído		
11.5	Relatório Intermediário de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	22/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluído		
	Liberação da 3ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2013	31/12/2013	R\$ 534.606,22	19/12/2013	30/12/2013	R\$ 534.606,22	100%	Concluído		
11.6	Relatório Final de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12	Meta IV: Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação (R\$ 380.603,91)	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
12.1	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e estimar oferta de serviços.	SEPLAG/PB	27/09/2013	18/10/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.2	Identificar prioridades e demandas do plano de desenvolvimento industrial e logístico e mapear necessidades futuras de TIC.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.3	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e oferta planejada.	SEPLAG/PB	11/10/2013	15/11/2013		11/10/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.4	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI.	SEPLAG/PB	08/11/2013	22/11/2013		08/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.5	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à demanda por serviços.	SEPLAG/PB	15/11/2013	29/11/2013		15/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.6	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	22/11/2013	20/12/2013		22/11/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.7	Relatório Intermediário do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	20/12/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluído		
12.8	Relatório Final do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13	Meta V: Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba(R\$ 376.841,25)	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído		
13.1	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de capacitação profissional, visando o crescimento e investimentos do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.2	Projetara atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.3	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra visando o crescimento do estado.	SEPLAG/PB	29/11/2013	13/12/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.4	Dimensionar investimentos necessários para formação profissional.	SEPLAG/PB	13/12/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.5	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	20/12/2013	28/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.6	Relatório Intermediário do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.7	Relatório Final do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído		

14	Relatório Final consolidado do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/04/2014		01/08/2013	18/02/2014		100%	Concluído		
15	Finalização do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	18/02/2014	28/05/2014		18/02/2014	28/05/2014		100%	Concluído	A SEPLAG formalizará solicitação de utilização dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicação a serem aplicados em atividades de desdobramento do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								17,0%	Atrasado		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	01/08/2014	01/10/2014		11/08/2014			85%	Atrasado	Relatórios de execução (técnico) aprovados, à emitir o laudo técnico. *Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	*O número de relatórios a serem analisados demandam um maior tempo para emissão do Laudo Técnico Final;
			Valor Previsto:		R\$ 1.794.595,93	Valor realizado:		R\$ 1.794.595,93	97,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)												
Observações:												
2º Termo Aditivo foi solicitado pelo conveniente por meio do SICONV em 12/08/13, sendo publicado em 01/11/13.												
Em 18/02/2014 a equipe técnica participou de um Seminário em João Pessoa/PB com o Governador do Estado, Secretário de Planejamento e Gestão, Gestores e Técnicos do Governo do Estado, Universidades Federal e Estadual, Parlamentares etc, onde foram apresentados o Plano Estratégico da Paraíba, relativo aos resultados do Projeto "Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba – uma visão estratégica para o Estado.												
1º Ciclo 2015 - Repactuada a etapa 16												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 825.379,68

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 280.000,00
R\$ 280.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 288.400,00	A realizar no exercício	R\$ 520.000,00
R\$ 260.000,00	R\$ 8.400,00		R\$ 268.400,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 260.000,00	R\$ 8.579,68		R\$ 268.400,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 800.000,00	R\$ 25.379,68		R\$ 825.379,68	Valor liberado no Exercício	R\$ 520.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 800.000,00

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE (28/08/2014) - Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2012	13/06/2012		13/06/2012	13/06/2012		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/06/2012	16/06/2012		15/06/2012	16/06/2012		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	20/06/2012	21/06/2012		20/06/2012	21/06/2012		100%	Concluído		
4	Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	21/06/2012	28/06/2012		22/06/2012	28/06/2012		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	28/06/2012	23/08/2012		29/06/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	24/08/2012	24/08/2012		24/08/2012	24/08/2012		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2012	01/09/2012	R\$ 280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	R\$ 280.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 1ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi providenciada a Prorrogação de ofício pela SUDENE, por mais 36 dias, alterando a data de conclusão para 31/03/2014
9	Meta 1	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013		100%	Concluído	Houve atraso devido recurso judicial contra procedimento licitatório	O tribunal proferiu sentença favorável ao município. O processo licitatório foi concluído e homologado o licitante vencedor.
9.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.2	Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apilado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
9.3	Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das fundações.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/08/2013	30/09/2013		100%	Concluído		
9.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/06/2013	03/07/2013		27/03/2013	30/03/2013		100%	Concluído		
10	Meta 2	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	28/02/2014		01/09/2013	30/09/2014		100%	Concluído		

10.1	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2013	30/09/2013	R\$ 260.000,00	14/11/2013	14/11/2013	R\$ 260.000,00	100%	Concluído	Houve atraso na liberação da 2ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Solicitada prorrogação de ofício, por mais 73 dias, alterando a data de conclusão para 12/06/2014
10.2	Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	01/08/2013		01/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído		
10.3	Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09/12/2013	30/09/2014		01/12/2013	30/09/2014		100%	Concluído		
10.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/09/2013	02/10/2013		05/12/2013	08/12/2013		100%	concluído		
10.5	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	27/12/2013	27/12/2013	R\$ 260.000,00	06/04/2014	06/04/2014	R\$ 260.000,00	100%	concluído	Houve atraso na liberação da 3ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo covenente, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014
10.6	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/02/2014	17/02/2014		10/04/2014	17/04/2014		100%	Concluído		
11	Meta 3		01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
11.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	10/01/2015	10/04/2015	--	--	--	--	0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 800.000,00	Valor realizado:		R\$ 800.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00. Convênio nº 770860/2012 - Proposta nº 24955/12

Informações referentes à data de 19/04/2013:

(2) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Este atraso inicial repercutiu em todo o processo, gerando retardo nas demais etapas.

(3) Foi concluído o processo licitatório e homologada a empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está instalada no canteiro de obras para iniciar os serviços preliminares de construção da ponte. Estas informações estão atualizadas até 31/05/2013.

Informações referentes à data de 29/11/2013:

(4) 4º ciclo 2013: alterações na etapa 1 da meta 2

(5) 1º ciclo 2014: Falta liberar a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, prevista para fevereiro/2014. Foi concluído a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituindo-se de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4

(6) 2º ciclo 2014: foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, em 06/04/2014.

(7) 3º ciclo 2014: Foi realizada uma vistoria de fiscalização em 10.04.2014; Foi concretada a laje de piso da ponte em concreto armado com concreto fck = 45 Mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural. Foi alocado no SICONV o termo aditivo de 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014.

(8) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em três parcelas, como segue: 1ª parcela: Out/2012 - 2ª parcela: Set/2013 - 3ª parcela: Abr/2014

(9) Em 28/08/2014, o EngºCivil Givanildo Ramos de Souza foi incorporado ao processo como responsável técnico auxiliar.

(10) Em 11/12/2014, o conveniente solicitou prorrogação de ofício está prevista uma visita técnica para recebimento da obra e emissão de laudo técnico.

(11) Em 01/10/2014 foi aprovado termo aditivo de 90 dias, alterando a data de término do convênio para 10/01/2015.

(12) Ressalta-se que o conveniente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final, e a SUDENE terá 30 dias para analisar.

1º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.				
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas				
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	R\$ 9.452.840,00	R\$ 9.452.840,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE
--	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2013)	R\$ 352.840,00
A realizar no exercício	R\$ 1.352.840,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício 2014	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.352.840,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício (2013)	R\$ 352.840,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/04/2015	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético. Aguardando agendamento de uma reunião com a EPE para dar prosseguimento.
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/04/2015		19/06/2013			90%	Em Andamento	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	Redefinindo orçamento para 2015/2016. ACT assinado pela SUDENE, UFPE e aguardando assinatura do MI

8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnias para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014		70%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Industrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
Valor Previsto:			R\$ 4.452.840,00		Valor realizado:		R\$ 352.840,00	90,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs.	1º Ciclo 2015 - Repactuadas as Atividades/Etapas 6, 7										
	Os recursos previstos nas Etapas 5, 6 e 7, são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.										

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014 (2ª Etapa)
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .				
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada				
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	28/05/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Edson Fernando Laranjeiras, Givanildo Ramos, Macira Sotero e Vinícius Medeiros (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Paulo Ditarso (IFPB).

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	R\$ 714.000,40	A realizar no exercício (2014)	R\$ 1.183.120,40
IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	R\$ 469.120,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
			R\$ 1.183.120,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.183.120,40

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014	22/05/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								45,3%	Em Andamento		
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído		
8	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	Abril/Julho e Set/Nov/2014		27/05/2014			76%	Em Andamento	Capacitadas 240 alunas ds 640 previstas.	
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013		100%	Concluído		
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013		100%	Concluído		
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014		100%	Concluído		
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013	31/10/2013		100%	Concluído		
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013		março/2015	março/2015		100%	Concluído		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013			50%	Atrasado	A empresa licitada não entregou com todas as especificações constantes do documento de licitação o que ensejou a necessidade de correções, que estão sendo efetuadas.	
8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico;Curso de Pintura de Obras; CursoAuxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	Abril/Julho e Set/Nov/2014		01/04/2014			50%	Atrasado	Novas turmas a serem iniciadas em Março/2015 em 04 campus: João Pessoa, Monteiro. Cajazeiras e Pedra de Fogo.	
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	30/01/2015		04/08/2014			10%	Atrasado	Em negociação com os sindicatos da construção civil e SINE.	

9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/14	28/05/15		24/11/14			50%	Em Andamento	Acompanhamento técnico do projeto ao campi de Cabedelo e reunião no IFPB com os Gestores - relatório de acompanhamento no processo.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	22/06/2015	22/08/2015					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 1.183.120,40	Valor realizado:		R\$ 1.183.120,40	65,3%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
IFPB												
Observações:												
O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível conclui-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.												
Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.												
A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.												

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 08 (Ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2014	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	13/03/2015	Vigência: 31/12/13 a 30/12/14

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Tiago Cançado Diniz - IDENE
--	---

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	R\$ 41.671,00	R\$ 281.295,52	A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 485.874,65
R\$ 230.151,48		R\$ 41.760,00	R\$ 230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ 255.723,17
				Saldo a liberar (2014)	R\$ 230.151,48
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 255.723,17

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		29,7%	Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			48%	Atrasado	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14			80%	Atrasado	Segundo conveniente, empresa entregaria o produto 2 no final de novembro.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48				0%	Atrasado	Pagamento será realizado após 2ª visita técnica de acompanhamento. Cronograma de desembolso será repactuado.	
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014					0%	Atrasado		
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014					0%	Atrasado		

8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	30/12/2014					0%	Atrasado		
9	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	30/12/2014					0%	Atrasado		
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir					0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20 %)								0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE							0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 485.874,65	Valor realizado:		R\$ 255.723,17	49,7%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE												
Observações:												
1º Ciclo 2015 – Atualização da etapa 8.3. Em razão da mudança de governo do estado e consequentemente na direção da SEDINOR/IDENE, foi provocado um atraso. Deste modo, foi solicitada a prorrogação de vigência de 30/03/2015 pra 30/07/2015, no sentido de não prejudicar a execução do projeto. Aguardando posicionamento jurídico.												

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.	
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.	
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.				
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	R\$ 207.542,62	R\$ 218.465,90

Previsão de Conclusão:	01/11/2015	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 107.354,71	R\$ 5.650,24	FEV/2014	R\$ 113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 207.542,62
R\$ 100.187,91	R\$ 5.273,04	JUN/2014	R\$ 105.460,95	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 207.542,62	R\$ 10.923,28	-	R\$ 218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ 107.354,71
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Ferreira da Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013	100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013	100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013	100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013	100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							10,3%	Em Andamento		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de 27/10/2014)		R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71 100%	Concluído		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	01/09/2014	A definir		01/09/2014	--	-- 20%	Em Andamento	*Superada a dificuldade relacionada ao modelo de TR inicialmente utilizado (em lotes/3), sem resposta, o andamento do processo licitatório foi novamente adiado, para adoção de medidas relativas ao aditamento do Convênio (1º TA), em razão da proximidade do término da vigência, em 15/03/2015, com vistas a manutenção do Convênio e recomposição do prazo que permita a execução do objeto pactuado.	Adotadas as medidas necessárias com vistas ao 1º TA, que prorrogou a vigência do Convênio até 1/11/2015, prazo atual: 1/03/2015 a 1/11/2015. *Com a recomposição do prazo de vigência, segue-se a consequente providência de Ajustes no Plano de Trabalho: cronograma físico e de desembolso, atualizando as datas previstas.
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	-- 0%	A Iniciar		
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	-- 0%	A Iniciar		
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	-- 0%	A Iniciar		

10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0%	A Iniciar		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	A definir	A definir	R\$ 100.187,91	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir		--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 207.542,62	Valor realizado:		R\$ 107.354,71	30,3%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)												
Observações:												
1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.												
4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida ,em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral para início das atividades.												
item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.												

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar			Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.				
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 359.682,64	R\$ 378.613,30

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 221.267,56	R\$ 11.645,66	jun/14	R\$ 232.913,22	A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 359.682,64
R\$ 138.415,08	R\$ 7.285,00	dez/14	R\$ 145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 359.682,64	R\$ 18.930,66		R\$ 378.613,30	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 221.267,56
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	13/03/2015

CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)

Vigência: 31/12/2015

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%			
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/1013	04/06/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,2%			
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014			50%	Em Andamento	Realizada a licitação. Análise dos recursos ao processo pelas empresas.	
9	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	30/12/2014					11%	Atrasado		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	

9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social (R\$ 45.973,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	03/03/2014					0%	Atrasado		
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 186.939,54)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/03/2014	06/06/2014					0%	Atrasado		
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2014	30/12/2014	R\$ 138.415,08				0%	Atrasado		
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas (R\$ 67.618,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	07/06/2014	07/09/2014					0%	Atrasado		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano (R\$ 78.081,40)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	08/09/2014	03/12/2014					0%	Atrasado		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 359.682,64	Valor realizado:		R\$ 221.267,56	59,17%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

1º ciclo 2015. Repactuada as atividades 8 e 9. Foi solicitada pelo conveniente a prorrogação do prazo do convênio para 31/12/2015. Houve a formalização do termo aditivo e o prazo de vigência foi atualizado para 31/12/2015, por isto o cronograma deverá ser atualizado.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria		Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.			
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano			
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 206.151,42	R\$ 18.140,00	dez/14	R\$ 224.291,42	A realizar no exercício (2015-RAP 2014)	R\$ 343.585,70
R\$ 137.434,28	R\$ 0,00	mai/15	R\$ 137.434,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00		R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 343.585,70
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	Convênio Nº 813986/2014
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcélio de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)			20,0%							Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado	-	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado	-	Não informado	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)			0,0%							Em Andamento		
8	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0%	A Iniciar		
9	Liberação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 206.151,42	Não informado	Não informado	R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
10	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0%	A Iniciar		
11	Liberação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 137.434,28	Não informado	Não informado	R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
12	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)			0,0%							A Iniciar		
13	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 343.585,70	Valor realizado:			R\$ 0,00	20,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
Observações:	1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.			
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará			
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares , gerando renda e fixação do homem ao campo.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 771.000,00	R\$ 989.777,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 221.000,00	R\$ 57.777,00	nov/14	R\$ 278.777,00	A realizar no exercício (2015-RAP 2014)	R\$ 771.000,00
R\$ 550.000,00	R\$ 161.000,00	mar/15	R\$ 711.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 771.000,00	R\$ 218.777,00		R\$ 989.777,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 771.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Em Andamento		
8	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0,0%	A Iniciar		
9	Liberação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 221.000,00	Não informado	Não informado		0,0%	A Iniciar		
10	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0,0%	A Iniciar		
11	Liberação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 550.000,00	Não informado	Não informado		0,0%	A Iniciar		
12	Fiscalização	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
13	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Observações:
1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.		
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.		
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Atender ao desafio de moldar o perfil do agente público na concepção moderna da nova gestão pública ou gestão pública gerencial, com o desafio de incluir características que atendam a objetivos e missão institucionais, convergindo com os interesses da sociedade.				
Projeto:	CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICO-GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 10 MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO PARAIBANO				
Objetivo do projeto:	Capacitar e qualificar os servidores de 10 municípios do semiárido paraibano, visando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências nas áreas técnico-gerenciais, administrativo-organizacionais, financeiro-fiscais, elaboração de projetos e captação de recursos com vistas à melhoria da capacidade de gestão pública local.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	410.203,62	R\$ 437.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/15	Convênio N° 813604/2014 (Proposta: 052390/2014)
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção.
---	---

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 212.141,92	R\$ 13.858,08	dez/14	R\$ 226.000,00	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 410.203,62
R\$ 198.061,70	R\$ 12.938,30	jun/15	R\$ 211.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 410.203,62	R\$ 26.796,38		R\$ 437.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 410.203,62
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Programa	CGDS/SUDENE			R\$ -		06/08/2015	R\$ -	100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	30/10/2014	06/11/14	R\$ -	30/10/2014	06/11/2014	R\$ -	100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	04/11/2014	19/12/14	R\$ -	04/11/2014	19/12/2014	R\$ -	100%	Concluído		
4	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	20/12/2014	30/12/14	R\$ -	20/12/2014	31/12/2014	R\$ -	100%	Concluído		
5	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		31/12/2014	R\$ -	100%	Concluído		
6	Publicação do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		08/01/2015	R\$ -	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
7	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	R\$ 212.141,92			R\$ -	0%	Atrasado	A liberação da primeira parcela ainda não foi realizada, pois a concedente está aguardando, em tempo legalmente previsto, o atendimento das cláusulas condicionantes.	
8	Meta 1: Realizar 4 Capacitações em Gestão Financeira	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	14/05/2015	R\$ 167.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar	Todas as Datas do Plano de Trabalho serão ajustadas, mediante a retirada das cláusulas condicionantes do convênio.	
8.1	Etapa 1: Sensibilização e Mobilização/Procedimentos Licitatórios e Contratuais	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	14/03/2015	R\$ 500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
8.2	Etapa 2: Realizar 2 Cursos sobre E-social e Administração Pública	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/03/2015	14/04/2015	R\$ 69.500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
8.3	Etapa 3: Realizar 1 Curso sobre GFIP-SEFIP	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/04/2015	30/04/2015	R\$ 69.500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
8.4	Etapa 4: Realizar 1 Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira na Administração Pública	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/05/2015	14/05/2015	R\$ 69.500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
9	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0%	A Iniciar		

10	**Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 198.061,70			R\$ -	0%	A Iniciar		
11	Meta 2: Realizar 1 Capacitação em Patrimônio Público	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
11.1	Etapa 1: Realiza 1 Curso sobre Gestão do Patrimônio Público	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
12	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0%	A Iniciar		
13	Meta 3: Realizar 1 Capacitação em Gestão de Projetos	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015	R\$ 26.500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 1: 1 Curso sobre SICONV – Da Celebração à Prestação de Contas. (Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Fianaceiros).	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015	R\$ 26.500,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
14	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0%	A Iniciar		
15	Meta 4: Realizar 6 Capacitações em Compras Governamentais	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	30/11/2015	R\$ 211.000,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.1	Etapa 1: 1 Curso sobre Licitações Públicas	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	14/07/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.2	Etapa 2: 1 Curso sobre Elaboração de Edital e Termo de Referência	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/07/2015	30/07/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.3	Etapa 3: 1 Curso sobre Pregão Presencial e Eletrônico	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/08/2015	30/08/2015	R\$ 37.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.4	Etapa 4: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/09/2015	30/09/2015	R\$ 34.750,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.5	Etapa 5: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/10/2015	30/10/2015	R\$ 32.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
15.6	Etapa 6: 1 Curso sobre Contratos Administrativos (Gestão e Fiscalização)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/11/2015	30/11/2015	R\$ 37.250,00			R\$ -	0%	A Iniciar		
16	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 410.203,62	Valor realizado:		R\$ 0,00	20,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Administração

Observações:

1º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 420.540,15

Previsão de Conclusão:	23/06/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00	dez/14	R\$ 210.000,00	A realizar no exercício (2015-RAP 2014)	R\$ 400.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15	abr/15	R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 400.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014		03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014		24/02/2014	21/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014		18/03/2014	21/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014		22/08/2014	22/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	Em Andamento		
8	Liberação da 1ª parcela (SUDENE)	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00				0%	Atrasado	Realizado em 02/02/2015 o depósito da 1ª parcela da contrapartida (R\$ 10.000,00). Recursos SUDENE ainda não descentralizados.	
9	Meta 1		01/01/2015	30/03/2015	R\$ 205.027,43				0%	A Iniciar		
9.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Jardim de Piranhas	01/01/2015	15/01/2015	R\$ 935,31				0%	Atrasado		
9.2	Demolições	Município de Jardim de Piranhas	16/01/2015	31/01/2015	R\$ 18.661,72				0%	Atrasado		
9.3	Movimento de Terra	Município de Jardim de Piranhas	16/01/2015	31/01/2015	R\$ 232,37				0%	Atrasado		
9.4	Fundações	Município de Jardim de Piranhas	01/02/2015	20/02/2015	R\$ 10.937,59				0%	Atrasado		
9.5	Estrutura	Município de Jardim de Piranhas	21/02/2015	07/03/2015	R\$ 50.949,17				0%	Atrasado		
9.6	Paredes e Painéis	Município de Jardim de Piranhas	20/02/2015	15/03/2015	R\$ 22.822,52				0%	A Iniciar		
9.7	Cobertura	Município de Jardim de Piranhas	20/02/2015	15/03/2015	R\$ 36.425,31				0%	A Iniciar		
9.8	Revestimento	Município de Jardim de Piranhas	15/03/2015	20/03/2015	R\$ 45.814,51				0%	A Iniciar		

9.9	Esquadrias e Ferragens - 32%	Município de Jardim de Piranhas	10/03/2015	20/03/2015	R\$ 18.248,93				0%	A Iniciar		
9.10	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	22/03/2015	30/03/2015					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Jardim de Piranhas	31/03/2015	05/04/2015	R\$ 10.540,15				0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela (SUDENE)	COCF /CGAF / DAD	06/04/2015	20/04/2015	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
12	Meta 2		21/04/2015	23/06/2015	R\$ 215.512,72				0%	A Iniciar		
12.1	Esquadrias e Ferragens - 68%	Município de Jardim de Piranhas	16/04/2015	30/04/2015	R\$ 38.778,99				0%	A Iniciar		
12.2	Instalações Hidrosanitárias	Município de Jardim de Piranhas	28/04/2015	15/05/2015	R\$ 15.680,90				0%	A Iniciar		
12.3	Instalações elétricas	Município de Jardim de Piranhas	30/04/2015	15/05/2015	R\$ 20.630,80				0%	A Iniciar		
12.4	Instalação de Granito/Mármore	Município de Jardim de Piranhas	01/05/2015	17/05/2015	R\$ 17.608,64				0%	A Iniciar		
12.5	Instalações contra incêndio	Município de Jardim de Piranhas	17/05/2015	01/06/2015	R\$ 2.102,99				0%	A Iniciar		
12.6	Piso	Município de Jardim de Piranhas	18/05/2015	15/06/2015	R\$ 77.762,05				0%	A Iniciar		
12.7	Pintura	Município de Jardim de Piranhas	01/05/2015	20/05/2015	R\$ 40.661,95				0%	A Iniciar		
12.8	Diversos	Município de Jardim de Piranhas	13/06/2015	23/06/2015	R\$ 2.286,40				0%	A Iniciar		
12.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	24/06/2015	30/06/2015					0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGC/DAD/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 400.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014												
(2) O convenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015												
(3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.												
(4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 310.000,00

Previsão de Conclusão:	05/06/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício (2015-RAP 2014)	R\$ 300.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	
				Valor Empenhado no Exercício	
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014		04/04/2014	04/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		06/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		18/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014		26/08/2014	04/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		05/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0%	Em Andamento		
8	Liberação da 1ª parcela (SUDENE)	COCF / CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00				0%	Atrasado	Realizado em 04/02/2015 o depósito da 1ª parcela da contrapartida (R\$ 5.000,00). Recursos SUDENE ainda não descentralizados.	
9	Meta 1		01/01/2015	30/03/2015	R\$ 155.000,00				0%	A Iniciar		
9.1	Serviços preliminares - 100%	Município de Messias Targino/RN	01/01/2015	15/01/2015	R\$ 18.399,26				0%	Atrasado		
9.2	Trabalhos em terra - 100%	Município de Messias Targino/RN	16/01/2015	31/01/2015	R\$ 656,27				0%	Atrasado		
9.3	Fundações e Estruturas - 100%	Município de Messias Targino/RN	01/02/2015	20/02/2015	R\$ 30.872,07				0%	Atrasado		
9.4	Alvenaria - 100%	Município de Messias Targino/RN	21/02/2015	07/03/2015	R\$ 14.584,98				0%	Atrasado		
9.5	Cobertura - 100%	Município de Messias Targino/RN	20/02/2015	15/03/2015	R\$ 5.927,69				0%	A Iniciar		
9.6	Esquadrias - 39,49%	Município de Messias Targino/RN	05/03/2015	15/03/2015	R\$ 12.000,00				0%	A Iniciar		
9.7	Instalações Hidrosanitárias - 26,03%	Município de Messias Targino/RN	01/03/2015	18/03/2015	R\$ 4.000,00				0%	A Iniciar		
9.8	Instalações elétricas - 34,68%	Município de Messias Targino/RN	01/03/2015	15/03/2015	R\$ 4.000,00				0%	A Iniciar		

9.9	Revestimentos - 56,72%	Município de Messias Targino/RN	15/03/2015	20/03/2015	R\$ 17.059,73				0%	A Iniciar		
9.10	Piso - 37,77%	Município de Messias Targino/RN	15/03/2015	20/03/2015	R\$ 35.000,00				0%	A Iniciar		
9.11	Calçada Externa - 42,45%	Município de Messias Targino/RN	10/03/2015	20/03/2015	R\$ 12.500,00				0%	A Iniciar		
9.12	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	21/03/2015	30/03/2015					0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	31/03/2015	05/04/2015	R\$ 5.000,00				0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela (SUDENE)	COCF /CGAF / DAD	06/04/2015	15/04/2015	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
12	Meta 2		16/04/2015	05/06/2015	R\$ 155.000,00				0%	A Iniciar		
12.1	Esquadrias - 60,51%	Município de Messias Targino/RN	16/04/2015	30/04/2015	R\$ 18.390,90				0%	A Iniciar		
12.2	Instalações Hidrosanitárias - 73,97%	Município de Messias Targino/RN	28/04/2015	15/05/2015	R\$ 11.369,39				0%	A Iniciar		
12.3	Instalações elétricas - 65,32%	Município de Messias Targino/RN	30/04/2015	15/05/2015	R\$ 7.531,96				0%	A Iniciar		
12.4	Revestimentos - 43,28%	Município de Messias Targino/RN	01/05/2015	17/05/2015	R\$ 13.017,07				0%	A Iniciar		
12.5	Piso - 62,23%	Município de Messias Targino/RN	17/05/2015	01/06/2015	R\$ 57.670,96				0%	A Iniciar		
12.6	Pintura - 100%	Município de Messias Targino/RN	18/05/2015	03/06/2015	R\$ 26.706,86				0%	A Iniciar		
12.7	Calçada Externa - 57,55%	Município de Messias Targino/RN	20/05/2015	31/05/2015	R\$ 16.943,86				0%	A Iniciar		
12.8	Diversos - 100%	Município de Messias Targino/RN	01/06/2015	05/06/2015	R\$ 3.369,00				0%	A Iniciar		
12.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	06/05/2015	10/06/2015					0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGC/DAD/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Prefeitura Municipal de Messias Targino/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada na OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014												
(2) O convenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015												
(3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.												
(4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.												
1ºCiclo 2015.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Falta de mão de obra especializada para acompanhar o crescimento na área de construção civil, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .			
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014			
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(él)s técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Givanildo Ramos, Macira Sotero e Vinicius Medeiros (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Vanessa Tenório Beltrão Barbirato (coordenadora), Adrianny Cristiny De Lima Silva (técnica)

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL (R\$)	Pago até o ano anterior	R\$ -
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 1.069.868,00
371.625,00		jun/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
371.625,00		set/15	371.625,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
1.069.868,00			1.090.800,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.069.868,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Atrasado		
8	Liberação da 1ª parcela	COCF/CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00				0%	Atrasado	Em processo de liberação o depósito da contrapartida no valor de R\$ 20.932,00. Esta liberação do conveniente (SEMTABES) deveria ter ocorrido até 28/02/15.	
9	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-				0%	A Iniciar	Reunião inicial de concertação acerca das informações relativas ao projeto	

10	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-				0%	A Iniciar	O processo licitatório não foi iniciado, visto que a 1ª parcela não foi liberada, em virtude dos recursos financeiros ainda não terem sido descentralizados	Em processo de liberação
11	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-				0%	A Iniciar		
12	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00				0%	A Iniciar		
13	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	01/04/2015	31/05/2015	-				0%	A Iniciar		
14	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00				0%	A Iniciar		
15	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-				0%	A Iniciar		
16	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-				0%	A Iniciar		
17	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	15/06/2015	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
18	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2015	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
19	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	05/09/2015	-				0%	A Iniciar		
20	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2015	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
21	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2015	R\$ 371.625,00				0%	A Iniciar		
22	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2015	-				0%	A Iniciar		
23	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2015	-				0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
24	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	01/02/2016	31/05/2016	-				0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 1.069.868,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	20,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

Observações:

1º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.				
Projeto:	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.				
Objetivo do projeto:	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	DEZ/2014	R\$ 499.949,49	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 835.823,47
R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	JUN/2015	R\$ 428.743,26	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	-	R\$ 928.692,75	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 835.823,47
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Conveniente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	A Iniciar		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/12/201	31/12/2014	R\$ 458.149,49	--	--	R\$ 0,00	0%	Atrasado	A liberação da primeira parcela ainda não foi realizada, pois a concedente está aguardando, em tempo legalmente previsto, o atendimento da cláusula condicionante.	
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

8	Consolidação do Projeto	SEIRHMACT / PB	31/12/2014	31/01/2015	R\$ 41.304,00	--	--	--	0%	Atrasado	Todas as datas do Plano de Trabalho serão ajustadas, mediante a retirada da cláusula condicionantes do convênio.	
9	Elaboração de Diagnóstico	SEIRHMACT / PB	31/12/2014	30/06/2015	R\$ 458.645,49	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	31/12/2014	30/03/2015	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/01/2015	30/04/2015	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	01/02/2015	30/04/2015	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	01/04/2015	30/05/2015	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	01/05/2015	30/06/2015	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 377.673,98	--	--	R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/06/2015	31/10/2015	R\$ 294.170,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	01/06/2015	30/08/2015	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/06/2015	30/08/2015	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	01/07/20105	30/09/2015	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	31/10/2015	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	30/11/2015	R\$ 89.649,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	30/11/2015	R\$ 44.922,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	30/03/2016	28/06/2016					0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 835.823,47	Valor realizado:		R\$ 0,00	20,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

Observações:

1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO 18
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil			Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil		
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres		
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrpogênicos, causando danos e prejuízos às populações.				
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do istema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.				
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordeandores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Políia Militar e técnicos da EMATER).				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 228.797,21	R\$ 254.219,12

Previsão de Conclusão:	31/05/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsável(él)s técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
R\$ 167.999,61	R\$ 25.421,91	dez/12	R\$ 193.421,52	A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
R\$ 60.797,60	--	fev/13	R\$ 60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 228.797,21	R\$ 25.421,91	-	R\$ 254.219,12	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)									20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		100%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)									21,4%	Em Andamento	Com a reforma administrativa implantada pelo governo no Estado, as ações de Defesa Civil passaram a ser executadas pela Secretaria de Estado de Governo, em substituição à Secretaria de Infraestrutura, responsável pela execução do Projeto. Desta forma, houve a necessidade da transferência dos recursos financeiros a nova Secretaria, assim como, os projetos em andamento no Estado.	
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100%	Concluído		
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50%	Atrasado		
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100%	Concluído		
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0%	Atrasado		

12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir				0%	A Iniciar		
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60			0%	Atrasado		
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14				0%	Atrasado		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%			
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	31/10/15				0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 228.797,21	Valor realizado:		R\$ 167.999,61	41,4%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil											
Observações:											
1º ciclo 2015											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antropogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	R\$ 350.978,27	R\$ 370.465,27

Previsão de Conclusão:	28/12/2014	Convênio Nº 7703355/2012 (Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	13/03/2015	

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 350.978,27
R\$ 186.696,80	R\$ 19.487,00	dez/12	R\$ 206.183,80	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 164.281,47	--	fev/13	R\$ 164.281,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 350.978,27	R\$ 19.487,00		R\$ 370.465,27	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 350.978,27

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/Macira Régia Sotero e Marcelo de Castro Viana - CBMCE/ Aluizio Souza Freitas
---	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Em Andamento		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	R\$ 186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	R\$ 186.696,80	100%	Concluído		
9	Processo Licitatório	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		25/07/14	19.08.2014		100%	Concluído	Processo concluído.	
10	Meta 1: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			100%	Cancelado	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2012 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros devolvidos na prestação de contas.	
11	Meta 2: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
12	Meta 3: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	13/12/2013		25/07/2014			100%	Cancelado	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2012 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros a devolvidos na prestação de contas.	
13	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	13/12/2013		20/10/2014	22/10/2014		100%	Concluído		
14	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	28/12/2012	27/09/2014	R\$ 164.281,47		28/11/2014	R\$ 164.281,47	100%	Concluído		
15	Meta 4: Realização 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil	GOV/CE	25.08.2014	05/12/2014		25.08.2014	05/12/2014		100%	Concluído		

16	Meta 5: Realização um Fórum Internacional Sobre Evidência Sísmicas no Ceará.	GOV/CE	19/11/2014	22/11/2014		10/12/2014	13/12/2014		100%	Concluído		
17	Visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015		25/02/2015	26/02/2015		100,0%	Concluído	Realizado de 25 a 26/02/2015.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
Valor Previsto:					R\$ 350.978,27	Valor realizado:			R\$ 350.978,27	80,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará												
Observações:												
A prestação de contas de acordo com a Portaria 507/2011 seria até 28/02/2015 e a análise técnica e financeira até 28/05/2015, por isso ainda consta a situação 'em andamento'.												
1º Ciclo 2015												

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.			
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE			
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		R\$
	250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35	274.405,33	108.616,36	Mai/2013	383.021,69	Pago até o ano anterior	857.015,99
						582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	A realizar no exercício (RAP 2012)	-
						857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
										Valor Empenhado no Exercício	-
										Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	-
										Saldo a liberar	-
										Saldo a Empenhar no exercício	-
										Total Liberado até o exercício	857.015,99

Previsão de Conclusão:	31/10/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (90%)
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015
9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2014					0%	A Iniciar		
10	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	01/08/2015	30/10/2015					0%	A Iniciar		
11	Realização de visita técnica para parecer, se houve incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	11/2015	11/2015					0%	A Iniciar		
12	Emissão de Laudo Técnico	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	11/2015	11/2015					0%	A Iniciar		
13	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	01/12/2015	01/12/2015					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		857.015,99	Valor realizado:		857.015,99	62%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	-			Ano:	2014
Sub-objetivo:	-			Medida Institucional Normativa	
Programa do PPA:	Ação interna		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação do PPA:	Ação interna		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Inexistência de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14				
Projeto:	Metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma metodologia geral de avaliação que possa ser aplicada em planos, programas e projetos de portes pequenos ou grandes, na área de atuação da SUDENE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	17/12/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Após a Entrega pelos técnicos, foram feitas uma série de ajustes pelo Coordenador Geral Frederico Cavalcanti. Dentre as mudanças propostas e ajustes, o principal foi a mudança com relação ao Foco da Investigação do 2029, para INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, por questões de foco do governo federal, disponibilidade de dados e suas externalidades.

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
---	-----------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Leitura da metodologia enviada ao TCU	Gabriela Lins	14/10/2014	16/10/2014		14/10/2014	16/10/2014		100%	Concluído		
2	Análise crítica da metodologia enviada ao TCU para adequação à metodologia geral	Gabriela Lins	17/10/2014	28/10/2014		17/10/2014	28/10/2014		100%	Concluído		
3	Elaboração do Relatório da Metodologia de Avaliação Geral	Gabriela Lins	29/10/2014	18/11/2014		29/10/2014	18/11/2014		100%	Concluído		
4	Ajustes finais da Metodologia de Avaliação Geral	Gabriela Lins	19/11/2014	05/12/2014		19/11/2014	20/12/14		100%	Concluído		
5	Elaboração do Plano de Trabalho do projeto a ser avaliado através Metodologia de Avaliação Geral e que será entregue ao TCU em 2015	Gabriela Lins	05/12/2014	11/12/2014		21/12/2014	26/12/2014		100%	Concluído		
6	Aprovação final da Metodologia pelo gestor	Frederico/Lautemyr	12/12/2014	17/12/2014		20/02/2015	23/02/2015		100%	Concluído		
			Valor Previsto: R\$ -			Valor realizado: R\$ -			100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º ciclo 2015
A data acordada com o TCU para entrega do Relatório de Avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE é Dez-2015. Para elaborá-lo, será seguido o Plano de Trabalho a ser entregue como resultado da atividade 5 deste PO.
Plano de Trabalho para avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE será incluído como PO de monitoramento em 2015. Equipe constituída para execução do projeto: Ludmilla Calado, Jéssica Rivas, Tássia Germano, Marina Rogério, Miguel Araújo, Joyce Queiroz.
Nota: Este projeto foi considerado como medida institucional normativa por que trata-se de insumo para melhoria da ação governamental. Um conceito tomado do PPA para monitoramento de projetos dessa natureza.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:			3. Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE		Número do Projeto:		PO 22 (PO 20)	
Objetivo estratégico:			-		Ano:		2014	
Sub-objetivo:			-		Medida Institucional Normativa			
Programa do PPA:			Ação interna		Eixo temático (MI):		Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação do PPA:			Ação interna		Objetivo estratégico (MI):		Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Finalidade da ação:								
Diretoria responsável:			DPLAN		Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:			Sérgio Antonio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:		Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):			Inexistência de marcos de avaliação aplicados em planos, programas ou projetos, que sirvam como referência para replicagem.					
Projeto:			Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE					
Objetivo do projeto:			Propor parâmetros, marcos legais ou indicadores a partir da avaliação de um projeto piloto na área de atuação da SUDENE.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	19/12/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel
---	-----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Relatório de seleção do projeto a ser avaliado, com justificativas	Ludmilla Calado	26/09/2014	13/10/2014		26/09/2014	13/10/2014		100%	Concluído		
2	Adaptação da metodologia de avaliação ao projeto avaliado	Ludmilla Calado	14/10/2014	18/11/2014		14/10/2014	18/11/2014		100%	Concluído		
3	Avaliação do projeto com base na metodologia aprovada	Ludmilla Calado	19/11/2014	12/12/2014		19/11/2014	02/12/14		100%	Concluído		
4	Relatório final de avaliação contendo metodologia proposta, resultados obtidos, recomendações e próximos passos	Ludmilla Calado	15/12/2014	18/12/2014		02/12/14	10/03/15		100%	Concluído		
5	Validar relatório e entrega final	Frederico/Lautemyr	19/12/2014	19/12/2014		10/03/15			0%	Atrasado		
			Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	80,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Esta avaliação será um piloto da metodologia que está sendo desenvolvida. Não será entregue ao TCU. Equipe constituída para execução do projeto: Jéssica Rivas, Marina Rogério.
1º ciclo 2015
Nota: Este projeto foi considerado como medida institucional normativa por que trata-se de insumo para melhoria da ação governamental. Um conceito tomado do PPA para monitoramento de projetos dessa natureza.
Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.			Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.				
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal				
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	28/08/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
--	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais	Miguel Vieira	09/03/2015	09/04/2015		09/03/2015			23%	Em Andamento		
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015			30%	Em Andamento		
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015			30%	Em Andamento		
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015			30%	Em Andamento		
1.4	Relatório Produto 1	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	30/03/2015	09/04/2015					0%	A Iniciar		
2	Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais	José Luis	10/04/2015	01/06/2015					0%	A Iniciar		
2.2	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/04/2015					0%	A Iniciar		
2.3	Relatório Produto 2	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015					0%	A Iniciar		
3	Produto 3 - Potencialidades do Nordeste por Estado	Marcus Vinícius	02/06/2015	03/08/2015					0%	A Iniciar		
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	02/06/2015	21/07/2015					0%	A Iniciar		
3.2	Relatório Produto 3	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	22/07/2015	03/08/2015					0%	A Iniciar		
4	Produto 4 - Diretrizes Regionalizadas	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	04/08/2015	28/08/2015					0%	A Iniciar		
4.1	Consolidação dos Três Produtos Anteriores	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	04/08/2015	10/08/2015					0%	A Iniciar		
4.2	Apontamento das Diretrizes Para Regionalização	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	11/08/2015	17/08/2015					0%	A Iniciar		
4.3	Relatório Produto 4	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	18/08/2015	28/08/2015					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto: R\$ -			Valor realizado: R\$ -			5,6%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícius; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira.
1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE		
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em apoio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 1.277.000,00
1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 723.000,00
723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (RAP 2014)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 723.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.277.000,00

Previsão de Conclusão:	11/11/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014	Não se aplica	13/08/2014	13/08/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014	Não se aplica	12/11/2014	12/11/2014	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014	Não se aplica	17/11/2014	17/11/2014	Não se aplica	100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015	Não se aplica	27/02/2015	27/02/2015	Não se aplica	100%	Concluído	Aguardando os devidos encaminhamentos burocráticos visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	723.000,00			0,00	20%	Em Andamento	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Aguardando liberação da CGAF/COCF	
	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	25/11/2015	25/11/2015	Não se aplica				0%	A Iniciar		
8	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	03/12/2015	03/12/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
9	Apresentação da prestação de contas	UFPE (Cláudia Sampaio)	10/12/2015	10/12/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
10	Realização de visita técnica para parecer, se houver incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	17/12/2015	17/12/2015	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		2.000.000,00	Valor realizado:		1.277.000,00	52%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 25
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):			
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):			
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Insuficiência de dados, informações e/ou indicadores oferecidos pelos órgãos nacionais de estatística sobre o ambiente e a área de atuação da SUDENE, sugerindo a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a realidade do Nordeste.				
Projeto:	Diagnóstico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos e metas para o PPA. Cumprir o que determina o art. 4º, inciso VII da Lei Complementar nº 125/2007, que estabelece ser de competência da SUDENE [...], em articulação com o Ministério da Integração Nacional, assessorar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por ocasião da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas para sua área de atuação. Para tal, foi criado um Grupo de Trabalho para produzir um diagnóstico e propor objetivos para o PPA. Oferecer subsídio técnico para regionalização do PPA.				
Objetivo do projeto:					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	26/04/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
--	----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração da Metodologia	DPLAN/CGEP (Frederico e Joyce) e CGGI (Manoel Barreiros)	11/02/15	03/03/15		11/02/15	03/03/15		100%	Concluído		
2	Elaborar panorama e metas para os dois primeiros Eixos em Grupos de Trabalho e propor objetivos	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	04/03/15	24/03/15		04/03/15			80%	Em Andamento		
3	Elaborar panorama e metas para os dois Eixos seguintes em Grupos de Trabalho e propor objetivos	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	25/03/15	08/04/15					0%	A Iniciar		
4	Elaborar panorama e metas para os dois Eixos seguintes em Grupos de Trabalho e propor objetivos	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	09/04/15	17/04/15					0%	A Iniciar		
5	Elaborar Dossiê com todos os panoramas, metas e cenários que subsidiem os objetivos propostos e a síntese dos objetivos	DFIN/CGDF (Ana Paula) e DPLAN/CGEP (Joyce Queiroz)	20/04/15	26/04/15					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto: R\$ -			Valor realizado: R\$ -			36,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	Técnico responsável pelo produto: Joyce Queiroz. Integrantes CGEP do projeto: Tássia Germano, Marina Barbosa, Caique Melo (estagiário), Robson Brandão e Ludmilla Calado
	1º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.			Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Desatualização dos critérios e das prioridades adotadas na aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em P&D e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5%, calculados sobre o produto do retorno das operações financeiras concedidos pelo FDNE conforme estabelecido pela alínea "d", inciso XIII, art. 4º do Decreto nº 8276/14.				
Projeto:	Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE.				
Objetivo do projeto:	Melhor seletividade no custeio de atividades em Pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em critérios objetivos para aplicação de 1,5% oriundo do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	06/08/2015
Data Atualização:	01/04/2015

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
--	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Produto 1 - Estudos dos critérios anteriormente definidos	Albertina	05/05/2015	13/05/2015	-	22/09/2014		-	65%	Em Andamento		
1.1	Leitura do relatório resultante do Estudo VIII da Coordenação de Estudos e Pesquisas	Albertina	05/05/2015	11/05/2015	-	22/09/2014		-	30%	Em Andamento	Retomar em 05/05/2015. Depois do PPA.	
1.2	Identificação dos projetos que utilizam recursos do 1,5% (usar como apoio Estudo VIII citado acima)	Albertina	12/05/2015	13/05/2015	-	Não informado	Não informado	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Levantamento dos critérios utilizados por outras instituições executoras de fundos de C&T	Albertina	14/05/2015	27/05/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.1	Identificar instituições que executam fundos de C&T (CNPq, Finep...)	Albertina	14/05/2015	18/05/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.2	Contactar tais instituições (Faz-se necessária a coordenação de articulação)	Albertina	19/05/2015	27/05/2015	-			-	0%	A Iniciar		
2.3	Contactar o CETENE para alinhar os critérios	Albertina	19/05/2015	27/05/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3	Produto 3 - Definição dos critérios de aplicação do 1,5%	Albertina	28/05/2015	24/06/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3.1	Reunião interna para discussão do que foi levantado e definição dos critérios	Albertina	28/05/2015	05/06/2015	-			-	0%	A Iniciar		
3.2	Redigir relatório parcial com os critérios definidos	Albertina	08/06/2015	24/06/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4	Produto 4 - Definição das prioridades de aplicação do 1,5%	Albertina	25/06/2015	21/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4.1	Oficina para discussão de prioridades para aplicação dos recursos	Albertina	25/06/2015	03/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
4.2	Redigir relatório parcial com as prioridades definidas	Albertina	06/07/2015	21/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
5	Produto 5 - Apresentação Interna	Albertina	22/07/2015	22/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
5.1	Reunião para apresentação interna dos critérios e aplicações eleitos pela equipe	Albertina	22/07/2015	22/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6	Produto 6 - Relatório Final	Albertina	23/07/2015	06/08/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.1	Elaboração do relatório final	Albertina	23/07/2015	29/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.2	Validação do relatório	Albertina	30/07/2015	31/07/2015	-			-	0%	A Iniciar		
6.3	Possíveis correções e entrega do relatório final	Albertina	03/08/2015	06/08/2015	-			-	0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	10,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Responsável Produto
1º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 16)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TISA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 124.639.832,63
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Em Andamento		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00			3.065.105.668,00	77,8%	Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	------------------	--	--	------------------	-------	-----------	-------------------

Parceiros institucionais:											
Observações:											
1º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).											
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.											
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.											
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.											
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.											
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.											
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.											
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.											
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.											
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)			
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	13/03/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.180.925.388,15
A realizar no exercício	R\$ 778.074.611,85
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 778.074.611,85
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.180.925.388,15

Responsável(él)eis técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	639.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	639.000.000,00	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	191.544.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	191.544.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	191.544.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	106.368.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	03/03/15	1.959.000.000,00	24/10/13	-	1.180.925.388,15	50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.180.925.388,15	61,54%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.	
Obs.6 A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador.	

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 18)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeétrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão:	01/03/2010	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	Em Andamento	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:								
Observações:								
1º Ciclo 2015								
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2: Atualizado em 08/04/2013.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 30 (ex PO 19)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.376.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	01/08/2014	A ser repactuada
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 53.376.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 53.376.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Em Andamento	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/representação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	Conforme ofício nº 0270/2014 - Dfin/Sudene, de 25.2.2014, encaminhado ao BNB solicitado aditamento ao contrato ou novo contrato.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/04/14	01/05/14	42.477.417,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	
6	Liberação 2	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/06/14	01/07/14	10.899.064,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.	Aprovada a migração pela Sudene/BNB. Aditivo ao Contrato de Ag. Operador em Andamento.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/04/14	01/07/14	53.376.481,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		

Competência da SUDENE /Banco									50%	Atrasado		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		53.376.481,00	Valor realizado:		0,00	50,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2015.												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.											
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.											
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.											
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.											
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.											
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O B											
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.											
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:									
Observações:									
1º Ciclo 2015.									
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.								
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.								
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.								

Fonte: Fonte: CGG/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87
A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	-	53.635.943,87	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 54.900.000,00			Valor realizado: 53.635.943,87			70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD		
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa I Geração e Comercialização de Energia Ltda				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	28/11/2014

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	496.137,41	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.439.000,00	15/05/13	-	63.942.862,59	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		63.942.862,59	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa II Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	428.678,72	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	59.864.000,00	15/05/13	-	59.435.321,28	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.435.321,28	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa III Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$ 429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	429.090,12	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.278.000,00	Valor realizado:		54.848.909,88	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 36 (ex PO 25)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	1.056.552,40	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		54.216.447,60	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Falsa V Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Traini/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	01/08/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 57.321.606,84
Saldo a liberar	R\$ 7.133.393,16
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 57.321.606,84

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	-	57.321.606,84	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 64.455.000,00			Valor realizado: 57.321.606,84			70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 39 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39
						A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ 3.213.914,61
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ 46.786.085,39

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	-	46.786.085,39	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		46.786.085,39	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012.BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Joema/J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	46.701.999,96	85.684.069,03

Previsão de Conclusão:	01/04/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 34.986.862,96
A realizar no exercício	R\$ 11.715.137,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.715.137,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 34.986.862,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012- Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	11.715.137,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	46.701.999,96	15/05/13	-	34.986.862,96	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		46.701.999,96	Valor realizado:		34.986.862,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 42 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			53.959.000,00	Valor realizado:			80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):				
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ 3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	0,00
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	99.970.000,00	22/05/13	-	96.407.194,96	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		99.970.000,00	Valor realizado:		96.407.194,96	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 45 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	30/07/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 197.811.049,39
A realizar no exercício	R\$ 105.188.950,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 105.188.950,61
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 197.811.049,39

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,00	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	48.707.006,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	22.281.666,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/15	31/01/15	18.954.422,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	15.245.856,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	01/05/15	303.000.000,00	19/04/13	-	197.811.049,39	43%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									71%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	197.811.049,39	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Aratu Empreendimentos Ltda				
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 86.845.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 86.845.000,00
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 183.737.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-		0,00	6%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-		0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		270.582.240,00	Valor realizado:			0,00	18,18%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.				
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	30/12/2014
Data Atualização:	13/032015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	13.862.197,00
A realizar no exercício	R\$	9.992.845,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	9.992.845,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	13.862.197,00

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/09/14	30/11/14	9.992.845,00	09/03/15	-	-	0,00%	Atrasado		Solução de pendências da Proposta de liberação em andamento.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	30/11/14	23.855.042,00	20/06/13	-	13.862.197,00	67%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado		
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 23.855.042,00			Valor realizado: 13.862.197,00			62,50%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Deten Química S.A.				
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	30/01/2016
Data Atualização:	13/03/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$	15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	15.447.600,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	30/12/15	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	29%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									64%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			31.256.000,00	Valor realizado:		15.447.600,00	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: A sudene está agudando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.				
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	75%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									88%	Concluído		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	66,67%	Atrasado	Status do Projeto
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Cone Multicenter Ltda				
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2017
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 107.720.106,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 191.238.424,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 191.238.424,00			Valor realizado: 0,00			28,57%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão:	30/11/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	13/03/2015	

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	71,43%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD		
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora dde Aço				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.075.935.159,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Cosulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/13	06/07/14	0,00	19/12/12	27/06/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Em Andamento	Minuta de contrato enviada ao Banco.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização. Prazo prorrogado.
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/06/14	31/07/17	1.075.935.159,00	16/05/14	-	0,00	6%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		1.075.935.159,00	Valor realizado:		0,00	26,92%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parcelos institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão:	01/06/16
Data Atualização:	13/03/2015

Responsáv(el)eis técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 70.152.822,60
A realizar no exercício	R\$ 288.555.369,17
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 345.429.739,92
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 70.152.822,60

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	114.555.923,52	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	57.163.904,46	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/14	31/12/14	54.743.293,10	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/06/15	01/07/15	75.370.699,94	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	56.874.370,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/06/16	01/07/16	56.874.370,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	01/07/16	415.582.562,52	21/02/14	-	70.152.822,60	28,57%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									64,29%	Em Andamento		

11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 70.152.822,60	41,67%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	--------------------	------------------	-------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs3: A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -

Previsão de Conclusão:	15/04/2015
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.	O Decreto nº 8.276 foi assinado em 27/06/14 e publicado no DOU de 30/06/14, Seção 1, pág. 5..
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído		
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.	
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes	
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14	03/10/14		100,00%	Concluído		
8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		06/10/14	24/10/14		100,00%	Concluído		

9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14		29/10/14	14/11/14		100,00%	Concluído		
10	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	19/11/14	15/12/14		19/11/14	15/12/14		100,00%	Concluído	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD, que foi seguida por sugestões de ajustes e o envio para apreciação da versão final no dia 15/12/14.	
11	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/12/14	29/12/14		27/02/15	27/02/15		100,00%	Concluído	Aguardando agenda da Diretoria colegiada.	Em reunião realizada dia 25/03/15, a Diretoria pediu que as unidades internas apresentassem, no prazo de 48 horas, sugestões à proposta de RI que ainda percebam como necessárias.
12	Aprovação pela DC, publicação no DOU e/ou Boletim interno.	Samuel (SAD/GAB)	01/03/15	15/04/15					0,00%	A Iniciar	Os prazos previstos (início e fim) foram ajustados.	
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:			91,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.												
Observações:												
1º Ciclo 2015												
O prazo de conclusão foi reajustado para 15/04/2015 em função de agenda da Diretoria colegiada.												

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.				
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste		Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional	
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)		Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros	
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.				
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	1	90	0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	08/11/2015
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca e Manoel Barreiros
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído		
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	
3	Reunião com uniaddes internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.	
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explanção sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14	-	11/09/14	11/09/14	-	100%	Concluído		
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14	-	11/09/14	18/09/14	-	100%	Concluído		
6	Projeto piloto (mapeamento dos principais processos da CGGI)	Carmen Fonseca e Vinicius Vieira (CGGI/SUDENE)	11/08/14	10/04/15	-	11/08/14		-	30%	Em Andamento	Datas repactuadas de acordo com realinhamento da unidade	
7	Revisão do projeto de GESTÃO DE PROCESSOS. (Elaboração versão final)	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15		-	50%	Em Andamento		
8	Seleção da área a ser mapeada	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15	26/03/15	-	100%	Concluído		

9	Elaboração do fluxo	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-		-	0%	A Iniciar		
10	Formar grupo de trabalho e interlocutores	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-		-	0%	A Iniciar		
11	Elaborar minuta de edital para contratação de consultoria	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15				0%	A Iniciar		
12	Encaminhamento à PRD de minuta de Edital	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE)	13/04/15	14/04/15	-		-	0%	A Iniciar		
13	Encaminhamento à DAD de minuta de Edital	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE)	29/04/15	30/04/15				0%	A Iniciar		
14	Apresentação à Diretoria Colegiada para aprovação do edital de contratação incluindo apresentação e formalização do EP.	Equipe do EP, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	08/05/15	14/05/15				0%	A Iniciar		
15	Encaminhamento à DAD/CGAF o edital para lançamento.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE)	18/05/15	18/05/15				0%	A Iniciar		
16	Treinamento do grupo básico indicado pela unidades (in company)	Empresa a ser contratada	A definir	A definir				0%	A Iniciar		
17	Contratação conforme etapa 6.	DAD/CGAF	A definir	A definir				0%	A Iniciar		
18	Execução do trabalho de acordo com o plano de ação.	Equipe do EP, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE), Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE) e Consultoria	A definir	A definir	-		-	0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	38%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015
Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.
Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 56
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe		
Projeto:	DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		26.600,00

Previsão de Conclusão:	27/11/2015
Data Atualização:	31/03/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.600,00
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.600,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14	0,00	17/11/14	28/11/14	0,00	100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14	0,00	11/12/14	11/12/14	0,00	100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15	0,00	03/02/15	31/03/15	0	100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15	0,00	01/04/15	30/04/15	0	0%	A Iniciar		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	29/05/15	25.000,00	04/05/15	29/05/15	0	0%	A Iniciar		
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/06/15	12/06/15	0,00	01/06/15	12/06/15	0	0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/07/15	31/07/15	0,00	01/07/15	31/07/15	0	0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Projetos Desenvolvimento de coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/08/15	14/08/15	0,00	03/08/15	14/08/15	0	0%	A Iniciar		
10	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	17/08/15	30/10/15	0,00	17/08/15	30/10/15		0%	A Iniciar		
11	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	09/11/15	27/11/15	0,00	09/11/15	27/11/15	0	0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		26.600,00	Valor realizado:		1.600,00	36%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2015
Sub-objeto:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e getão de seus programas frinalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.		
Projeto:	Gestão por Competências		
Objetivo do projeto:	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2015
Data Atualização:	31/03/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14	0,00	24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15	0,00	19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15	0,00	02/02/15			30%	Em Andamento		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15	25.000,00	01/04/15			30%	Em Andamento		
5	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/15	0,00				0%	A Iniciar		
6	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/15	0,00				0%	A Iniciar		
7	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	01/07/15	30/07/15	0,00				0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/08/15	30/10/15	0,00				0%	A Iniciar		
9	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/08/15	31/08/15	0,00				0%	A Iniciar		
10	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	01/10/15	30/10/15	0,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		25.000,00	Valor realizado:		0,00	26%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 58
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2015
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e Gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laboral.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		10.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	31/03/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 10.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14	0	06/10/14	10/10/14	0	100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14	0	17/10/14	17/10/14	0	100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14	0	19/11/14	05/12/14	0	100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15	0	20/01/15	31/03/15	0	100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15	0,00	Não informado			20%	Em Andamento		
6	Divulgação do Projeto e Formação dos grupos	Marlene Franklin e Marina Braga	13/04/15	08/05/15	0,00				0%	A Iniciar		
7	Contratação de facilitadores e realização das Oficinas Temáticas	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	18/05/15	30/10/15	10.000,00				0%	A Iniciar		
8	Elaboração do Projeto de Vida pelos participantes e avaliação do Projeto Investindo nos Sonhos.	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	03/11/15	30/11/15	0,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		10.000,00	Valor realizado:		0,00	53%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco
Observações:	
1º Ciclo 2015	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:		3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE		Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:		3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho		Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho		Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho				
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho				
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Previsão de Conclusão:	28/04/2016
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 2.630.114,65
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 555.861,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2015)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (2015)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a liberar no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício (2015)	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 2.630.114,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Sector de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14		0,00	95%	Em Andamento	A 1ª fase da licitação (habilitação das concorrentes) foi realizada em 1º/12/2014 e a 2ª fase (propostas de preços) foi em 09/03/2015.	O processo está sob análise da área de Engenharia quanto à avaliação da proposta de preços mais vantajosa para a Sudene.
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14		100%	Concluído		A Nota de empenho, no valor global de R\$ 555.861,00, foi realizada em 05/12/2014, aguardando autorização superior para fabricação das poltronas.

8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Empresa a contratar	27/04/15	27/10/15	345.000,00				0%	A Iniciar	A empresa de projetos apresentará o Projeto Básico para a licitação da execução da obra, contendo o Orçamento Básico com todos os elementos necessários para essa contratação.	
9	Licitação da obra de ambientação final	Eneida (SUDENE/CPL)	27/07/15	27/10/15	0,00				0%	A Iniciar		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	28/10/15	28/04/16	3.300.000,00				0%	A Iniciar	A Área de Engenharia estimou o valor global da execução da obra de ambientação em R\$ 3.300.000,00.	
11	Fiscalização da obra de ambientação final	José Wilson Galdino e José Villeneuve	28/10/15	28/04/16	0,00				0%	A Iniciar		
12	Entrega da obra			28/04/16					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		7.553.642,89	Valor realizado:		2.630.114,65	58%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceliros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2015												

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 60 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho		Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior	
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.				
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.				
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	2.700.000,00	2.700.000,00

Previsão de Conclusão:	31/08/2016
Data Atualização:	20/03/2015

Não constará do próximo ciclo

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 30.000,00
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2015)	
Valor Empenhado no Exercício (2015)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a liberar no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício (2015)	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 30.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/2009	22/09/2010	30.000,00	100%	Concluído	Entrega do projeto básico e do projeto executivo realizado pela empresa Policonsult.	Entrega do projeto básico à CPL para lançar licitação.
2	Licitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	-	22/12/2011	06/03/2012	-	100%	Concluído	Licitação deserta	Revisar planilha orçamentária e relançar licitação.
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	-	15/06/2012	13/08/2012	-	100%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)	Encaminhar e-mail à Policonsult cobrando informações e estabelecendo prazo.
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	-	13/08/2012	05/12/2012	-	100%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.	Foi julgado improcedente o recurso da licitante pela CPL e mantida a inabilitação, o que ocasionou o fracasso da licitação. A SUDENE irá revisar as planilhas orçamentárias para abrir nova licitação e consultar a PRD sobre dispensa de licitação dessa obra.
6	Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa de consultoria	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	02/01/14	25/11/14	-	17/03/2014	25/11/2014	-	60%	Paralisado	A Área de Engenharia paralisou a elaboração do Termo de Referência necessário para a contratação da empresa de consultoria em virtude da decisão superior de a Sudene transferir-se para outro empreendimento comercial, ficando a cargo do futuro administrador do Condomínio SUDENE a continuidade da contratação da instalação do sistema de prevenção e combate a incêndios.	A Área de Engenharia sugere a retirada desse Plano Operativo no próximo ciclo.
7	Licitação da Consultoria	Eneida (Sudene/CPL)	26/11/14	26/02/15	-				0%	Atrasado		
8	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Empresa a ser contratada	27/02/15	27/05/15	30.000,00				0%	A Iniciar		
9	Relançamento da licitação da obra (3ª tentativa)	Eneida (Sudene/CPL)	28/05/15	28/08/15	-				0%	A Iniciar		
10	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	31/08/15	31/08/16	2.400.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização e Empresa a ser contratada	31/08/15	31/08/16	240.000,00				0%	A Iniciar		

12	Entrega da obra	Empresa a ser contratada		31/08/16	-				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	2.700.000,00	Valor realizado:	30.000,00	18,40%	Paralisado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:
Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco no Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.

Observações:
1º Ciclo 2015
A Área de Engenharia sugeriu, no 4º Ciclo de 2014, a retirada desse Plano Operativo do rol de atividades desta Unidade.

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 61 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior		
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.				
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Previsão de Conclusão:	22/07/2015
Data Atualização:	20/03/2015

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 5.191.716,42
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 3.120.429,31
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2015)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (2015)	R\$ -
Valor liberado no Exerc. (LOA 2015+RAP 2014)	R\$ 358.399,13
Saldo a liberar no Exercício (2015)	R\$ 2.762.030,18
Saldo a Empenhar no exercício (2015)	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 5.550.115,55

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.	Lançamento de licitação para complementação da obra.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/07/15	5.745.805,68	22/10/12		2.625.376,37	79%	Em Andamento	Após a celebração do 4º Termo Aditivo, a obra foi reiniciada em 13/10/2014, estando em execução os serviços de recuperação dos blocos, lay-out do subsolo e cravação das estacas para a rampa.	

9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/07/15	0,00	22/10/12			72%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve, pela arquiteta Rebeca Ramalho e pelos engenheiros eletricitistas Diego Vêras e Thiago Teles.	
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/07/15	0,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		9.673.041,23	Valor realizado:		5.550.115,55	88%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2015												

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

PLANO DE AÇÃO 2010					
Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.				
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	4.663.522,50	4.663.522,50

Previsão de Conclusão:	10/12/2015
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 100.000,00
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2015)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício (2015)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a liberar no Exercício (2015)	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício (2015)	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14			95%	Em Andamento	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhará Memorando à CGAF, sugerindo que a licitação seja realizada pelo órgão futuramente indicado como síndico do Condomínio.
7	Relançamento da Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	06/04/15	06/08/15	0,00				0%	A Iniciar		
8	Execução da Obra	A definir	10/08/15	10/12/15	4.503.522,50				0%	A Iniciar		
9	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Vêras e empresa de consultoria	10/08/15	10/12/15	60.000,00				0%	A Iniciar		
10	Entrega da obra			10/12/15					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					4.663.522,50	Valor realizado:			100.000,00	25,87%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:
Observações:

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 63 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	20WQ - PO 05 - Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE.		
Projeto:	PROCONDEL 1 - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	251.373,39	251.373,39

Previsão de Conclusão:	30/06/2014
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 251.373,39
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 251.373,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do projeto	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/08/2012	10/11/2012		15/08/2012	10/11/2012		100%	Concluído		
2	Captação de recursos	Angela Nascimento	11/11/2012	20/02/2013	-	11/11/2012	20/02/2013		100%	Concluído		
3	Contatos com articulistas	Marcos Costa Lima	02/01/2013	31/01/2013	-	02/01/2013	31/01/2013		100%	Concluído		
4	Identificação de recursos no orçamento 2013	Angela Nascimento e Frederico Cavalcanti	20/04/2013	20/04/2013		20/04/2013	20/04/2013		100%	Concluído		
5	Orientação para instrução do processo e abertura de processo	Shieley Câmara, Zizete Nogueira, Frederico Cavalcanti, Brivaldo Soares e Eva Porto	03/05/2013	20/05/2013		03/05/2013	20/05/2013		100%	Concluído		
6	Encaminhamento a DAD	Angela Nascimento	22/05/2013	22/05/2013		22/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
7	Emissão de Parecer pela Procuradoria Federal/SUDENE	Romoaldo Goulart	24/05/2013	06/06/2013		06/06/2013	06/06/2013		100%	Concluído		
8	Elaboração de Nota Técnica e Plano de Trabalho	Angela Nascimento/Adonis Oliveira	09/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
9	Encaminhamento a CGC	Angela Nascimento	10/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído		
10	Parecer da CGC	Zizete Nogueira	10/06/2013	11/06/2013		11/06/2013	11/06/2013		100%	Concluído		
11	Encaminhamento a COCF para informar liberação de limites orçamentários	Angela Nascimento	12/06/2013	12/06/2013		12/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
12	Atesto da COCF	Brivaldo Soares	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
13	Encaminhamento à Diretoria de Planejamento para inserção pauta de reunião da Diretoria Colegiada	Angela	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
14	Aprovação do Processo na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	14/06/2013	14/06/2013		14/06/2013	14/06/2013		100%	Concluído		
15	Encaminhamento do Termo de Cooperação à Universidade Federal de Pernambuco	Angela Nascimento	28/06/2013	28/06/2013		28/06/2013	28/06/2013		100%	Concluído		
16	Tramitação na UFPE	Diretoria Convênios	01/07/2013	19/07/2013		01/07/2013	19/07/2013		100%	Concluído		
17	Assinatura do Termo de Cooperação	Reitor e Superintendente	22/07/2013	26/07/2013		22/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		
18	Publicação no DOU	Coordenação Convênios	25/07/2013	25/07/2013		25/07/2013	25/07/2013		100%	Concluído		
19	Encaminhamento de destaque orçamentário	COCF	26/07/2013	26/07/2013		26/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído		

20	Liberação e recebimento	COCF/UFPE	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	100%	Concluído	Foi transferido o valor total, do qual a UFPE irá desembolsar mensalmente os valores correspondentes à folha de pagamento e contratação de serviços.	
21	Empenho UFPE	UFPE/PROEXTE	06/08/2013	06/08/2013		06/08/2013	06/08/2013		100%	Concluído		
22	Execução: 1ª reunião com coordenadores UFPE	Angela/Marcos Costa Lima	02/08/2013	02/08/2013		02/08/2013	02/08/2013		100%	Concluído		
23	Seleção de bolsistas UFPE	Marcos Costa Lima/Vildeane Borba	05/08/2013	15/08/2013		05/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
24	Solicitação de material e equipamento na SUDENE	Angela Nascimento	07/08/2013	15/08/2013		07/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
25	Capacitação de 10 bolsistas nas atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	Májury Miranda/Vildeane Borba	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
26	Chamamento de bolsistas técnico de nível médio	Evaldo Souza/Angela Nascimento	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
27	Orientação de 02 bolsistas responsáveis pela pesquisa de campo e apresentação dos mesmos à instituição de pesquisa	Angela Nascimento	20/08/2013	23/08/2013		20/08/2013	23/08/2013		100%	Concluído		
28	Pesquisa de campo	Pedro Maranhão/Sergio Cavalcante	26/08/2013	20/12/2013		26/08/2013	28/02/2014		100%	Concluído	Foram pesquisado os anos 1959 a 1964	
29	Atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	10 bolsistas	02/09/2013	20/012/2013		02/09/2013	28/02/2014		100%	Concluído	Todo o acervo foi digitalizado 1959 a 1970	
30	Alteração de elemento de despesa e solicitação de pagamento de bolsas	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	23/05/2013	05/09/2013		23/05/2013	05/09/2013		100%	Concluído		
31	Acervo Sonoro - Identificação/Quantificação	Silva/Alais	02/09/2013	31/10/2013		09/09/2013	22/10/2013		100%	Concluído		
32	Acervo Sonoro - Higienização (142 fitas de rolo)	Silva/Alexandre	20/10/2013	10/11/2013		10/10/2013	25/10/2013		100%	Concluído		
33	Acervo Sonoro - Digitalização	Silva/Alexandre	11/11/2013	31/10/2013		10/10/2013	31/03/2014		100%	Concluído	O acervo 1960 a 1970; Iniciada digitalização fitas cassetes de 1971	
34	Assinatura e publicação do 1º Termo Aditivo	UFPE/SUDENE	15/01/2014	31/01/2014		15/01/2014	24/03/2014		100%	Concluído		
35	Inclusão de pesquisadora da área de publicidade	Alaide Vilanova	03/02/2014	31/03/2014		03/02/2014	31/03/2014		100%	Concluído	Produção de peças para o site e seminário	
36	Entrega dos artigos	Articulistas convidados	02/09/2013	31/01/2014		02/09/2013	21/03/2014		100%	Concluído		
37	Finalização (Relatório)	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	15/01/2014	30/06/2014		24/03/2014	25/09/2014		100%	Concluído	O relatório final será encaminhado pela UFPE. Segundo orientação da Coordenação de Convênios, a solicitação à UFPE poderá ser feita pela responsável técnica. Foi solicitado declaração de restituição dos recursos não utilizados, da COCF(folha 456 do Processo 59335.000208/2013-12)	
			Valor Previsto:		251.373,39	Valor realizado:		251.373,39	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento												
Observações:												
1º ciclo 2015												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 64 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças	
Diretor:	Marcos Robalinho		Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO	
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.				
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	484.650,00

Previsão de Conclusão:	31/03/2015
Data Atualização:	13/03/2015

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Angela Nascimento
---	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 484.650,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 484.650,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májury Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májury Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaíde Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	

15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	30/06/2014		100%	Concluído		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros9organização); Realização igual a R\$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	Concluído		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)	Severino Silva	02/06/2014	30/11/2014		02/12/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)	Pessoa Jurídica	02/06/2014	30/11/2014					0%	Cancelado	Atividade não executada.	
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)	Arabera Tradução Técnicas	02/06/2014	30/11/2014		10/10/2014	30/11/2014		100%	Concluído		
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	Concluído		
23	Finaização (Relatório)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	28/02/2015	31/03/2015		28/02/2015				Em andamento		
			Valor Previsto:		484.650,00	Valor realizado:		484.650,00	95%	Em andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento											
Observações:												
1º ciclo 2015												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 65 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro		
Problema (causa):	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI.				
Projeto:	Modernização da Infraestrutura da Rede Local				
Objetivo do projeto:	Melhoria da Infraestrutura de TI.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	a definir

Previsão de Conclusão:	90 dias após contratação
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.	01/10/14	28/11/14	-	22/09/14	13/11/14		100%	Concluído		
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/12/14	29/08/14	-	14/11/14	Não informado		100%	Concluído		
3	Contratação.	Setor de Licitação	-	-	-				0%	Paralisado		
4	Realização do serviço.	Fornecedor	90 dias após contratação		a definir				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	60%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2015
A contratação aguarda a disponibilização do orçamento LOA-2015 (INVESTIMENTO).
A realização do serviço (entrega + instalação) tem previsão de 90 dias após a contratação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 66 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88

Previsão de Conclusão:	30/10/2015
Data Atualização:	20/03/2015

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 272.909,00
A realizar no exercício	R\$ 340.953,88
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 340.953,88
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 272.909,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14			80%	Em Andamento		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	01/04/15	31/07/15	-				0%	A Iniciar		
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	03/08/15	30/10/15	340.953,88				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		613.862,88	Valor realizado:		272.909,00	72%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Ministério da Integração Nacional e SUDAM

Observações:

1º Ciclo 2015

Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento e implantação do sistema. Os recursos para manutenção correrão à conta de orçamentos ainda a serem definidos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2015-Duodécimos)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	DUODÉCIMO	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	5.799.492,00		2.856.857,31	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	149.994,00		84.407,75	0,00	0,00	Servidor capacitado	199		0,00		
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00		52.889,77	0,00	0,00	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00		0,00	0,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	31.680,00		1.636,80	0,00	0,00	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00		18.965,20	0,00	0,00	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.075.416,00		175.954,46	0,00	0,00	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	21.204,00		0,00	0,00	0,00	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.893.943,00		566.149,86	0,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	25.750.455,00		4.526.162,18	0,00	-	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI					Total	37.594.284,00	0,00	8.283.023,33	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.138.123,00		466.228,85	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União					Total	2.138.123,00	0,00	466.228,85	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	150.000,00		0,00	0,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	90.840,00		0,00	0,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	191.247,00		0,00	0,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	249.999,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
19	691	2029	8902/0024	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/0020	A	1	133.116,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/0024	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada					
22	691	2029	8918	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	124.998,00		0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	741.072,00		0,00	0,00	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	24.999,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7114	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7120	A	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária					Total	1.706.271,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!						
06	182	2040	8172	A	-	0,00		0,00	0,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres					Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Posição: em 26/03/2015 - SIAFI (Até a presente data a LOA 2015 ainda não havia sido sancionada)
Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	694.459,19	694.459,19	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	1.794.595,93	1.794.595,93	100%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	800.000,00	800.000,00	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	4.452.840,00	352.840,00	8%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	1.183.120,40	1.183.120,40	100%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	485.874,65	255.723,17	53%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	207.542,62	107.354,71	52%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	359.682,64	221.267,56	62%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	343.585,70	0,00	0%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	771.000,00	0,00	0%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	410.203,62	0,00	0%
12	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	400.000,00	0,00	0%
13	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Cme, Frutas e Verduras	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	300.000,00	0,00	0%
14	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	1.069.868,00	0,00	0%
15	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	857.015,99	857.015,99	100%
16	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	2.000.000,00	1.277.000,00	64%
17	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração de Relatório Contendo Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	
18	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00	79%

19	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.959.000.000,00	1.180.925.388,15	60%
20	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	61.728.156,00	61.728.156,00	100%
21	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	53.376.481,00	0,00	0%
22	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	59.700.000,00	59.700.000,00	100%
23	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	54.900.000,00	53.635.943,87	98%
24	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	64.439.000,00	63.942.862,59	99%
25	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	59.864.000,00	59.435.321,28	99%
26	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	55.278.000,00	54.848.909,88	99%
27	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	55.273.000,00	54.216.447,60	98%
28	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	64.455.000,00	57.321.606,84	89%
29	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	33.900.000,00	33.900.000,00	100%
30	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	50.000.000,00	46.786.085,39	94%
31	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	49.690.000,03	49.687.713,17	100%
32	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	46.701.999,96	34.986.862,96	75%
33	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	29.040.000,00	29.040.000,00	100%
34	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	53.959.000,00	53.959.000,00	100%

35	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	99.970.000,00	96.407.194,96	96%
36	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	303.000.000,00	197.811.049,39	65%
37	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	270.582.240,00	0,00	0%
38	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	23.855.042,00	13.862.197,00	58%
39	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	31.256.000,00	15.447.600,00	49%
40	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	61.867.350,00	61.867.350,00	100%
41	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	191.238.424,00	0,00	0%
42	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
43	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.075.935.000,00	0,00	0%
44	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Foz do Atlântico saneamento S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	415.582.562,52	70.152.822,60	17%
Total do Objetivo 1.1								9.167.212.744,25	5.472.311.556,63	60%
45	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	0%
46	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Grupo de Trabalho para Diagnóstico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos para o PPA	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	0%
Total do Objetivo 1.4								0,00	0,00	0%
47	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	234.105,49	139.865,15	60%
Total do Objetivo 1.5								234.105,49	139.865,15	60%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								9.167.446.849,74	5.472.451.421,78	60%
48	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	530.482,50	265.241,25	50%
49	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	835.823,47	0,00	0%
Total do Objetivo 2.3								1.366.305,97	265.241,25	19%
50	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	228.797,21	167.999,61	73%
51	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	350.978,27	350.978,27	100%
Total do Objetivo 2.4								579.775,48	518.977,88	90%
TOTAL DA DIRETRIZ 2								1.946.081,45	784.219,13	40%

52	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	0%
53	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	0%
54	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	26.600,00	1.600,00	6%
55	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	25.000,00	0,00	0%
56	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo em Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	10.000,00	0,00	0%
Total do Objetivo 3.1								61.600,00	1.600,00	3%
57	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	251.373,39	251.373,39	100%
58	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	484.650,00	484.650,00	100%
59	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	0,00	0,00	0%
60	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2 Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	613.862,88	272.909,00	44%
Total do Objetivo 3.2								1.349.886,27	1.008.932,39	75%
61	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	7.482.242,89	2.630.114,65	35%
62	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	2.700.000,00	30.000,00	1%
63	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	8.229.186,02	5.550.115,55	67%
64	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3 Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.892.394,45	100.000,00	3%
Total do Objetivo 3.3								21.303.823,36	8.310.230,20	39%
65	21	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de uma metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	0,00	0,00	0%
66	22	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Atrasado	0,00	0,00	0%
Total da Medida Institucional Normativa								0,00	0,00	0%
TOTAL DA DIRETRIZ 3								22.715.309,63	9.320.762,59	41%
TOTAL GERAL								9.192.108.240,82	5.482.556.403,50	59,6

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2015

Nota: Ta Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 13/03/2015

ANEXO IV
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
1	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00	79%
2	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.959.000.000,00	1.180.925.388,15	60%
3	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	61.728.156,00	61.728.156,00	100%
4	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	53.376.481,00	0,00	0%
5	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	59.700.000,00	59.700.000,00	100%
6	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	54.900.000,00	53.635.943,87	98%
7	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	64.439.000,00	63.942.862,59	99%
8	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	59.864.000,00	59.435.321,28	99%
9	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	55.278.000,00	54.848.909,88	99%
10	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	55.273.000,00	54.216.447,60	98%
11	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	64.455.000,00	57.321.606,84	89%
12	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	33.900.000,00	33.900.000,00	100%
13	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	50.000.000,00	46.786.085,39	94%
14	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	49.690.000,03	49.687.713,17	99,995%
15	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	46.701.999,96	34.986.862,96	75%
16	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	29.040.000,00	29.040.000,00	100%

17	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	53.959.000,00	53.959.000,00	100%
18	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	99.970.000,00	96.407.194,96	96%
19	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	303.000.000,00	197.811.049,39	65%
20	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	270.582.240,00	0,00	0%
21	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	23.855.042,00	13.862.197,00	58%
22	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	31.256.000,00	15.447.600,00	49%
23	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	61.867.350,00	61.867.350,00	100%
24	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	191.238.424,00	0,00	0%
25	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
26	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	1.075.935.000,00	0,00	0%
27	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Foz do Atlântico saneamento S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	415.582.562,52	70.152.822,60	17%
P 2029 - Ação 0355								9.151.082.955,51	5.464.768.179,68	60%
28	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	343.585,70	0,00	0%
29	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	771.000,00	0,00	0%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	0,00	0%
30	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	1.183.120,40	1.183.120,40	100%
31	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária - Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	1.069.868,00	0,00	0%
P 2029 - Ação 4640								2.252.988,40	1.183.120,40	53%
32	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	530.482,50	265.241,25	50%
33	17	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	835.823,47	0,00	0%

		P 2029 - Ação 8689						1.366.305,97	265.241,25	19%
34	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	800.000,00	800.000,00	100%
35	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	400.000,00	0,00	0%
36	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Crme, Frutas e Verduras	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	300.000,00	0,00	0%
37	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	234.105,49	139.865,15	60%
38	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	1.794.595,93	1.794.595,93	100%
39	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	485.874,65	255.723,17	53%
40	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	359.682,64	221.267,56	62%
46	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	4.452.840,00	352.840,00	8%
P 2029 - Ação 8902								8.827.098,71	3.564.291,81	40%
41	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	207.542,62	107.354,71	52%
42	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	410.203,62	0,00	0%
P 2029 - Ação 8917								617.746,24	107.354,71	17%
43	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	857.015,99	857.015,99	100%
44	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	2.000.000,00	1.277.000,00	64%
P 2029 - Ação 8340								2.857.015,99	2.134.015,99	75%
45	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Atrasado	694.459,19	694.459,19	100%
P 2029 - Ação 8918								694.459,19	694.459,19	100%
Total do Programa 2029								9.168.813.155,71	5.472.716.663,03	60%
47	18	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	228.797,21	167.999,61	73%
48	19	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Em Andamento	350.978,27	350.978,27	100%
P 2040 - Ação 8172								579.775,48	518.977,88	90%
Total do Programa 2040								579.775,48	518.977,88	90%
49	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	0%
50	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	0,00	0,00	0%
51	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	26.600,00	1.600,00	6%
52	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	25.000,00	0,00	0%
53	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo em Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	10.000,00	0,00	0%
54	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	7.482.242,89	2.630.114,65	35%

55	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	2.700.000,00	30.000,00	1%	
56	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	8.229.186,02	5.550.115,55	67%	
57	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	2.892.394,45	100.000,00	3%	
58	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	251.373,39	251.373,39	100%	
59	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	484.650,00	484.650,00	100%	
60	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	0,00	0,00	0%	
61	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	613.862,88	272.909,00	44%	
		P 2111 - Ação 2000							22.715.309,63	9.320.762,59	41%
		Total do Programa 2111							22.715.309,63	9.320.762,59	41%
62	21	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de uma metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Concluído	0,00	0,00	0%	
63	22	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Avaliação de um Projeto Piloto na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Atrasado	0,00	0,00	0%	
64	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	0%	
65	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Grupo de Trabalho para Diagnóstico do NE, elaboração de cenários e proposição de objetivos para o PPA	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	0%	
66	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração de Relatório Contendo Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	0,00	0,00	0%	
		Total das Ações Internas da CGEP/DPLAN							0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								9.192.108.240,82	5.482.556.403,50	59,6	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 1º Ciclo 2015

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 13/03/2015
