



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

**2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação
2014**

Recife
20 de junho de 2014

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	3
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	7
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	19
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	26
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	36
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	36
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013	39
8 – Conclusão	41
Anexo I – Quadros do monitoramento	43
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014	132
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	134
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015	139

Introdução

O 2º ciclo de monitoramento e avaliação das ações da SUDENE faz referência ao período compreendido entre Janeiro a Maio de 2014. Nesse, alguns eventos concorreram para que a reunião de explanação dos resultados não ocorresse, fazendo com que apenas fosse gerado o presente relatório.

Entre tais eventos podemos citar o período de jogos da copa do mundo realizado no Brasil, que modificou o expediente das instituições públicas e alterou as rotinas de trabalho; o período de festejos juninos, principal época de manifestação e celebração cultural nordestina, com a ocorrência de feriados; incompatibilidade de agenda dos diretores e coordenadores da instituição e também a indefinição na escolha e posse do novo superintendente, sendo o órgão dirigido em tal período de forma interina.

Assim, foi deliberado pela Diretoria e pelo superintendente interino, que não aconteceria a reunião para exposição dos resultados do 2º ciclo, agendada para o dia 20 (vinte) de junho, mas seria preparado o relatório com os resultados apurados.


Deste ciclo fazem parte sessenta projetos, dois a mais que o anterior em razão de novos projetos do FDNE. A análise aplicada ao conteúdo seguiu a mesma metodologia de outros ciclos e os referenciais de enquadramento foram os mesmos: a programação estratégica da SUDENE, o PPA e a programação estratégica do Ministério da Integração Nacional. Ademais, todos os projetos, antes do monitoramento, foram submetidos à apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada, condição também, à habilitação ao presente processo.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Agregados do 1º semestre 2014

Uma breve comparação entre os Ciclos de monitoramento, revela-nos uma razoável inversão de situações entre planos operativos (projetos) nas situações de andamento e atrasado. Observando-se os planos operativos do 2º ciclo, uma situação peculiar nos chama a atenção. São os atrasos decorrentes dos pedidos de liberação previstos nos cronogramas dos projetos do FDNE, pois até a data de consolidação dos dados, os bancos operadores do fundo não haviam encaminhado às respectivas solicitações, em contraposição aos prazos previstos.

O primeiro gráfico traduz essa situação, mostrando, por outro lado, cinco projetos concluídos até maio de 2014.

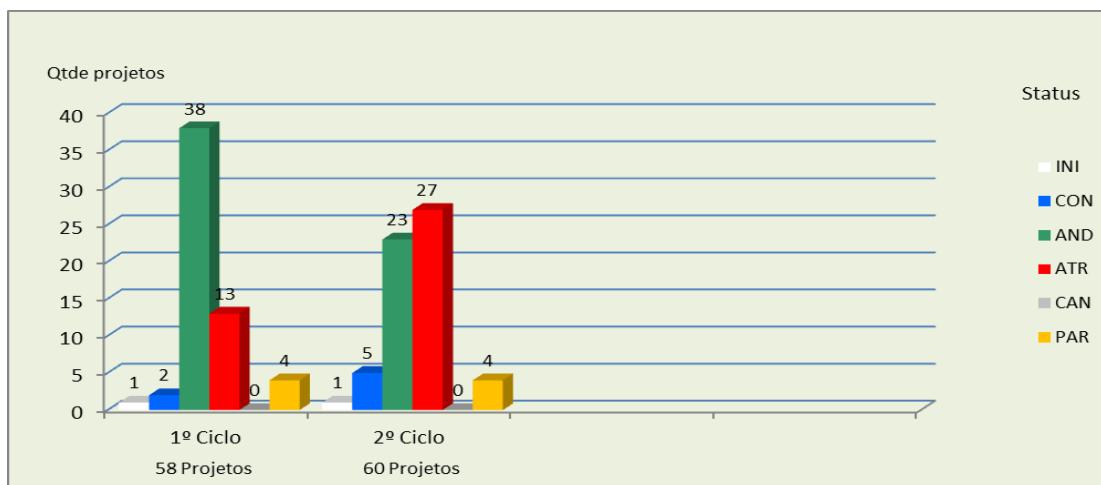

Fonte: Assessoria de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada ciclo de 2014

1.2 – Resultados Gerenciais – 2º Ciclo 2014

No que tange aos resultados apresentados no segundo ciclo de 2014, a tabela 1 nos mostra a distribuição dos 60 (sessenta) Planos Operativos (projetos) por diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, divididos pelas respectivas situações ou status até o dia 30 de maio de 2014.

Com dois projetos a mais do que o 1º ciclo de 2014, esses projetos somaram um total de recursos previstos da ordem de R\$ 6,5 bilhões, dos quais pouco mais de R\$ 3 bilhões foram liberados até o final do 2º ciclo.

Ainda em relação à tabela 1, observamos que a maior parte dos recursos se concentram na diretriz 1, que objetiva “Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste”, principalmente na subdivisão do objetivo estratégico 1, qual seja, “Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores”, onde se enquadram os investimentos do Fundo de desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Nesta diretriz 1, temos os investimentos com grande capacidade germinativa, fundamentados na capacitação profissional dos recursos humanos, na inovação e desenvolvimento tecnológico e na ampliação da infraestrutura física (energia, transporte - mobilidade urbana e comunicações), hídrica (especialmente na sub-região semiárida), na ampliação da estrutura de logística e na ampliação, internacionalização e diversificação das exportações, além de apoiar a capacitação voltada para a inovação, particularmente nos micro, pequenos e médios negócios, como estímulo para o alcance da competitividade. Do total de 60 projetos 40 estão nessa diretriz, sendo que a maior parte encontra-se em uma situação de atraso, ademais, 12 estão em andamento, 2 estão paralisados e 2 já foram concluídos.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2014

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	37	6.491.989,33	3.025.672,32	-	-	11	24	-	2	37
	1.5	3	234,11	139,87	-	2	1	-	-	-	3
Sub-Total		40	6.492.223,43	3.025.812,18	-	2	12	24	-	2	40
2	2.1	1	4.972,00	0,00	-	-	-	-	-	1	1
	2.3	1	530,48	265,24	-	-	-	1	-	-	1
	2.4	2	579,78	354,70	-	-	-	2	-	-	2
Sub-Total		4	6.082,26	619,94	-	-	-	3	-	1	4
3	3.1	4	621,37	621,37	1	2	1	-	-	-	4
	3.2	8	1.261,02	36,02	-	1	7	-	-	-	8
	3.3	4	21.303,82	7.783,66	-	-	3	-	-	1	4
Sub-Total		16	23.186,22	8.441,05	1	3	11	-	-	1	16
TOTAL		60	6.521.491,91	6.061.305,29	1	5	23	27	0	4	60

Fonte: AGI/SUDENE

(1) - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1.1** Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.1**-Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.


(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/05/2014 (2º Ciclo de monitoramento-2014)

O gráfico 2, adiante, detalha a distribuição desses projetos relacionados pela tabela 1, de acordo com cada objetivo estratégico.

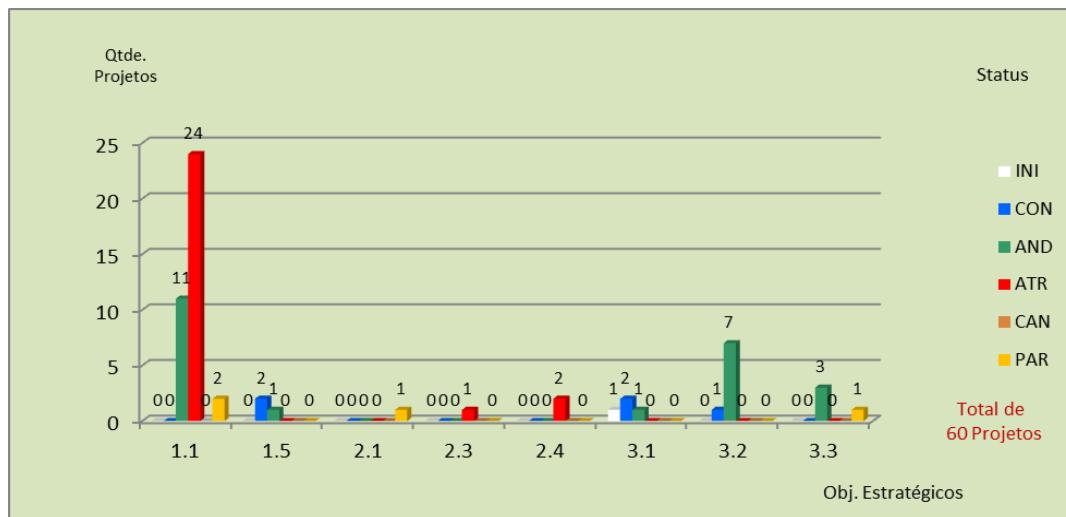

Fonte: Assessoria de Gestão Institucional

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º Ciclo – 2014)

Nos Anexos I, III e IV encontram-se os 60 planos operativos trabalhados neste ciclo, dos quais 40 estão relacionados com a promoção da competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste, 4 com universalização do acesso a ativos estratégicos, e 16, com a promoção da excelência técnica e da qualidade da gestão da SUDENE, todas, diretrizes estratégicas da Autarquia.

A tabela 2, mais adiante, detalha a distribuição dos projetos pelos seus respectivos programas e ações do Plano Plurianual do Governo Federal, mostrando o seu status também em 30 de maio de 2014.

Nesta, o leitor verá que o maior volume de recursos está concentrado no Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, e nele estão concentrados 41 projetos cujos recursos previstos somam quase R\$ 6,5 bilhões, dos quais pouco mais de R\$ 3 bilhões haviam sido aplicados até a data deste relatório, lembrando que alguns desses projetos, particularmente os do FDNE, são plurianuais, e os recursos liberados incluem os Restos a Pagar de exercícios anteriores.

Quanto ao conteúdo, o **Anexo II**, mostra a execução orçamentária geral, alcançada pela SUDENE em cada programa e ação do PPA até este ciclo. O **Anexo III**, um resumo dessa execução segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, e o **Anexo IV**, o mesmo resumo segundo a programação do PPA.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 2º Ciclo de Monitoramento de 2014

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20N9	1	126,37	115,80	-	-	-	1	-	-	1
	355	25	6.455.673,69	3.020.059,39	-	-	6	19	-	-	25
	20WQ-PO 05	1	251,37	251,37	-	-	1	-	-	-	1
	4640	1	1.018,50	1.018,50	-	-		1	-	-	1
	8340	4	26.529,01	974,41	-	-	1	1	-	2	4
	8689	1	530,48	265,24	-	-		1	-	-	1
	8902	6	12.945,86	3.087,30	-	-	4	1	-	1	6
	8917	1	207,54	0,00	-	-	-	1	-	-	1
	8918	1	694,46	556,78	-	-	1	-	-	-	1
Sub-Total		41	6.497.977,29	3.026.328,80	0	0	13	25	0	3	41
2040	8172	2	579,78	354,70				2			2
Sub-Total		2	579,78	354,70	0	0	0	2	0	0	2
2111	2000	17	22.934,85	8.889,68	1	5	10			1	17
Sub-Total		17	22.934,85	8.889,68	1	5	10	0	0	1	17
TOTAL		60	6.521.491,91	3.035.573,17	1	5	23	27	0	4	60

Fonte: AGI/SUDENE

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 20N9 – Apoio ao Associativismo e Cooperativismo; 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20WQ-Plano Orçamentário 05 – Divulgação das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;). Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade).

(2)- Inclui os projetos apoiados por transferências voluntárias, os de financiamento do FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração para o alcance da missão institucional.


(3)- Corresponde à participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento financiado pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais.

Convenções: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Nota: Os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência:30/05/2014 (2º Ciclo de monitoramento 2014)

O gráfico 3, por sua vez, revela que o objetivo estratégico 1.1 foi o que recebeu a maior parcela de recursos até o momento, incluindo saldos de RAP e investimentos do FDNE, compatível com a Missão da SUDENE, *de articular e fomentar a cooperação das forças sociais representativas para promover o desenvolvimento includente e sustentável do Nordeste, a preservação cultural e a integração competitiva da base econômica da Região nos mercados nacional e internacional.*

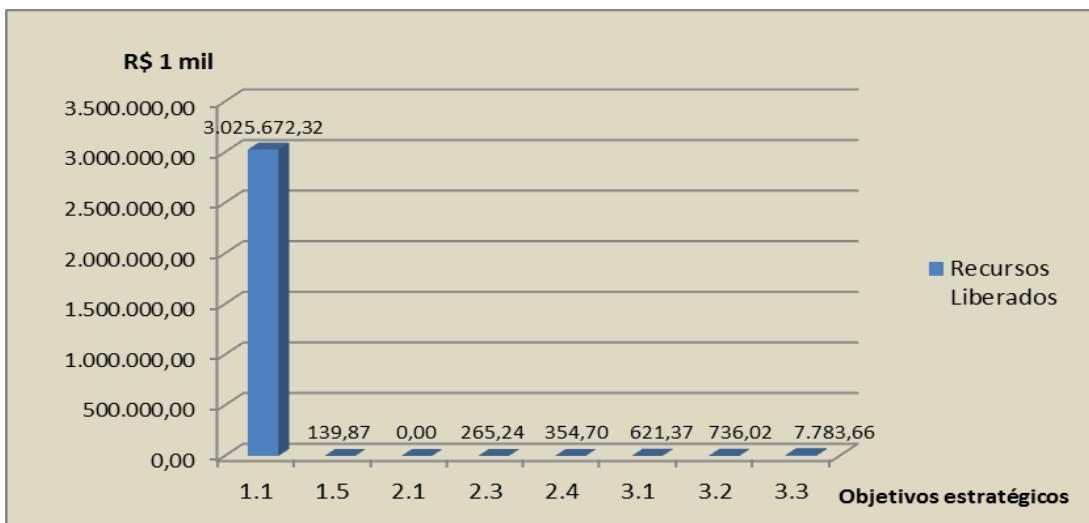

Fonte: Assessoria de Gestão Institucional

Gráfico 3 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (2º Ciclo – 2014)

2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC))

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Consultas Prévias protocoladas}} \times 100 = \frac{7}{7} \times 100 = 100,00\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e externo

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários:

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 98,6 %.

Nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 57,14% (1º Ciclo 2013).


Jun/2013 = 100% (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 100 % (3º Ciclo 2013).

Nov/2013= 100% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 100% (1º ciclo 2014)

h) Representação Gráfica:

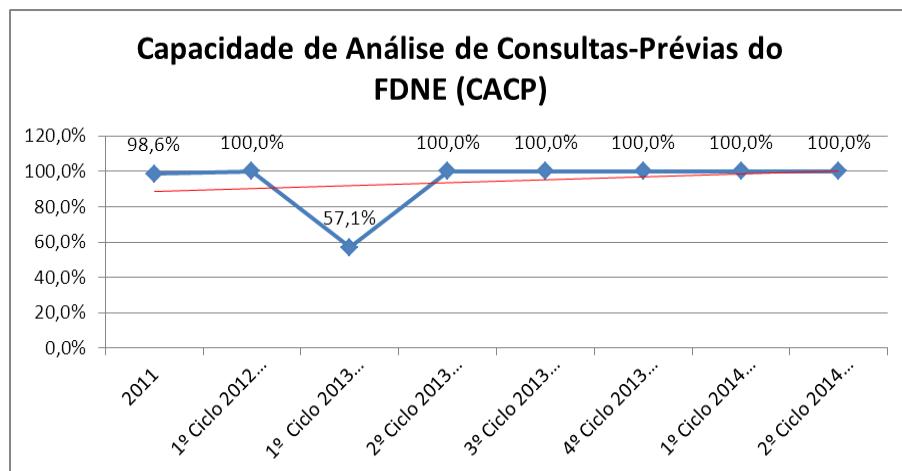

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídos as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{7}{2} = 3,50$ análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico: uso interno

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários:

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 2,05 análises/técnico (2011)

Nov/2012 = 0,67 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 2,67 análises/técnico (1º Ciclo 2013).


Jun/2013 = 6,00 análises/técnico (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 6,50 análises/técnico (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 11,67 análises/técnico (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 11,67 análises/técnico (1º ciclo 2014)

h) Representação gráfica:

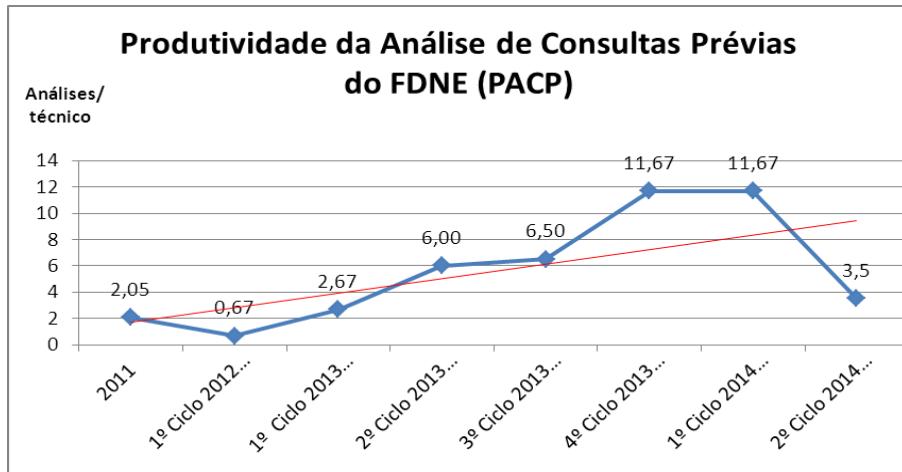

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

2.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{5 \times 100}{7} = 71,43\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: A devolução de Consultas Prévias foi decorrente de ausência de documentos necessários à conclusão da análise e/ou preenchimento inadequado do formulário padrão estabelecido.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 40,80 %.

Nov/2012 = 100,00 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013).


Jun/2013 = 50,00 % (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 46,15 % (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 40% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 40% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

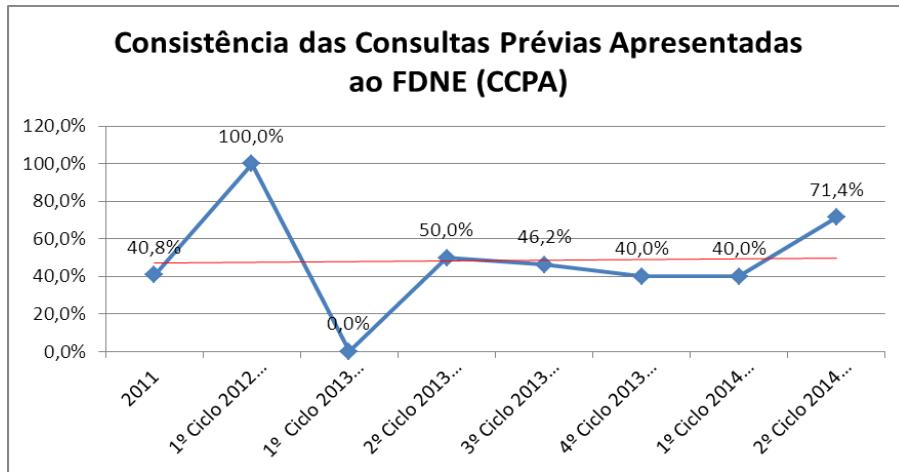

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{149 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,66$$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{150 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,67$$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: não houve demanda de análise de projeto para o BNB.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º Ciclo 2013). Incluía até então, apenas o BNB.


Jun/2013 = BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63 (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63 (3º Ciclo 2013).


Nov/2013 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63 (1º ciclo 2014)


i) Representação gráfica:

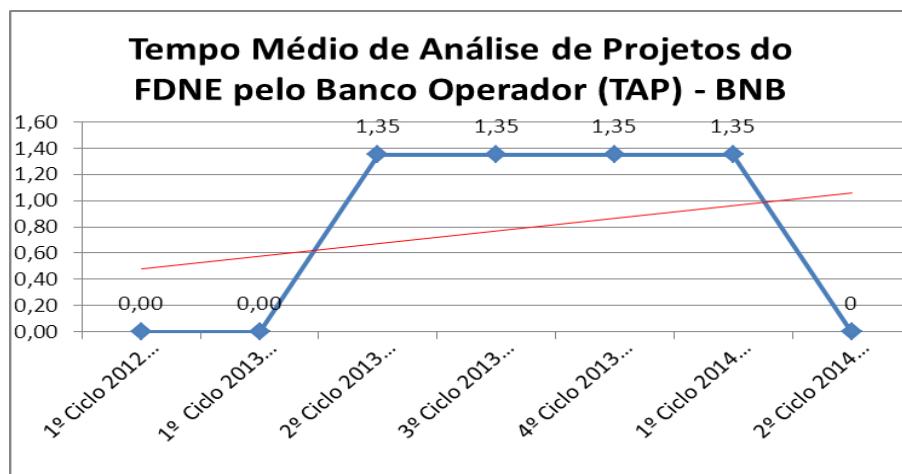

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

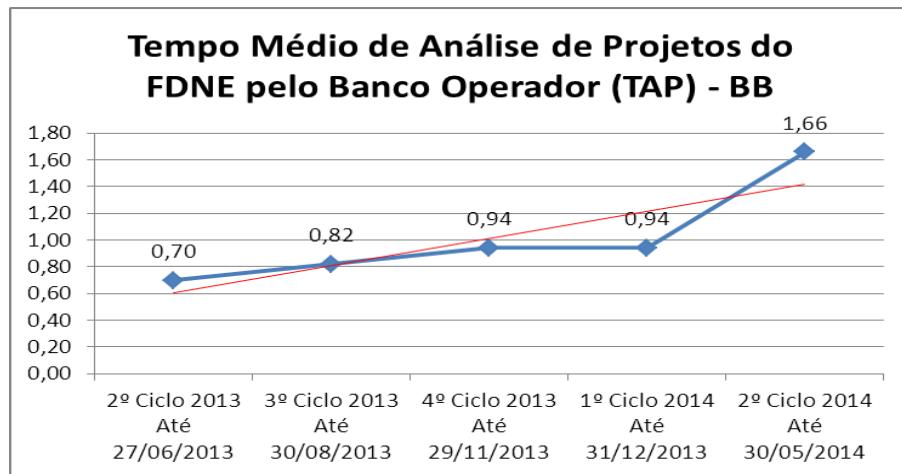

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

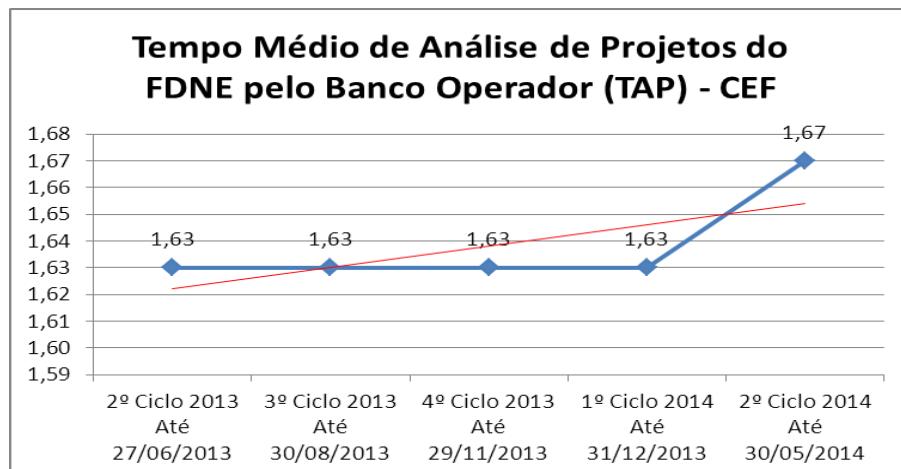

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0,00 \%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{1 \times 100}{1} = 100,00 \%$$

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{1} = 0,00 \%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

- e) Status hierárquico: uso interno e público
- f) Periodicidade: Jan-maio/2014
- g) Comentários: não houve demanda de análise de projeto para o BNB.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado pelas razões já expostas. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 0,00 % (1º Ciclo 2013) (incluía até então, apenas o BNB).


Jun/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 % (3º Ciclo 2013).


Nov/2013 = BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00% (1º ciclo 2014)


i) Representação gráfica:

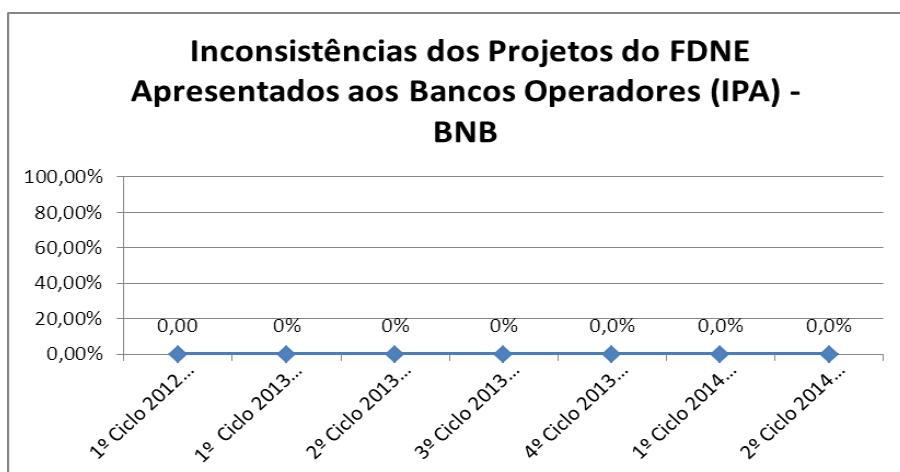

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

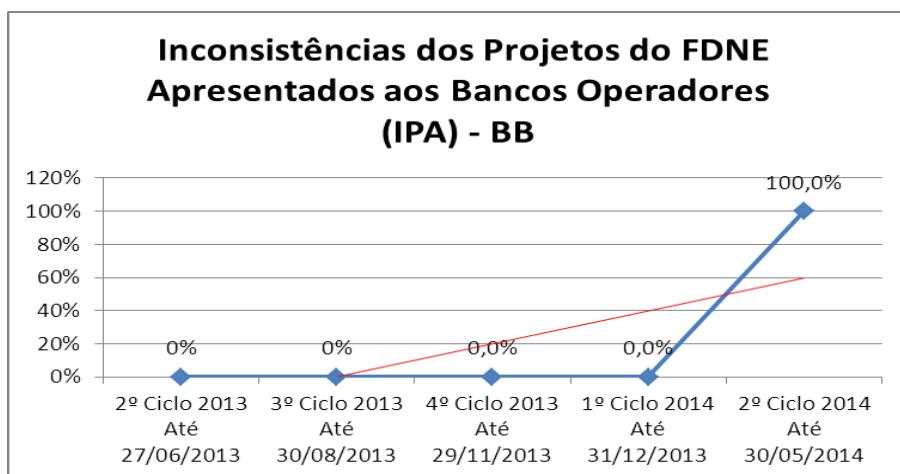

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

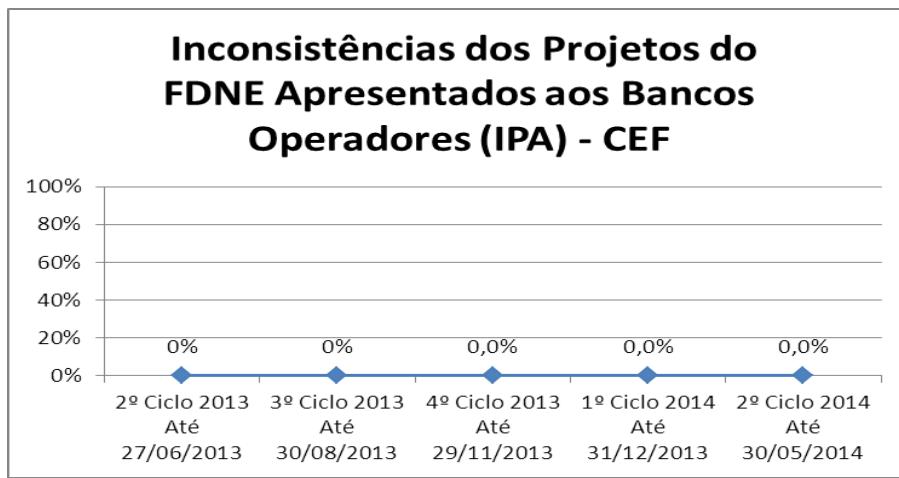

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado} \times 100}{\text{Dotação LOA}} = \frac{51.000.000,00 \times 100}{2.022.481.635,00} = 2,52\%$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: A meta de 100% de empenho deverá ser alcançada ao final do exercício.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 100,0 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 99,14 % (referência LOA 2012 e RAPs) (1º Ciclo 2013)


Jun/2014 = 61,24 % (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 61,24 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 56,26% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 100% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

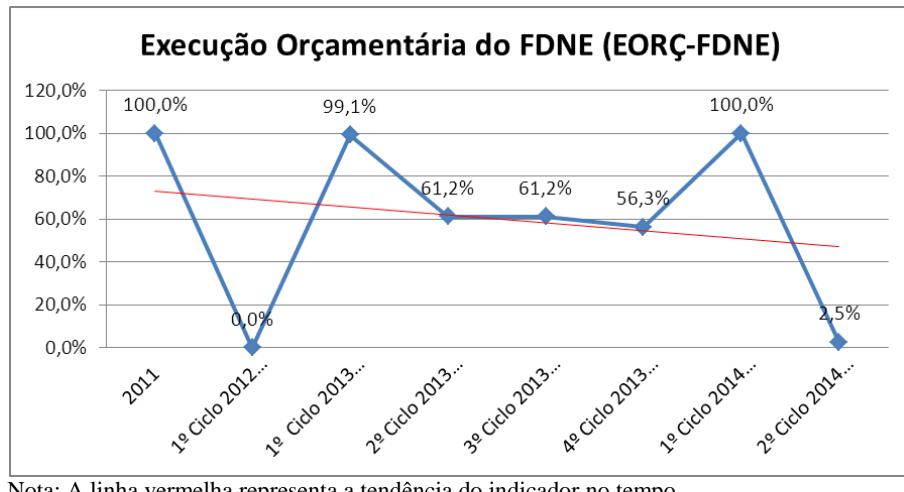

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Recursos Empenhados}} = \frac{562.794.206,49 \times 100}{6.649.354.817,29} = 8,46\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários:

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = 14,2 %

Nov/2012 = 0,0 % (1º e único Ciclo 2012).

Abr/2013 = 3,25 % (1º Ciclo 2013).


Jun/2013 = 11,70 % (2º Ciclo 2013).

Ago/2013 = 11,70 % (3º Ciclo 2013).

Nov/2013 = 18,43% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 18,43% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

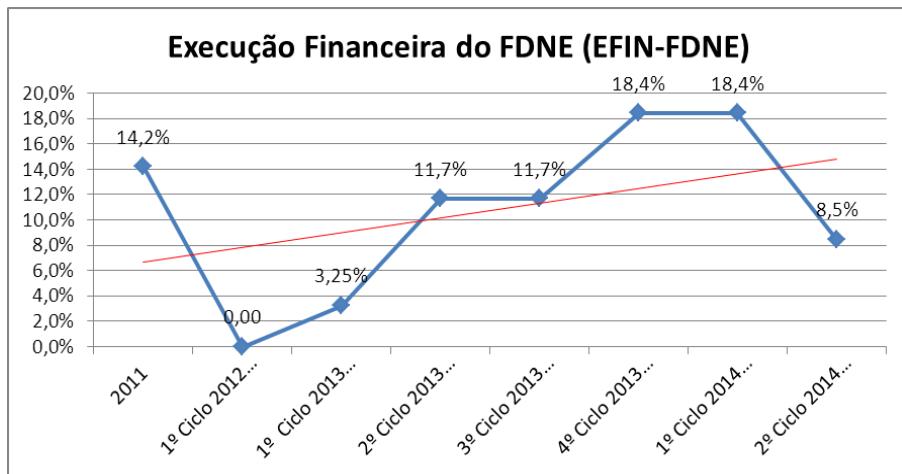

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1 \times 100}{30 \text{ dias}^1} = \frac{3 \times 100}{30} = 10,00\%$

b) Objetivo: Aferir o percentual que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: O percentual reflete a eficiência da equipe técnica, que utilizou apenas uma fração do tempo máximo legal para tanto.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)


Jun/2013 = 36,50% (2º Ciclo 2013)

Ago/2013 = 36,50 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 34,53% (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 34,53% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

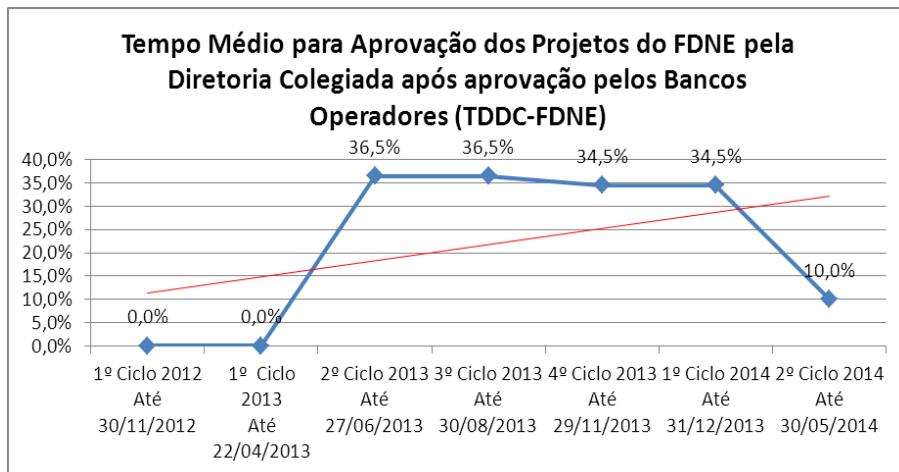

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Convenção:

M_1 – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $Tm = \frac{T}{N} = \frac{521}{2} = 260,50$ dias

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários:

h) Resultados anteriores:


Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013= cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 138,4 dias (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 138,4 dias (3º Ciclo 2013)
 Nov/2013 = 501 dias (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 501 dias (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

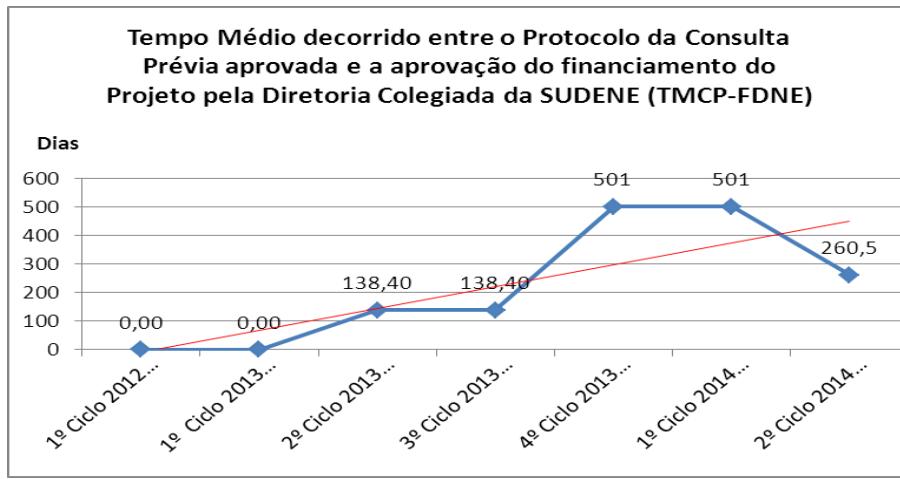

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:

- **T_m** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{2}{2} = 1,00$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)

e) Status hierárquico: uso interno e público

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: todos os projetos aprovados pelos Agentes Operadores (BB, BNB e CEF) tiveram o financiamento aprovado pela SUDENE.

h) Resultados anteriores:


Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 = cálculo prejudicado. (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = cálculo prejudicado. (1º Ciclo 2013)

Jun/2013 = 1,0 (2º Ciclo 2013)
 Ago/2013 = 1,0 (3º Ciclo 2013)
 Nov/2012 = 1,0 (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 1,0 (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

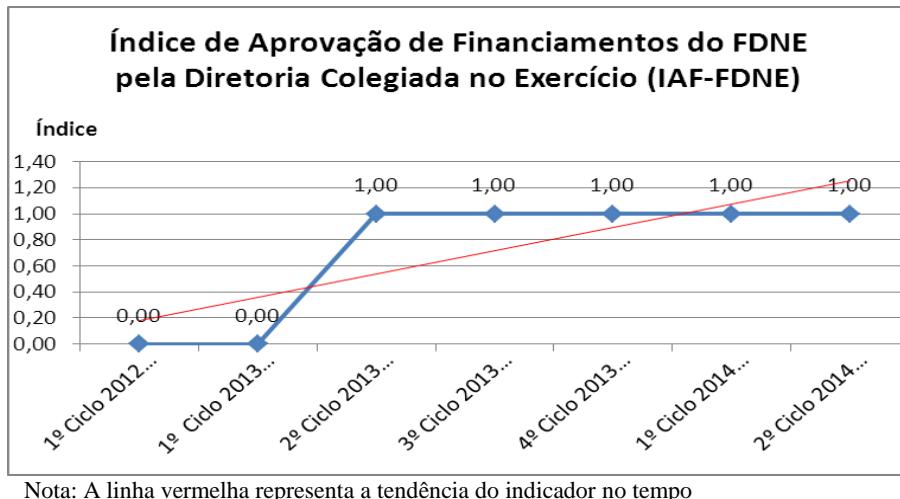

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- Fórmula: $\frac{T1}{N} = \frac{3.316 \text{ dias}}{40 \text{ pleitos}} = 83 \text{ dias/pleito}$
- Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado Ideal: Quanto menor melhor.
- Status Hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- Periodicidade: Jan-maio/2014
- Comentários:** no período iniciado em 1º de janeiro de 2014 e encerrado em 31 de maio de 2014, foram **vistoriados 40 estabelecimentos dos 131 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 83 dias**. O resultado foi basicamente afetado pelo período de férias uma vez que em janeiro não foram

realizadas vistorias e em fevereiro as vistorias somente tiveram início a partir do dia 17, e por 5 processos cujo prazo médio entre a formalização e a vistoria alcançou a 117 dias. O prazo médio de espera para esses pleitos oscilou entre 140 e 189 dias.

Em comparação com igual período de 2013, o resultado foi menos favorável, uma vez que o **Tempo Médio de Espera dos 5 primeiros meses de 2013 foi de 76 dias**.

O quadro abaixo distribui, nos meses indicados, os processos e suas respectivas vistorias.

meses	Processos formalizados	Vistorias realizadas
2012	1	1
2013	36	17
Janeiro de 2014	3	-
Fevereiro 2014	1	12
Março 2014	3	4
Abril 2014	-	6
Maio 2013	-	-
Total	44	40

Convenções:

T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 64,54 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 30,1 dias/pleito (1º Ciclo 2013)

Jan a dez/2012 = 63,2 dias/pleito (medição extra, feita pela própria unidade de incentivos)


Jan a mai = 76 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago = 64,4 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov = 68,5 dias/pleito (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 69,2 dias/pleito (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

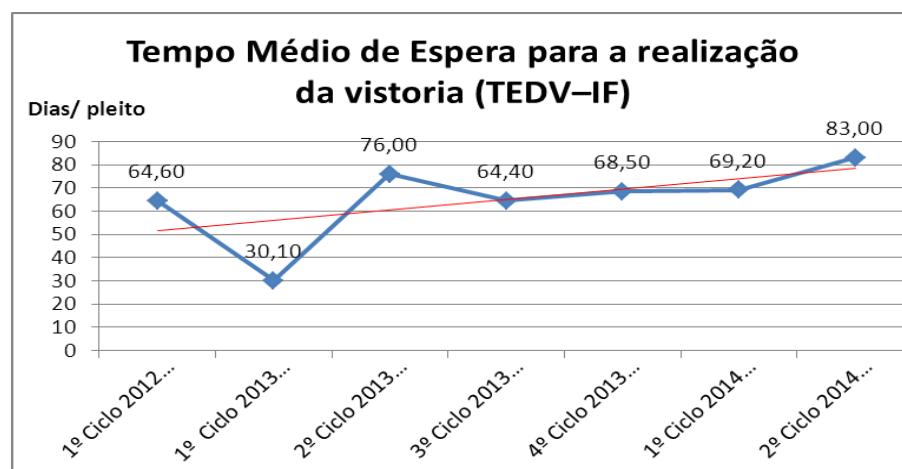


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota: Para aferir o período semestral, foram considerados os 5 meses do semestre examinado e o último mês do semestre anterior.

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no semestre} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no semestre}} = \frac{0 \times 100}{77} = 0,0\%$
- b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (%): Quanto menor melhor.
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e interno
- f) Periodicidade: Jan-Maio/2014
- g) Comentários: Não preenchido
- h) Resultados anteriores:
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 2,36% (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 0,00% (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 0,00% (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 0,00% (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 0,00% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 0,00% (1º ciclo 2014)
- i) Representação gráfica:

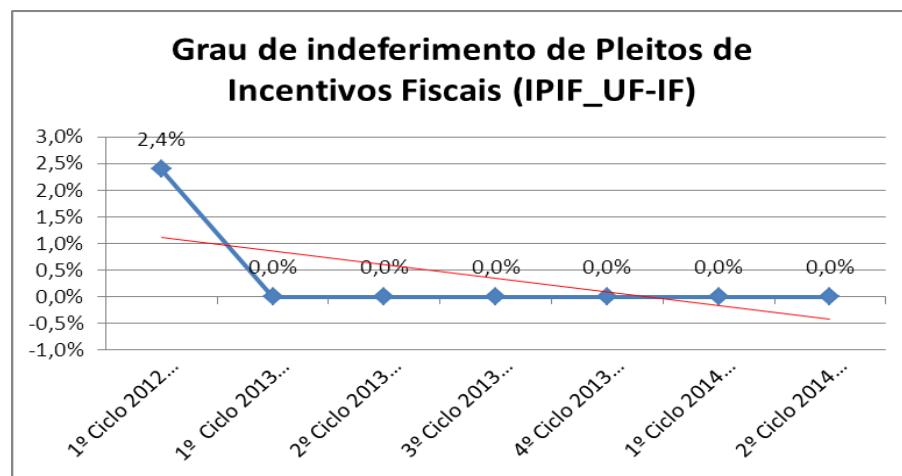

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:


- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no semestre e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial de um estado do Nordeste.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} = \frac{85 \times 100}{128} = 66,4\%$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Status hierárquico (uso público):
- f) Periodicidade: Jan-maio/2014
- g) Comentários: no período, foram concluídas 96 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 100% dos pleitos ingressados.
- h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 77,16 %. (1º e único Ciclo 2012)
Jul a dez/2012 = 90,00% (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 100,00% (2º Ciclo 2013)
Jan-ago/2013 = 75,4% (3º ciclo 2013)
Jan-nov/2013 = 62,9% (4º ciclo 2013)
Mar/2014 = 67,3% (1º ciclo 2014)

- i) Representação gráfica:

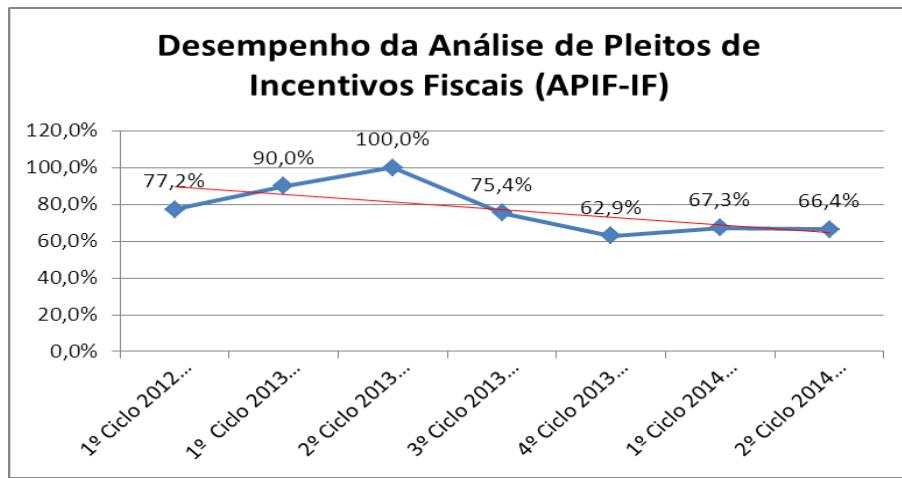

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)


- Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{9.627 \text{ dias}}{85} \cong 113,3$
- Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal (média): Quanto menor melhor
- Status hierárquico (uso público): Público e Interno
- Periodicidade: Jan-maio/2014
- Comentários: o prazo médio observado, de **113,3 dias** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros cinco meses de 2014 (85). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 150 dias, sendo de 74 dias para os processos de isenção do AFRMM e de reinvestimento.
Em igual período de 2013 o prazo médio observado foi de **67,7 dias**.

O acréscimo no prazo médio dispendido nos exames foi provocado, em grande parte, pela finalização da análise de 8 processos cujo prazo médio entre a formalização e a aprovação alcançou 255,4 dias, basicamente por problemas de documentação e de logística, com destaque para o pleito de interesse de Master Glasses Indústria e Comércio Ltda., com 488 dias entre a formalização e a aprovação, e o de interesse da Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. com 308 dias para sua aprovação.

- Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Dez/2011 a mai/2012 = 53,86 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)
 Jul a dez/2012 = 52,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 67,7 dias/pleito (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 62,2 dias/pleito (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 70,2 dias/pleito (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 76,7% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

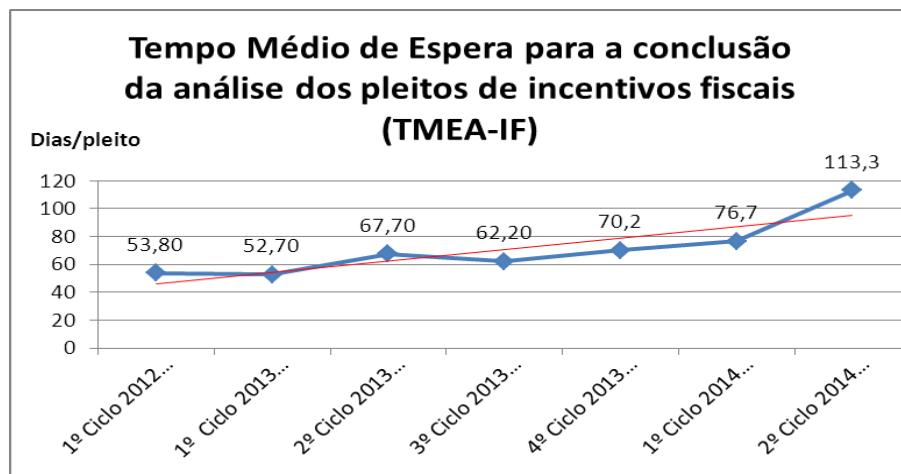

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Convenção:

T1 = Média aritmética da Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no semestre}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{85 \text{ análises}}{10 \text{ técnicos}} = 8,5 \text{ análises/técnico}$
- Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal: (quanto maior melhor)
- Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- Periodicidade: Jan-Maio/2014
- Comentários: o número observado, de 9,6 análises por técnico, é a nosso ver mais que satisfatório se levarmos em conta, além do período de férias de julho, o número de dias gastos com a realização das vistorias uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo. Deixamos de efetuar o cálculo em termos percentuais por entender que o resultado fica distorcido.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Dez/2011 a mai/2012 = 12,7 análises/técnico (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 14,4 análises/técnico (1º Ciclo 2013)


Jan a mai/2013 = 9,6 análises/técnico (2º Ciclo/2013)

Jan a ago/2013 = 15 análises/técnico (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013= 21,6 análises/técnico (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 29,8 análise/técnico (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

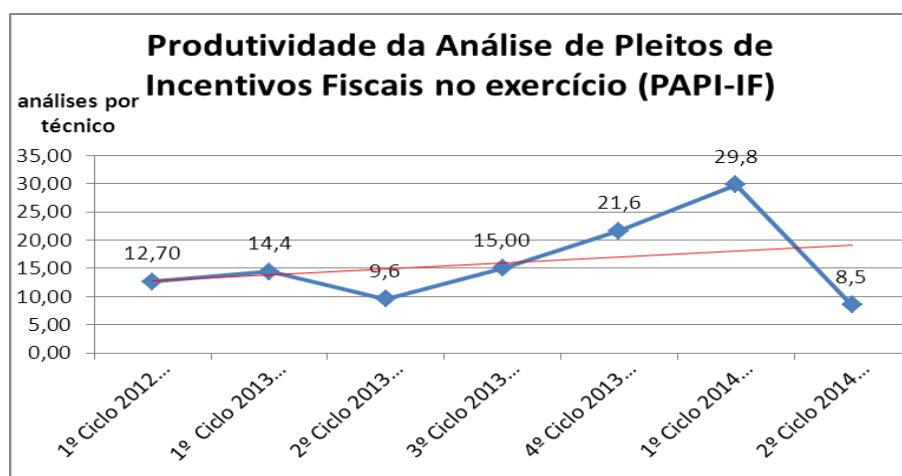


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

- Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{40 \text{ vistorias}}{5 \text{ equipes}} = 8 \text{ vistorias/equipe}$
- Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado ideal : (quanto maior melhor)
- Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- Periodicidade: Jan-maio/2014
- Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 40 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- Resultados anteriores:
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Dez/2011 a mai/2012 = 12,4 vistorias/equipe. (1º e único Ciclo 2012)

Jul a dez/2012 = 18,2 vistorias/equipe (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 8 vistorias/equipe (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 12,4 vistorias/equipe (3º ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 18,6 vistorias/equipe (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 32,4 vistorias/equipe (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

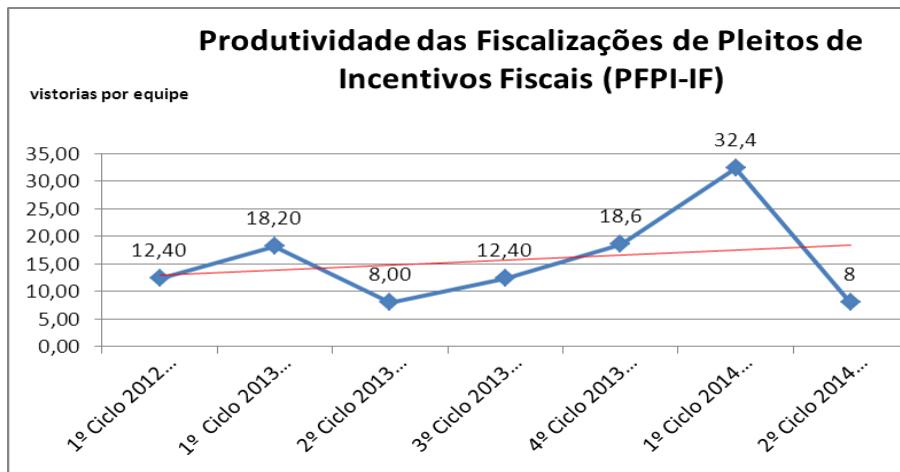

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{11 \times 100}{15} = 73,33\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período de aferição: janeiro-maio/2014.

g) Comentários: Foram apresentadas 15 propostas, tendo sido analisadas no período desta 2º ciclo de 2014 11 propostas. Ressalta-se que consultando o SICONV verifica-se a relação de 16 propostas, entretanto, uma delas encontra-se em duplicidade.


h) Resultados Anteriores (CAPC):

Dez/2011 = 100,0 %

Jan a nov/2012 = 100,0 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 65,6 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 0,0% (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)
 Jan a nov/ 2013 = 86,79 % (4º ciclo 2013)
 Mar/2014 = 92,45% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

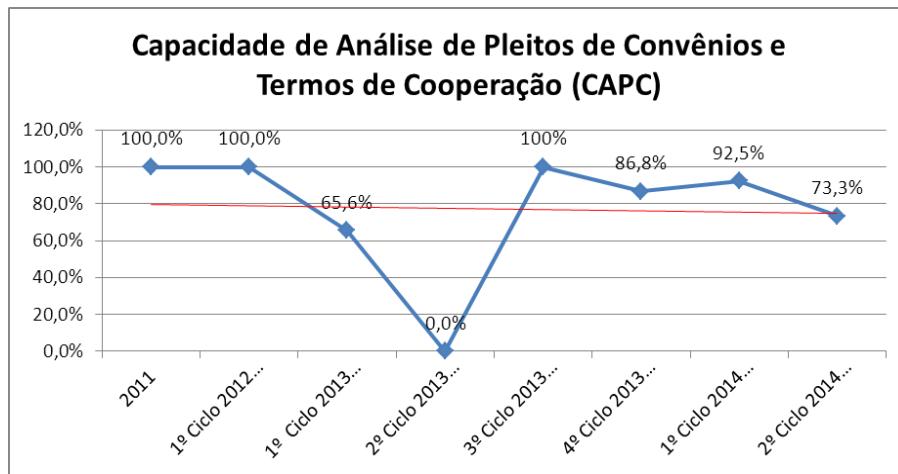

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{2 \times 100}{11} = 18,18\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: janeiro-maio/2014

g) Comentários: Neste período, foram aprovados duas proposta, das 11 analisadas.

h) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = 14,6 %

Jan a nov/2012 = 21,74 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 38,6 % (1º Ciclo 2013)


Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 25,0% (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 23,91 % (4º ciclo 2013)

Mar/2014 = 22,45% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

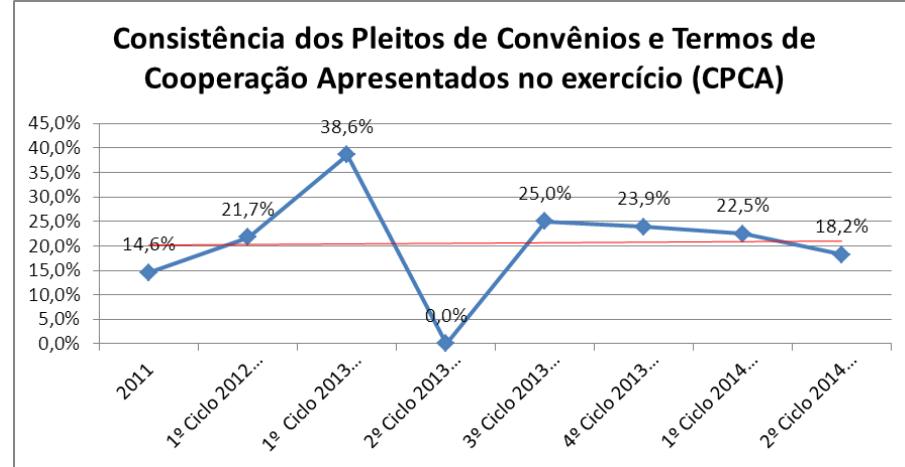

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} = \frac{9 \times 100}{15} = 60,0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Período da aferição: janeiro-maio/2014

g) Comentários: Dentro das 9 propostas rejeitadas, 6 foram por impedimento técnico, que deverão ser reapresentadas para uma nova análise.

h) Resultados Anteriores (IIC):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a nov/2012 = 13,04 % (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 74,6 % (1º Ciclo 2013)


Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 75,0 % (3º Ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 56,6 % (4º ciclo 2014)

Mar/2014 = 62,26% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

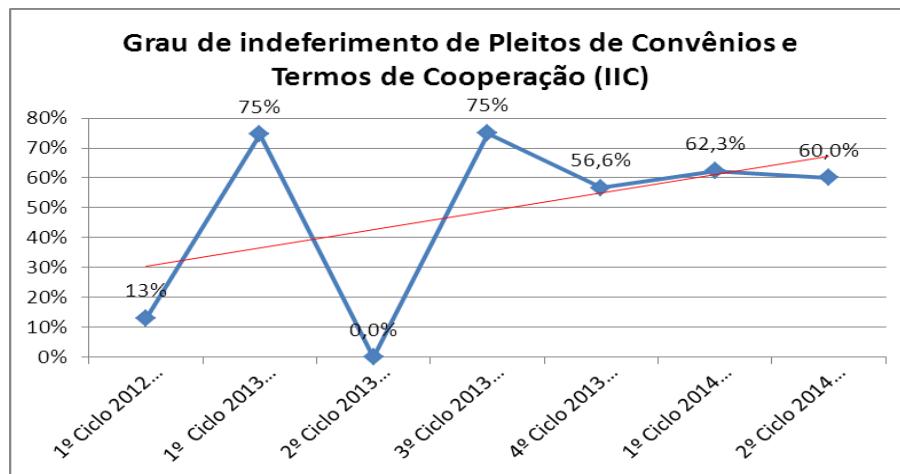
Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

O quadro adiante objetiva demonstrar a relação de pleitos protocolados no período.


PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO A MAIO / 2014 - CGDS / SUDENE

Número da Proposta	Nome do Proponente	UF do Proponente	Programa	Possui Parecer	Situação
1 039978/2014	MONTE ALEGRE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
2 039973/2014	LAGES PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
3 039971/2014	BREJINHO PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
4 039733/2014	MAXARANGUAPE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
5 039638/2014	SAO VICENTE PREFEITURA	RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
6 039633/2014	MUNICIPIO FLORIANIA	DE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária / A??o 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico
7 036529/2014	ESTADO DA PARAIBA	PB	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
8 036442/2014	ESTADO DE SERGipe - ADMINISTRACAO DIRETA	SE	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 82029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
9 036438/2014	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA, E ABASTECIMENTO	MG	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 8917 - FORTALECIMENTO DAS ADMINISTRAÇÕES LOCAIS - Programação	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
10 036339/2014	MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	MG	2040 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES / 8172 - COORDENAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
11 036275/2014	EMPRESA EST DE PESQUISA E TECNOLOGIA DA PARAIba S/A	PB	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs Plano Brasil sem Miséria	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
12 036138/2014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	PE	2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA / AÇÃO 8689 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO - PROGRAMAÇÃO	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados
13 024010/2014	MESSIAS TARGINO PREFEITURA	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
14 023207/2014	DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs Plano Brasil sem Miséria	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
X 023169/2014	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA	CE	2029-DESENVOLVIMENTO REGIONAL / 20N7 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA PARA APLs Plano Brasil sem Miséria	Não	Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise
15 020551/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	2029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA SOLIDARIA - AÇÃO 8902 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA	Sim	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados

LEGENDA	
PROPOSTAS ANALISADAS E REJEITADAS	
PROPOSTAS A SEREM ANALISADAS	
PROPOSTAS ANALISADAS E APROVADAS	
PROPOSTA ENVIADA EM DUPLOCIDADE	

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} \times 100 = \frac{8}{8} \times 100 = 100\%$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Período da aferição: Jan-maio/2014
- g) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 8 viagens de acompanhamento da parte física dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.
- h) Resultados Anteriores (DFCON):
 Dez/2011 = Não existia o indicador.
 Jan a nov/2012 = não informado pela unidade. (1º e único Ciclo 2012)
 Jan a dez/2012 = 100,0 % (1º Ciclo 2013)
 Jan a mai/2013 = 0,0 % (2º Ciclo 2013)
 Jan a ago/2013 = 100,0 % (3º Ciclo 2013)
 Jan a nov/2013 = 100,0 % (4º ciclo 2013)
 Mar/2014= 100,0% (1º ciclo 2014)
- i) Representação gráfica:

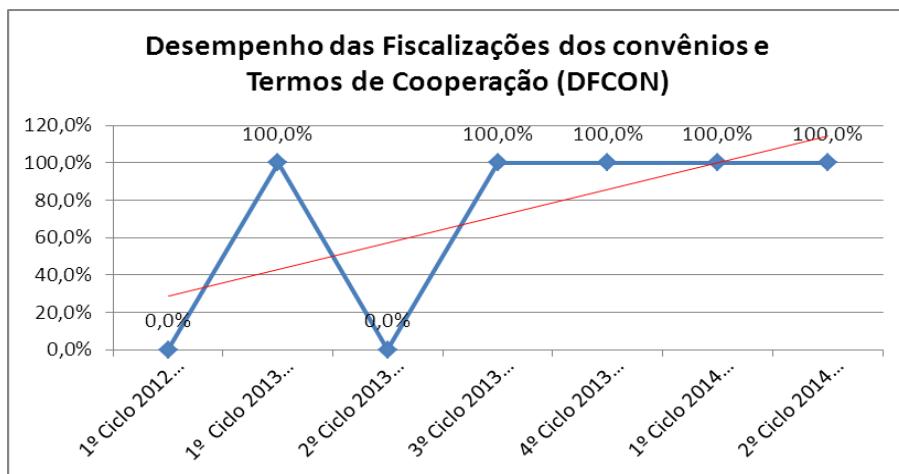

Adiante constam as fiscalizações realizadas e seus objetivos.

1 - Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura.

Período: 28 à 31.01.2014

Técnico: Marcelo Viana

Local: Araripina, Serra Talhada, Moreilândia-PE

2 - Realizar visita técnica de acompanhamento do convênio nº 770741/2012 que trata do Projeto de Capacitação dos Integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Estado da Paraíba

Período: 30.01.2014

Técnicos: Juliana Borges e Macira Sotero

Local João Pessoa –PB

3 - Realizar viagem de supervisão aos cursos de capacitação de apicultura previstos no Projeto de Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas da Ovinocaprinocultura e Apicultura no Estado de PE

Período: 04 a 06.02.2014

Técnico: Marcelo Viana

Local: Floresta e São José do Egito

4 - Realizar visita de acompanhamento final do Projeto Aprisco Seridó, convênio SICONV 710365/2009 – na região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte-RN

Período 1102 a 13.02.2014-03-31 Técnico: Victor Uchoa

Local: Natal e Jardim do Seridó-RN.

5 - Visita Técnica para emissão de Laudo Técnico do convênio SICONV 744654/2010 – ao município de Timbau do Sul, no Estado do Rio Grande do Norte.

Período: 20 a 21.02.2014.

Técnica: Maria Helena Castro

Local: Timbau do Sul-RN.

6 - Realizar supervisão final do convênio nº 767485/2011, celebrado com o Município de Riacho de Santana, no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas a emissão de Laudo Técnico

Período: 19 a 21.03.2014.

Técnico Agrimon Marcos

Local Riacho de Santana-RN

7 - Realização dos trabalhos de vistoria de campo nos convênios da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedra/RN – SICONV nº 737691/2010 (conclusão de obras de urbanização), Prefeitura Municipal de Assu/RN – SICONV 768007/2011 (obras de pavimentação em asfalto CBUQ em ruas) e Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa-RN, SICONV 770860/2012 (construção de uma ponte de concreto armado) para emissão de Laudo técnico.

Período: 09.04 a 11.04.2014

Técnico: Edson Laranjeiras

Local: Lagoa de Pedra, Assu e Ruy Barbosa-RN

8 – Verificar no local onde vai se realizar as reformas dos mercados públicos de Messias Targino/RN e Jardim de Piranhas/RN, a viabilidade de realização de convênios.

Período: 06.05 a 08.05.2014.

Técnico: Edson Laranjeiras

Local: Messias Targino-RN e Jardim de Piranhas-RN

4.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTCP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{179 \text{ dias}}{03 \text{ pleitos}} = 59,66 \text{ dias/pleito}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: As demandas de solicitação de celebração de convênios são encaminhadas pela DPLAN, entretanto, até a presente data, nenhum convênio foi celebrado. Apenas tramitaram pela CGC, até 30/05/14, 03 (três) processos de pleitos em tramitação, os quais foram encaminhados para empenho.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = 13,8 dias/pleito (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = 13,7 dias/pleito (1º Ciclo 2013)


Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 0 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 0 dias/pleito (4º ciclo 2014)

Mar/2014= 16,27 dias/pleito (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

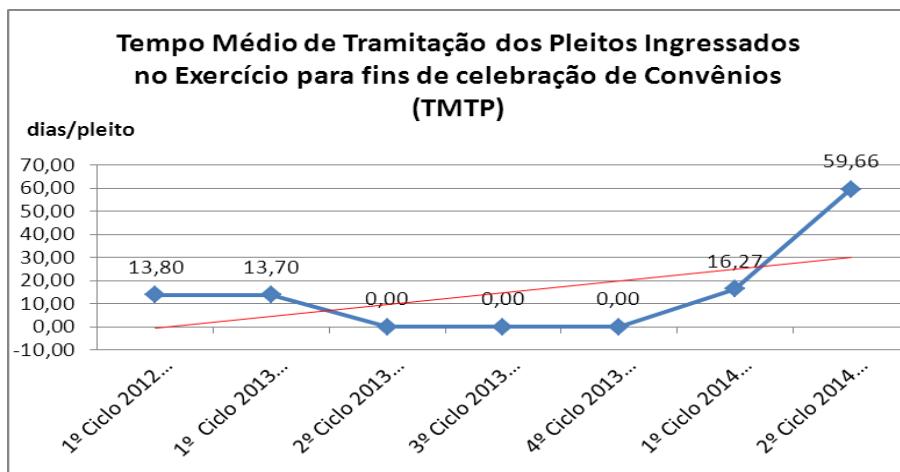

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{10 \text{ dias}}{2 \text{ pleitos}} = 5 \text{ dias/pleito}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios

d) Resultado ideal (dias/pleito): (quanto menor melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Periodicidade: Jan-maio/2014

g) Comentários: Até o dia 30/05/14, foram celebrados 02 (dois) Termos de Cooperação.

h) Resultados anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Jan a out/2012 = Não existia o indicador (1º e único Ciclo 2012)

Jan a dez/2012 = Não existia o indicador (1º Ciclo 2013)


Jan a mai/2013 = 0 dias/pleito (2º Ciclo 2013)

Jan a ago/2013 = 5 dias/pleito (3º ciclo 2013)

Jan a nov/2013 = 5 dias/pleito (4º ciclo 2013)

Mar/2014= 5 dias/pleito (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

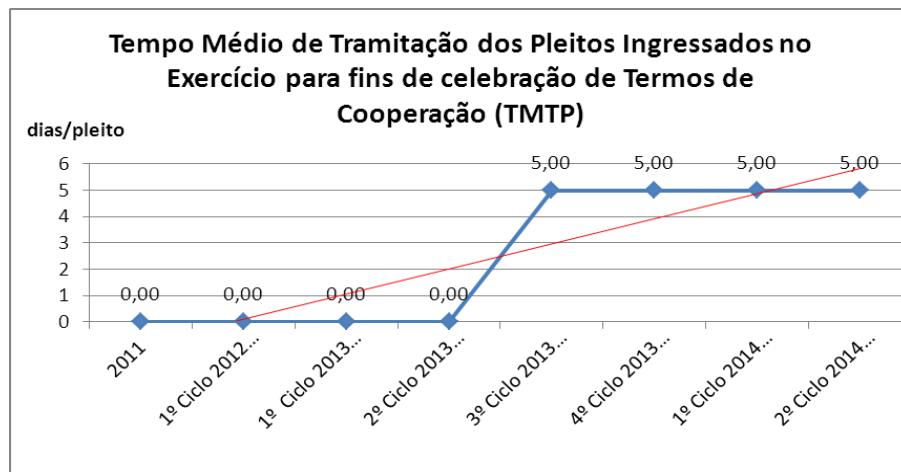

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).


Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \frac{37 \times 100}{36} = 102,7\%$
- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios, com o apoio da Comissão Permanente de TCE.
- d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)
- e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- f) Periodicidade: Jan-maio/2014
- g) Comentários: Percebe-se que a SUDENE vem reduzindo, de forma significativa o passivo dos Convênios, no entanto os processos aqui citados são Convênios celebrados pela extinta SUDENE e pela ADENE, ou seja, fazem parte do passivo da SUDENE. Outrossim, a Autarquia vem adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico, emissão de Análise Financeira e Notificação aos convenentes, entretanto ainda persiste a dificuldade de pessoal. Em cumprimento às determinações legais, bem como dos órgãos de controle, tentamos esgotar todas as providências administrativas, antes de instaurar Tomada de Contas Especial. Vale lembrar, que existem processos na situação de "A PROVAR", que estão localizados na CPTCE, ou seja, estão em Tomada de Contas Especial. Neste contexto, para que o índice reduza é necessário a conclusão dos convênios em TCEs. O resultado maior que 100 % decorreu de revisão do enquadramento de convênio no SIAFI, passando a situação final a uma quantidade maior que a inicial.
- h) Resultados anteriores:
Dez/2011 = não existia o indicador.
Jan a out/2012 = não foi apurado. (1º e único Ciclo 2012)
Jan a dez/2012 = 80,4 % (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 95,1 % (2º Ciclo 2013)
Jan a ago/2013 = 92,7 % (3º Ciclo 2013)
Jan a Nov/2013 = 87,8% (4º ciclo 2013)
Mar/2014= 87,8% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

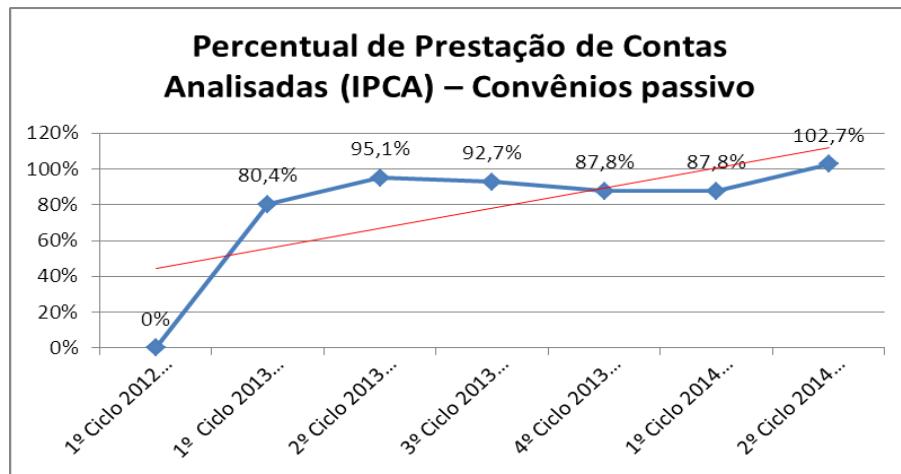


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009

- Fórmula: $\frac{\text{Nº Final de Convênios "A Aprovar"} \times 100}{\text{Nº Inicial de Convênios "A Aprovar"}} = \frac{8 \times 100}{4} = 200\%$
- Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios
- Resultado Ideal (%): % (Quanto menor melhor)
- Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno
- Periodicidade: Jan-maio/2014
- Comentários: A SUDENE está adotando, dentro do possível, as providências necessárias ao encerramento das avenças: emissão de Laudo Técnico (CGDS), emissão de Análise Financeira (CGC) e notificação aos convenentes (CGC), entretanto tem dificuldades de pessoal. Lembramos, outros sim, as dificuldades dos convenentes na operacionalização do SICONV. O convenente só deve encaminhar a Prestação de Contas, no SICONV, após o encaminhamento, a análise e aprovação dos Relatórios de Execução, em cumprimento aos Manuais de operacionalização do SICONV. A tendência deste percentual será sempre de aumentar, haja vista a celebração de novos convênios em cada exercício, ou seja, o volume de convênios firmados, e consequentemente o volume de Prestação de Contas apresentadas no SICONV. Inclusive as análises das Prestações de Contas dos convênios, celebrados no SICONV, são mais céleres.
- Resultados anteriores:
Dez/2011 = Não existia o indicador.
Jan a out/2012 = 92,7 % (1º e único Ciclo 2012)
Jan a dez/2012 = 75,0 % (1º Ciclo 2013)
Jan a mai/2013 = 71,4% (2º Ciclo 2013)
Jan a ago/2013 = 57,1 % (3º Ciclo 2013)

Jan a Nov/2013 = 57,1% (4º ciclo 2013)
 Mar/2014= 57,1% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica:

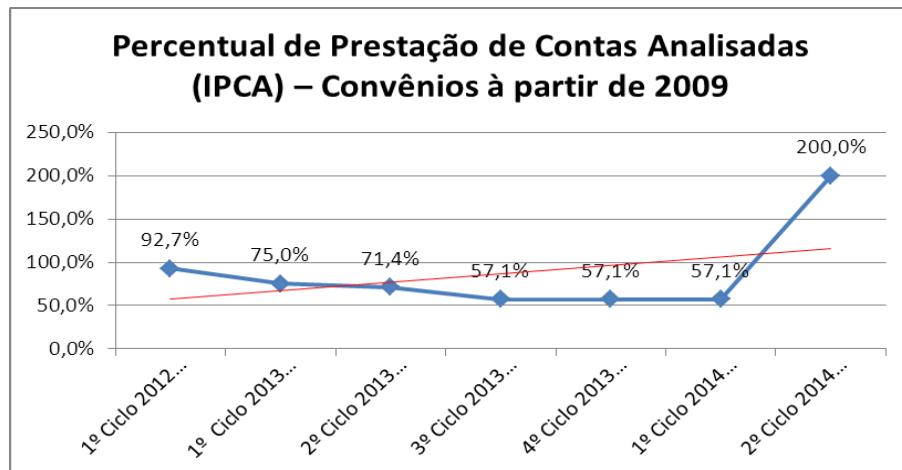

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

Os dados não foram apresentados pela Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

Os dados não foram apresentados pela Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

Os dados não foram apresentados pela Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{50\% + 18\% + 87\% + 20,95\%}{4} = 43,99\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): Público e Interno

f) Data da aferição: 30/mai/2014

g) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (50%); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (18%); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (87%); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (20,95%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

h) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 42,6 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 (4 projetos) = 33,9 % (resultado influenciado pelo detalhamento revisto desses projetos) (1º Ciclo 2013)


Até mai/2013 = 43,67% (2º Ciclo 2013)

Até ago/2013 = 61,7% (3º Ciclo 2013)

Até nov/2013 = 38,55% (4º ciclo 2013)

Mar/2014= 41,63% (1º ciclo 2014)

i) Representação gráfica

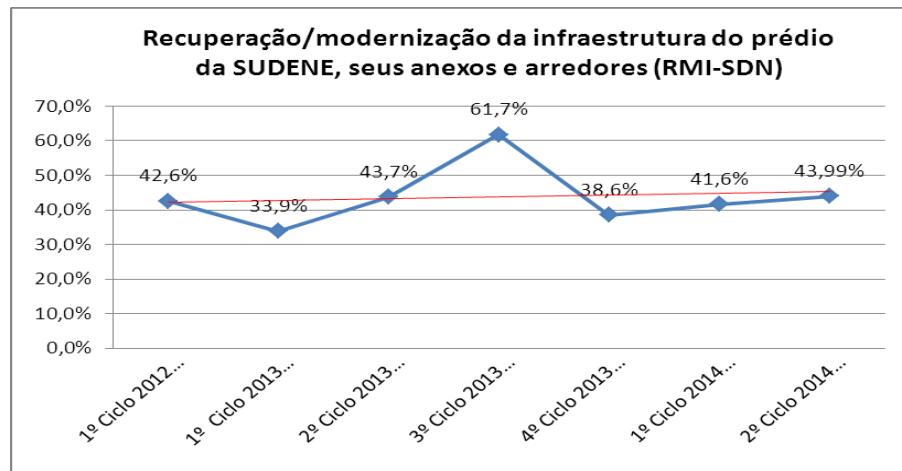

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido do respectivo Plano Operativo interno.

² O resultado apresentou-se menor que no relatório anterior em razão da incorporação de etapas que haviam sido inicialmente suprimidas em dois dos Planos Operativos dessas obras.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos} \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} =$

$$\frac{(2.630.114,65+30.000,00+5.023.543,17+100.000,00) \times 100}{3.193.554,19+30.000,00+8.229.186,02+2.940.394,45} = 54,08 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação das fundações do prédio sede, recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, sistema de combate a incêndio e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): público.

f) Data da aferição: 30/maio/2014

g) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.630.114,65 e novo limite autorizado acumulado=R\$ 3.193.554,19); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (aplicado acumulado de R\$ 30.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 30.000,00). f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 5.023.543,17 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.229.186,02); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 2.940.394,45). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

h) Resultados Anteriores:

Dez/2011 = Não existia o indicador.

Nov/2012 (4 projetos) = 60,7 % (1º e único Ciclo 2012)

Abr/2013 = 48,5 % (1º Ciclo 2013)

Mai/2013 = 60,4 % (2º ciclo 2013)


Ago/2013 = 42,6 % (3º Ciclo 2013)

Nov/2013 = 73,92 % (4º ciclo 2013)

Mar/2014= 53,56% (1º ciclo 2014)

Nota: os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

i) Representação gráfica:

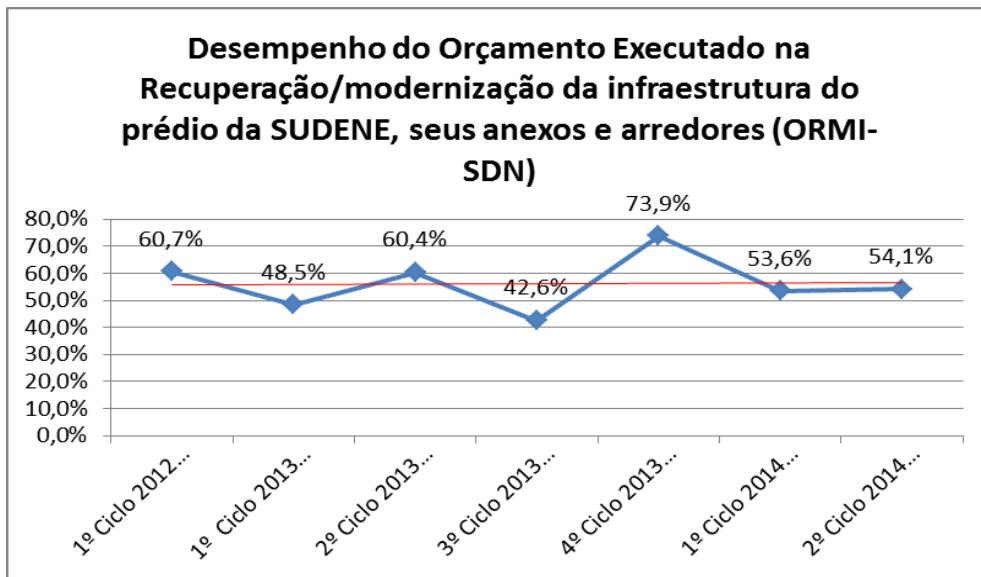

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional de projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 107, de 28/11/2013 (ADI)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc. executado das metas e dos projetos¹ =

$$\frac{76\% + 68\% + 60\% + 67\% + 41\% + 62\% + 80\% + 81\% + 38\% + 54\% + 100\% + (\quad \%) + 100\% + 46\% + 95\%}{15} =$$

$$= 69\%$$

b) Objetivo: Aferir o estágio de execução do conjunto dos projetos estratégicos escolhidos como metas para avaliação de desempenho institucional, cuja apuração final dar-se-á em 30/set/2014.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Gestão Institucional (AGI).

Nota: As fontes de dados são as detentoras de projetos inscritos na Portaria SUDENE nº 107/2013, quais sejam: Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento (DPLAN); Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN); Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais, (DGFN), Coordenação-Geral de Administração e Finanças (DAD/CGAF) e Assessoria de Gestão Institucional.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Status hierárquico (uso interno ou público): público.

f) Período da aferição: até mai/2014

g) Comentários: Os valores utilizados no cálculo foram obtidos da relação entre metas alcançadas e previstas (caso dos novos investimentos do FDNE aprovados até mai/14 e não inscritos nas apurações realizadas até set/2013), bem como, dos percentuais físicos dos planos operativos (projetos) selecionados segundo programas e ações do PPA 2012-2015, e

Diretrizes/objetivos estratégicos do planejamento estratégico da SUDENE, formalizados por meio da Portaria nº 107, de 28 de novembro de 2013, que estabeleceu as metas de desempenho institucional a serem apuradas em 30/set/2014.

h) Quadro de metas e resultados alcançados:

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual apontado pelo PO ou pela unidade administrativa	Status
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração da unidade	Projeto implementado	1	76%	Em Andamento
	4572-Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada*	40	68%	Em Andamento
	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos atendidos	341	60%	Em Andamento
	0355-Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R\$ 2.000.000.000	67%	Em Andamento
	8340-Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Projeto	1	41%	Paralisado
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918-Ampliação e fortalecimento das Estruturas Produtivas	Projeto	1	62%	Em Andamento
	20N9-Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Projeto	1	80%	Em Andamento
	8902-Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Projeto	1	81%	Em Andamento
	8689-Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Projeto	1	38%	Atrasado
	4640-Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Projeto	1	54%	Atrasado
2068 - Saneamento Básico	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco (Áqua para Todos)	Famílias beneficiadas	4000	100%	Concluído
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.2- Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Projeto	2	A definir!	A Iniciar
	O1.5-Fortalecer as administrações públicas	Oficinas de capacitação realizadas	12	100%	Concluído
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	1	46%	Em Andamento
	O3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planos aprovados	2	95%	Atrasado
MÉDIA ARITMÉTICA				69%	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Assessoria de Gestão Institucional da SUDENE.

Observações:

- a) Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.
- b) Todos os dados informados são de responsabilidade dos gestores de cada projeto.

Referência dos dados: 2º Ciclo 2014 - 30/05/2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

i) Resultados anteriores:

Mar/2014 = 51% (1º Ciclo 2014)

j) Representação gráfica:

Existem apenas dois pontos apurados, que não são suficientes para uma expressão gráfica.

Notas:

¹ Os projetos referenciados são os constantes de Planos Operativos internos que se utilizam de programas do PPA e das definições estratégicas da Superintendência da SUDENE, relacionadas no quadro acima, inclusive metas de investimento do FDNE. A célula do numerador, que está em branco, refere-se aos dois projetos do Obj Estratégico da SUDENE nº 1.2, ainda em aberto, que será definido em reunião a ser realizada antes do final de agosto.

² Não puderam ser atualizados os resultados da Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos, por falta de apresentação das informações pela Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos/Diretoria de Administração, como também, os dados da Ação 8340-Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e do Objetivo Estratégico 1.2 – Fortalecimento da Infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da Cadeia Produtiva, estes, da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas.

8 – Conclusão

Devido à não realização da reunião de monitoramento, não houve deliberações da Diretoria Colegiada, contudo, alguns aspectos do monitoramento merecem registro.

Inicialmente cabe destacar que, apesar dos insistentes pedidos, formais e informais, a Coordenação de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento, da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas da Autarquia não encaminhou os planos operativos atualizados referentes aos projetos PO 13- Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro; PO 14 – Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE; PO 15 – Malha Aerooviária Regional; PO 16 – Projeto de Inserção Tecnológica na Educação – PITE; PO 17 – Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE). Também não encaminhou os seus indicadores de gestão de recursos humanos, a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humano, da Diretoria de Administração.

Outrossim, foi notada a quantidade de projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste na situação de atraso, e entre tantos motivos, todos de origem externa, está a dificuldade para a atualização tempestiva dos cronogramas de execução por parte dos bancos operadores do fundo, fato que tem repercutido na agenda de desembolsos administrada pela Autarquia, provocando, com certa frequência, o registro de atraso para um projeto que se encontre nessa condição, daí que, de um total de vinte e cinco POs, dezenove se apresentaram, neste 2º ciclo, nessa condição.

Outro aspecto a ser considerado, é a situação dos projetos paralisados, condição que recomenda a adoção de providências por parte da Diretoria Colegiada sobre as medidas a serem adotadas. São os casos dos Planos Operativos PO 15 – Malha Aerooviária Regional; que mobilizou representantes de diversos segmentos do setor, porém o assunto terminou centralizado pela Casa Civil da Presidência da República, culminando com a paralisação dos trabalhos; PO 16 – Projeto de Inserção Tecnológica na Educação – PITE. Esse projeto, devido a limitações orçamentárias e orientações da CGU/PE foi revisto em sua concepção, vindo a requerer redimensionamento e a necessidade de nova articulação com os estados do Nordeste, que não demonstraram a mesma motivação na sua continuidade, diferentemente do que ocorria nos idos de 2012; PO 17 - Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE). Esse projeto era, na realidade, um programa de apoio à pesquisa e inovação para a melhoria da competitividade de diferentes segmentos do semiárido nordestino. A sua maior dificuldade foi orçamentária em razão da impossibilidade do Ministério da Integração Nacional, ao qual estamos vinculados, disponibilizar os recursos na oportunidade em que estes se faziam necessários; PO 51 – Recuperação das Fundações do Edifício Sudene. A maior dificuldade para a continuação dos trabalhos (Etapa II) estava vinculada à desocupação, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Esta operação, segundo a unidade de engenharia da SUDENE, foi concluída. Por sua vez, a proposta do terceiro termo aditivo para esses trabalhos também, e na data de fechamento do relatório, a empresa Jatobeton, estava preparando contraproposta para retomada dos serviços.

Uma questão também recorrente na incidência de atrasos tem sido a deficiência do planejamento por parte de entidades públicas detentoras de convênios com a SUDENE, e isso tem se demonstrado pelos inesperados atrasos em fases que envolvem licitação, situação que impacta o cronograma de execução do plano de trabalho, levando à necessidade de aditivações que normalmente não são tempestivamente apresentadas à Autarquia, refletindo isso no status do projeto no momento da avaliação pelo monitoramento.

Por fim, em que pesem as mudanças positivas dos processos internos de controle, algumas melhorias ainda se fazem necessárias, e podem ser implementadas pelas próprias unidades, principalmente aquelas que levem à antecipação de medidas para redução de riscos, principalmente no que tange ao acompanhamento da execução física, tanto para contratos como para convênios, situação que sugere capacitação especializada para tal, a ser incluída no plano de capacitação da Autarquia.

Para os próximos ciclos o calendário está definido conforme abaixo, lembrando que a data de referência para os dados é a mesma para atualização dos indicadores. Significa que os indicadores cujo cálculo é cumulativo, deverão ser atualizados sempre de janeiro até a data de entrega dos dados.

**Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos
de Monitoramento da SUDENE no Segundo Semestre de 2014**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à AGI	Data da Reunião de Apresentação
3º	29/08/14	05/09/14	25/09/14
4º	28/11/14	05/12/14	18/12/14

Fonte: AGI/SUDENE

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturantes nas regiões de menor dinamismo econômico
Finalidade da ação:	Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, ...; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade das atividades produtivas, fortalecendo o associativismo e (ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva. Ampliar as oportunidades de acesso ao mercado e ao desenvolvimento do APL em que as cooperativas e associações estão envolvidas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Organização social, frágil; Mercado restrito.		
Projeto:	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.		
Objetivo do projeto:	Fortalecer a organização social, criar uma rede de comunicação entre as associações de Apicultores dos munic. principais produtores Cadeia do Mel -Meso do Araripe, visando para ampliar oportunidades de inserção produtiva.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE CONVENIENTE PERÍODO	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 115.800,00
				250	GND 3	30	126.368,00	133.269,00	
Previsão de Conclusão:	18/02/2014	CONVÊNIO Nº 771203/2012 (Proposta SICONV 027116/2012)						A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
Data Atualização:	30/05/2014							Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Maria do Socorro Vilar - SUDENE / Glielson Alves e Paulo da Fonte - CONDEPE/FIDEM							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
								Valor liberado no Exercício (2014)	R\$ -
								Saldo a liberar (2014)	R\$ -
								Saldo a Empenhar no exercício (2014)	R\$ -
								Total Liberado até o exercício (2014)	R\$ 115.800,00

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)										
1 Lançamento/divulgação do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	03/04/2012		20/03/2012	03/04/2012		100%	Concluído	
2 Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	05/04/2012	19/04/2012		05/04/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
3 Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
4 Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS - ASCOM	10/05/2012	14/05/2012		10/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
5 Divulgação Chamamento - Prorrogação	CGDS/SUDENE	25/05/2012	31/05/2012		25/05/2012	31/05/2012		100%	Concluído	
6 Análise técnica	CGDS/SUDENE	01/06/2012	15/06/2012		01/06/2012	15/06/2012		100%	Concluído	
7 Resultado do Chamamento - prorrogação	CGDS - ASCOM	19/06/2012	29/06/2012		19/06/2012	29/06/2012		100%	Concluído	
8 Análise técnica e parecer	CGDS/SUDENE	Não informado	07/07/2012		Não informado	29/06/2012		100%	Concluído	
9 Etapas de formalização do convênio	CGC - COCF - PRD	Não informado	Não informado		29/06/2012	18/10/2012		100%	Concluído	
10 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	18/10/2012		100%	Concluído	
11 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	30/10/2012		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)										
* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	30/10/2012	30/10/2012	74.838,00	30/10/2012	14/12/2012	74.838,00	100%	Concluído	
12 ** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	Não informado	30/08/2013		16/06/2013	16/08/2013		100%	Concluído	
13 Meta 1 - Capacitar 140 Apicultores em Associativismo e Cooperativismo (R\$ 79.324,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/09/2013	15/10/2013		02/09/2013	29/10/2013		100%	Concluído	Previsão de início e término reprogramada em razão do ajuste no plano de trabalho, após 2º TA, de prazo, assinado em 16/08/2013, publicado em 19/08/2013. Processo licitatório concluído. Empresa para prestação de serviços técnicos, contratada. Reunião de planejamento realizada - atividades reprogramadas.
13.1 Etapa 1.1 – Mobilização Social	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	02/09/2013	06/09/2013		02/09/2013	06/09/2013		100%	Concluído	

13.2	Etapa 1.2 – Realizar 7 oficinas (Associativismo / Cooperativismo) p/ 140 Apicultores associados = 20 associados x 7 associações	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	11/10/2013	22/10/2013		13/10/2013	22/10/2013		100%	Concluído			
	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/10/2013	22/10/2013		15/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído			
14	Meta 2 - Capacitar 140 Apicultores em Formação de Redes de Comunicação (R\$ 42.687,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	16/10/2013	30/11/2013		11/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído			
14.1	Etapa 2.1 – Realizar 07 oficinas sobre Formação de Redes de Comunicação	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	16/10/2013	30/11/2013		11/10/2013	18/10/2013		100%	Concluído	Verificou-se no acompanhamento que a oficina de IPUBI não ocorreu (uma apicultora, associada, foi morta no 1º dia do evento).		
	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	1º/11/2013	30/11/2013	40.962,00	21/11/2013	21/11/2013	40.962,00	100%	Concluído			
	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	11/11/2013	20/11/2013		18/11/2013	20/11/2013		100%	Concluído			
15	Meta 3 - Realizar 1 Seminário Temático sobre Formação de Redes de Comunicação p/140 Apicultores (R\$ 11.258,00)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/12/2013	18/02/2014			07/12/2013		100%	Concluído			
15.1	Etapa 3.1 - Realizar seminário temático; diagnóstico - potencialidades/desafios com vistas a construção de uma Rede de comunicação (Plano)	CONDEPE/FIDEM e CONTRATADA	01/12/2013	18/02/2014			07/12/2013		100%	Concluído			
	* Liberação da terceira parcela de recursos	SUDENE	1º/12/2013	30/12/2013	10.568,00				-	Cancelado	Foi sociificado pela Conveniente o <u>cancelamento</u> da liberação da <u>3ª parcela</u> (Ofício CONDEPE / FIDEM Nº 008/2014 - DEAG), devido a existência de saldo suficiente para o pagamento do contrato executado.		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)							0,0%		Atrasado	Prazo de vigência expirado em 18/2/2014, em fase de prestação de contas. Solicitada pelo conveniente e acatada pela SUDENE alteração/adequação do plano de trabalho, por razões de ordem operacional (Plano de trabalho - Plano de aplicação detalhado), que impossibilitavam a prestação de contas.		
16	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	19/02/2014	18/04/2014		19/02/2014	...		0%	Atrasado	Foram analisados e aprovados os Relatórios de Execução, referentes aos aspectos físicos, para posterior emissão do laudo, após análise dos aspectos financeiros.		
17	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGC/DAD/SUDENE	Não informado	Não informado					0%	Atrasado	Em análise dos Relatórios de Execução dos aspectos financeiros pela CGC dos aspectos financeiros.		
						Valor Previsto:	126.368,00	Valor realizado:	115.800,00	80,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

AGENCIAS DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

a)1º Ciclo 2014. **Datas de início e conclusão das metas do projeto ajustadas conforme 2º TA, datado de 16/08/2013, publicado em 19/08/2013.**

b) Dados atualizados para o 2º Ciclo 2014.

Obs. 1: Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 006/2012 / Programa: 5320320120015. Enviada para análise em 31/05/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 29/06/2012, seguindo nessa data p/ CGC/DAD. Retornou à CGDS em meados de julho para indicação dos técnicos responsáveis, devolvida no dia seguinte c/ Mem. informando responsáveis.(...) Data de assinatura: 18/10/2012. Publicação DOU: 30/10/2012. Depósito da contrapartida realizado em 29/11/2012. Liberação da 1ª parcela: 14/12/2012,

após novo ajuste do PT. Solicitado, analisado e aprovado aditamento da vigência do convênio, para recomposição de prazo; cf. 1 TA, de 18/03/2013, vigência prorrogada até 18/08/2013. Recomposição do prazo para 18/02/2014, conforme 2º TA. Procedidos ajustes no Plano de Trabalho.

Obs. 2: O convênio teve sua execução física concluída dentro do prazo de vigência, encerrado em 18/02/14. Está na fase de análise dos relatórios de execução dos aspectos financeiros e prestação de contas, razão do status "Em Andamento".

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)		
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				SUDENE no Projeto (R\$)			CONCEDENTE CONVENENTE	Mês	TOTAL
				100	234.105,49	246.426,82	139.865,15	mai/12	147.226,47
					94.240,34		4960,01	jun/12	99.200,35
					234.105,49		12.321,33		246.426,82
Previsão de Conclusão:	06/07/2014	CONVÉNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)				Pago até o ano anterior	R\$	139.865,15	
Data Atualização:	30/05/2014	Vigência: 18/12/12 a 18/07/13				A realizar no exercício (2014) RAP 2012	R\$	94.240,34	
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Gieldson Alves da Silva - CONDEPE/FIDEM					Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
						Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
						Valor liberado no Exercício	R\$	-	
						Saldo a liberar	R\$	94.240,34	
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
						Total Liberado até o exercício	R\$	139.865,15	

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2012	31/12/2012	139.865,15	17/04/2013	01/08/2013	139.865,15	100%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/04/2013	14/10/2013		100%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	01/12/2013	06/07/2014		01/12/2013			29%	Em Andamento	
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social (R\$	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	01/12/2013	14/01/2014		01/12/2013	14/03/2014		100%	Concluído	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	03/01/2014	31/01/2014		23/01/2014	23/01/2014		100%	Concluído	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R\$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/01/2014	04/03/2014		14/03/2014			30%	Em Andamento	Segundo o conveniente, o atraso desta etapa será compensado, não havendo prejuízo para a data final do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2014	30/04/2014	94.240,34				0%	A Iniciar	
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R\$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	05/03/2014	05/05/2014					0%	A Iniciar	

9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R\$ 63.653,45)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	06/05/2014	06/07/2014					0%	A Iniciar	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	05/09/2014	05/10/2014					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	234.105,49	Valor realizado:	139.865,15	65,75%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

2º Ciclo - 2014. Alterações realizadas a partir da etapa 6.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 03
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				SUDENE no Projeto (R\$)	
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00
CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)					
Previsão de Conclusão: 31/12/2014 Data Atualização: 30/05/2014					
Responsável(s) pelo Projeto Concedente: Victor Uchôa Ferreira da Silva e Maria do Socorro R. Morais Vilar - SUDENE Convenente: Sérgio de Azevedo Mendonça e Maria das Graças Sobreira de Moura - SEMAS/PE					

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25	
265.241,25	58.942,50	DEZ/2012	324.183,75	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ 265.241,25	
265.241,25	--	MAIO/2013	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
530.482,50	58.942,50	-	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
				Valor liberado no Exercício	R\$ -	
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25	
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25	

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado		100%	Concluído	
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE		11/05/2012		11/05/2012			100%	Concluído	
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100%	Concluído	
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído	
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Não Informado	28/12/2012		Não informado	28/12/2012		100%	Concluído	
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Não Informado	03/01/2013		Não informado	03/01/2013		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)							18,0%	Atrasado		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	265.241,25	100%	Concluído	
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado		--	50%	Em Andamento	A Convenente informou, até o momento, apenas a contratação dos serviços de aluguel de veículos e aquisição de combustível.

7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco (R\$ 356.560,00)	SEMAS/PE	01/08/2013	23/03/2014					0%	Atrasado	
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano (R\$ 146.400,00)	SEMAS/PE	01/08/2013	21/01/2014					0%	Atrasado	
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2013	31/10/2013	265.241,25				0%	Atrasado	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto (R\$ 176.960,00)	SEMAS/PE	22/01/2014	04/03/2014					0%	Atrasado	Foi concedida ampliação do prazo de vigência, para 31/12/2014, em decorrência do atraso na execução do projeto, devido a problemas operacionais no sistema OBTIV, junto a Caixa Econômica Federal e nos processos licitatórios. No momento, a Convenente foi autorizada a realizar ajustes no Plano de Trabalho para adequá-lo ao novo prazo de vigência. A realização deste procedimento ensejará uma reformulação das datas contidas neste PO.
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da C34 Desertificação na Região Nordeste (R\$ 33.200,00)	SEMAS/PE	05/03/2014	23/03/2014					0%	Atrasado	
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco (R\$ 232.865,00)	SEMAS/PE	01/08/2013	23/03/2014					0%	Atrasado	
8.1	META 2/ETAPA1 – Realizar a identificação, caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas (R\$ 182.865,00)	SEMAS/PE	01/08/2013	23/03/2014					0%	Atrasado	
8.2	META2/ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas (R\$ 50.000,00)	SEMAS/PE	17/02/2014	23/03/2014					0%	Atrasado	
***	Visita para emissão de Laudo/Parecer Técnico Final	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	24/03/2014	22/05/2014					0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:	530.482,50	Valor realizado:	265.241,25	38,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

2º Ciclo 2014

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013).

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Número do Projeto:	PO 04
Objetivo estratégico:						Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária					Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas					Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.						
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)					Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.						
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.						
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.						
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso	
	100/250	GND 3 e 4	30	694.459,19	771.621,32	Concedente	Conveniente
						Liberação	Total
						419.104,63	77.162,13
						dez/12	496.266,76
						137.677,28	
						-- jan/13	137.677,28
						137.677,28	
						-- abr/13	137.677,28
						694.459,19	77.162,13
						-	771.621,32
Previsão de Conclusão:	17/06/2014	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Data Atualização:	30/05/2014						Pago até o ano anterior R\$ 419.104,63
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDNE/ Marcelo de Castro Viana e Victor Uchôa Ferreira da Silva - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo					A realizar no exercício (2014) R\$ 275.354,56	
							Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício R\$ -
							Valor liberado no Exercício R\$ 137.677,28
							Saldo a liberar (2014) R\$ 137.677,28
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
							Total Liberado até o exercício R\$ 556.781,91

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído	
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não Informado	10/05/2012		Não Informado	10/05/2012		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CCG/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CCG/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100%	Concluído	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								41,5%	Em Andamento	
8	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100%	Concluído	
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	Não Informado	419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	419.104,63	100%	Concluído	
9	Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		25/11/2013			50%	Em Andamento	Realizados 20 cursos de ovinocaprinocultura, 50% do previsto.
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		13/01/2014			42%	Em Andamento	Realizados 05 cursos de apicultura, 42% do programado.
	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	Não Informado		28/01/2014	06/02/2014		100%	Concluído	A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	137.677,28	09/04/2104	19/05/2014	137.677,28	100%	Concluído	No mês de junho será dada continuidade das capacitações.
11	Adquirir 540 colmeias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído	
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014						0%	A Iniciar	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	17/06/2014	137.677,28				0%	A Iniciar	

13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa ENCERRAMENTO (Peso 20%)	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100%	Concluído		
14	Análise da PTC, sob aspecto físico e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	18/08/14	02/01/2015					0,0%			Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
15	Análise da PTC, sob aspecto financeiro final.	CGC/SUDENE	18/08/14	02/01/2015					0%	A Iniciar		Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
			Valor Previsto:	694.459,19		Valor realizado:	556.781,91	61,5%	Em Andamento	Status do Projeto		

Análise da proposta

Parceiros institucionais:

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:

Em 11/7/2013 foi assinado o 1º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 17/06/2014
2º Ciclo 2014;

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconómicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Formular o Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba abrangendo cinco metas/módulos: micrologística de transporte de cargas, desenvolvimento industrial, energia, telecomunicações e tecnologia da informação e capacitação.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				250 e 100	3330.41		CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL
						732.887,59	79.238,97	nov/12	812.126,56	Pago até o ano anterior R\$ 1.794.595,93
						527.102,12	67.204,78	nov/13	594.306,90	A realizar no exercício (RAP 2012) R\$ -
						534.606,22	58.960,32	dez/13	593.566,54	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
						1.794.595,93	205.404,07	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício R\$ -
										Valor liberado no Exercício (2013) R\$ -
										Saldo a liberar R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
										Total Liberado até o exercício R\$ 1.794.595,93

CONVÉNIO Nº 769784/2012-41 (Proposta SICONV 011604/2012)

Previsão de Conclusão: 28/04/2014 Data Atualização: 30/05/2014

Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto Maria Helena de Castro Lima e Juliana de Melo Borges - SUDENE / Gustavo Nogueira e Luiz Carlos Soares - SEPLAG-PB

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor (SUDENE)	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído	
1 Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
3 Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100%	Concluído	
4 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100%	Concluído	
5 Etapas de formalização do convênio	SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100%	Concluído	
6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	14/12/2012	18/12/2012		14/12/2012	18/12/2012		100%	Concluído	
7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	02/01/2013		18/12/2012	02/01/2013		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído	O convênio foi prorrogado "de ofício" após a data de referência do PO para 28/05/14.
Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	01/11/2012	30/11/2012	732.887,59	100%	Concluído	
8 Processo licitatório	SEPLAG/PB	01/02/2013	07/06/2013		01/02/2013	25/07/2013		100%	Concluído	Edital da licitação (nº 001/2013) registrado na CGE-Controladoria Geral do Estado, sob nº 13-00476-0 e publicado em 23/04/2013, nos jornais de grande circulação e diários oficiais. Contrato com a empresa vencedora assinado em 25/07/13, mas só registrado no SICONV após formalização do 2º Termo Aditivo.
9 Meta I: Estruturação do Plano Estratégico da Micrologística do Transporte de Cargas do Estado da Paraíba (R\$ 274.617,39)	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluído	
9.1 Diagnóstico das cadeias produtivas paraibanas	SEPLAG/PB	01/08/2013	27/09/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído	
9.2 Diagnóstico da infra-estrutura da logística do transporte de cargas do estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	11/10/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído	
9.3 Priorização dos Projetos Estratégicos Micrológisticos para o estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	12/11/2013		100%	Concluído	
9.4 Relatório Intermediário do Plano de Micrologística do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	08/11/2013		01/08/2013	12/11/2013		100%	Concluído	

	Liberação da 2ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/11/2013	30/11/2013	527.102,12	25/11/2013	02/12/2013	527.102,12	100%	Concluido		
9.5	Relatório Final do Plano de Micrológistica do Transporte de Cargas.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
10	Meta II: Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Estado da Paraíba (R\$ 463.979,98)	SEPLAG/PB	30/08/2013	28/01/2014		30/08/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
10.1	Avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas	SEPLAG/PB	30/08/2013	18/10/2013		30/08/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.2	Estudo de Mercado dos Produtos Priorizados	SEPLAG/PB	13/09/2013	08/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.3	Priorização dos cinco Produtos-Chaves	SEPLAG/PB	01/11/2013	22/11/2013		01/11/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.4	Elaboração de um Plano de Implementação	SEPLAG/PB	22/11/2013	06/12/2013		22/11/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
10.5	Relatório Intermediário do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	22/11/2013		01/08/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
10.6	Relatório Final do Plano de Desenvolvimento Industrial.	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/01/2014		01/08/2013	11/02/2014		100%	Concluido		
11	Meta III: Plano Estratégico de Energia do Estado da Paraíba (R\$ 298.553,40)	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
11.1	Avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia da Paraíba	SEPLAG/PB	13/09/2013	25/10/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.2	Avaliação das necessidades energéticas da Paraíba	SEPLAG/PB	11/10/2013	08/11/2013		11/10/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.3	Avaliação dos "gaps" e priorização dos investimentos em energia na Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	22/11/2013		25/10/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
11.4	Realização de 2ª visita técnica de acompanhamento	CGDS/SEPLAG	12/12/2013	12/12/2013		12/12/2013	12/12/2013		100%	Concluido		
11.5	Relatório Intermediário de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	22/11/2013		13/09/2013	19/11/2013		100%	Concluido		
	Liberação da 3ª parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2013	31/12/2013	534.606,22	19/12/2013	30/12/2013	534.606,22	100%	Concluido		
11.6	Relatório Final de Energia.	SEPLAG/PB	13/09/2013	28/01/2014		13/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12	Meta IV: Plano Estratégico de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação (R\$ 380.603,91)	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
12.1	Verificar estado atual de TIC do Estado da Paraíba e estimar oferta de serviços.	SEPLAG/PB	27/09/2013	18/10/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.2	Identificar prioridades e demandas do plano de desenvolvimento industrial e logístico e mapear necessidades futuras de TIC.	SEPLAG/PB	04/10/2013	08/11/2013		04/10/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.3	Explicitar lacunas entre necessidades projetadas e oferta planejada.	SEPLAG/PB	11/10/2013	15/11/2013		11/10/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.4	Identificar alavancas que superem potenciais barreiras à implantação de uma infraestrutura de TI.	SEPLAG/PB	08/11/2013	22/11/2013		08/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.5	Desenvolver e priorizar iniciativas para atender à demanda por serviços.	SEPLAG/PB	15/11/2013	29/11/2013		15/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.6	Consolidar o Plano de TIC.	SEPLAG/PB	22/11/2013	20/12/2013		22/11/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.7	Relatório Intermediário do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	20/12/2013		27/09/2013	10/12/2013		100%	Concluido		
12.8	Relatório Final do Plano de Telecomunicações e de Tecnologia de Informação.	SEPLAG/PB	27/09/2013	28/01/2014		27/09/2013	13/01/2014		100%	Concluido		
13	Meta V: Plano Estratégico de Capacitação do Capital Humano para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba(R\$ 376.841,25)	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluido		

13.1	Mapear a demanda de recursos humanos, por tipo de capacitação profissional, visando o crescimento e investimentos do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.2	Projetar a atual oferta de mão-de-obra no estado.	SEPLAG/PB	25/10/2013	29/11/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.3	Definir ajustes na oferta de capacitação de mão-de-obra visando o crescimento do estado.	SEPLAG/PB	29/11/2013	13/12/2013		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.4	Dimensionar investimentos necessários para formação profissional.	SEPLAG/PB	13/12/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.5	Consolidar o Plano de Capacitação do Capital Humano do Estado da Paraíba.	SEPLAG/PB	20/12/2013	28/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.6	Relatório Intermediário do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	03/01/2014		25/10/2013	13/01/2014		100%	Concluído		
13.7	Relatório Final do Plano de Capacitação do Capital Humano.	SEPLAG/PB	25/10/2013	28/01/2014		25/10/2013	10/02/2014		100%	Concluído		
14	Relatório Final consolidado do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	01/08/2013	28/04/2014		01/08/2013	18/02/2014		100%	Concluído		
15	Finalização do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	SEPLAG/PB	18/02/2014	28/05/2014					100%	Concluído	A SEPLAG formalizará solicitação de utilização dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicação a serem aplicados em atividades de desdobramento do Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									1,4%	A Iniciar		
16	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/SUDENE	29/05/2014	29/08/2014					7%	A Iniciar	Em análise dos relatórios de execução	
				Valor Previsto:	1.794.595,93	Valor realizado:	1.794.595,93	81,4%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba (CNPJ: 08761124000100)

Observações:

2º Termo Aditivo foi solicitado pelo conveniente por meio do SICONV em 12/08/13, sendo publicado em 01/11/13.

Em 18/02/2014 a equipe técnica participou de um Seminário em João Pessoa/PB com o Governador do Estado, Secretário de Planejamento e Gestão, Gestores e Técnicos do Governo do Estado, Universidades Federal e Estadual, Parlamentares etc, onde foram apresentados Plano Estratégico da Paraíba, relativo aos resultados do Projeto "Eixos Integrados de Desenvolvimento da Paraíba – uma visão estratégica para o Estado.

2º Ciclo 2014.

Em análise os relatórios de execução

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 06
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Henrique Tinoco (interino)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros			
					CONCEDENTE CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior (2012)	R\$ 280.000,00	A realizar no exercício	R\$ 520.000,00	Orcamento Autorizado no exercício	R\$ -
	250	GND 3	30	825.379,68	280.000,00	8.400,00 out a dez/12	288.400,00		260.000,00	8.400,00 jan a mar/1	268.400,00	
					260.000,00	8579,68 jun/set/13	268.400,00		800.000,00	25.379,68	825.379,68	
Previsão de Conclusão:	18 meses após 1ª liberação	Convênio nº 770860/2012 Proposta nº 24955/12										
Data Atualização:	30/05/2014											
Responsável(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE e Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.											

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Divulgação do Programa no SICONV	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		20%	Concluído	
2	Recebimento da proposta, análise	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	Foi providenciado a Prorrogação de ofício pela SUDENE, alterando a data de conclusão da obra para 12.06.2014.
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo
4	Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	conveniente por mais 120 dias, alterando a
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	data de término do convênio para 12.10.2014.
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	Não Informado	Não Informado		Não Informado	Não Informado		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
	*Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	280.000,00	100%	Concluído	
8	Meta 1	Município de Ruy Barbosa	01.09.2012	31.01.2013		01.05.2013	30.09.2013		100%	Concluído	Data de assinatura: 23/08/2012; liberação da 1ª parcela: 07/12/2012.
8.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01.09.2012	31.01.2013		01.05.2013	31.05.2013		100%	Concluído	
8.2	Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apilado.	Município de Ruy Barbosa	01.09.2013	31.01.2014		01.05.2013	31.07.2013		100%	Concluído	
8.3	Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das	Município de Ruy Barbosa	01.09.2014	31.01.2015		01.08.2013	30.09.2013		100%	Concluído	
	*Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30.06.2013	Não Informado		27.03.2013	03.07.2013		100%	Concluído	
	*Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30.09.2013	30/09/2013	260.000,00	14.11.2013	14/11/2013	260.000,00	100%	Concluído	Foi liberada a 2ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, em 14.11.2013

9	Meta 2	Município de Ruy Barbosa	01.02.2013	Não Informado		Não Informado			85%	Atrasado		
9.1	Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01.02.2013	01.08.2013		01.09.2013		28.02.2014	100%	Concluído		
9.2	Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09.12.2013	28.02.2014		01.12.2013			70%	Em andamento		
	*Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30.09.2013	Não Informado			05/12/2013		100%	concluído		
	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	27.12.2013	Não informado	260.000,00		06/04/2014	260.000,00	100%	concluído	Foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00 em 06/04/2014.	
10	Meta 3		01/03/2014	30/06/2014					0%	A Iniciar		
10.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/03/2014	30/06/2014					0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final		01.09.2014	30.09.2014					0%	A Iniciar		
					Valor Previsto:	800.000,00	Valor realizado:	800.000,00	71%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

* Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 50.000.000,00.

Informações referentes à data de 19/04/2013:

1) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Resultado: o juiz deu sentença favorável ao município. Faltou concluir o processo licitatório e escolher a empresa vencedora da licitação.

2) Foi concluído o processo licitatório e homologada a empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está instalada no canteiro de obras para iniciar os serviços preliminares de construção da ponte. Estas informações estão atualizadas até 31.05.2013.

Informações referentes à data de 29/11/2013:

4º Ciclo 2013: alterações na etapa 1 da meta 2.

Foi liberada a 2ª parcela no valor de R\$ 260.000,00 em 14.11.2013; Foi providenciado Prorrogação de Ofício pela SUDENE, alterando a data de conclusão da obra para 12.06.2014.

1º ciclo 2014: Faltava liberar a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, prevista para fevereiro/2014. Foi concluído a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituído de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4.

2º ciclo 2014: foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R\$ 260.000,00, em 06/04/2014.

Foi solicitado termo aditivo ao convênio, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014.

Está em processo de preparação para concretagem da laje de piso da ponte com concreto fck = 20 mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.		
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas		
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100/250/280	Correntes	
				50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima
-----------------------------	-----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior (2013)	R\$	352.840,00
A realizar no exercício	R\$	1.352.840,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício 2014	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	1.352.840,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício (2013)	R\$	352.840,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT . Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100%	Concluído	
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100%	Concluído	
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100%	Concluído	Organizada pela SUDENE
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013		100%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/04/2014	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/06/2014		19/06/2013			50%	Em Andamento	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região Previsto para o orçamento 2014 (R\$ 5.000.000,00) Aguardando a formalização do Termo de Cooperação Técnica com o Centro de Energias Renováveis da UFPE, o Ministério da Integração.
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14.	SUDENE	24/05/13	30/06/14	R\$ 100.000,00	24/05/2013			45%	Em Andamento	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Em razão do período de realização da jogos da Copa e da eleições/2014 foi acordado com a EPE e GT, efetuar um posterior agendamento.
			Valor Previsto: R\$ 4.452.840,00			Valor realizado: R\$ 352.840,00			81,9%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. 2º Ciclo 2014

Obs1: Repactuadas as Atividades/Etapas 6, 7 e 8

Legenda

A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:		Ano:	2013 (etapa 1)
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso			
						Concedente	Conveniente	Liberação	Total
	100/250	GND 3	30	1.018.500,00	1.018.500,00	IFPB	agosto	única	1.018.500,00

Previsão de Conclusão:	13/06/2014
Data Atualização:	09/06/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Juliana de Melo Borges e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Edelcides Vasconcelos (Pró-Reitora de Extensão do IFPB).

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.018.500,00
A realizar no exercício (2014)	R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.018.500,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído	
1	Elaboração do projeto	IFPB	Não informado	Não informado		2012	08/05/2013		100%	Concluído	Em 22/03/13, foi realizada reunião na SUDENE para apresentar a proposta de projeto Mulheres na Construção - segundo modelo implantado pela SUDECO - para o IFRN e o IFPE. Na ocasião, o IFPB apresentou o projeto elaborado em 2012 a ser executado em 2013-2014.
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		02/05/2013	07/05/2013		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto a SUDENE	IFPB	Não informado	Não informado		08/05/2013	23/05/2013		100%	Concluído	
4	Formalização do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		09/05/2013	05/08/2013		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		15/05/2013	15/05/2013		100%	Concluído	Ata n.º 138 da Diretoria Colegiada
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído	Assinado em 13/06/13.
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		13/06/2013	05/08/2013		100%	Concluído	Publicado no DOU em 05/08/13.
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								33,8%	Atrasado	

	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	01/05/2013	01/06/2013	1.018.500,00	23/05/2013	21/08/2013	1.018.500,00	100%	Concluído	Por um equívoco do convenente, o montante dos recursos disponibilizados foram devolvidos em sua totalidade por não terem sido empenhados e não poderem ficar em 'restos a pagar'. Investimento: R\$ 41.865,00 (quarenta e hum mil e oitocentos e sessenta e cinco reais); Custeio: R\$ 511.432,90 (quinhentos e onze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e noventa centavos). Total: R\$ 553.297,90 (quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais, noventa centavos). Os recursos empenhados totalizaram o valor de: R\$465.202,30 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais e trinta centavos) e foram repassados, novamente, ao IFPB em 25.03.2014.	
8	Capacitação de 320 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 16 turmas de 20 alunos.	IFPB	13/06/2013	31/12/2013		13/06/2013	27.05.2014	--	69%	Atrasado	Início (27.05.2014) referente a 50% do total das alunas a serem capacitadas no projeto (640 alunas).	
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído		
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	24/10/2013	--	100%	Concluído		
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014	--	100%	Concluído		
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/10/2013	08/11/2013	--	100%	Concluído		
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013		01/11/2013	--	--	100%	Concluído		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	--	--	50%	Atrasado	Valor empenhado: R\$ 427.607,00. Procedendo nova licitação. A empresa licitada não entregou no prazo a unidade móvel, por isso foi necessária outra licitação.	
8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico;Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	01/08/2013	31/10/2013					0%	Em Andamento		
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	01/11/2013	31/12/2013					0%	Atrasado		
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	12/06/2013	13/06/2014		31.01.2014			0%	Em Andamento		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	Em Andamento		
10	Relatório Final de Acompanhamento Técnico do Projeto	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		1.018.500,00	Valor realizado:		1.018.500,00	53,8%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

IFPB

Observações:

2º Ciclo 2014

O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível conclui-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. O projeto prevê a descentralização do montante de R\$1.183.120,40 (hum milhão, cento e oitenta e três mil, cento e vinte reais, quarenta centavos) para o novo Termo de Execução Descentralizada. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

Legenda	
	A Iniciar
■	Concluído
■	Em Andamento
■	Atrasado
■	Cancelado
■	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO_09
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	Mês	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
	250	GND 3 (3330.41)	30	485.874,65	511.447,00	255.723,17	R\$ 25.572,35	fev/14	281.295,52	A realizar no exercício (2014) RAP 2013	R\$ 485.874,65
Previsão de Conclusão:	30/12/2014	CONVÊNIO Nº 794997/2013				230.151,48		mai/14	230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Data Atualização:	30/05/2014	Vigência: 31/12/13 a 30/12/14				485.874,65	25.572,35		511.447,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Responsáv(el)s técnico(s) pelo Projeto		Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Tiago Cançado Diniz - IDENE									

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1 Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE			0	26/09/2013			100%	Concluído		
2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE				11/12/2013			100%	Concluído		
3 Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE				31/12/2013			100%	Concluído		
5 Publicação do convênio	CGC/SUDENE				17/01/2014			100%	Concluído		
EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014		30/12/2014			9,0%	Em Andamento	Foi retirada Cláusula Suspensiva.	
6 Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/02/2014	26/05/2014	255.723,17				100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7 Processo licitatório	IDENE	01/03/2014	30/04/2014					50%	Em Andamento	O edital do pregão está sendo analisado pelo setor de licitações do IDENE. Após a retirada da cláusula suspensiva, o Idene solicitará prorrogação da vigência do convênio de modo a corresponder com o processo licitatório e contrato a ser firmado a partir do certame.	Datas em processo de repactuação.
8 Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas	IDENE/SUDENE	30/04/2014	31/07/2014					5%	Em Andamento	O parecer técnico de análise da proposta indicou um prazo maior para execução do convênio.	
9 Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	01/05/2014	15/06/2014					25%	Em Andamento		
10 Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/06/2014	31/07/2014					0%	A Iniciar		
11 Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
12 Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/05/2014	31/05/2014	230.151,48				0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
13 Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	01/08/2014	31/08/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
14 Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	01/09/2014	10/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
15 Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas	IDENE/SUDENE	05/10/2014	20/10/2014					0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.

16	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	31/10/2014				0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
17	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/10/2014	31/10/2014				0%	A Iniciar	Prorrogação de vigência alterada para 30/12/2014.	Datas em processo de repactuação.
	ENCERRAMENTO (Peso 20 %)							0,0%	A Iniciar		
3	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE						0%	A Iniciar		Datas em processo de repactuação.
			Valor Previsto:	485.874,65	Valor realizado:	0,00	29,0%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros Institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

2º Ciclo 2014.

Aprovada a prorrogação da vigência e aguardando a atualização do Plano de Trabalho: Cronogramas Físico e de Desembolso

Repacktuada a etapa 6

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando- os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				CONCEDENTE	CONVENENTE	PERÍODO	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$	207.542,62
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90	107.354,71	5.650,24	FEV/2014	113.004,95		Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
				100.187,91	5.273,04	JUN/2014	105.460,95				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
				207.542,62	10.923,28	-	218.465,90			Valor liberado no Exercício	R\$	-	
										Saldo a liberar (2014)	R\$	207.542,62	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
										Total Liberado até o exercício	R\$	-	

Previsão de Conclusão: 01/09/2014 **CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)**

Data Atualização: 30/05/2014

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto Vera Lúcia Assunção e Victor Ferreira da Silva - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Atrasado		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	01/02/2014	28/02/2014 <i>(A redefinir)</i>	107.354,71	--	--	--	0%	Atrasado	Convênio celebrado com Cláusula Suspensiva, retirada em 15/05/2014. Em fase de ajustes no plano de trabalho, para adequações nos cronogramas físico e de desembolso e no plano de aplicação detalhado, e posterior procedimentos com vistas a recomposição do prazo de execução, 8 meses, cf. proposta aprovada. *Todos os prazos que constam desta planilha até aqui, são provisórios, vez que serão adequados, após ajustes. Somente após o ajuste no plano de trabalho e a repartição formal do prazo de execução do projeto se poderá dar início a essa fase, com a liberação dos recursos.	Realização de reuniões para entendimentos e adequações.
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	--	--		--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	31/12/2013	09/05/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		

10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	31/12/2013	08/04/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	17/02/2014	14/04/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	09/04/2014	09/05/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0%	A Iniciar		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/06/2014	30/06/2014	100.187,91	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação/Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	10/05/2014	01/09/2014		--	--	--	0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	12/05/2014	12/06/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	13/06/2014	14/07/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	15/07/2014	01/09/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)												
15	Análise da PTC e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	02/09/2014	01/11/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC e emissão de parecer financeiro final	CGC/DAD/SUDENE	02/09/2014	01/11/2014	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	207.542,62	Valor realizado:	0,00	20,0%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 11 (ex-PO 12)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12	Concedente	Convenente	Liberação	Total
Previsão de Conclusão:	31/08/2014	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)							167.999,61	25.421,91	dez/12	193.421,52
Data Atualização:	30/05/2014								60.797,60	-	fev/13	60.797,60
Responsáv(e)is técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcélio de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito								228.797,21	25.421,91	-	254.219,12

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
INICIAÇÃO (Peso 20%)											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/2012		Não informado	09/05/2012		100%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	25/06/2012		09/05/2012	25/06/2012		100%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/2012	20/12/2012		25/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		Não informado	04/01/2013		100%	Concluído	
EXECUÇÃO (Peso 60%)											
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/2013	28/06/2013	167.999,61	14/06/2013	28/06/2013	167.999,61	100%	Em Andamento	O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2013, passando a vigência para 31/08/2014.
											Reunião técnica realizada em 30/01/2014 em João Pessoa-PB, com a finalidade de verificar o andamento do projeto.
8	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/2013	20/03/2014		31/08/2013			0%	Atrasado	O conveniente está realizando o processo de Licitação para contratação dos serviços e aquisição dos equipamentos.
9	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/2014	30/01/2014		30/01/2014	30/01/2014		0%	A Iniciar	
10	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil)	Gov/PB	30/04/2013	31/08/2014					0%	A Iniciar	Aguardando o término das licitações.
	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/2014	31/05/2014	60.797,60				0%	A Iniciar	
11	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/2013	31/08/2014					0%	A Iniciar	Aguardando o término das licitações.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)											
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico e emissão de Laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	02/09/2014	17/11/2014					0%	A Iniciar	

13	Análise da PTC, sob os aspectos financeiros e emissão de parecer técnico final.	CGC/DAD/SUDENE	02/09/2014	17/11/2014				0%	A Iniciar	Iclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
			Valor Previsto:	228.797,21	Valor realizado:	167.999,61	30,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil

Observações:

2º Ciclo 2014.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objet:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso	Concedente	Conveniente	Liberação	Total	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				100/250/280	GND 3 e 4						Pago até o ano anterior	R\$ 186.696,80
				350.978,27	370.465,27		186.696,80	19.487,00	dez/12	206.183,80	A realizar no exercício (2014)	R\$ 164.281,47
							164.281,47	--	fev/13	164.281,47	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
							350.978,27	19.487,00		370.465,27	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
											Valor liberado no Exercício	R\$ -
											Saldo a liberar	R\$ 164.281,47
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
											Total Liberado até o exercício	R\$ 186.696,80

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início		Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100%	Concluído		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100%	Concluído		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								20,0%	Atrasado		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	186.696,80	100%	Concluído	A primeira parcela do convênio SICONV 770355/2012 foi liberada em 29/11/2013, no valor de R\$ 186.696,80, através da ordem bancária 2013OB801500.	
8	Processo Licitatório	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		27/02/14	Não informado		0%	Atrasado	Processo em andamento; não concluído.	
8.1	Meta 1: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			25%	Atrasado		
8.2	Meta 2: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
8.3	Meta 3: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	28/12/2014		09/08/2013			25%	Atrasado		

	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	28/12/2014					0%	Atrasado		
	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	28/12/2012	28/12/2014	164.281,47				0%	Atrasado		
8.4	Meta 4: Realização 14 cursos de capacitação de Agentes de Proteção de defesa Civil	GOV/CE	28/12/2012	28/12/2014		Não informado			25%	Atrasado	Contrato assinado aguardando publicação no DOE para inicio da execução da meta.	
8.5	Meta 5: Realização um Fórum Internacional Sobre Evidências Sísmicas no Ceará.	GOV/CE	28/12/2012	28/12/2014		Não informado			25%	Atrasado	Decreto do Governador suplementando orçamento do Corpo de Bombeiros para dar inicio a licitação. Previsão de inicio do evento novembro/2014.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC sob os aspectos físicos e emissão de parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC sob os aspectos financeiros e emissão de parecer final	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015					0,0%	A Iniciar		
		Valor Previsto:			350.978,27	Valor realizado:		186.696,80	40,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Observações:

Obs1: O Convenente depositou a contrapartida em 07.10.2013, no valor de R\$ 19.487, 00.

Obs2: O convenente solicitou Termo Aditivo de prorrogação de vigência para 28 de dezembro de 2014 por meio de ofício anexo SICONV em 20/11/13. Aguardando inserção no SICONV do Termo Aditivo de Prorrogação.

Obs3: O Plano de Trabalho será repactuado quando for aditado o Termo Aditivo com a nova data da vigência.

2º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Número do Projeto:	PO 13 (ex-PO 10)
Objetivo estratégico:		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.	Subunidade responsável:	Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação/CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Vernon George Walsmsley
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)		
Problema (causa):	Insuficiência de opções de oleaginosa apropriadas (materia prima) para viabilizar o avanço do Programa Nacional de Biodiesel no Nordeste.		
Projeto:	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.		
Objetivo do projeto:	Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				no Projeto (R\$ 1,00)	Projeto (R\$ 1,00)	CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	
				250	Descentralizaçâo	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Previsão de Conclusão:

A DPLAN não apresentou os dados para o 2º Ciclo 2014

Data Atualização:

10/04/2014

24/03/2014

Responsáv(el)eis técnico(s) pelo Projeto

Concedente: Vernon George Walsmsley e Rubem Fernandes Monteiro Filho

Conveniente: Andre Galenbeck

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ 700.000,00
A realizar no exercício R\$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ -
Valor liberado no Exercício (2014) R\$ -
Saldo a liberar R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ 700.000,00

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Celebração de Termo de Descentralização	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	18/12/2012	18/12/2012	-	18/12/2012	18/12/2012	-	100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	20/12/2012	20/12/2012	-	20/12/2012	20/12/2012	-	100%	Concluído	
3	Liberação da parcela única	SUDENE (CCOF-Brivaldo Soares)	01/01/2013	31/03/2013	700.000,00	27/03/2013	27/03/2013	700.000,00	100%	Concluído	
4	Aquisição de equipamentos (R\$ 613.045,57)	CETENE (Andre Galenbeck)	31/01/2013	30/05/2013	-	31/03/2013	31/08/2013	-	100%	Concluído	Equipamentos adquiridos
5	Instalação dos equipamentos (R\$ 20.390,63)	CETENE (Andre Galenbeck)	30/05/2013	30/10/2013	-	01/09/2013	14/01/2014	-	100%	Concluído	Repactuar as datas previstas de início e término. Prazos prorrogado de ofício para 10/04/2014
6	realização de ensaios	CETENE (Andre Galenbeck)	31/06/2013	31/11/2013					0%	Atrasado	Repactuar as datas previstas de início e término. Aguardando técnico da Alemanha para montagem e regulagem. Há a necessidade de obtenção de mais informações do CETENE sobre a previsão da conclusão desta etapa.
7	Apresentação de relatório final	CETENE (Andre Galenbeck)	01/12/2013	31/12/2013					0%	Atrasado	
8	Emissão de Laudo Técnico	SUDENE (Vernon Walsmsley)	02/01/2014	31/01/2014					0%	Atrasado	
9	ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SUDENE (CGC-Zizete Falcão)	01/02/2014	28/02/2014					0%	Atrasado	
10	Encerramento	SUDENE (Vernon Walsmsley)	01/03/2014	10/04/2014					0%	Atrasado	
			Valor Previsto:	700.000,00		Valor realizado:	700.000,00	50,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

O projeto será executado através de descentralização orçamentária e financeira para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE)- MCT

Observações:

a) N.E. - Nº da etapa;

1º Ciclo 2014.

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação de Ciência, Tecnologia e Inovação/CGDS
Dirutor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Vernon George Walsmsley
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
						CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	274.405,33
	250	Investimento		857.015,99	965.632,35	274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$	582.610,66
						582.610,66	0,00	Julho/2013	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
				857.015,99	108.616,36	-			965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
										Valor liberado no Exercício	R\$	-
										Saldo a liberar	R\$	582.610,66
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
										Total Liberado até o exercício	R\$	274.405,33

A DPLAN não apresentou os dados para o 2º Ciclo 2014

Previsão de Conclusão:	31/12/2014
Data Atualização:	24/03/2014

Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente: Vernon George Walsmsley e Ruvem Monteiro Convenente: Jussara Santanna Alves
--	--

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído	
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014					0%	A Iniciar	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela. Repartuar datas previstas de início e término.
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamientos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	A definir.	A definir	582.610,66				0%	A Iniciar	Aguardando relatório da visita técnica
7	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro)	A definir.	A definir					0%	A Iniciar	
8	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves)	01/12/2014	28/02/2015					0%	A Iniciar	
9	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro)	A definir.						0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	857.015,99		Valor realizado:	274.405,33	44,4%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Existe a necessidade de deliberação sobre a continuação ou não desses acordos. Como não há diretor de planejamento, quem toma a decisão? Creio que a SUDENE deve resolver o problema de responsáveis na DPLAN pelas áreas, pois no momento não temos a quem recorrer.

Apesar das solicitações da Procuradoria, o Termo de Cooperação foi encaminhado para assinatura, tendo inclusive a UFPB assinado o termo.

Existem diversas solicitações da procuradoria sobre esses acordos: Solicitações da procuradoria:

1. Manifestação da área técnica sobre a existência ou necessidade de um Plano de trabalho para o Termo de Cooperação
2. Caso haja, é necessário Parecer Técnico sobre o Plano de Trabalho existente no processo com os devidos ajustes
3. Anexar autorização da Diretoria Colegiada
4. Documentação do representante do UF's e respectivo ato de delegação
5. Verificar se haverá ou não nesse acordo transferência de recursos.

1º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 15 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas de Desenvolvimento
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Adonis Oliveira
Problema (causa):	Falta de cobertura da malha aérea em cidades de grande e médio porte do Nordeste, prejudicando a movimentação de passageiros e cargas, com perdas econômicas para a Região.		
Projeto:	Malha aeroportuária regional		
Objetivo do projeto:	Articulação para incrementar malha aérea na área de atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	A definir			178.440,00	0,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2013
Data Atualização:	24/03/2014

A DPLAN não apresentou os dados para o 2º Ciclo 2014

Responsável(s) pelo Projeto	Adonis Oliveira
-----------------------------	-----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Composição de equipe interna (definir perfis e elencar servidores)	Marcus/Adonis	19/06/12	10/08/12	-	19/06/12	29/06/12	-	100,00%	Concluído	Inicialmente Francisco Linhares fez parte da equipe, mas afastou-se por ter sido convidado a fazer parte da equipe municipal de João Pessoa. Assim a equipe técnica ficou reduzida ao economista Marcus Vinícius com apoio dos técnicos da Coordenação de Gestão de Informações.
2	Elaboração do plano de trabalho	Marcus/Adonis	01/08/12	10/08/12	-			-	50,00%	Paralisado	A equipe inicial elaborou um PT que deverá ser ajustado.
3	Levantamento da malha institucional (malha regular, companhias aéreas com abrangência local, tempo de voo, etc)	Marcus/Adonis	01/08/12	20/08/12	-			-	20,00%	Paralisado	
4	Identificação dos marcos legais	Marcus/Adonis	21/08/12	10/09/12	-			-	0,00%	Paralisado	
5	Levantamento do estado da arte	Marcus/Adonis	11/09/12	28/09/12	-			-	0,00%	Paralisado	
6	Reuniões com os stakeholders	Adonis Oliveira	01/10/12	31/10/12				-		Paralisado	
7	Formação de Fórum permanente voltado para o estudo de alternativas	Adonis Oliveira	01/11/12	30/11/12	-			-	0,00%	Paralisado	
8	Definição de critérios para estabelecimento da malha	Adonis Oliveira	03/12/12	30/11/12	150.840,00			-	0,00%	Paralisado	
9	Definição da malha aérea	Adonis Oliveira	03/12/12	07/12/12	-			-	0,00%	Paralisado	
10	Termo de Referência da malha aérea	Adonis Oliveira	10/12/12	21/12/12	27.600,00			-	0,00%	Paralisado	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 703/2012, de 14/05/2012.

Valor Previsto: 178.440,00 Valor realizado: 0,00 18,89% Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

1º Ciclo 2014.

A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz Estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos					Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 14)
Objetivo Estratégico:	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis					Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar desigualdades regionais e erradicar a miséria				
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):					
Objetivo da ação:	Fortalecer os sistemas locais e regionais de inovação, visando à competitividade dos espaços produtivos e ao desenvolvimento regional sustentável, por meio da promoção do conhecimento e do acesso a instrumentos de apoio coletivo						
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGPD				
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Adonis Oliveira				
Problema (causa):	Baixo IDEB e alta evasão escolar						
Projeto:	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE						
Objetivo do projeto:	Aumentar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem, incorporando tecnologias já existentes, no ensino público fundamental e médio, na rede pública estadual da área de atuação da SUDENE						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
	250	4.4.90.00	Pregão	4.971.999,00	4.971.999,00	Pago até o ano anterior	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	27/02/2015					A realizar no exercício	R\$ -	4.971.999,00
Data Atualização:	24/03/2014					Orçamento Autorizado no Exercício	R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
						Valor liberado no Exercício	R\$ -	
						Saldo a liberar	R\$ -	
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
						Total Liberado até o exercício	R\$ -	

A DPLAN não apresentou os dados para o 2º Ciclo 2014

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Termo de Referência para compra dos equipamentos e software	Marlene Franklin	01/08/2012	30/08/2012		01/08/2012	30/08/2012		100,0%	Concluído	
2	Assinatura do Termo de Cooperação	Marlene Franklin	09/11/2012	31/12/2012	0,00	09/11/2012	09/11/2012	0	100,0%	Concluído	
3	Licitação para a compra dos Equipamentos	Frederico Cavalcanti	01/08/2012	30/08/2013	2.200.000,00	01/08/2013		0,00	30,0%	Atrasado	
3.1	Preparação do Edital	Frederico Cavalcanti	01/02/13	01/06/13		01/02/13	01/06/13		100,0%	Concluído	
3.2	Licitação	Marisa Fontaine	01/06/13	01/07/13		01/06/13			50,0%	Atrasado	Hardware - A licitação está suspensa aguardando os recursos interpostos pelas as empresas perdedoras.
3.3	Empenho	Brivaldo	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Os limites orçamentários foram utilizados para o convênio com o CVT de fitoterápicos de Pernambuco. Há a necessidade de verificação da possibilidade de utilização dos recursos da Administração para a realização desta compra.
3.4	Contrato	Marisa Fontaine	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Prazos previstos repactuados.
3.5	Pagamento	José Luís	01/08/13	01/08/13					0,0%	Atrasado	Prazos previstos repactuados.
4	Licitação para a compra dos Softwares		01/08/2012	30/08/2013	2.771.999,00	01/08/12			60,0%	Atrasado	Aguardando assinatura do Contrato
4.1	Preparação do Edital	Frederico Cavalcanti	01/01/13	01/05/13		01/01/13	01/05/13		100,0%	Concluído	
4.2	Licitação	Marisa Fontaine	01/06/13	01/06/13		01/06/13	01/06/13		100,0%	Concluído	
4.3	Empenho	Brivaldo	01/08/13	01/08/13		01/09/13	01/09/13		100,0%	Concluído	
4.4	Contrato	Marisa Fontaine	01/08/13	01/08/13					0,0%	Paralisado	A CGU pediu esclarecimentos sobre a licitação e contrato da P3D
4.5	Pagamento	José Luís	01/08/13	01/08/13					0,0%	Paralisado	
5	Entrega na SUDENE e Montagem (Eqpts. e softwares)	Frederico Cavalcanti	01/09/2013	30/11/2013					0,0%	Paralisado	
5.1	Recebimento e conferência	Administração	set/13	set/13					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
5.2	Instalação	Informática	set/13	set/13					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
5.3	Testes	Informática	out/13	out/13					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
5.4	Validação	Informática	out/13	nov/13					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
5.5	Embalagem	Administração	nov/13	nov/13					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
6	Distribuição nas escolas	Frederico Cavalcanti	02/01/2014	30/01/2014					0,0%	Paralisado	
6.1	Evento para entrega	Frederico Cavalcanti	jan/14	jan/14					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
6.2	Treinamento	P3D	jan/14	jan/14					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
7	Fiscalização e Controle	Frederico Cavalcanti	02/01/2014	30/10/2014					0,0%	Paralisado	
7.1	Fiscalização do Treinamento	Frederico Cavalcanti	jan/14	jan/14					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
7.2	1ª Visita de acompanhamento	Frederico Cavalcanti	mar/14	mar/14					0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.

7.3	2ª Visita de Acompanhamento	Frederico Cavalcanti	jun/14	jun/14				0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
7.4	3ª Visita de Acompanhamento	Frederico Cavalcanti	out/14	out/14				0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
8	Encerramento	Frederico Cavalcanti	01/12/2014	27/02/2015				0,0%	Paralisado	
8.1	Fiscalização Final	Frederico Cavalcanti	dez/14	dez/14				0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
8.2	Relatório de avaliação do Projeto	Frederico Cavalcanti	jan/15	jan/15				0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
8.3	Encaminhamentos	Frederico Cavalcanti	jan/15	fev/15				0,0%	Paralisado	Prazos previstos repactuados.
			Valor Previsto:	4.971.999,00	Valor realizado:	0,00	36,25%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Estados da área de atuação da SUDENE

Observações:

1º Ciclo 2014

Obs.: Software - A CGU solicitou esclarecimentos sobre o projeto e a contratação da empresa P3D. Ainda não houve resposta. Hardware - A licitação está suspensa aguardando os recursos interpostos pelas as empresas perdedoras.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 15) (Substitui PO 15 - CAPES.
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340-Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Formular e implementar os marcos legais das Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento Territorial , contribuindo para a redução das desigualdades regionais e a ocupação racional do território		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGPD
Diretor:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto acumulando Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Adonis Oliveira
Problema (causa):	Existência de impedimentos técnicos e estruturais ao desenvolvimento da educação fundamental do Nordeste		
Projeto:	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE)		
Objetivo do projeto:	Apoiar programas/projetos de pesquisa nas áreas de biotecnologia aplicada à indústria, à agropecuária, aos recursos naturais, à saúde, ao controle de pragas e doenças, como também, a programas de inovação tecnológica em pós-colheita, em novos materiais para o uso em energia solar e outros. Também propiciará estudos e capacitação dirigidos ao semiárido nordestino.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				250	3.3.30.00	
Previsão de Conclusão:	31/12/2014					Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	25/03/2014					A realizar no exercício R\$ 5.000.000,00
Responsável(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti					Orçamento (LOA+Crédito) no exercício R\$ -

A DPLAN não apresentou os dados para o 2º Ciclo 2014

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Assinatura do Termo de Cooperação	Frederico Cavalcanti	01/07/13	27/12/13		Não informado	Não informado		60%	Em Andamento	Foram analisadas as propostas encaminhada pelas UFRPE (2); UFRN e UFPB. Emitido parecer técnico e encaminhado para convênio com a minuta do Termo de Cooperação
1.1	Solicitação de Proposta - Universidades Federais	Frederico Cavalcanti	01/07/13	30/09/13		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Assinatura do acordo prevista para 27/12/2013
1.2	Análise das Propostas	Frederico Cavalcanti	30/09/13	16/12/13		Não informado	Não informado		100%	Concluído	
1.3	Preparação de Minuta para Acordo	Frederico Cavalcanti	16/12/13	17/12/13		Não informado	Não informado		100%	Concluído	
1.4	Trâmites Internos	Frederico Cavalcanti	17/12/13	26/12/13					0%	Em Andamento	
1.5	Assinatura e Publicação	Frederico Cavalcanti	27/12/13	27/12/13					0%	Paralisado	
2	Descentralização Orçamentária	Frederico Cavalcanti	01/05/14	01/06/14	5.000.000,00				0%	Paralisado	
3	Implementação da proposta	Frederico Cavalcanti		31/12/14					0%	Paralisado	
			Valor Previsto: 5.000.000,00			Valor realizado: 0,00			20,00%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo-2014
Obs.1: Este projeto absorve o PO 15 (CAPES) monitorado até o 3º Ciclo.
Obs.2: Aguardando definição orçamentária para 2014 em razão das dificuldades apresentadas pelas Universidades Federais do RN e PB, e Rural de PE de empenhar recursos e executar algo ainda em 2013. Os gastos totais previstos são de R\$ 20.000.000,00 e os anuais, de R\$ 5.000.000,00. O prazo é de 4 anos.
Obs.3: Após a viabilização do Acordo de Cooperação cada projeto se transformará em um PO. Estão previstos para a UFRN um proj., para a UFPB um proj. e para a UFRPE dois projetos.
O PPDTC/NE é o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro.

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 17)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guender	
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar							
Problema (causa):								
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA							
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
				100	5	90	2.672.400.000,00	-	Pago até o ano anterior	
Previsão de Conclusão:	01/12/2015								R\$ 2.265.105.668,00	
Data Atualização:	30/05/2014								A realizar no exercício	R\$ 407.294.332,00
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
									Valor liberado no Exercício	R\$ -
									Saldo a liberar	R\$ 407.294.332,00
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
									Total Liberado até o exercício	R\$ 2.265.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	-	-	70,00%	Atrasado	O valor previsto de aporte adicional do FDNE é de R\$ 1.204.000.000,00. Rescindido Contrato entre a TLSA e a Odebrecht. Em discussão ações para viabilizar a implantação do projeto.	Assinado acordo de acionistas e acordo de investimento. Em andamento procedimentos para aditamento ao contrato de investimento e escritura de emissão de debêntures. Repactuar datas.
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	135.764.778,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/03/14	31/03/14	135.764.777,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/03/15	31/03/15	135.764.777,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	2.672.400.000,00	Valor realizado:	2.265.105.668,00	70,56%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)		
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		100	5	90	1.959.000.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 387.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 1.572.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.572.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 387.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	ANÁLISE DO PROJETO	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído	
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	639.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	639.000.000,00				0,00%	Atrasado	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	191.544.000,00				0,00%	Atrasado	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	191.544.000,00				0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	191.544.000,00				0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	106.368.000,00				0,00%	A Iniciar	
12	Fiscalizações	A definir Não informado Não informado							0,00%	A Iniciar	
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir Não informado Não informado							0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00		Valor realizado:	R\$ 387.000.000,00	46,15%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 18)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar								
Problema (causa):									
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)								
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA								
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
		100	5	90	61.728.156,00	-	Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00	
							A realizar no exercício	R\$ -	
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	
							Saldo a liberar	R\$ -	
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
							Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00	
Previsão de Conclusão:		01/03/2010							
Data Atualização:		30/05/2014							
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Valor Previsto: 61.728.156,00 Valor realizado: 61.728.156,00 71,43% Status do Projeto									

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs:2 Atualizado em 08/04/2013.									
2º Ciclo 2014									

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 19)																																		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2008																																		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																		
Objetivo da ação:																																									
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGLD																																				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																				
Problema (causa):																																									
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR																																								
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA																																								
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)																																				
	100	5	90	53.576.481,00	-																																				
Previsão de Conclusão:	01/08/2014																																								
Data Atualização:	30/05/2014																																								
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>53.576.481,00</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>53.576.481,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>									Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)									Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	53.576.481,00	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	53.576.481,00	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	-
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																									
Pago até o ano anterior	R\$	-																																							
A realizar no exercício	R\$	53.576.481,00																																							
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																							
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																							
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																																							
Saldo a liberar	R\$	53.576.481,00																																							
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																							
Total Liberado até o exercício	R\$	-																																							
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado																																			
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor																																	
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00% Concluído																																
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00% Concluído																																
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00% Concluído																																
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00% Concluído																																
5	Liberação 1	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/04/14	01/05/14	42.477.417,00	-	-	-	0,00% Atrasado																																
6	Liberação 2	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/06/14	01/07/14	10.899.064,00	-	-	-	0,00% A Iniciar																																
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00% A Iniciar																																
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00% A Iniciar																																
			Valor Previsto:	53.376.481,00	Valor realizado:	0,00	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto																																

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014.

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.

Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.

Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.

Obs5: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.

Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.

Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O B

Obs9: Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.

Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 59.700.000,00
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.723.785,57
Saldo a liberar	R\$ 16.976.214,43
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.723.785,57

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43				0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	59.700.000,00		Valor realizado:	42.723.785,57	70,00%		Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2014.	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	-

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 54.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 53.635.943,87
Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13				0,00%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	54.900.000,00		Valor realizado:	53.635.943,87	70,00%		Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 24 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	-		Pago até o ano anterior R\$ -
Previsão de Conclusão:	01/08/2014						A realizar no exercício R\$ 64.439.000,00
Data Atualização:	30/05/2014						Orcamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
							Valor Empenhado no Exercício R\$ -
							Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -
							Valor liberado (LOA) R\$ -
							Saldo a liberar R\$ 64.439.000,00
							Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
							Total Liberado até o exercício R\$ -

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniele/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.868.946,48				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	38.570.053,52				0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implementado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	64.439.000,00		Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 25 (ex PO 23)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria								
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social								
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD								
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler								
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA										
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)						
	100	5	90	59.864.000,00	-						
Previsão de Conclusão:	01/08/2014										
Data Atualização:	30/05/2014										
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)											
Pago até o ano anterior	R\$ -										
A realizar no exercício	R\$ 59.864.000,00										
Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -										
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -										
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -										
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -										
Saldo a liberar	R\$ 59.864.000,00										
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -										
Total Liberado até o exercício	R\$ -										
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado		Status	Observação/Problemas			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	Início 13/07/11	Fim 11/09/11	Valor -	Inicio 13/07/11	Fim 28/07/11	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	Início 28/12/11	Fim 26/02/12	Valor -	Inicio 28/12/11	Fim 24/02/12	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	Início 07/03/12	Fim 10/02/13	Valor -	Inicio 07/03/12	Fim -	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	Início 24/12/12	Fim 23/05/13	Valor -	Inicio 24/12/12	Fim 06/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	Início 06/05/13	Fim 05/06/13	Valor -	Inicio 06/05/13	Fim 15/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	Início 15/05/13	Fim 31/05/13	Valor -	Inicio 15/05/13	Fim 24/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		Início 01/03/14	Fim 31/03/14	Valor 24.054.463,06	Valor -			0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Liberação 2		Início 01/07/14	Fim 31/07/14	Valor 35.809.536,94	Valor -			0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	59.864.000,00	Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014.
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 26 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE				Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).				Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos				Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar					
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00			R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
		Pago até o ano anterior R\$ -
		A realizar no exercício R\$ 55.278.000,00
		Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
		Valor Empenhado no Exercício R\$ -
		Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -
		Valor liberado no Exercício (LOA) R\$ -
		Saldo a liberar R\$ 55.278.000,00
		Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
		Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluíz/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.192.548,86				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.085.451,14				0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	55.278.000,00		Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 25)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Falsa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA										
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	55.273.000,00	-	Pago até o ano anterior	R\$ -			
							A realizar no exercício	R\$ 55.273.000,00			
							Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 55.273.000,00			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ -			
Previsão de Conclusão:		01/08/2014									
Data Atualização:		30/05/2014									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	22.200.954,82				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	33.072.045,18				0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:	
2º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.	
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.	
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				Projeto (R\$ 1,00)	Total do Projeto (R\$ 1,00)			R\$	-
	100	5	90	64.455.000,00	-			Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão:	01/08/2014							A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Data Atualização:	30/05/2014							Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
								Saldo a liberar	R\$ 64.455.000,00
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
								Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Corm a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	25.909.829,46				0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	38.545.170,54				0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	64.455.000,00		Valor realizado:	0,00	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Corm a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Dirutor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	-	Pago até o ano anterior R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 33.900.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 28.688.696,90
Saldo a liberar	R\$ 5.211.303,10
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 28.688.696,90

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10				0,00%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	33.900.000,00		Valor realizado:	28.688.696,90	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
2º Ciclo 2014.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 30 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	5	
				90	50.000.000,00	-
Previsão de Conclusão:	30/05/2014					Pago até o ano anterior
Data Atualização:	14/03/2014					A realizar no exercício
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)
						Valor Empenhado no Exercício
						Valor liberado no Exercício (RAP)
						Saldo a liberar
						Total Liberado até o exercício
						R\$ 46.786.085,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61				0,00%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	50.000.000,00		Valor realizado:	46.786.085,39	70,00%		Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 29)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGFD						
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Problema (causa):											
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)					
		100	5	90	49.690.000,03	-					
Previsão de Conclusão:		30/05/2014						Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
Data Atualização:		30/05/2014						Pago até o ano anterior R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						A realizar no exercício R\$ 49.690.000,03			
								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -			
								Valor Empenhado no Exercício R\$ -			
								Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 37.225.328,03			
								Saldo a liberar R\$ 12.464.672,00			
								Saldo a Empenhar no exercício R\$ -			
								Total Liberado até o exercício R\$ 37.225.328,03			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim				Valor
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Joema/J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído	
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	37.225.328,03	70,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

2º Ciclo 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 30)		
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:										
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD		
Dirutor:	Henrique Jorge Tincoco Aguiar						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):										
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A									
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN									
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)					
	100	5	90	46.701.999,96	-					
Previsão de Conclusão:	01/04/2014							Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Data Atualização:	30/05/2014							Pago até o ano anterior	R\$ -	
							A realizar no exercício	R\$ 46.701.999,96		
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 34.986.862,96		
							Saldo a liberar	R\$ 11.715.137,00		
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
							Total Liberado até o exercício	R\$ 34.986.862,96		
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler								
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas		Ações Corretivas	
1	Carta-consulta		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	01/09/11 31/10/11 -	01/09/11 26/10/11 -	100,00% Concluído				
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	07/12/11 05/02/12 -	07/12/11 01/02/12 -	100,00% Concluído				
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	06/02/12 10/02/13 -	06/02/12 - -	100,00% Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.		Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.	
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12 24/03/13 -	24/12/12 25/03/13 -	100,00% Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.			
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	25/03/13 24/04/13 -	25/03/13 15/05/13 -	100,00% Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.			
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	15/05/13 31/05/13 -	15/05/13 24/05/13 -	100,00% Concluído				
7	Liberação 1		SUDENE/BNB	01/02/14 03/03/14 34.986.862,96	13/12/13 24/01/14 34.986.862,96	100,00% Concluído				
7	Liberação 2		SUDENE/BNB	01/03/14 31/03/14 11.715.137,00		0,00% Atrasado				
8	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado	0,00%	A Iniciar			
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado	0,00%	A Iniciar			
				Valor Previsto:	46.701.999,96	Valor realizado:	34.986.862,96	70,00% Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

2º Ciclo 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 31)				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGLD				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar											
Problema (causa):												
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A											
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Elétrica - 18,0 MW - Sobradinho/BA											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
		100	5	90	29.040.000,00	-	Pago até o ano anterior	R\$ -				
Previsão de Conclusão:		30/05/2014						A realizar no exercício	R\$ 29.040.000,00			
Data Atualização:		30/05/2014						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 21.755.374,08			
								Saldo a liberar	R\$ 7.284.625,92			
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
								Total Liberado até o exercício	R\$ 21.755.374,08			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas		
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Inicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor	Físico %			
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/12/11	05/02/12	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/ Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CNN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92				0,00%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	21.755.374,08	70,00%	Atrasado	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	-	
Previsão de Conclusão:	01/08/2014					Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	30/05/2014					A realizar no exercício R\$ 53.959.000,00
						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ 40.423.492,77
						Valor liberado no Exercício (LOA) R\$ -
						Saldo a liberar R\$ 13.535.507,23
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ 40.423.492,77

Responsáv(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrepostos.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23				0,00%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	53.959.000,00		Valor realizado:	40.423.492,77	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrepostos os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
2º Ciclo 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	-		Pago até o ano anterior R\$ -
Previsão de Conclusão:	01/08/2014					A realizar no exercício R\$ 99.970.000,00	
Data Atualização:	30/05/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício R\$ -	
						Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -	
						Saldo a liberar R\$ 99.970.000,00	
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -	
						Total Liberado até o exercício R\$ -	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestrados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	41.731,00	41.754,00	-	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implementado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	99.970.000,00		Valor realizado:	0,00	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestrados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 36
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGFD		
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	303.000.000,00		Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão:	30/07/2015					A realizar no exercício	R\$ 303.000.000,00
Data Atualização:	30/05/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
						Saldo a liberar	R\$ 303.000.000,00
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
						Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14		100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,00				0,00%	Atrasado	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	48.707.006,00				0,00%	A Iniciar	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/14	31/10/14	22.281.666,00				0,00%	A Iniciar	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/15	31/01/15	18.954.422,00				0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	15.245.856,75				0,00%	A Iniciar	
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	0,00	41,67%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes. Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 37			
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGFD			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar										
Problema (causa):											
Projeto:	Aratu Empreendimentos Ltda										
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	270.582.240,00		Pago até o ano anterior	R\$ -			
Previsão de Conclusão:		30/12/2017						A realizar no exercício	R\$ 80.590.017,00		
Data Atualização:		30/05/2014						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
								Saldo a liberar	R\$ 270.582.240,00		
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
								Total Liberado até o exercício	R\$ -		
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto		Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13	-	19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	54.516.375,00				0,00%	Atrasado	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/14	29/11/14	12.381.495,00				0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/11/14	28/02/15	13.692.147,00				0,00%	A Iniciar	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	29/05/15	25.480.367,00				0,00%	A Iniciar	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/05/15	29/08/15	26.388.906,00				0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/08/15	29/11/15	6.557.454,00				0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	30/11/15	28/02/16	9.615.399,00				0,00%	A Iniciar	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	29/02/16	29/05/16	26.795.017,00				0,00%	A Iniciar	
13	Liberação 9	SUDENE/BB	31/05/16	29/08/16	29.260.923,00				0,00%	A Iniciar	
14	Liberação 10	SUDENE/BB	31/08/16	29/11/16	20.665.368,00				0,00%	A Iniciar	
15	Liberação 11	SUDENE/BB	30/11/16	28/02/17	7.019.491,00				0,00%	A Iniciar	
16	Liberação 12	SUDENE/BB	28/02/17	29/05/17	4.091.190,00				0,00%	A Iniciar	
17	Liberação 13	SUDENE/BB	31/05/17	29/08/17	18.422.784,00				0,00%	A Iniciar	
18	Liberação 14	SUDENE/BB	31/08/17	29/11/17	15.695.324,00				0,00%	A Iniciar	
19	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
20	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	270.582.240,00	Valor realizado:	0,00	20,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	PO 38
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE				Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).				Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos				Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):						
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	5	90	23.855.042,00				Pago até o ano anterior	R\$ -
Previsão de Conclusão:	30/12/2014							A realizar no exercício	R\$ 23.855.042,00
Data Atualização:	30/05/2014							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
								Saldo a liberar	R\$ 23.855.042,00
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
								Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobretempo dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14		-	0,00%	Em Andamento	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/09/14	30/11/14	9.992.845,00			-	0,00%	A Iniciar	
7	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
8	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	23.855.042,00		Valor realizado:	0,00	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2014	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 39
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar						
Problema (causa):							
Projeto:	Deten Química S.A.						
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
	100	5	90	31.256.000,00		Pago até o ano anterior	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	30/01/2016					A realizar no exercício	R\$ 17.287.600,00	
Data Atualização:	30/05/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	
						Saldo a liberar	R\$ 31.256.000,00	
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
						Total Liberado até o exercício	R\$ -	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00			-	0,00%	Atrasado	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00			-	0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00			-	0,00%	A Iniciar	
	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00			-	0,00%	A Iniciar	
	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar	
	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00			-	0,00%	A Iniciar	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	31.256.000,00		Valor realizado:	0,00	33,33%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2014.	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 40
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.		
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	

Previsão de Conclusão: 30/10/2014

Data Atualização: 30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto: Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 61.867.350,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 61.867.350,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Cosulta prévia	Mauro Povas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14		-	70,00%	Em Andamento	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95			-	0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87			-	0,00%	A Iniciar	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	61.867.350,00		Valor realizado:	0,00	52,22%		Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	PO 41				
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					Ano:	2012				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE					Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	DFIN/CGFD				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos					Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):						Responsável:					
Projeto:	Cone Multicenter Ltda					Assunto:					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)					
		100	5	90	191.238.424,00		Pago até o ano anterior	R\$ -			
Previsão de Conclusão:		30/03/2017					A realizar no exercício	R\$ 107.720.106,00			
Data Atualização:		30/05/2014					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ -			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00			-	0,00%	Atrasado	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00			-	0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00			-	0,00%	A Iniciar	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00			-	0,00%	A Iniciar	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00			-	0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00			-	0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00			-	0,00%	A Iniciar	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00			-	0,00%	A Iniciar	
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	191.238.424,00		Valor realizado:	0,00	28,57%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014.

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 42
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	DFIN/CGFD
Diretor:	Henrique Jorge Tinoco Aguiar		
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S.A.		
Objetivo do projeto:	Fábrica de Resina Termoplásticas		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	

Previsão de Conclusão:	30/11/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	50.000.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	50.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14			16/05/14		-	50,00%	Em Andamento		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00			-	0,00%	A Iniciar		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				-	0,00%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		0,00	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
2º Ciclo 2014.	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2008
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)		
Problema (causa):	Disfunções/desvios entre atribuições e a ocupação de cargos em decorrência de não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219, de 04/10/2007.		
Projeto:	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).		
Objetivo do projeto:	Elaborar novo Decreto de estrutura regimental para corrigir as não-conformidades provocadas pelo Decreto nº 6.219/2007, particularmente a recomposição de funções e atribuições funcionais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				100	1			Pago até o ano anterior	R\$ -
				90	0,00	R\$ -		A realizar no exercício	R\$ -
								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
								Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
								Valor liberado no Exercício	R\$ -
								Saldo a liberar	R\$ -
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
								Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	07/03/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
-----------------------------	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Encaminhamento do Projeto de Lei de criação de cargos pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados.	Casa Civil da Presidência da República (MPO)	16/05/08	01/12/08	-	16/05/08	11/10/12	-	100%	Concluído	
2	Aprovação da Lei de criação dos novos cargos e funções gratificadas	Presidência da República (Casa Civil, Min. Fazenda e MI)	02/12/08	04/03/09	-	02/12/08	17/12/12	-	100%	Concluído	Lei nº 12.742, de 17/12/2012
3	Elaboração de minuta de decreto de Estrutura Regimental para a SUDENE	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	04/01/13	11/01/13	-	04/01/13	11/01/13	-	100%	Concluído	Of. nº 003/2013/SUDENE/GAB
4	Solicitação de ajustes à minuta de decreto de estrutura regimental com o corte de 3 cargos DAS.	Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI)	18/03/13	18/03/13	-	18/03/13	18/03/13	-	100%	Concluído	
5	Revisão da proposta de Decreto da nova estrutura regimental da SUDENE e envio ao MI.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE)	18/03/13	19/03/13	-	18/03/13	19/03/13	-	100%	Concluído	O MI em 09/05 encaminhou ajustes na estrutura sem possibilidade de alteração, solicitando do Superintendente, a validação para continuidade da tramitação. Esses ajustes unilaterais não conferem com a posição da AGI.
6	Encaminhamento da minuta pelo MI ao MPO	Secretaria Executiva/MI	15/05/13	15/05/13	-	15/05/13	07/06/13	-	100%	Concluído	
7	Análise Técnica e aprovação pela Secretaria de Gestão Pública/MPOG	Secretaria de Gestão Pública/MPOG	08/06/13	20/09/13	-	08/06/13	10/10/13	-	100%	Concluído	Os prazos dados são expectativas baseadas em posição da SEGEOP/MPO.
8	Manifestação da CONJUR/MPOG	Consultoria Jurídica do MPOG	15/10/13	24/10/13	-	15/10/13	30/10/13	-	100%	Concluído	
9	Proposta do Decreto de estrutura regimental da SUDENE	Casa Civil da Presidência da República (MPO e MI)	29/10/13	25/02/14	-	29/10/13	14/11/13	-	100%	Concluído	A proposta encontra-se no MPOG e está pronta para assinatura da Presidenta da República, porém enfrenta agenda política.

Valor Previsto: 0,00 Valor realizado: 0,00 100% Concluído Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014.

obs.: A parte da preparação interna (SUDENE) objeto deste PO foi concluída e aprovada pelo Superintendente. A proposta de Decreto já se encontra aprovada pelo MPOG e pela Casa Civil da Presidência da República desde mar/2014. Aguardando apenas assinatura e publicação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2014
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade		
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste		
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)		
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)								
						Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	-	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
				0,00	R\$ -							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
Previsão de Conclusão:	12 dias após publ. Decreto Est Reg.											Saldo a liberar	R\$ -	
Data Atualização:	30/05/2014											Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca											Total Liberado até o exercício	R\$ -	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	3 dias após publicação	+ 3 dias					0%	A Iniciar	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
2	Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	1 dia após concluída a etapa 1	+ 3 dias					0%	A Iniciar	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
3	Reunião para apresentação dos resultados e novos ajustes.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (AGI)	1 dia após concluída a etapa 2	Mesmo dia					0%	A Iniciar	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
4	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Manoel Barreiros (AGI)	2 dia após concluída a etapa 3	Mesmo dia					0%	A Iniciar	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
5	Publicação no DOU e Boletim interno.	Nivaldo Andrade (CGAF) e Samuel (SAD/GAB)	1 dia após concluída a etapa 4	+ 4 dias					0%	A Iniciar	Prazos definidos em função do esquema montado pela AGI para os devidos encaminhamento em regime de urgênciatão logo haja a publicação do Decreto de Estrutura.
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	0%	A Iniciar	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Observações:

2º Ciclo 2014

Legenda

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 45
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.				
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Assessoria de Gestão Institucional		
Responsável :	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros		
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.				
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.				

Dados Orçamentários	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)								
	1	90	0,00	0,00	Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	-	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Previsão de Conclusão:	08/04/2015				Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	-
Data Atualização:	30/05/2014				Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	-			
Responsável(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca e Manoel Barreiros												

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído	
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE), Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	
3	Reunião para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (AGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	
4	Reunião de planejamento, para discussão das propostas para a construção do EP (missão, visão, valores, objetivos do EP, Finalidade (papéis, responsabilidades, objetivos e funções/atribuições), apresentação do Mapa de Relacionamento, da minuta de portaria para implementação dos trabalhos e escolha dos primeiros processos a serem mapeados.	Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	08/05/14	20/06/14	-			-	80%	Em Andamento	Nessa etapa falta a assinatura da portaria com os integrantes do Escritório
5	Ajuste do mapa de relacionamentos.	Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	12/05/14	29/06/14	-			-	10%	Em Andamento	Foram realizadas as primeiras análises e sugeridos os primeiros ajustes
6	Decisão pela escolha dos principais processos da AGI, como piloto, para organizar em função dos novos funcionários que estão chegando.	Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	02/05/14	03/08/14					20%	Em Andamento	

7	Reunião com o grupo para apresentar o trabalho realizado. Consolidação do plano de trabalho com cronograma para os primeiros processos a serem mapeados após a AGI. Selecionar nova unidade.	Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	21/07/14	20/07/14					0%	a iniciar
8	Reunião com interlocutor da unidade escolhida para discussão sobre metodologia de mapeamento e início dos trabalhos piloto.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	23/07/14	23/07/14	-			-	0%	A Iniciar
9	Mapeamento piloto dos processos da unidade escolhida.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	24/07/14	30/09/14					0%	A Iniciar
10	Reunião interna com gestores de todas as unidades para apresentação dos resultados dos primeiros processos mapeados (piloto) e preparação de apresentação sobre os resultados já alcançados, para a Diretoria Colegiada.	Equipe do EP, Carmen Fonseca (AGI/SUDENE) e interlocutor da unidade trabalhada.	03/10/14	09/10/14					0%	A Iniciar
11	Apresentação à Diretoria Colegiada da SUDENE, dos primeiros resultados mapeados no piloto, para deliberação.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	10/10/14	10/10/14	-			-	0%	A Iniciar
12	Atualização do cronograma de mapeamento, com inserção de novas unidades, ajustes na abordagem e nas estratégias de sensibilização.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	11/10/14	18/10/14					0%	A Iniciar
13	Reuniões com as novas unidades para preparação dos trabalhos de mapeamento.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	22/10/14	30/10/14					0%	A Iniciar
14	Início dos trabalhos de mapeamento de processos com as novas unidades incorporadas ao processo.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	01/11/14	23/12/14					0%	A Iniciar
15	Treinamento e teste de funcionalidade dos novos mapeamentos.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	13/01/15	28/02/15					0%	A Iniciar
16	Manualização e revisão/ajuste de todos os processos mapeados.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	02/03/15	31/03/15					0%	A Iniciar
17	Aprovação geral da sistemática de procedimentos com base no mapeamento realizado.	Equipe do EP e Carmen Fonseca (AGI/SUDENE)	08/04/15	08/04/15	-			-	0%	A Iniciar
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	24%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014.

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Suplementação emergencial do quadro funcional.		
Diretoria responsável:	Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Aguda escassez de servidores comprometendo a eficiência da gestão.		
Projeto:	Concurso Público da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Agilizar a realização do concurso público e a recomposição do quadro funcional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250			621.372,00	621.372,00

Previsão de Conclusão:	06/01/2014
Data Atualização:	19/03/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Ângela Maria Lima Gouveia
------------------------------------	---------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 497.097,60
A realizar no exercício	R\$ 621.372,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 124.274,40
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 621.372,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Reunião técnica no MI sobre elaboração de concurso	Ângela Lima	22/01/13	22/01/13		22/01/13	22/01/13		100%	Concluído	
2	Pesquisa de referências para elaboração de perfis de cargos	Comissão de concurso	29/01/13	05/02/13		29/01/13	05/02/13		100%	Concluído	
3	Estudo e análise da demanda de cargos por unidade administrativa da Sudene	Comissão de concurso	05/02/13	07/02/13		05/02/13	07/02/13		100%	Concluído	
4	Elaboração de requisitos e atribuições de cargos	Comissão de concurso	08/02/13	25/02/13		08/02/13	25/02/13		100%	Concluído	
5	Elaboração do Projeto Básico do Concurso	Comissão de concurso	26/02/13	28/02/13		26/02/13	28/02/13		100%	Concluído	
6	Apresentação dos trabalhos ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr. Superintendente da Sudene para apreciação	Comissão de concurso	04/03/13	04/03/13		04/03/13	04/03/13		100%	Concluído	
7	Ajustes e adequação do Projeto Básico	Comissão de concurso	04/03/13	05/03/13		04/03/13	05/03/13		100%	Concluído	
8	Expedição de correspondência a instituições para fins de enquadramento em processo de contratação	Angela Lima	05/03/13	06/03/13		05/03/13	06/03/13		100%	Concluído	
9	Apreciação e análise comparativa das propostas	Comissão de concurso	25/03/13	03/04/13		25/03/13			100%	Concluído	
10	Expedição de correspondência a instituições para fins de enquadramento em processo de contratação por insuficiência de propostas.	Angela Lima	03/04/2013	04/04/2013		03/04/2013	04/04/2013		100%	Concluído	
11	Apreciação e análise comparativa das propostas	Comissão de concurso	12/04/2013	12/04/2013		12/04/2013	12/04/2013		100%	Concluído	
12	Apresentação das considerações sobre as propostas ao Sr. Diretor de Administração e ao Sr.	Comissão de concurso	15/04/2013	17/04/2013		15/04/2013	17/04/2013		100%	Concluído	

13	Elaboração de Despacho para encaminhamento de celebração de contrato	Comissão de concurso	18/04/2013	18/04/2013		18/04/2013	18/04/2013		100%	Concluído		
14	Elaboração de Contrato e análise jurídica	Comissão de concurso	18/04/2013	26/04/2013		26/04/2013	29/04/2013		100%	Concluído		
15	Devolução do Jurídico (Adequação ao Acórdão TCU)	Comissão de concurso	29/04/2013	21/05/2013		21/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído		
16	Análise jurídica	Procuradoria	23/05/2013	27/05/2013		27/05/2013	31/05/2013		100%	Concluído		
17	Assinatura do Contrato e reunião técnica com a empresa contratada	Superintendente/Empresa	27/05/2013	31/05/2013		31/05/2013	26/06/2013		100%	Concluído		
18	Apresentação de cronograma das atividades relativas ao concurso	Fundação Getúlio Vargas	31/05/2013	07/06/2013		18/06/2013	19/06/2013		100%	Concluído		
19	Publicação do edital de abertura	Sudene	07/06/2013	21/06/2013		26/06/2013	27/06/2013		100%	Concluído		
20	Liberação de 60 % do valor total (1ª parcela de 3)	Sudehe	06/09/2013	06/09/2013	372.823,20	06/09/2013	06/09/2013	372.823,20	100%	Concluído		
21	Aplicação das provas	Fundação Getúlio Vargas	15/09/2013	15/09/2013		15/09/2013	15/09/2013		100%	Concluído		
22	Liberação de 20 % do valor total (2ª parcela de 3)	Sudene	18/09/2013	28/09/2013	124.274,40	19/09/2013	24/09/2013	124.274,40	100%	Concluído		
23	Publicação definitivo da prova discursiva	Fundação Getúlio Vargas	05/12/2013	06/12/2013		05/12/2013	06/12/2013		100%	Concluído		
24	Aplicação de perícia médica p/ portadores de deficiência.	Fundação Getúlio Vargas	16/12/2013	16/12/2013		13/12/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
25	Publicação do resultado da perícia médica dos portadores de deficiência.	Fundação Getúlio Vargas	20/12/2013	20/12/2013		13/12/2013	13/12/2013		100%	Concluído		
26	Publicação final das provas e homologação	Fundação Getúlio Vargas	26/12/2013	26/12/2013		23/12/2013	23/12/2013		100%	Concluído		
27	Apresentação do Relatório Final do trabalho	Fundação Getúlio Vargas	27/12/2013	27/12/2013		09/01/2014	09/01/2014		100%	Concluído		
28	Liberação de 20 % do valor total (3ª parcela de 3)	Sudene	06/01/2014	06/01/2014	124.274,40	16/01/2014	21/01/2014	124.274,40	100%	Concluído		

Valor Previsto:

621.372,00

Valor realizado:

621.372,00

100%

Concluído

Status do Projeto

Parceiros institucionais:**Observações:**

2º Ciclo - 2014

Obs.: As etapas "Aplicação de Perícia Médica para portadores de deficiência" e "Publicação do resultado da perícia médica dos portadores de deficiência" foram realizadas com a ressalva de que o único concursado nessa condição não compareceu, sendo então reprovado.

O total do projeto, inicialmente estimado em R\$ 2 milhões foi ajustado para R\$ 621.372,00.

OBS: AS DATAS PODERÃO SER ALTERADAS, TENDO EM VISTA A DINÂMICA DE AGENDAS.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					Número do Projeto:	47			
Objetivo estratégico:	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas					Ano:	2014			
Programa do PPA:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional					Eixo temático (MI):	Implementar Gestão eficiente, eficaz e efetiva			
Ação do PPA:	2000 - Administração de Unidade					Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão			
Objetivo da ação:						Subunidade responsável:	CGC			
Diretoria responsável:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO -DAD					Gestor da subunidade:	ZIZETE NOGUEIRA			
Diretor:	MARCOS ROBALINHO									
Problema (causa):	Dificuldade dos proponentes na apresentação de propostas no SICONV, em decorrência do desconhecimento legal bem como na operacionalização do SICONV									
Projeto:	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, de celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;									
Objetivo do projeto:	Orientar os proponentes para elaboração e apresentação de propostas, no SICONV, objetivando celebração de convênios com a SUDENE.									
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros					
					Pago até o ano anterior					
					A realizar no exercício					
					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)					
					Valor Empenhado no Exercício					
					Valor liberado no Exercício					
					Saldo a liberar					
					Saldo a Empenhar no exercício					
					Total Liberado até o exercício					
Previsão de Conclusão:		30/05/2014								
Data Atualização:		30/05/2014								
Responsável(s) pelo Projeto		Zizete Falcão Nogueira								
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	
1	Realizar oficinas, nos Estados, da área de atuação da SUDENE.	CGC/CGDS	01/02/14	30/05/14		01/02/14	30/05/14		100%	Concluído
2	Reunião com a CGDS para alinhar a programação dos eventos	CGC/CGDS	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído
3	Elaborar Cronograma dos Eventos	CGC	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído
4	Encaminhar Ofícios aos Estados	CGC	01/02/14	01/03/14		01/02/14	01/03/14		100%	Concluído
5	Elaborar material para as oficinas	CGC/CGDS	01/02/14	28/02/14		01/02/14	28/02/14		100%	Concluído
6	Realizar das Oficinas nos Estados	CGC/CGDS	01/03/14	30/03/14		01/03/14	30/03/14		100%	Concluído
7	Elaborar Relatório com o feedback das oficinas	CGC	01/04/14	30/05/14		01/04/2014	30/05/2014		100%	Concluído
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	100,0%		Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
 ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
 PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	48
Objetivo estratégico:	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Ano:	2014
Programa do PPA:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação do PPA:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO -DAD	Subunidade responsável:	CGC
Diretor:	MARCOS ROBALINHO	Gestor da subunidade:	ZIZETE NOGUEIRA
Problema (causa):	Desconhecimento dos convenientes na utilização do SICONV e na aplicação da legislação que rege a matéria		
Projeto:	Realização de oficina, com os convenientes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;		
Objetivo do projeto:	Orientar os convenientes, objetivando a execução do objeto do Convênio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	Zizete Nogueira
-----------------------------	-----------------

Valores Orçamentários/ Financeiros
Pago até o ano anterior
A realizar no exercício
Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.)
Valor Empenhado no Exercício
Valor liberado no Exercício
Saldo a liberar
Saldo a Empenhar no exercício
Total Liberado até o exercício

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Realizar 01 oficina com os convenientes	CGC	01/03/14	30/05/14		01/03/14	30/05/14		100%	Concluído	
2	Elaborar material para a reunião	CGC	01/03/14	01/04/14		01/03/14	01/04/14		100%	Concluído	
3	Encaminhar convites para os convenientes	CGC	01/03/14	30/04/14		01/03/14	30/04/14		100%	Concluído	
4	Realizar a oficina	CGC/CGDS	01/03/14	30/05/14		01/03/14	30/05/14		100%	Concluído	
			Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				250	44	
				7.482.242,89	7.482.242,89	

Previsão de Conclusão:	21/08/2015
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
-----------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior (2013)	R\$	2.397.648,13
A realizar no exercício 2014 (RAP 2013)	R\$	563.439,54
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014)	R\$	1.000.000,00
Valor Empenhado no Exercício (2014)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (2014)	R\$	232.466,52
Saldo a liberar (RAP 2013)	R\$	563.439,54
Saldo a Empenhar no exercício (2014)	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	2.630.114,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído	
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.
3	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.
4	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
5	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.
6	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.
7	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	19/09/14	0,00	20/01/14			30%	Em Andamento	Tendo em vista a grande proporção do incêndio ocorrido na edificação, faz-se necessária a contratação de novos projetos de ambientação, de elétrica, de ar condicionado, de sonorização etc.
											A Área de Engenharia, em 07/05/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação desses projetos, acompanhado da proposta de uma empresa, no valor de R\$ 273.600,00.

8	Contratação das poltronas para os auditórios	Elaine Ferrari e Mariza Fontaine	02/12/13	31/07/14	960.000,00	06/02/14			75%	Em Andamento	A Área de Engenharia recebeu propostas das empresas Flexform e Alberflex e está aguardando a necessária terceira proposta, tendo sido contactada a empresa Marelli.
9	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares		Empresa a contratar	22/09/14	22/03/15	273.600,00			0%	A Iniciar	A empresa de projetos apresentará o Projeto Básico para a licitação da execução da obra, contendo o Orçamento Básico com todos os elementos necessários para essa contratação.
10	Licitação da obra de ambientação final	Eneida (SUDENE/CPL)	17/11/14	20/02/15	0,00				0%	A Iniciar	
11	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	23/02/15	21/08/15	3.300.000,00				0%	A Iniciar	A Área de Engenharia estimou o valor global da execução da obra de ambientação em R\$ 3.300.000,00.
12	Fiscalização da obra de ambientação final	José Wilson Galdino e José Villeneuve	23/02/15	21/08/15	0,00				0%	A Iniciar	
13	Entrega da obra			21/08/15					0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:	7.482.242,89	Valor realizado:	2.630.114,65	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º Ciclo 2014

A CPL solicitou a repactuação de prazo de 90 (noventa) dias.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo de ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Problema (causa):	Desgaste dos equipamentos e instalações de combate a incêndio pela falta de manutenção e divergentes da atual norma brasileira vigente, colocando em risco a segurança do edifício.		
Projeto:	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.		
Objetivo do projeto:	Execução das obras de instalação de proteção contra incêndio do Edifício SUDENE e seus anexos (Biblioteca, Condel, Restaurante e Antigo serviço médico)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				250	33	
				90	2.700.000,00	2.700.000,00
Previsão de Conclusão:	03/06/2016					
Data Atualização:	30/05/2014					
Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto Bem					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Projeto Básico/Projeto executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	30.000,00	30/06/09	22/09/10	30.000,00	100%	Concluído	Entrega do projeto básico e do projeto executivo realizado pela empresa Policonsult.
2	Llicitação	Eneida (Sudene/CPL)	22/12/11	06/03/12	0,00	22/12/11	06/03/12	0,00	100%	Concluído	Llicitação deserta
4	Modificação do Projeto	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	15/06/12	30/07/12	0,00	15/06/12	13/08/12	0,00	100%	Concluído	O atraso se deu em virtude de estarmos aguardando o envio de informações técnicas adicionais pela empresa de consultoria (Policonsult)
5	Nova licitação (retomada)	Eneida (Sudene/CPL)	30/07/12	16/11/12	0,00	13/08/12	05/12/12	0,00	100%	Concluído	A fase de habilitação da licitação ocorreu em 08/10/2012, tendo comparecido apenas a empresa P. C. Campano Com. e Serv. ME, a qual foi inabilitada por questões formais, concedendo-se à licitante o prazo legal de oito dias úteis para apresentação dos documentos requeridos, para revisão da sua inabilitação.
6	Elaboração do Projeto Básico para contratação de empresa de consultoria	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem (SUDENE/CGAF)	02/01/14	25/08/14	0,00	17/03/14			50%	Em Andamento	A Área de Engenharia está elaborando o Termo de Referência necessário para a contratação de empresa de consultoria, a qual será responsável pela atualização do Projeto Executivo e elaboração do Projeto Básico para a contratação das obras e posterior assessoria à Comissão de Fiscalização.
7	Llicitação da Consultoria	Eneida (Sudene/CPL)	26/08/14	26/11/14	0,00				0%	A Iniciar	
8	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Empresa a ser contratada	27/11/14	27/02/15	30.000,00				0%	A Iniciar	
9	Relançamento da licitação da obra (3ª tentativa)	Eneida (Sudene/CPL)	02/03/15	02/06/15	0,00				0%	A Iniciar	
10	Execução da Obra	Empresa a ser contratada	03/06/15	03/06/16	2.400.000,00				0%	A Iniciar	O orçamento básico para a contratação da obra será elaborado pela empresa de consultoria, sendo estimado, pela área de Engenharia, o valor global da obra em torno de R\$ 2.400.000,00.
11	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização e Empresa a ser contratada	03/06/15	03/06/16	240.000,00				0%	A Iniciar	

12	Entrega da obra	Empresa a ser contratada		03/06/16	0,00			0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	2.700.000,00	Valor realizado:	30.000,00	18%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Ministério da Saúde; IBGE; CODEVASF; TRT 6ª Região; CTI/NE; Ministério do Planejamento; Banco do Brasil; Banco no Nordeste; INSS; IFPE; e DFRP/MI.

Observações:

2º Ciclo 2014

A Área de Engenharia solicita repactuação de prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)		
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	8.229.186,02	8.229.186,02

Previsão de Conclusão:	22/08/2014
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior (2013)	R\$	5.023.543,17
A realizar no exercício 2014 (RAP 2012+2013)	R\$	3.205.642,85
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito 2014)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício 2014	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP 2012/2013)	R\$	-
Saldo a liberar (RAP 2012+2013)	R\$	3.205.642,85
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	5.023.543,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0,00	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Llicitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Recebimento Definitivo da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	02/04/12	02/05/12	0,00	02/04/12	02/05/12	0,00	100%	Concluído	Somente foram recuperados 119 blocos de fundação com dotação de 2010 e 2011. A análise preliminar feita pela empresa contratada subestimou o tamanho do problema com as fundações do prédio, vindo a requerer complementação dos trabalhos.	Lançamento de licitação para complementação da obra.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encamimar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12		100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.

8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	22/08/14	4.301.950,47	22/10/12		2.098.803,99	70%	Paralisado	Os serviços de recuperação das fundações estão com 102 blocos concluídos e 4 sapatas concluídas. A obra foi paralisada pela Contratada em 20/12/2013, sob o argumento da impossibilidade de executar serviços em áreas ocupadas pelo TRT, bem como pela necessidade de celebração do 2º Termo Aditivo. O TRT concluiu os serviços de deslocamento do cabeamento da Subestação C, a Sudene celebrou o 2º Termo Aditivo de prazo de 120 dias e a Área de Engenharia finalizou a análise da planilha do 3º Termo Aditivo, aguardando a Contratada apresentar contraproposta.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012	22/10/12	22/08/14	0,00	22/10/12			70%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização é composta pelos engenheiros civis dos seguintes Órgãos: SUDENE - Wilson Galdino e José Villeneuve; Ministério da Saúde - Cláudia Nascimento e IBGE - Edith Negromonte.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		22/08/14	0,00				0%	A Iniciar	

Valor Previsto:

8.229.186,02

Valor realizado:

5.023.543,17

87%

Paralisado

Status do Projeto

Parceiros institucionais:**Observações:**

2º Ciclo 2014

A Área de Engenharia encaminhou em 03/04/2014 a solicitação da contratação por inexigibilidade de licitação dos serviços de remoção do painel Brennand existente no Condel, que está impedindo a execução dos serviços de recuperação de cinco blocos de fundação daquela área, estando a Área de Licitações e Contratos ultimando esta contratação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	Hildo Pereira da S. Júnior
Problema (causa):	Exaustão e obsolescimento das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Substituição (modernização) de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento alternativo de energia do prédio da SUDENE, que hoje serve a diversos condôminos, por sua vez consumidores de diferentes cargas, nele instalados		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	250	33	90	2.892.394,45	2.892.394,45	Pago até o ano anterior (2013) R\$ 70.000,00 A realizar no exercício (2014) (RAP 2013) R\$ 78.000,00 Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) (2014) Valor Empenhado no Exercício (2014) Valor liberado no Exercício (RAP 2013) R\$ 30.000,00 Saldo a liberar (2014) RAP 2013 R\$ 48.000,00 Saldo a Empenhar no exercício (2014) R\$ 2.792.394,45 Total Liberado até o exercício (2012-2014) R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2015
Data Atualização:	30/05/2014

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e José Villeneuve Peixoto.
-----------------------------	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100% Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém, limitações orçamentárias e Decreto suspendem obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100% Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100% Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100% Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14			40% Em Andamento	A CPL elaborou a minuta do Edital da licitação, o qual foi analisado pela Procuradoria através do Parecer nº 67/2014, datado de 29/05/2014.	
6	Execução da Obra	A definir	22/09/14	22/03/15	2.732.394,45				0% A Iniciar	O valor previsto, R\$ 2.871.334,88, foi fornecido pela empresa Elétrica Engenharia em 28/02/2014. Em 17/04/2014 esse valor foi revisado para R\$ 2.732.394,45, a partir da adoção de BDI diferenciado para os itens 7 e 8 do orçamento básico.	
7	Fiscalização da Obra	A definir	22/09/14	22/03/15	60.000,00				0% A Iniciar		
8	Entrega da obra				22/03/15				0% A Iniciar		
			Valor Previsto:	2.892.394,45	Valor realizado:	100.000,00	20,95%		Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

2º ciclo 2014

A CPL solicitou a repactuação de prazo de 90 (noventa) dias.

Legenda

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	20WQ - PO 05 - Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE.		
Projeto:	PROCONDEL 1 - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	250	33	90	251.373,39	251.373,39	
Previsão de Conclusão:	30/06/2014					Pago até o ano anterior R\$ 251.373,39
Data Atualização:	06/06/2014					A realizar no exercício R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Angela Nascimento					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.) R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do projeto	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/08/2012	10/11/2012		15/08/2012	10/11/2012		100%	Concluído	
2	Captação de recursos	Angela Nascimento	11/11/2012	20/02/2013	-	11/11/2012	20/02/2013		100%	Concluído	
3	Contatos com articulistas	Marcos Costa Lima	02/01/2013	31/01/2013	-	02/01/2013	31/01/2013		100%	Concluído	
4	Identificação de recursos no orçamento 2013	Angela Nascimento e Frederico Cavalcanti	20/04/2013	20/04/2013		20/04/2013	20/04/2013		100%	Concluído	
5	Orientação para instrução do processo e abertura de processo	Shieley Câmara, Zizete Nogueira, Frederico Cavalcanti, Brivaldo Soares e Eva Porto	03/05/2013	20/05/2013		03/05/2013	20/05/2013		100%	Concluído	
6	Encaminhamento a DAD	Angela Nascimento	22/05/2013	22/05/2013		22/05/2013	22/05/2013		100%	Concluído	
7	Emissão de Parecer pela Procuradoria Federal/SUDENE	Romoaldo Goulart	24/05/2013	06/06/2013		06/06/2013	06/06/2013		100%	Concluído	
8	Elaboração de Nota Técnica e Plano de Trabalho	Angela Nascimento/Adonis Oliveira	09/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído	
9	Encaminhamento a CGC	Angela Nascimento	10/06/2013	10/06/2013		10/06/2013	10/06/2013		100%	Concluído	
10	Parecer da CGC	Zizete Nogueira	10/06/2013	11/06/2013		11/06/2013	11/06/2013		100%	Concluído	
11	Encaminhamento a COCF para informar liberação de limites orçamentários	Angela Nascimento	12/06/2013	12/06/2013		12/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído	
12	Atesto da COCF	Brivaldo Soares	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído	
13	Encaminhamento à Diretoria de Planejamento para inserção pauta de reunião da Diretoria Colegiada	Angela	13/06/2013	13/06/2013		13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído	
14	Aprovação do Processo na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	14/06/2013	14/06/2013		14/06/2013	14/06/2013		100%	Concluído	
15	Encaminhamento do Termo de Cooperação à Universidade Federal de Pernambuco	Angela Nascimento	28/06/2013	28/06/2013		28/06/2013	28/06/2013		100%	Concluído	
16	Tramitação na UFPE	Diretoria Convênios	01/07/2013	19/07/2013		01/07/2013	19/07/2013		100%	Concluído	
17	Assinatura do Termo de Cooperação	Reitor e Superintendente	22/07/2013	26/07/2013		22/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído	
18	Publicação no DOU	Coordenação Convênios	25/07/2013	25/07/2013		25/07/2013	25/07/2013		100%	Concluído	
19	Encaminhamento de destaque orçamentário	COFC	26/07/2013	26/07/2013		26/07/2013	26/07/2013		100%	Concluído	

20	Liberação e recebimento	COCF/UFPE	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	26/07/2013	26/07/2013	251.373,39	100%	Concluído	Foi transferido o valor total, do qual a UFPE irá desembolsar mensalmente os balores correspondente à folha de pagamento e contratação de serviços.	
21	Empenho UFPE	UFPE/PROEXTE	06/08/2013	06/08/2013		06/08/2013	06/08/2013		100%	Concluído		
22	Execução: 1ª reunião com coordenadores UFPE	Angela/Marcos Costa Lima	02/08/2013	02/08/2013		02/08/2013	02/08/2013		100%	Concluído		
23	Seleção de bolsistas UFPE	Marcos Costa Lima/Vildeane Borba	05/08/2013	15/08/2013		05/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
24	Solicitação de material e equipamento na SUDENE	Angela Nascimento	07/08/2013	15/08/2013		07/08/2013	15/08/2013		100%	Concluído		
25	Capacitação de 10 bolsistas nas atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	Májory Miranda/Vildeane Borba	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
26	Chamamento de bolsistas técnico de nível médio	Evaldo Souza/Angela Nascimento	19/08/2013	31/08/2013		19/08/2013	31/08/2013		100%	Concluído		
27	Orientação de 02 bolsistas responsáveis pela pesquisa de campo e apresentação dos mesmos à instituição de pesquisa	Angela Nascimento	20/08/2013	23/08/2013		20/08/2013	23/08/2013		100%	Concluído		
28	Pesquisa de campo	Pedro Maranhão/Sergio Cavalcante	26/08/2013	20/12/2013		26/08/2013	28/02/2014		50%	Concluído	Foram pesquisado os anos 1959 a 1964	
29	Atividades de digitalização, tratamento da imagem e descrição	10 bolsistas	02/09/2013	20/012/2013		02/09/2013	28/02/2014		45%	Concluído	Todo o acervo foi digitalizado 1959 a 1970	
30	Alteração de elemento de despesa e solicitação de pagamento de bolsas	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	23/05/2013	05/09/2013		23/05/2013	05/09/2013		100%	Concluído		
31	Acervo Sonoro - Identificação/Quantificação	Silva/Alais	02/09/2013	31/10/2013		09/09/2013	22/10/2013		100%	Concluído		
32	Acervo Sonoro - Higienização (142 fitas de rolo)	Silva/Alexandre	20/10/2013	10/11/2013		10/10/2013	25/10/2013		100%	Concluído		
33	Acervo Sonoro - Digitalização	Silva/Alexandre	11/11/2013	31/10/2013		10/10/2013	31/03/2014		100%	Concluído	O acervo 1960 a 1970; Iniciada digitalização fitas cassetes de 1971	
34	Assinatura e publicação do 1º Termo Aditivo	UFPE/SUDENE	15/01/2014	31/01/2014		15/01/2014	24/03/2014		100%	Concluído		
35	Inclusão de pesquisadora da área de publicidade	Alaide Vilanova	03/02/2014	31/03/2014		03/02/2014			85%	Em Andamento	Produção de peças para o site e seminário	
36	Entrega dos artigos	Articulistas convidados	02/09/2013	31/01/2014		02/09/2013	21/03/2014		100%	Concluído		
37	Finalização (Relatório)	Angela Nascimento/Marcos Costa Lima	15/01/2014	30/06/2014					0%	A Iniciar	O relatório final será encaminhado pela UFPE. Segundo orientação da Coordenação de Convênios, a solicitação à UFPE poderá ser feita pela responsável técnica.	
				Valor Previsto:	251.373,39	Valor realizado:	251.373,39	94%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciéncia da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

2º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 54
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	ANGELA NASCIMENTO		
Problema (causa):	Disponibilização do acervo histórico do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.				
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto					Valores Orçamentários/ Financeiros					
	100	33	90	484.650,00										
Previsão de Conclusão:	31/12/2014													
Data Atualização:	02/06/2014													
Responsável(s) pelo Projeto	Angela Nascimento													

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído	
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			25%	Em andamento	
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014			25%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014			0%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/2014		15/04/2014			6.25%	Em andamento	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Dejenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014			0%	Em andamento	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			12.5%	Em andamento	
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014			12.5%	Em andamento	
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaíde Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014			12.5%	Em andamento	

14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014			80%	Em andamento		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros da organização; Realização igual a R\$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1971-1974 (R\$ 1.200,00)	Alexandre Malta	04/04/2014	30/05/2014		01/04/2014	30/05/2014		100%	Concluído		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar		
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar		
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)		02/06/2014	30/11/2014					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	484.650,00	Valor realizado:	484.650,00	61%	Em andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

2º ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL**
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 55 (ex PO42)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Directoria responsável:	Directoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Dirutor:	Marcos Robalinho (Dirutor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Com a criação do PEI, existe a obrigatoriedade de criação do PETI, em atendimento a legislação em vigor, acórdão 1233/2012 - TCU - Plenário.		
Projeto:	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.		
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PETI.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				0,00	0,00	Pago até o ano anterior R\$ - A realizar no exercício R\$ - Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.) R\$ - Valor Empenhado no Exercício R\$ - Valor liberado no Exercício R\$ - Saldo a liberar R\$ - Saldo a Empenhar no exercício R\$ - Total Liberado até o exercício R\$ -

Previsão de Conclusão:	01/09/2014
Data Atualização:	12/06/2014

Responsáv(el)(es) técnico(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Levantamento da documentação necessária.	Luiz Carlos Dourado	28/03/2013	05/04/2013	não se aplica	03/04/2013	09/04/2013		100%	Concluído	Atraso em função da agenda dos participantes (Edgar, Josué e Luiz Carlos).
2	Reuniões técnicas para definição do alinhamento do PETI ao Realinhamento Estratégico da Sudene - 2013/2015.	Área de TI	08/04/2013	19/04/2013	não se aplica	10/04/2013	12/04/2013		100%	Concluído	
3	Redação, revisão e publicação do PETI 2013/2015.	Luiz Carlos Dourado	25/06/2013	16/09/2013	não se aplica	23/07/2013	27/09/2013		100%	Concluído	Reprogramado em função das atribuições na Coordenação de TI - férias dos gestores. Previsão para 30/08/2013
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos - aprovados com o PETI - (Portaria) ¹	Luiz Carlos Dourado	19/09/2013	14/11/2013	não se aplica	30/09/2013	28/03/2014		100%	Concluído	Reprogramado (Sudam 26 a 30/09/2013) e Licitação de equipamentos dos novos servidores (funcionários). Férias. Alinhamento Modelo de Governança.
5	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	18/11/2013	22/11/2013	não se aplica	22/04/2014	25/04/2014		100%	Concluído	Elaboração de novos instrumentos para o CESTI (Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação)
6	Apresentação da proposta do PETI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para conhecimento.	Luiz Carlos Dourado /CesTI	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar	Aguardando reformulação da Portaria 126/2009 e de novos instrumentos.
7	Encaminhamento do PETI para aprovação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar	
8	Apresentação da proposta do PETI a Diretoria Colegiada, para aprovação.	Luiz Carlos Dourado.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar	
9	Publicação da Portaria de aprovação do PETI.	Área de TI.	A definir	A definir	não se aplica				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:			0,00	Valor realizado:			0,00	90%
							Em Andamento			Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
¹ No modelo proposto o CESTI é responsável, também, pela elaboração e aprovação do PETI e do PDTI (Portaria tem que ser publicada antes da aprovação do PETI)
2º Ciclo - 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE				Número do Projeto:	PO 56 (exPO 43)	
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.				Ano:	2013	
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI				Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade				Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.	
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração				Gestor da subunidade:		
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)						
Problema (causa):	Necessidade de alinhamento ao PETI.						
Projeto:	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.						
Objetivo do projeto:	Elaborar e implantar o PDTI alinhando-o ao Plano Estratégico da SUDENE.						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				0,00	0,00	Pago até o ano anterior	R\$ -		
Previsão de Conclusão:	30/06/2014					A realizar no exercício	R\$ -		
Data Atualização:	12/06/2014					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
						Valor liberado no Exercício	R\$ -		
						Saldo a liberar	R\$ -		
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
						Total Liberado até o exercício	R\$ -		

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Análise do PETI.	Luiz Carlos Dourado	25/03/2014	28/03/2014	***	25/03/2014	26/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão e aprovação do PETI.
2	Relacionar projetos de TI (PDTI atual) aos objetivos estratégicos.	Luiz Carlos Dourado	03/04/2014	04/04/2014	***	30/03/2014	08/04/2014		100%	Concluído	
3	Redação, revisão e publicação da proposta do PDTI 2013/2014.	Luiz Carlos Dourado	07/04/2014	23/04/2014	***	09/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Aprovação dos Analistas da DAD/CSI
4	Preparação para reunião do Comitê Estratégico de TI.	Secretaria do CESTI/Área de TI.	23/04/2014	30/04/2014	***	28/04/2014	02/05/2014		100%	Concluído	Reunião com Analistas da DAD/CSI (aprovado)
5	Apresentação da proposta do PDTI ao Comitê Estratégico de TI - CESTI, para aprovação.	Área de TI.	02/05/2014		***	06/05/2014	06/05/2014		100%	Concluído	Data a ser agendada pelo Gabinete
6	Revisão e publicação da proposta.	Luiz Carlos Dourado			***	06/05/2014	07/05/2014		100%	Concluído	
7	Encaminhamento do PDTI para homologação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.		30/05/2014	***	07/05/2014	07/05/2014		100%	Concluído	Encaminhado à Diretoria de Administração para Homologação na DC.
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs.: O início deste projeto depende da conclusão do projeto 3.2.1 (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação) do Objetivo Estratégico 3.2 acima mencionado.
2º Ciclo - 2014.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 57 (exPO 44)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Dirutor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Aumento da demanda de acesso a Internet.		
Projeto:	Melhoria da infraestrutura de comunicação		
Objetivo do projeto:	Aumentar a velocidade de acesso a Internet.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	33	90	180.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	01/07/2013	01/11/2013	-	01/08/2013	12/11/2013	-	100%	Concluído	
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação (Mariza)	25/03/2014	23/05/2014	-	25/03/2014	13/06/2014		100%	Concluído	
3	Contratação.	Setor de Licitação (Mariza)	16/06/2014	30/06/2014	120.000,00				0%	A Iniciar	
4	Início da prestação do serviço.	Fornecedor	02/06/2014	30/07/2014	-				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		120.000,00	Valor realizado:		0,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

a) O valor previsto do projeto é referente a estimativa de custo anual do serviço.
2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 58 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Proporcionar melhor desempenho e disponibilidade de máquinas servidores e PCs, com menor custo.		
Projeto:	Virtualização de recursos de informática.		
Objetivo do projeto:	Reducir o custo com aquisição de máquinas servidores e PCs.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros					
					Pago até o ano anterior	R\$	-	A realizar no exercício	R\$	-
	a definir	33	90	195.000,00						
Previsão de Conclusão:	14/11/2014									
Data Atualização:	13/06/2014									
Responsável(s) pelo Projeto	Josué da Silva Ribeiro.									

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro.	25/03/2014	30/06/2014	-	25/03/2014			60%	Em Andamento	
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/07/2014	29/08/2014	-				0%	A Iniciar	
3	Contratação.	Setor de Licitação	01/09/2014	12/09/2014	-				0%	A Iniciar	
4	Realização do serviço.	Fornecedor	15/09/2014	14/11/2014	195.000,00				0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	195.000,00		Valor realizado:	0,00	33%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
2º Ciclo 2014

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Dirutor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	150.000,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	13/06/2014

Josué da Silva Ribeiro

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/2013	21/06/2013	-	04/02/2013	28/06/2013		100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/2013	31/07/2014	-	05/07/2012			85%	Em Andamento		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/2014	30/09/2014	a definir				0%	A Iniciar		
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/08/2014	28/11/2014	-				0%	A Iniciar		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto.	Empresa Contratada.	01/12/2014	31/03/2015	-				0%	A Iniciar		
6	Implantação do módulo de Projeto.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/04/2015	30/06/2015	a definir				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	47%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais

Observações:

- a) O Valor Total do Projeto refere-se apenas ao investimento por parte da Sudene. A SUDAM participa com igual valor.
b) Em 2014 serão desenvolvidos e implantados outros módulos para este Sistema porém, ainda não é possível estimar prazos e custos.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2014

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 60 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2013
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Segurança da Informação e Serviço de Rede.
Diretor:	Marcos Robalinho (Diretor de Administração acumulando a Superintendência como substituto)	Gestor da subunidade:	
Problema (causa):	Em atendimento a legislação em vigor.		
Projeto:	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação		
Objetivo do projeto:	Elaborar a proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, para elaboração da Posic / PSI, no âmbito desta Autarquia.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				0,00	0,00	
Previsão de Conclusão:	30/09/2014					
Data Atualização:	12/06/2014					
Responsável(s) pelo Projeto	Luiz Carlos Dourado.					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento da legislação em vigor.	Luiz Carlos Dourado.	10/06/2013	14/06/2013	0,00	10/06/2013	12/06/2013		100%	Concluído		
2	Redação da proposta de criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.	Luiz Carlos Dourado.	29/07/2013	10/08/2013	0,00	25/07/2013	05/09/2013		100%	Concluído		
3	Revisão e publicação da proposta.	Área de TI.	09/09/2013	16/09/2013	0,00	04/11/2013	22/11/2013		100%	Concluído		
4	Análise, formatação e minuta dos Instrumentos Normativos 1	Área de TI.	15/07/2014	30/08/2014	0,00				0%	A Iniciar	Falta definição dos instrumentos Normativos.	Alinhamento ao Modelo de Governança (PETI).
5	Encaminhamento da proposta para apreciação da Diretoria Colegiada.	Área de TI.	A definir.	30/09/2014	0,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		0,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
'No modelo proposto é criado o CESIC - Comitê de SIC (Portaria tem que ser publicada antes da Homologação pela Diretoria Colegiada)
2º Ciclo 2014

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	

ANEXO II

Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2014)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + Créditos (a)	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2013	Comentários dos desvios
04	122	2111	2000	A	1	23.482.274,00	11.500.000,00	7.350.431,48	48,97	63,92	-	-	-	-	-	
04	121	2111	2000/PO0001	A	1	500.000,00	500.000,00	138.884,24	100,00	27,78	Servidor capacitado	230		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	342.000,00	342.000,00	124.665,71	100,00	36,45	Pessoa beneficiada	228		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	39.600,00	39.600,00	4.006,20	100,00	10,12	Criança atendida	50		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	108.000,00	108.000,00	39.591,94	100,00	36,66	Servidor beneficiado	51		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	822.288,00	822.288,00	312.302,76	100,00	37,98	Servidor beneficiado	184		0,00		Meta realizada não informada pela CRH
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	20.000,00	20.000,00	556,46	100,00	2,78	Servidor beneficiado					Meta realizada não informada pela CRH
04	122	2111	09HB	A	1	3.512.829,00	3.512.829,00	1.074.754,47	100,00	-	-	-	-	-		
04	122	2111	20TP	A	1	24.304.013,00	24.304.013,00	8.225.456,90	100,00	-	-	-	-	-		
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	53.187.104,00	41.204.830,00	17.270.650,16	77,47	41,91					
09	272	0089	0181	OP	1	1.681.678,00	1.681.678,00	650.109,70	100,00	38,66	-	-	-	-		
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	1.681.678,00	1.681.678,00	650.109,70	100,00	38,66					
11	128	2029	4640	A	1	2.423.950,00	1.185.000,00	1.183.120,40	48,89	99,84	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	3.000.108,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	1.280.000,00	930.000,00	0,00	72,66	0,00	Zoneamento realizado - km²	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	2.000.000,00	450.000,00	0,00	22,50	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
19	691	2029	8902/0024	A	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/0020	A	1	750.000,00	460.000,00	0,00	61,33	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/0024	A	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada					
22	691	2029	8918	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	2.000.000,00	1.600.000,00	0,00	80,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1	500.000,00	400.000,00	0,00	80,00	0,00	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1	1.000.000,00	484.650,00	484.650,00	48,47	100,00	Avaliação Realizada			0,00	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	3.450.066,00	1.066.597,00	0,00	30,92	0,00	Plano Elaborado			0,00		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	1.633.185,00	240.000,00	0,00	14,70	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7114	A	1	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7120	A	1	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	59.537.309,00	9.816.247,00	1.667.770,40	16,49	16,99					
06	182	2040	8172	A	-	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	1.000.000,00	300.000,00	0,00	30,00	0,00					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 31/05/2014 - SIAFI

ANEXO III

**Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE**

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(2º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2019 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Atrasado	R\$ 126.368,00	R\$ 115.800,00	92%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	4%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Atrasado	R\$ 1.018.500,00	R\$ 1.018.500,00	100%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 0,00	0%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 0,00	0%
9	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biobiodiesel no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	100%
10	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32%
11	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aerooviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Paralizado	R\$ 178.440,00	R\$ 0,00	0%
12	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDTC-NE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340- Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralizado	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0%
13	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 2.672.400.000,00	R\$ 2.265.105.668,00	85%
14	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 387.000.000,00	20%
15	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
16	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 0,00	0%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(2º Ciclo 2014)

17	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuacá Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	72%
18	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
19	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 0,00	0%
20	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 0,00	0%
21	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 0,00	0%
22	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0%
23	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0%
24	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,00	85%
25	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
26	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,03	R\$ 37.225.328,03	75%
27	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	75%
28	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 21.755.374,08	75%
29	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 40.423.492,77	75%
30	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 0,00	0%

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(2º Ciclo 2014)

31	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 0,00	0%
32	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0%
33	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 0,00	0%
34	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 0,00	0%
35	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 61.867.350,00	R\$ 0,00	0%
36	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
37	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 1.1								6.491.989.329,37	3.025.672.315,84	46,6
38	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
39	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, de celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
40	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficina com os convenentes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 1.5								234.105,49	139.865,15	59,7
Total da Diretriz Estratégica 1								6.492.223.434,86	3.025.812.180,99	46,6
41	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 4.971.999,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 2.1								4.971.999,00	0,00	0,0
42	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
Total do Objetivo Estratégico 2.3								530.482,50	265.241,25	50,0
43	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 228.797,21		73%
44	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 350.978,27		53%
Total do Objetivo Estratégico 2.4								579.775,48	354.696,41	61,2
Total da Diretriz Estratégica 2								6.082.256,98	619.937,66	10,2
45	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
46	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
47	45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
48	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Concurso Público da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 621.372,00	R\$ 621.372,00	100%
Total do Objetivo Estratégico 3.1								621.372,00	621.372,00	100,0

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos
(2º Ciclo 2014)

49	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL I - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - PO 05 - Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Em Andamento	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100%
50	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
51	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
52	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
53	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	0%
54	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	0%
55	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0%
56	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo Estratégico 3.2								1.261.023,39	736.023,39	58,4
57	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.482.242,89	R\$ 2.630.114,65	35%
58	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.700.000,00	R\$ 30.000,00	1%
59	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralizado	R\$ 8.229.186,02	R\$ 5.023.543,17	61%
60	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.892.394,45	R\$ 100.000,00	3%
Total do Objetivo Estratégico 3.3								21.303.823,36	7.783.657,82	36,5
Total da Diretriz Estratégica 3								23.186.218,75	9.141.053,21	39,4
TOTAL GERAL								6.521.491.910,59	3.035.573.171,86	46,5

Posição: 30/05/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Referência dos dados: 2º Ciclo 2014

ANEXO IV

**Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA 2012-2015**

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(2º Ciclo 2014)

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado até mar/14	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de 140 apicultores em Associativismo, Cooperativismo e Formação de Redes de Comunicação, de 7 associações dos principais municípios da cadeia do mel – Chapada do Araripe.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo	Atrasado	R\$ 126.368,00	R\$ 115.800,00	91,64
Total da Ação 20N9 - Programa 2029										
2	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 2.672.400.000,00	R\$ 2.265.105.668,00	84,76
Total da Ação 0355 - Programa 2029										
3	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 387.000.000,00	19,75
4	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100,00
5	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 0,00	0,00
6	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.700.000,00	R\$ 42.723.785,57	71,56
7	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	97,70
8	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 0,00	0,00
9	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 0,00	0,00
10	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 0,00	0,00
11	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 0,00	0,00
12	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.455.000,00	R\$ 0,00	0,00
13	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 33.900.000,00	R\$ 28.688.696,00	84,63
14	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.786.085,39	R\$ 46.786.085,39	100,00

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(2º Ciclo 2014)

15	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 49.690.000,03	R\$ 37.225.328,03	74,92
16	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 46.701.999,96	R\$ 34.986.862,96	74,92
17	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 29.040.000,00	R\$ 21.755.374,08	74,92
18	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.959.000,00	R\$ 40.423.492,77	74,92
19	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 0,00	0,00
20	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 0,00	0,00
21	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aratu Empreendimentos Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 270.582.240,00	R\$ 0,00	0,00
22	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 0,00	0,00
23	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 0,00	0,00
24	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 61.867.350,00	R\$ 0,00	0,00
25	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0,00
26	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 50.000.000,00	R\$ 0,00	0,00
Total da Ação 0355 - Programa 2029								6.455.673.692,99	3.020.059.392,67	46,78
27	53	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL 1 - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1959/1970	2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - PO 05 - Divulgação das Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.	Em Andamento	R\$ 251.373,39	R\$ 251.373,39	100,00
Total da Ação 20WQ - Plano Orç 05 - Programa 2029								251.373,39	251.373,39	100,00
28	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Cooperação	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Atrasado	R\$ 1.018.500,00	R\$ 1.018.500,00	100,00
Total da Ação 4640 - Programa 2029								1.018.500,00	1.018.500,00	100,00

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(2º Ciclo 2014)

29	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Biodiesel no Nordeste Brasileiro: Infraestrutura laboratorial para caracterização físico-química de oleaginosas com potencial para produção.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	100,00
30	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 274.405,33	32,02
31	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1. Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	Projeto de Inserção Tecnológica na Educação - PITE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 4.971.999,00	R\$ 0,00	0,00
32	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e de Competitividade para o Nordeste Brasileiro (PPDT-C-NE)	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	0,00
Total da Ação 8340 - Programa 2029								26.529.014,99	974.405,33	3,67
33	3	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50,00
Total da Ação 8689 - Programa 2029								530.482,50	265.241,25	50,00
34	2	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	59,74
35	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano Estratégico de Consolidação dos Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado da Paraíba.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 1.794.595,93	R\$ 1.794.595,93	100,00
36	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Atrasado	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	100,00
37	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Promoção de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica.	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 352.840,00	3,73
38	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 0,00	0,00
39	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Malha aeroviária regional	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Económica.	Paralisado	R\$ 178.440,00	R\$ 0,00	0,00
Total da Ação 8902 - Programa 2029								12.945.856,07	3.087.301,08	23,85
40	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 0,00	0,00
Total da Ação 8917 - Programa 2029								207.542,62	0,00	0,00
41	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R\$ 694.459,19	R\$ 556.781,91	80,17
Total da Ação 8918 - Programa 2029								694.459,19	556.781,91	80,17
Total do Programa 2029								6.497.977.289,75	3.026.328.795,63	46,57
42	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73,43
43	12	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 - Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R\$ 350.978,27	R\$ 186.696,80	53,19
Total da Ação 8172 - Programa 2040								579.775,48	354.696,41	61,18
Total do Programa 2040								579.775,48	354.696,41	61,18
44	43	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Regulamentação de decreto com a nova estrutura regimental da SUDENE (proposta).	2111 - Programa de Gestão e Administração de Unidade	2000 - Administração de Manutenção do MI	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
45	44	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Administração de Unidade	2000 - Administração de Manutenção do MI	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
46	45	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Administração de Unidade	2000 - Administração de Manutenção do MI	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
47	46	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Concurso Público da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Administração de Unidade	2000 - Administração de Manutenção do MI	Concluído	R\$ 621.372,00	R\$ 621.372,00	100,00

SUDENE
Relação de Planos Operativos e resultados segundo Programas e Ações do PPA 2012-2015
(2º Ciclo 2014)

48	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficinas para divulgação dos programas a serem disponibilizados, no SICONV, bem como transmitir orientações legais, da fase inicial, de celebração dos Convênios, na área de atuação da SUDENE;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
49	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as Administrações Públicas	Realização de oficina, com os convenientes, objetivando transmitir orientações de acompanhamento, execução e Prestação de Contas dos convênios vigentes;	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
50	49	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.482.242,89	R\$ 2.630.114,65	35,15
51	50	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Sistema de Combate a Incêndios do Edifício SUDENE e anexos.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.700.000,00	R\$ 30.000,00	1,11
52	51	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 8.229.186,02	R\$ 5.023.543,17	61,05
53	52	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 2.892.394,45	R\$ 100.000,00	3,46
54	54	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 11971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100,00
55	55	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
56	56	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
57	57	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Melhoria da infraestrutura de comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	0,00
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Virtualização de recursos de informática.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 195.000,00	R\$ 0,00	0,00
59	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	0,00
60	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modelo de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Total da Ação 2000 - Programa 2111								22.934.845,36	8.889.679,82	38,76
Total do Programa 2111								22.934.845,36	8.889.679,82	38,76
TOTAL GERAL								6.521.491.910,59	3.035.573.171,86	46,55

Posição: 30/05/2014

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Referência dos dados: 2º Ciclo 2014
