



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

**1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação
2016**

**Recife
31 de março de 2016**

Sumário

	Pág.
Introdução	03
1 – Resultados do monitoramento	08
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	12
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	27
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	35
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos	48
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos	51
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) - Resultado out/2015 - mar/2016	54
8 – Observações e Deliberações em plenária de 31/03/2016	56
9 – Conclusão	58
Anexo I – Quadros do monitoramento	62
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2015	194
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	196
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA	202

Introdução

Dando continuidade ao processo de monitoramento iniciado em 2013, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI) promoveu no dia 31 de março o 1º ciclo de monitoramento e avaliação das principais ações da SUDENE. Uma reunião com contou com a presença do Superintendente João Paulo Lima e Silva, dos Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas, Sérgio Alencar, do Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Ricardos Barros, e do Diretor de Administração, Eugênio Pacelli, além de outros 33 técnicos, entre gestores de unidades e líderes de projeto.

Na oportunidade foi apresentado um balanço por meio de indicadores de processo, dos principais resultados alcançados pelas unidades internas no ano de 2015, seguido da apresentação dos projetos.

A sistemática constou de prévia atualização do portfólio pelas próprias unidades, incluindo projetos de anos anteriores ainda em andamento, seguida da análise de consistência das informações e da verificação dos padrões de dados pela Coordenação-Geral de Gestão Institucional, culminando com a reunião para apresentação dos resultados. Para este ciclo foram relacionados 77 projetos dos quais 12 selecionados segundo o critério de impacto, complexidade ou dificuldades que demandassem urgente intervenção da Superintendência.

Segundo a origem, foram apresentados 2 planos operativos (POs) da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI/Superintendência); 11 da Diretoria de Administração (DAD); 31 da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); e 33 da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN). Estes, projetos apoiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Entre os projetos selecionados, 7 são apoiados por programas finalísticos segundo o conceito do PPA, 1 refere-se a ação interna e 4 estão sendo executados por meio de programa de apoio.

A reunião foi aberta pelo Superintendente da SUDENE, seguindo-lhe o Coordenador-Geral de Gestão Institucional para continuação dos trabalhos.



Foto 1 – Abertura da reunião do 1º Ciclo de Monitoramento de 2016, da SUDENE, no dia 31/03/2016, pelo Superintendente da SUDENE, João Paulo Lima e Silva, com os primeiros comentários.

Em sua explanação o Superintendente fez um breve relato de seus encaminhamentos em Brasília na penúltima semana de março, destacando sua visita à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Integração Nacional, oportunidade em que tratou da necessidade da volta da SUDENE ao apoio a projetos de geração de energia, interrompido por decisão do planalto desde 2012, também ressaltou a necessidade de construir uma frente parlamentar que possibilite a defesa dos interesses regionais, além de discutir mecanismos que possam garantir o retorno de 1,5 % das amortizações e os 2 % recebidos a título de administração do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)., isto por que a SUDENE já contabiliza grandes somas de receitas provenientes dessa fonte, que terminam formando o superávit primário ficando a Autarquia impedida de utilizá-lo, particularmente o retorno do 1,5%, que hoje é destinado apenas ao apoio a projetos de pesquisa de interesse do desenvolvimento regional conforme estabelece a Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, mas que poderia ser utilizado em outras finalidades sociais, inclusive com o caráter não reembolsável conforme afirmou. Também ressaltou o esforço com a Diretoria Colegiada, no sentido de consolidar medidas que possibilitem a alocação de emenda parlamentar ao orçamento da SUDENE para projetos que sejam compatíveis com as atribuições da Autarquia. Nesse sentido, sugeriu reunião em Brasília, com os Deputados, particularmente a bancada nordestina, para esclarecer as dúvidas que emperram o andamento das atividades da SUDENE.

Na oportunidade João Paulo também comentou a sua viagem a Belém/PA, para reunião com as outras Superintendências (SUDAM e SUDECO) objetivando tratativas em torno de uma pauta de interesses afins

Na foto a seguir, o Coordenador-Geral de Gestão Institucional mostra um balanço dos resultados do monitoramento realizado em 2015.



Foto 2 – Explanação do Coordenador-Geral da CGGI, Manoel Barreiros, sobre os resultados do monitoramento em 2015.

Durante a apresentação foi ressaltado, e os indicadores revelaram isso, o impacto que a escassez de recursos para diárias e passagens gerou na programação de fiscalizações de convênios e vistorias de pleitos incentivados, gerando inclusive uma tendência de queda no ritmo desses trabalhos.

O maior destaque das discussões foram os problemas com o andamento dos projetos para a recuperação do prédio da SUDENE. Encaminhamentos foram apresentados, problemas foram colocados na mesa de forma clara e objetiva e compromissos definidos. A expectativa agora é o cumprimento desses encaminhamentos seja quanto a parte que toca a SUDENE, seja quanto a parte que toca os demais condôminos (IBGE, Ministério da Saúde e Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (IFPE)).

Destaque também para as discussões em torno da reforma do regimento interno cujo prazo para apresentação das sugestões tinha sido fixado com a anuência de todos, para 18/03/16, mas nenhuma Diretoria, até o momento da reunião, havia encaminhado qualquer proposta. A DPLAN comprometeu-se a apresentar sua proposta até o dia 08/04. Isso preocupa a CGGI por que há prazos legais que precisam ser cumpridos.

A foto a seguir mostra o técnico Roberto Cavalcanti esclarecendo questões levantadas pelo Diretor de Fundos, Ricardo Barros.



Foto 3 – Explicação do técnico Roberto Cavalcanti, da Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento, sobre os problemas com a execução do projeto da Companhia Ferroviária do Nordeste, com a ferrovia Transnordestina.



Foto 4 - Visão panorâmica dos participantes do 1º Ciclo de Monitoramento 2016.

Vale lembrar que foi apropriado do Plano Plurianual do Governo Federal o conceito de “Medida Institucional Normativa (MIN)”. De acordo com o PPA uma “MIN” pode contribuir tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para complementar a realização de uma diretriz estratégica. Além disso, não precisa demandar recursos orçamentários.

Os referenciais para o enquadramento dos planos operativos 2016 na programação estratégica continuam os mesmos aprovados pela Diretoria Colegiada em sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013, e prorrogado pela Diretoria Colegiada até 31/12/2016 conforme deliberação da 218ª reunião realizada em 21/12/2015.

- Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva;

Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

- Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;

Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

- Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

Sub objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;

Sub objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;

Sub objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;

Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

- Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:


- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.

- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

As observações, deliberações e encaminhamentos da alta administração surgidas na plenária de 31/03/2016 constam de capítulo específico deste relatório, como também a programação de eventos para o restante do ano.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Retrospectiva 2015

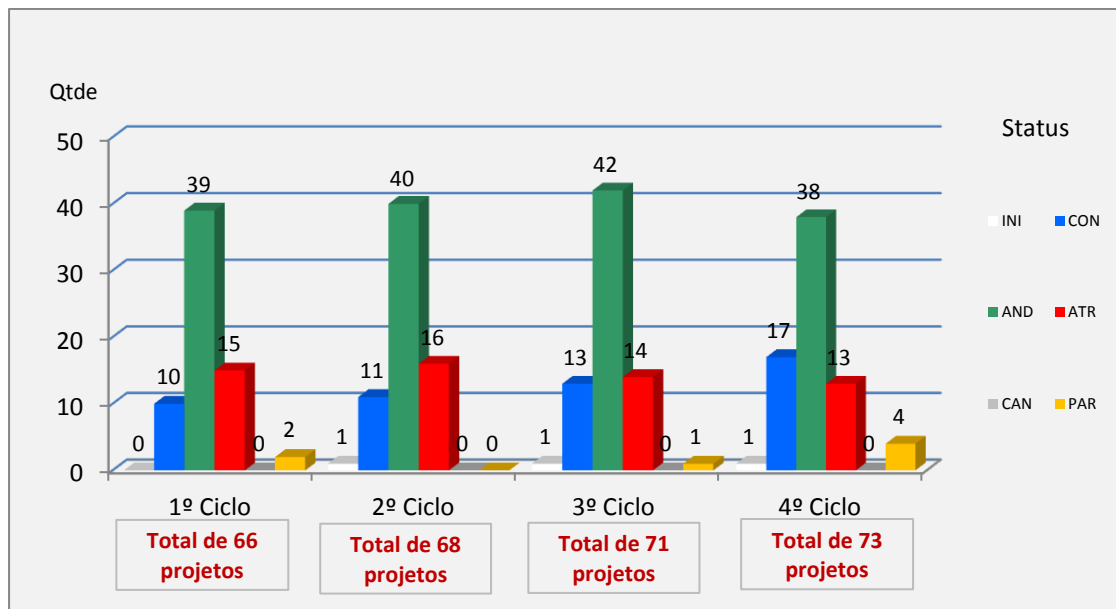

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo os ciclos de 2015

No quadro adiante estão relacionados os projetos que no decorrer de 2015 apresentaram problemas na execução, tiveram prazos prorrogados e entraram em 2016 com problemas.

Quadro 1 - Projetos que apresentaram largos tempos de execução em 2015 e até o 1º Ciclo de 2016 ainda estavam apresentando problemas

PO	Projeto	Previsão de conclusão	Início do projeto	Atual	1º ciclo 2015	2º ciclo 2015	3º ciclo 2015	4º ciclo 2015
11	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.	19/10/2016	19/09/2014	Paralisado	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento
21	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	09/09/2015	20/03/12	Paralisado	Em Andamento	Em Andamento	Atrasado	Paralisado
32	Transnordestina Logística S/A - TLSA	01/12/2015	08/08/08	Atrasado	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento
53	Deten Química S.A.	30/01/2016	05/02/13	Atrasado	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento
73	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	20/08/2015	04/09/09	Paralisado	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento	Paralisado

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

1.2– Resultados Gerenciais do 1º Ciclo de Monitoramento 2016

A Tabela 1 detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2016

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	56	9.685.302,29	6.430.949,66	-	14	39	2	1	-	56
	1.4	3	0,00	0,00	-	1	2	-	-	-	3
	1.5	1	234,11	139,87	-	-	1	-	-	-	1
Sub-Total		60	9.685.536,40	6.431.089,53	0	15	42	2	1	0	60
2	2.1	1	43.290,00	16.926,00	-	-	1	-	-	-	1
	2.3	2	1.366,31	723,39	-	-	1	-	-	1	2
	2.4	1	228,80	168,00	-	-	-	-	-	1	1
Sub-Total		4	44.885,10	17.817,39	0	0	2	0	0	2	4
3	3.1	7	61,60	15,78	-	1	6	-	-	-	7
	3.2	3	1.664,21	1.434,35	-	1	2	-	-	-	3
	3.3	3	21.890,21	9.830,17	-	-	2	-	-	1	3
Sub-Total		13	23.616,02	11.280,29	0	2	10	0	0	1	13
TOTAL		77	9.754.037,52	6.460.187,21	0	17	54	2	1	3	77

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Convenções:

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Observações:

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 13/03/2016 (1º Ciclo de monitoramento-2016)

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 1º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
2029	0355	33	9.662.099,20	6.419.256,00		12	19	2			33
	20N7	3	1.649,00	417,15			3				3
	20WQ	2	1.249,00	749,00			2				2
	4640	2	2.252,99	1.509,74		1	1				2
	8689	2	1.366,31	723,39			1			1	2
	8902	9	12.841,99	4.448,81			9				9
	8917	2	617,75	107,35			1		1		2
	8340	3	3.882,02	3.657,02			3				3
	8918	1	694,46	694,46		1					1
	7K66	1	250,00	250,00			1				1
Sub-Total		58	9.686.902,70	6.431.812,92	0	14	40	2	1	1	58
2040	8172	1	228,80	168,00						1	1
Sub-Total		1	228,80	168,00	0	0	0	0	0	1	1
2111	2000	13	23.616,02	11.280,29		2	10			1	13
Sub-Total		13	23.616,02	11.280,29	0	2	10	0	0	1	13
2069	-	1	43.290,00	16.926,00			1				1
Sub-Total		1	43.290,00	16.926,00	0	0	1	0	0	0	1
Ações Internas		4	0,00	0,00		1	3				4
Sub-Total		4	0,00	0,00	0	1	3	0	0	0	4
TOTAL		77	9.754.037,52	6.460.187,21	0	17	54	2	1	3	77

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Convenções:

1- Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); **Programa 2069-Segurança Alimentar e Nutricional**. **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.


2-INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Observações:

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


Referência: 13/03/2016 (1º Ciclo de monitoramento-2016)

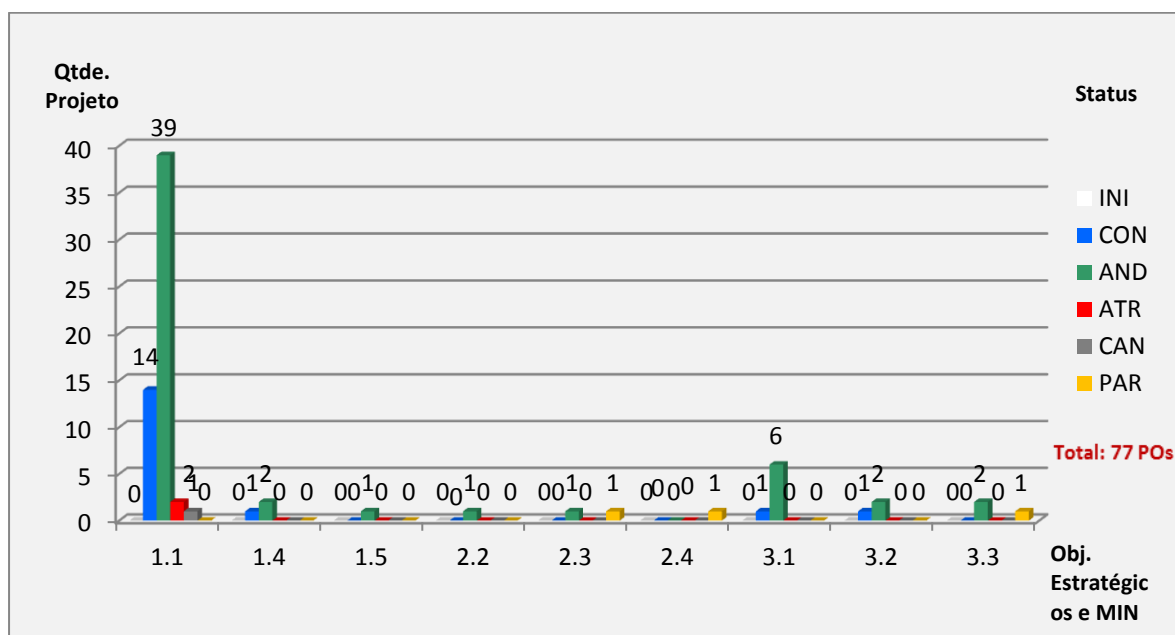

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Convenções: Obj. Estratégicos: 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; 2.2- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; 2.4-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; 3.2-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; 3.3-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.


Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º Ciclo – 2016)

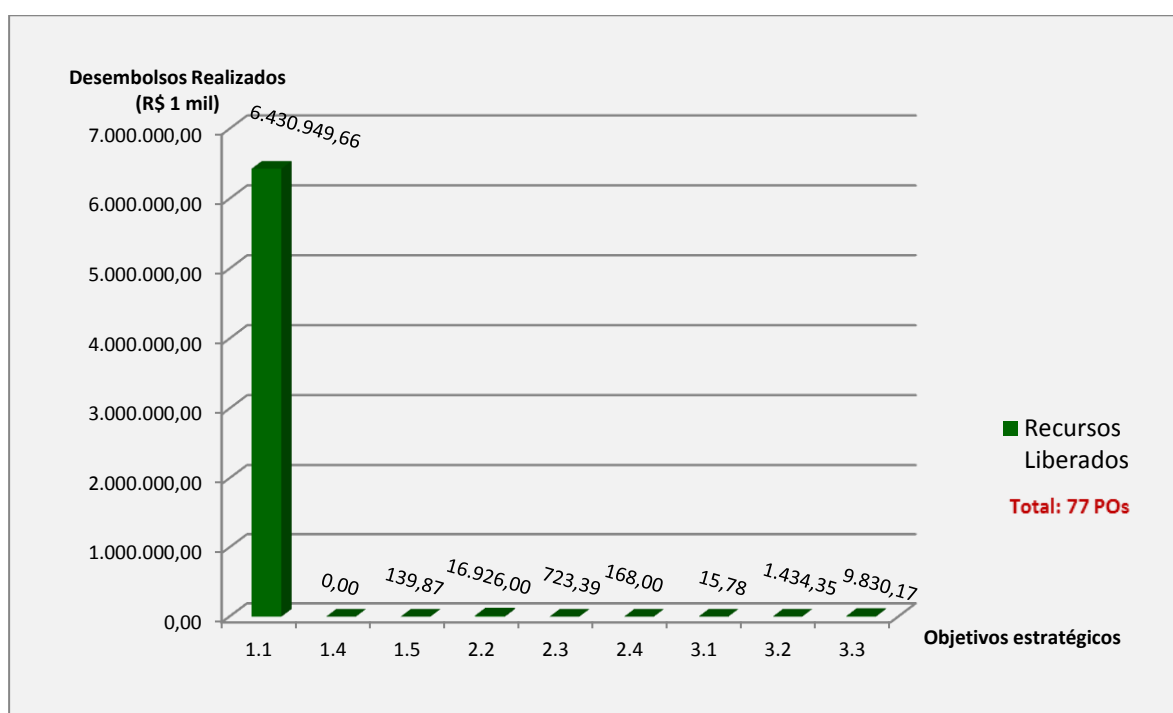

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (1º ciclo 2016)

O organograma adiante mostra a distribuição dos 77 projetos segundo Diretorias e unidades da Autarquia.

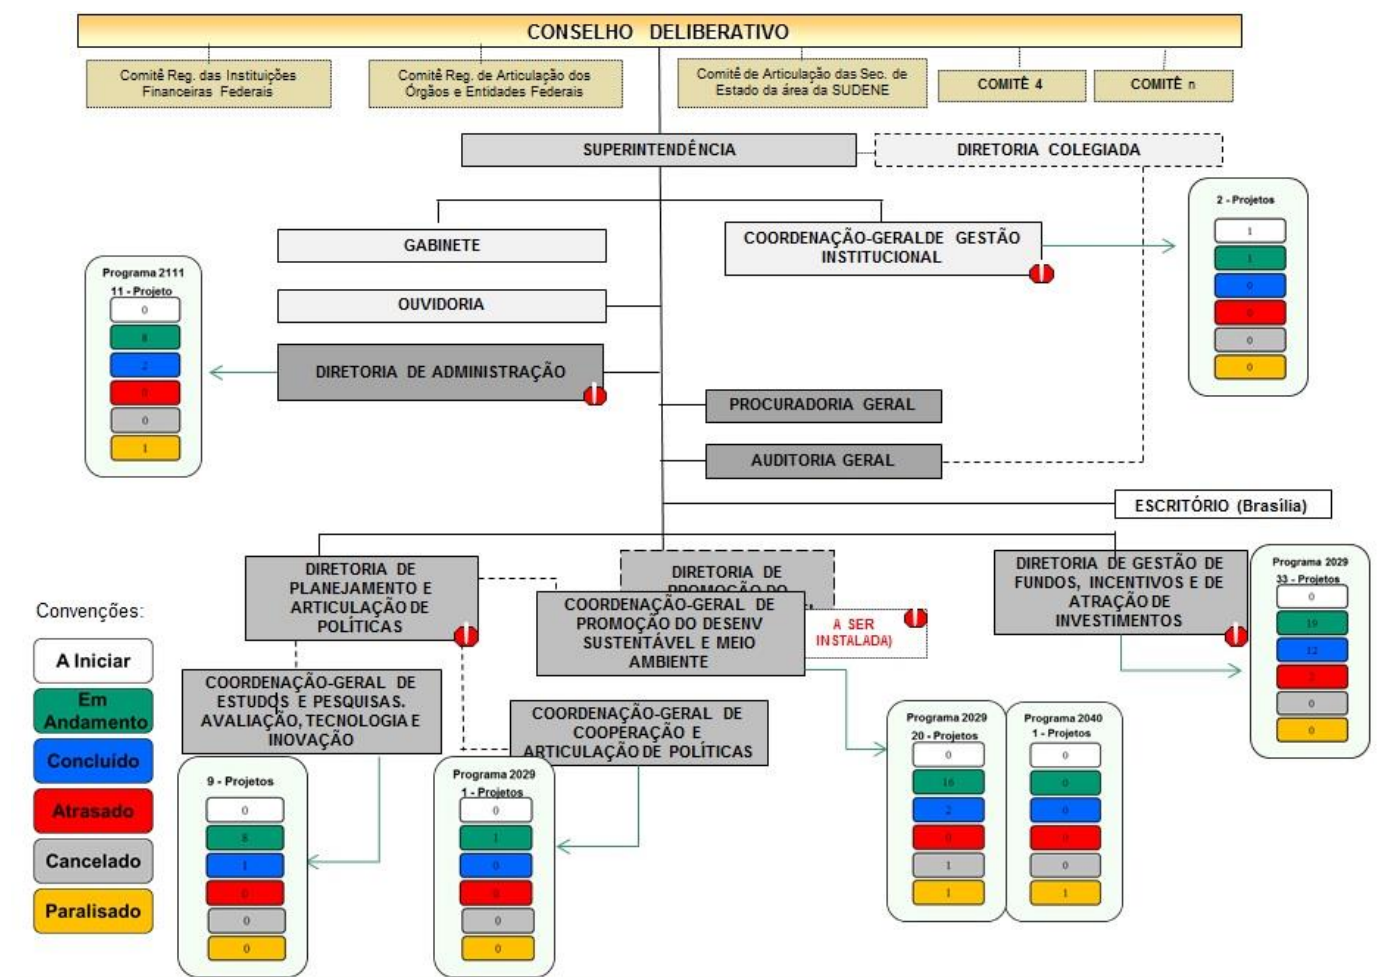

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{34 \times 100}{34} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-dez/2015

f) Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	98,6 %	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	100%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica

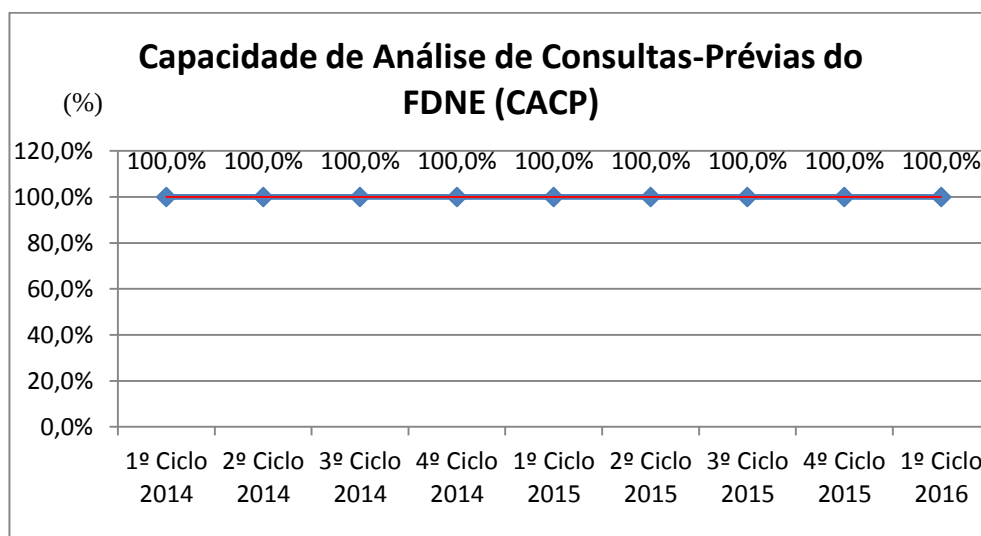

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{34}{6} = 5,7 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-dez/2015

f) Comentários: -

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	2,05 análises/técnico	-
Jan a Nov/2012	0,67 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,43 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	1,67 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

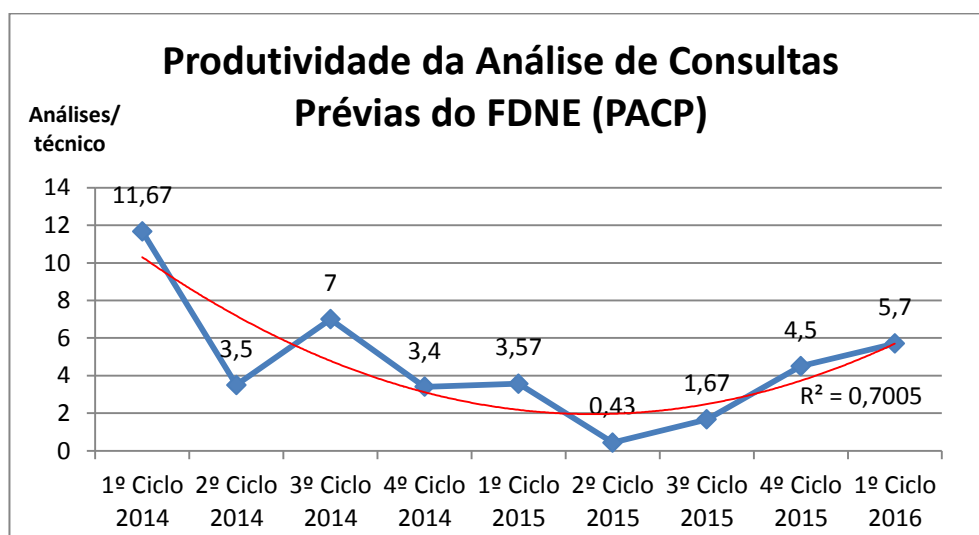

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.


A tendência de melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias, representada pela linha vermelha do gráfico, é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda durante 2015, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser analisado com cuidado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{19 \times 100}{34} = 55,9\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2015
- f) Comentários: fazendo uma comparação entre os valores absolutos informados neste ciclo, em relação ao anterior, observou-se que o volume de devoluções de consultas prévias mais que quadruplicou (17 contra 4), para um volume de pleitos protocolados que aumentou em quase três vezes (27 contra 10 do ciclo anterior). O que chamou a atenção foi o crescimento dessas devoluções. Até a primeira apuração de 2015, representada pelo 2º ciclo, não haviam tantos pleitos devolvidos.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	40,80 %	-
Jan a Nov/2012	100,00 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	63%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

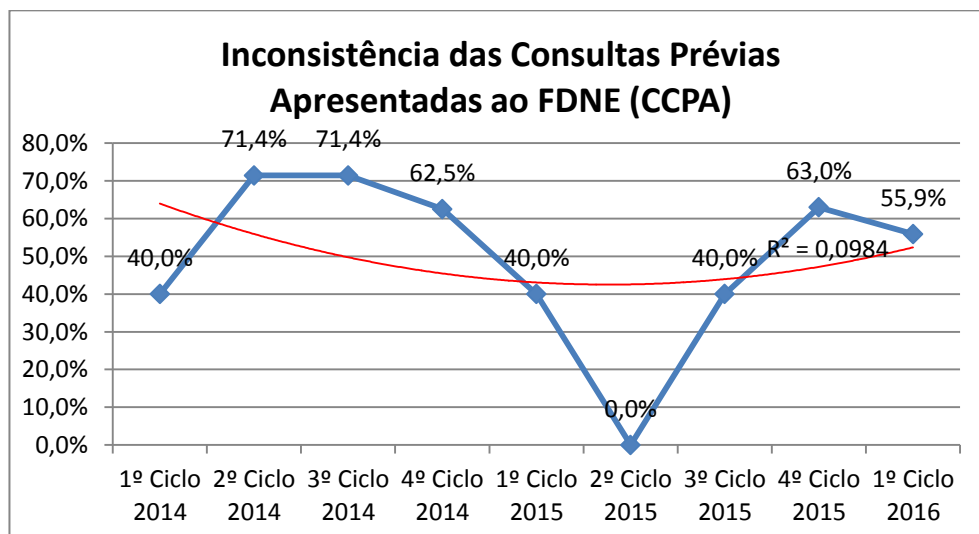

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Atenção: Desde o 4º ciclo/2015 o título do indicador passou a se chamar “Inconsistência das Consultas Prévia apresentadas ao FDNE (CCPA)” por adequar-se mais apropriadamente ao resultado apresentado.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{122 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,36$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: Jan-dez/2015

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:


Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE.	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

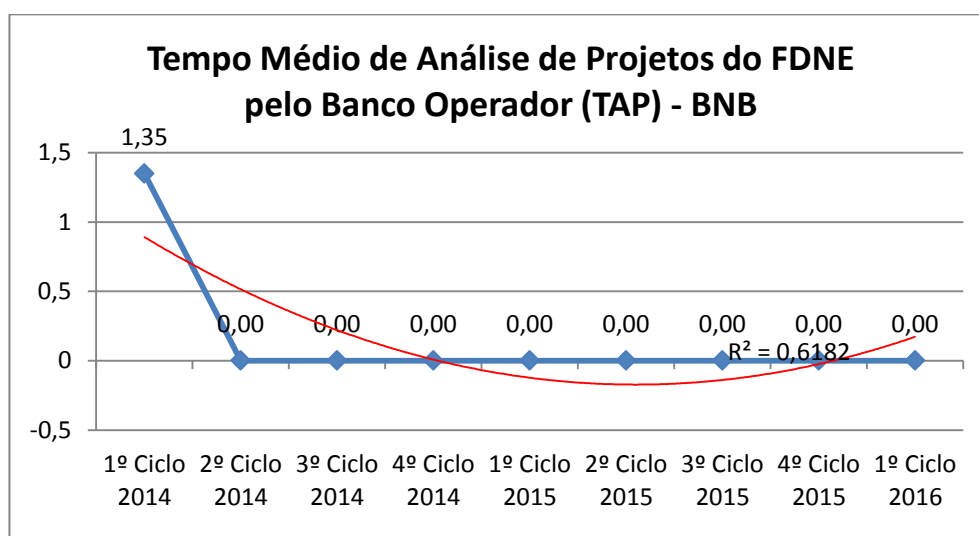


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

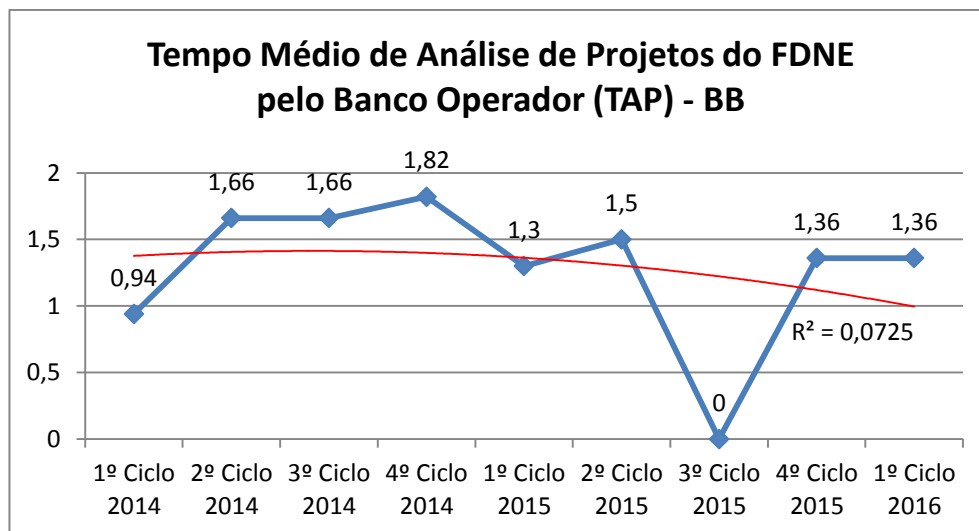

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

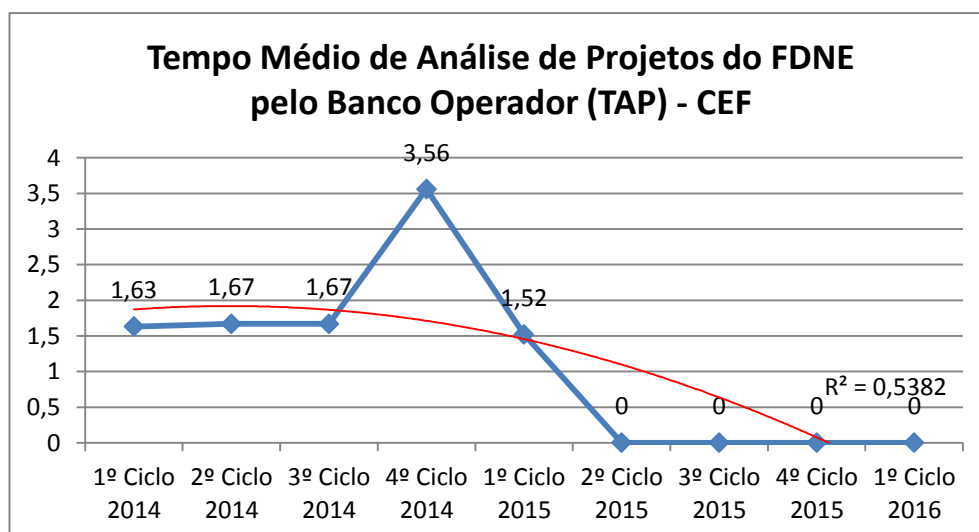

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{3 \times 100}{7} = 42,9\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.




a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2015
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

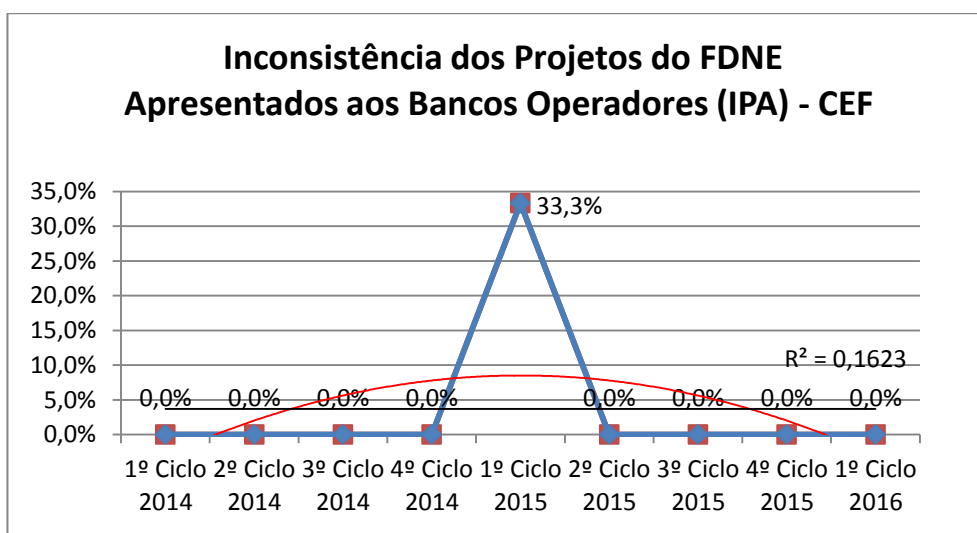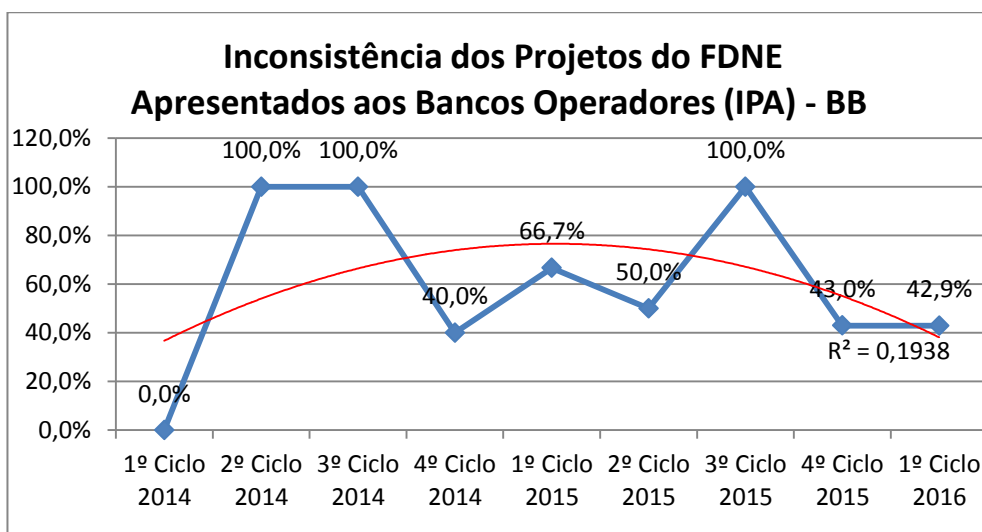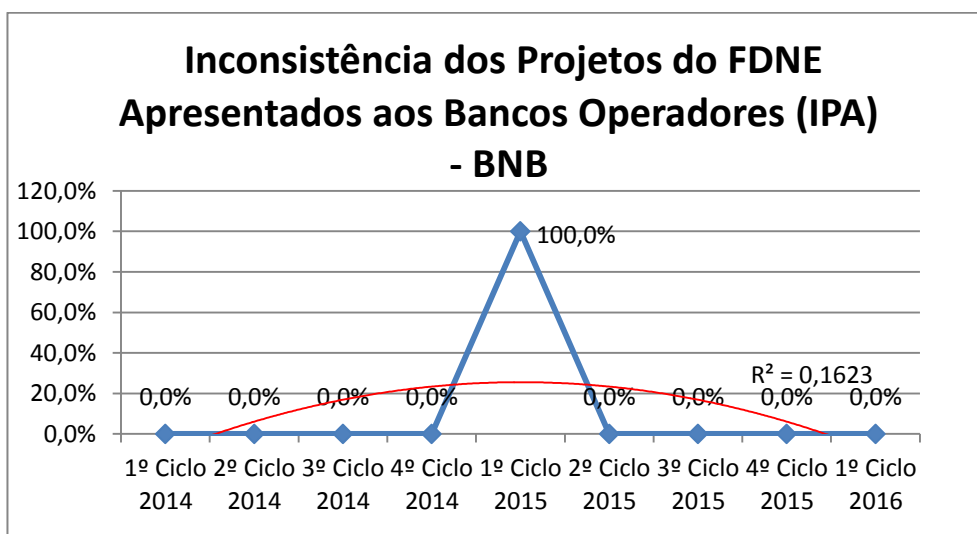


2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2015} \times 100}{\text{Dotação LOA 2015}} = \frac{2.022.481.635,00 \times 100}{2.022.481.635,00} = 100\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-dez/2015
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	100,0 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

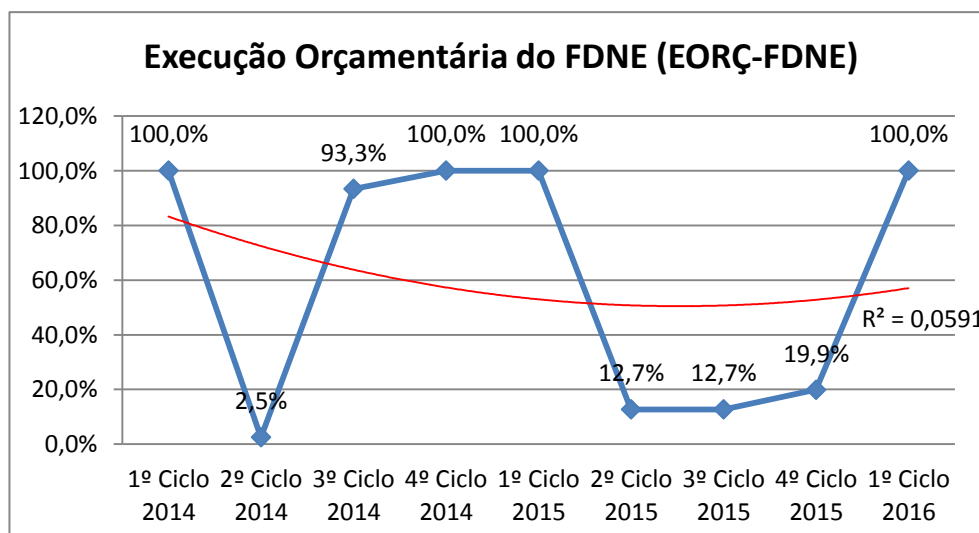


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{778.762.344,14 \times 100}{5.786.051.227,20} = 13,5\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-dez/2015
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	14,2 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

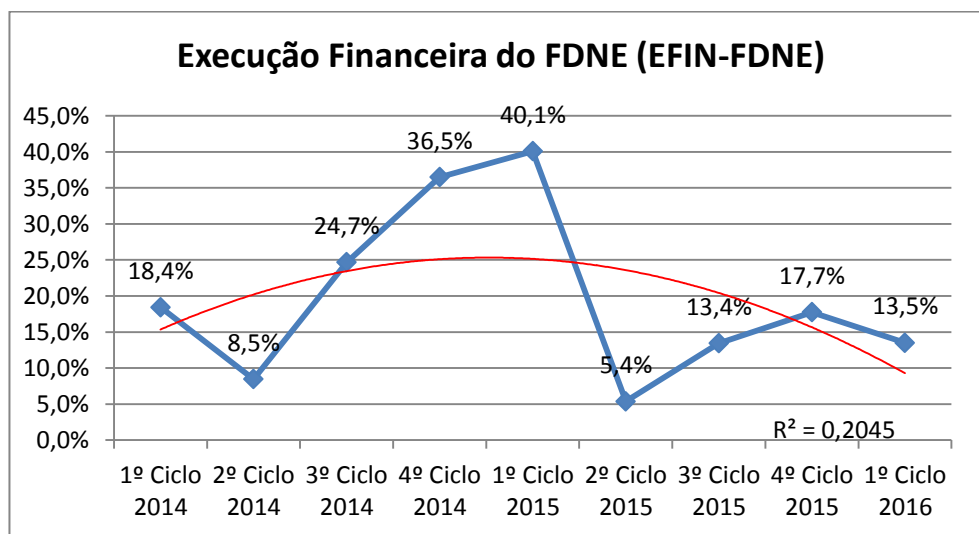

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{17,33}{30} = 0,58$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-dez/2015


f) Comentários: Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014

Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,58	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

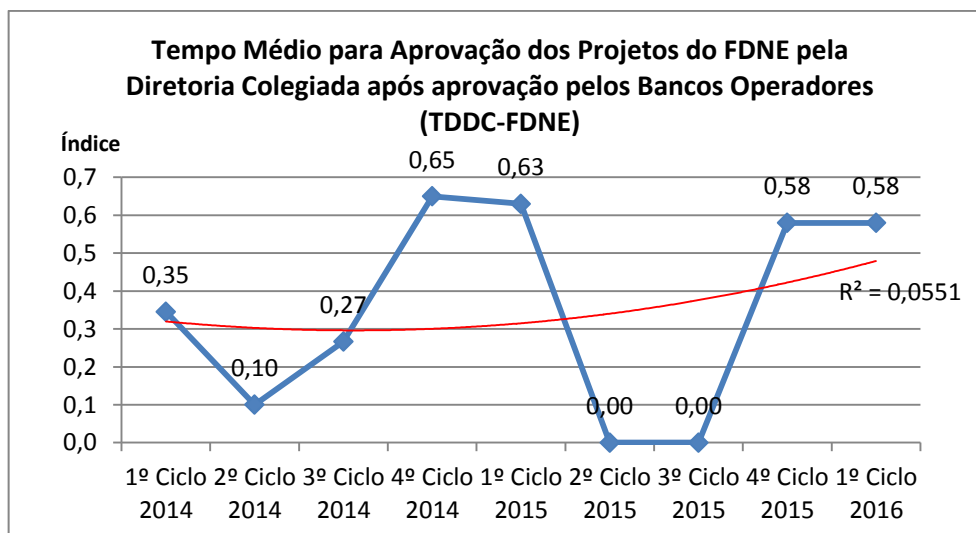

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{886}{3} = 295,34$ dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-dez/2015

f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

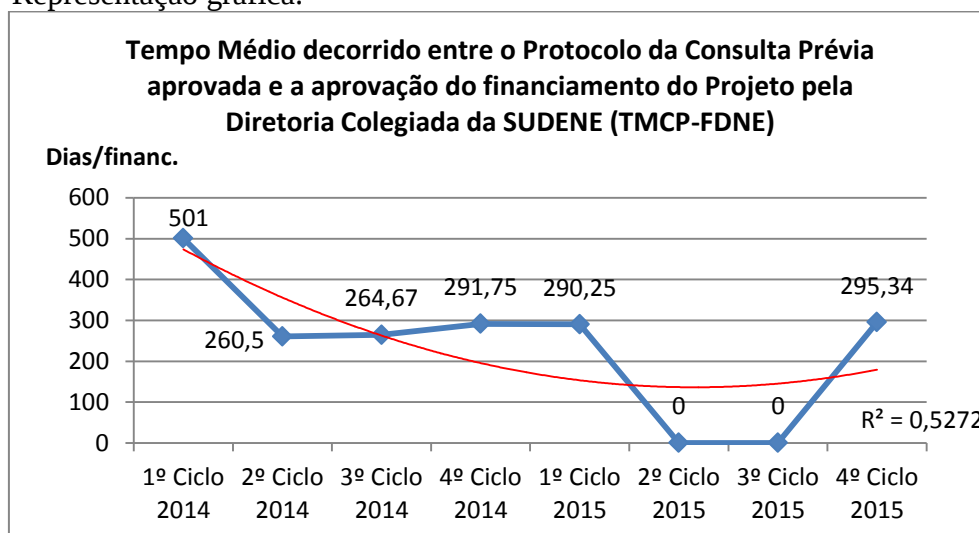

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).


2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{3}{3} = 1,00$$

- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan-dez/2015
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	1,0	4º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

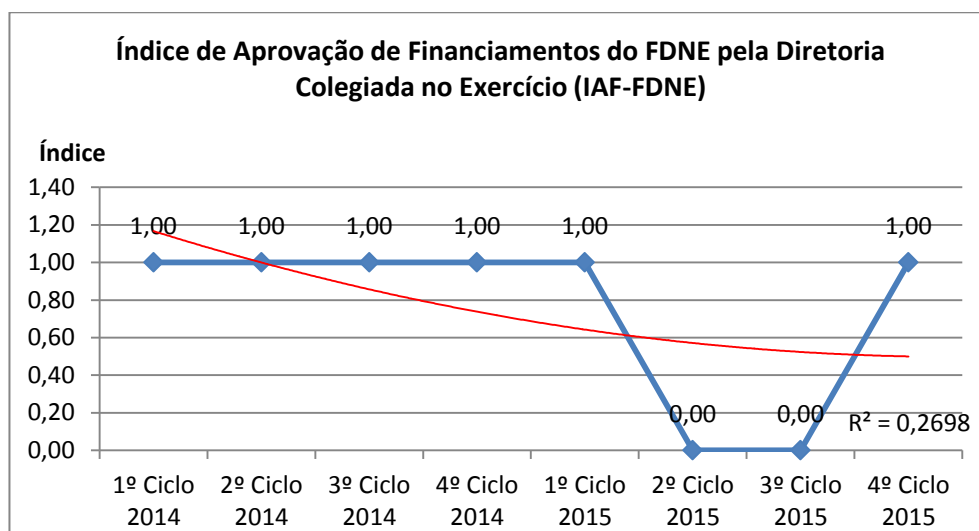

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{18.547 \text{ dias}}{201 \text{ pleitos}} = 92,3 \text{ dias/pleito}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan- Dez/2015
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de dezembro de 2015, foram **vistoriados 201 estabelecimentos dos 253 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos protocolados no período (quadro I)**. A diferença, de 52 pleitos, refere-se a 24 processos que se encontravam em fase de exame em 31.12.2015 e a 28 processos de transferência de benefício e retificação por mudança de razão social, que não se submetem ao procedimento de vistoria.

Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 92,3 dias (74,9 dias entre janeiro e dezembro de 2014)**.

O aumento verificado no prazo de espera em relação a 2014 foi fortemente influenciado pela restrição orçamentária observada ao longo do ano e que limitou a programação das vistorias a partir do mês de maio de 2015. Com efeito, entre junho e outubro de 2015 foram realizadas apenas 7 vistorias, todas de empresas localizadas em Pernambuco, região metropolitana de Recife. Somente a partir de novembro, com a realização de 54 vistorias e em dezembro, com 63 vistorias é que o processo foi normalizado.

Quadro II – Processos Formalizados e Vistoriados - 2015

FORMALIZAÇÃO E VISTORIA	Número de processos (1)	Número de dias (2)	Prazo médio (3)
Formalizados até 31.05.2015 e vistoriados até 31.10.2015	79	5.991	75,83
Formalizados a partir de 01.06.2015 e vistoriados até 31.10.2015	5	203	40,60
Formalizados até 31.05.2015 e vistoriados a partir de 01.11.2015	24	5.013	208,87
Formalizados a partir de 01.06.2015 e vistoriados a partir de 01.11.2015	93	7.340	78,92
TOTALIZAÇÃO	201	18.547	92,27

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de **262 dias** (Siagra – Sociedade Industrial Agropecuária de Gravatá – Hotel Canarius). O prazo mínimo, de **18 dias**, foi observado no processo de interesse da empresa Bomar Maricultura Ltda.

Quadro III – Distribuição das Vistorias por Prazo - Comparativo

Prazo em dias	Nº vistorias - 2014	Nº vistorias - 2015
Até 30 dias	54	24
De 31 a 60 dias	51	46
De 61 a 90 dias	34	49
De 91 a 120 dias	13	35
De 121 a 150 dias	11	10
De 151 dias a 180 dias	12	11
De 181 a 210 dias	5	16
Acima de 210 dias	13	10

Convenções:


$T_1 = \Sigma$ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	64,60 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	72,9 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	73,7 dias/pleito	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

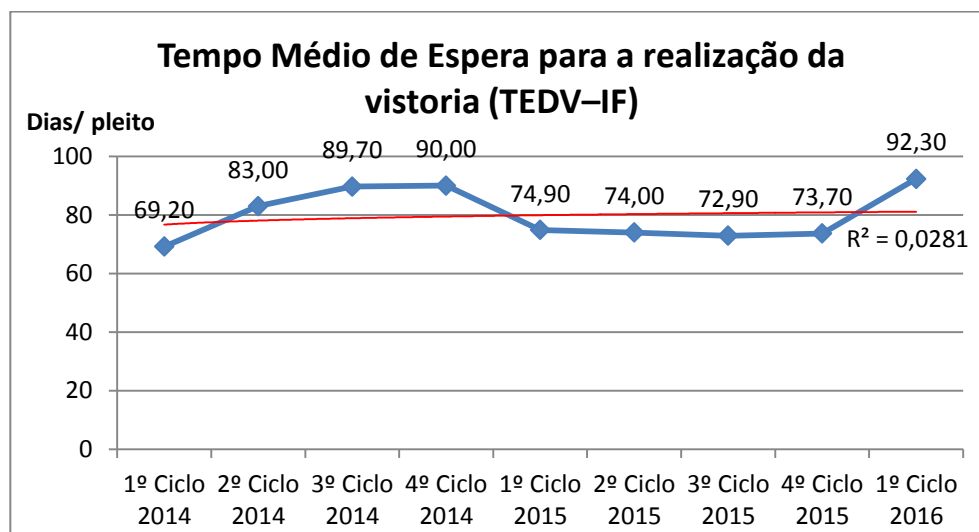

Convenções:

$T_1 = \Sigma$ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} =$
 $= \frac{0 \times 100}{381} = 0,0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan- Dez/2015


f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	2,36 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013

Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

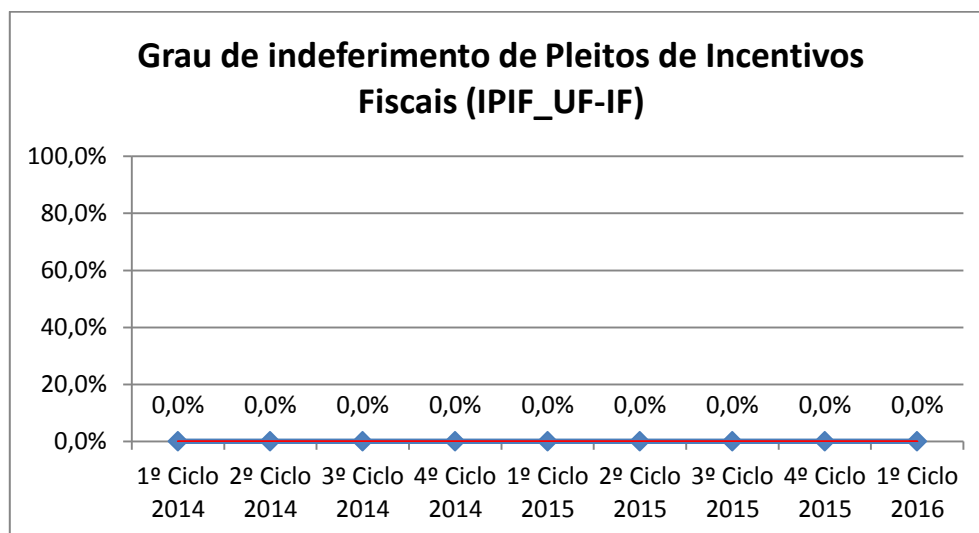

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$\frac{346 \times 100}{381} = 90,8 \%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor

e) Periodicidade: Jan- Dez/2015


f) Comentários: no período, foram concluídas 346 análises de pleitos diversos, significando percentual de êxito de **90,8%** dos pleitos formalizados (381) entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015.

Obs.: O desempenho do período janeiro/novembro, em relação ao observado até o mês de agosto sofreu acentuada queda, saindo da casa dos 70% para 60,9% tendo em vista a não realização de vistorias desde meados de maio de 2015, por força de restrições orçamentárias. A não realização de vistorias impede a conclusão das análises e interfere sensivelmente no desempenho da Unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	77,16 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

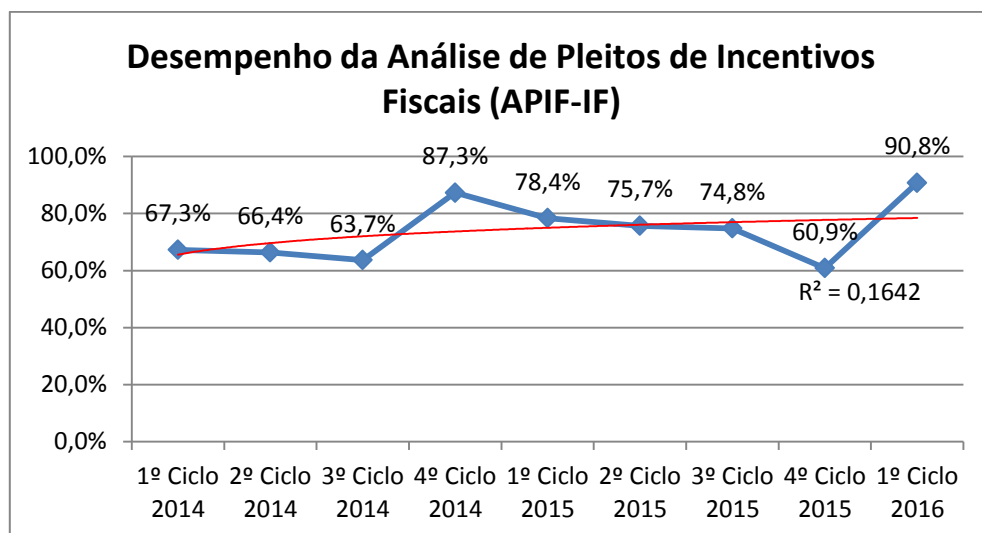

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

a) Fórmula:
$$T1 = \frac{33.031}{N} = 103,8 \text{ dias/pleito}$$


N 346

- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: Jan- Dez/2015
- f) Comentários: o prazo médio observado, de 103,8 dias (**95,4 dias no exercício de 2014**) decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos doze primeiros meses de 2015 (346). Individualmente, o prazo médio que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 124,8 dias, sendo de 67,2 dias o prazo médio para os processos de isenção do AFRMM e de reinvestimento. Conforme já ressaltado anteriormente, muitos processos aprovados ao longo de 2015 demandaram prazo acima de 180 dias para sua conclusão o que contribuiu sobremaneira para a ampliação do tempo médio de espera.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	53,86 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

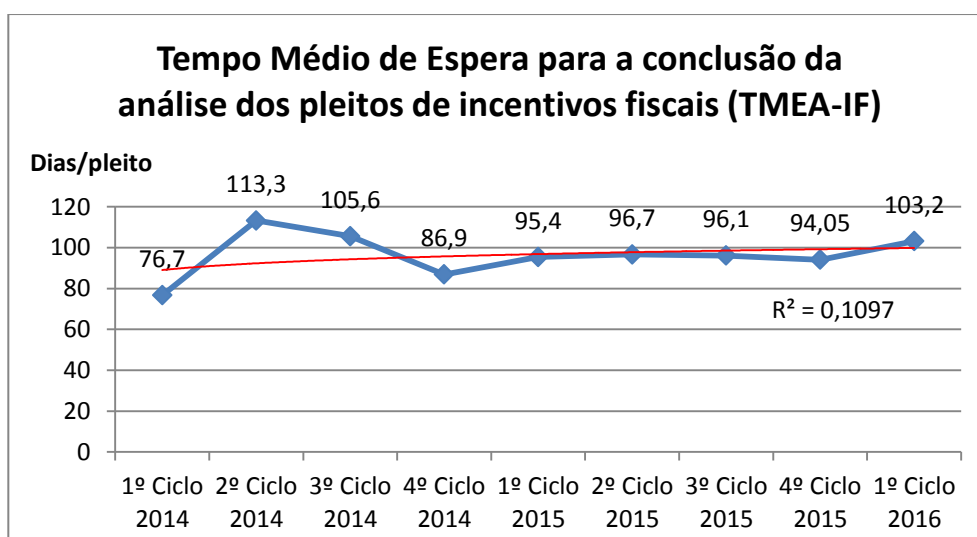

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.


N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{346}{21} = 16,5$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan- Dez/2015
- f) Comentários: o número observado, de 16,5 análises por técnico, a nosso ver é amplamente satisfatório uma vez que é o mesmo servidor que formaliza o processo, realiza a vistoria e complementa o exame do processo.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,7 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

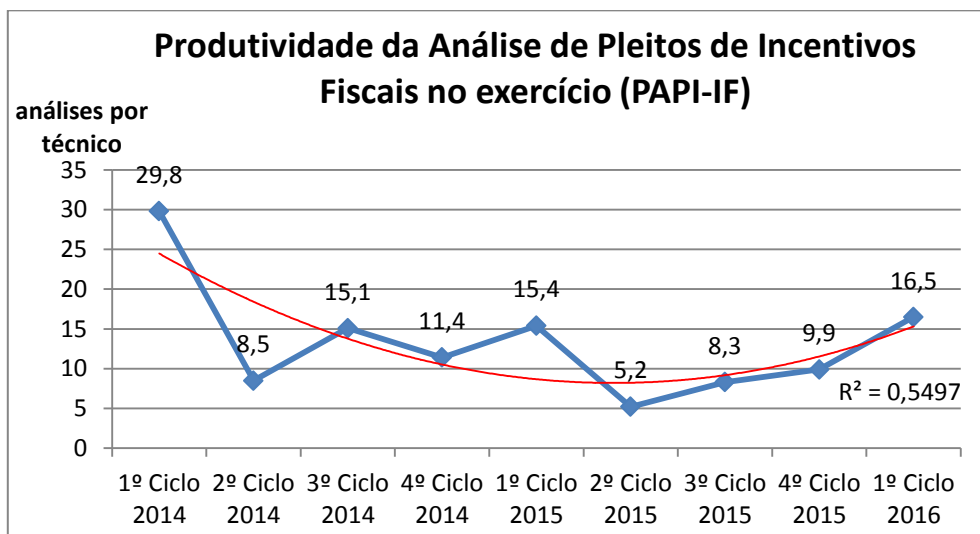

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{201}{10} = 20,1 \text{ vistorias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan- Dez/2015


f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 201 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,4 vistorias/equipe	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015

Jan a Ago/2015	7,5 vitórias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	8,3 vitórias/equipe	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

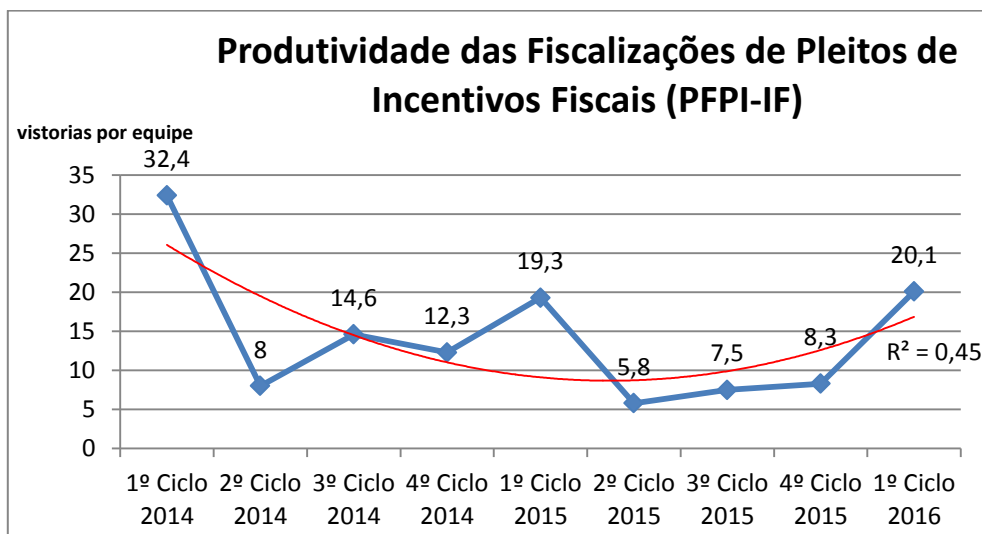

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios


4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{15 \times 100}{16} = 93,75 \%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período de aferição: Jan-Dez/2015.
- f) Comentários: Houve o recebimento de 16 propostas, das quais 15 foram analisadas.
- g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	100%	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014

Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

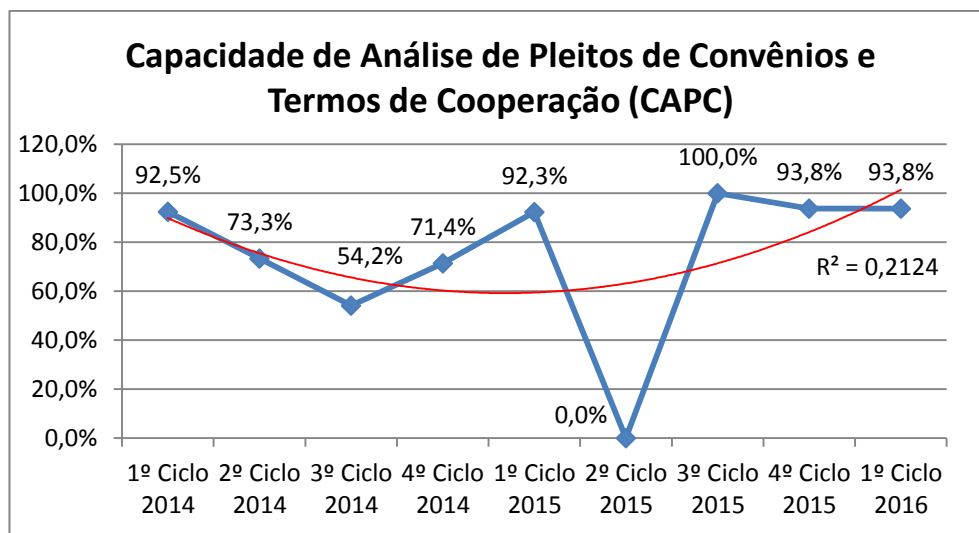

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{6 \times 100}{15} = 40 \%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %

e) Período da aferição: Jan-Dez/2015.


f) Comentários: Foram analisadas 15 propostas, das quais 6 foram aprovadas.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	14,6 %	-
Jan a Nov/2012	21,74 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014

Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

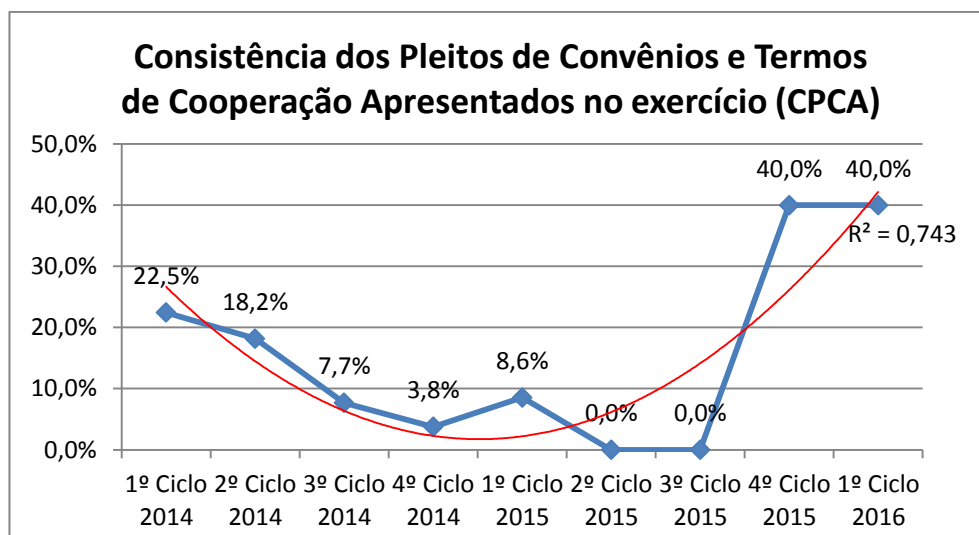

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$

$$= \frac{9 \times 100}{16} = 56,25 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-Dez/2015.

f) Comentários: 16 propostas foram recebidas, das quais se rejeitaram 9 pelos critérios técnicos.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,04 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

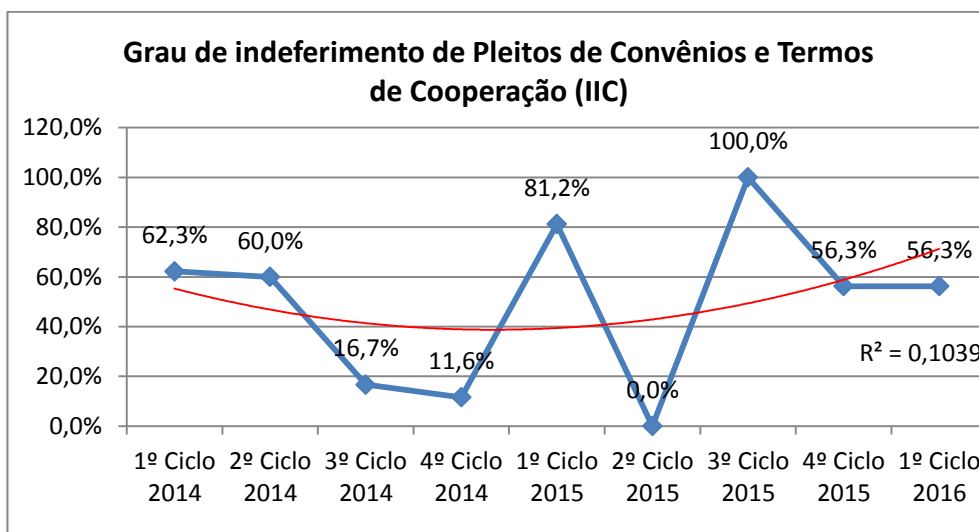

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{17 \times 100}{36} = 47,22 \%$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-Dez/2015.

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 9 viagens de acompanhamento dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral e 8 reuniões para o acompanhamento. Devido à restrição orçamentária, não foi possível a realização das viagens programadas.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não informado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

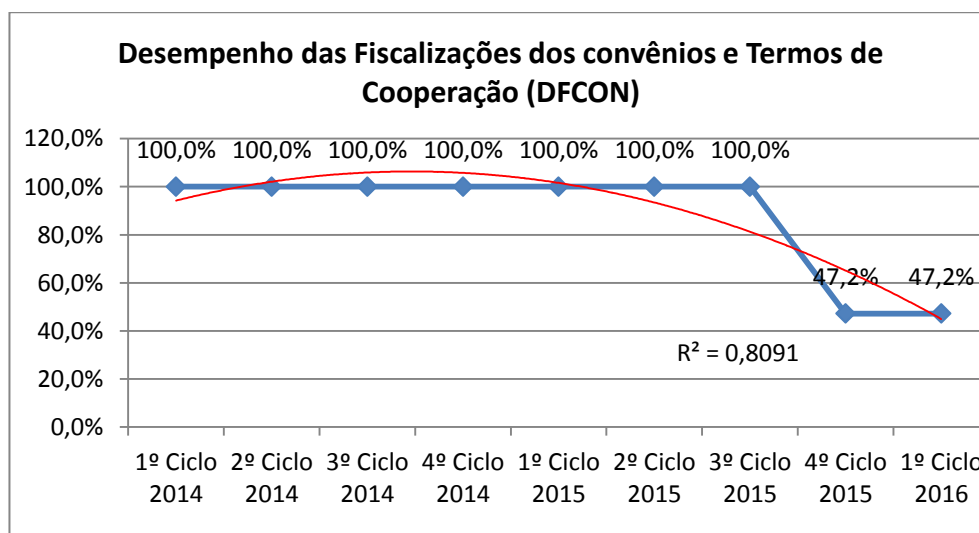

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2015**

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar de reunião na EMEPA (Convênio 813986/2014-AL da caprinocultura) e Governo da Paraíba (Convênio 770741/2012 – Capacitação em Defesa Civil)	30.01.2015	João Pessoa PB	Carlos Almiro
Reunião com EMEPA-PB (Discussão sobre Termo de Referência do Convênio nº 813986/2014.	06.02.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Victor Uchoa Carlos Almiro, Marcelo de Castro
Reunião sobre o convênio ZEE-Borborema na SEIRHMACT	27.02.2015	João Pessoa PB	Isis Moreira Renato Vaz
Reunião CONDEPE/FIDEM sobre participação da SUDENE na Oficina para o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Bom Conselho	02.03.2015	SUDENE CGDS	Teresa Barbosa, Macira Régia, Vinícius Medeiros, Maria do Socorro, Renato Arruda e Maria Helena
Participar da Oficina de Validação da Caracterização e Diagnóstico Situacional do Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho-PE produto do convênio realizado entre a SUDENE e o CONDEPE/FIDEM nº 769782/2012.	04 a 05.03.2015	Bom Conselho PE	Macira Sotero, Renato Vaz, Vera Lúcia, Maria Helena Socorro Vilar
Reunião com a SEIRHMACT/PB PARA TRATAR DO Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema na Paraíba.	13.03.2015	SUDENE CGDS	Maria Helena, Victor Uchoa, Renato Vaz e Isis Guimarães
Realizar visita de acompanhamento do convênio nº 794987/2013- Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais-PESI/NNE e visita técnica ao CSEM Brasil.	18 a 20.03.2015	Belo Horizonte MG	Maria Helena, Isis Guimarães
Entrevistar alunos que participaram da 1ª etapa de capacitação nos campus de Monteiro e João Pessoa e acompanhar o início das capacitações em 03 campus dos 04 previstos: Monteiro, João Pessoa e Pedra de Fogo, objeto do convênio 59335.000033/2014-24 SUDENE/IFPB	24 a 27.03.2015	João Pessoa PB	Macira Régia Givanildo Ramos
Participar do Seminário do Agreste Setentrional, onde situa-se a “Bacia Leiteira” onde se encontra o município de Bom Conselho SUDENE/CONDEPE/FIDEM, convênio 59.335.000116/2012-51 –	09 a 10.04.2015	Garanhuns PE	Maria Helena Vera Lúcia Batista

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência de Bom Conselho “			
Realizar visita técnica para alinhamento de idéias e orientações a respeito da execução do convênio Construindo com Mulheres 59.335.000533/2014-66	16 a 17.04.15	Maceió AL	Macira Sotero Givanildo Ramos
Reunião técnica com Agência CONDEPE/FIDEM sobre convênios em execução.	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Mª do Socorro, Vera Lucia, Teresa Barbosa, Renato Vaz, Victor Uchoa, Isis Moreira e Carlos Almiro
Reunião com representante da Prefeitura Municipal de Saboeiro sobre reforma e urbanização do mercado (Convênio).	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Edson, Agrimon, Givanildo
Reunião com a Agência CONDEPE/FIDEM sobre a e situação dos convênios em execução.	08.07.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Maria Helena, Caio Rodrigues, Victor Uchoa, Renato Arruda e Socorro Vilar
Reunião para discutir proposta de projeto das professoras Márcia Vanusa e Claudia Lima, sobre formalização de Acordo Cooperação Técnica e da continuidade do CVT Fitoterápicos	12.08.2015	SUDENE CGDS	Isis Moreira, Renato Vaz, Marcelo Saiki, Socorro Vilar, Vera Lúcia, Maria Helena, Caio Assis, Lautemyr e Jéssica
Reunião SEMAS—PE, elaborar a proposta tendo como foco o território da RESEX Acaú-Goiana	13.08.2015	SUDENE CGDS	Vera lúcia, Isis Moreira, Caio Assis e Victor Uchôa
Reunião com os professores Ricardo e Claudia da UFPE sobre Acordo de Cooperação	19.08.2015	SUDENE CGDS	Caio Renato, Marcelo Saiki, Teresa, Victor
Oficina – Projeto Piloto Semiárido. Território Salgueiro	20.08.2015	Auditório do GP/DENOR Recife	Maria Helena Vera Assunção
Workshop Energia Fotovoltaica no Norte de Minas. No evento acontecerá a apresentação e entrega oficial do PESI – Planejamento Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas, objeto do convênio 794997/2013	10.09 a 11.09.15	Montes Claros MG	Maria Helena
Reunião com a SEMAS – Proposta para a Rota do Marisco	23.09.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Caio Rodrigues, Vera Lúcia
Reunião com a ASA, sobre a verificação no SICONV as ações divulgadas da SUDENE	14 e 15.10.2015	SUDENE CGPP	Mª Helena
Reunião com “Movimento Via Trabalho” Articular com IPA e rever proposta à luz das orientações dos programas disponibilizados pela SUDENE e apresentar proposta	21.10.2015	SUDENE CGDS	Mª Helena, Vera Lúcia
Reunião com a SEMAS para tratar sobre ajustes no Projeto dos Mariscos em comunidades tradicionais pesqueiras	21.10.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki Caio Assis, Marcelo Viana

de moluscos de Goiana-PE			
Reunião MST – Discussão Projeto	23.10..2015	SUDENE CGDS	Marcelo Viana Maria Helena Carlos Almiro, Vera Lúcia
Reunião com Via do Trabalho, enviar ofício ao Superintendente da SUDENE solicitando abertura do SICONV, conforme entendimento do IPA com a Superintendência	26.10.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro Mª Helena, Maria do Socorro Marcelo Viana
Reunião sobre o convênio ZEE-PE entre técnicos da SEMAS/PE e SUDENE para ajustes Plano de Trabalho em virtude do 3º Termo Aditivo do Convênio	05.11.2015	CGDS SUDENE	Renato, Socorro Vilar, Victor Uchôa
Reunião Técnica – Reforma do Mercado Público de Saboeiro-CE	09.11.2015	SUDENE CGDS	Givanildo, Edson Laranjeiras, Agrimom Marcos
Reunião Agencia Xique Xique-PB/INCRA, sobre formalização de Acordo de Cooperação técnica-ACT/SUDENE/INCRA	11-11-15	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Vera Assunção, Marcelo de Castro
Reunião com a UFRPE – APL Banana	13.11.2015	SUDENE CGDS	Almiro, Vera Lúcia Manoel
Reunião MST – proposta projeto	16.11.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Vera Assunção, Maria Helena
Viagem de acompanhamento técnico do Termo de Execução Descentralizada entre a SUDENE e o IFPB, referente ao projeto “Mulheres na Construção Civil” finalizado em 31 de agosto de 2015, com o objetivo de emissão de Parecer Final.	23 a 26.11.2015	Monteiro Cajazeiras PB	Givanildo Ramos
Reunião para discussão do projeto APL da Banana no Estado de Pernambuco entre SUDENE e UFRPE	02.12.2015	SUDENE CGDS	Almiro, Vera, Marcelo Viana e Marcelo Saiki

PROPOSTAS RECEBIDAS - JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

Entre janeiro e Dezembro de 2015, a coordenação recebeu via SICONV 11 propostas, das quais 5 estão relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”, 3 no âmbito do programa “Capacitação de recursos humanos para a competitividade (4640)”, 2 propostas para o programa “Fortalecimento das Administrações Locais (8917)” e uma proposta para o programa “Provimento De Infraestrutura Produtiva Para Arranjos Produtivos Locais (20N7)”. Além disso, foram recebidas 5 propostas para Termos de Execução Descentralizada. Das propostas recebidas, analisou-se 15 propostas, das quais foram aprovadas 6 e rejeitadas 9.


4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)_{Conv}

- a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2015
- f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,8 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	Não Informado	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

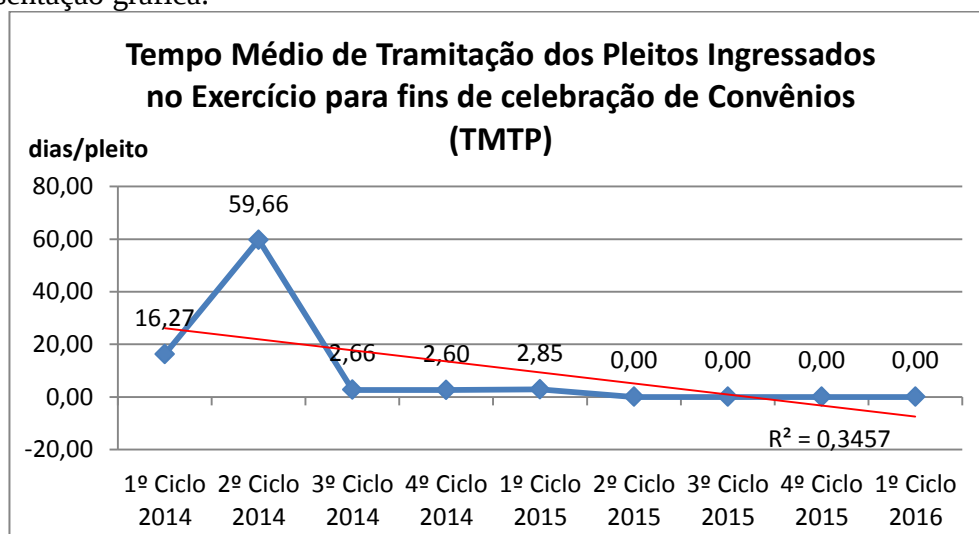

Fonte: Coordenação de Gestão de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

Atenção: Pelo segundo ciclo seguido, a Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial deixou de apresentar as informações de sua área apesar dos insistentes apelos da Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-Dez/2015

f) Comentários: Não informado pela unidade

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	Não Informado	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

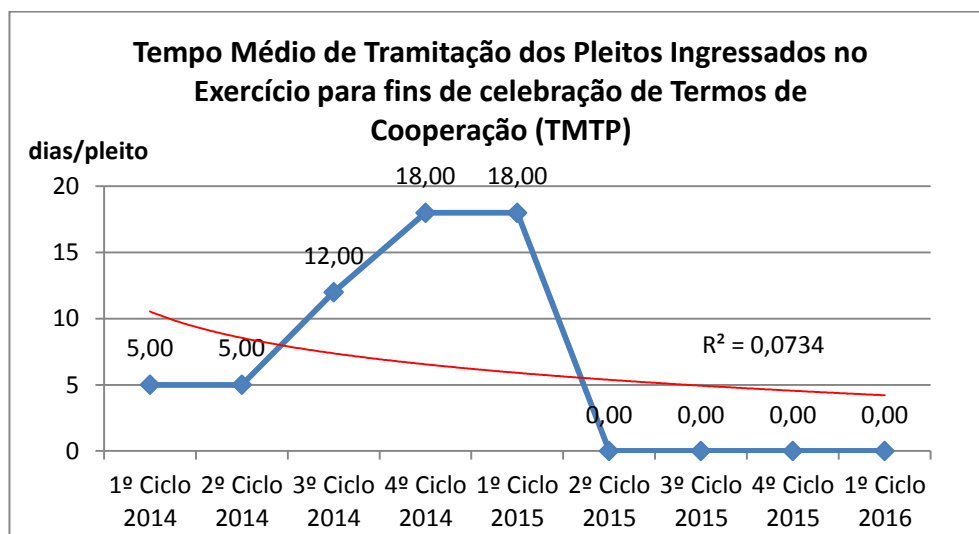

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

Atenção: Pelo segundo ciclo seguido, a Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial deixou de apresentar as informações de sua área apesar dos insistentes apelos da Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_a \text{ _ Aprovar}_{FINAL}}{\text{Convênios}_a \text{ _ Aprovar}_{INICIAL}}$$


Valor do índice no ciclo: **Não informado pela unidade**

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)

- e) Periodicidade: Jan-Dez/2015
- f) Comentários: **Não informado pela unidade.**
- f) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não foi apurado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	Não Informado	4º ciclo 2015

- g) Representação gráfica:

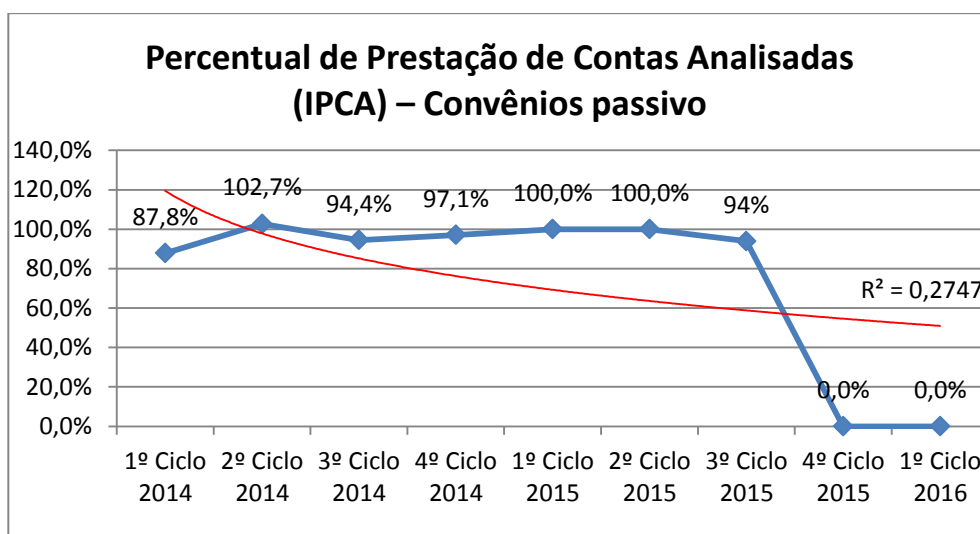

Atenção: Pelo segundo ciclo seguido, a Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial deixou de apresentar as informações de sua área apesar dos insistentes apelos da Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:
$$IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{\text{Convênios}_a \text{ Aprovar}_{FINAL}}{\text{Convênios}_a \text{ Aprovar}_{INICIAL}}$$


Valor do índice no ciclo: **Não informado pela unidade.**

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-Dez/2015
- f) Comentários: **Não informado pela unidade.**
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	92,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	Não Informado	4º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

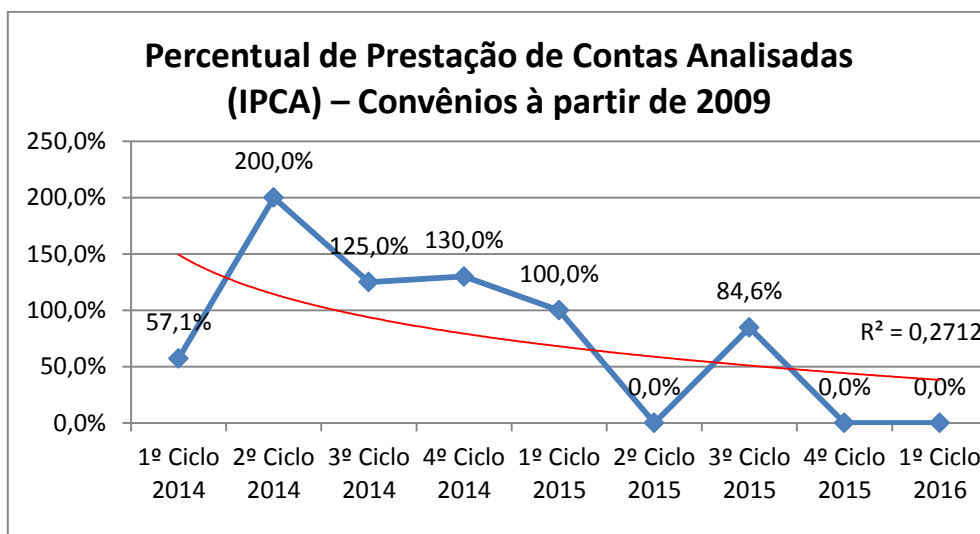

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Atenção: Pelo segundo ciclo seguido, a Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial deixou de apresentar as informações de sua área apesar dos insistentes apelos da Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a)Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{138 \times 100}{200} = 69\%$$

b)Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100 %


e)Período da aferição: Jan-Dez/2015

f)Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores foi parcialmente atingida, alcançando 138 (cento e trinta e oito) servidores, representando 69% da meta. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 477 (quatrocentos e setenta e sete) inscrições efetivamente realizadas. Entretanto, tendo em vista o contingenciamento de despesa referente a passagens e diárias, alguns eventos não foram realizados por serem promovidos fora da cidade do Recife, prejudicando assim, o alcance da meta estabelecida.

g)Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	71,6 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	69%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

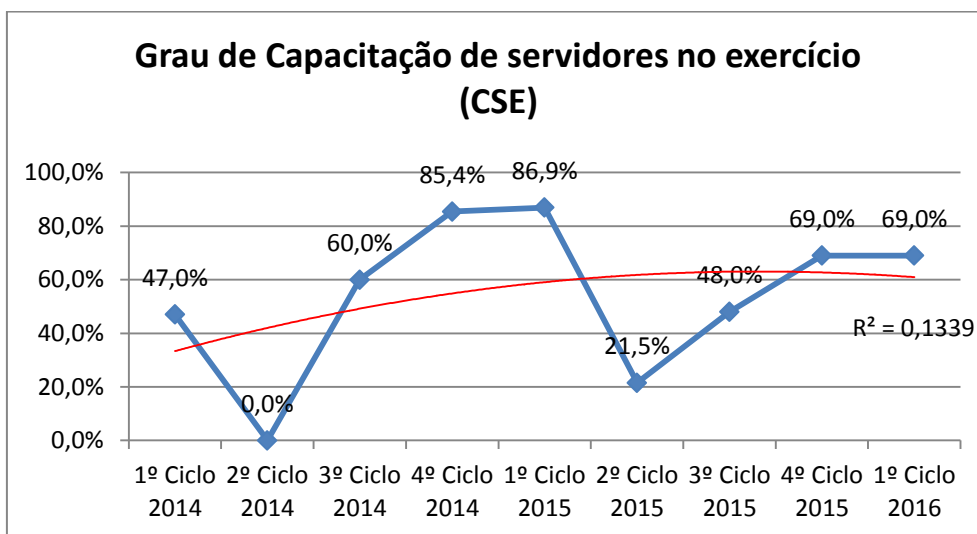

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{96 \times 100}{50} = 192\%$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-Dez/2015

f) Comentários: De janeiro a dezembro (2015), foram realizados 96 (noventa e seis) eventos de capacitação, ultrapassando a meta prevista de 50 (cinquenta) eventos de capacitação.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	66,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	180%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

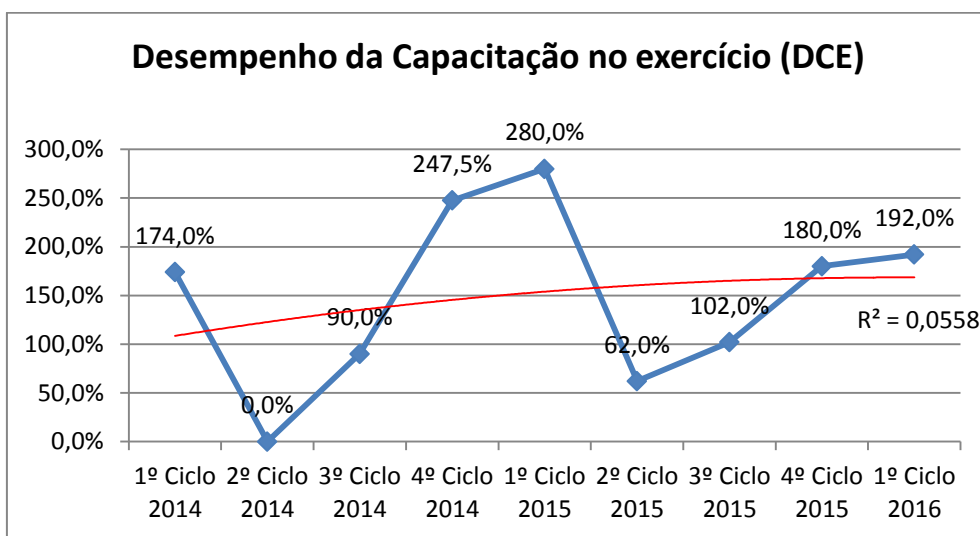

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{171.813,33 \times 100}{400.000,00} = 42,95\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100%

e) Periodicidade: Jan-Dez/2015


f) Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos de capacitação no valor de R\$ 85.117,50 (oitenta e cinco mil, cento e dezessete reais e cinquenta centavos). Somase a isso os custos com passagens e diárias no montante de R\$ 86.695,83 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), perfazendo assim, o total de R\$ 171.813,33 (cento e setenta e um mil, oitocentos e treze reais e trinta e três centavos), representando 42,95% do valor previsto para o investimento em capacitação. Considerando o contingenciamento de despesa referente a passagens e diárias, alguns eventos não foram realizados por serem promovidos fora da cidade do Recife, prejudicando assim, a realização do orçamento previsto.

g) Resultados Anteriores (NIC):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	27,8 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014

Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

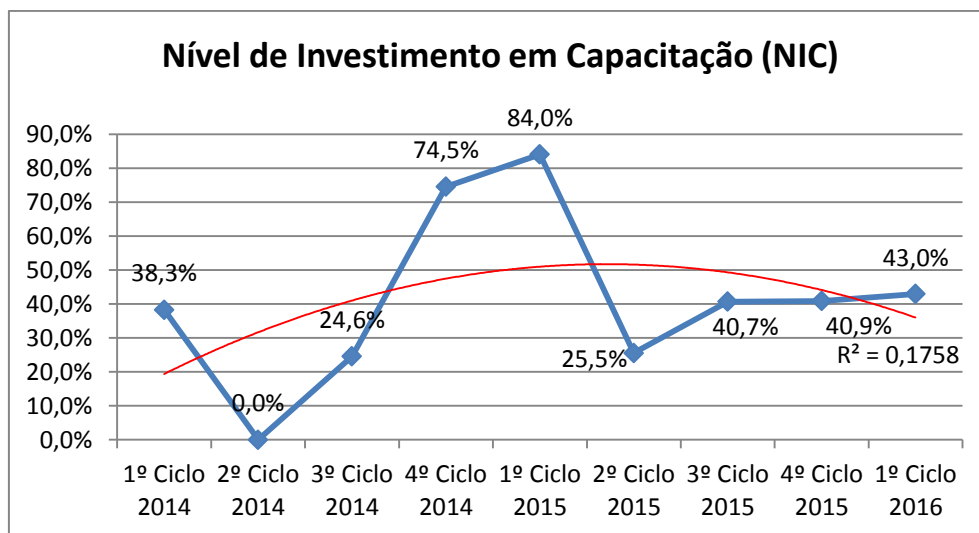

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos¹ =

$$\frac{66\% + 90\% + 38\%}{3} = 64,7\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)


e) Data da aferição: 29/02/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (auditórios) (66%); f.2) recuperação das fundações do Edif. SUDENE (90%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edif. SUDENE (38%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	42,6%	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	47,6%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	58,70%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	61,33%	4º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

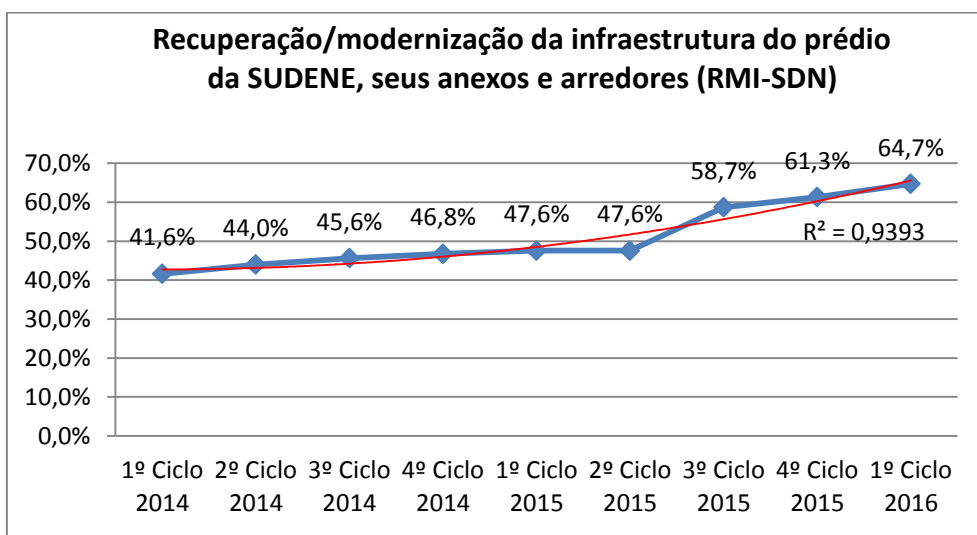

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Notas:

¹ O percentual de execução de cada projeto é obtido da média aritmética geral lida no respectivo Plano Operativo. Neste caso, os POs 72, 73 e 74.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a) Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}}$

$$\frac{(3.271.552,15+6.458.613,62 +100.000,00) \times 100}{3.427.430,35+8.670.544,86+148.000,00} = 80,27 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com: a) recuperação do Anexo Nilo Coelho (auditórios); b) recuperação das fundações do edf. SUDENE; e, c) modernização das subestações elétricas.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 04/mar/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 3.271.552,15 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.427.430,35); f.2) recuperação das fundações do Edif. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edif. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).


g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	60,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	71,9 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	71,2 %	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	78,9%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	78,82%	4º ciclo 2015

Nota:

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

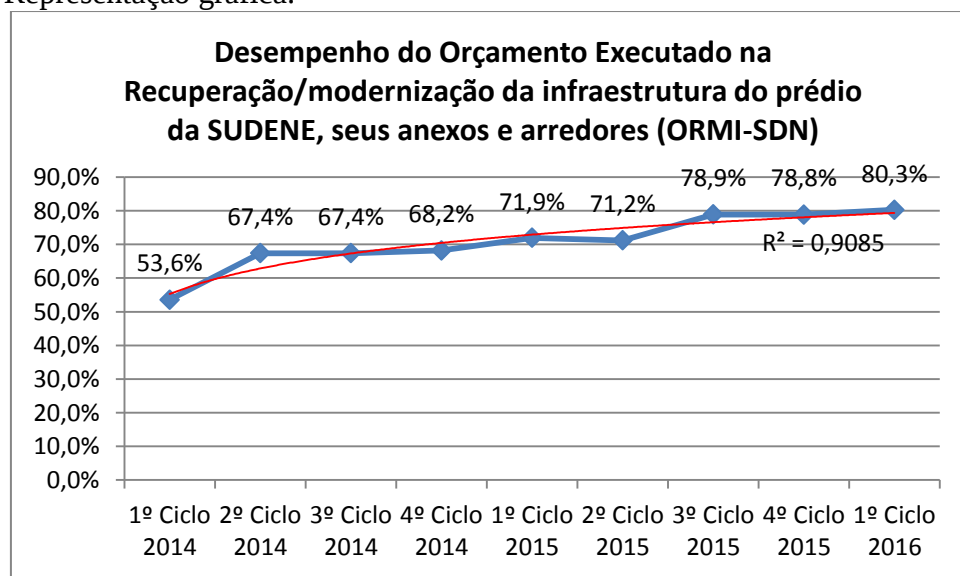

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI)- Resultado out/2015 - mar/2016

O resultado expresso a seguir, representa o que foi alcançado pelas metas definidas pelas unidades internas para o período outubro/2015-setembro/2016 nos termos definidos pela Portaria SUDENE nº 166, de 21/12/2015, apurados até o 1º ciclo 2016 no que tange às metas institucionais. Esse resultado visa atender, particularmente, ao estabelecido pelo Decreto nº 7.133/2010, que estabeleceu as regras para a concessão de gratificações aos servidores enquadrados no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, conhecida também, como GDPGPE, e aos enquadrados em Atividades de Cargos Específicos, conhecida como GDACE, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

a)Fórmula: Média aritmética dos percentuais alcançados pelas metas estabelecidas na Portaria SUDENE nº 166/2015, até a data de travamento do levantamento do ciclo.

$$\frac{0,0\%+0,0\%+0,0\%+80,0\%+94,0\%+0,0\%+0,0\%+57,3\%+39,2\%+77,6\%}{10}$$

$$= 34,81\%$$

$$\text{Em pontos: } 34,81\% \times 0,80 \text{ pontos/fração percentual} = 27,85 \text{ pontos}$$

b)Objetivo: Aferir a parcela de desempenho institucional que integra o cálculo da avaliação de desempenho para fins de concessão da Gratificação de Desempenho aos servidores enquadrados no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, e àqueles que se enquadram em Atividades de Cargos Específicos, conhecida como GDACE, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI) com base em metas definidas pelas diferentes unidades da SUDENE.

d)Resultado ideal (%): 100%, que equivale a 80 pontos.

e)Data da aferição: após o término do período de vigência, que começa em outubro de cada ano.

f) Comentários: As **metas** compreendem índices de produtividade (comparações entre o previsto e o realizado em determinado período), como também, o percentual de execução física alcançado ao final de cada ciclo de monitoramento, com a ressalva de que o final do período apuratório deste tipo de indicador não necessariamente irá coincidir com a data da apuração dos resultados do 3º ciclo de monitoramento. Neste caso, findo o período, que se encerra em 30 de setembro de cada ano, a apuração dar-se-á no início do período apuratório seguinte. Os projetos previamente escolhidos são trimestralmente monitorados por meio dos chamados planos operativos ou indicadores de produtividade.

g)Resultado:

Metas de Desempenho Institucional
Resultado do período out/2015-set/2016 com base na Portaria SUDENE nº 166/2015

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Valores Absolutos ou Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs ou indicadores apurados)
D4-Fortalecer a Imagem da SUDENE	D4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Eventos temáticos realizados	100 %	0%	0	1ª Oficina Rotas da Integração Macrorregional Nordeste - Fórum Sudene de Energia e Meio Ambiente (CDGS/DPLAN) – POs ainda não definidos
	D4.1-Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Encontros realizados	100 %	0%	0	Realização de encontros abordando temas ambientais (Café com Sustentabilidade) Possíveis temas: 1. Energias Renováveis e Zoneamento Ecológico-Econômico - Reunião de Kick Off dos TEDs formalizados em 2015; 2. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Sudene; 3. ODS nº 7 – Energia. (CDGS/DPLAN) – POs ainda não definidos
D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1-Moderinizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Planejamento realinhado/ implementado	50%	0%	0	Execução do realinhamento/atualização do Planejamento Estratégico. (CGGI) – PO ainda não definido
Programa 2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária (PPA 2011-2015)	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Projeto realizado	50%	80%	64	Execução de projeto com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco para implantação do padrão de qualidade no “Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Pernambuco - Qualidade Botânica Tradicional e Molecular, Química e Microbiológica” –(CGEP/DPLAN) PO 24 - CVT Fitoterápicos II.
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação aos semiárido	Relatório	100%	94%	75	Relatório para Implementação da infraestrutura necessária para instalação de área de geoprocessamento na SUDENE. (CGEP/DPLAN) – PO 27 - GT GEO
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas.	100%	0%	0	Análise das consultas prévias protocoladas junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 3º, art. 18 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - Indicador

Continua...

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Valores Absolutos ou Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs ou indicadores apurados)
2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355-Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamentos analisados.	100%	0%	0	Análise da participação do FDNE nos projetos aprovados pelos agentes operadores protocolados junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 2º, art. 22 do Decreto nº 7.838/2012). (CGDF/DFIN) - Indicador
D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovadas	300	57,3%	46	Aprovação de pleitos de incentivos fiscais. Entre 01/out/15 e 13/mar/16 foram aprovados: 131 pleitos de redução de 75% do IRPJ; 23 de Reinvestimento do IRPJ e 18 de Isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), totalizando 172 pleitos, ou 57,33% da meta prevista até set/16. (CGIF/DFIN) - Indicador
2111 - Gestão e Manutenção do MI	4575 - Capacitação de Servidores Públicos Federais - Plano Orçamentário 0001	Projetos implementados	50%	39,2%	31,36	Realização de 3 (três) projetos do Plano de Desenvolvimento de Pessoas: 1. Projeto de desenvolvimento de competências, mediante mapeamento, análise de gaps e validação; 2. Projeto avaliação de desempenho por competências, mediante estudos, elaboração de instrumentos e aplicação; 3. Projeto de planejamento da força de trabalho, mediante estudos, pesquisas e dimensionamento da força de trabalho. (CGGP/DAD) – Apenas o PO 70 referente ao item 1 - Gestão por Competências, foi apresentado.
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração da Unidade, plano orçamentário 0002.	Obra executada	85%	77,6%	62,12	Obra de recuperação do Anexo Nilo Coelho: 1.Elaboração dos projetos básico e executivo; 2.Licitação para contratação da execução da obra; 3.Execução da obra de ambientação; 4.Fiscalização e acompanhamento da obra. (CGAF/ENG/DAD) – PO 72-Anexo Nilo Coelho
MÉDIA ARITMÉTICA				34,81%	28	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Observações:

* Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.

Notas:

a) Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada.

b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional.

c) O presente cálculo refere-se ao resultado parcial do 7º Ciclo de avaliação GPDGPE e 4º Ciclo de avaliação GDACE- que compreende o período de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.

d) Os resultados são obtidos da verificação sobre o que foi feito até a data de apuração do 1º ciclo 2016, para cada meta.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 31/03/2016

- Frederico Cavalcanti, Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN/SUDENE) informou sobre notícia repassada por João Mendes (Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR/MI) de que no dia 27 de abril haverá reunião que discutirá o processo de desenvolvimento regional. A base do trabalho será levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) sobre o tema e possibilidades de cooperação com os Ministérios. A SDR está puxando essa discussão diante do risco de extinção do MI e de suas vinculadas. Sobre o assunto, João Paulo externou sua preocupação com os destinos da Autarquia e acrescentou que em Belém “unificamos

uma pauta SUDENE, SUDAM, SUDECO para discutir com o MI”. Frederico acrescentou a recente publicação de matéria do Senado instituindo uma frente parlamentar de fortalecimento da SUDENE.

- PO 22- Trata-se de plano operativo do Centro Vocacional Tecnológico de Tobias Barreto/SE, sob responsabilidade da CGEP/DPLAN, onde a meta 7 não foi totalmente cumprida, no que se refere à compra de software. Essa mudança no plano de trabalho exigiu o encaminhamento de pedido de esclarecimento ao executor, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC, para doação de providências.

- PO 25 - Trata-se do plano operativo que orienta a execução das “Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal”. Esse PO é uma ação interna voltada para o cumprimento de uma das atribuições da CGEP/DPLAN. Sobre o assunto, relata sua responsável, Albertina Pereira, que os trabalhos iam entrar na fase de articulação com os estados, mas as severas restrições com diárias e passagens impediram o cumprimento dessa meta. A bem da verdade, segundo Albertina, até o momento só foram envolvidos os estados da Paraíba, Pernambuco e Bahia. Alternativamente, a unidade elaborou documento interno para apresentar à Diretoria Colegiada. Após isso e sua melhoria, a proposta é transformá-lo num documento base e, por meio de convite aos estados, promover uma reunião na sede da SUDENE para sua discussão, aperfeiçoamento e encaminhamento ao Conselho Deliberativo da SUDENE para apreciação, deliberação e encaminhamento nas esferas governamentais.

- PO 29 - Refere-se ao projeto de “Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035” também sob responsabilidade da CGEP/DPLAN. Esse Po foi celebrado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) para “promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicosocial e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno”. Esse projeto surgiu de articulação entre a SUDENE, o MI e o Governo do Estado da Paraíba. No momento está sendo renegociada a prorrogação do prazo do projeto por mais 4 meses tendo em vista o atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isso, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado.

- George Meireles, Coordenador-Geral de Planejamento e Articulação de Políticas (CGAP/DPLAN) sugeriu, em relação ao conjunto dos Planos Operativos, pensar uma avaliação quantitativa e qualitativa sobre a contribuição desses projetos para o desenvolvimento regional como forma de saber se as metas estão sendo atingidas, iniciativa que todas as unidades responsáveis por projetos devem viabilizar haja vista que elas exercem o controle sobre a finalidade e alcance dos objetivos previstos tanto qualitativa como quantitativamente.

- PO 31 - Trata-se do projeto do “Programa Água para Todos”. Esse PO está sob a condução da Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação de Políticas (CGAP/DPLAN). São ao todo 111 municípios dos estados do Piauí (50 municípios), Paraíba (50 municípios) e Pernambuco (11 municípios) que deveriam ser contemplados segundo a programação original, porém, do total, 71 prefeituras apresentaram irregularidades e 40 somente agora estão começando a construir seus sistemas simplificados, lembrando que a meta para cada município é a construção de 3 sistemas. De acordo com George Meireles, o Programa apresentou algumas falhas em sua concepção. A primeira foi a inexistência de um estudo prévio que pudesse orientar a real necessidade de 3 sistemas com uma análise prévia das condições técnicas da captação da água, ou a capacidade técnica do município para desenvolver o projeto. Aliás, há casos em que, aparentemente, um único sistema, talvez um pouco maior, pudesse atender e resolver o problema. Diante desses fatos, o Superintendente João Paulo sugeriu a elaboração de um relatório objetivo, que aponte os problemas que estão afetando os municípios, como também, os casos exitosos. Um relatório que contemple a quantidade de projetos e os principais erros no Piauí (o mais problemático), na Paraíba e em Pernambuco.

- POs 32 a 64 - Tratam-se de planos operativos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. São ao todo 33 projetos que, pela similitude de alguns problemas para sua conclusão, foram apresentados em bloco pela Coordenadora-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN/SUDENE), Sabrina Lira. Nesse sentido, a DFIN encaminhou ofício a todos os bancos operadores pedindo solução para os projetos com atraso na emissão do “Certificado de Empreendimento Implantado - CEI”. O Diretor de Fundos, Ricardo Barros, presente na reunião, ressaltou que “deve ficar claro que para haver liberação autorizada pela Diretoria Colegiada, a SUDENE deve ser provocada pelo banco, que recebe a demanda da empresa, ao contrário do que o BNB falou em audiência no Senado, de que os atrasos na conclusão se deviam à SUDENE”, concluiu.

- PO 66- Trata-se de PO referente à “Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada” sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Gestão Institucional. Sobre o assunto, houve reunião com todas as unidades no dia 01/03/16, no 8º andar, no Espaço Cultural Celso Furtado, para exposição da agenda de execução, tendo em vista a necessidade de se adequar, até 13/06/2016, o atual RI da SUDENE aos cortes estabelecidos pelo Decreto nº 8.679/2016, sancionado em 22/02/2016 e publicado no DOU em 23/02/2016. Informou que até 18/03 nada havia chegado à CGGI. A DPLAN pediu a dilatação do prazo até 08/04 para encaminhamento das propostas tendo em vista dificuldades internas de agenda com o Diretor Sérgio Alencar. A CGGI continuará no aguardo dessas informações em que pese ter a todos informado, inclusive pro registro escrito na agenda que foi distribuída no dia 01/03, que a não entrega das informações seria interpretada como o endosso às atribuições regimentais vigentes, dispensando assim, alguma alteração.

- POs 72 a 75 - Tratam-se de POs referentes aos projetos “recuperação do Anexo Nilo Coelho”, “recuperação das fundações do edifício sede”, e “modernização das subestações elétricas do edifício SUDENE”. Dos três, a recuperação das fundações encontra-se paralisada. Esses projetos estão sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Administração e Finanças (CGAF/DAD/SUDENE) e fazem parte do conjunto de projetos sob condução de uma força-tarefa. Chamado a se pronunciar, o Engenheiro José Wilson Galdino destacou que a preocupação da força-tarefa reside em quatro pontos: coberta do prédio; elétrica; hidráulica e estrutura. Tomando a palavra, o Superintendente João Paulo destacou que a Autarquia provavelmente irá reassumir a gestão do prédio, que a equipe da força-tarefa será reforçada e que na segunda-feira, 04/04, haverá reunião com os condôminos, preparatória para a reunião no Ministério Público. Na Assembleia Geral Ordinária será definido o que se pode e o que não se pode fazer. Lembrou também outro grande problema que vem se mostrando fora das preocupações, mas que não pode ocorrer: a solução a ser dada com os aparelhos de ar-condicionado para a biblioteca, além da recuperação estrutural da própria edificação, acrescentando que a situação da Biblioteca é muito delicada tanto em relação ao conforto mínimo oferecido aos servidores, quanto às condições necessárias para a preservação do acervo e recuperação estrutural e hidro-sanitária, e que já encaminhou providências para uma solução urgente pela Diretoria de Administração.

9 – Conclusão

Os resultados do 1º ciclo de monitoramento de 2016 revelaram duas grandes preocupações e, ao mesmo tempo, reflexões: o cumprimento do papel institucional da SUDENE diante de restrições orçamentárias tão agudas, e o atendimento aos pleitos de incentivos e vistorias de convênios que exigem vistorias ex-ante, durante e ex post à sua execução, mas também enfrentam restrições quanto aos gastos com diárias e passagens.

De acordo com a Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças da SUDENE, para o ano de 2015 a SUDENE apresentou ao MI, no decorrer de 2014, pré proposta orçamentária de R\$ 107.717.297,00 dos quais R\$ 45.732.309,00 destinados aos programas finalísticos, R\$ 26.913.131,00 para a administração da unidade e capacitação de servidores, e R\$ 34.071.857,00 para os gastos com

benefícios, pessoal e encargos sociais. Ou seja, R\$ 60.984.988,00 para atividades meio, equivalente a cerca de 57 % do total.

Após sucessivos ajustes e cortes, em 22/04/2015 foi sancionada a Lei nº 13.115, fixando o orçamento da SUDENE para 2015 em R\$ 88.858.706,00 dos quais R\$ 11.535.301,00 (inclusive R\$ 2.862.300,00 referente a emendas parlamentares) para os programas finalísticos e R\$ 77.323.405,00 para benefícios, pessoal e encargos sociais, precatórios, reserva de contingência, administração e capacitação de servidores.

Acompanhando a política de restrições orçamentárias e a crise econômica que marcaram o ano que passou, em 22/05/2015 o Governo Federal sancionou o Decreto nº 8.456, fixando o contingenciamento para a SUDENE com o limite orçamentário autorizado de R\$ 21.282.637,00, dos quais R\$ 5.203.800,55 para os programas finalísticos e R\$ 16.078.836,45 para administração e capacitação de servidores, exclusive benefícios, pessoal e encargos sociais, que já haviam sido fixados em R\$ 34.071.857,00. Ou seja, para 2015 foram fixadas R\$ 50.150.693,15 para as despesas de administração geral e R\$ 5.203.800,55 para as finalísticas, totalizando R\$ 55.354.493,70, equivalente a 49 % abaixo da pré-proposta orçamentária inicial.

Em maio de 2015 a SUDENE foi surpreendida pela inesperada limitação de gastos com diárias e passagens - R\$ 476 mil de disponibilidade para 2015 (Portaria MI nº 463, de 30 de dezembro de 2014). Em 2014 foram gastos R\$ 1.218 mil. Ainda em 2015 vários foram os expedientes encaminhados ao MI na tentativa de melhor adequar os compromissos assumidos com diferentes segmentos da sociedade à política de restrições orçamentárias severas. Até mesmo a recomendação da Controladoria Regional da União em Pernambuco quanto à obrigatoriedade da vistoria a ser feita em convênios, pleitos de incentivos fiscais, projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), além da participação da SUDENE em compromissos respaldados pelas atribuições contidas no art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014, relacionados ao exercício de nossas atividades deixaram de ser, em sua grande parte, cumpridos.

Que fazer então, haja vista que a finalidade da SUDENE é “promover o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional”, além de atuar em um modelo que exige a articulação, negociação e mobilização de diferentes segmentos da sociedade para a discussão de suas propostas, mas ainda não dispõe de mecanismos ou autonomia administrativa para fazer frente a essas expectativas.

A criação da SUDENE teve como objetivo permanente, a “INCLUSÃO SOCIAL”. Para isso recebeu como incumbência 12 competências gerais que foram detalhadas no art. 4º da lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, que a instituiu:

- I - definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao desenvolvimento sustentável de sua área de atuação;
- II - formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento de sua área de atuação, em consonância com a política nacional de desenvolvimento regional, articulando-os com os planos nacionais, estaduais e locais;
- III - propor diretrizes para definir a regionalização da política industrial que considerem as potencialidades e especificidades de sua área de atuação;
- IV - articular e propor programas e ações nos Ministérios setoriais para o desenvolvimento regional, com ênfase no caráter prioritário e estratégico, de natureza supra estadual ou sub-regional;

V - articular as ações dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das forças sociais representativas de sua área de atuação de forma a garantir o cumprimento dos objetivos e metas de que trata o inciso I do caput deste artigo;

VI - atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, visando a promover a diferenciação regional das políticas públicas nacionais e a observância dos §§ 1º e 7º do art. 165 da Constituição Federal;

VII - nos termos do inciso VI do caput deste artigo, em articulação com o Ministério da Integração Nacional, assessorar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por ocasião da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas para sua área de atuação;

VIII - apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, capacitação de recursos humanos, inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;

IX - estimular, por meio da administração de incentivos e benefícios fiscais, os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação, conforme definição do Conselho Deliberativo, em consonância com o § 2º do art. 43 da Constituição Federal e na forma da legislação vigente;

X - promover programas de assistência técnica e financeira internacional em sua área de atuação;

XI - propor, mediante resolução do Conselho Deliberativo, as prioridades e os critérios de aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais na sua área de atuação, em especial aqueles vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico;

XII - promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e a proteção ambiental do semiárido, por meio da adoção de políticas diferenciadas para a sub-região.

Contudo, desde sua criação vive um contraditório: conviver com um Estado cujas decisões são centralizadas, e, ao mesmo tempo, receber a tarefa de braço descentralizado desse mesmo Estado, afinal trata-se de uma “autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma”, mas que, ao mesmo tempo se subordina às mesmas regras dos cortes e contingenciamentos orçamentários impostos aos integrantes do “Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal”, ou ainda, sequer dispor da garantia do crédito devidamente apurado nos termos do estabelecido pelo § 2º, art. 3º da MP nº 2.156-5/2001, com as alterações do art. 19 da Lei Complementar nº 125/2007, ou do estabelecido nos incisos I e II, art. 3º do Decreto nº 7.838/2012.

Isso de certa forma explica uma pauta de 77 projetos que demandam um esforço apreciável das unidades internas para a garantia dos objetivos por eles traçados, contudo as afasta de projetos estratégicos que exigem parcerias, construções políticas interinstitucionais, complexas articulações e mobilizações supra regionais e grandes somas de investimentos.

E por que isso é trazido à discussão? Por que parece que está surgindo uma luz no fim do túnel. Setores do parlamento começam a se mobilizar reconhecendo que uma questão regional precisa ser resolvida e que há instituições que precisam ser fortalecidas e há instrumentos institucionais para isso.

Por sua vez, a administração superior da Autarquia vem trabalhando uma agenda que propicie a integração interinstitucional e uma pauta de execuções que incorpore a construção de um processo estruturado de avaliação dos impactos dessas medidas integradas na região, além de critérios objetivos que possibilitem antecipar a efetividade dos projetos apoiados. E isso se explica! Na medida que o

monitoramento revela projetos com etapas atrasadas ou mesmo com o todo sendo conduzido por sucessivas prorrogações de prazo, é por que algo precisa ser melhorado.

A criação, nos próximos meses, de um grupo no Ministério da Integração Nacional para estudar o papel das Superintendências no processo de desenvolvimento regional parece vir ao encontro desse clamor por mudanças. Esforço semelhante aconteceu entre 2012 e 2013 com o mesmo tema e pode servir de base para a superação de obstáculos como os apurados na época, quando era buscada uma atuação integrada via compartilhamento das pautas programáticas dos diferentes órgãos com atuação na Região.

E tudo isso surge nas discussões dos ciclos de monitoramento e reforça o fato de que o acompanhamento das ações da SUDENE se constitui hoje, etapa fundamental para a tomada de decisão.

Sobre os próximos compromissos a agenda é a seguinte:

**Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos
de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2016**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
2º	31/05/2016	07/06/2016	22/06/2016
3º	31/08/2016	09/09/2016	22/09/2016
4º	28/11/2016	02/12/2016	15/12/2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 01
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.				
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Previsão de Conclusão:	07/08/2016	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012) Vigência: 18/12/12 a 31/12/2015
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
--	--

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	ONVENIENT	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15
mai/12	139.865,15	7.361,32	147.226,47	A realizar no exercício	R\$ 94.240,34
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
jul/12	234.105,49	12.321,33	246.426,82	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 94.240,34
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 139.865,15

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								53,8%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013			68,8%	Em Andamento		
9.1	Etapas I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	Concluído		

9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34				0,0%	A Iniciar		
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016		28/5/2015	21/01/2016		100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016		22/1/2016			50,0%	Em Andamento	Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	A última visita técnica será realizada na data da Oficina de finalização do projeto, cuja data ainda não foi marcada.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/06/2016	07/08/2016					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 234.105,49	Valor realizado:		R\$ 139.865,15	73,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM
Observações:
1º Ciclo - 2016. Repactuadas Etapas 9.6 e 9.7 diante da nova vigência do convênio, prorrogado para o dia 28/06/2016
Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião tecnica de acompanhamento entre os tecnicos da CGDS e os tecnicos do CONDEP/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	Número do Projeto:	PO 02
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	ONVENIENT	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	27/09/2016	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								36,8%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	01/09/2013	01/12/2013	R\$ 325.222,88	15/11/2014		--	65,0%	Atrasado	Contratada a empresa para a conclusão das atividades da Etapa 1/Meta 1, em substituição a que realizou destrato. Além disso, encontra-se em fase de conclusão a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1.	
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/07/2014	30/04/2016	R\$ 356.560,00	08/12/2014		--	40,0%	Em Andamento	Foi selecionada uma nova empresa para dar continuidade às realizações dos Encontros / Diálogos Municipais.	

7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído	Etapa concluída após a retomada da realização dos Encontros em 21/09/2015 com a contratação de uma nova empresa.	Foram realizadas duas reuniões, uma com a equipe coordenadora da execução do projeto e outra com o Secretário-Executivo da SEMAS/PE, quando foram discutidos aspectos relativos ao andamento das atividades e à solicitação de esclarecimentos. A Conveniente apresentou nova solicitação de prorrogação da vigência do convênio e está ciente da necessidade de ajustes no Relatório de Execução para que ocorra a liberação da segunda parcela para dar continuidade às atividades.
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do concedente. No momento, aguarda-se a retificação de um dos relatórios de execução pelo conveniente.	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	04/01/2016	30/03/2016	R\$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos.	
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	04/04/2016	30/04/2016	R\$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	40,0%	Em Andamento		
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2014	30/04/2016	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	80,0%	Em Andamento	A conveniente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluí-la.	
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/03/2016	30/04/2016	R\$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDEN	30/06/2016	27/09/2016	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela	
			Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 265.241,25	56,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.												
Observações:												
* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016.												
1º ciclo 2016												

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 03
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.				
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 4	30	694.459,19	771.621,32

Previsão de Conclusão:	08/08/2015	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)
Data Atualização:	29/02/2016	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 694.459,19
dez/12	419.104,63	77.162,13	496.266,76	A realizar no exercício	R\$ -
jan/13	137.677,28	--	137.677,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
abr/13	137.677,28	--	137.677,28	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
TOTAL	694.459,19	77.162,13	771.621,32	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 694.459,19

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Márcelo de Castro Viana, Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	23/04/2012	10/05/2012		23/04/2012	10/05/2012		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
8	Realização de processo licitatório para contratação de serviços	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100,0%	Concluído		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	11/10/2012	R\$ 419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	R\$ 419.104,63	100,0%	Concluído		
9	Realizar 40 cursos de capacitação em Ovinocaprinocultura para 600 criadores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013	15/09/2014		100,0%	Concluído		
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica para 180 apicultores	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014	Não informado		100,0%	Concluído		
	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	06/02/2014		28/01/2014	06/02/2014		100,0%	Concluído	(*)	
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	R\$ 137.677,28	09/04/2014	19/05/2014	R\$ 137.677,28	100,0%	Concluído		
11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100,0%	Concluído		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014	16/05/2014		07/08/2014	22/08/2014		100,0%	Concluído	(**)	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	R\$ 137.677,28	16/01/2015	25/02/2015	R\$ 137.677,28	100,0%	Concluído		
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de Centrífuga extratora de mel, Mesa desoperculadora de favos e Tanque decantador para mel (R\$ 204.702,72)	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100,0%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		

14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	29/06/2015	08/08/2015		07/01/2016	13/01/2016		100,0%	Concluído	Elaborado Relatório Final (Laudo Técnico), com parecer das metas físicas do projeto e encaminhado em 15.01.2016 à Unidade de Gestão de	
			Valor Previsto:		R\$ 694.459,19	Valor realizado:		R\$ 694.459,19	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE												
Observações:												
Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014												
(*) A viagem de supervisão foi realizada no período de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto												
(**) A viagem de supervisão foi realizada no período de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto												
1º ciclo 2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 04 (ex PO 06)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 485.874,65
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 485.874,65

Previsão de Conclusão:	22/08/2016	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	29/02/2016	Vigência: 31/12/13 a 14/05/16

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		60,0%	Concluído		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%	Concluído	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído		

8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.	
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.	
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.	
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Técnica: Maria Helena de Castro Lima	
ENCERRAMENTO (Peso 20 %)									0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/07/2016	22/08/2016					0%	A Iniciar	Aguardando relatórios de execução para emissão de LT.	
			Valor Previsto:		R\$ 485.874,65	Valor realizado:		R\$ 485.874,65	80,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

4º Ciclo 2015 - Etapas 8.6 repactuada

1º Ciclo 2016

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 05 (ex PO 07)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Previsão de Conclusão:	31/07/2017	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)
Data Atualização:	29/02/2016	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 107.354,71
OUT/2014	107.354,71	5.650,24	113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 100.187,91
OUT/2015	100.187,91	5.273,04	105.460,95	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	207.542,62	10.923,28	218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								10,3%	Em Andamento		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	---	---		11/09/2015	24/09/2015	--	20,0%	Concluído		
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	18/03/2016	--	--	--	--	0,0%	Atrasado	Em decorrência de solicitações da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco - SAD/PE para a reformulação do Termo de Referência, que retardaram os ritos processuais do projeto, foi necessário refazer o edital de licitação o que levou a nova solicitação de prorrogação de prazo para concluir os ritos da licitação e contratações para o efetivo início da execução. De acordo com o 2º Termo Aditivo a vigência passa a ser 01/06/2016. Em decorrência da não apresentação do relatório de atividades que comprovem a sua realização até a presente data, a concedente não pode proceder a liberação da segunda parcela dos recursos, gerando a necessidade de atualização do Plano de Trabalho.	Conveniente contatado através de reunião, por e-mail e por telefone para tomar providências de apresentar relatório de atividades referente à etapa 1.1 e 1.2, relativas à meta 1, para que sejam analisadas e encaminhadas a liberação da segunda parcela dos recursos. Foi agendada reunião para o dia 08/03/2015, com vistas à avaliação do Convênio e solicitação de providências.
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	20/12/2015	--	--	--	--	0,0%	Atrasado		
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	--	--	--	0,0%	Atrasado		
10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	15/02/2016	18/03/2016	--	--	--	--	0,0%	Atrasado		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	A Iniciar		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91			--	0,0%	Atrasado		
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	21/03/2016	31/05/2016		--	--	--	0,0%	A Iniciar		
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	15/04/2016	29/04/2016	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	02/05/2016	13/05/2016	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	16/05/2016	31/05/2016	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/2016	31/07/2017	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$ 207.542,62	Valor realizado:	R\$ 107.354,71	30,3%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:							
AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)							
Observações:							
4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.							
3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.							
2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efeivo início das atividades.							
1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.							
4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberção da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.							
1º Ciclo 2016							

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 08)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.				
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Previsão de Conclusão:	26/10/2016	CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)	
Data Atualização:	29/02/2016	Vigência:	27/08/2016

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56
jun/14	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
dez/14	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	359.682,64	18.930,66	378.613,30	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
--------------------------------------	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								50,5%	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído		
9	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	27/08/2016		28/08/2015			36,7%	Em Andamento		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015			30,0%	Em Andamento		

9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2016	30/04/2016	R\$ 138.415,08				0,0%	A Iniciar	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.(As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)	
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/03/2016	26/05/2016					0,0%	A Iniciar	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas. (As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)	
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	27/05/2016	27/08/2016					0,0%	A Iniciar	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.(As datas já foram repactuadas - fevereiro/2016)	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R\$ 359.682,64	Valor realizado:		R\$ 221.267,56	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM												
Observações:												
a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2												
b) O conveniente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.// Datas repactuadas em Fevereiro/2016												
1º ciclo 2016.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 07 (ex PO 09)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraíba, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.			
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraíba			
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Previsão de Conclusão:	22/06/2017	Convênio Nº 813986/2014
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcélio de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	---

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								20,1%	Em Andamento		
8	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convete solicitou ajustes no cronograma de desembolso	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1a parcela
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	21/04/2016	-	03/10/2015		-	20%	Em Andamento	O processo licitatório (que equivale a 59% do recurso global do projeto) ocorreu no dia 27/11/2015. Nenhuma empresa apresentou capacidade técnica e o jurídico da EMEPA está avaliando as possibilidades para contratação.	
10	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	05/03/2016	-	04/11/2015		-	70%	Em Andamento		
11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2016	-	24/10/2015		-	65%	Em Andamento		
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2016	-	02/12/2015		-	30%	Em Andamento	O processo licitatório para aquisição dos insumos veterinários para coleta de sêmen ocorreu em 02/12/2015.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	21/04/2016	-	14/09/2015		-	40%	Em Andamento		

14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	21/04/2016	-	27/11/2015		-	10%	Em Andamento	O processo licitatório para contratação dos instrutores e serviços de terceiros ocorreu no dia 27/11/2015. No entanto, nenhuma empresa apresentou capacidade técnica e o jurídico da EMEPA está avaliando as possibilidades para contratação.	
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	26/10/2015	30/10/2015	-			-	0%	Paralisado	Não houve liberação de recursos financeiros (diárias) para realização de viagem para acompanhamento.	
16	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 137.434,28				0%	Atrasado	Ainda não foi liberada a 2a parcela, pois não foi possível constatar in loco a realização das etapas anteriores, em virtude da não liberação de diárias para viagem de acompanhamento.	
17	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/12/2015	31/12/2015	-			-	0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
18	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	22/06/2016	29/07/2016	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 343.585,70	Valor realizado:			R\$ 206.151,42	40,1%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba												
Observações:												
1º ciclo 2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 08 (ex PO 10)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.				
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará				
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares , gerando renda e fixação do homem ao campo.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Previsão de Conclusão:	21/06/2017	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	29/02/2016	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	ONVENIENT	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	A realizar no exercício	R\$ 550.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 550.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 211.000,00

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído		
	Execução (Peso 60%)								10,0%	Em Andamento	Em 22.02.2016 o conveniente solicitou prorrogação de prazo de vigência do convênio. Foi dado parecer técnico acatando tal solicitação.Processo encaminhado à Coordenação de Convênio para elaboração do Termo Aditivo.	
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 221.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído		
9	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	10/03/2016	14/03/2016					0,0%	A iniciar	Aguardando a publicação do Contrato da empresa que prestará o serviço.	
10	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	29/03/2016	31/03/2016					0,0%	A iniciar	Realizadas reuniões preparatórias com as lideranças (prefeitos e secretários de agricultura) municipais e técnicos da EMATERCE, presidentes de associações, para dar início aos seminários.	

11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	26/04/2016	06/05/2016					0,0%	A iniciar	Os cursos iniciarão após os seminários e seleção por meio de visita ao público beneficiário e aplicação de questionário.	
12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	14/06/2016	22/06/2016					0,0%	A iniciar	Terá início após conclusão dos cursos (item 11)	
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	15/08/2016	16/09/2016					0,0%	A iniciar	A ser realizado no segundo semestre.	
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/11/2015	27/11/2015					0,0%	Atrasado	Viagem de Acompanhamento não realizada por não ter sido ainda iniciadas as ações do projeto.	
15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	16/11/2015	R\$ 550.000,00				0,0%	Atrasado	A liberação não foi realizada em função das ações do projeto não terem sido implementadas.	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	11/08/2015	29/02/2016					50,0%	Em Andamento	Pregão eletrônico adjudicado .	
	Encerramento - 20%								0,0%			
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/05/2016	07/05/2016					0,0%	A iniciar		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	21/06/2016	21/06/2017					0,0%	A iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 211.000,00	30%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Observações:

1º ciclo 2016

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 09 (ex PO 11)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.		
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.		
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Atender ao desafio de moldar o perfil do agente público na concepção moderna da nova gestão pública ou gestão pública gerencial, com o desafio de incluir características que atendam a objetivos e missão institucionais, convergindo com os interesses da sociedade.				
Projeto:	Capacitação estratégico-gerencial dos servidores públicos de 10 municípios do Semiárido paraibano				
Objetivo do projeto:	Capacitar e qualificar os servidores de 10 municípios do semiárido paraibano, visando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências nas áreas técnico-gerenciais, administrativo-organizacionais, financeiro-fiscais, elaboração de projetos e captação de recursos com vistas à melhoria da capacidade de gestão pública local.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	GND 3	30	410.203,62	437.000,00

Previsão de Conclusão:	12/12/2017	Convênio N° 813604/2014 (Proposta: 052390/2014)
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção.
--------------------------------------	---

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
dez/14	212.141,92	13.858,08	226.000,00	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 410.203,62
jun/15	198.061,70	12.938,30	211.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	410.203,62	26.796,38	437.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 410.203,62
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Programa	CGDS/SUDENE			R\$ -		06/08/2015	R\$ -	100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	30/10/2014	06/11/14	R\$ -	30/10/2014	06/11/2014	R\$ -	100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	04/11/2014	19/12/14	R\$ -	04/11/2014	19/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído		
4	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	20/12/2014	30/12/14	R\$ -	20/12/2014	31/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído		
5	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		31/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído		
6	Publicação do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		08/01/2015	R\$ -	100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								0,0%	Cancelado		
7	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	23/12/2015	23/12/2015	R\$ 212.141,92			R\$ -	0,0%	Cancelado	Realizado o ajuste do Plano de Trabalho (Cronograma Físico e de Desembolso), a substituição, por parte da conveniente, do responsável técnico pelo projeto, apresentação de termos de compromisso dos municípios a serem beneficiados pela capacitação. Foi solicitado à Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finaças a liberação dos recursos da primeira parcela do Convênio. No entanto, foi informado que não havia disponibilidade de recursos na SUDENE, sendo necessário solicitá-lo ao MI. Diante da não liberação dos recursos na data prevista, por parte da concedente, r por motivos técnicos a convenete solicitou o cancelamento do convênio, aguardado a posterior devolução da contrapartia, outrora depositada pela SEAD-PB.	Foi realizada prorrogação de ofício (autorizada no dia 15/10/2015) para ampliação da vigência do convênio até 13/10/2016. Foi realizado pedido de esclarecimento via Siconv no dia 18/11/2015 e no dia 30/11 foi minutado ofício para o Governo do Estado da Paraíba, solicitando providências diante das pendências existentes. Solicitação dos recursos do convênio ao Ministério da Integração.
8	Meta 1: Realizar 4 Capacitações em Gestão Financeira (R\$ 167.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	23/12/2015	07/05/2016				R\$ -	0,0%	Cancelado		

8.1	Etapa 1: Sensibilização e Mobilização/Procedimentos Licitatórios e Contratuais (R\$ 500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	23/12/2015	31/03/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
8.2	Etapa 2: Realizar 2 Cursos sobre E-social e Administração Pública (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	04/04/2016	16/04/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
8.3	Etapa 3: Realizar 1 Curso sobre GFIP-SEFIP (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	18/04/2016	23/04/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
8.4	Etapa 4: Realizar 1 Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira na Administração Pública (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	25/04/2016	07/05/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
9	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$	-	0,0%	Cancelado		
10	**Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/05/2016	01/05/2016	R\$ 198.061,70			R\$	-	0,0%	Cancelado		
11	Meta 2: Realizar 1 Capacitação em Patrimônio Público (R\$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	09/05/2016	14/05/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
11.1	Etapa 1: Realiza 1 Curso sobre Gestão do Patrimônio Público (R\$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	09/05/2016	14/05/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
12	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$	-	0,0%	Cancelado		
13	Meta 3: Realizar 1 Capacitação em Gestão de Projetos (R\$ 26.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	16/05/2016	28/05/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
13.1	Etapa 1: 1 Curso sobre SICONV – Da Celebração à Prestação de Contas. (Elaboração de Projetos para Captação de Recursos	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	16/05/2016	28/05/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
14	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15	Meta 4: Realizar 6 Capacitações em Compras Governamentais (R\$ 211.000,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	30/05/2016	23/07/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.1	Etapa 1: 1 Curso sobre Licitações Públicas (R\$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	30/05/2016	04/06/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.2	Etapa 2: 1 Curso sobre Elaboração de Edital e Termo de Referência (R\$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	06/06/2016	11/06/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.3	Etapa 3: 1 Curso sobre Pregão Presencial e Eletrônico (R\$ 37.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	13/06/2016	18/06/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.4	Etapa 4: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R\$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	04/07/2016	09/07/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.5	Etapa 5: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R\$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	11/07/2016	16/07/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
15.6	Etapa 6: 1 Curso sobre Contratos Administrativos (Gestão e Fiscalização) (R\$ 37.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	18/07/2016	23/07/2016				R\$	-	0,0%	Cancelado		
16	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$	-	0,0%	Cancelado		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	Cancelado		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	12/12/2016	12/12/2017						0,0%	Cancelado	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios após emissão do laudo técnico.	
			Valor Previsto:		R\$ 410.203,62	Valor realizado:		R\$ 0,00		20,0%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Administração												
Observações:												
1º Ciclo 2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 10 (ex PO 14)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio n° 813665/2014		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Previsão de Conclusão:	01/02/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL (R\$)		
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	Pago até o ano anterior	R\$ 326.618,00
371.625,00		jun/15	371.625,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 743.250,00
371.625,00		set/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL			1.090.800,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Vanessa Tenório Beltrão Barbirato (coordenadora), Adrianny Cristiny De Lima Silva (técnica)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Início	Previsto Fim	Valor	Início	Realizado Fim	Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								42,9%	Atrasado		
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído		
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.	
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído		
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído		
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00				10%	Atrasado	Em fase de elaboração contratual para o início das capacitações	
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/03/2016	30/03/2016	-	Não informado	Não informado		100%	Concluído		

15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015		20%	Atrasado	Só foram adquiridos os 'tablets' dos materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho (R\$ 42.155,00). Nota Explicativa de 27/01/2016, inserida no Siconv, solicitando redução no quantitativo dos equipamentos - material permanente - do curso de aplicadora de revestimento cerâmico. Justificativa acatada pela equipe técnica e plano de trabalho em atualização.	
16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-			0%	Atrasado	A entidade a ser contratada para fornecer a capacitação é quem ficará responsável pela elaboração do material didático e como se encontra em processo licitatório esta etapa se encontra em atraso.	
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-			100%	Cancelado	Visita prevista cancelada em função da falta de recursos financeiros.	
18	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	15/06/2015	R\$ 371.625,00			0%	Atrasado		
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2015	R\$ 371.625,00			0%	Atrasado	Em fase de seleção das alunas	
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	05/09/2015	-			0%	Atrasado		
21	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2015	R\$ 371.625,00			0%	Atrasado		
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2015	R\$ 371.625,00			0%	Atrasado	Em fase de seleção das alunas	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2015	-			0%	A Iniciar		
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2015	-			0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	01/02/2017	-			0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 1.090.800,00	Valor realizado:		R\$ 326.618,00	62,9%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

Observações:

Por meio do Ofício nº 428/SEMTABES 2015 foi solicitado prorrogação por mais 1 ano. Processo na Procuradoria para análise do pleito.

4º Ciclo 2015

Termo Aditivo para encerramento do convênio em 30/12/2016

1º Ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO 11 (ex PO 15)
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.				
Projeto:	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.				
Objetivo do projeto:	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75

Previsão de Conclusão:	19/10/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Conveniente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 458.149,49
AGO/2015	R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	R\$ 499.949,49	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 377.673,98
OUT/2015	R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	R\$ 428.743,26	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
-	R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	R\$ 928.692,75	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 377.673,98
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 458.149,49

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								7,5%	Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R\$ 458.149,49	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 458.149,49	100%	Concluído		
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	50%	Paralisado	A Conveniente informou que o processo licitatório foi cancelado e ainda não têm data prevista para ser realizado	
8	Consolidação do Projeto	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	11/05/2016	R\$ 41.304,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Diagnóstico	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 458.645,49	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		

9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	11/07/2016	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	A Iniciar	Tais etapas serão iniciadas após a finalização do processo licitatório. Houve atraso devido aos ajustes no TR e no plano de trabalho no SICONV como condicionantes para a liberação da primeira parcela. No momento, o início da execução está condicionado à realização do processo licitatório como indicado acima.	O convênio foi prorrogado de ofício, tendo como nova vigência 09/09/2016. Foi inserida, em18/02/2016, no SICONV uma "Solicitação de Esclarecimento", na qual foi pedido que a Convenente apresentasse relatório descritivo do andamento deste Convênio 813695/2014. Foi concedido o prazo até o dia 26/02/2016 para que esta relatório fosse apresentado, mas, até a data limite deste PO, a "Solicitação" ainda não havia sido respondida, nem o solicitado relatório constatado no SICONV.
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	11/07/2016	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	11/07/2016	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	11/07/2016	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 377.673,98	--	--	R\$ 0,00	0%	Atrasado		
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 294.170,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	10/08/2016	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	10/08/2016	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	10/08/2016	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	10/08/2016	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	A Iniciar		
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	09/09/2016	R\$ 89.649,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	09/09/2016	R\$ 44.922,88	--	--	--	0%	A Iniciar		
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	10/09/2016	19/10/2016					0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
Valor Previsto:					R\$ 835.823,47	Valor realizado:		R\$ 458.149,49		28%	Paralisado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

Observações:

O 1º Termo de Prorrogação de Ofício foi assinado em 05/11/2015, prorrogando a vigência do Convênio para 09/09/2016.

1º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 12 (ex PO 04)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2009
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.				
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas				
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(e)s técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.952.322,32
A realizar no exercício	R\$ 3.000.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R\$ 3.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.952.322,32

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CIM	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100,0%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas -	DPLAN/CGDS/CIM	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100,0%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CIM	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100,0%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100,0%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	100,0%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Articulações com a EPE para a elaboração do Balanço Energético Regional 2015/2016 (digital) e apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CIM	01/12/2012	30/12/2016	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60,0%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais julho/2016. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético. Redefinindo orçamento para 2016/2017.
7	Formalização de Cooperação Técnica com a UFPE, para realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CIM	01/03/2013	30/04/2015	R\$ 600.000,00	19/06/2013	27/11/2015	R\$ 599.482,32	100,0%	Concluído	Identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região. Formalizados 2 (dois) TED's com o CER/UFPE	Termos de Execução Descentralizada com o Centro de Energias Renováveis/UFPE - 1)Solar:" Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil"; 2) Eólica:" Anteprojeto da área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída".

8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014	25/09/2015	Sem ônus	100,0%	Concluído	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Industrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
			Valor Previsto:		R\$ 5.052.840,00	Valor realizado:		R\$ 1.952.322,32	95,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs.	4º Ciclo 2015 - Repactuada a atividade 6, 7 e 8											
	Os recursos previstos na etapa 6 são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.											
	1º Ciclo 2016											

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 13 (ex PO 16)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar	
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos			
Projeto:	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN			
Objetivo do projeto:	Adquirir frota de equipamentos agrícolas (plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 266.400,00

Previsão de Conclusão:	03/08/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/Município de Currais Novos/RN.
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	31/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1		31/12/2013	05/06/2015	R\$ 266.400,00			R\$ 266.400,00	100%	Concluído		
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 196.000,00	16/07/2014	16/07/2014	R\$ 196.000,00	100%	Concluído		
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 34.400,00	21/08/2014	21/08/2014	R\$ 34.400,00	100%	Concluído		
10.3	Grade aradora(02 Unid.)	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 36.000,00	22/08/2014	22/08/2014	R\$ 36.000,00	100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		04/08/2015	03/08/2016					0%	A Iniciar		
11	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS	31/03/2016	09/06/2016					0%	A Iniciar	A visita técnica foi prejudicada por falta de recursos financeiros.	Laudo Técnico depende da visita "in loco".
12	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/08/2016					0%	A Iniciar		
					R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Município de Currais Novos/RN
Observações:
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;
(2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para a encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
1º Ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 14 (ex PO 17)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos			
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro - CE			
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 1.053.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/1901	CONVÊNIO Nº 789013/2013 (Proposta SICONV 063712/2013)
Data Atualização:	29/02/2016	Vigência: 18/12/12 a 18/06/2016

Cronograma de Desemboço				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 700.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	
R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 1.000.000,00	R\$ 53.000,00		R\$ 1.053.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 700.000,00

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								42%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 23.000,00	05/02/2014	05/02/2014	R\$ 23.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 15.000,00	15/04/2015	15/04/2015	R\$ 15.000,00	100%	Concluído		
	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 300.000,00	18/11/2015	18/11/2015	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 15.000,00			R\$ 0,00	0%	Cancelado		
	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 300.000,00			R\$ 0,00	0%	Cancelado		
10	Meta 1		30/12/2013	00/01/1900		28/02/2014			70%	Em Andamento		
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Saboeiro	30/12/2013	00/01/1900	R\$ 1.053.000,00	28/02/2014		R\$ 738.000,00	70%	Em Andamento	O Conveniente ajustou o projeto básico e executou serviços em desacordo com o plano de trabalho aprovado	Foi realizado o ajuste do plano de trabalho no Siconv acarretando a redução do valor total do convênio para R\$ 905.088,92.
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/02/1900	28/02/1901					13%	A Iniciar		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/02/1900	28/02/1901					0%	A Iniciar		

			R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 700.000,00	75%	Em Andamento	Status do Projeto	
--	--	--	------------------	------------------	----------------	-----	--------------	-------------------	--

Parceiros institucionais:
Município de Saboeiro/CE
Observações:
(1) O convênio teve a sua vigência prorrogada até 21/12/2015 em face da necessidade de se proceder o ajuste do plano de trabalho, que encontra-se em andamento;
(2) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
(4) A vigência do convênio foi aditada para 18/06/2016.
1º Ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		PO 15 (ex PO 05)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:		2014	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.			
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.					
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS			
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto			
Problema (causa):	Crescimetno na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .					
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada					
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	09/01/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	R\$ 714.000,40	A realizar no exercício (2014)	R\$ 1.183.120,40
IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	R\$ 469.120,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
			R\$ 1.183.120,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.183.120,40
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.183.120,40

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Paulo Ditarso (IFPB).

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)		11.02.2014	18.05.2014		11.02.2014	18.05.2014		20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014	2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)		02/05/2014	22/08/2015		02/05/2014	25/08/2015		60,0%	Concluído		
8	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído		
9	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/03/2015		27/05/2014	20/08/2015		100%	Concluído	Até o presente momento, foram capacitadas 240 alunas das 640 previstas. Em virtude do Decreto nº 8.407/15, os recursos financeiros foram bloqueados, o que acarretou atrasos na execução das capacitações.	Recursos Financeiros desbloqueados. Foi solicitado Aditivo de Prazo, pelo IFPB, alterando a data de conclusão do projeto para 22/08/2015
9.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	22/08/2013		100%	Concluído		
9.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	22/08/2013		100%	Concluído		
9.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014		100%	Concluído		
9.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013	29/10/2013		100%	Concluído		
9.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013					100%	Concluído		
9.6	Aquisição do Laboratório Móvel,	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	23/03/2015		100%	Concluído		

9.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico; Curso de Pintura de Obras; Curso Auxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/12/2014		01/04/2014	20/08/2015		100%	Concluído	Em virtude do Decreto nº 8.407/15, que dispõe sobre regulamentação das despesas inscritas em restos a pagar não processados até o exercício de 2014, houve o bloqueio dos recursos financeiros, acarretando atrasos nas ações.	Os cursos nos Campi João Pessoa e Pedra de Fogo iniciaram-se no dia 09/04/2015; no Campus Monteiro iniciaram-se no dia 27/04/2015; no Campus Cajazeiras iniciaram-se no dia 23/03/2015.
9.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	01/03/2015		01/11/2014			0%	Cancelado	O IFPB não estimou adequadamente as condições de absorção das alunas no mercado de trabalho.	Com o término da vigência do TED, a ação foi cancelada por impossibilidade da absorção das alunas no mercado de trabalho, que encontra-se em baixa.
10	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/2014	22/08/2015		24/11/2014	26/11/2015		100%	Concluído		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		22/06/2015	11/12/2015		27/11/2015			20,0%	Concluído		
11	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	30/09/2015	14/11/2015		30/11/2015			100%	Concluído		
			Valor Previsto:		R\$ 1.183.120,40	Valor realizado:		R\$ 1.183.120,40	100,0%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
IFPB											
Observações:											
(1) O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluí-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.											
(2) Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.											
(3) A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.											
(4) O encerramento do TED estava previsto para 22/05/2015, todavia devido a entraves observados na execução das ações e do decreto nº 8.407/15, foi enviado pelo IFPB o Ofício Nº 10/2015 - PROEXT/IFPB, de 27/05/2015, solicitando Aditivo de Prazo para 22/08/2015, sendo acatado pela SUDENE e publicado no DOU de 27/05/2015. Houve retificação do prazo de vigência no DOU de 12/06/2015 para a data de até 31/08/2015.											
4º ciclo 2015											

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 16 (ex PO 12)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos			
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas - RN			
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 420.540,15

Previsão de Conclusão:	06/07/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 200.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								30%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 10.000,00	02/02/2015	02/02/2015	R\$ 10.000,00	100%	Concluído	No valor de R\$ 10.000,00	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
	Depósito da 2ª parcela da contrapartida				R\$ 10.540,15					Cancelado		
	Liberação da 2ª parcela				R\$ 200.000,00					Cancelado		
10	Meta 1		23/12/2014	07/05/2016	R\$ 420.540,15			R\$ 210.000,00	0%	A Iniciar		
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	07/05/2016	R\$ 420.540,15			R\$ 210.000,00	0%	A Iniciar	O Município procedeu o ajuste do projeto básico e a licitação está em processo de homologação.	O projeto foi reavaliado e se prevê que a obra será iniciada em março/2016.
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		06/07/2016	06/07/2017					0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	06/07/2016	06/07/2017					0%	A Iniciar		
					R\$ 420.540,15	Valor realizado:		R\$ 210.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
Município de Jardim de Piranhas/RN
Observações:
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para a encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 17 (ex PO 13)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos			
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino - RN			
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 310.000,00

Previsão de Conclusão:	18/06/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 150.000,00

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
---	---

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014		04/04/2014	04/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		06/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		18/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014		26/08/2014	04/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		05/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								30%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00	04/02/2015	04/02/2015	R\$ 5.000,00	100%	Concluído	No valor de R\$ 5.000,00	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00					Cancelado		
	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00					Cancelado		
10	Meta 1		05/12/2014	19/04/2016	R\$ 310.000,00			R\$ 155.000,00	0%	A Iniciar		
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	19/04/2016	R\$ 310.000,00			R\$ 155.000,00	0%	A Iniciar	O Município ajustou o projeto básico.	O plano de trabalho está em fase de ajuste final no Siconv.
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		18/06/2016	18/06/2017					0%	A Iniciar		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/06/2016	18/06/2017					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 310.000,00	Valor realizado:		R\$ 465.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Messias Targino/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014												
(2) O convênio se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015												
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para a encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.												
(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.												
(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015
Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais		Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Contexto de fragilidade socioeconômica em que vivem as populações de pescadores e pescadoras artesanais no município de Goiana-PE. Organização coletiva precária e dependência de atravessadores.			
Projeto:	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE			
Objetivo do projeto:	Promover maior inclusão produtiva dos pescadores e pescadoras, permitindo que tenham maior autonomia sobre o seu trabalho e oferecer um produto com maior valor agregado.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 4	30	534.417,84	539.816,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2016	Convênio Nº 822608/15
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / Caio Rodrigo Dias de Assis / Vera Lúcia Assunção/ SEMAS - Rafael Siqueira
---	---

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
fev/16	377.417,84	5.398,16	382.816,00	Pago até o ano anterior	R\$ -
jun/16	157.000,00		157.000,00	A realizar no exercício	R\$ 534.417,84
TOTAL	534.417,84	5.398,16	539.816,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 534.417,84
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		01/07/2015	06/09/2015		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	01/07/2015	06/09/2015		27/08/2015	27/08/2015		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		27/08/2015	01/10/2015		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		01/10/2015	10/11/2015		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		11/11/2015	24/11/2015		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	30/12/2015		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		30/12/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído		
	Execução (Peso 60%)								0,0%	Em Andamento		
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 377.417,84			R\$ 0,00	0,0%	Em Andamento	A liberação está condicionada ao cumprimento de 04 cláusulas presentes na Conclusão do Parecer Técnico CDT/CGDS à proposta 034583	Cumprimento das cláusulas condicionantes
9	Realizar 03 mapeamentos da cadeia produtiva das comunidades.	SEMAS/PE	01/02/2016	30/04/2016					0,0%	A iniciar	Aguardando o cumprimento das cláusulas supracitadas e consequente liberação dos recursos	
10	Realizar 09 oficinas de capacitação, 03 por comunidade, com cessão de uso às associações dos bens e materiais adquiridos	SEMAS/PE	01/05/2016	31/06/2016					0,0%	A iniciar		
11	Elaborar 03 planos de gestão dos bens adquiridos, 01 por comunidade	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	A iniciar		
11.1	Aquisição dos bens e planejamento de sua gestão comuni	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	A iniciar		
11.2	Construção ou reforma de estrutura física para abrigar os bens adquiridos	SEMAS/PE	01/06/2016	31/08/2016					0,0%	A iniciar		
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	A Iniciar		
15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	R\$ 157.000,00			R\$ 0,00	0,0%	A Iniciar		
16	Realização de 21 visitas técnicas de acompanhamento dos três primeiros meses de	SEMAS/PE	01/09/2016	30/11/2016					0,0%	A Iniciar		
	Encerramento - 20%								0,0%			
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado					0,0%	A iniciar		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	30/12/2016	28/02/2017					0,0%	A iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 534.417,84	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:
SEMAS - Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

PLANO DE AÇÃO 2016			
Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 19
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APLs, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	GND 3	30		

Previsão de Conclusão:	27/12/2016	TED 05/2015 Vigência: 27/11/2016
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira
---	--

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	A realizar no exercício	R\$ -
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 21ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902.	
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	Concluído		
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								6,7%	Em Andamento		
9	Liberação dos recursos	COFC/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído		
10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016					0%	A iniciar		
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016					0%	A iniciar		
12	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	01/05/2016					0%	A iniciar		
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/5/2016	1/5/2016					0%	A iniciar		
14	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	31/7/2016					0%	A iniciar		
15	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2019	1/11/2016					0%	A iniciar		
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/10/2016	1/10/2016					0%	A iniciar		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	27/12/2016					0%	A iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	A iniciar		
Valor Previsto:					R\$ 277.371,58	Valor realizado:		R\$ 277.371,58	26,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
UFPE - Centro de energias renováveis
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
A iniciar	A Iniciar
Concluído	Concluído
Em Andamento	Em Andamento
Atrasado	Atrasado
Cancelado	Cancelado
Paralisado	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 20
Objetivo estratégico:	Aumentar a Competitividade do Setor Produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto	
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste			
Projeto:	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil			
Objetivo do projeto:	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	GND 3	30		

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

Previsão de Conclusão:	27/12/2016	TED Vigência: 27/11/2016
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015			29/06/2015			100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015			12/11/2015			100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015			27/11/2015			100%	Concluído		
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015			02/12/2015			100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								6,7%	Em Andamento		
9	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído		
10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016						A Iniciar		
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016						A Iniciar		
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2016						A Iniciar		
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016						A Iniciar		
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	31/09/2016						A Iniciar		
15	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2019	1/11/2016						A Iniciar		
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016							A Iniciar		

17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	27/12/2016						A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
7	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17						A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 322.110,74	Valor realizado:		R\$ 322.110,74	26,67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º ciclo 2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 18)
Objetivo estratégico:	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil			Ano:	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	Eixo temático (MI):	Assegurar proteção civil		
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Objetivo estratégico (MI):	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres		
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrpogênicos, causando danos e prejuízos às populações.				
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do istema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.				
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordeandores e Subcoordenadores Muniapiis de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Políia Militar e técnicos da EMATER).				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12

Previsão de Conclusão:	09/09/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcelo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito
---	---

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
dez/12	167.999,61	25.421,91	193.421,52	A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
fev/13	60.797,60	--	60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
-	228.797,21	25.421,91	254.219,12	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		100,0%	Concluído		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100,0%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								21,4%	Paralisado		
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100,0%	Concluído		
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50,0%	Paralisado		
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100,0%	Concluído		
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0,0%	Paralisado		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Paralisado		
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60				0,0%	Paralisado		
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0,0%	Paralisado	Processo em tramitação na Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas, para devolução dos recursos financeiros não aplicados.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%			
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	09/09/15					0,0%	Paralisado		
Valor Previsto:					R\$ 228.797,21	Valor realizado:		R\$ 167.999,61	41,4%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
Observações:
Obs.: De acordo com o técnico Marcelo Viana, o projeto será cancelado por dificuldades de execução
1º ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 22
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.				
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE				
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Convênio	857.015,99	965.632,35

Previsão de Conclusão:	30/06/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liquidação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 857.015,99
274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído	
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2014						Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	SEDETEC/SE irá enviar o Relatório atualizado até 29/05/2015, será avaliada a necessidade de se fazer uma visita anterior a prestação de contas, mas de acordo com informações colhidas no SICONV, o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2o Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015		27/07/2015	27/07/2015		100%	Concluído	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015		31/10/2015			0%	Paralisado	Erro no Sistema SICONV impediu que a SEDETEC enviasse a prestação de contas	Foi orientado que o Conveniente registrasse o erro no SICONV. O Conveniente está aguardando a solução do problema.
12	Realização de visita técnica para parecer, se houver inconformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	15/01/2016	30/01/2016					0%	Paralisado	Prestação de contas não enviada devido ao erro do SICONV. A visita técnica só poderá ocorrer após a prestação de contas	Solicitação de solução do problema pelo Conveniente
13	Envio de Relatório de Execução por e-mail	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/03/2016	11/04/2016					0%	A Iniciar	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, foi acordado com a SEDETEC que seria elaborado e enviado por e-mail o relatório técnico final, sem incluir as questões financeiras. Prazos repactuados.	Será solicitado o relatório técnico por e-mail em 04/03/2016
14	Emissão de Laudo Técnico (sem prestação de contas)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	18/03/2016	30/04/2016					0%	A Iniciar	O laudo técnico será para acompanhamento interno e não terá validade perante o SICONV.	
15	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Coordenação de Gestão de Convênios	02/05/2016	30/06/2016					0%	A Iniciar	Este prazo foi prorrogado devido ao erro que ocorreu no SICONV. A SEDETEC abriu chamado no SERPRO para solucionar o erro. Conveniente aguardando a solução para posterior envio da prestação de contas.	
16	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	02/05/2016	30/06/2016					0%	A Iniciar	O prazo para encerramento do convênio deverá ser alterado devido ao erro no SICONV.	
			Valor Previsto:		857.015,99	Valor realizado:		857.015,99	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º ciclo 2016
Houve necessidade de reprogramar este PO, acrescentando novas etapas, tendo em vista os problemas operacionais do SICONV.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.				
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia BioSustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE				
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 1.277.000,00
1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	A realizar no exercício	R\$ 723.000,00
723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 723.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 2.000.000,00

Previsão de Conclusão:	A definir
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014		13/08/2014	13/08/2014		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014		12/11/2014	12/11/2014		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014		17/11/2014	17/11/2014		100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	R\$ 1.277.000,00	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015		27/02/2015	27/02/2015		100%	Concluído		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	R\$ 723.000,00	10/03/2015	23/03/2015	R\$ 723.000,00	100%	Concluído	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro. (Foi liberado com atraso)	
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015					0%	Cancelado	Foi solicitado um aditivo no valor de R\$ 252.045,00, mas a executora decidiu não pedir mais o termo aditivo financeiro, uma vez que conseguiu adenuar o andamento do plano de	
8	Paracer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015					0%	Cancelado		

9	Trâmites burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015				0%	Cancelado	Perseguiu a reprogramação do plano de trabalho ao valor inicial.			
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	A definir	A definir				0%	A Iniciar	Os prazos serão reprogramados tendo em vista que o projeto foi analisado pela Auditoria Interna e o processo ainda está em andamento.			
11	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel, Robson Brandão, Técnico em Química)	A definir	A definir				0%	A Iniciar				
			Valor Previsto:		R\$ 2.000.000,00		Valor realizado:		R\$ 2.000.000,00		66%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
1º ciclo 2016											
Tendo em vista que a servidora Jéssica Rivas pediu exoneração, foram designados para acompanhar a execução deste projeto os servidores Gabriela Isabel e Robson Brandão.											
As linhas 12 e 13 foram retiradas pois não há obrigatoriedade de prestação de contas junto à SUDENE no caso de Termo de Execução Descentralizada											

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 24
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 8902 - Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.				
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordeste.				
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em apoio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	286 e 280	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	1.025.000,00	1.025.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Crôno Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ORÇAO REPASSADOR	ORÇAO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
800.000,00	0,00	Fevereiro/2016	800.000,00	A realizar no exercício	R\$ 1.025.000,00
	0,00		0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	0,00	-	800.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.025.000,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ 800.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 225.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ (1.025.000,00)
				Total Liberado até o exercício	R\$ 800.000,00

Responsáv(e)l(s) técnico(s) pelo Projeto	Unidade	Albertina de Souza Leão Pereira
	Descentralizadora	
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)			Não se aplica				100%	Concluído	A visita técnica foi substituída por reuniões realizadas nas instalações da CGEP nas quais estiveram presentes técnicos da UFPE e da SUDENE.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	03/12/2015	03/12/2015		03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	100%	Concluído		
5	Reunião para programar visitas técnicas e de campo	SUDENE E UFPE	11/03/2016	11/03/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
6	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/03/2016	11/04/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
7	Vistoria de campo	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/04/2016	11/06/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
8	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/05/2016	11/06/2016	R\$ 225.000,00				0%	A Iniciar		
9	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	11/07/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	01/12/2016	01/02/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
11	Emissão de laudo/parecer final	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	01/02/2017	02/05/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 800.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 25 (Ex PO 23)
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.			Ano:	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social		
Finalidade da ação:					
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.				
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal				
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	23/11/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
---	-------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais	Miguel Vieira	09/03/2015	09/04/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído		
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	25/03/2015		100%	Concluído		
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído		
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	02/04/2015		100%	Concluído		
1.4	Relatório Produto 1	Miguel Vieira, com o apoio de José Luis e Marcus Vinícius	30/03/2015	09/04/2015		06/04/2015	09/04/2015		100%	Concluído		
2	Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais	José Luis	10/04/2015	01/06/2015		10/04/2015	16/06/2015		100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/05/2015		10/04/2015	12/05/2015		100%	Concluído		
2.2	Relatório Produto 2	José Luis, com o apoio de Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015		13/05/2015	16/06/2015		100%	Concluído		
3	Produto 3 - Gargalos e Potencialidades do Nordeste por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	16/09/2015		10/04/2015	14/09/2015		100%	Concluído		
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		10/04/2015	27/08/2015		100%	Concluído	Atividade antecipada, em razão de articulação com os governos da Bahia e Pernambuco.	
3.2	Relatórios parciais, por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		05/05/2015	14/09/2015		100%	Concluído	O planejamento inicial previa visita aos estados para execução desta etapa. Devido ao corte de diárias e passagens, esta etapa precisou ser replanejada e, consequentemente, as posteriores	
3.3	Matrizes estaduais e síntese	Marcus Vinícius	09/07/2015	11/09/2015		09/07/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3.4	Matriz regional e síntese	Marcus Vinícius	14/09/2015	16/09/2015		09/07/2015	24/09/2015		100%	Concluído		
4	Produto 4 - Relatório Base para Elaboração de Diretrizes para Regionalização da Política Industrial	Marcus Vinícius, Marina Barbosa, Miguel Vieira e Tássia Germano	31/08/2015	23/09/2015		25/09/2015	29/10/2015		100,0%	Concluído		
4.1	Introdução	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	17/09/2015	18/09/2015		25/09/2015	30/09/2015		100%	Concluído		

4.2	Capítulo 1 - Síntese das três últimas políticas industriais	Marina Barbosa	31/08/2015	04/09/2015		05/10/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
4.3	Capítulo 2 - Síntese dos indicadores da indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	08/09/2015	11/09/2015		19/10/2015	23/10/2015		100%	Concluído		
4.4	Capítulo 3A - Apreciação geral sobre as potencialidades e gargalos nos estados	Marina Barbosa	14/09/2015	18/09/2015		23/10/2015	26/10/2015		100%	Concluído		
4.5	Capítulo 3B - Gargalos e Potencialidas à indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	21/09/2015	23/09/2015		26/10/2015	29/10/2015		100%	Concluído		
4.6	Conclusão	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	24/09/2015	25/09/2015		28/10/2015	29/10/2015		100%	Concluído		
5	Revisão e entrega final	Albertina Pereira	28/09/2015	30/09/2015		29/10/2015	23/12/2015		100%	Concluído	As atividades foram desdobradas para melhor esclarecer o andamento.	
5.1	Revisão	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	28/09/2015	21/11/2015		29/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído		
5.2	Ajustes	Marina Barbosa e Marcus Vinicius	03/11/2015	21/11/2015		18/11/2015	16/12/2015		100%	Concluído		
5.3	Entrega final	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	23/11/2015	23/11/2015		16/12/2015	23/12/2015		100%	Concluído		
			Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícius; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira.
Inclusão de uma atividade do produto 3 em função de maior compreensão do produto via desmembramento de atividade
2º ciclo 2015
Observação para o 3º ciclo: dada a restrição de diárias e passagens, houve a necessidade de readequar o planejamento e execução deste PO
1º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 26
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico		
Finalidade da ação:	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidades responsáveis:	CGEP e CGDS		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestores das subunidades:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.				
Projeto:	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Previsão de Conclusão:	01/02/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Vinicius e Miguel Vieira - CGEP/DPLAN ; Caio de Assis e Renato Vaz (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		100%	Concluído		
2	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído		
4	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								6,0%	Em Andamento		
9	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1: Levantamento etnobotânico	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 76.800,00	18/01/2016			10%	Em Andamento		
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016					0%	A Iniciar		
10.2	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016					0%	A Iniciar		
11	Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 138.000,00				0%	A Iniciar		
11.1	2º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016					0%	A Iniciar		

12	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 373.400,00				0%	A Iniciar		
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016					0%	A Iniciar		
13	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 160.800,00				0%	A Iniciar		
13.1	Visita técnica (oficinas devolutivas)		01/11/2016	03/11/2016					0%	A Iniciar		
14	Apresentação de relatório final	UFPE	01/12/2016	31/12/2016					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	01/01/2017	28/02/2017					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 749.000,00	Valor realizado:		R\$ 749.000,00	26,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º ciclo 2015												

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 27
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2015
Programa:	Ação interna	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti Albertina Souza Leão		
Problema (causa):	A inexistência de base de dados geográficos estruturada, que possibilite integrar espacialmente as informações entre as áreas desta Superintendência; A criação, pelo Ministério da Integração Nacional, do Observatório do Desenvolvimento Regional – ODR, que necessita de informações georreferenciadas das autarquias vinculadas; A carência de informações geográficas estruturadas para suporte à tomada de decisões sobre os problemas existentes na área de atuação da SUDENE; O interesse da SUDENE em colaborar com criação de tal base de dados geográficos estruturada, que permitirá a implantação de um Núcleo de Geoprocessamento, já expressamente manifestada, bem assim de fazer uso efetivo desta.				
Projeto:	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE				
Objetivo do projeto:	Elaborar relatório conclusivo contendo a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	04/03/2016
Data Atualização:	09/03/2016

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado
	Robson Brandão

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	-
A realizar no exercício	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	-
Valor Empenhado no Exercício	-
Valor liberado no Exercício	-
Saldo a liberar	-
Saldo a Empenhar no exercício	-
Total Liberado até o exercício	-

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração da Resolução do GTGEO	Ludmilla e Robson	01/09/2015	14/09/2015	-	01/09/2015	14/09/2015	-	100%	Concluído		
2	Aprovação da Resolução pela Diretoria Colegiada	GTGEO	15/09/2015	19/09/2015	-	23/09/2015	23/09/2015	-	100%	Concluído		
3	Publicação da Resolução no Boletim Interno	CGEP	20/09/2015	23/09/2015	-	03/11/2015	03/11/2015	-	100%	Concluído		
4	Primeira Reunião do GTGEO	GTGEO	25/09/2015	29/09/2015	-	04/11/2015	04/11/2015	-	100%	Concluído		
5	Elaboração do 1º Relatório sobre o Plano Cartográfico da SUDENE 1960-1990	Ludmilla e Robson	30/09/2015	04/10/2015	-	05/11/2015	10/11/2015	-	100%	Concluído		
6	Reunião de trabalho para validação do 1º relatório	GTGEO E CGEP	05/10/2015	14/10/2015	-	11/11/2015	11/11/2015	-	100%	Concluído		
7	Segunda Reunião do GTGEO	GTGEO	15/10/2015	19/10/2015	-	12/11/2015	15/11/2015	-	100%	Concluído		
8	Elaboração do 2º Relatório sobre o Quadro atual da Cartografia na SUDENE (1990-2015)	Ludmilla e Robson	20/10/2015	24/10/2015	-	16/11/2015	08/12/2015	-	100%	Concluído		
9	Reunião de trabalho para validação do 2º relatório	GTGEO E CGEP	25/10/2015	30/10/2015	-	09/12/2015	09/12/2015	-	100%	Concluído		
10	Terceira Reunião do GTGEO	GTGEO	01/11/2015	14/11/2015	-	10/12/2015	10/12/2015	-	100%	Concluído		
11	Solicitação de prorrogação do Prazo do GTGEO	GTGEO	21/12/2015	23/12/2015	-	21/12/2015	23/12/2015	-	100%	Concluído	Prazo estendido até 21/02/2016	
12	Elaboração do 3º Relatório: proposta de implantação do núcleo de geoprocessamento na SUDENE	GTGEO	15/12/2015	12/02/2016	-	15/12/2015	12/02/2016	-	100%	Concluído		
13	Reunião de trabalho para validação do 3º relatório	GTGEO	11/02/2016	16/02/2016	-	12/02/2016	16/02/2016	-	100%	Concluído		
14	Ajustes e correções finais do relatório	GTGEO	16/02/2016	19/02/2016	-	16/02/2016	19/02/2016	-	100%	Concluído		
15	Entrega do Relatório à Diretoria Colegiada	GTGEO	22/02/2016	22/02/2016	-	22/02/2016	22/02/2016	-	100%	Concluído		
16	Aprovação do Relatório Final pela Diretoria Colegiada	GTGEO	22/02/2016	04/03/2016	-			-	0%	Atrasado	Aguardando o processo entrar na pauta para a próxima reunião da Diretoria Colegiada.	
			Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	94%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:		PO 28
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				Ano:		2015
Programa do PPA:	Ação interna			Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna			Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:							
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Prover os agentes públicos e privados de informações regionais, objetivando subsidiar planos e programas para o Nordeste.						
Projeto:	Nordeste em Números 2015						
Objetivo do projeto:	Sistematizar um conjunto de informações sócio-econômicas referente à região Nordeste e estados que a compõem, atualizando a versão anterior do Nordeste em Números 2011.						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	18/04/2016
Data Atualização:	05/02/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Gabriela Isabel Limoeiro Alves Nascimento / José Luis Alonso
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Coleta de dados	José Luis	10/09/2015	10/11/2015		10/09/2015	10/11/2015		100%	Concluído	Algumas informações apresentadas no Nordeste em Números 2011, não estavam mais disponíveis.	
2	Tabulação e crítica dos dados coletados	Gabriela Isabel / José Luis	10/11/2015	24/11/2015		10/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído		
3	Elaboração de Gráficos e Mapas	Gabriela Isabel / José Luis	24/11/2015	08/12/2015		24/11/2015	08/12/2015		100%	Concluído		
4	Confecção da publicação (Parte I - capítulo 1 a 9)	Gabriela Isabel / José Luis	08/12/2015	22/12/2015		08/12/2015	18/12/2015		100%	Concluído		
5	Confecção da publicação (Parte II - capítulo 10 a 18)	Gabriela Isabel / José Luis	22/12/2015	15/01/2016		18/12/2015	15/01/2016		100%	Concluído		
6	Revisão do documento	Gabriela Isabel / José Luis	15/01/2016	19/02/2016		15/01/2016	19/02/2016		100%	Concluído	Durante a revisão do documento, observou-se a necessidade de acrescentar mais informações relativas ao Semiárido e a características hidrológicas.	
7	Ajustes após revisão	Gabriela Isabel / José Luis	19/02/2016	18/03/2016		19/02/2016			20%	Em Andamento	Acrescentada uma etapa para adequação dos ajustes do documento, que não tinham sido previstos.	
8	Revisão da formatação final/Layout	ASCOM	18/03/2016	18/04/2016					0%	A Iniciar	O cronograma das atividades foi alterado em virtude da inclusão de nova etapa.	
9	Normatização	Biblioteca	18/04/2016	22/04/2016					0%	A Iniciar		
10	Publicação no site	ASCOM	22/04/2016	29/04/2016					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					R\$ -	Valor realizado:			R\$ -	62,0%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 29
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - NE	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035			
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicosocial e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	Descentralização	500.000,00	

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
SUDENE	IFPB			A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
500.000,00	0,00		500.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
500.000,00	0,00	-	500.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	
Data Atualização:	07/03/2016

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Unidade Descentralizadora	Anita Rozenblit
	Unidade Descentralizada	Maíara Souza Melo - IFPB

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Articulação para elaboração do Termo de Execução Descentralizada - TED	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	15/05/2015	10/12/2015		15/05/2015	10/12/2015		100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico de Campina Grande/PB	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E IFPB	10/12/2015	18/12/2015		10/12/2015	18/12/2015		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/12/2015	21/12/2015		21/12/2015	21/12/2015		100%	Concluído		
4	Descentralização do crédito e a Transferência do limite orçamentário	CGAF/COCF	24/12/2015	24/12/2015		24/12/2015	24/12/2015		100%	Concluído	R\$ 500.000,00	
5	Reunião com IFPB e a empresa contratada para elaboração do Plano a partir do diagnóstico. Solicitar ajustes no cronograma de execução do Plano de Trabalho.	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	26/02/2015	26/02/2015		26/02/2015	26/02/2015		100%	Concluído	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado	
6	Reunião (em João Pessoa): Apresentação do projeto técnico da Macroplan e o ajuste do cronograma do Plano de trabalho.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	21/03/2016	21/03/2016					0%	A Iniciar		
7	Liberação da 1ª parcela	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	02/04/2016	30/04/201	R\$ 500.000,00				0%	A Iniciar	Previsão de liberação da 1 parcela no mês de abril de 2016.	
8	Produto 1: Aprofundamento da Visão de Futuro da Cidade de Campina Grande 2015 (construída na fase de diagnóstico) - Emissão de parecer do Relatório do Produto 1	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado	
9	Produto 2: Construção da Visão de futuro Complexo Aluísio Campos - Emissão de parecer do Relatório do Produto 2	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado		
10	Produto 3: Desenho urbano conceitual da cidade de Campina Grande e conexões com os municípios do entorno - Emissão de parecer do Relatório do Produto 3	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado		
11	Produto 4: Visão de Futuro: desafios, estratégias e metas - Emissão de parecer do Relatório do Produto 4	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado		
12	Produto 5: Realização de seis oficinas de reflexão estratégica, uma em cada município envolvido - Parecer sobre os resultados das oficinas	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado		
13	Produto 6: Pesquisa de opinião pública via internet - Emissão de parecer do Relatório do Produto 6	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado		

14	Produto 7: Realização de Concurso sobre o tema "Campina do Futuro", junto à estudantes do 1 e 2 graus - Parecer sobre resultados do concurso	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado	
15	Produto 8: Transferência Institucional do Portal 2035 e canais de acompanhamento do projeto pela sociedade e incorporação de propostas de outras fontes (blogs, redes sociais, debates e mídias sociais) - Parecer sobre resultados	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	01/01/2016	29/02/2016					0%	Paralisado	
12	Parecer final de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Anita Rozenblit)	01/03/2016	11/03/2016					0%	Paralisado	
13	Revisão	DPLAN (Lautemyr Canel)	14/03/2016	16/03/2016					0%	Paralisado	
			Valor Previsto:		R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	29%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 30
Objetivo estratégico:	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	-				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14				
Projeto:	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB				
Objetivo do projeto:	Publicação de um capítulo em um artigo do IPEA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	06/03/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannell
--	------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Realizar resumo sobre o artigo da UAB	Gabriela Lins, Gabriela Nascimento, Marina Barbosa, Tássia Germano.	17/02/2016	19/02/2016		17/02/2016	18/02/2016		100%	Concluído		
2	Adaptação do Relatório UAB para formato de Capítulo para livro do IPEA	Gabriela Lins, Gabriela Nascimento, Marina Barbosa, Tássia Germano.	17/02/2016	02/03/2016		17/02/2016	02/03/2016		100%	Concluído		
3	Envio para Coordenação	Frederico/Lautemyr	02/03/2016	03/03/2016					0%	A Iniciar		
4	Normatização pela biblioteca	Juçara	03/03/2016	05/03/2016					0%	A Iniciar		
5	Envio para Ascom	Mariana Melcop	06/03/2016	08/03/2016					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	40,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos			Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	2.1-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido			Ano:	2013
Programa do PPA:	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO			Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Sérgio Alencar			Gestor da subunidade:	George Meireles
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social				
Projeto:	Programa Água para Todos				
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/17
Data Atualização:	22/03/2016

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.878.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.048.000,00
Saldo a liberar	R\$ 3.448.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 16.926.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/2013	26/09/2013		01/09/2013	02/09/2013		100%	Concluído		
2	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/2013	02/10/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
3	Abertura e Instrução dos Processos	GTAPT	01/09/2013	09/09/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
4	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/2013	23/12/2013		01/10/2013	01/10/2013		100%	Concluído		
5	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/2014	30/01/2014		01/11/2013	01/12/2013		100%	Concluído		
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/2014	30/05/2014		01/04/2014	01/05/2014		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.	
7	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014		02/04/2014	02/05/2014		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram êxito para empenho.	Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014	R\$ 8.658.000,00	01/04/2014	01/05/2014	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.	Um município do estado do Piauí foi empenhado, mas não se habilitou para o recebimento da primeira parcela.
9	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/2015	31/07/2015		01/03/2015	31/07/2015		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas as solicitações de Ofícios.	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.
10	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015			50%	Atrasado	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT nº 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP nº 01/2016.

11	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015			50%	Atrasado	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	01/02/2016		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/2015	03/12/2015		01/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/2015	04/12/2015		03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	
15	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/2015	01/05/2016	R\$ 34.632.000,00	01/12/2015		R\$ 9.048.000,00	58%	Em Andamento	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N°	Com o valor descentralizado até momento a SUDENE continuará
16	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/2016	01/10/2016		01/02/2016			2%	Em Andamento		
17	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/2015	01/10/2016		10/12/2015			2%	Em Andamento		
18	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	30/09/2016	30/11/2016					0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/12/2016	01/02/2017					0%	A Iniciar		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/12/2016	01/02/2017					0%	A Iniciar		
21	Encerramento do PAPT	FTAPT	01/02/2017	30/06/2017					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:			R\$ 43.290.000,00			Valor realizado:			R\$ 16.926.000,00	64,9%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progrmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progrmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.												
Observações:												
1º Ciclo 2016												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberção 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberção 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberção inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberção 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberção 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberções concluídas para o Módulo I. Liberção parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberção. (Vide obs4).	Liberção parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		3.876.491.700,00		3.065.105.668,00	77,78%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	--	------------------	--	------------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)./ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)				
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	28/12/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.593.233.020,25
A realizar no exercício	R\$ 365.766.979,75
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 206.991.566,24
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 158.775.413,51
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.800.224.586,49

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	158.775.413,51	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	01/07/16	1.954.000.000,00	24/10/13	-	1.800.224.586,49	89%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									94%	Em Andamento		

15	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 1.954.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.800.224.586,49	81,25%	Em Andamento	Status do Projeto			
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------	--	--	--

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.												
Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.												
Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.												
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.												
Obs.6 A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador.												

Fonte: Fonte: CGG/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 34 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão:	01/03/2010
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	A Iniciar	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 35 (ex PO 30)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	27/09/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 53.576.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.477.417,63
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/16	31/03/16	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/03/16	31/03/16	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	0%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									50%	Em Andamento		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 53.576.481,00			Valor realizado: 42.477.417,63			57,14%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB e
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 36 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			59.700.000,00	Valor realizado:			80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 37 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	13/09/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87
A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 54.900.000,00			Valor realizado: 54.900.000,00			80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 38 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísia I Geração e Comercialização de Energia Ltda				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:	28/10/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2		01/04/16	01/05/16	496.137,41	-	-		0,00%	Em Andamento	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/16	64.439.000,00	15/05/13	-	63.942.862,59	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		63.942.862,59	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 39 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	28/10/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/04/16	01/05/16	428.678,72	-	-		0,00%	Em Andamento	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/16	59.864.000,00	15/05/13	-	59.435.321,28	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.435.321,28	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 40 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	28/10/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$ 429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/04/16	01/05/16	429.090,12	-	-		0,00%	Em Andamento	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/16	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 55.278.000,00			Valor realizado: 54.848.909,88			70,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 41 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísca IV Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	27/09/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/03/16	31/03/16	1.056.552,40	-	-		0,00%	Em Andamento	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/16	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	54.216.447,60	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:								
Observações:								
1º Ciclo 2016								
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.								
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 42 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Faísca V Geração e Comercialização de Energia LTDA				
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	09/03/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 64.455.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.455.000,00

Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 64.455.000,00			Valor realizado: 64.455.000,00			80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 43 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

	Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	33.900.000,00	Valor realizado:	33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:								
Observações:								
1º Ciclo 2016								
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.							
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.							
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 44 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão:	13/08/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39
A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 3.213.914,61
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05//13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05//13	31/05/13		22/05/13	24/0513		100,00%	Concluído		
7	Liberação1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2016

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
- Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
- Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 45 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	08/02/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Joema/J.Emerson/A .F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:									
Observações:									
1º Ciclo 2016									
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.								
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 46 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Previsão de Conclusão:	29/05/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		40.845.410,40	Valor realizado:		40.845.410,40	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 47 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	19/05/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(e) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução N° 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 48 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	19/05/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 53.959.000,00			Valor realizado: 53.959.000,00			80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 49 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Previsão de Conclusão:	27/09/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ 3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	0,00
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/16	31/03/16	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Em Andamento	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/03/16	99.970.000,00	22/05/13	-	96.407.194,96	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	99.970.000,00	Valor realizado:	96.407.194,96	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 50 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP				
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	29/07/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 269.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ 33.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 33.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 269.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.130.259,94	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	3.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/01/16	303.000.000,00	19/04/13	-	269.869.740,06	67%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		303.000.000,00	Valor realizado:		269.869.740,06	63,64%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 51 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)				
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	29/03/2019
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 108.616.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 270.582.240,00			Valor realizado: 30.000.000,00			22,73%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 52 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.			
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	28/10/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	29/02/2016	

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	03/11/15	03/12/15	4.037.814,18	03/11/15	-	-	50,00%	Atrasado	Pedido de liberação em análise.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	01/05/16	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	70%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									85%	Em Andamento		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	23.855.042,00	Valor realizado:	19.539.983,88	65,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 53 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Deten Química S.A.				
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	30/01/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	30/12/15	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	29%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									64%	Atrasado		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		31.256.000,00	Valor realizado:		15.447.600,00	41,67%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 54 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.				
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	23/12/2014
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			61.867.350,00	Valor realizado:		61.867.350,00	66,67%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGG/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Cone Multicenter Ltda				
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 177.367.554,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		191.238.424,00	Valor realizado:		0,00	28,57%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 56 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MJ):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MJ):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão:	18/02/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 50.000.000,00			Valor realizado: 50.000.000,00			71,43%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 57 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 963.665.191,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.075.935.159,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Casimiro SUDENE/DGF)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			19/12/13	06/07/14	0,00	19/12/12	27/06/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Atrasado	Minuta de contrato enviada ao Banco.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/06/14	31/07/17	1.075.935.159,00	16/05/14	-	0,00	6%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		

12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		1.075.935.159,00	Valor realizado:		0,00	26,92%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 58 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão:	29/06/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 178.622.724,54
A realizar no exercício	R\$ 177.924.928,79
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 59.034.909,19
Saldo a liberar	R\$ 177.924.928,79
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 237.657.633,73

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	4.332.162,07	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação.	
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/06/16	01/07/16	85.917.582,77	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	87.675.183,95	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/16	415.582.562,52	21/02/14	-	237.657.633,73	57,14%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									78,57%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 237.657.633,73	58,33%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	--------------------	------------------	--------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs3:	A sudene está aguardando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Cone S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

Previsão de Conclusão:	29/08/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-		-	-	0,00%	A Iniciar	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	autorizado a prorrogação do prazo de contratação pela Sudene até 15/12/15.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	00/01/00	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Competência da SUDENE /Banco									50,00%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		R\$	123.186.471,03	Valor realizado:		R\$	-	21,43%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 60 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Iraeta Brasil S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de flanges eólicas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	34.102.182,00	89.861.866,00

Previsão de Conclusão:	28/04/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 34.102.182,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 34.102.182,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 34.102.182,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 34.102.182,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			07/10/14	27/09/15	0,00	07/10/14	23/09/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	26/01/16	-	-	-	-	50,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	Autorizado a prorrogação do prazo de contratação pelo BB até 26/01/2016.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/09/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									62,50%	Em Andamento		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 34.102.182,00	Valor realizado:		R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
1º Ciclo 2016
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 61 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Sauípe S/A		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	68.299.987,00	193.893.821,06

Previsão de Conclusão:	30/07/2018
Data Atualização:	29/02/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 68.299.987,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 68.299.987,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 68.299.987,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vilaça/Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	09/10/14	08/11/14	-	09/10/14	30/10/14	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/05/15	22/10/15	-	25/05/15	26/10/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	26/10/15	25/11/15	-	26/10/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 231/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			09/10/14	25/11/15	0,00	09/10/14	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	10.133.063,55	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	16.330.175,83	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	6.085.184,11	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	12.766.884,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/04/17	01/05/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/10/17	31/10/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	5.731.169,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/01/18	68.299.987,00	-	-	0,00	5,56%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									52,78%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 68.299.987,00	Valor realizado:		R\$ -	25,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 57)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.				
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão:	28/06/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 39.800.940,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 39.800.940,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 39.800.940,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	-	0,00	25,00%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									62,50%	Em Andamento		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
1º Ciclo 2016	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO 63	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):							
Projeto:	Braskem S/A						
Objetivo do projeto:	Modernização do Centro de Petroquímicos Básicos.						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	188.283.235,00	418.407.190,00

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 188.283.235,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 188.283.235,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Austricínio (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 241/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/02/15	31/01/16	0,00	03/02/15	11/02/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	188.283.235,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/02/16	31/07/16	188.283.235,00	17/02/16	-	0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									62,50%	Em Andamento		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 188.283.235,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--------------------	------------------	-------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º Ciclo 2016												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 64
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S/A				
Objetivo do projeto:	Modernização das unidades industriais de vinílicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	62.999.857,00	139.999.682,00

Previsão de Conclusão:	27/01/2017
Data Atualização:	29/02/2016

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 62.999.857,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 62.999.857,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	03/02/15	05/03/15	-	03/02/15	26/02/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	04/08/15	01/01/16	-	04/08/15	28/12/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	01/01/16	31/01/16	-	12/01/16	11/02/16	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 242/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/02/15	31/01/16	0,00	03/02/15	11/02/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/02/16	16/06/16	-	17/02/16	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	188.283.235,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			17/02/16	31/07/16	188.283.235,00	17/02/16	-	0,00	25,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									62,50%	Em Andamento		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 188.283.235,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------	--------	--------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2015	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 65 (ex PO 61)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2013
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI			Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade			Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.				
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Responsável :	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)			Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.				
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE (Mapeamento Experimental da atividade CONVÊNIOS)				
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	1	90	0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	29/04/2016
Data Atualização:	22/03/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Barreiros, Carmen Lúcia Couto Fonseca e Vinicius Almeida Vieira (CGGI)
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído		
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	
3	Reunião com unidades internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.	
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explanção sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14	-	11/09/14	11/09/14	-	100%	Concluído		
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14	-	11/09/14	18/09/14	-	100%	Concluído		
6	Seleção da área a ser mapeada	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15	26/03/15	-	100%	Concluído	Foi escolhido o tema "convênios"	
7	Definição da Metodologia	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	12/06/15	12/06/15	-	12/06/15	12/06/15	-	100%	Concluído		
8	Ajuste/revisão a minuta de portaria	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	10/06/15	18/06/15	-	10/06/15	18/06/15	-	100%	Concluído		
9	Revisão do projeto de GESTÃO DE PROCESSOS e elaboração versão final com base na metodologia escolhida.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	12/06/15	19/06/15	-	100%	Concluído		
10	Preparar Material a ser distribuído aos interlocutores	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	20/08/15	20/08/15	-	100%	Concluído		
11	Reunião com representante das unidades envolvidas no processo "convênios" (CGGI; CGDS/DPLAN; CGEP/DPLAN; AUD; CGC-CPTCE; COC/CGAF) para tratar das orientações que irão nortear o mapeamento das atividades/ Início dos trabalhos e início do mapeamento na temática "Convênios".	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	21/08/15	21/08/15	-	21/08/15	21/08/15	-	100%	Concluído	É importante que o servidor indicado seja mantido no trabalho até o seu final.	

12	Acompanhamento dos trabalhos com os interlocutores envolvidos no convênio, para elaboração e conclusão das entrevistas	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	24/08/15	30/09/15	-	24/08/15	30/09/15	-	100%	Concluído	Agendado quartas-feiras pela manhã (9h-11h)	
13	Trabalhos internos do grupo de processos relativo ao processo de convênios	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	01/11/15	29/04/16		01/11/15			19%	Em Andamento		
13.1	Elaboração do mural de sub-processos adotados por cada unidade e consolidação em um fluxo único sobre a realidade	Manoel Barreiros, Vinicius Oliveira e Carmen Fonseca (CGGI)	21/10/15	23/10/15		21/10/15	23/10/15		100%	Concluído		
13.2	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela Coordenação de convênios e Tomada de Contas Especial (CGC/DAD) e retorno à CGGI	Heber Nunes (DAD/CGC)	05/11/15	10/11/15		05/11/15			50%	Atrasado	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.3	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGDS/DPLAN e retorno à CGGI	Marcelo Viana (CGDS)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.4	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGEP/DPLAN e retorno à CGGI	Frederico Cavalcanti e Joyce Queiroz (CGEP/DPLAN)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.5	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGAF/COC e retorno à CGGI	Brivaldo Soares e Eva (CGAF/COC)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.6	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela AUD e retorno à CGGI	Taciana e Lúcio Flávio (AUD)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.7	Elaboração da proposta de um novo fluxo de convênios	Vinicius Vieira e Manoel Barreiros (CGGI)	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
13.8	Reunião com as unidades que integram o processo de convênios para discussão da proposta, aperfeiçoamento e consolidação	Manoel Barreiros (CGGI)	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
14	Apresentação, para o Superintendente e Diretores, dos resultados do mapeamento do Processo "Convênio".	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE) GAB Diretoria Colegiada	29/04/16	29/04/16	-			-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:			0,00		Valor realizado:		0,00		87%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Auditoria interna; Coordenação-Geral de Logística, Administração e Finanças/DAD; Coordenação de Gestão de Convênios/DAD; Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente/DPLAN e Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação/DPLAN.

Observações:

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

1º Ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão e Coordenação de Gestão de Processos de Desenvol. Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CPA e CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 66
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2016
Sub-objetivo:	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.				
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão				
Unidade Responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional		
Responsável:	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros		
Problema (causa):	Mudanças no Decreto nº 8.276, de 27/06/14, feitas pelo Decreto nº 8.679, de 22/02/2016, reduziu 9 cargos comissionados, afetando o funcionamento de algumas unidades da estrutura organizacional da SUDENE.				
Projeto:	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada.				
Objetivo do projeto:	Adequar, até 13/06/2016, o atual RI da SUDENE aos cortes estabelecidos pelo Decreto nº 8.679/2016, sancionado em 22/02/2016 e publicado no DOU em 23/02/2016.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -

Previsão de Conclusão:	13/06/2016
Data Atualização:	18/03/2016

Responsáv(e)l(s) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca
---	----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião com as unidades internas para a apresentação da metodologia e dos encaminhamento necessários (prazos e produtos esperados) para a adequação do Regimento interno vigente aos cortes.Espaço Cultural Celso Furtado - 8º andar, sala 01-Ala Norte, 9h30	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/03/16	01/03/16	-	01/03/16	01/03/16	-	100,0%	Concluído	Os novos ajustes do RI da SUDENE terão como base a Resolução da DC nº 230 que aprovou o RI em 2015, bem como, o Decreto nº 8.276/14, o Decreto nº 8.679/2016 que estabeleceu cortes na estrutura de cargos daquele Decreto, ademais das contribuições das unidades. Além disso os efeitos do Decreto nº 8.679/2016 começam vinte e um dias após a sua publicação. Ou seja, 15/03/16.	
2	Análise das unidades e encaminhamento das propostas de ajuste	Gestores das unidades internas	01/03/16	18/03/16					0,0%	Atrasado	Devido ao pouco tempo e escassez do quadro da CGGI não haverá prorrogação.	
3	Análise interna do impacto das propostas de ajuste às atribuições vigentes no Regimento interno.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	21/03/16	05/04/16					0,0%	A Iniciar		
4	Montagem da primeira minuta e envio às unidades para apreciação	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	06/04/16	08/04/16					0,0%	A Iniciar		
5	Retorno das unidades internas	Gestores das unidades internas	12/04/16	12/04/16					0,0%	A Iniciar		
6	Reunião presencial com as unidades e ultimos ajustes, conforme o caso.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	13/04/16	19/04/16					0,0%	A Iniciar		
7	Análise da alteração do siglário das unidades da Sudene.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	20/04/16	22/04/16					0,0%	A Iniciar		
8	Envio da proposta do RI ajustado à Procuradoria da SUDENE para análise da proposta.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/04/16	25/04/16					0,0%	A Iniciar		
9	Retorno da Procuradoria da SUDENE	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	09/05/16	09/05/16					0,0%	A Iniciar		
10	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	09/05/16	20/05/16					0,0%	A Iniciar		

11	Envio da proposta aos Diretores para análise.	Manoel Barreiros (CGGI)	20/05/16	20/05/16					0,0%	A Iniciar		
12	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/05/16	30/05/16					0,0%	A Iniciar		
13	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/06/16	01/06/16					0,0%	A Iniciar		
14	Ajustes complementares conforme e se for o caso.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	02/06/16	08/06/16					0,0%	A Iniciar		
15	Publicação no DOU e Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	13/06/16	13/06/16					0,0%	A Iniciar	Prazo limite (90 dias contados do início dos efeitos do Decreto nº 8.679/2016).	
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:			6,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Unidades Administrativas internas.
Observações:
1º Ciclo 2016

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 67 (ex PO 62)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2016
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Assessoria Técncia de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial		
Diretor:	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/02/2016

Colocar a data do último contato.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Processo nº 03057.000018/96-15 (SIAFI n.º 317428), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/12/2014	06/01/2015	ñ se aplica	15/12/2014	06/01/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
2	Processo nº 03045.000086/99-19 (SIAFI n.º 383890), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/12/2014	14/01/2015	ñ se aplica	22/12/2014	14/01/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo nº 03055.000006/97-17 (SIAFI n.º 321499), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2015	08/01/2015	ñ se aplica	02/01/2015	08/01/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2015	17/01/2015	ñ se aplica	02/01/2015	17/01/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo nº 59335.000705/2010-78 (SIAFI n.º 750323), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/02/2015	12/02/2015	ñ se aplica	02/02/2015	19/02/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo nº 59335.000172/2010-24 (SIAFI n.º 737121), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/02/2015	27/02/2015	ñ se aplica	13/02/2015	27/02/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
7	Processo nº 03054.000032/97-19 (SIAFI n.º 339202), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	16/02/2015	24/02/2015	ñ se aplica	16/02/2015	24/02/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59333.000214/04-07 (SIAFI n.º 517207), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/02/2015	06/03/2015	ñ se aplica	20/02/2015	06/03/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 59333.000181/2005-78 (SIAFI n.º 538618), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	26/02/2015	12/03/2015	ñ se aplica	26/02/2015	12/03/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
10	Processo nº 59313.000007/00-59 (SIAFI n.º 403449), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/03/2015	17/03/2015	ñ se aplica	02/03/2015	17/03/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 542944), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	05/03/2015	02/04/2015	ñ se aplica	05/03/2015	16/03/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59335.000577/2009-29 (SIAFI n.º 716701), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/03/2015	02/04/2015	ñ se aplica	19/03/2015	02/04/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
13	Processo nº 59335.000445/09-05 (SIAFI n.º 707420), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/04/2015	18/04/2015	ñ se aplica	04/04/2015	18/04/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo nº 03057.000012/98-17 (SIAFI n.º 368220), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	06/04/2015	20/04/2015	ñ se aplica	06/04/2015	20/04/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
15	Processo nº 59335.000449/2009-85 (SIAFI n.º 707430), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	10/04/2015	17/08/2015	ñ se aplica	15/04/2015	17/08/2015	ñ se aplica	100%	Concluído	O convênio precisou: a) mudança de status (A) para mudança de status. Devolvido em 24/04. b) Remetido à PRD em 25/05/2015.	a) remetido à COCF em 20/04 para mudança de status. Devolvido em 24/04. b) Remetido à PRD em 25/05/2015.
16	Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 744654), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	10/04/2015	15/04/2015	ñ se aplica	10/04/2015	15/04/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo nº 03057.000018/96-15 (SIAFI n.º 317428), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	05/05/2015	19/05/2015	ñ se aplica	05/05/2015	19/05/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/05/2015	18/06/2015	ñ se aplica	13/05/2015	18/06/2015	ñ se aplica	100%	Concluído	detectada ausência de laudo técnico em 03/06/2015.	remessa à CGDS para emissão de laudo técnico em 03/06/2015. Retorno da CGDS em 10/06.

19	Processo nº 59335.000211/2010-93 (SIAFI n.º 744427), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/05/2015	28/05/2015	ñ se aplica	13/05/2015	30/05/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
20	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/06/2015	15/06/2015	ñ se aplica	08/06/2015	15/06/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
21	Processo nº 03057.000036/97-96 (SIAFI n.º 337849), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/06/2015	05/08/2015	ñ se aplica	08/06/2015	05/08/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		Processo em conciliação na CJU/RN
22	Processo nº 03054.000027/98-51 (SIAFI n.º 770860), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	11/06/2015	26/06/2015	ñ se aplica	11/06/2015	22/10/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
23	Processo nº 59335.000211/2010-93 (SIAFI n.º 744427), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/06/2015	11/08/2015	ñ se aplica	22/06/2015	11/08/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
24	Processo nº 59335.000293/2012-76 (SIAFI n.º 746462), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/06/2015	14/08/2015	ñ se aplica	22/06/2015	14/08/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
25	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	09/07/2015	24/08/2015	ñ se aplica	09/07/2015	29/09/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
26	Processo nº 59313.000029/2000-19 (SIAFI n.º 402702), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	24/07/2015	08/08/2015	ñ se aplica	24/07/2015	23/09/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
27	Processo nº 59333.000214/2004-07 (SIAFI n.º 517207), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/08/2015	09/09/2015	ñ se aplica	25/08/2015	13/10/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
28	Processo nº 59333.000181/2005-78 (SIAFI n.º 538618), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/08/2015	09/09/2015	ñ se aplica	25/08/2015	09/10/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
29	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/08/2015	28/08/2015	ñ se aplica	25/08/2015	28/08/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
30	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	28/09/2015	13/10/2015	ñ se aplica	28/09/2015	16/11/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
31	Processo nº 59335.000210/2012-19 (SIAFI n.º 770860), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/10/2015	23/10/2015	ñ se aplica	08/10/2015	22/10/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
32	Processo nº 03054.000027/98-51 (SIAFI n.º 368547), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/10/2015	23/10/2015	ñ se aplica	08/10/2015	06/11/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
33	Processo nº 59335.000211/2010-93 (SIAFI n.º 744427), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	14/10/2015	29/10/2015	ñ se aplica	14/10/2015	10/11/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
34	Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	28/10/2015	12/11/2015	ñ se aplica	28/10/2015	20/11/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
35	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	29/10/2015	13/11/2015	ñ se aplica	29/10/2015	29/09/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
36	Processo nº 03054.000027/1998-51 (SIAFI n.º 770860), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	06/11/2015	21/11/2015	ñ se aplica	06/11/2015	17/11/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
37	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	27/11/2015	12/12/2015	ñ se aplica	27/11/2015	25/01/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
38	Processo nº 59335.000293/10-76 (SIAFI n.º 746462), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	27/11/2015	12/12/2015	ñ se aplica	27/11/2015	04/12/2015	ñ se aplica	100%	Concluído		
39	Processo nº 59335.000175/2012-20 (SIAFI n.º 769473), Aprovação de Relatório de Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/01/2016	19/01/2016	ñ se aplica	04/01/2016	04/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído		
40	Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/01/2016	03/02/2016	ñ se aplica	19/01/2016	20/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído		
41	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/01/2016	05/02/2016	ñ se aplica	21/01/2016	26/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
1º ciclo 2016 - Jan/2015 a Fev/2016	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 68 (ex PO 63)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2016
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial		
Diretor:	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	29/02/2016

Colocar a data do último contato.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000329/2013-64, Ref. Conv. SIAFI n.º 383689 (Processo n.º 03045.000074/99-21) - Emissão de Relatório de TCE nº 001/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	17/08/2014	13/02/2015	N/A	17/08/2014	13/02/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 25/02/2015 (Ofício n.º 049/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
2	Processo TCE n.º 59335.000324/2013-31, Ref. Conv. SIAFI n.º 383671 (Processo n.º 03045.000061/99-80) - Emissão de Relatório de TCE nº 002/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	17/08/2014	13/02/2015	N/A	17/08/2014	13/02/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 27/02/2015 (Ofício n.º 051/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
3	Processo TCE n.º 59335.000584/2013-15, Ref. Conv. SIAFI n.º 365635 (Processo n.º 03050.000045/98-09) - Emissão de Relatório de TCE nº 003/2015	Rivaldo Alves, Eliane Acioly (CPTCE)	27/08/2014	23/02/2015	N/A	27/08/2014	23/02/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 09/03/2015 (Ofício n.º 0612015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
4	Processo TCE n.º 59335.000586/2013-04, Ref. Conv. SIAFI n.º 767395 (Processo n.º 59335.000373/2011-11) - Emissão de Relatório de TCE nº 004/2015	Heber Nunes, Rivaldo Alves (CPTCE)	06/09/2014	05/03/2015	N/A	06/09/2014	05/03/2015	N/A	100%	Concluído	TCE encerrada por saneamento de pendência (remessa de prestação de contas e devolução do saldo do convênio). Arquivamento autorizado no item "g" da 191ª Ata da Diretoria Colegiada da SUDENE	
5	Processo TCE n.º 59335.000257/2011-93, Ref. Conv. SIAFI n.º 135783 (Processo n.º 06270.000005/95-64) - Emissão de Relatório de TCE nº 005/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	27/11/2014	26/05/2015	N/A	27/11/2014	26/05/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 02/06/2015 (Ofício n.º 143/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
6	Processo TCE n.º 59335.000158/2011-01, Ref. Conv. SIAFI n.º 338496 (Processo n.º 03055.000034/97-44) - Emissão de Relatório de TCE nº 006/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	N/A	03/03/2015	31/07/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 12/06/2015 (Ofício n.º 162/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
7	Processo TCE n.º 59335.000171/2010-80., Ref. Conv. SIAFI n.º 383513 (Processo n.º 03045.000037/99-03) - Emissão de Relatório de TCE nº 007/2015	Rivaldo Alves, Eliane Acioly (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	N/A	03/03/2015	31/07/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 15/06/2015 (Ofício n.º 165/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
8	Processo TCE n.º 59335.000037/2011-60, Ref. Conv. SIAFI n.º 348331 (Processo n.º 03050.000007/98-10) - Emissão de Relatório de TCE nº 008/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	N/A	03/03/2015	31/07/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 30/06/2015 (Ofício n.º 175/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	

9	Processo TCE n.º 59335.000038/2012-95, Ref. Conv. SIAFI n.º 118907 (Processo n.º 28.110.JO.0037/94-7) - Emissão de Relatório de TCE nº 009/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	N/A	03/03/2015	31/07/2015	N/A	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 30/06/2015 (Ofício n.º 174/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
10	Processo TCE n.º 59335.000587/2013-41, Ref. Conv. SIAFI n.º 767312 (Processo n.º 59335.000370/2011-79) - Emissão de Relatório de TCE nº 010/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	27/11/2013	26/05/2014	N/A	27/11/2013	30/06/2015	N/A	100%	Concluído	TCE encerrada por saneamento de pendência (remessa de prestação de contas e devolução do saldo do convênio). Arquivamento autorizado no item "g" da 191ª Ata da Diretoria Colegiada da SUDENE	
11	Processo TCE n.º 59335.000063/2011-98, Ref. Conv. SIAFI n.º 364921 (Processo n.º 03050.000035/98-47) - Emissão de Relatório de TCE nº 011/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	04/03/2015	31/08/2015	N/A	04/03/2015	11/11/2015	N/A	100%	Concluído	TCE concluída em 28/10/15, com envio à CGU em 11/11/2015. (Ofício n.º 277/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
12	Processo TCE n.º 59335.000412/2010-90, Ref. Conv. SIAFI n.º 368499 (Processo n.º 03054.000023/98-09) - Emissão de Relatório de TCE nº 012 /2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/07/2015	16/01/2016	N/A	20/07/2015	17/11/2015	N/A	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 286/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
13	Processo TCE n.º 59335.000354/2012-67, Ref. Conv. SIAFI n.º 383832 (Processo n.º 03045.000089/99-07) - Emissão de Relatório de TCE nº 013/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	02/01/2016	N/A	06/07/2015	17/11/2015	N/A	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 285/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
14	Processo TCE n.º 59335.000059/2010-49, Ref. Conv. SIAFI n.º 338465 (Processo n.º 03055.000045/97-61) - Emissão de Relatório de TCE nº 014/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	13/07/2015	09/01/2016	N/A	13/07/2015	17/11/2015	N/A	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 284/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
15	Processo TCE n.º 59335.000207/2012-97, Ref. Conv. SIAFI n.º 383999 (Processo n.º 03045.000012/99-74) - Emissão de Relatório de TCE nº 015/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/06/2015	12/12/2015	N/A	15/06/2015	26/11/2015	N/A	100%	Concluído	TCE concluída em 23/11/15, com envio à CGU em 26/11/2015. (Ofício n.º 290/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
16	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	02/01/2016	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Atrasado	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar	
17	Processo TCE n.º 59335.000038/2011-04, Ref. Conv. SIAFI n.º 370305 (Processo n.º 03050.000007/99-92) - Emissão de Relatório de TCE nº 16/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	27/03/2015	23/09/2015	N/A	27/03/2015	01/12/2015	N/A	100%	Concluído	Em fase de notificação dos potenciais responsáveis. A data final previstas será repactuada em função do estoque de providências relacionadas à tramitação de TCE	
18	Processo TCE n.º 59335.000185/2010-01, Ref. Conv. SIAFI n.º 395796 (Processo n.º 59313.000019/00-83) - Emissão de Relatório de TCE nº 17/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/08/2015	30/01/2016	N/A	03/08/2015	03/12/2015	N/A	100%	Concluído	Em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
19	Processo TCE n.º , Ref. Conv. SIAFI n.º 317557 (Processo n.º 03057.000002/96-93) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	26/10/2015	23/04/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
20	Processo TCE n.º 59335.000538/09-21, Ref. Conv. SIAFI n.º 406596 (Processo n.º 59313.000105/00-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	26/10/2015	23/04/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	95%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.											
Observações:											
1º ciclo 2016 - Jan/2015 a Fev/2016											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 69 (ex PO 64)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2016
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI			Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade			Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Eugênio Pacelli			Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe				
Projeto:	Desenvolvimento de Lideranças				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.90.00		34.580,00	

Previsão de Conclusão:	17/11/2019
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.980,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 7.980,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/09/15	25.000,00	04/05/15	27/10/15		0%	Atrasado	Data repactuada. As propostas recebidas apresentaram inconsistências legais, conforme o Parecer da Procuradoria da Sudene.	
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/12/15	30/06/16	7.980,00	04/12/15		7.980,00	50%	Em Andamento		
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Projetos Desenvolvimento de coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
10	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
11	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:			34.580,00			Valor realizado:			9.580,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Ciclo janeiro a dezembro de 2015. O projeto é uma ação interligada ao Projeto Gestão por Competências e ambos ocorrerão nos próximos 04 anos conforme previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2016/2019.

1º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 70 (ex PO 65)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2016
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.		
Projeto:	Gestão por Competências		
Objetivo do projeto:	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Previsão de Conclusão:	10/11/2019
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/07/15	25.000,00	01/04/15	27/10/15		0%	Atrasado	Repactuação de datas. As propostas recebidas apresentaram inconsistências legais para contratação, conforme o Parecer da Procuradoria da Sudene.	
5	Reunião de orientação para descrição de competências por unidade organizacional	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	16/02/16	16/02/16		16/02/16	16/02/16		100%	Concluído		
6	Levantamento das competências das unidades organizacionais	Gestores das unidades organizacionais	16/02/16	29/02/16		16/02/16	29/02/16		100%	Concluído		
7	Mapeamento das competências	Marlene Franklin e Marina Braga	29/02/16	23/03/16		29/02/16			50%	Em Andamento		
8	Elaboração do projeto de gestão por competências	Marlene Franklin e Marina Braga	23/03/16	30/03/16					0%	A Iniciar		
9	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
10	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
11	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
12	Desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
13	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
14	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
Valor Previsto:					25.000,00	Valor realizado:			0,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Ciclo de janeiro a dezembro de 2015. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento. de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.
1º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 71 (ex PO 66)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2016
Sub-objeto:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Ângela Maria Lima Gouveia
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laboral.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.90.00			

Previsão de Conclusão:	30/11/2019.
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 6.200,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 6.200,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído		
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído		
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.	
10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	Concluído		
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	Concluído		

12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15	22/09/15		100%	Concluído		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilitadores	15/09/15	02/10/15		15/09/15	02/10/15		100%	Concluído		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilitadores	16/10/15	18/12/15	2.500,00	16/10/15	18/12/15	1.200,00	100%	Concluído		
15	Encerramento do Projeto de 2015	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	18/12/15	18/12/15		18/12/15	18/12/15		100%	Concluído		
16	Planejamento do Projeto para 2016	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	01/09/16	09/09/16					0%	A Iniciar		
17	Realização dos Encontros - terceira turma	CGGP e facilitadores	12/09/16	18/11/16					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		10.000,00	Valor realizado:		6.200,00	88%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Banco Central; Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Igreja Batista do Cordeiro

Observações:

Ciclo de janeiro a dezembro de 2015. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.

1º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Plano de Ação 2012			
Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 72 (ex PO 67)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor :	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Previsão de Conclusão:	03/07/2017
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / Paula Aragão de Souza
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.271.552,15
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 155.878,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar no Exercício	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total liberado até o exercício	R\$ 3.271.552,15

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14	13/04/15	0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compom Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.	
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14	555.861,00	100%	Concluído		As poltronas foram entregues nesta Autarquia e pagas em 28/12/2015, aguardando a reforma dos auditórios para serem instaladas.

8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compór Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	01/05/16	273.000,00	11/06/15			90%	Em Andamento	Foi celebrado em 07/05/2015 o Contrato Sudene nº 02/2015 e emitida a Ordem de Execução dos Serviços em 11/06/2015, com prazo de entrega dos projetos em 180 dias.	Foi emitida a Portaria nº 48, de 20/05/2015, nomeando a Comissão de Fiscalização dos serviços, composta pela arquiteta Paula Aragão de Souza e pelos engenheiros José Wilson Galdino, Thiago Teles da Silva e Diego Vêras Emerenciano.
8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compór Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15	28/10/15	25.356,00	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 25.356,00.	Os serviços foram concluídos em 28/10/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compór Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	31/12/15		27/07/15	14/12/15	60.220,50	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 60.220,50.	Os serviços foram concluídos em 14/12/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.3	Projeto Executivo	Compór Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	01/05/16		17/08/15			70%	Em Andamento	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 87.478,20.	Os serviços foram iniciados em 17/08/2015, tendo a Contratada solicitado a prorrogação do prazo contratual por mais 45 dias, e de valor igual a R\$ 32.560,90, estando o Termo Aditivo carecendo de aprovação superior para a sua celebração.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	02/05/16	02/09/16	0,00				0%	A Iniciar		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	03/09/16	03/07/17	3.300.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compór Eng. e Automação Ltda.	03/09/16	03/07/17	72.000,00				0%	A Iniciar	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			03/07/17					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		7.553.642,89	Valor realizado:		3.271.552,15	66%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

1º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 73 (ex PO 68)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Previsão de Conclusão:	20/08/2015
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 6.458.613,62
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 2.211.931,24
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar no Exercício	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total liberado até o exercício	R\$ 6.458.613,62

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12		3.533.874,44	88%	Paralisado	A Sudene encaminhou o 6º Termo Aditivo, sugerindo o acréscimo de 180 dias no prazo contratual, porém a Contratada não assinou esse documento dentro do prazo legal.	A questão foi analisada pela Consultoria Jurídica da Sudene, estando sob análise da Auditoria Interna.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12		0,00	88%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve e pelos engenheiros eletricitistas Diego Vêras e Thiago Teles e pela arquiteta Rebeca Ramalho.	O engenheiro José Villeneuve encontra-se afastado da Comissão, a pedido, desde 09/02/2015, para coordenar, à época, o projeto Água para Todos, e a arquiteta Rebeca Ramalho solicitou demissão da Sudene.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00				0%	Paralisado		
Valor Previsto:					9.673.041,23	Valor realizado:		6.458.613,62	90%	Paralisado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:
1º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 74 (ex PO 69)
Objetivo estratégico:	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho			Ano:	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor :	Eugênio Pacelli	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares		
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.				
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	4.663.522,50	4.663.522,50

Previsão de Conclusão:	31/12/2016
Data Atualização:	04/03/2016

Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / Diego Vêras Emerenciano / Thiago Teles da Silva
--	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar no Exercício	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhou Memorando à CGAF, em 20/03/2015, solicitando a contratação dos serviços de modernização das subestações elétricas.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15	15/04/15	0,00	100%	Concluído	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que aguardasse a decisão final sobre que órgão condominial iria realizar esta licitação.	Ficou decidido que a contratação será realizada pela Sudene, tendo sido solicitada a autorização do MI, através do Ofício GAB/SUDENE nº 371/2015, em 17/07/15, e reiterado através do Ofício GAB/SUDENE nº 492/2015, em 1º/12/2015.

8	Autorização para a contratação dos serviços	Ministério da Integração Nacional	17/07/15	17/08/15	0,00	17/07/15	17/12/15	0,00	100%	Concluído	A autorização do Ministério da Integração Nacional foi proferida em 17/12/2015, em despacho do Secretário-Executivo Substituto, Sr. Laércio Roberto Lemos de Souza.	Face à necessidade de atender à Decisão judicial que anulou a interdição do Edifício SUDENE, a autorização ministerial caracterizou a contratação como emergencial.
9	Novo processo de contratação da obra	SUDENE/DAD	18/12/15	30/06/16	0,00	18/12/15			35%	Em Andamento	Ainda no Exercício 2015, foi realizada a tentativa de contratação da empresa ATP Soluções em Energia, porém a proposta foi cancelada, em virtude da existência de entraves técnicos não atendidos pela pretensa contratada.	A Área de Engenharia está atualizando o Projeto Básico para adequação às exigências técnicas da Concessionária de energia, bem como o orçamento básico.
10	Execução da Obra	A definir	01/07/16	31/12/16	4.503.522,50					A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Vêras e empresa de consultoria	01/07/16	31/12/16	60.000,00					A Iniciar		
12	Entrega da obra			31/12/16						A Iniciar		
			Valor Previsto:		4.663.522,50	Valor realizado:		100.000,00	37,95%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
1º ciclo 2016												

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 75 (ex PO 70)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	George Meireles		
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.				
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL entre 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	484.650,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Nascimento (UFPE).
---	---------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 484.650,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 484.650,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaide Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	

15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	30/06/2014		100%	Concluído		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros9organização); Realização igual a R\$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	Concluído		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)	Severino Silva	02/06/2014	30/11/2014		02/12/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)	Pessoa Jurídica	02/06/2014	30/11/2014		-	-		-	Cancelado	Atividade não executada.	
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)	Arabera Tradução Técnicas	02/06/2014	30/11/2014		10/10/2014	30/11/2014		100%	Concluído		
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	Concluído		
23	Finaização (Relatório)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	28/02/2015	30/06/2015		28/02/2015	29/02/2016		100%	Concluído	Relatório entregue em 29/02/2016	
			Valor Previsto:		484.650,00	Valor realizado:		484.650,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento												
Observações:												
4º ciclo 2015												
Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 76 (ex PO 71)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	George Meireles		
Problema (causa):	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)				
Projeto:	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000				
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	565.700,00

Previsão de Conclusão:	31/07/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Nascimento (UFPE).
---	---------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 565.700,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 565.700,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído	Portaria nº 046 de 13/05/2015, pela qual o Chefe de Gabinete passa a ser o coordenador institucional do Projeto	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	30/05/2016		30/04/2015			70%	Em andamento		
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			80%	Em andamento		
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassete e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015			60%	Atrasado		
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philippe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			80%	Em andamento		
10	Produção de Artigos (R\$ 24.000,00)	Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			60%	Em andamento		
11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			85%	Em andamento		
12	Coleta de depoimento na elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	31/03/2016					70%	Em andamento		
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fabício Silva	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			70%	Em andamento		
14	Produção de Artigos (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	30/09/2015		01/06/2015			90%	Atrasado		

15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Não selecionado	01/10/2015	31/12/2015					50%	Atrasado		
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Não selecionado	01/08/2015	29/02/2016		30/09/2015			50%	Em Andamento		
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	02/01/2015	30/04/2016					0%	A Iniciar		
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	01/07/2015	29/02/2016					0%	A Iniciar		
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	30/04/2016		01/06/2015			30%	Em Andamento	Realização do III Ciclo de Debates em Caruaru, 31/08/2015	
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016					0%	Cancelado	Por necessidade de outras atividades do projeto esta ação foi cancelada.	
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/07/2015	31/05/2016					80%	Em andamento		
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015			50%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		565.700,00	Valor realizado:		565.700,00	63%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento												
Observações:												
1º ciclo 2016												
Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 77 (ex PO 73)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.			Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação		
Diretor:	Eugenio Pacelli Remigio Araujo	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro		
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.				
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO				
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88

Previsão de Conclusão:	30/09/2016
Data Atualização:	29/02/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 383.999,07
A realizar no exercício	R\$ 229.863,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 229.863,81
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 383.999,07

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE	
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	19/10/15	-	76.046,79	90%	Atrasado		
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	10/11/15	-	-	90%	Atrasado		
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	29/07/16	-	26/02/16	-	-	10%	Em Andamento		
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador e da SUDENE	Área de TI, Empresa Contratada,	01/04/16	30/09/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
Valor Previsto:			613.862,88			Valor realizado:			383.999,07	90%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Ministério da Integração Nacional e SUDAM
Observações:
1º Ciclo 2016
Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema.
Ainda não houve empenho ou liberação no presente exercício.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira
Exercício 2015

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2015)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	26.198.061,00	15.678.836,00	9.896.982,33	59,85	63,12	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	600.000,00	400.000,00	177.886,08	66,67	44,47	Servidor capacitado	199		0,00		
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	312.050,87	100,00	54,18	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	31.680,00	31.680,00	9.487,50	100,00	29,95	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	92.403,74	100,00	38,50	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.075.416,00	1.075.416,00	307.534,35	100,00	28,60	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	21.204,00	21.204,00	1.182,64	100,00	5,58	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.848.455,00	3.848.455,00	3.394.434,98	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	28.862.954,00	28.862.954,00	27.525.893,66	100,00	-	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI					Total	61.509.870,00	50.790.645,00	41.717.856,15	82,57	82,14	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.356.309,00	2.258.123,00	2.211.273,07	95,83	97,93	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União					Total	2.356.309,00	2.258.123,00	2.211.273,07	95,83	97,93	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	1.100.000,00	300.000,00	300.000,00	27,27	100,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	1.211.233,00	878.370,00	878.370,00	72,52	100,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	765.000,00	459.000,00	459.000,00	60,00	100,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	1.000.000,00	746.112,32	746.112,32	74,61	100,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	532.475,00		0,00	0,00	#DIV/0!	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/7002	A	1	900.000,00		0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/7004	A	1	100.000,00		0,00	não inf.	não inf.	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	1.000.000,00	534.417,84	534.417,84	53,44	100,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1			0,00	#DIV/0!	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	2.964.293,00	2.573.769,15	2.573.769,15	86,83	100,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00		0,00	0,00	#DIV/0!	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/71243	A	1	800.000,00	700.000,00	700.000,00	87,50	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71243	A	1	262.300,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71244	A	1	800.000,00		0,00	0,00							
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária					Total	11.535.301,00	6.191.669,31	6.191.669,31	53,68	100,00						
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres					Total	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 31/12/2015 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Projetos tabulados segundo Diretrizes
e Objetivos Estratégicos da SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Concluído	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estrategico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Cancelado	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
9	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.952.322,32	21%
10	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
11	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
13	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
14	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 310.000,00	R\$ 150.000,00	48%
15	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
16	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
17	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
18	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
20	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 800.000,00	78%
21	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
22	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
23	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%
24	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
25	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiânia/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.800.224.586,49	92%
26	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
27	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
28	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
29	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
30	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
31	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
32	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
33	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
34	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
36	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
37	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
38	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
39	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
40	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
41	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
42	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
43	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
44	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
45	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
46	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
47	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
48	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
49	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 237.657.633,73	57%
51	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
52	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
53	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauipe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
54	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
55	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%
56	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo 1.1								9.685.302.289,95	6.430.949.662,23	66%
57	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	-	-	-
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total da Diretriz 1
60	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
Total do Objetivo 1.5								234.105,49	139.865,15	60%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								9.685.536.395,44	6.431.089.527,38	66%
61	31	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 16.926.000,00	39%
Total do Objetivo 2.2								43.290.000,00	16.926.000,00	39%
62	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
63	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
Total do Objetivo 2.3								1.366.305,97	723.390,74	53%
64	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
Total do Objetivo 2.4								228.797,21	167.999,61	73%
TOTAL DA DIRETRIZ 2								44.885.103,18	17.817.390,35	40%
65	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
66	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
68	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
69	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 9.580,00	36%
70	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
71	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 1º CICLO 2016, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
			Total do Objetivo 3.1					61.600,00	15.780,00	26%
72	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
73	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
74	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 383.999,07	63%
			Total do Objetivo 3.2					1.664.212,88	1.434.349,07	86%
75	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.271.552,15	43%
76	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
77	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%
			Total do Objetivo 3.3					21.890.206,62	9.830.165,77	45%
			TOTAL DA DIRETRIZ 3					23.616.019,50	11.280.294,84	48%
			TOTAL GERAL					9.754.037.518,12	6.460.187.212,57	66,2

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 1º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: 18/03/2016

ANEXO IV
Projetos tabulados segundo a
Programação do PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TL5A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.800.224.586,49	92%
3	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
17	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
20	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
27	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 237.657.633,73	57%
28	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
29	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
30	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
31	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
32	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 188.283.235,00	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
33	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 62.999.857,00	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 0355								9.662.099.196,98	6.419.255.995,67	66%
34	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
35	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
36	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Rota do Marisco: Estruturação e Qualificação da cadeia Produtiva da Pesca Extrativa de Molusco nas Comunidades Pesqueiras de Goiana - PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 534.417,84	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	417.151,42	37%
37	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Concluído	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
38	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
P 2029 - Ação 4640								2.252.988,40	1.509.738,40	67%
39	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
40	11	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
P 2029 - Ação 8689								1.366.305,97	723.390,74	53%
41	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
42	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
43	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
44	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.952.322,32	21%
45	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
46	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
47	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 310.000,00	R\$ 150.000,00	48%
48	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
49	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
P 2029 - Ação 8902								12.841.985,10	4.448.812,00	35%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
51	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estrategico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Cancelado	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 8917								617.746,24	107.354,71	17%
52	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
53	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
54	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 800.000,00	78%
P 2029 - Ação 8340								3.882.015,99	3.657.015,99	94%
55	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Concluído	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
P 2029 - Ação 8918								694.459,19	694.459,19	100%
56	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
P 2029 - Ação 7K66								250.000,00	250.000,00	100%
57	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
58	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/ICG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 20WQ								1.249.000,00	749.000,00	60%
Total do Programa 2029								9.686.368.283,57	6.431.812.918,12	66%
59	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
P 2040 - Ação 8172								228.797,21	167.999,61	73%
Total do Programa 2040								228.797,21	167.999,61	73%
60	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 230, de 21/10/2015, da Diretoria Colegiada	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 9.580,00	36%
65	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
66	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
67	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.271.552,15	43%
68	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
69	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%
70	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
71	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
72	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 383.999,07	63%
P 2111 - Ação 2000								23.616.019,50	11.280.294,84	48%
Total do Programa 2111								23.616.019,50	11.280.294,84	48%
73	31	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 16.926.000,00	39%
Total do Programa 2069								43.290.000,00	16.926.000,00	39%
74	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 1º CICLO 2016, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA 2016-2019

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
75	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Grupo de Trabalho para a estruturação de uma base de dados geográficos e a implantação do Núcleo de Geoprocessamento na SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
76	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Nordeste em Números 2015	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
77	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de um resumo do Relatório de Avaliação da UAB	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	-	-	-
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								9.753.503.100,28	6.460.187.212,57	66,2

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 1º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: 18/03/2016
