



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Indicadores do Monitoramento e Controle  
da Programação  
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

**4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação  
2016**

**Recife  
15 de dezembro de 2016**

## Sumário

	Pág.
Introdução .....	3
1 – Resultados do monitoramento .....	5
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) .....	9
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais .....	23
4 – Indicadores de Gestão de Convênios .....	31
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos .....	44
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos .....	48
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) (Resultado out/15 - set/16).....	51
8 – Observações e Deliberações em plenária de 15/12/2016 .....	53
9 – Conclusão .....	56
Anexo I – Quadros do monitoramento .....	57
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira 2016 (posição até agosto) .....	220
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE .....	222
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA .....	230

## Introdução

O presente relatório apresenta os resultados do Plano de Ação 2016 e corresponde à última reunião de monitoramento do ano, ocorrida na sala Presidente Juscelino Kubitschek, 13º andar do prédio sede, dia 15 de dezembro de 2016. Neste ciclo foram trabalhados 84 projetos dos quais 12 foram especialmente selecionados para uma abordagem mais aprofundada.

Deste evento, além do Superintendente Marcelo José Almeida das Neves e do Chefe de Gabinete, Marcus Calheira, participou também, o Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Sérgio Wanderley. Além deles, participaram outros 23 Coordenadores-Gerais, Coordenadores e líderes de projetos.

A reunião, sob direção e promoção da Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão, subunidade da Coordenação-Geral de Gestão Institucional, foi aberta pelo Superintendente que teceu comentários sobre os resultados dos trabalhos nesses meses iniciais de sua gestão, particularmente sobre a última reunião do ano do Conselho Deliberativo, realizada em Brasília, bem como, sobre as providências que estão sendo encaminhadas quanto à mudança física da SUDENE para o novo prédio, o **Empresarial Souza Melo Tower**, localizado na Avenida Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, escolhido após processo seletivo de propostas apresentadas após chamamento público.



Foto 1 - abertura dos trabalhos do 4º Ciclo de Monitoramento.

Sobre a reunião, a metodologia foi expositiva, com cada responsável apresentando ao Superintendente o seu projeto, as dificuldades enfrentadas e medidas de superação encaminhadas para o seu êxito, além dos exemplos de boas práticas e possibilidade de replicagem para outros estados ou sub-regiões da área de atuação da Autarquia, a exemplo dos planos de desenvolvimento integrado, que envolvem diversos municípios de uma subregião.

Os referenciais do planejamento estratégico vigente continuaram referenciando os projetos, inclusive com a aprovação da sua prorrogação até que novo realinhamento seja implementado conforme decisão da Diretoria Colegiada em sua 249ª reunião realizada em 01/dez/2016.

A foto adiante mostra parte da equipe de dirigentes participantes do evento realizado em 15 de dezembro.



Foto 2 - Vista parcial dos participantes do 4º ciclo de monitoramento.

Abaixo, momento em que a Coordenadora Maria Helena, da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, esclarecia alguns aspectos verificados no portfólio de projetos em debate.



Foto 3 - Momento da apresentação dos resultados.

Na foto abaixo, momento de participação do Superintendente nas discussões sobre a melhoria da repercussão das ações da SUDENE na Região.



Foto 4 - Participação do Superintendente Marcelo Neves nos debates.

É oportuno relembrar que o monitoramento oferece cinco vertentes à alta administração do órgão: a) possibilitar ao Diretor da unidade, e ao gestor direto daquele projeto monitorado, a adoção de medidas preventivas sobre projetos que venham apresentando sistemáticos problemas de execução e assim minimizar ou eliminar os riscos para a sua efetividade; b) antecipar, a unidades como a de execução orçamentária, a adoção de medidas relacionadas com a rotina da execução orçamentária e financeira; c) a adoção, pela Diretoria Colegiada, de medidas corretivas, administrativas ou operacionais; d) o acompanhamento da execução da pauta estratégica da SUDENE; e e) o acompanhamento da execução à luz dos chamados eixos estratégicos do Ministério da Integração Nacional, cujo planejamento interno já se encontra compatibilizado ao do MI.

Na oportunidade estiveram em discussão 16 projetos concluídos, 57 em andamento, 6 em atraso e 3 paralisados. Desse portfólio, 2 estavam para iniciar ainda este ano. 84 projetos no total. Neste relatório, o Anexo I é dedicado ao detalhamento de cada projeto.

## 1- Resultados do monitoramento

### 1.1- Resultados Gerenciais do 4º Ciclo de Monitoramento 2016

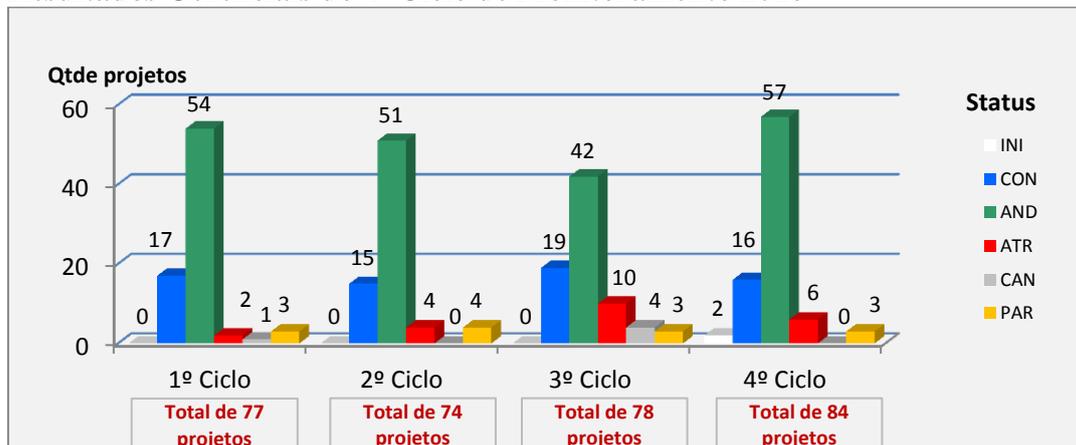


Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2016

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico <sup>1</sup>	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status <sup>2</sup>						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	51	8.796.239,05	6.542.816,81		14	32	5			51
	1.4	16	0,00	0,00	2		14				16
	1.5	1	234,11	234,11			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>68</b>	<b>8.796.473,16</b>	<b>6.543.050,91</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00			1				1
	2.3	3	1.825,31	1.182,39			2			1	3
<b>Sub-Total</b>		<b>4</b>	<b>45.115,31</b>	<b>18.420,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
3	3.1	6	60,41	46,05		1	5				6
	3.2	2	1.179,56	1.027,54			1	1			2
	3.3	3	21.453,29	9.895,98			1			2	3
<b>Sub-Total</b>		<b>11</b>	<b>22.693,27</b>	<b>10.969,58</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
4	4.1	1	0,00	0,00		1					1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>44.146,55</b>	<b>20.865,56</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>84,00</b>	<b>8.864.281,73</b>	<b>6.572.440,88</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>84</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

**Convenções:**

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Referência:** 30/11/2016 (4º Ciclo de monitoramento-2016)

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2016**

Programa do PPA <sup>1</sup> (Código)	Ação do PPA <sup>1</sup> (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	34	8.787.468,91	6.535.933,39		13	18	3			34
	20N7	2	1.114,59	417,15			2				2
	20WQ	19	1.814,70	1.814,70	2		16	1			19
	4640	1	1.069,87	326,62			1				1
	8689	3	1.825,31	1.182,39			2			1	3
	8902	8	3.231,23	2.885,38			8				8
	8917	1	207,54	107,35			1				1
	8340	2	1.882,02	1.882,02			1	1			2
	7K66	1	250,00	250,00				1			1
<b>Sub-Total</b>		<b>71</b>	<b>8.798.864,16</b>	<b>6.544.799,00</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
2111	2000	9	22.127,57	10.403,88		1	6			2	9
<b>Sub-Total</b>		<b>9</b>	<b>22.127,57</b>	<b>10.403,88</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>43.290,00</b>	<b>17.238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ações Internas		3	0,00	0,00		2	1				3
<b>Sub-Total</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>8.864.281,73</b>	<b>6.572.440,88</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>84</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Convenções:**

1- Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ – Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.


2- INI - A iniciar; CON- Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


**Referência:** 30/11/2016 (4º Ciclo de monitoramento-2016)

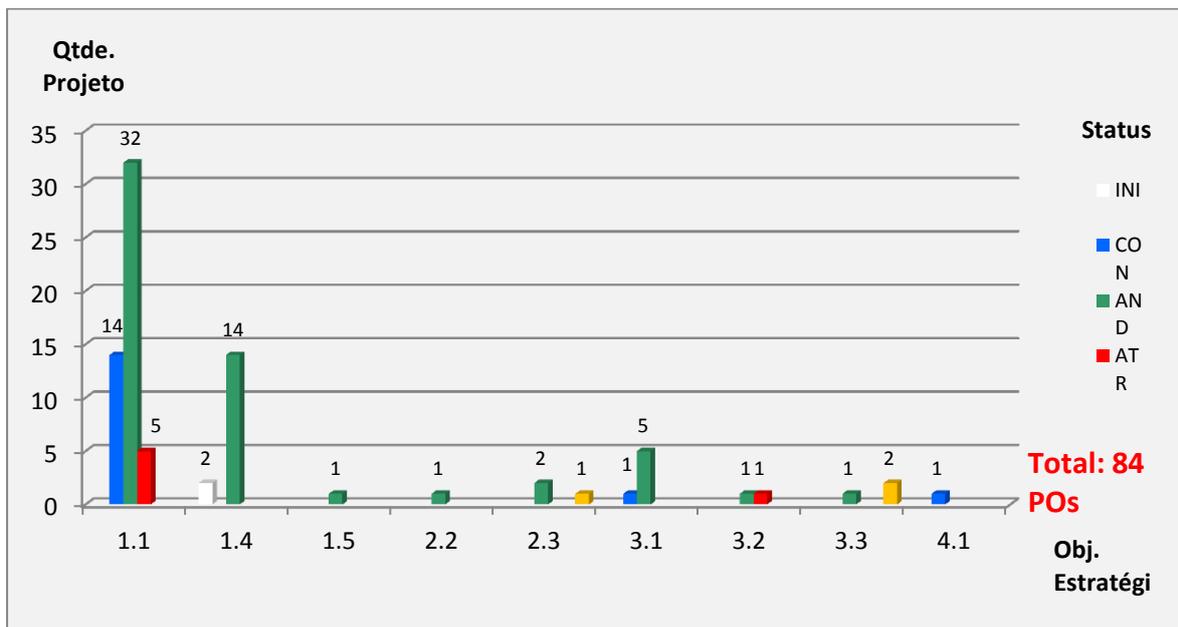

Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional


**Convenções: Obj. Estratégicos:** **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

**Gráfico 2** – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo – 2016)

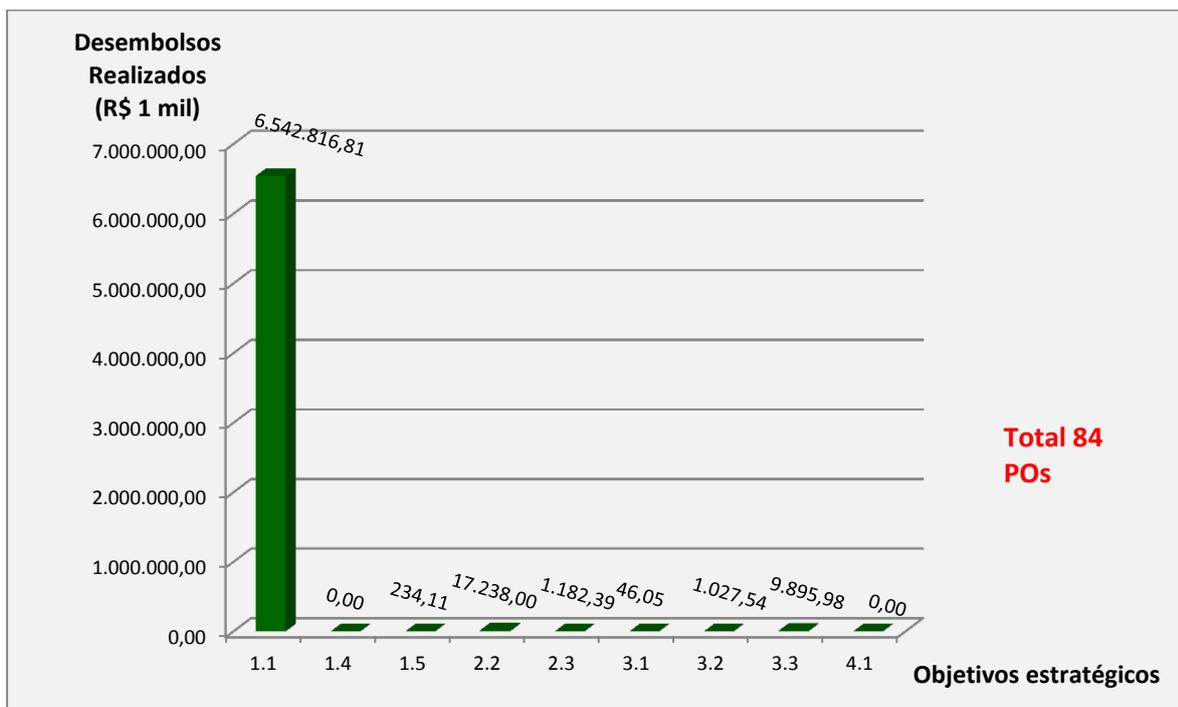

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Gráfico 3** – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º ciclo 2016)

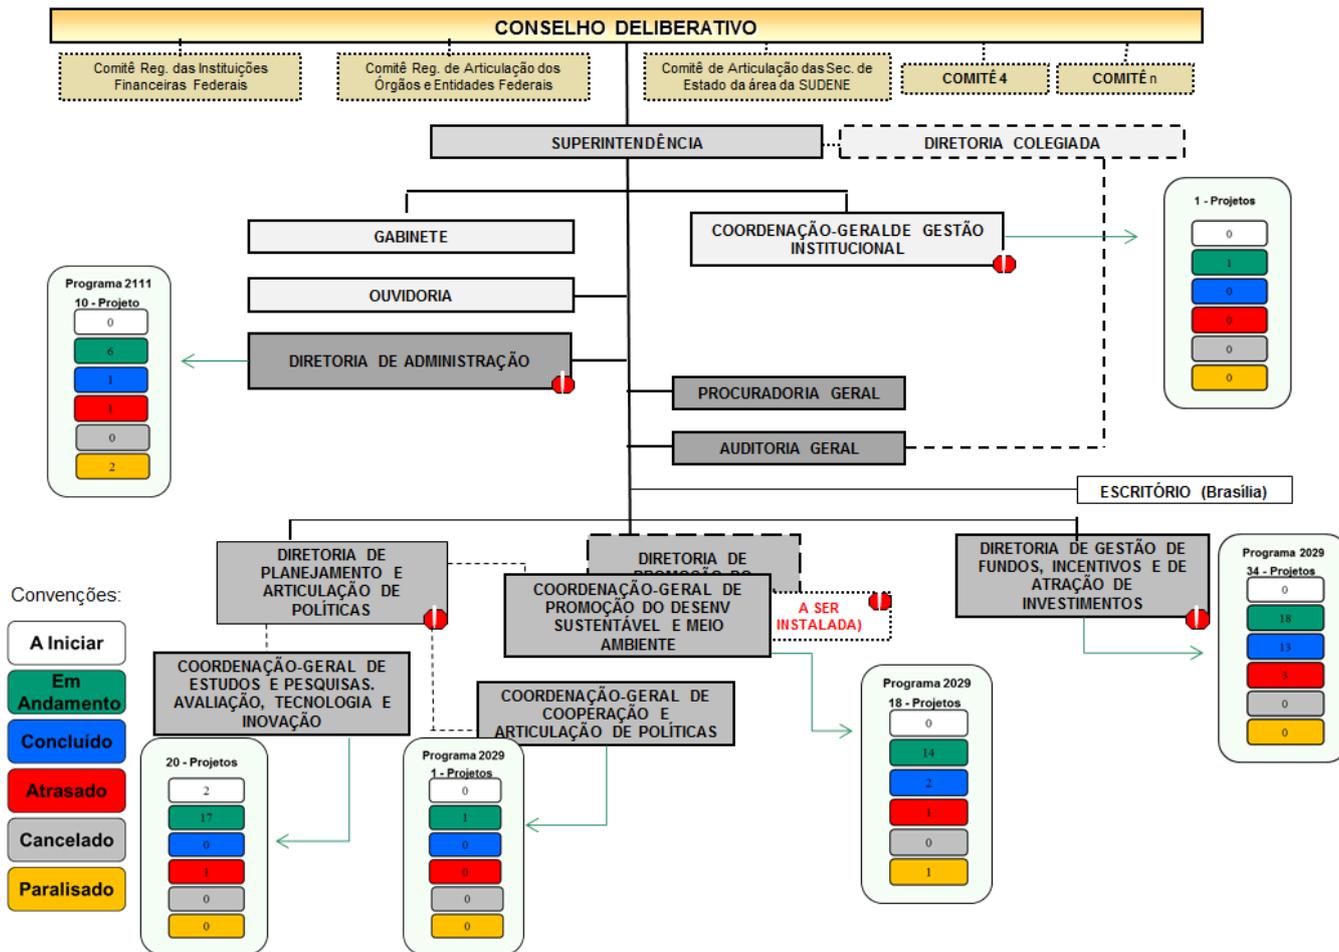

**Diagrama 1 - Distribuição dos 84 Planos Operativos Conforme a Estrutura da SUDENE**

**2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)**

**2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)**

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{18 \times 100}{18} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica

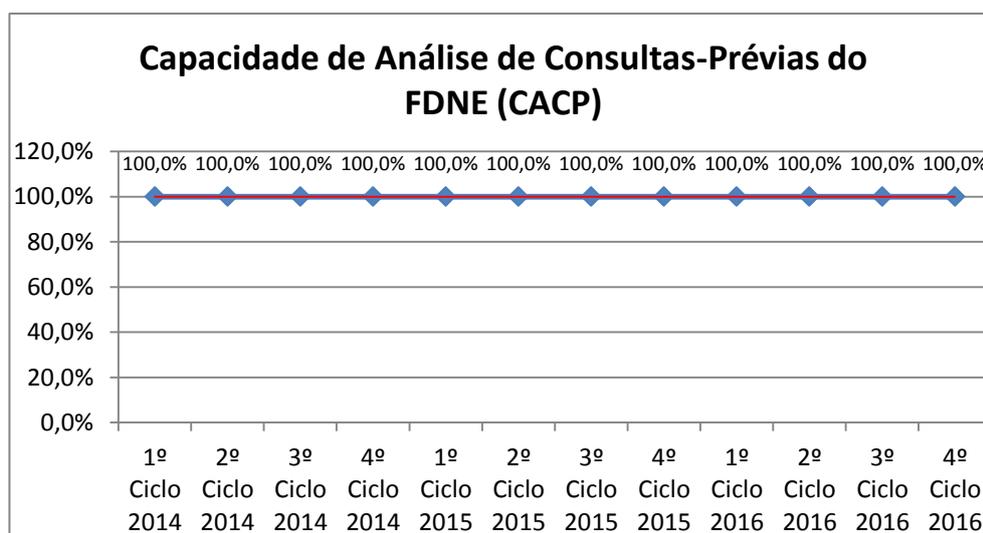

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Nota:**

<sup>1</sup> até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

**2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)**

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{18}{6} = 3$  análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análises/técnico	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	3,4 análises/técnico	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	3,57 análises/técnico	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,43 análises/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	1,67 análises/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,5 análises/técnico	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

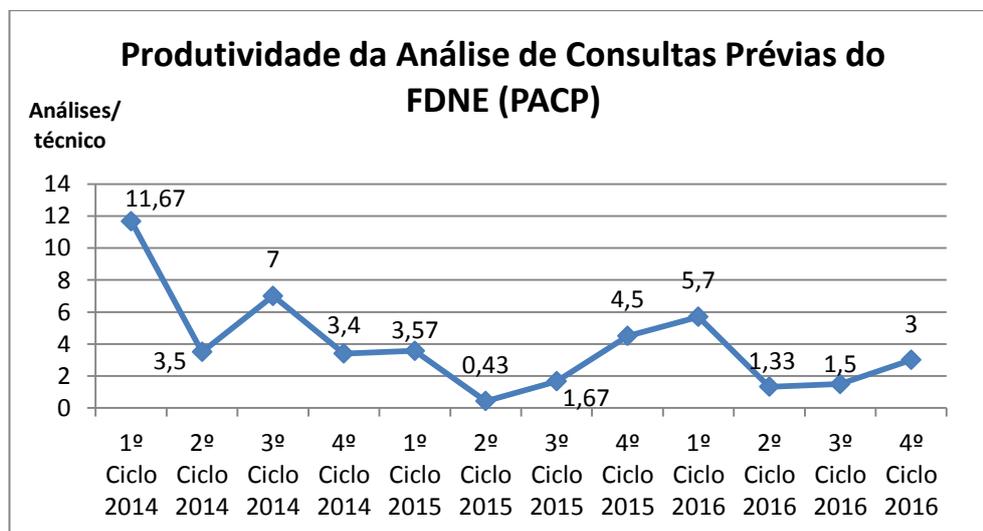

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


A melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda em determinados períodos, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia que ainda se manteve em 2016, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser considerado com cuidado.

### 2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{9 \times 100}{18} = 50\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	63%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	55,5%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

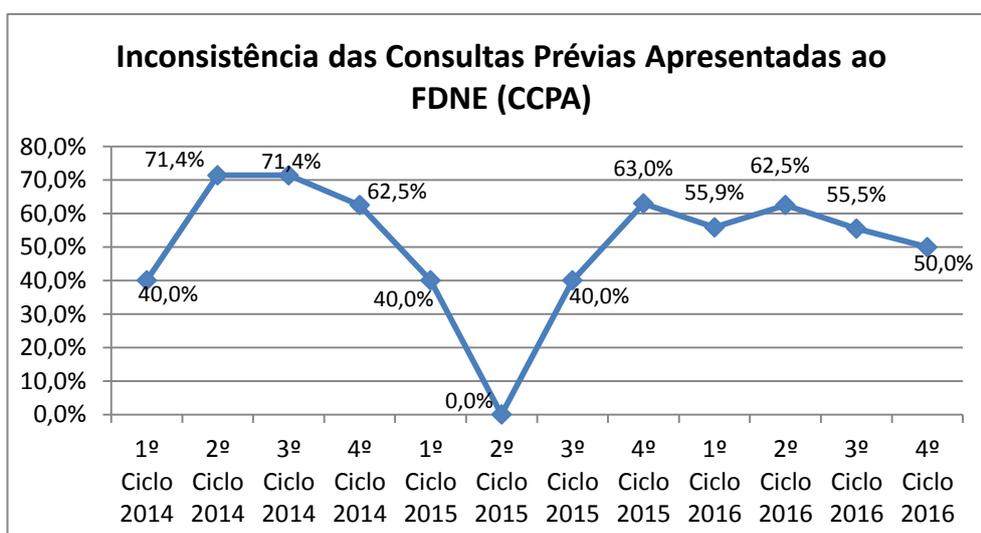

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

<sup>1</sup> Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Atenção: A partir deste 4º ciclo o título do indicador passou a se chamar “Inconsistência das Consultas Prévias apresentadas ao FDNE (CCPA)” por adequar-se mais apropriadamente ao resultado apresentado.

## 2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

### a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{131,2 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,46$

### a.3) Caixa Econômica Federal - CEF


a) Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): ..... (igual ou menor que 1 (um))
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:


Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0,00; BB 1,48; CEF 0,00	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

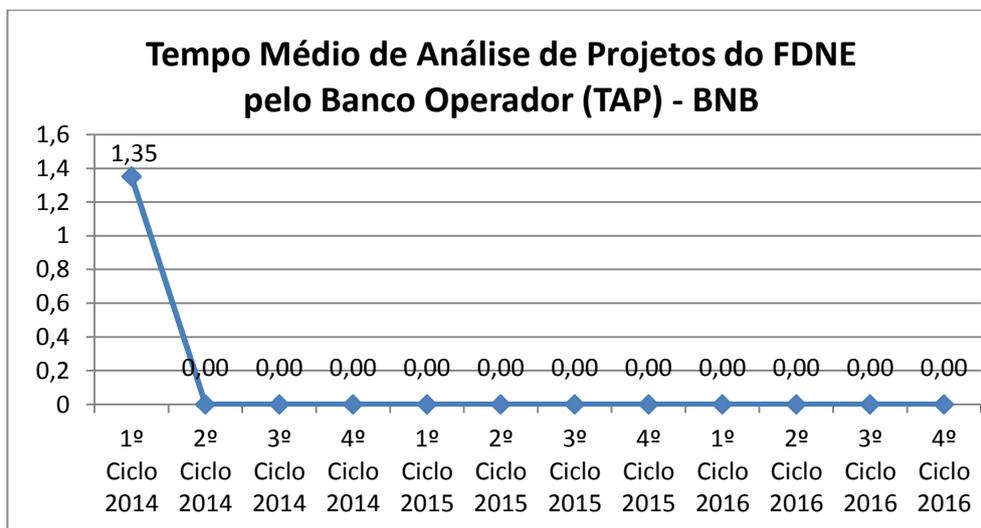


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

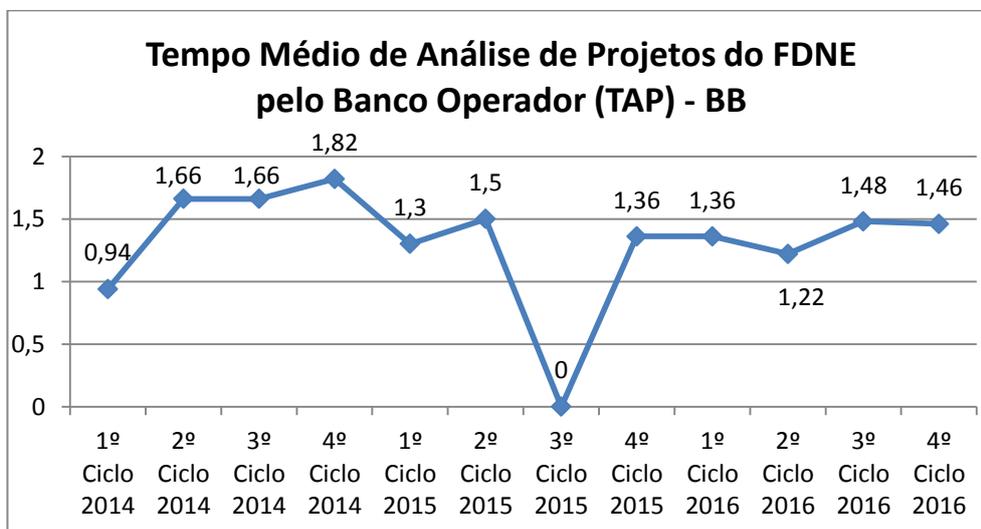

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

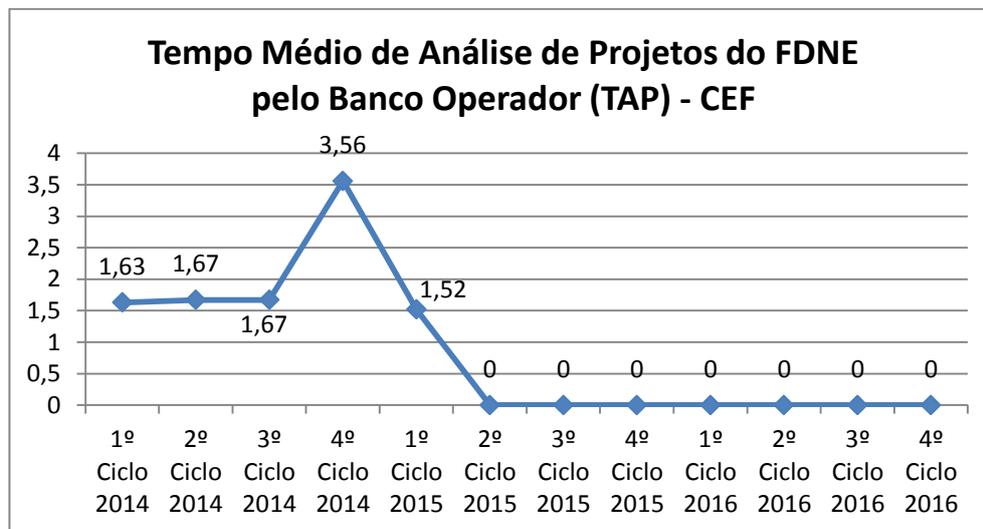

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

#### Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

### 2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

#### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

#### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{6} = 0\%$$

**Observação:** um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

#### a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$


b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

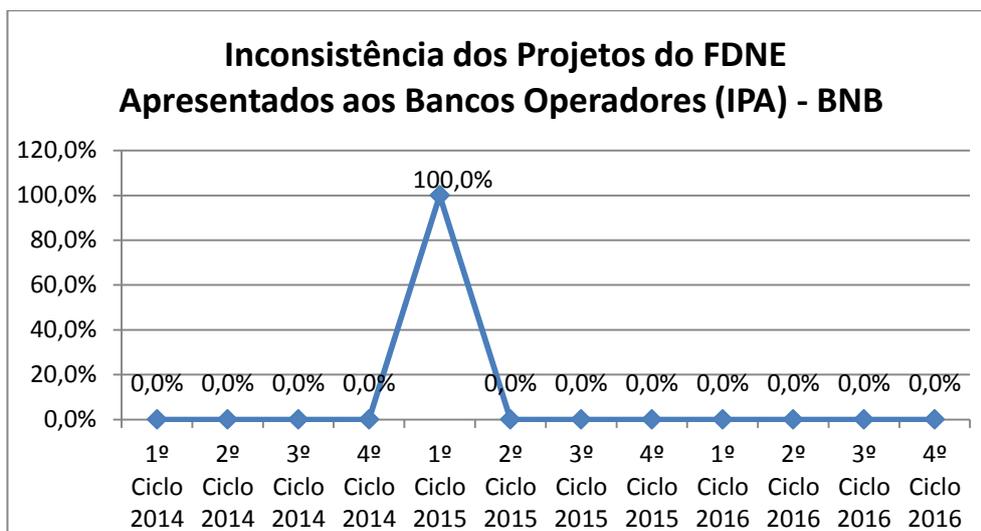


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

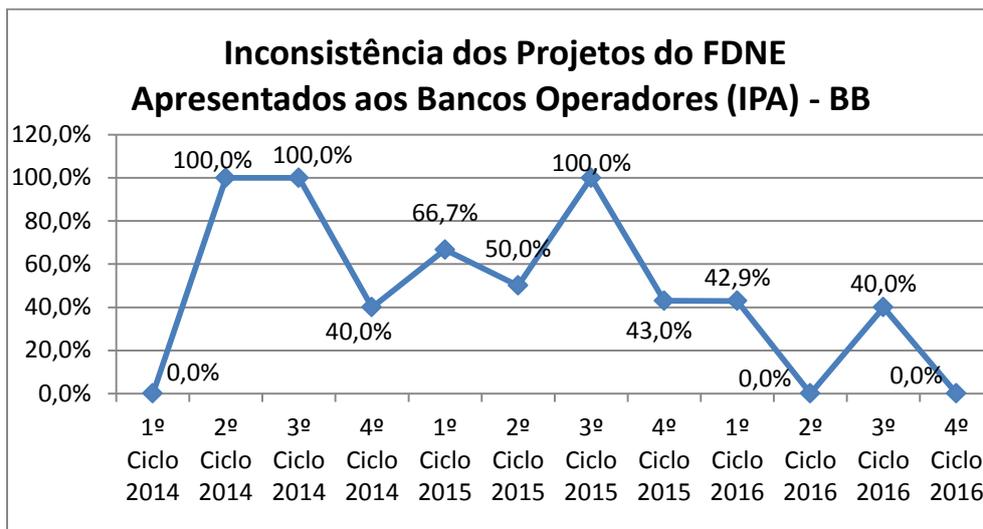

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

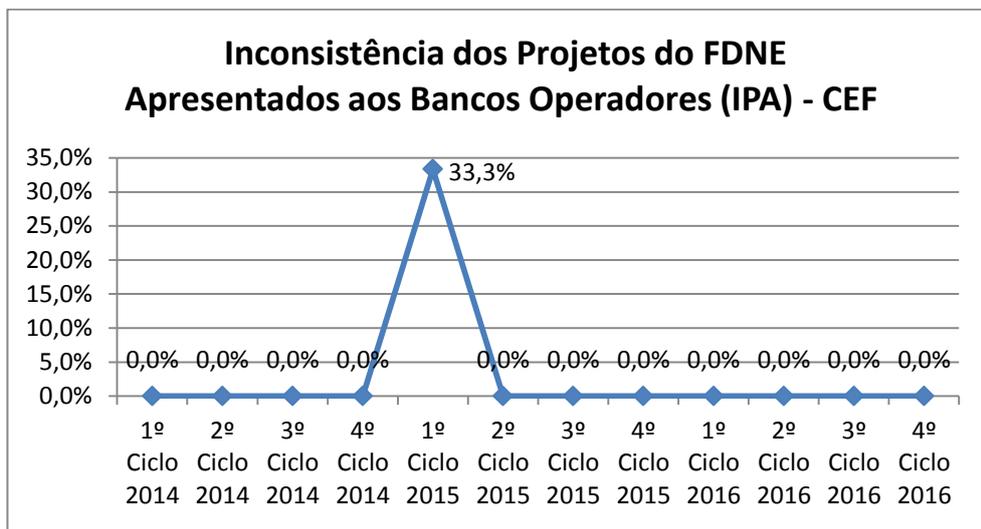

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Valor empenhado LOA 2016} \times 100}{\text{Dotação LOA 2016}} = \frac{0,00}{1.895.911.874,00} \times 100 = 0,00\%$$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

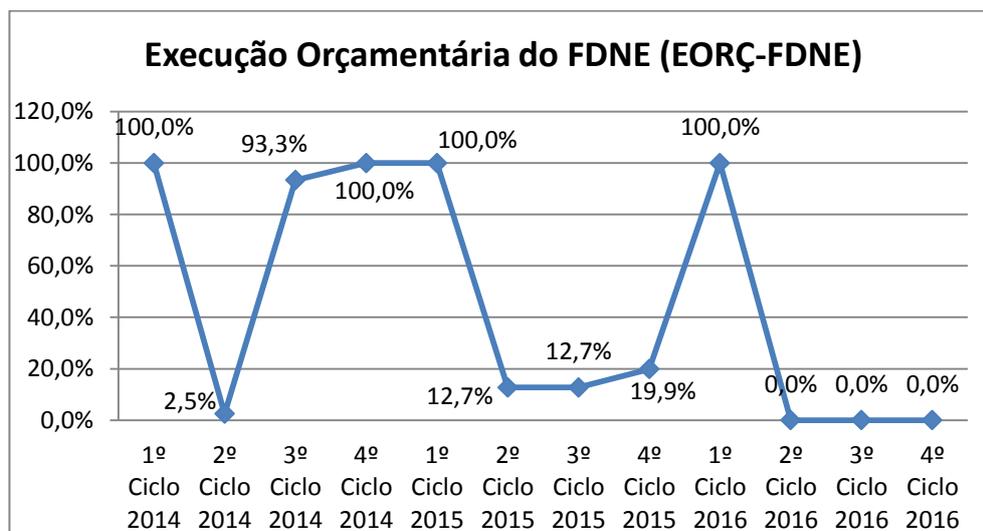

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{394.925.480,54 \times 100}{3.314.001.800,43} = 11,9\%$$


b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-nov/2016
- f) Comentários Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	10,9%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

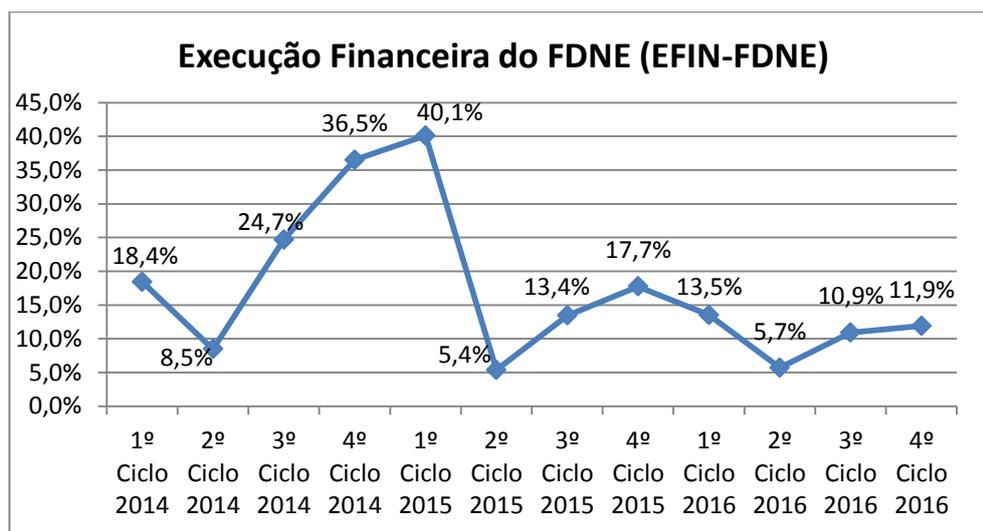

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{M_1}{30 \text{ dias}} = \frac{26,8}{30} = 0,9$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0,58	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,9	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

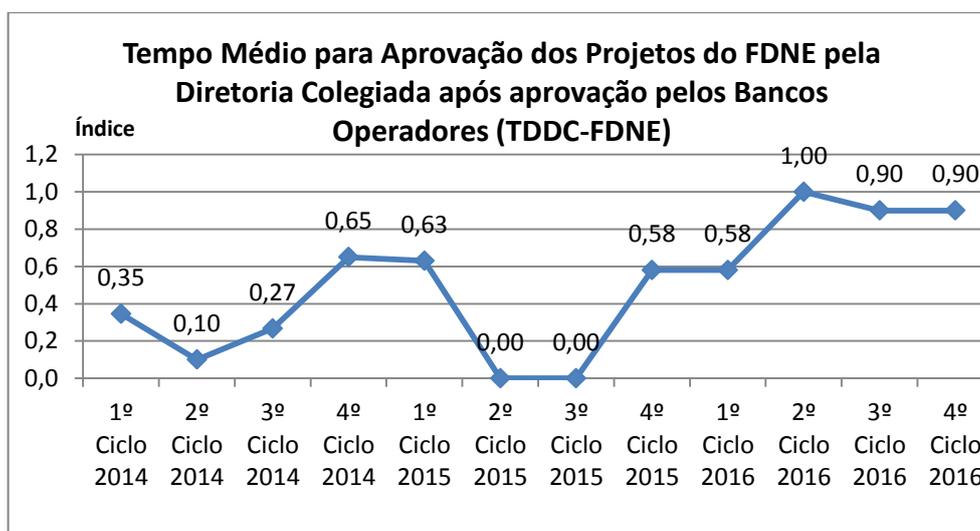

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Convenção:**

**M<sub>1</sub>** – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

**Nota:**

<sup>1</sup> 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

**2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)**

a) Fórmula:  $T_m = \frac{T}{N} = \frac{1891}{6} = 315,2$  dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	321,8 dias	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

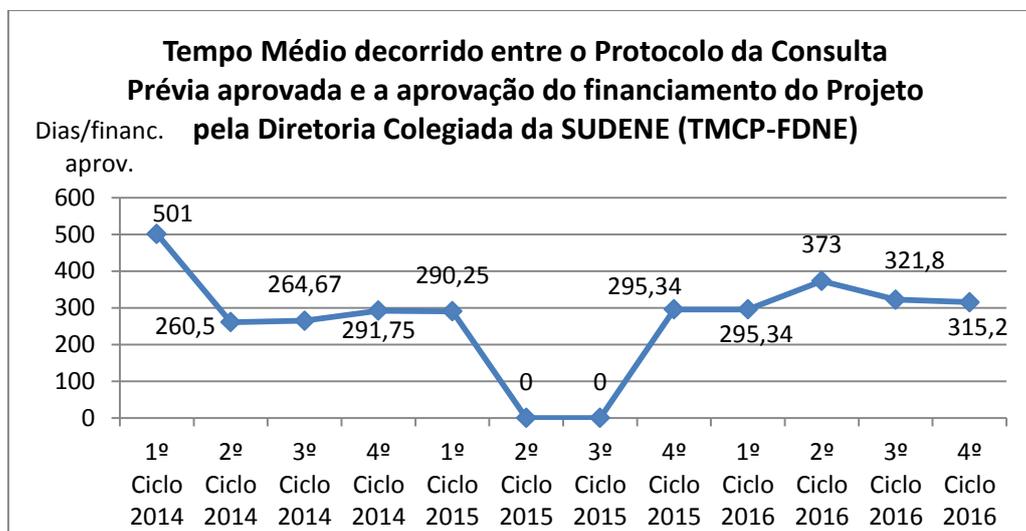

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Notas:**

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

**2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)**

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{6}{6} = 1,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	1,0	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,0	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

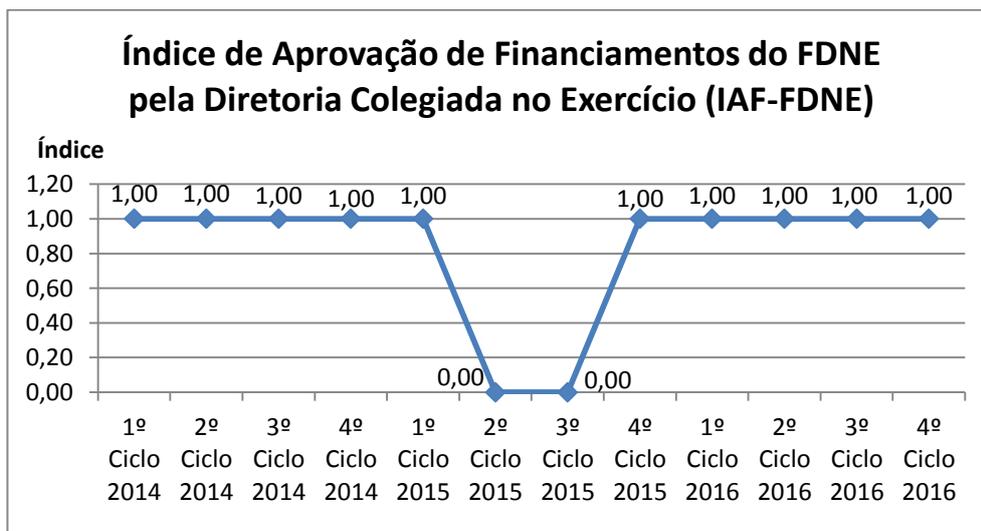

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Nota:** resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

### 3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

#### 3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

a) Fórmula:  $T_1 = \frac{12.432 \text{ dias}}{154 \text{ pleitos}} = 80,7 \text{ dias/pleito}$

- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2016 e encerrado em 30 de novembro de 2016, foram **vistoriados 154 estabelecimentos dos interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 80,7 dias**.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 386 dias (Só Aço Industrial Ltda., estabelecida em Teresina, Piauí). O prazo mínimo, de 12 dias, foi observado no processo de interesse da empresa Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil. O maior número de vistorias (50) situou-se entre 61 e 90 dias de espera e entre 31 a 60 dias (42). Entre 61 e 90 dias foram realizadas 22 vistorias.

Prazo em dias	Número de vistorias
Até 30 dias	16
De 31 a 60 dias	42
De 61 a 90 dias	50
De 91 a 120 dias	22
De 121 a 150 dias	14
De 151 dias a 180 dias	4
De 181 a 210 dias	3
Acima de 210 dias	3

Convenções:


$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	72,9 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	73,7 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	92,30 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	76,4 dias/pleito	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

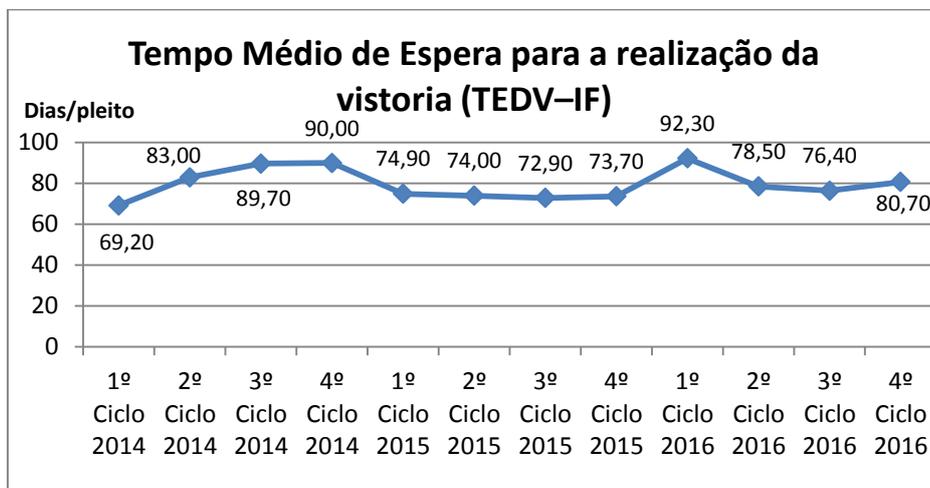

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### 3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF\_UF-IF)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} =$$

$$= \frac{0 \times 100}{319} = 0 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): .... (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: o número de Processos formalizados no período (319 pleitos) corresponde ao total aprovado até novembro 2016 (227 processos), acrescido do número de processos em exame, na referida data (92 processos).

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

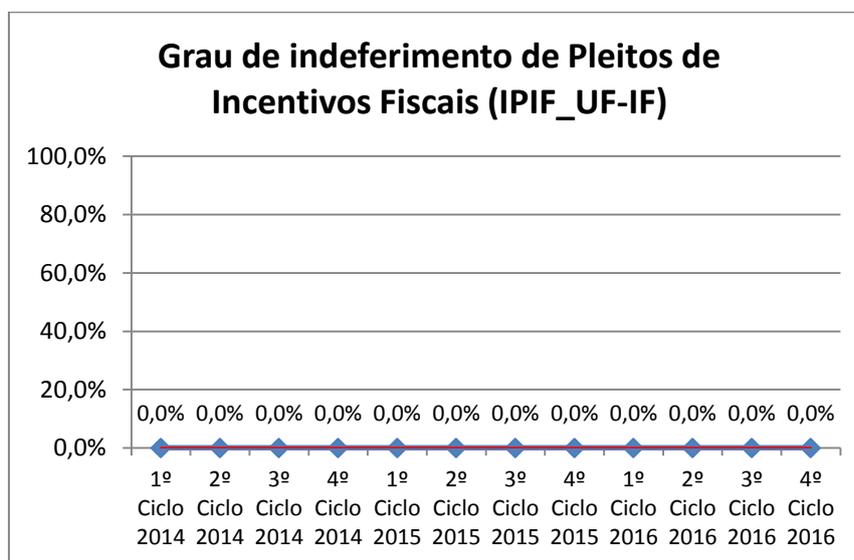

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

### 3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)


a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{227 \times 100}{319} = 71,2 \%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: No período foram protocolados 319 processos diversos. Desse total foram concluídas 227 análises, sendo 178 de redução do imposto de renda, 48 de reinvestimento do IRPJ e 1 de depreciação acelerada. O desempenho do período janeiro/novembro foi bastante afetado pela impossibilidade de realização de vistorias no mês de novembro, em função de restrições orçamentárias. o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado até novembro 2016 (227 processos), acrescido do número de processos em exame, na referida data (92 processos).
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70,7%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

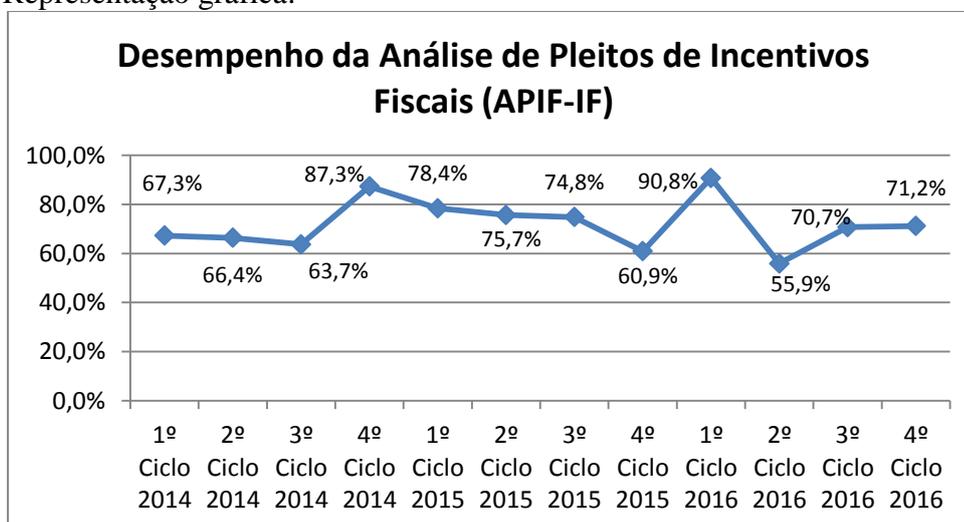

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
 Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado


### 3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula: 
$$\frac{T1}{N} = \frac{24.051 \text{ dias}}{203 \text{ pleitos}} = 118,5 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: o prazo médio observado, de **118,5 dias/pleito** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros onze meses de 2016. Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto com os processos de transferência de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados, aprovados e computados anteriormente, quando do pedido inicial, sendo que a eventual demora não depende da Coordenação de Incentivos Especiais.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	93,3 dias/pleito	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

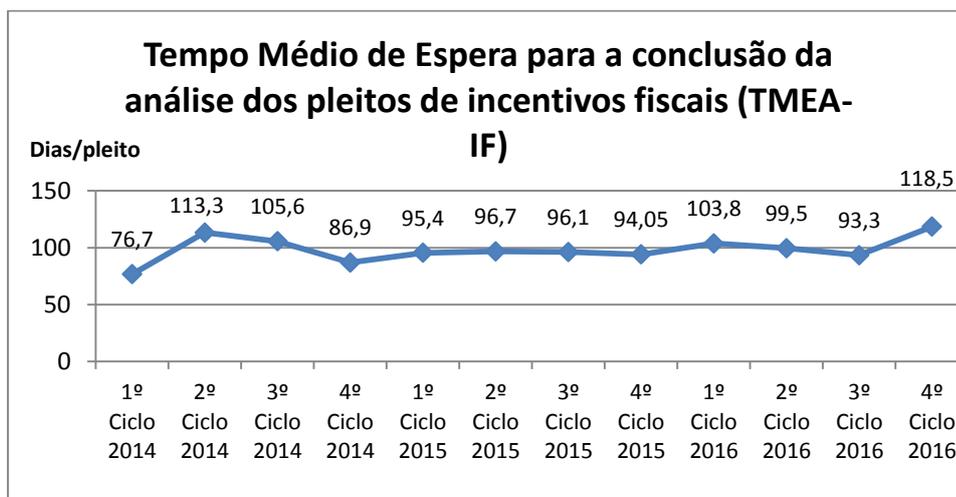

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 =  $\Sigma$  do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

### 3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{227}{21} = 10,8$  análises/técnico

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: o número observado, de 10,8 análises/técnico, é a nosso ver mais que satisfatório se levarmos em conta o contingenciamento orçamentário, que tem dificultado a realização das vistorias.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	16,5 análise/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	6,3 análises/técnico	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

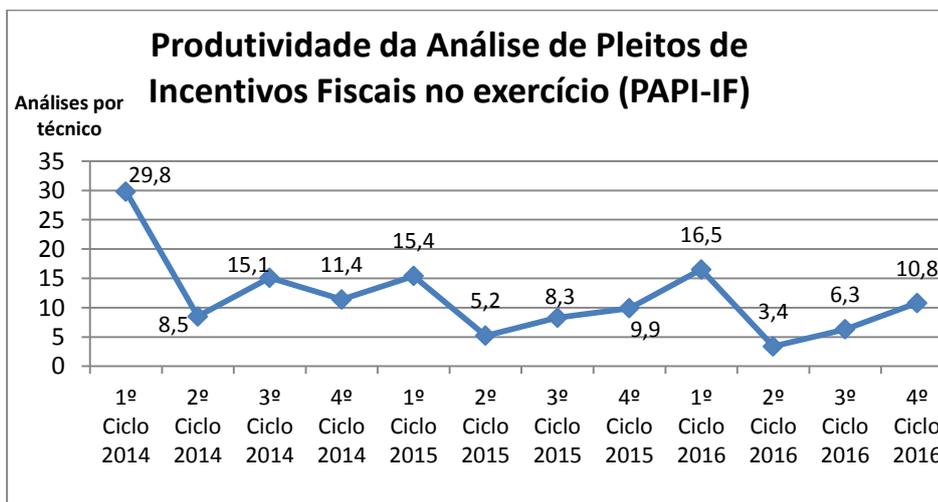

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

### 3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de vitorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{154}{10} = 15,4 \text{ vitorias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): .....(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 154 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda. Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	7,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	8,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	20,1 vistorias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vistorias/equipe	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	9,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

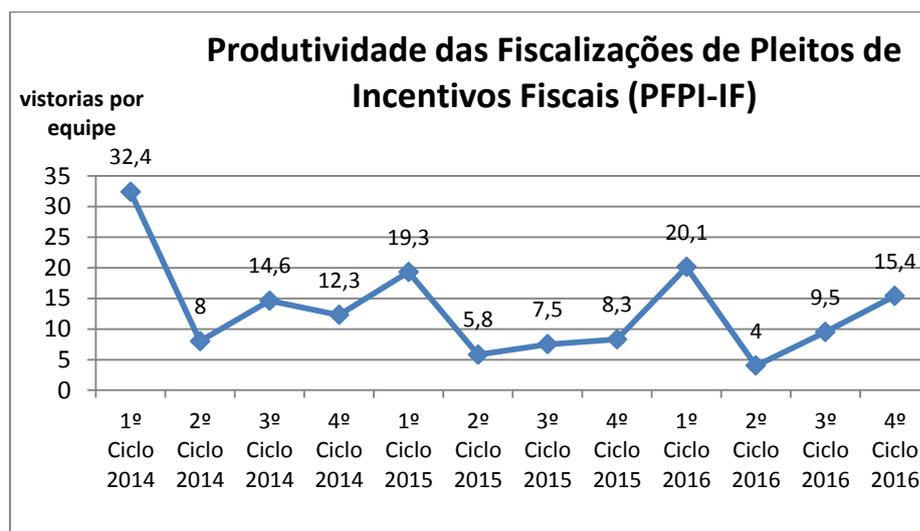

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 4 - Indicadores de Gestão de Convênios

### 4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{2 \times 100}{2} = 100\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-nov/2016.

f) Comentários: Houve o recebimento de 02 novas propostas, cujas análises foram concluídas até a data do presente relatório. Das propostas recebidas, 01 trata-se de convênio e 01 é TED.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	91,2%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

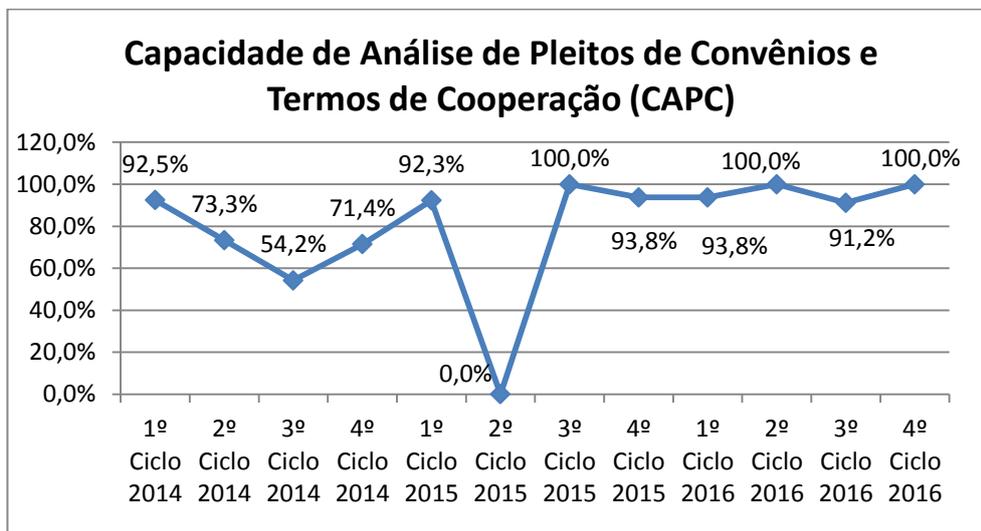

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{2 \times 100}{2} = 100\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-nov/2016

f) Comentários: Foram analisadas 02 propostas, todas aprovadas.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	67,7%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

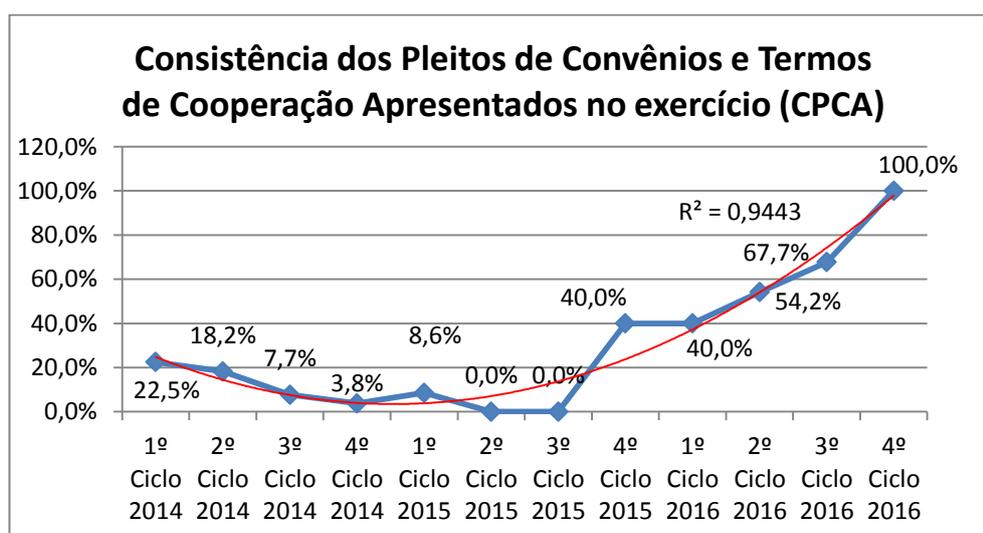

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} =$

$$= \frac{0 \times 100}{2} = 0,00\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-nov/2016

f) Comentários: Foram recebidas 2 propostas, das quais nenhuma foi rejeitada.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	20,6%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

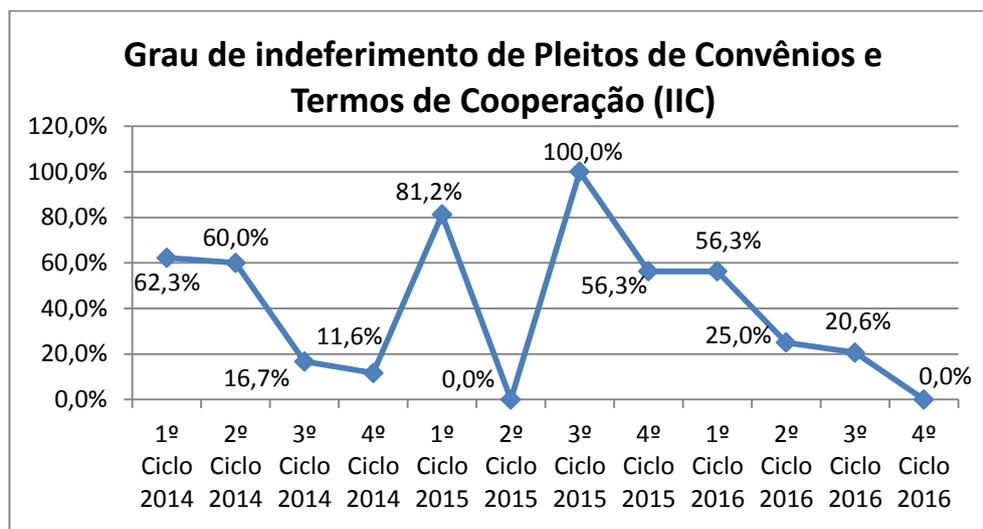

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

**Notas:**

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

**4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)**

a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{4 \times 100}{5} = 80\%$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-nov/2016

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 4 fiscalizações (2 de TEDs e 2 de convênios) sob a responsabilidade desta Coordenação Geral.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

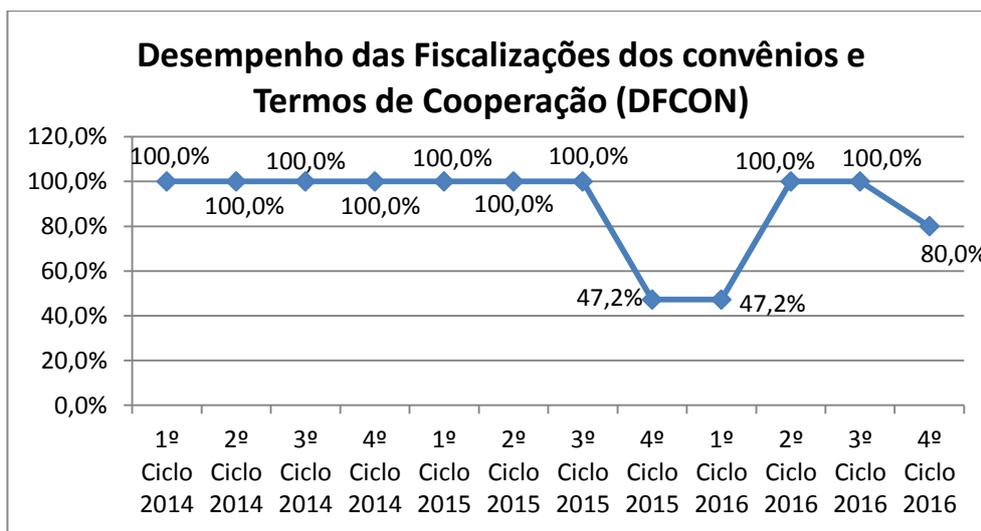

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, entre janeiro e novembro de 2016.

**ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE**  
**JANEIRO A NOVEMBRO 2016**

<b>EVENTO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>PARTICIPANTES</b>
Reunião de acompanhamento dos TEDs (eólica) com o Centro de Energias Renováveis // SUDENE	08 março	Recife PE	Maria Helena e Isis
Acompanhamento do TED “Mulheres na Construção Civil” – SUDENE/IFPB	06 de abril	Paraíba – João Pessoa	Macira e Givanildo
Acompanhamento do Convênio SUDENE/CONDEPE-FIDEM nº 794329/2013 - Fortalecimento Institucional – PE: Seminário Norte Metropolitano e Mata Norte – Desafios e Oportunidades (Meta 1)	28 de abril	Centro Mariápolis – Igarassu/PE	Vera Lúcia, Maria Helena, Victor, Teresa, Marcelo Viana
Acompanhamento do TED “Construindo com Mulheres” – SUDENE/Município de Maceió/AL	14 a 15.05.2016	Alagoas - Maceió	Macira e Givanildo
Apresentação do Diagnóstico Preliminar do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Salgueiro e seu entorno, Convênio SUDENE/CONDEPE-FIDEM 792551/2013	01 a 03.06.2016	Salgueiro PE	Maria Helena, Vera Lúcia, Isis
Oficina de Apresentação do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência do Município de Bom Conselho e Entrega dos Livretos	06 a 07.06.2016	Bom Conselho PE	M <sup>a</sup> Helena, Vera Lúcia, Teresa, Renato, Givanildo e Macira
Reunião SEMAS/Prefeitura de Goiana – APL/Rota do Marisco (ref. CV 822604/15)	30.05.2016	Recife	Reunião SEMAS/Prefeitura de Goiana – APL/Rota do Marisco (ref. CV 822604/15)
Reunião SUDENE/SEMAS-PE ref. CV 822604/2015 – Monitoramento das providências (Condições suspensivas)	28.06.2016	Recife PE	Almiro, Vera Lúcia, Marcelo Viana, Marcelo Saiki
Reunião com a Secretaria do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária/Maceió-AL, sobre liberação de 2 <sup>a</sup> e prorrogação vig. convênio e outros	12.07.2016	Recife PE	Carlos Almiro, Macira, Raul
Reunião SUDENE/EMEPA-PB, sobre alteração de metas e troca de equipamento.	22.07.2016	Recife PE	Carlos Almiro, Marcelo Viana, Vera Assunção, Marcelo Saiki.

Continua

<b>EVENTO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>PARTICIPANTES</b>
Acompanhamento do Convênio 794329/2013 – Condepe/Fidem, Meta 2 - que se refere às capacitações dos servidores municipais dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	28.07.2016	Paulista PE	Teresa Maria
Oficina de Boas Práticas no Cultivo de Plantas Medicinais, Hortaliças e Frutíferas, objeto TED nº 006/16 - SUDENE/UFPE, “CVT Fitoterápicos”	28.07.2016	Brejo da Madre de Deus PE	Renato
Acompanhamento do Convênio 794329/2013 – SUDENE/Condepe-Fidem – Fortalecimento Institucional	01.08.2016	Igarassu	Teresa e Victor
Reunião de Monitoramento SUDENE e Agencia CONDEPE/FIDEM – convênios ref. aos projetos: Fortalecimento Institucional RMR e MN – PE; Plano de Desenvolvimento de Bom Conselho; e Plano de Desenvolvimento de Salgueiro e entorno.	02.08..16	Recife PE	Carlos Almiro, Maria Helena, Vera Lúcia, Victor Uchôa, Teresa Maria.
Reunião ref. Convênio SUDENE/SEIRHACT-PB – Projeto ZEE Borborema	04.08.2016	João Pessoa PB	Carlos Almiro, Maria Helena, Vera Assunção.
Acompanhamento da Meta 2 do Convênio 794329/2013 - Condepe/Fidem, que se refere às capacitações dos servidores municipais dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	09.08.2016	Paulista PE	Victor Uchôa
Acompanhamento das ações do Projeto de Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano, Convênio nº 813986/2014 – SUDENE/EMEPA-PB.	10 a 12.08.16	Soledade PB	Marcelo de Castro Viana
Acompanhamento da Meta 2 do Convênio 794329/2013 – SUDENE/Condepe-Fidem, que se refere às capacitações/servidores dos municípios da Mata Norte e Metropolitana Norte de PE	11.08.16	Igarassu PE	Victor Uchôa

Continua

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Acompanhamento do Convênio nº 792551/2013 – SUDENE/CONDEPE/FIDEM. Evento: 2ª Oficina de Validação das Diretrizes Gerais e Propostas do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.	17 a 19.08.2016	Salgueiro PE	Vera Lúcia, Victor Uchôa
Reunião com Profª. Márcia Vanusa e Prof. Ari sobre TED SUDENE/UFPE – Projeto “Inventário da Caatinga” e sobre proposta de vídeo documentário Plantas da Caatinga	19.08.2016	Recife PE	Teresa, Renato
Acompanhamento de etapa do TED SUDENE/UFPE – Projeto “Inventário da Caatinga”.	05 a 06.09.2016	Recife PE	Teresa, Renato, Vera Lúcia, José Aildo e Isis
Acompanhamento das ações do Projeto Fortalecimento da Caprinocultura de Leite no Ceará, Convênio nº 812155/2014 – SUDENE/SDA-CE.	12 a 15.09.16	Jaguaretama e Banabuiú CE	Marcelo de Castro Viana, Marcelo Saiki Braga
Realizar a supervisão final do convênio nº 789015/2013, celebrado com o Município de Currais Novos, no Estado do Rio Grande do Norte, com vistas à emissão de Laudo Técnico.	06 a 08.10.16	Currais Novos, Natal RN	Marcelo Viana, Agrimon Marcos
Acompanhamento de etapa do TED SUDENE/UFPE – Projeto “Inventário da Caatinga”.	08 a 09.11.2016	Recife PE	Teresa, Miguel (CGEP)

### **PROPOSTAS RECEBIDAS - JANEIRO A NOVEMBRO / 2016**

Entre janeiro e novembro de 2016, a coordenação recebeu via SICONV 25 propostas, todas relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”, na ação 7K66, referentes a emendas parlamentares do Rio Grande do Norte. Além disso, foi recebida 1 proposta para Termo de Execução Descentralizada.

#### **4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)<sub>Conv</sub>**

a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$


b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

- d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: **Não Informado pela unidade.**
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	Não informado pela unidade	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

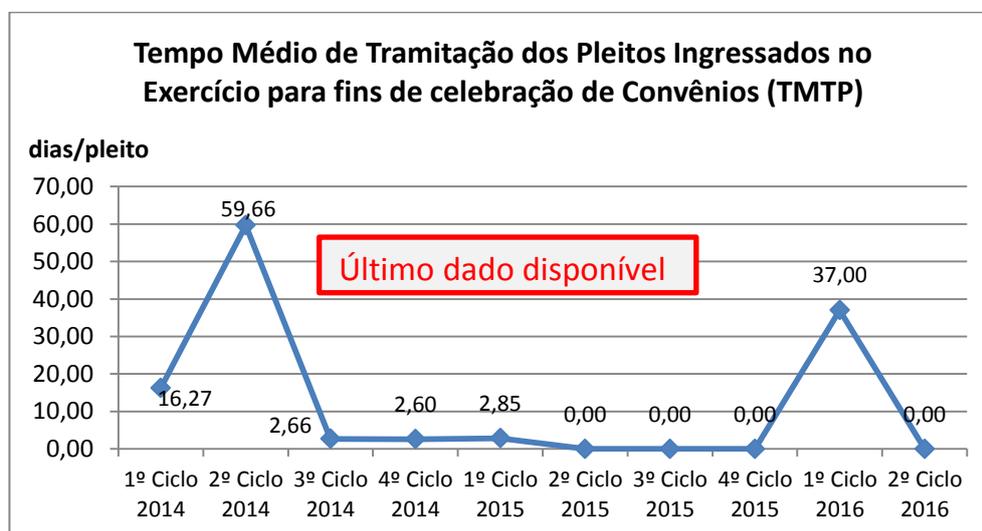

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (**em condições de conformidade**) até sua celebração (assinatura pelas partes).

**Notas:**

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;


- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

#### 4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

- a) Fórmula: 
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$$
- b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: **Não Informado pela unidade.**
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	39,25 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	Não informado pela unidade	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

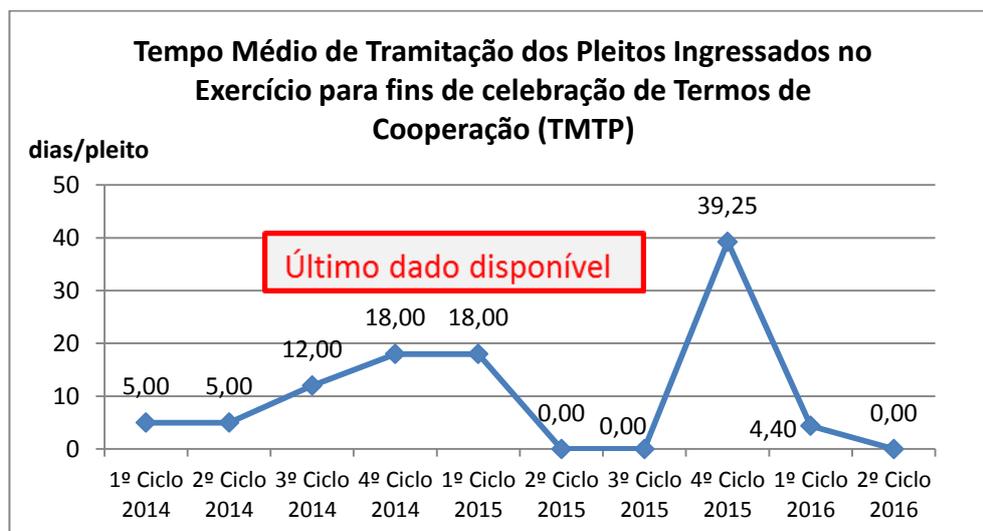

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

#### 4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_a \text{ Aprovar}_{FINAL}}{\text{Convênios}_a \text{ Aprovar}_{INICIAL}}$$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%) = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%) : .....% (Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: **Não Informado pela unidade.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	Não informado pela unidade	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

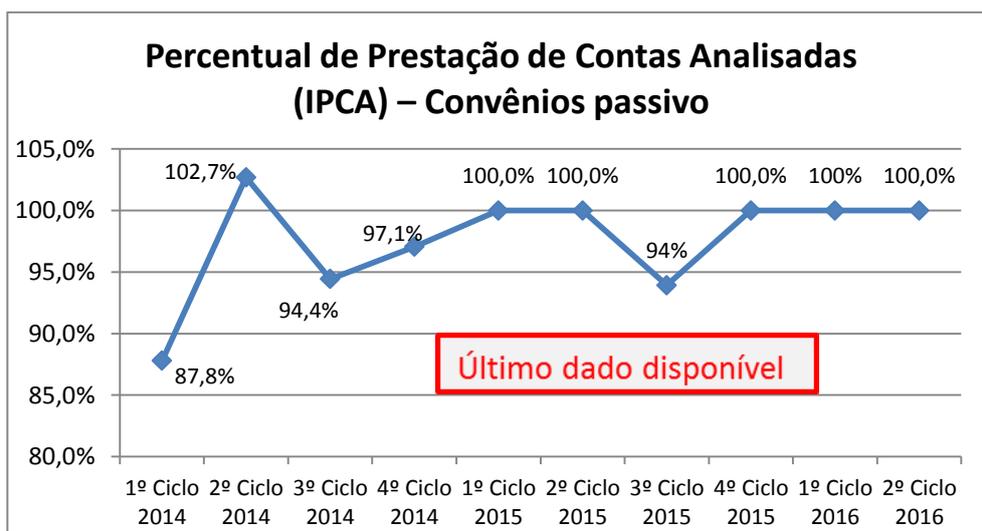

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

#### 4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:  $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo:  $IPCA (\%)_{SICONV} = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%): ..... %(Quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2016

f) Comentários: **Não Informado pela unidade.**

g) Resultados anteriores:

Jan a Ddez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	87,5%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	Não informado pela unidade	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

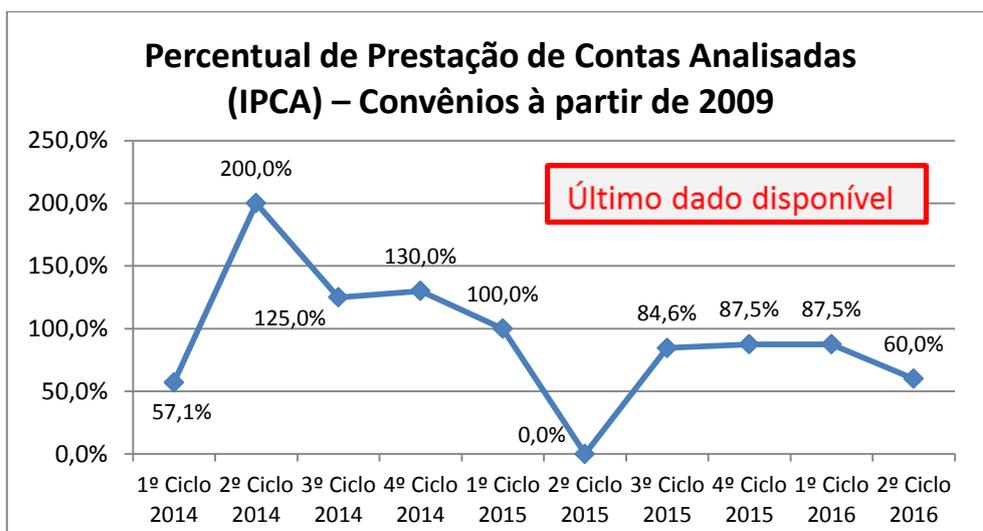

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

## 5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

### 5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{144 \times 100}{200} = 72\%$$


b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-nov/2016
- f) Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores foi atingida em 72%, alcançando 144 (cento e quarenta e quatro) servidores. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) inscrições efetivamente realizadas.
- g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	69%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

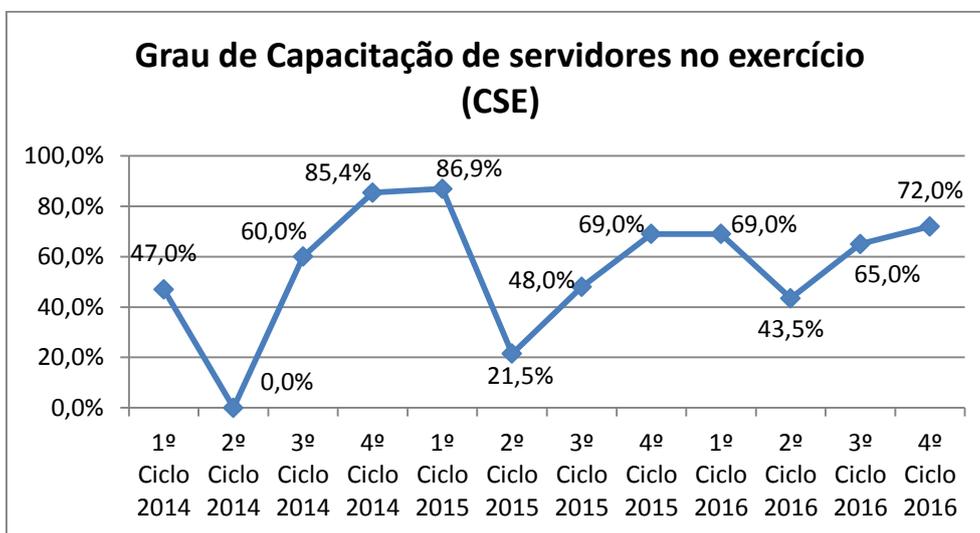

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


## 5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{67 \times 100}{50} = 134\%$$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-nov/2016
- f) Comentários: Foram realizados 67 (sessenta e sete) eventos de capacitação, priorizando os cursos *in company* e na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	180%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	84%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

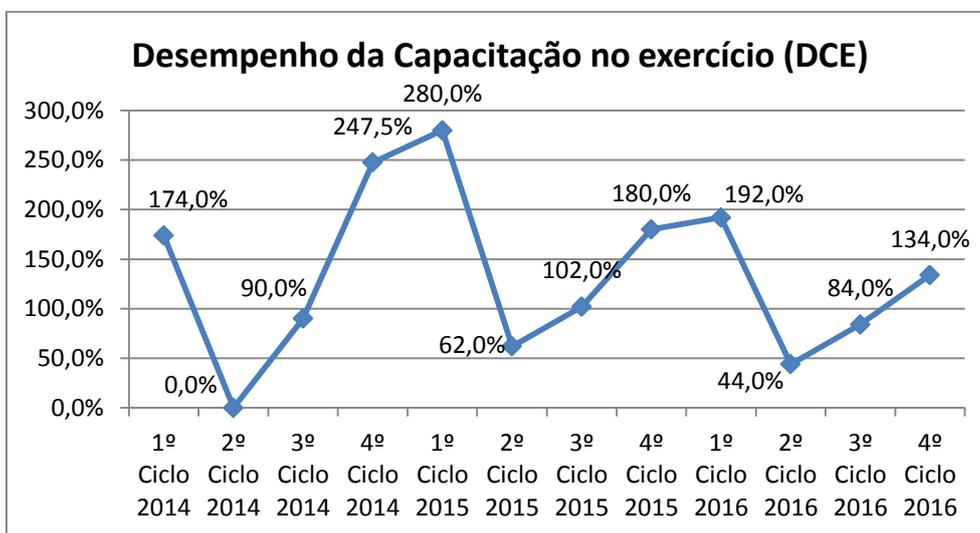

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


### 5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: 
$$\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{130.976,63 \times 100}{398.404,00} = 32,87\%$$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100%
- e) Periodicidade: Jan-nov/2016
- f) Comentários: Do valor de R\$ 398.404,00 (Trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quatro reais) a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 113.781,85 (Cento e treze mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) e R\$17.194,78 (Dezessete mil cento e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) com diárias e passagens, representando 32,87 %. Conforme o Plano Anual de Capacitação 2016 e as normas legais foram priorizados os cursos realizados na cidade do Recife, *in company* e promovidos por Escolas de Governo.
- g) Resultados Anteriores (NIC):

Jan a dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	18,2%	3º ciclo 2016

- h) Representação gráfica:

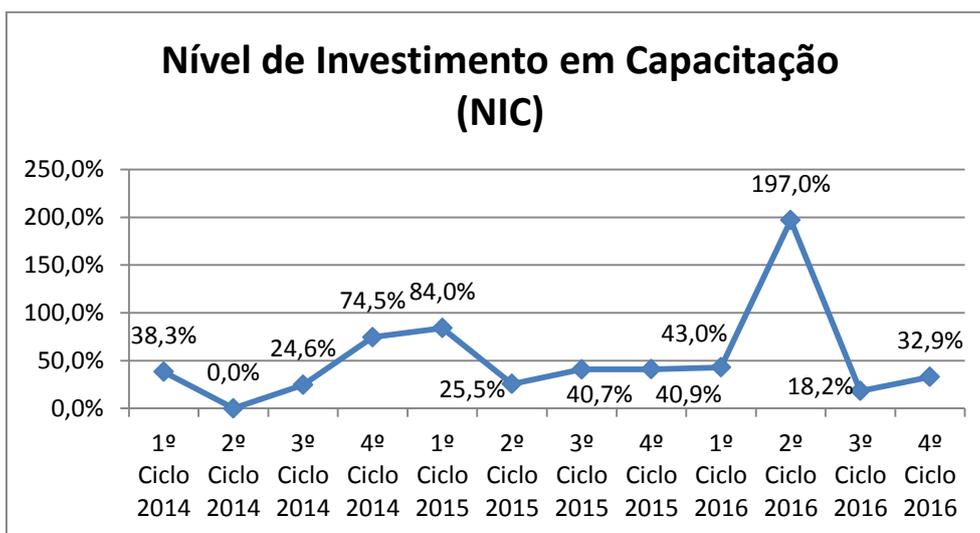

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

## 6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

### 6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos<sup>1</sup> =

$$\frac{67\% + 90\% + 38\%}{3} = 65\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)


e) Data da aferição: 30/11/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (67%); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (90%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (38%). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Jan a dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	47,6%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	58,70%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	61,33%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	64,7%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	65,7%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016

h) Representação gráfica:

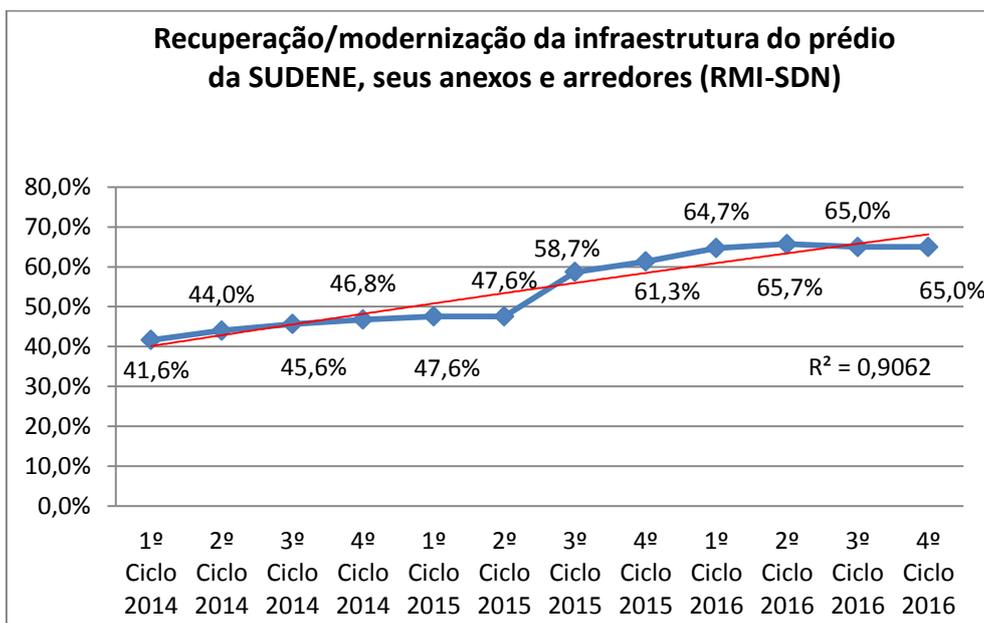

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

**Notas:**

<sup>1</sup> O percentual de execução de cada projeto é obtido da média aritmética geral lida no respectivo Plano Operativo. Neste caso, os POs 80, 81 e 82.

**6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)**

a) Fórmula:  $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}}$

$$\frac{(3.337.367,25+6.458.613,62 +100.000,00) \times 100}{3.459.991,25+8.670.544,86+148.000,00} = 80,6 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, recuperação das fundações do prédio sede e sistema de energia) da SUDENE.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 30/11/2016

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 3.337.367,25 e limite autorizado acumulado=R\$ 3.459.991,25); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização

das subestações elétricas do Edif. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).


g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a dez/2014	71,9 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	71,2 %	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	78,9%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	79,1%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	79,1%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	80,6%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	80,6%	3º ciclo 2016

**Nota:**

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h) Representação gráfica:

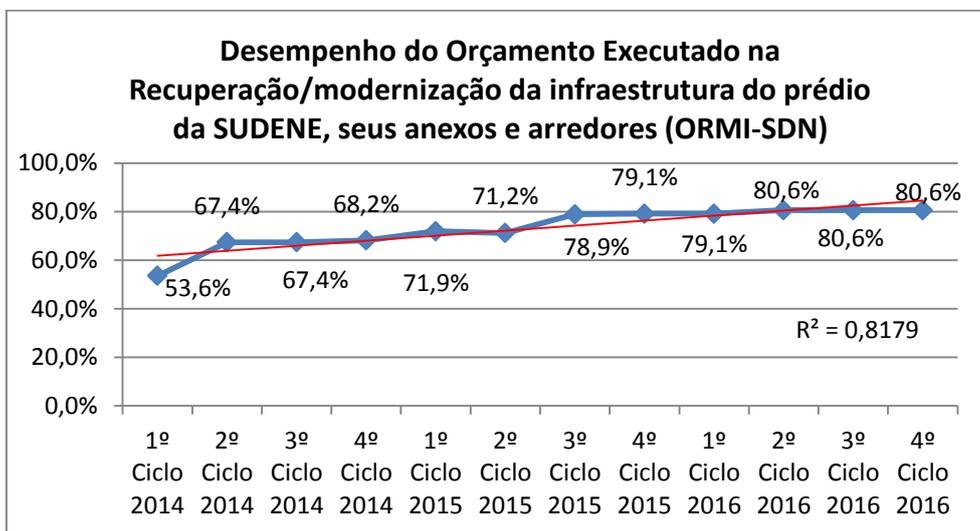

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) (Resultado out/15-set/16)

Os resultados alcançados pelas metas fixadas em 21 de dezembro de 2015, por meio da Portaria SUDENE nº 166 para o período out/2015-set/2016 foram divulgados pela Portaria SUDENE nº 140, de 26 de outubro de 2016, e estão reproduzidos no quadro abaixo.

Esses resultados estão disponíveis no site da SUDENE, no endereço <http://www.sudene.gov.br/aceso-a-informacao/institucional/gestao-institucional>, item “Legislação” da página “Gestão Institucional”

**Quadro de Metas de Desempenho Institucional**  
**Resultados do período out/2015-set/2016 com base na Portaria SUDENE nº 140/2016**

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
D4-Fortalecer a Imagem da SUDENE	D4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Eventos temáticos realizados	2	100,0 %	80,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1ª Oficina Rotas da Integração Macrorregional Nordeste (demonstrado por Plano Operativo)</li> <li>Fórum Sudene de Energia e Meio Ambiente (demonstrado por meio de Planos Operativos)</li> </ul> (CGDS/DPLAN)
D4-Fortalecer a imagem da SUDENE	D4.1-Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Encontros realizados	3	100,0%	80,0	Realização de encontros abordando temas ambientais (Café com Sustentabilidade) Possíveis temas: 1. Energias Renováveis e Zoneamento Ecológico-Econômico - Reunião de Kick Off dos TEDs formalizados em 2015; 2. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Sudene; 3. ODS nº 7 – Energia. (demonstrado por meio de Planos Operativos) (CDGS/DPLAN)
D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1-Moderinizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Planejamento realinhado/ implementado	35%	100,0%	80,0	Execução do realinhamento/atualização do Planejamento Estratégico. <sup>1</sup> (demonstrado por meio de Plano Operativo) (CGGI)
Programa 2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária (PPA 2011-2015)	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Projeto realizado	50%	100,0%	80,0	Execução de projeto com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco para implantação do padrão de qualidade no “Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos em Pernambuco - Qualidade Botânica Tradicional e Molecular, Química e Microbiológica” –(CGEP/DPLAN) (demonstrado por meio de Plano Operativo)
D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação aos semiárido	Relatório	100%	100,0%	80,0	Relatório para Implementação da infraestrutura necessária para instalação de área de geoprocessamento na SUDENE. (demonstrado por meio de Plano Operativo) (CGEP/DPLAN)
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas.	100%	100,0%	80,0	Análise das consultas prévias protocoladas junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 3º, art. 18 do Decreto nº 7.838/2012). (demonstrado por meio de indicador) (CGDF/DFIN)

Continua

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2029- Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamentos analisados.	100%	100,0%	80	Análise da participação do FDNE nos projetos aprovados pelos agentes operadores protocolados junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 2º, art. 22 do Decreto nº 7.838/2012). (demonstrado por meio de indicador) (CGDF/DFIN)
D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovadas	300	100,0%	80	Aprovação de incentivos fiscais. (demonstrado por meio de indicador) (CGIF/DFIN)
2111 - Gestão e Manutenção do MI	4575 - Capacitação de Servidores Públicos Federais - Plano Orçamentário 0001	Projetos implementados	100%	95,0%	76	Previsto 1 (hum) projeto do Plano de Desenvolvimento de Pessoas no período 2016-2019: PO Gestão por Competência. (Demonstrado por meio de Plano Operativo) (CGGP/DAD)
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do M.I	2000 - Administração da Unidade, plano orçamentário 0002.	Obra executada	85%	100,0%	80	Obra de recuperação do Anexo Nilo Coelho: (realizado: 89%) (Demonstrado por meio de Plano Operativo) (CGAF/ENG/DAD)
<b>MÉDIA ARITMÉTICA</b>				99,50%	79,60	


Fontes: : Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

<sup>1</sup> Prazo alterado de 12 para 24 meses em razão de mudanças na Superintendência, ocorrida entre abril e julho/16, inclusive com a saída do então Chefe de Gabinete, Uyrán Costa, da equipe do então Superintendente João Paulo, que vinha gerenciando o trabalho, provocando a paralisação destes, além dos cortes orçamentários que inviabilizaram uma possível contratação, levando ao ajuste do percentual de execução referente ao período de apuração deste ciclo, ajuste esse que recebeu a aprovação na 237ª reunião de 27/07/2016, da Diretoria Colegiada.

Notas:

- Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada
- Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional
- Os resultados referem-se ao 7º Ciclo de avaliação GDPGPE e 4º Ciclo de avaliação GDACE- 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.
- Os resultados são calculados a cada ciclo de 12 meses, completados em setembro de cada ano pois se aplicam, após findo essa data, a algumas gratificações funcionais.
- Cada ponto percentual equivale a 0,8 (8 décimos) de ponto para fins de conversão, cujo máximo para essas gratificações, no que tange à parcela institucional, pode atingir até 80 pontos, que equivaleria a 100 % de percentual atingido para todas as metas.

a) Representação gráfica:

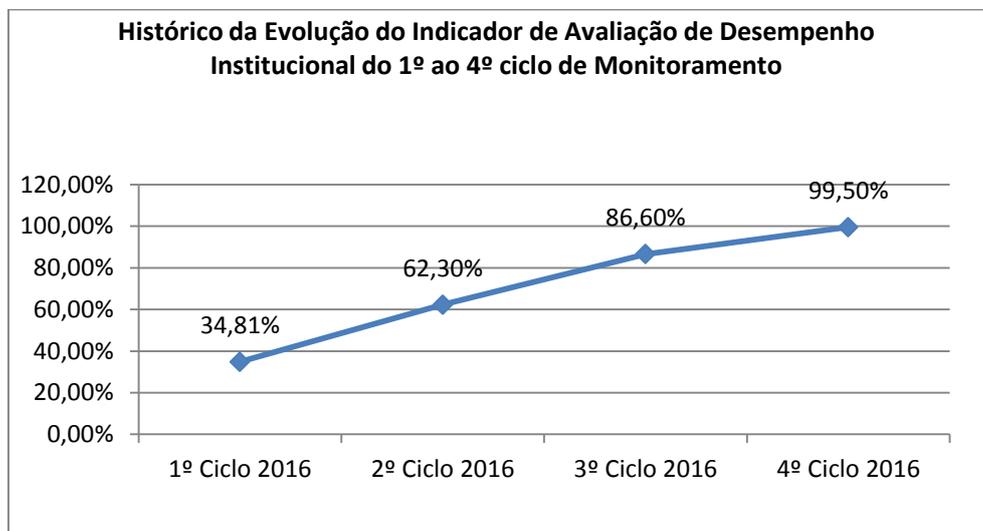

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: a informação referente ao 4º ciclo de monitoramento é a mesma da data de apuração do resultado final, que foi realizada na posição de 30/09/2016.

## 8 – Observações e Deliberações em plenária de 15/12/2016

- O Superintendente da SUDENE, Marcelo José Almeida das Neves indagou se os recursos do orçamento de 2017 poderiam ser utilizados em projetos de 2016? A CGDS respondeu que não. Pediu então, que as unidades informem onde a Superintendência deve promover tratativas junto a alguma Secretaria do MI para viabilizar projetos ou compor alguma execução orçamentária em projeto de interesse regional.

- Maria Helena (CGDS): destacou que em razão das restrições orçamentárias, principalmente para o acompanhamento dos convênios, as unidades precisam fazer uma estimativa planejada. Nesse sentido, o Superintendente Marcelo José Almeida das Neves pediu a demanda das unidades para poder solicitar tais recursos aos ministérios. Destacou também, a necessidade de uma reunião interno com a administração para se estimar os recursos necessários para o acompanhamento dos projetos, com a participação do Coordenador-Geral de Logística, Administração e Finanças, Brivaldo Soares, enfatizando prioridade para aqueles projetos que estão finalizando.

- O Superintendente registrou também, a necessidade de otimizar a execução dos convênios e dos Termos de Execução Descentralizada - TEDS estimulando o apoio a projetos de desenvolvimento integrado, até como forma de reduzir os custos de acompanhamento. Ainda nessa linha, manifestou o desejo de que os projetos e planos da SUDENE sejam realizados priorizando a maior abrangência possível de municípios e assim um maior impacto. E no caso dos TEDs, sugeriu pensar uma função de gerenciamento mais estratégico “escolher bem o que vai ser apoiado para se obter um impacto positivo junto à população”.

Em relação a projetos específicos, os comentários foram os seguintes:

- PO 01-Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE: foram resolvidos os problemas de recursos que tinham sido expostos na última reunião de monitoramento. Convênio prorrogado até 30 de junho de 2017.

- PO 02: Projeto realizado em conjunto com a secretaria de meio ambiente de Pernambuco, que teve problemas na execução dos serviços pela empresa contratada, havendo a necessidade de contratação de nova empresa. Atualmente está na fase de realização de workshops, faltando a liberação da 2ª parcela para também ser finalizado em 2017.
- A coordenadora Maria Helena expôs sua preocupação com a liberação de recursos para os convênios que estão em fase de finalização, bem como, recursos para o acompanhamento final.
- PO 19- Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE: O projeto encontra-se atrasado por que surgiu no meio da execução a necessidade de registro de novas etapas e problemas quando da inserção da prestação de contas no Sistema SICONV, tendo o executor que se adaptar às regras do referido sistema, entretanto o projeto já foi finalizado e o laudo técnico será emitido em breve.
- O Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) da DPLAN, Frederico Cavalcanti fez um panorama geral dos projetos da CGEP, onde vários indicadores estão sendo estudados para consubstanciar políticas voltadas para o nordeste. Pediu a reestruturação da coordenação de planos, para que ações e planos que estão sendo realizados de forma divergente pelos estados possam ser uniformizados pois isso está repercutindo nas ações de apoio da Autarquia em relação a entidades que querem implementar seus planos integrados de desenvolvimento. Salientou ainda, que alguns projetos, como os “boletins” temáticos, em processo de elaboração, serão divulgados nas reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE-CONDEL. E exemplificou alguns resultados cuja realidade pode estar sendo desconhecida dos governadores do Nordeste: Os resultados da educação quando divulgados pelo Governo Federal são relativamente bons em termos de Brasil, mas se mostram ruins quando regionalizados, conforme se mostraram para o Nordeste, revelando que não existe uma visão regional dentro da Política Nacional e isso foi mostrado na última reunião da CGEP/DPLAN para o TCU. Que a SUDENE tem sofrido as consequências das atuações desintegradas dos diferentes Ministérios na Região. Também registrou que “as Diretorias da SUDENE estão trabalhando isoladamente e isso precisa ser repensado”. E completou...”vamos aplicar uma metodologia para verificar a eficácia dos programas a partir da proposta metodológica de avaliação de planos e programas pedida e apresentada ao TCU, que terá rebatimento em algumas metas fixadas para o período 2016-2017”.
- PO 23-Produto 1-Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal: De acordo com Frederico Cavalcanti (Coordenador-Geral da CGEP/DPLAN) trata-se de trabalho da SUDENE inédito entre as instituições no Brasil. A ideia geral é não se manter, como tradicionalmente ocorria, uma base de dados na SUDENE, mas na nuvem. Seguindo uma metodologia padrão mundial de disponibilização de dados, o projeto disponibilizará uma primeira versão de dados regionais, em março ou abril de 2017, tendo por base os boletins internos produzidos pela CGEP/DPLAN/SUDENE. A novidade são alguns indicadores institucionais de entidades que trabalham na área da pesquisa, da inovação, meio ambiente etc., como a gestão orçamentária e financeira dessas entidades, gestão do lixo, do saneamento...”. O projeto está sendo feito com a Universidade Federal de Pernambuco, auxiliado pelas Prof<sup>as</sup> Bernadete e Ana Carolina que desenvolveram estudo sobre o tema “Dados Abertos”.
- A Coordenadora-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF/DFIN), Sabrina Lyra lembrou, que boa parte dos projetos do FDNE está com status geral “atrasado” em virtude da não emissão dos certificados de implantação por alguns agentes operadores, mas que já há alguns expedidos, que serão

analisados em breve. Acrescentou que no mês de nov/16 correspondência foi enviada aos bancos e está aguardando retorno.

- PO 40-Transnordestina Logística S/A - TLSA: A última liberação para o projeto foi realizada em agosto de 2014, desde então foi informado para a empresa que novas liberações só seriam realizadas com a adequação do cronograma físico ao financeiro, o que até o momento não foi realizado, não sendo também solicitadas as liberações pendentes pela empresa. Sobre o assunto o Superintendente Marcelo Neves externou a sua preocupação, principalmente pelo fato de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vem realizando tratativas para pedir o cancelamento da concessão. Ademais também preocupa a deterioração da ferrovia pelo tempo e pela ferrugem que afeta a infraestrutura.

- PO 41-FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A): foi aprovada a última liberação pela diretoria colegiada e se está no aguardo da liberação dos recursos pelo Ministério da Integração Nacional.

- PO 74-Atualização do Regimento Interno com base no Decreto nº 8.891/2016: Carmen Fonseca, Assistente Técnica da CGGI informou que o projeto encontra-se em fase de conclusão, as unidades enviaram as mudanças e o processo seguiu para a Procuradoria da SUDENE se pronunciar, dar seu parecer e na sequência, ser levado à apreciação e deliberação da diretoria colegiada, acrescentando que o Regimento interno poderá ser objeto de atualização a qualquer tempo.

- O Coordenado-Geral da CGEP, Frederico Cavalcanti, comentou a importância da revisão do regimento interno após término da revisão do planejamento estratégico institucional vigente.

- PO 78-Gestão por Competências: a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Ângela Lima informou que as atividades do projeto para o ano de 2016 foram finalizadas, o plano para o desenvolvimento de competências realizado ainda será encaminhado ao comitê de gestão de pessoas, e assim poderá receber modificações para então ser implementado.

- PO 84 - Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO: Informou o Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, Josué Ribeiro, que o sistema já dispõe de diversos módulos concluídos e em uso, e que até fevereiro de 2017 será possível o acesso do agente operador.

O Superintendente Marcelo Neves indagou o Coordenador-Geral da CGTI sobre o andamento do novo site e da padronização orientada pelo Governo Federal. Este informou que a sua parte estava concluída e que a disponibilização do site só dependia da migração dos dados do site antigo e que tal tarefa dependia da Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional (ASCOM) da SUDENE. Perguntado a respeito dessa etapa o Analista Técnico Administrativo, Agnelo Câmara (ASCOM) informou que a previsão é o início de março/2017.

## 9 – Conclusão

Ao longo de 2016 foram realizados quatro ciclos de monitoramento, todos sob coordenação da CGGI, destacando-se o fato de que essa atividade vem cumprindo o objetivo de apresentar uma síntese dos principais projetos em andamento, compartilhar resultados alcançados, apontar dificuldades, levantar soluções e subsidiar a alta administração na adoção de medidas que levem à redução de riscos na execução de sua programação estratégica.

O 4º Ciclo de Monitoramento acompanhou um total de 84 projetos divididos entre CGDS (18), CGEP (20) e CGCP (01)/Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas; CGDF (34)/Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos; Coordenação-Geral de Gestão Institucional (01); Procondel (01); e CGTI (01), CGGP (03), CGC (02), CGAF (03)/Diretoria de Administração. Entre os projetos destacados na reunião estão o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência do Município de Bom Conselho/PE, Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal, empreendimentos financiados pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), atualização do Regimento Interno, Gestão por competências e Sistema Informatizado de Gestão do FDNE/FDA/FDCO

A agenda para os ciclos de 2017 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2016	10/02/2017	23/02/2017
2º	31/05/2017	9/06/2017	21/06/2017
3º	31/08/2017	8/09/2017	22/09/2017
4º	30/11/2017	6/12/2017	15/12/2017

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

# **ANEXO I**

## **Quadros do Monitoramento**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 01</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.5. Fortalecer as administrações públicas.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
<b>Projeto:</b>	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 139.865,15
mai/12	139.865,15	7.361,32	147.226,47	A realizar no exercício	R\$ 94.240,34
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	<b>234.105,49</b>	<b>12.321,33</b>	<b>246.426,82</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 94.240,34
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 234.105,49

<b>Previsão de Conclusão:</b>	02/03/2018	<b>CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	<b>Vigência: 18/12/12 a 21/01/2017</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012	100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012	100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012	100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012	100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012	100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012	100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013	100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>58,8%</b>	<b>Atrasado</b>		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013	100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	<b>Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013		93,8%	<b>Atrasado</b>		
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014	100,0%	<b>Concluído</b>	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014	100,0%	Concluído		

9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34	25/11/2016	25/11/2016	94.240,34	100,0%	Concluído	No ciclo anterior, foi recomendada a prorrogação da vigência do convênio e que aguardassemos a liberação da 2ª parcela que aconteceu em 25/11/2016	
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016			28/5/2015	21/01/2016	100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016			22/1/2016		50,0%	Atrasado	Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final.	Convênio será prorrogado até 30/06/2017.
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	6/6/2016	7/6/2016			6/6/2016	7/6/2016	100,0%	Concluído	Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho.	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	02/03/2017	02/03/2018					0,0%	Atrasado	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 234.105,49	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 234.105,49	<b>79%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**  
 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**  
**4º Ciclo - 2016.** Liberação da segunda parcela realizada, no entanto devido ao atraso na liberação solicitou-se a prorrogação de ofício.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício. Liberação da segunda parcela realizada, no entanto devido ao atraso na liberação solicitou-se a prorrogação de ofício.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 02</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, conseqüentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
<b>Projeto:</b>	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	ONVENENT	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>530.482,50</b>	<b>58.942,50</b>	<b>589.425,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/03/2018	<b>CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	Vigência de 28/12/2012 à 30/12/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Convenente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>39,8%</b>	<b>Atrasado</b>		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	<b>Concluído</b>		

6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	01/09/2013	30/10/2016	R\$ 325.222,88	15/11/2014	--	--	80,0%	<b>Atrasado</b>	Segundo informações dadas pela convenente o processo licitatório para contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1, foi realizado e homologado no dia 07/10/2015, aguardando o repasse da segunda parcela para execução. Resta a contratação dos serviços para a realização do Seminário final.	Convenente ajustou Plano de trabalho para a nova vigência de 30/12/2016. Convenente enviou solicitação de prorrogação da vigência do convênio por 12 meses, parecer técnico favorável à ampliação por 8 meses encaminhado para setor de convênios.
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/07/2014	30/12/2016	R\$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	40,0%	<b>Em Andamento</b>		
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	<b>Concluído</b>	Etapa concluída após a retomada da realização dos Encontros com a contratação de uma nova empresa.	
**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	<b>Concluído</b>	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/11/2016	30/11/2016	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do Concedente. No momento, encontra-se em análise pela Concedente justificativas apresentadas pela Convenente a respeito de aspectos relativos a relatórios de execução.	
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	04/07/2016	30/11/2016	R\$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos.	
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	03/10/2016	30/12/2016	R\$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2014	30/12/2016	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	45,0%	<b>Em Andamento</b>		
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2014	15/12/2016	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	90,0%	<b>Em Andamento</b>	A convenente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluí-la.	
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/11/2016	30/12/2016	R\$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>		
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/03/2017	01/02/2018	--	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 530.482,50	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 265.241,25	<b>60%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

**Observações:**

\* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Solicitação de prorrogação da vigência do convênio por 12 meses, parecer técnico favorável à ampliação por 8 meses encaminhado para setor de convênios.

**4º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 03 (ex PO 04)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.		
<b>Projeto:</b>	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	Pago até o ano anterior	R\$ 485.874,65
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	A realizar no exercício	R\$ -
<b>485.874,65</b>	<b>25.572,35</b>	-	<b>511.447,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 485.874,65

<b>Previsão de Conclusão:</b>	12/08/2017	<b>CONVÊNIO Nº 794997/2013</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	<b>Vigência: 31/12/13 a 14/05/16</b>

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255)
--	---

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>	CGDS/SUDENE				<b>26/09/2013</b>	<b>17/01/2014</b>		<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	<b>Concluído</b>		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>	IDENE/SUDENE	<b>31/12/2013</b>	<b>31/07/2014</b>			<b>30/12/2014</b>		<b>60,0%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	<b>Concluído</b>	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	<b>Concluído</b>		
8	<b>Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais</b>	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%	<b>Concluído</b>	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	<b>Concluído</b>	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	<b>Concluído</b>	Produto 1 entregue a SUDENE.	

8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído	
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Técnica: Maria Helena de Castro Lima
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20 %)</b>									<b>18,0%</b>	<b>Em Andamento</b>	
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	12/08/2016	12/08/2017		12/08/2016			90%	Em Andamento	Relatórios de Execução Físico Aprovado. Aguardando a finalização da análise financeira para elaboração do Parecer Técnico Final
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 485.874,65	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 485.874,65	<b>98,0%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Etapas 8.6 repactuada

4º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 04 (ex PO 05)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.	
<b>Ação:</b>	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.	
<b>Finalidade da ação:</b>	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.			
<b>Projeto:</b>	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
OUT/2014	107.354,71	5.650,24	113.004,95	Pago até o ano anterior	R\$ 107.354,71
OUT/2015	100.187,91	5.273,04	105.460,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 100.187,91
<b>TOTAL</b>	<b>207.542,62</b>	<b>10.923,28</b>	<b>218.465,90</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	<b>CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 22/01/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 29/05/2015)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>			
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>50,6%</b>			
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	--	--		11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído		
10	<b>Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.</b>	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	18/03/2016	--	--	--	--	<b>90,0%</b>	Atrasado		
10.1	<b>Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados</b>	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	20/12/2015	--	--	--	--	<b>100,0%</b>	Concluído	No período de 08/08/2016 a 03/10/2016 foram inseridos pela convenente os relatórios de prestação de contas da execução parcial (meta 1), para avaliação desta SUDENE. Foram também iniciadas as análises necessárias do ponto de vista físico-financeiro. No entanto, em virtude do período de inatividade ocorrido no mês de outubro, em função de problemas de infraestrutura do prédio desta Sudepe, que levou à não conclusão do parecer final, foi necessário solicitar prorrogação de ofício do referido convênio.	
10.2	<b>Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados</b>	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	--	--	--	<b>70,0%</b>	Atrasado		
10.3	<b>Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.</b>	CONDEPE/FIDEM	15/02/2016	18/03/2016	--	--	--	--	<b>100,0%</b>	Concluído		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	-	-		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91	--	--	--	0,0%	Atrasado		
13	<b>Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento</b>	CONDEPE/FIDEM	21/03/2016	31/05/2016		04/07/2016	11/08/2016	--	<b>100,0%</b>	Concluído		
13.1	<b>Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.</b>	CONDEPE/FIDEM	15/04/2016	29/04/2016	--	04/07/2016	15/07/2016	--	100,0%	Concluído		

13.2	<b>Etapa 2.2:</b> Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	02/05/2016	13/05/2016	--	25/07/2016	05/08/2016	--	100,0%	Concluído		
13.3	<b>Etapa 2.3:</b> Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	16/05/2016	31/05/2016	--	09/08/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	25/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>						R\$ 207.542,62	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 107.354,71	71%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros Institucionais:**

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado ( 1ª TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, conseqüentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral para início das atividades. Item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

**4º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 05 (ex PO 06)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almir Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.			
<b>Projeto:</b>	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Cronograma de Desemolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56
ago/15	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
nov/16	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>359.682,64</b>	<b>18.930,66</b>	<b>378.613,30</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 138.415,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56

<b>Previsão de Conclusão:</b>	24/04/2018	<b>CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

Vigência: 23/02/2017

<b>Responsáveis técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Moreira - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>			
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013	100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013	100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013	100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013	100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013	100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014	100,0%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>52,4%</b>	Em Andamento		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015	100,0%	Concluído		
9	<b>Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno</b>	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	22/02/2017		28/08/2015		62,2%	Em Andamento		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014	100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015	100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.	

9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/04/2016	30/11/2016	R\$ 138.415,08				0,0%	Atrasado	A vigência foi prorrogada e as datas repactuadas.
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	21/07/2016	10/10/2016			17/08/2016		60,0%	Atrasado	Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	11/10/2016	22/02/2017					0,0%	A Iniciar	A vigência foi prorrogada e as datas repactuadas.
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	24/04/2017	24/04/2018					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 359.682,64	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 221.267,56	<b>72%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2

b) O conveniente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.

**4º ciclo 2016.**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 06 (ex PO 09)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
<b>Projeto:</b>	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

MÊS	Cronograma de Desemboio			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	<b>R\$ 343.585,70</b>	<b>R\$ 18.140,00</b>	<b>R\$ 361.725,70</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	Convênio Nº 813986/2014
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>39,6%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convênio solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		

11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/12/2016	-	24/10/2015	-	75%	Em Andamento	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.		
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	22/12/2016	-	03/12/2015	-	55%	Em Andamento	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.		
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/12/2016	-	14/09/2015	-	70%	Em Andamento			
14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	14/12/2016	-	27/11/2015	-	60%	Em Andamento	Foram ministrados os módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo		
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28				0%	Atrasado	Foi realizada visita técnica de acompanhamento do convênio em julho e solicitado ao convenente a elaboração da prestação de contas referente à 1ª parcela.	Aguardando envio da prestação de contas parcial pelo convenente, para liberação da 2ª parcela.
17	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	13/02/2017	17/02/2017	-			-	0%	A iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A iniciar</b>		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-			-	0%	A iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 343.585,70	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 206.151,42	<b>60%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

**Observações:**

**4º ciclo 2016**

Foi solicitada pela Convenente ampliação do prazo de vigência, que encontra-se em fase de análise pela Concedente.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 07 (ex PO 08)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
<b>Projeto:</b>	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	A realizar no exercício	R\$ 560.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>771.000,00</b>	<b>218.777,00</b>	<b>989.777,00</b>	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 560.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 211.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>									<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>	
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado			100,0%	<b>Concluído</b>	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
6	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014			100,0%	<b>Concluído</b>	
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015			100,0%	<b>Concluído</b>	
	<b>Execução (Peso 60%)</b>									<b>35,5%</b>	<b>Em Andamento</b>	Assinado o 1º Termo Aditivo em 31.03.2016, prorrogando a vigência do convênio para 22.12.2016.
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	100,0%	<b>Concluído</b>	
9	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016		100,0%	100,0%	<b>Concluído</b>	
10	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016		100,0%	100,0%	<b>Concluído</b>	
11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016			50,0%		<b>Atrasado</b>	Realizados 03 cursos um em cada município (Piquet Carneiro, Jaguaratama e Banabuiú), - 21/06/2016

12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016			33,0%	Em Andamento	Os 03 Dia de Campo foram realizados no município de Quixeramobim. - 29/10/2016	
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016			50,0%	Atrasado	O intercâmbio foi realizado na Estação Experimental de Pendências no município de Soledade no Estado da Paraíba. - 11/11/2016	
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/082016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído	A viagem teve por objetivo avaliar o andamento do projeto e verificar a possibilidade de liberar a segunda parcela dos recursos financeiros.	
15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00				0,0%	Atrasado	Com a nova data de vigência do convênio, houve a necessidade repactuar nova data.	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016					0,0%	Atrasado	Aguardando a liberação da 2ª parcela de recursos financeiros para a aquisição dos animais.	
Encerramento - 20%									0,0%			
17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	A iniciar		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 771.000,00	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 211.000,00	56%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

**Observações:**

4º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 08 (ex PO 10)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
<b>Projeto:</b>	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL (R\$)		
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	Pago até o ano anterior	R\$ 326.618,00
371.625,00		jun/15	371.625,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 743.250,00
371.625,00		set/15	371.625,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>1.090.800,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/08/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Juliana Borges e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Otávio Araujo Lessa Santos (coordenador)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>38,5%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00	
9	<b>Liberação da 1ª parcela</b>	COFC /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	24/03/2015	24/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	100%	Concluído		
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.	
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído		
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído		
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 41.750,00	Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL	

14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/03/2016	30/03/2016	-		Não informado		100%	Concluído	
15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			20%	Atrasado	Só foram adquiridos os 'tablets' dos materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho (R\$ 42.155,00).
16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		20/04/2016	22/06/2016		100%	Concluído	
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.
18	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/09/2016	R\$ 438.250,00				0%	Atrasado	Conforme Nota Técnica da SEMTABES, foi solicitada alteração dos valores das parcelas 2ª e 3ª com remanejamento de valores. Equipe técnica acatou a solicitação. A liberação do pag. aguarda finalização da prestação de contas parcial.
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras, auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso.	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2016	R\$ 371.625,00	15/04/2016			70%	Atrasado	Foram capacitadas 200 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. 15/06/2016
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	30/05/2016	-	15/05/2016	15/05/2016		100%	Concluído	
21	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2016	R\$ 305.000,00				0%	A Iniciar	Será atualizado.
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso.	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2016	R\$ 305.000,00				0%	A Iniciar	Será repactuado em dezembro.
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar	Será repactuado em dezembro.
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2016	-				0%	A Iniciar	Será repactuado em dezembro.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	30/06/2017	31/08/2017	-				0%	A Iniciar	
					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 1.069.868,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 326.618,00</b>	<b>58%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES -Estado de Alagoas

**Observações:**

Termo Aditivo de prorrogação do convênio para encerramento em 30/06/2017 foi assinado em 24/11/16. Será solicitado ajuste do PT para repactuar as etapas.

**4º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 09 (ex PO 11)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>		<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineamento de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.			
<b>Projeto:</b>	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
AGO/2015	R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	R\$ 499.949,49	Pago até o ano anterior	R\$ 458.149,49
OUT/2015	R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	R\$ 428.743,26	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 377.673,98
-	R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	R\$ 928.692,75	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 377.673,98
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 458.149,49

<b>Previsão de Conclusão:</b>	05/08/2017	<b>CONVÊNIO Nº 813695/2014</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	<b>Vigência: 31/12/13 a 08/03/17</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Conveniente	Beranger Arnaldo Araújo - SEIRHMACT/PB

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONS para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%	<b>Concluído</b>		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>7,5%</b>	<b>Em Andamento</b>		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R\$ 458.149,49	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 458.149,49	100%	<b>Concluído</b>		
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	50%	<b>Paralisado</b>	A Conveniente informou que o processo licitatório foi cancelado e ainda não têm data prevista para ser realizado.	

8	Consolidação do Projeto	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	11/05/2016	R\$ 41.304,00	--	--	--	0%	Atrasado	<p>Em 17/03/2016, a Conveniente inseriu no SICONV o Ofício/GS/ nº 0173/2016, no qual apresenta duas alternativas de orçamentos para o projeto para a análise deste SUDENE. A equipe técnica posicionou-se contra as duas proposições apresentadas pela Conveniente. Foi encaminhado um ofício à SEIRHMACT indicando o posicionamento da equipe técnica, bem como solicitando o agendamento de uma reunião presencial com os representantes da SEIRHMACT/PB, para tomada de decisão quanto aos encaminhamentos a serem adotados.</p> <p>Foi realizada uma reunião entre os gestores da SUDENE e da SEIRHMACT/PB, em João Pessoa/PB, em 04/08/2016, quando ficou acordado que seria concedida uma ampliação do prazo de vigência deste convênio por mais 180 dias para que a Conveniente tentasse solucionar as pendências encontradas. O convênio teve sua vigência prorrogada para 08/03/2017, entretanto, a Concedente ainda não ajustou o Plano de Trabalho à nova pactuação de vigência. A equipe técnica está analisando a alteração de orçamento encaminhada pela SEIRHMACT para prosseguir com o andamento do convênio .</p>
9	Elaboração de Diagnóstico	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 458.645,49	--	--	--	0%	Atrasado	
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	11/07/2016	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	11/07/2016	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%	Atrasado	
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	11/07/2016	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	11/07/2016	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%	Atrasado	
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	11/07/2016	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%	Atrasado	
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 377.673,98	--	--	--	0%	Atrasado	
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 294.170,50	--	--	--	0%	Atrasado	
12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	10/08/2016	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	Atrasado	
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	10/08/2016	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	Atrasado	
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	10/08/2016	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	Atrasado	
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	10/08/2016	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	Atrasado	
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	10/08/2016	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	Atrasado	
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	09/09/2016	R\$ 89.649,88	--	--	--	0%	A Iniciar	
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	09/09/2016	R\$ 44.922,88	--	--	--	0%	A Iniciar	
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDEN E	07/05/2017	05/08/2017					0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 835.823,47	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 458.149,49	28%	<b>Paralisado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

**Observações:**

O 1º Termo de Prorrogação de Ofício foi assinado em 05/11/2015, prorrogando a vigência do Convênio para 09/09/2016.

**4º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 10 (ex PO 11)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar
<b>Finalidade da ação:</b>	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos		
<b>Projeto:</b>	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adquirir frota de equipamentos agrícolas (plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 250.000,00	R\$ 266.400,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 250.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>03/08/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>30/11/2016</b>

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Agrimon Marcos Brasileiro Lima, Edson Laranjeiras e Marcelo Viana/ SUDENE e Município de Currais Novos/RN,
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>11/06/2013</b>	<b>16/01/2014</b>	<b>-</b>	<b>13/06/2013</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013	-	100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>05/06/2015</b>	<b>R\$ 266.400,00</b>	<b>31/01/2014</b>	<b>22/08/2014</b>	<b>R\$ 266.400,00</b>	<b>60%</b>	<b>Concluído</b>		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	31/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1</b>		<b>31/12/2013</b>	<b>05/06/2015</b>	<b>R\$ 266.400,00</b>	<b>16/07/2014</b>	<b>22/08/2014</b>	<b>R\$ 266.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 196.000,00	16/07/2014	16/07/2014	R\$ 196.000,00	100%	Concluído		
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 34.400,00	21/08/2014	21/08/2014	R\$ 34.400,00	100%	Concluído		
10.3	Grade aradora(02 Unid.)	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 36.000,00	22/08/2014	22/08/2014	R\$ 36.000,00	100%	Concluído		

ENCERRAMENTO (Peso 20%)			04/08/2015	03/08/2016	-			-	10%	Em Andamento	
11	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	31/03/2016	09/06/2016	-	06/10/2016	08/10/2016	-	100%	Concluído	O laudo técnico está em elaboração. Aguardando ajuste na prestação de contas final
12	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/08/2016	-			-	0%	Atrasado	
					R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	90%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Município de Currais Novos/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;  
(2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.  
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.

4º ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 11 (ex PO 12)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.	
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto	
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos			
<b>Projeto:</b>	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 700.000,00
R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>R\$ 53.000,00</b>		<b>R\$ 905.088,92</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ 152.088,92
				Saldo a liberar	R\$ 147.911,08
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 852.088,92

<b>Previsão de Conclusão:</b>	15/11/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
---	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>30/09/2013</b>	<b>14/01/2014</b>	<b>-</b>	<b>30/09/2013</b>	<b>09/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015		100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>30/12/2013</b>	<b>14/12/2016</b>	<b>R\$ 1.053.000,00</b>	<b>05/02/2014</b>	<b>05/02/2014</b>	<b>R\$ 905.088,92</b>	<b>53%</b>	<b>Concluído</b>		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 23.000,00	05/02/2014	05/02/2014	R\$ 23.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/2015	30/03/2015	R\$ 15.000,00	07/04/2015	07/04/2015	R\$ 15.000,00	100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 300.000,00	18/11/2015	18/11/2015	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/2015	30/12/2015	R\$ 15.000,00	27/05/2016	27/05/2016	R\$ 15.000,00	100%	Concluído		
13	Liberação da 3ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/08/2016	30/08/2016	R\$ 152.088,92	05/08/2016	15/08/2016	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)	
14	<b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.</b>	Município de Saboeiro	<b>30/12/2013</b>	<b>16/09/2016</b>	<b>R\$ 1.053.000,00</b>	<b>28/02/2014</b>	<b>14/11/2016</b>	<b>R\$ 905.088,92</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>	Ver Observação (1)	

15	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/2016	14/12/2016	-			-	0%	A Iniciar	Foram solicitadas diárias para a realização da visita técnica.	A liberação das diárias foi aprovada. A visita de recebimento do Objeto está programada para 07/12/2016
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>			<b>15/11/2016</b>	<b>15/11/2017</b>	-				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/2016	15/11/2017					0%	A Iniciar	Ver Observações (3) e (4)	
					<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 852.088,92</b>	<b>73%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Município de Saboeiro/CE

**Observações:**

- (1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.
- (2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R\$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.

**4º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 12 (ex PO 13)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>R\$ 20.540,15</b>		<b>R\$ 420.540,15</b>	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 200.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>03/11/2017</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>30/11/2016</b>

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>24/02/2014</b>	<b>15/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>24/02/2014</b>	<b>09/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>01/12/2014</b>	<b>10/02/2017</b>	<b>R\$ 420.540,15</b>	<b>02/02/2015</b>		<b>R\$ 142.061,00</b>	<b>32%</b>	<b>Em Andamento</b>		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 10.000,00	02/02/2015	02/02/2015	R\$ 10.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1</b>	Município de Jardim de Piranhas	<b>23/12/2014</b>	<b>15/07/2016</b>	<b>R\$ 210.000,00</b>	<b>15/02/2016</b>		<b>R\$ 142.061,00</b>	<b>68%</b>	<b>Atrasado</b>	Até a data desta apuração só haviam sido gastos aproximadamente R\$ 142.061,00	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016	R\$ 10.540,15	13/07/2016	13/07/2016	R\$ 10.540,00	100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00				0%	<b>Atrasado</b>	A liberação da 2ª parcela está condicionada à conclusão da meta 1, pelo município, o que não ocorreu até a presente data.	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias

13	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	01/02/2017	R\$ 210.540,15			0%	A Iniciar	A liberação da 2ª parcela está condicionada à conclusão da meta 1, pelo município, o que não ocorreu até a presente data.	O município está sendo cobrado para que agilize a execução das obras / Foi aprovado Aditamento de Vigência por mais 150 dias, alterando a data de vigência para 01/02/2017
14	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	05/02/2017	10/02/2017	-			0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>			<b>11/04/2017</b>	<b>03/11/2017</b>	<b>-</b>			<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	11/04/2017	03/11/2017	-			0%	A Iniciar		
					<b>R\$ 400.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>52%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Município de Jardim de Piranhas/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
- (2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.
- (6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.
- (7) Foi solicitado Aditamento da Vigência do convênio por mais 150 dias, a contar da vigência anterior

**4º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 13 (ex PO 14)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
<b>Projeto:</b>	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 150.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	-
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 7.441,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>		<b>R\$ 310.000,00</b>	Total Liberado até o exercício	R\$ 292.558,79

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>18/03/2018</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>30/11/2016</b>

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
--	---

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		<b>06/03/2014</b>	<b>15/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>06/03/2014</b>	<b>08/01/2015</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1 Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2 Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3 Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4 Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5 Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6 Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7 Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		<b>01/12/2014</b>	<b>17/01/2017</b>	<b>R\$ 310.000,00</b>	<b>04/02/2015</b>		<b>R\$ 302.558,79</b>	<b>49%</b>	<b>Concluído</b>		
8 Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00	04/02/2015	04/02/2015	R\$ 5.000,00	100%	Concluído		
9 Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10 <b>Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1</b>	Município de Messias Targino/RN	<b>05/12/2014</b>	<b>17/08/2016</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>28/07/2015</b>	<b>25/05/2016</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
11 Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015	R\$ 5.000,00	15/04/2016	15/04/2016	R\$ 5.000,00	100%	Concluído		
12 Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	05/06/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído	Foi realizado ajuste que reduziu a segunda parcela para R\$ 142.558,79	O saldo remanescente de R\$ 7.441,21 somente será liberado caso haja ampliação no projeto
13 <b>Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2</b>	Município de Messias Targino/RN	<b>01/07/2016</b>	<b>17/01/2017</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>19/10/2016</b>		<b>R\$ 98.700,00</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>	Ver Observação (8)	

14	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	27/01/2017	01/02/2017	-	-	0%	A Iniciar			
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>			<b>18/03/2017</b>	<b>18/03/2018</b>			<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>			
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/03/2017	18/03/2018			0%	A Iniciar	Ver Observação (7)		
<b>Valor Previsto:</b>					<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>R\$ 292.558,79</b>	<b>69%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Município de Messias Targino/RN

**Observações:**

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014
- (2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
- (4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.
- (6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho
- (7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (8) Foi efetuada Aditamento de Vigência, alterando a data de vigência do convênio para o dia 17/01/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV

**4º Ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 14 (ex PO 16)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
<b>Projeto:</b>	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2016	<b>TED 05/2015</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	<b>Vigência: 27/11/2016</b>

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)
---	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	<b>Concluído</b>	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	<b>Concluído</b>		
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	<b>Concluído</b>	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	<b>Concluído</b>	Parecer N° 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	<b>Concluído</b>		
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								<b>17,3%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Liberação dos recursos	COFC/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	<b>Concluído</b>		
10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016		20/6/2016	22/6/2016		100%	<b>Concluído</b>	A Coordenadora de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou uma visita técnica ao Laboratório de Energias Renováveis – NREL dos Estados Unidos, que faz parte da etapa 1 do Plano de Trabalho aprovado	
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015			60%	<b>Atrasado</b>		

12	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	01/05/2016					0%	Atrasado	A partir dos intercâmbios realizados foram demandados alguns encaminhamentos. O mais importante deles é um acordo entre as partes para implantar uma área de ensaios de energias renováveis no Nordeste que influenciará no projeto em andamento, especificamente na etapa 1.1;	A universidade solicitou aditivo de prazo e de recursos, que foi acatado pela equipe técnica e está aguardando parecer das demais áreas competentes
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar		
14	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	31/7/2016					0%	Atrasado		
15	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2019	1/11/2016					0%	Atrasado		
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	27/12/2016					0%	A iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A iniciar</b>		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	A iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 277.371,58	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 277.371,58	<b>37%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

**Parceiros institucionais:**

UFPE - Centro de energias renováveis

**Observações:**

4º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 15 (ex PO 17)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
<b>Projeto:</b>	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74
			R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2016	<b>TED</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	<b>Vigência: 27/11/2016</b>

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)
--	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>									<b>20,0%</b>		
1	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015			29/06/2015				100%	<b>Concluído</b>	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;
2	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015			100%	<b>Concluído</b>	
3	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN
4	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015			12/11/2015				100%	<b>Concluído</b>	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED
5	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU
6	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015			100%	<b>Concluído</b>	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN
7	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015			27/11/2015				100%	<b>Concluído</b>	
8	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015			02/12/2015				100%	<b>Concluído</b>	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>									<b>27,3%</b>	<b>Em Andamento</b>	
9	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%		<b>Concluído</b>	

10	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia da visita de acompanhamento foi constatado que o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo".
11	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	1/11/2016		3/12/2015			40%	Atrasado	
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2016		3/12/2015			50%	Atrasado	A UFPE e o CSEM formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica em outubro.
13	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	31/09/2016		1/1/2016			20%	Atrasado	Devido o atraso da formalização do ACT entre UFPE e CSEM, bem como a percepção de ampliar os testes necessários para realizar o projeto em tela, a UFPE solicitou aditivo de prazo e recursos, o qual foi acatada pela equipe técnica e está aguardando o posicionamento das demais áreas competentes
15	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2019	1/11/2016					0%	A Iniciar	
16	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado					0%	A Iniciar	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	27/12/2016					0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/DPLAN	27/12/16	25/02/17					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 322.110,74	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 322.110,74	<b>47%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º ciclo 2016**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 16 (ex PO 18)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
<b>Projeto:</b>	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL		
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
			R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016	<b>Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015</b> <b>Vigência: 31/12/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	CGDS / SUDENE	Carlos Almiro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>							<b>20,0%</b>	<b>Concluído</b>		
1	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015	100%	<b>Concluído</b>		
2	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015	100%	<b>Concluído</b>		
3	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015	100%	<b>Concluído</b>		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015	100%	<b>Concluído</b>		
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015	100%	<b>Concluído</b>		
	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
6	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016	100%	<b>Concluído</b>		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>							<b>33,0%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Liberação da primeira e única parcela	COFC/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	<b>Concluído</b>	
10	<b>Mobilização e Planejamento</b>	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado	100%	<b>Concluído</b>		

Esta Meta compreende o conjunto de ações

10.1	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016	12/02/2016	Não informado	100%	Concluído	Esta meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	100%	Concluído	A SUDENE participou do <b>Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos</b> indicado acima como participante do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
12	<b>Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	<b>MMA</b>	<b>12/05/2016</b>	<b>13/09/2016</b>	<b>08/03/2016</b>		85%	Em Andamento		
12.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016	08/03/2016	16/11/2016	100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
12.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016	22/04/2016	18/07/2016	100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
12.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	04/08/2016	16/07/2016		90%	Atrasado	Foi apresentada pelo consórcio de empresas uma nova versão deste diagnóstico, que encontra-se em análise final pela CTAAA.	
12.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	13/09/2016	05/08/2016		50%	Atrasado	Esta Etapa está diretamente relacionada à conclusão das três Etapas anteriores.	
13	<b>Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF</b>	<b>MMA</b>	<b>14/09/2016</b>	<b>13/10/2016</b>			0%	Atrasado		
13.1	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	13/10/2016			0%	Atrasado		
14	<b>Sistematização e divulgação dos resultados</b>	<b>MMA</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>12/11/2016</b>			0%	Atrasado		
14.1	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	02/11/2016			0%	Atrasado		
14.2	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	12/11/2016			0%	Atrasado		
15	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	A definir	A definir			0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
16	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	08/11/2016	09/01/2017			0%	A Iniciar		

Devido ao atraso na execução desta iniciativa, foi solicitada ampliação do prazo de vigência pelo MMA até 31/03/2017, que foi analisada e acatada pela área técnica da CGDS/DPLAN, necessitando da tramitação pelos demais setores envolvidos neste processo. A prorrogação da vigência implicará na repactuação das datas para a realização das Metas/Etapas.

	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 459.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 459.000,00	53%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	
--	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----	---------------------	--------------------------	--

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

**Observações:**

4º Ciclo 2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	4. Fortalecer a imagem da Sudene			<b>Número do Projeto:</b>	PO 17 (Ex PO 22) Meta Inst.
<b>Objetivo estratégico:</b>	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação Interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Não se aplica		
<b>Ação do PPA:</b>	Ação Interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Não se aplica		
<b>Objetivo da ação:</b>	Realizar um encontro "Café com sustentabilidade" com servidores da SUDENE e parceiros estratégicos para discutir ações programas e projetos de cunho ambiental				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN/CGDS	<b>Subunidade responsável:</b>	CGDS		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto		
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar um encontro "Café com sustentabilidade" com o tema os objetivos do desenvolvimento sustentável - 7 : Acesso a energia				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Isis Moreira

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muller
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reunião interna - definição de temas e especialistas convidados	Equipe cgds	09/06/2016	19/06/2016		09/06/2016	19/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	A definição do assunto do café com sustentabilidade teve motivação na recente definição da ONU para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.	
2	Articulação com os especialistas convidados e definição de data	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	19/06/2016	30/06/2016		19/06/2016	30/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	Foram feitos contatos telefônicos e enviados e-mails para os Professores convidados	
3	Elaboração e envio dos convites para os especialistas	Sérgio / Carlos Almiro	27/06/2016	07/07/2016		27/06/2016	27/06/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído		
4	Elaboração da programação	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	01/07/2016	14/07/2016		01/07/2016	14/07/16	R\$ 0,00	100%	Concluído		
5	Reuniões e articulação com ASCOM para organização do evento	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	04/07/2016	06/07/2016		04/07/16	06/07/16	R\$ 0,00	100%	Concluído		
6	Elaboração de material gráfico	Ascom	06/07/2016	12/07/2016		13/07/2016	25/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído		
7	Divulgação interna e parceiros externos	Ascom e Equipe CGDS	06/07/2016	29/07/2016		06/07/2016	29/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	Outras instituições foram convidadas: IBGE, CODEVASF, IBAMA	
8	Elaboração da apresentação CGDS	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	18/07/2016	21/07/2016		25/07/2016	27/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído		
9	Realização do café com sustentabilidade	Equipe cgds	29/07/2016	29/07/2016		29/07/2016	29/07/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído		
10	Registro do evento	Maria Helena, Isis Moreira, Raul Muler	29/07/2016	15/09/2016		01/08/2016	08/09/2016	R\$ 0,00	100%	Concluído	O relatório final está armazenado na Pasta S de compartilhamento da CGDS	
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ -	<b>Valor realizado:</b>		R\$ -	100,0%	Concluído	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

UFPE, UFPB

**Observações:**

4º ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE  
METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2015 - 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 18 (ex PO 23 Meta Inst.)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1 Aumentar a competitividade do setor produtivo fortalecendo cadeias e arranjos produtivos	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	Ação interna	<b>Eixo temático (MI):</b>	Não se aplica
<b>Ação do PPA:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Não se aplica
<b>Finalidade da ação:</b>	"META INSTITUCIONAL - 2015/2016"		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	A biomassa tem um papel de extrema relevância no Nordeste, especialmente no semiárido, gerando renda e energia na Região. Contudo, a extração desse recurso é feita de maneira informal e desordenada, aumentando a pressão sobre o bioma. Além disso, a população que sobrevive e se utiliza dessa atividade produtiva é tratada muitas vezes de forma marginalizada e criminalizada. Crescem os estudos e as discussões sobre a inserção sustentável da biomassa na matriz energética. A Sudene como promotora do desenvolvimento sustentável e incluída na sua área de atuação tem o papel de articular os principais atores desse tema para definição de uma estratégia regional.		
<b>Projeto:</b>	I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Apresentar estudos de demanda e oferta e a inserção da biomassa na socioeconomia regional, promover o debate e estabelecer parcerias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016
<b>Atualização do PO:</b>	Maria Helena, Victor e Isis

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto (SUDENE)</b>	Maria Helena, Victor Uchôa Silva, Isis Guimarães e Aildo Sabino
--	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
<b>1</b>	<b>Planejamento da Oficina</b>								<b>20%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Definição de temas e possíveis parceiros	CGDS/CIM	05/08/2016	31/08/2016		05/08/2016	30/08/2016		100%	Concluído		
1.2	Articulação com instituições parceiras e especialistas convidados	Maria Helena, Victor, Isis, Aildo	11/08/2016	16/09/2016		11/08/2016	16/09/2016		100%	Concluído	1) Foi realizada uma reunião de trabalho, no dia 11/08/2016 com Chico Barreto Campello, que atualmente é Superintendente do Ibama/PE para discutir os desdobramentos do encontro ocorrido na Sudene no dia 01/06/2016 : "Estudos para inserção da biomassa florestal nativa na sócio economia do Nordeste: Matriz Energética". 2) No dia 13/09/2016 foi realizada um reunião de planejamento com o PNUD/IBAMA para a formulação do Encontro de Energia e Meio Ambiente sobre a Inserção da Biomassa Florestal no Nordeste	
1.3	Planejamento de programação	Maria Helena, Victor Uchôa, Isis Guimarães, Renato Vaz e Aildo Sabino	15/08/2016	14/09/2016		05/09/2016	14/09/2016		100%	Concluído		
<b>2</b>	<b>Preparação</b>								<b>20%</b>			
2.1	Elaboração e envio de convites institucionais	CGDS	14/09/2016	19/09/2016		14/09/2016	19/09/2016		100%	Concluído	Instituições convidadas: PNUD/IBAMA, Órgãos Estaduais, CEPIS, APNE, IABS, UFCG, EPE, IICA, MMA, Universidade Politécnica de Madri etc	
2.2	Organização logística - Coffe-break (PNUD/IBAMA), audio e som, reserva de sala.	CGDS e ASCOM	14/09/2016	19/09/2016		14/09/2016	19/09/2016		100%	Concluído		
2.3	Elaboração de material de divulgação	ASCOM	14/09/2016	19/09/2016		14/09/2016	23/09/2016		100%	Concluído		

2.4	Mobilização e Divulgação do evento	CGDS/CIM	14/09/2016	28/09/2016		15/09/2016	28/09/2016		100%	Concluído	
3	Execução								50%		
3.1	Realizar o evento	CGDS/CIM	27/09/2016	27/09/2016		27/09/2016	27/09/2016		100%	Concluído	
3.2	Participar/acompanhar as atividades	CGDS/CIM	27/09/2016	27/09/2016		27/09/2016	27/09/2016		100%	Concluído	
4	Encerramento								10%		
4.1	Elaboração de registro final	Maria Helena, Victor Uchôa, Isis Guimarães, Renato Vaz e Aildo Sabino	28/09/2016	30/09/2016		30/09/2016	30/09/2016		100%	Concluído	O relatório foi concluído e está armazenado na Pasta S de compartilhamento da CGDS
			Valor Previsto:	R\$ -	Valor realizado:	R\$ -			100,0%	Concluído	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

PNUD/IBAMA

**Observações:**

4º ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 19 (ex PO 20)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.			
<b>Projeto:</b>	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação, para replicagem em outros estados do Nordeste.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Convênio	857.015,99	965.632,35

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liberação	TOTAL		
274.405,33	108.616,36	Maior/2013	383.021,69	Pago até o ano anterior	R\$ 857.015,99
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/10/16
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012	Não se aplica	28/12/2012	28/12/2012	Não se aplica	100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013	Não se aplica	11/01/2013	11/01/2013	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013	Não se aplica	06/03/2013	08/03/2013	Não se aplica	100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014	Não se aplica	26/03/2014	29/03/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (100%)
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014	Não se aplica	04/12/2014	05/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Vistoria realizada	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014	Não se aplica	01/12/2014	29/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2015					0%	Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	A SEDETEC/SE enviou o Relatório atualizado em 29/05/2015, sendo constatado neste relatório, bem como no SICONV, que o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2o Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015	Não se aplica	27/07/2015	27/07/2015	Não se aplica	100%	Concluído	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015		31/10/2015			0%	Cancelado	Atividade cancelada para este período devido ao erro que ocorreu no SICONV, a SEDETEC não conseguiu incluir a prestação de contas no sistema (reprogramada no item 14).	A SEDETEC está entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente do SICONV para solucionar o problema.
12	Envio de Relatório de Execução por e-mail	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/03/2016	11/04/2016	Não se aplica	22/03/2016	29/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, foi acordado com a SEDETEC que seria elaborado e enviado por e-mail o relatório técnico final, sem incluir as questões financeiras. Prazos repactuados.	
13	Emissão de Relatório Técnico sobre a prestação de contas (sem incluir o SICONV)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	18/03/2016	04/04/2016	Não se aplica	29/03/2016	04/04/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Este Relatório técnico será para acompanhamento interno e não terá validade perante o SICONV.	Foi alterada a previsão do término do Laudo Técnico sem a prestação de contas.
14	Apresentação da prestação de contas (após solução dos problemas)	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/04/2016	04/04/2016	Não se aplica	04/04/2016		Não se aplica	100%	Concluído	Foi resolvido o problema da inclusão dos dados da prestação de contas, que se tratava do cálculo dos valores de devolução por meio do SICONV que não estão de acordo com os respectivos valores de devolução previstos.	A solução se deu com o apoio da SUDENE que encaminhou ofício para o Ministério do Planejamento solicitando que fosse alterado de OBTV para o modo não OBTV de forma que possibilitasse o cálculo manual dos valores que serão devolvidos para a Conveniente e Concedente, entretanto o MPOG para solucionar o problema preferiu corrigir a funcionalidade do sistema.
15	Realização de visita técnica para subsidiar o laudo técnico.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão e Marcus Paz)	23/05/2016	25/05/2016	Não se aplica	23/05/2016	25/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Foi alterada a previsão da viagem tendo em vista que os problemas operacionais na prestação de contas ainda persistem. A elaboração do Laudo técnico será concluída após a solução das pendências no SICONV.	Foi realizada a visita técnica às instalações do CVT de Confecções de Tobias Barreto para levantar informações que serão utilizadas para embasar a análise da prestação de contas do conveniente. (de acordo com o status do item 14)
16	Elaboração de Relatório sobre a visita técnica	DPLAN (Robson e Marcus)	27/05/2016	08/06/2016	Não se aplica	27/05/2016	08/06/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída para registro da visita técnica.	
17	Emissão de Laudo Técnico (final)	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz)	18/06/2016	29/07/2016	Não se aplica	29/08/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	Processo enviado para o setor de convênios em 02/12/2016
18	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Coordenação de Gestão de Convênios	11/10/2016	19/10/16	Não se aplica	02/12/2016		Não se aplica	80%	Atrasado	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	Etapa só irá ser iniciada após enviar o Laudo Técnico acerca do cumprimento do objeto para Convênios
19	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	20/10/16	28/10/16	Não se aplica			Não se aplica	0%	Atrasado	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	

	<b>Valor Previsto:</b>	857.015,99	<b>Valor realizado:</b>	857.015,99	88%	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
--	------------------------	------------	-------------------------	------------	-----	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2016

Houve necessidade de reprogramar este PO, acrescentando novas etapas, tendo em vista os problemas operacionais do SICONV.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 20 (ex PO 22)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 8902 - Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em apoio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	286 e 280	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	1.025.000,00	1.025.000,00

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
800.000,00	0,00	Fevereiro/2016	800.000,00	A realizar no exercício	R\$ 1.025.000,00
225.000,00	0,00	Julho/2016	225.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	0,00	-	1.025.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.025.000,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ 1.025.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ (1.025.000,00)
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.025.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	02/05/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	17/11/2015	17/11/2015	Não se aplica	17/11/2015	17/11/2015	Não se aplica	100%	Concluído	A visita técnica foi substituída por reuniões realizadas nas instalações da CGEP nas quais estiveram presentes técnicos da UFPE e da SUDENE.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	01/12/2015	01/12/2015	Não se aplica	01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	03/12/2015	03/12/2015	Não se aplica	03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	100%	Concluído		
5	Reunião para programar visitas técnicas e de campo	SUDENE E UFPE	11/03/2016	11/03/2016	Não se aplica	11/03/2016	11/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Verificou-se a importância e necessidade de que a equipe UFPE forneça relatórios parcial (regime trimestral) das atividades desenvolvidas no projeto. Em virtude disto, foram acrescentadas novas etapas no PO (Apresentação do relatório parcial).	
6	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/03/2016	11/04/2016	Não se aplica	17/03/2016	21/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Relatório entregue pelo técnico SUDENE em 21/03/2016	

7	Apresentação do 1º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/03/2016	18/03/2016	Não se aplica	18/03/2016	23/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Relatório entregue pela UFPE em 23/03/2016. Ressalta-se que este relatório apresenta informações relativas ao cronograma das atividades iniciais de abertura do projeto, não sendo necessário parecer técnico sobre o assunto.	
8	Vistoria de campo aos seis municípios do projeto	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/04/2016	11/10/2016	Não se aplica	14/06/2016	25/08/2016	Não se aplica	100%	Concluído	As atividades de mobilização e sensibilização (visitas de campo iniciais) foram prejudicadas pela ausência de recursos financeiros (carro, motorista, combustível) que seriam disponibilizados pela UFPE.	A UFPE realizou visita ao município de Picos em 31/10/2016, sem acompanhamento da SUDENE em virtude de inviabilidade de agenda e orçamentária. Pelos motivos citados acima, também foram cancelada a participação da SUDENE nas demais visitas de campo.
8.1	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	14/06/2016	12/08/2016	Não se aplica	14/06/2016	14/06/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Foi realizada reunião de abertura (acompanhada pela servidora Ludmilla Calado) em 14/06, ficando pendente a coleta de materiais. Relatório técnico da Reunião de Abertura concluído em 07/07/2016	
8.2	Acompanhamento de visita de campo - Coleta de Material - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	10/06/2016	10/06/2016	Não se aplica	21/07/2016	21/07/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
8.3	Acompanhamento de visita de campo - Implementação de Ações Tecno Gerencial - Brejo da Madre de Deus	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	Não se aplica	28/07/2016	28/07/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
8.4	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Esperança/Campina Grande	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Claudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	Não se aplica	25/08/2016	25/08/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Visita realizada pelo técnico Miguel Araujo.	
9	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	14/05/2016	Não se aplica	14/05/2016	14/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Visita realizada pela Coordenadora Albertina em 14/05/16.	
10	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	23/05/2016	Não se aplica	16/05/2016	06/06/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica..	
11	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/05/2016	11/06/2016	R\$ 225.000,00	20/05/2016	05/07/2016	R\$ 225.000,00	100%	Concluído	Os documentos comprobatórios estão em análise.	Repasse financeiro (PF Nº 2016PF000044)
12	Apresentação do 2º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/06/2016	18/06/2016	Não se aplica	27/05/2016	27/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
13	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	11/07/2016	Não se aplica	05/09/2016	05/09/2016	Não se aplica	100%	Concluído	A visita foi realizada pela Coordenadora Albertina e a técnica Gabriela Isabel.	

13.1	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	08/09/2016	08/09/2016	Não se aplica	03/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica (realizada com atraso, tendo em vista que aguardávamos relatório da UFPE).	
14	Apresentação do 3º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/09/2016	18/09/2016	Não se aplica	15/09/2016	15/09/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
15	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	01/12/2016	01/02/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
16	Emissão de laudo/parecer final	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	01/02/2017	02/05/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 0,00		<b>Valor realizado:</b>		R\$ 1.025.000,00	88%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 21 (ex PO 23)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e
<b>Finalidade da ação:</b>	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidades responsáveis:</b>	CGEP e CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestores das subunidades:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Carlos Almiro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.		
<b>Projeto:</b>	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/02016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Concedente	Marcus Vinicius e Miguel Vieira - CGEP/DPLAN ; Caio de Assis e Renato Vaz (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%	Concluído		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
2	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
4	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
7	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
8	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								35,3%	Em Andamento		
9	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		
10	<b>Meta 1: Levantamento etnobotânico</b>	UFPE	10/12/2015	10/11/2016	R\$ 76.800,00	18/01/2016		R\$ 76.800,00	83%	Atrasado		
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016	Não se aplica	10/03/2016	10/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído		

10.2	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016	Não se aplica	23/05/2016	25/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio. O técnico Renato (CGDS) está elaborando relatório da visita (ainda sem data definida).	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	10/11/2016	Não se aplica	10/10/2016		Não se aplica	50%	Atrasado	relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	
11	<b>Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de</b>	<b>UFPE</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>18/01/2016</b>		<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
11.1	2º Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016	Não se aplica	05/09/2016	06/09/2016	Não se aplica	100%	Concluído		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016.
11.2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	10/11/2016	Não se aplica	10/10/2016		Não se aplica	50%	Atrasado	Relatório enviado pela unidade descentralizada.	
12	<b>Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico p</b>	<b>UFPE</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>R\$ 373.400,00</b>	<b>18/01/2016</b>		<b>R\$ 373.400,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016	Não se aplica	08/11/2016	09/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
12.2	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	10/11/2016		10/10/2016		Não se aplica	50%	Atrasado	Relatório enviado com informações insuficientes pela unidade descentralizadora.	A unidade descentralizadora solicitou prorrogação da vigência do TED por 90 dias. O parecer técnico CGDS/DPLAN foi favorável e enviado ao setor de convênios, portanto todas as datas a partir da meta 4 serão repactuadas.
13	<b>Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produt</b>	<b>UFPE</b>	<b>10/12/2015</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>R\$ 160.800,00</b>			<b>Não se aplica</b>	<b>0,0%</b>	<b>Atrasado</b>		
13.1	Visita técnica (oficinas devolutivas)		01/11/2016	03/11/2016				Não se aplica	0%	Atrasado		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	04/11/2016	10/11/2016				Não se aplica	0%	Atrasado		
14	Apresentação de relatório final	UFPE	01/12/2016	31/12/2016				Não se aplica	0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	01/01/2017	28/02/2017				Não se aplica	0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ 749.000,00	<b>Valor realizado:</b>			R\$ 749.000,00	<b>55,3%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 22 ( ex PO 25)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
<b>Ação:</b>	Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - NE	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
<b>Finalidade da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
<b>Projeto:</b>	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035)			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicosocial e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio	Descentralização	500.000,00	

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
SUDENE	IFPB			Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
500.000,00	0,00		500.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
500.000,00	0,00	-	500.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 500.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 500.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	16/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Unidade Descentralizadora	Lautemyr Canel
	Unidade Descentralizada	Maiara Souza Melo - IFPB

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Articulação para elaboração do Termo de Execução Descentralizada - TED	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	15/05/2015	10/12/2015	-	15/05/2015	10/12/2015	-	100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico de Campina Grande/PB	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E IFPB	10/12/2015	18/12/2015	-	10/12/2015	18/12/2015	-	100%	Concluído		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/12/2015	21/12/2015	-	21/12/2015	21/12/2015	-	100%	Concluído		
4	Descentralização do crédito e a Transferência do limite orçamentário	CGAF/COCF	24/12/2015	24/12/2015	-	24/12/2015	24/12/2015	-	100%	Concluído	R\$ 500.000,00	
5	Reunião com IFPB e a empresa contratada para elaboração do Plano a partir do diagnóstico. Solicitar ajustes no cronograma de execução do Plano de Trabalho.	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	26/02/2016	26/02/2016	-	26/02/2016	26/02/2016	-	100%	Concluído	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisará ser repactuado	
6	Reunião (em João Pessoa): Apresentação do projeto técnico da Macroplan e o ajuste do cronograma do Plano de trabalho.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	21/03/2016	21/03/2016	-	21/03/2016	21/03/2016	-	100%	Concluído	Aguardando o ofício pelo IFPB constando: solicitação dos recursos financeiros do TED e o novo Cronograma de Execução (já ajustado), observados os produtos inseridos no Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada	
7	Recebimento por e-mail do Ofício nº 175/2016/GR/IFPB, encaminhado pelo IFPB e assinado pela Pró-Reitora Mary Roberta Meira Marinho, onde solicita formalmente a alteração do Cronograma de Execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Campina Grande e Municípios do Entorno - PED/CG-2035.	DPLAN (Lautemyr Canel, Anita Rozenblit)	18/04/2016	18/04/2016	-	18/04/2016	03/05/2016	-	100%	Concluído	Aguardando o ofício pelos correios para dar andamento ao processo de liberação da 1ª e única parcela dos recursos financeiros do TED nº 10/2015 SUDENE/IFPB.	Em 03/05/2016 foi entregue pelos Correios à SUDENE o Ofício nº175/2016/GR/IFPB de 18/04/2016, protocolo SUDENE nº 59334.000823/2016-81, no qual encaminhou novo Cronograma de Execução do Plano "PED/CG-2035" junto com o diagnóstico situacional, tabela de indicadores de Campina Grande e Municípios do Entorno e solicitação de repasse da parcela única de R\$ 500.000,00, referente ao TED nº 10/2015/SUDENE/IFPB.

8	Elaboração do parecer técnico	DPLAN (Anita Rozenblit)	03/05/2016	10/05/2016	-	03/05/2016	10/05/2016	-	100%	Concluído	No dia 03/05/16 o parecer técnico foi enviado à Coordenação Geral, passando por ajustes e correções, e no dia 11/05/16 foi enviado à DPLAN para providências pertinentes.		
9	Análise da DPLAN em relação ao Parecer Técnico da CGEP e providências pertinentes	DPLAN (Sérgio Alencar)	11/05/2016	11/05/2016	-	11/05/2016	12/05/2016	-	100%	Concluído	No dia 12/05/2016 foi enviado, pelo diretor, o processo do TED nº 10/2015 à DAD, para liberação da parcela única.		
10	Autorização da SUDENE para Liberação da parcela única	DPLAN (Lautemyr Canel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	12/05/2016	15/05/2016	R\$ 500.000,00	18/04/2016	13/05/2016	R\$ 500.000,00	100%	Concluído	Previsão de liberação da 1ª parcela no mês de maio de 2016.	Autorizado pela SUDENE a liberação da parcela única em 13/05/2016. Diretora do PROEXT - IFPB.	
11	<b>Produto 1:</b> Aprofundamento da Visão de Futuro da Cidade de Campina Grande 2015 ( construída na fase de diagnóstico) - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 1</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/08/2016	30/09/2016	-	17/05/2016		-	20%	Atrasado		Em 19/08 foi feita uma ligação para Mayara confirmando o envio da cópia do ofício. Em 22/08 recebemos por email uma cópia do ofício nº 346/2016/GR/IFPB que solicita a alteração do cronograma de execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Campina Grande 2035.	
12	<b>Produto 2:</b> Construção da Visão de futuro Complexo Aluisio Campos - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 2</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/08/2016	30/09/2016	-	10/11/2016		-	20%	Atrasado	Houve atraso na entrega do diagnóstico da região, o qual servirá de subsídio para elaboração do plano. Por isto, o cronograma de execução do plano precisou ser repactuado de maio a agosto de 2016. Obs1, conforme Ofício n175/2016/GR/IFPB de 18 de abril de 2016, a data da entrega do primeiro produto (englobando Visão de futuro, Const. visão Aloisio Nunes, Desenho urbano, e detalhamento da Visão Futura de determinadas áreas) está atrasado pois finaliza em 31/07/2017. Diante disso, foi realizado contato com IFPB para a solução do problema. Após contato com a Diretora de Inovação na pessoa de Mayara Melo no dia 29/07/16 ficou acordado que será enviado um ofício com a exposição de motivos do respectivo atraso. Só após elucidação dos problemas internos no IFPB será enviada um novo cronograma. Obs1: haverá nova reunião no Comitê Gestor do TED/CG2035, com previsão de entrega do produto 1. Ligação para Maiara Melo do IFPB, no dia 05/10/2016 para informar que em caso de prorrogação de prazo a Sudene deve ser avisada com antecipação mínima de um mês.		
13	<b>Produto 3:</b> Desenho urbano conceitual da cidade de Campina Grande e conexões com os municípios do entorno - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 3</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/09/2016	30/10/2016	-	10/11/2016		-	20%	Atrasado			
14	<b>Produto 4:</b> Visão de Futuro: desafios, estratégias e metas - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 4</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/09/2016	30/10/2016	-	10/11/2016		-	20%	Atrasado			
15	<b>Produto 5:</b> Realização de seis oficinas de reflexão estratégica, uma em cada município envolvido - <b>Parecer sobre os resultados das oficinas</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/08/2016	30/10/2016	-	01/12/2016		-	0%	Atrasado			
16	<b>Produto 6:</b> Pesquisa de opinião pública via internet - <b>Emissão de parecer do Relatório do Produto 6</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/08/2016	30/10/2016	-			-	0%	Atrasado			
17	<b>Produto 7:</b> Realização de Concurso sobre o tema "Campina do Futuro", junto à estudantes do 1 e 2 graus - <b>Parecer sobre resultados do concurso</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/08/2016	30/11/2016	-			-	0%	Atrasado			
18	<b>Produto 8:</b> Transferência Institucional do Portal 2035 e canais de acompanhamento do projeto pela sociedade e incorporação de propostas de outras fontes (blogs, redes sociais, debates e mídias sociais) - <b>Parecer sobre resultados</b>	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/11/2016	30/11/2016	-			-	0%	Atrasado			
19	Parecer final de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Lautemyr Canel)	01/12/2016	15/12/2016	-			-	0%	A Iniciar			Recebimento do Ofício IFPB em 05/09/2016.
20	Revisão	DPLAN (Lautemyr Canel)	15/12/2016	16/12/2016	-			-	0%	A Iniciar			Até o presente momento foi feita uma Nota Técnica de aceitação do Novo Cronograma (09/09/2016). O Ofício SUDENE de aceitação foi enviado ao IFPB no dia 20/09/2016.
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 500.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 500.000,00	46%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros Institucionais:**

**Observações:**  
**As colunas F, G, H, I, J e K estão ocultas na planilha, pois as mesmas mostram os cronogramas anteriores. O cronograma que está exposto nesta planilha se refere ao último pedido de alteração para o novo cronograma de execução.**  
**OBS: para exibir o histórico com o cronograma antigo (colunas F a K), vai na guia formatar e clica em visibilidade - ocultar e reexibir e clica em reexibir colunas.**  
**1º Ciclo 2016; (1) Conforme TED-IFPB, página 58, Processo 59335000359/2015-32. (2) Conforme Ofício IFPB nº 175/2016/GR, de 18/04/2016. (3) Conforme Ofício IFPB nº 346/2016/GR, de 22/08/2016.**  
**Ofício Sudene Nº 243/2016 -DPLAN enviado em 21/11/2016 alertando para a entrega do Produto 1 (Estratégia de desenvolvimento de longo prazo para a cidade de Campina Grande e Municípios do Entorno e focalização no Complexo Aluisio Campos) e devidos pagamentos.**  
**4º ciclo 2016**  
 Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 23
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>	Fase preparatória interna para projeto de Regionalização da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações de forma que permita um recorte regional e uma visão voltada para a identificação de desigualdades inter-regionais e intrarregionais.				
<b>Projeto:</b>	Produto 1 - Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Realizar um estudo preliminar da Política de Dados Abertos do Governo Federal, a fim de subsidiar o projeto posterior de pesquisa da melhor solução para sistematizar informações de modo a subsidiar os processos de formulação, monitoramento e avaliação de planos e programas que promovam o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto em 2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/03/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Joyce Queiroz e Silva
--	-----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal	Joyce Queiroz e Silva	08/11/2016	30/03/2017	Não se aplica	08/11/2016		Não se aplica	33%	Em Andamento		
1.1	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal através dos Cursos oferecidos pela ENAP Virtual	Joyce Queiroz e Silva	08/11/2016	28/11/2016	Não se aplica	08/11/2016	28/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Reunião de articulação com o Cin para analisar viabilidade de proposta de parceria	Joyce Queiroz e Silva/Albertina Pereira	17/11/2016	17/11/2016	Não se aplica	17/11/2016	17/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Apresentação interna dos resultados das etapas anteriores	Joyce Queiroz e Silva	29/11/2016	16/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
1.4	Planejamento para apresentação do tema aberta para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	02/01/2017	31/01/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
1.5	Apresentação do tema aberta para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	01/02/2017	15/03/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
1.6	Entrega do Relatório da Apresentação para chefia imediata	Joyce Queiroz e Silva	16/03/2017	30/03/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$ -	<b>Valor realizado:</b>			R\$ -	33%	Em Andamento	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
1.1 - Os cursos oferecidos pela ENAP sobre o tema foram Turma 1/2016 - Elaboração de Plano de Dados Abertos e Turma 4/2016 - Introdução à Interoperabilidade
<b>4º ciclo 2016</b>

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 24
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			
<b>Projeto:</b>	Construção de uma base de geoinformação para subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional)			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) através de uma base de geoinformação			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(ei)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Robson Brandão
---	----------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Levantamento dos requisitos para construção da base de geoinformação</b>	Ludmilla Calado / Robson Brandão / Márcio Gadelha (TI)	14/10/2016	11/11/2016	Não se aplica	27/10/2016	03/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.1	Definição de espaço virtual para ambientação e conectividade da base	Ludmilla Calado / Robson Brandão / Márcio Gadelha (TI)	14/10/2016	19/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	17/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Levantamento e catalogação das fontes de dados disponíveis	Robson Brandão	20/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	20/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Ludmilla Calado / Robson Brandão	01/11/2016	03/11/2016	Não se aplica	03/11/2016	03/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Obs: data da validação pela Coordenação.	
2	<b>Produto 2 - Estruturação da base de geoinformação</b>	Robson Brandão	04/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	04/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.1	Organização da estrutura de pastas e diretórios	Robson Brandão	04/11/2016	08/11/2016	Não se aplica	04/11/2016	07/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Aquisição dos dados cartográficos digitais	Robson Brandão	09/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	09/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Armazenamento dos dados de geoinformação na base de dados	Ludmilla Calado / Robson Brandão	16/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	16/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		

3	<b>Produto 3 - Validação da base de geoinformação</b>	Robson Brandão	21/11/2016	30/12/2016	Não se aplica	21/11/2016			3%	Em Andamento		
3.1	Verificação das informações georeferenciadas quanto ao atendimento das demandas internas da CGEP	Robson Brandão	21/11/2016	09/12/2016	Não se aplica	21/11/2016			10%	Em Andamento		
3.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Ludmilla Calado / Robson Brandão	12/12/2016	16/12/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
3.3	Disponibilização da Base de Geoinformação para uso na Unidade Especial "R"	Robson Brandão	19/12/2016	30/12/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -			68%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Os estagiários Manuella Lima e Antônio Henrique estão participando da execução das etapas deste PO.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 25
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) através da elaboração de mapas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	03/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ludmilla Calado
---	-----------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Levantamento dos requisitos para construção dos mapas</b>	Ludmilla Calado	31/10/2016	09/12/2016	Não se aplica	31/10/2016		Não se aplica	50%	Em Andamento		
1.1	Definição das temáticas utilizadas nos mapas	Robson Brandao / Ludmilla Calado	31/10/2016	04/11/2016	Não se aplica	31/10/2016	04/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Articulação com órgãos responsáveis pela infraestrutura da Ferrovia Transnordestina e da Transposição do São Francisco para aquisição de arquivos cartográficos digitais	Ludmilla Calado	07/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	07/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Armazenamento dos dados na base de geoinformação	Ludmilla Calado	28/11/2016	02/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Robson Brandao / Ludmilla Calado	05/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	Obs: data da validação pela Coordenação.	
2	<b>Produto 2 - Estruturação dos mapas</b>	Ludmilla Calado	12/12/2016	20/01/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
2.1	Definição do layout e dimensões e normativas vigentes para elaboração dos mapas	Robson Brandao / Ludmilla Calado	12/12/2016	21/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
2.2	Elaboração do mapa, utilizando a base de geoinformação	Ludmilla Calado	22/12/2016	07/01/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		

2.2	Verificação das nomenclaturas, símbolos e padronagens	Ludmilla Calado	09/11/2017	20/01/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar			
3	<b>Produto 3 - Validação dos mapas</b>	Ludmilla Calado	<b>23/01/2017</b>	<b>03/02/2017</b>	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar			
3.1	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Robson Brandao / Ludmilla Calado	23/01/2017	27/01/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar			
3.2	Disponibilização dos mapas em formato digital	Ludmilla Calado	30/01/2017	03/02/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar			
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	17%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Os estagiários Manuella Lima e Antônio Henrique estão participando da execução das etapas deste PO.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 26
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo IV - Redução da Taxa de Analfabetismo estabelecido, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo IV - Redução da Taxa de Analfabetismo, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	16/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Albertina Pereira/Gabriela Isabel
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>					100%	<b>Concluído</b>	
1.1	Selecionar indicadores	Gabriela Isabel	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016			100%	Concluído	
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Gabriela Isabel	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016			100%	Concluído	
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Gabriela Isabel	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016			100%	Concluído	
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Gabriela Isabel	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016			100%	Concluído	
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>					100%	<b>Concluído</b>	
2.1	Obtenção dos Dados	Gabriela Isabel	17/10/2016	25/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	27/10/2016			100%	Concluído	
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Gabriela Isabel	25/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	27/10/2016	31/10/2016			100%	Concluído	

<b>3</b>	<b>Produto 3 - Boletim de Analfabetismo</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>				<b>68%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>3.1</b>	Análise dos indicadores	Gabriela Isabel	01/11/2016	16/11/2016	<b>Não se aplica</b>	01/11/2016	16/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
<b>3.2</b>	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Gabriela Isabel	16/11/2016	23/11/2016	<b>Não se aplica</b>	16/11/2016	23/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
<b>3.3</b>	Validação final	Albertina / Fred	23/11/2016	28/11/2016	<b>Não se aplica</b>	23/11/2016	23/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
<b>3.4</b>	Ajustes no documento	Gabriela Isabel	28/11/2016	05/12/2016	<b>Não se aplica</b>	24/11/2016	28/11/2016		100%	<b>Concluído</b>		
<b>3.5</b>	Diagramação do Boletim	Shirley/ASCOM	05/12/2016	12/12/2016	<b>Não se aplica</b>	28/11/2016			5%	<b>Em Andamento</b>	Protótipo sendo construído pela equipe da ASCOM.	
<b>3.6</b>	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/2016	16/12/2016	<b>Não se aplica</b>				0%	<b>A Iniciar</b>		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	89%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 27
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo III - redução das taxas de mortalidade materno-infantil, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	16/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Albertina Pereira
---	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	Tássia	03/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Tássia	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Tássia	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Tássia	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Tássia	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	Tássia	17/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Tássia	17/10/2016	25/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	25/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Tássia	25/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	25/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3	<b>Produto 3 - Boletim de saúde materno infantil</b>	Tássia	01/11/2016	16/12/2016	Não se aplica	01/11/2016		Não se aplica	17%	Em Andamento		
3.1	Análise dos indicadores	Tássia	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Tássia	11/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	11/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Albertina / Fred	21/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	21/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Tássia	28/11/2016	01/12/2016	Não se aplica	30/11/2016		Não se aplica	20%	Em Andamento		

3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	02/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
3.6	Publicação do Boletim no site e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	16/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	72%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 28</b>
<b>Objetivo estratégico 1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido</b>		<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo IX - garantia de implantação de projetos para o desenvolvimento tecnológico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Miguel Vieira/Lautemyr Canel
--	------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	Miguel Vieira	03/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Miguel Vieira	03/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Miguel Vieira	10/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Miguel Vieira	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Lautemyr Canel	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados</b>	Miguel Vieira	31/10/2016	18/11/2016	Não se aplica	31/10/2016	18/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Miguel Vieira	31/10/2016	04/11/2016	Não se aplica	31/10/2016	04/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Tabulação dos dados	Miguel Vieira	07/11/2016	11/11/2016	Não se aplica	07/11/2016	11/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		

2.3	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Lautemyr Canel	14/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	14/11/2016	18/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3	<b>Produto 3- Boletim de C&amp;TI</b>	Miguel Vieira	<b>21/11/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	Não se aplica	21/11/2016		Não se aplica	80%	Em Andamento	
3.1	Análise dos dados	Miguel Vieira	21/11/2016	02/12/2016	Não se aplica	21/11/2016	21/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.2	Redação do texto	Miguel Vieira	05/12/2016	09/12/2016	Não se aplica	21/11/2016	22/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.3	Validação final (ajustes)	Lautemyr/Fred	12/12/2016	16/12/2016	Não se aplica	22/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.4	Diagramação do Boletim	ASCOM	19/12/2016	23/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
3.5	Publicação do Boletim no sítio	ASCOM	26/12/2016	30/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>		R\$ -	93%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
Obs. Aguardando solução de diagramação e de publicação.
<b>4º ciclo 2016</b>

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 29</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN		<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Relatório contendo Análise de viabilidade de elaborar um Painel de indicadores da Dimensão Institucional do Desenvolvimento Sustentável				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Analisar a viabilidade de elaborar um Painel de indicadores da Dimensão Institucional do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Gabriela Lins/Lautemyr Canel
--	------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	Gabriela Lins /Joyce Queiroz	23/10/2016	17/11/2016	Não se aplica	23/10/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Joyce Queiroz/Lautemyr	23/10/2016	27/10/2016	Não se aplica	23/10/2016	27/10/2016	não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Joyce Queiroz/Lautemyr	27/10/2016	27/10/2016	Não se aplica	27/10/2016	27/10/2016	não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Gabriela Lins	08/11/2016	08/11/2016	Não se aplica	08/11/2016	08/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Gabriela Lins	09/11/2016	12/11/2016	Não se aplica	09/11/2016	12/11/2016	não se aplica	100%	Concluído	Obs: data da validação pela Coordenação.	
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	Gabriela Lins	12/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	12/11/2016	14/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Gabriela Lins	12/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	12/11/2016	14/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização da base de dados	Gabriela Lins	12/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	12/11/2016	14/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Tabulação dos dados	Gabriela Lins	12/11/2016	14/11/2016	Não se aplica	12/11/2016	14/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
3	<b>Produto 3 - Nota técnica do indicador institucional</b>	Gabriela Lins	14/11/2016	23/12/2016	Não se aplica	14/11/2016		não se aplica	33%	Em Andamento		
3.1	Análise dos indicadores	Gabriela Lins	14/11/2016	26/11/2016	Não se aplica	14/11/2016	26/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Gabriela Lins	26/11/2016	30/11/2016	Não se aplica	26/11/2016	30/11/2016	não se aplica	100%	Concluído		
3.3	Validação Final	Lautemyr/Fred	01/12/2016	10/12/2016	Não se aplica	-	-	não se aplica	0%	Cancelado	Durante a etapa de validação foi verificado que será necessária uma Nota Técnica e que o Boletim não será publicado.	

3.4	Diagramação do Boletim	Shirley	11/12/2016	19/12/2016	Não se aplica	-	-	não se aplica	0%	Cancelado		
3.5	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	20/12/2016	20/12/2016	Não se aplica	-	-	não se aplica	0%	Cancelado		
3.6	Elaboração de Nota Técnica sobre o indicador institucional	Gabriela Lins	20/12/2016	21/12/2016	Não se aplica			não se aplica	0%	A Iniciar		
3.7	Validação Final	Lautemyr/Fred	21/12/2016	22/12/2016	Não se aplica			não se aplica	0%	A Iniciar		
3.8	Diagramação da Nota Técnica	Shirley	22/12/2016	22/12/2016	Não se aplica			não se aplica	0%	A Iniciar		
3.9	Envio da Nota Técnica aos responsáveis	Shirley	23/12/2016	23/12/2016	Não se aplica			não se aplica	0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	78%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

O estagiário Gabriel Fernando está participando da execução das etapas deste PO.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 30</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI - universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	16/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Albertina Pereira
--	-------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>Marina / Robson</b>	03/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	Marina / Robson	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Marina / Robson	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Marina / Robson	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Marina / Robson	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	<b>Marina</b>	17/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	Marina	17/10/2016	25/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	25/10/2016	Não se aplica	100%	<b>Concluído</b>		

2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Marina	25/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	25/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3	<b>Produto 3 - Boletim de saneamento</b>	<b>Marina</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>01/11/2016</b>		<b>Não se aplica</b>	35%	Em Andamento		
3.1	Análise dos indicadores	Marina	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Marina	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Albertina / Fred	16/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	16/11/2016		Não se aplica	10%	Atrasado		
3.4	Ajustes no documento	Marina	28/11/2016	01/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	02/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	16/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	78%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>			

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 31
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de		
<b>Finalidade da ação:</b>	políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Luiz/Lautemyr Canel
--	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3	<b>Produto 3 - Boletim de PIB e PIB per capita</b>	<b>José Luiz</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>31/10/2016</b>		<b>Não se aplica</b>	<b>80%</b>	<b>Em Andamento</b>		
3.1	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	Não se aplica	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	16/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	Não se aplica	17/11/2016	17/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	02/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	100%	A Iniciar		
3.6	Publicação do Boletim no site e apresentação a SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		

	<b>Valor Previsto:</b>	R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	93%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
--	------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----	---------------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

\*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 32</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de
<b>Finalidade da ação:</b>	das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste no período 2000-2010, considerando que este tema se correlaciona fortemente com os objetivo do PRDNE, estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto</b>	Albertina de Souza Leão Pereira
--	---------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>1</b>	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>Maria do Carmo</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	Maria do Carmo	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Maria do Carmo	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Maria do Carmo	10/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Maria do Carmo	17/10/2016	17/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	17/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
<b>2</b>	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados</b>	<b>Maria do Carmo</b>	<b>18/10/2016</b>	<b>22/11/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>18/10/2016</b>		<b>Não se aplica</b>	<b>90%</b>	<b>Atrasado</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	Maria do Carmo	18/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	18/10/2016	31/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Maria do Carmo	01/11/2016	22/11/2016	Não se aplica	05/12/2016		Não se aplica	80%	Atrasado	Foram identificados outros subsídios/informações para ampliação da análise, por este motivo, os prazos anteriormente planejados foram repactuados.	

<b>3</b>	<b>Produto 3 - Boletim de Migração</b>	<b>Maria do Carmo</b>	<b>06/12/2016</b>	<b>30/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>			<b>Não se aplica</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
3.1	Análise dos indicadores	Maria do Carmo	06/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Maria do Carmo	06/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.3	Validação final	Albertina/ Fred	12/12/2016	16/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.4	Ajustes no documento	Albertina/Estagiário	19/12/2016	19/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	20/12/2016	23/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
3.6	Publicação do Boletim no site e apresentação à SUDENE	ASCON	26/12/2016	30/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	63%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações: **Meta Institucional**

4º ciclo 2016

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 33</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido</b>		<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Luiz/Lautemyr Canel
--	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>1</b>	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
<b>2</b>	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
<b>3</b>	<b>Produto 3 - Boletim de Emprego</b>	<b>José Luiz</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>01/11/2016</b>		<b>Não se aplica</b>	<b>80%</b>	<b>Em Andamento</b>		
3.1	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	Não se aplica	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		

3.3	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	16/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.4	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	Não se aplica	17/11/2016	17/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	02/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	93%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

\*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 34
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de		
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Luiz/Lautemyr Canel
--	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>03/10/2016</b>	<b>14/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	03/10/2016	06/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	07/10/2016	07/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	10/10/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	11/10/2016	14/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	<b>José Luiz</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>17/10/2016</b>	<b>28/10/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	17/10/2016	21/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	24/10/2016	28/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
3	<b>Produto 3 - Boletim de Rendimento</b>	<b>José Luiz</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>22/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>01/11/2016</b>		<b>Não se aplica</b>	<b>80%</b>	<b>Em Andamento</b>		
3.1	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	Não se aplica	01/11/2016	10/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído		

3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	11/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.3	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	16/11/2016	16/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.4	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	Não se aplica	17/11/2016	17/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley	02/12/2016	09/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	93%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

\*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 35</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido</b>			<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
<b>Projeto:</b>	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Albertina Pereira/Gabriela Isabel
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
<b>1</b>	<b>Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>30/11/2016</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>28/11/2016</b>		<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
1.1	Selecionar indicadores	Gabriela Isabel	16/11/2016	21/11/2016	Não se aplica	16/11/2016	21/11/2016		100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Gabriela Isabel	21/11/2016	22/11/2016	Não se aplica	21/11/2016	22/11/2016		100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Gabriela Isabel	22/11/2016	25/11/2016	Não se aplica	22/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Gabriela Isabel	25/11/2016	30/11/2016	Não se aplica	25/11/2016	28/11/2016		100%	Concluído		
<b>2</b>	<b>Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>01/12/2016</b>	<b>15/12/2016</b>	<b>Não se aplica</b>				<b>10%</b>	<b>Em Andamento</b>		
2.1	Obtenção dos Dados	Gabriela Isabel	01/12/2016	08/12/2016	Não se aplica	28/11/2016			20%	Em Andamento		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Gabriela Isabel	08/12/2017	15/12/2016	Não se aplica				0%	A Iniciar		

<b>3</b>	<b>Produto 3 - Boletim sobre Universalização da Educação Básica</b>	<b>Gabriela Isabel</b>	<b>01/11/2016</b>	<b>23/02/2017</b>	<b>Não se aplica</b>				<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
3.1	Análise dos indicadores	Gabriela Isabel	16/12/2016	21/01/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar	Servidora de férias no período 26/12/2016 a 13/01/2017.	
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Gabriela Isabel	21/01/2017	25/01/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
3.3	Validação final	Albertina / Fred	25/01/2017	02/02/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
3.4	Ajustes no documento	Gabriela Isabel	02/02/2017	09/02/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
3.5	Diagramação do Boletim	Shirley/ASCOM	09/02/2017	16/02/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	16/02/2017	23/02/2017	Não se aplica				0%	A Iniciar		
<b>Valor Previsto:</b>					R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	37%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 36
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
<b>Finalidade da ação:</b>	Subsidiar a elaboração de um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de sistematização de informações de natureza orçamentária e financeira, de forma que permita um recorte regional e uma visão voltada para a identificação de desigualdades inter-regionais e intrarregionais do gasto público.				
<b>Projeto:</b>	Boletim Temático - Painel do Orçamento Público - Relatório de Acompanhamento e Análise do grau de regionalização da execução orçamentária do Governo Federal				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover o desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal, através da análise do grau de regionalização				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	07/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Joyce Queiroz e Silva
---	-----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Seleção da fonte de dados e benchmarking</b>	Joyce Queiroz	02/01/2017	15/01/2017					0%	A Iniciar		
1.1	Selecionar fonte de dados da execução orçamentária do Governo Federal	Joyce Queiroz	02/01/2017	07/01/2017					0%	A Iniciar		
1.2	Selecionar benchmarking para comparação	Joyce Queiroz	02/01/2017	07/01/2017					0%	A Iniciar		
1.3	Elaborar metadados (montar o quadro)	Joyce Queiroz	09/01/2017	15/01/2017					0%	A Iniciar		
2	<b>Estruturação da base de dados orçamentária</b>	Joyce Queiroz	16/01/2017	10/02/2017					0%	A Iniciar		
2.1	Obtenção e tratamento dos dados de natureza orçamentária	Joyce Queiroz	16/01/2017	21/01/2017					0%	A Iniciar		
2.2	Obtenção e tratamento dos indicadores de benchmarking	Joyce Queiroz	16/01/2017	21/01/2017					0%	A Iniciar		
2.3	Organização da base de dados	Joyce Queiroz	21/01/2017	27/01/2017					0%	A Iniciar		
2.4	Tabulação dos dados	Joyce Queiroz	21/01/2017	27/01/2017					0%	A Iniciar		
3	<b>Relatório de Acompanhamento e Análise do grau de regionalização da execução orçamentária do Governo Federal</b>	Joyce Queiroz	27/01/2017	07/04/2017					0%	A Iniciar		

3.1	Análise dos dados	Joyce Queiroz	27/01/2017	03/02/2017					0%	A Iniciar	
3.2	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Joyce Queiroz	06/02/2017	22/02/2017					0%	A Iniciar	
3.3	Diagramação do Relatório	Joyce Queiroz	23/02/2017	24/02/2017					0%	A Iniciar	
3.4	Validação da chefia imediata	Frederico Cavalcanti	27/02/2017	10/03/2017					0%	A Iniciar	
3.5	Ajustes	Joyce Queiroz	13/03/2017	24/03/2017					0%	A Iniciar	
3.6	Encaminhamento para Diretoria Colegiada	Joyce Queiroz	27/03/2017	07/04/2017					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	0%	A Iniciar	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

A alocação dos técnicos servidores que trabalharam neste projeto será em janeiro/17

**4º ciclo 2016**

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 37</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido</b>		<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
<b>Finalidade da ação:</b>	Elaborar manual interno de boas práticas para concepção de projetos/programas a fim de facilitar seu acompanhamento e avaliação			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
<b>Problema (causa):</b>	Inexistência de um manual interno de boas práticas de acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE			
<b>Projeto:</b>	Manual de rotinas de acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Elaborar manual interno de boas práticas para acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/03/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Joyce Queiroz e Silva
---	-----------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	<b>Selecionar literatura sobre acompanhamento e avaliação de programação de projetos públicos</b>	Joyce Queiroz	02/01/2017	17/01/2017					0%	A Iniciar		
1.1	Selecionar fontes relevantes sobre o tema de acompanhamento e avaliação de projetos públicos	Joyce Queiroz	02/01/2017	13/01/2017					0%	A Iniciar		
1.2	Seleção, dentre as fontes levantadas nas etapas anteriores, das fontes que serão utilizadas neste trabalho	Joyce Queiroz	02/01/2017	13/01/2017					0%	A Iniciar		
1.3	Elaborar quadro síntese com principais autores e teorias	Joyce Queiroz	16/01/2017	17/01/2017					0%	A Iniciar		
2	<b>Análise das Teorias e Trabalhos selecionados na etapa anterior</b>	Joyce Queiroz	18/01/2017	08/02/2017					0%	A Iniciar		
2.1	Análise das boas práticas para acompanhamento da programação de projetos públicos	Joyce Queiroz	24/01/2017	27/01/2017					0%	A Iniciar		
2.2	Análise das boas práticas para avaliação de projetos públicos	Joyce Queiroz	30/01/2017	03/02/2017					0%	A Iniciar		
2.3	Aplicação das análises para os projetos e atividades da SUDENE	Joyce Queiroz	03/02/2017	08/02/2017					0%	A Iniciar		
3	<b>Relatório com Boas Práticas de acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE</b>	Joyce Queiroz	08/02/2017	22/03/2017					0%	A Iniciar		
3.1	Elaboração do relatório com boas práticas acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE	Joyce Queiroz	08/02/2017	17/02/2017					0%	A Iniciar		
3.2	Diagramação do Relatório	Joyce Queiroz	20/02/2017	21/02/2017					0%	A Iniciar		

3.3	Validação da chefia imediata	Frederico Cavalcanti	21/02/2017	10/03/2017				0%	A Iniciar		
3.4	Ajustes e correções	Joyce Queiroz	13/03/2017	15/03/2017				0%	A Iniciar		
3.5	Encaminhamento para Diretoria Colegiada	Joyce Queiroz	16/03/2017	22/03/2017				0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$	-	<b>Valor realizado:</b>	R\$	-	0%	A Iniciar	<b>Status do Projeto</b>

<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
A alocação dos técnicos servidores que trabalharam neste projeto será em janeiro/17											
<b>4º ciclo 2016</b>											

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 38</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
<b>Finalidade da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
<b>Problema (causa):</b>	O Estado e seu conjunto de municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
<b>Projeto:</b>	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de Desenvolvimento. Políticas Regionais -MI		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico-social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Grande e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-		-	-	-

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
0,00	0,00		0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
0,00	0,00	-	0,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/03/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE	Lautemyr Canel/Marcus Vinicius
	Unidade Descentralizada	Não se aplica

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto (3)			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Articulação com o MI para elaboração do PED _ Alagoas	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	08/05/2015	08/05/2015	Não se aplica	08/05/2015	08/05/2015	Não se aplica	100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico do Estado de Alagoas	
2	Reunião em Maceió com a SEDETUR - Governo de Alagoas	Diretor, Coordenador Geral e as Técnicas Marina e Tássia	08/08/2015	08/08/2015	Não se aplica	08/08/2015	08/08/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Parceria do MI com o IICA (Projeto de Cooperação Técnica denominado PCT/BRA/IICA/09/003)	MI e IICA	21/12/2015	21/12/2015	Não se aplica	21/12/2015	21/12/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
4	Reunião com o MI para alinhamento do PED_ Alagoas	MI e IICA	24/12/2015	24/12/2015	Não se aplica	24/12/2015	24/12/2015	Não se aplica	100%	Concluído		
5	Licitação para contratação pelo IICA de empresa de consultoria para elaboração do Plano	MI	26/02/2016	26/02/2016	Não se aplica	26/02/2016	26/02/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
6	Envio de ofício para o IICA atendendo a dilação do cronograma de execução.	MI e IICA	21/03/2016	21/03/2016	Não se aplica	21/03/2016	21/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
7	Publicação de novo edital para licitação de contratação de empresa para elaboração do PED_ Alagoas.	MI	18/04/2016	18/04/2016	Não se aplica	18/04/2016	03/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído		
8	<b>Produto 1:</b> Elaboração e validação do Plano de Trabalho	MI	26/09/2016	29/09/2016	Não se aplica	29/09/2016	29/09/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Reunião na sede do MI, em Brasília	
9	<b>Produto 2 (a):</b> Diagnóstico Situacional Participativo (Construção participativa com base no MAPA DE ATORES)	MI	22/11/2016	29/11/2016	Não se aplica	22/11/2016	29/11/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Oficinas nas cidades pólo (Penedo, Arapiraca, Maragogi e Demiro Golveia) com lideranças locais. Participação da SUDENE nas Oficinas de Arapiraca e Maragogi (23 e 24/11/2016)	
10	<b>Produto 2 (b):</b> Diagnóstico Situacional Participativo Setorial (Construção participativa com base no MAPA DE ATORES)	MI	06/12/2016	16/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	Em Andamento	Oficinas temáticas setoriais na Cidade de Maceió - AL (Turismo, Agroindústria, Comércio e Indústria)	
11	<b>Produto 3:</b> Diretrizes Estratégicas	MI	19/12/2016	20/12/2016	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	última tarefa de 2016	
12	<b>Produto 4: a)</b> Avaliação da proposta preliminar do Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Alagoas	MI	10/02/2017	10/02/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	Reunião na sede do MI, em Brasília	
13	<b>Produto 4: b)</b> Seminário de validação da proposta preliminar do Plano Estadual de Desenvolvimento	MI	17/02/2017	17/02/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar	Reunião na sede do MI, em Brasília	
14	Publicação final do PDE Alagoas	MI	15/03/2017	15/03/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		

15	Parecer de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Lautemyr Canel e Marcus Vinícius)	24/03/2017	24/03/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
16	Parecer final de acompanhamento SUDENE REVISADO.	DPLAN (Lautemyr Canel e Marcus Vinícius)	27/03/2017	28/03/2017	Não se aplica			Não se aplica	0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 0,00	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 0,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

- Plano de Desenvolvimento do Estado de Alagoas, custeado por intermédio da Agência IICA e Ministério do Integração Nacional. Por parte da SUDENE, com base na Minuta de Cooperação MI, SUDENE, Estado de Alagoas (a ser assinada), a participação se dará em apoio às Reuniões e Oficinas no território.
- O custo a ser arcado pela SUDENE será em passagens, combustível e diárias para o técnico que acompanha o Projeto e Motorista Oficial da SUDENE.

4º ciclo 2016

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 30 (ex PO 30)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido</b>	<b>Ano:</b>	<b>2013</b>
<b>Programa do PPA:</b>	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO	<b>Eixo temático (MI):</b>	Garantir Segurança Hídrica
<b>Ação do PPA:</b>		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
<b>Objetivo da ação:</b>	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade equitativa suficientes à segurança alimentar e nutricional.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	-
<b>Problema (causa):</b>	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social		
<b>Projeto:</b>	Programa Água para Todos		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 7.878.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 9.360.000,00
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2017
<b>Data Atualização:</b>	31/08/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito n° 35	MI - Sudene	01/09/2013	26/09/2013		01/09/2013	02/09/2013		100%	Concluído		
2	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/2013	02/10/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
3	Abertura e Intrução dos Processos	GTAPT	01/09/2013	09/09/2013		01/09/2013	30/10/2013		100%	Concluído		
4	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/2013	23/12/2013		01/10/2013	01/10/2013		100%	Concluído		
5	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/2014	30/01/2014		01/11/2013	01/12/2013		100%	Concluído		
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/2014	30/05/2014		01/04/2014	01/05/2014		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.	
7	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014		02/04/2014	02/05/2014		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram sucesso para empenho.	Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/05/2014	R\$ 8.658.000,00	01/04/2014	01/05/2014	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte form.: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.	Um município do estado do Piauí foi empenhado, mas não se habilitou para o recebimento da primeira parcela.
9	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/2015	31/07/2015		01/03/2015	31/07/2015		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas as solicitações de Ofícios.	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.
10	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015			90%	Atrasado	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT n° 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP n° 01/2016.

11	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	27/05/2016		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/2015	30/11/2015		01/08/2015	01/02/2016		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/2015	03/12/2015		01/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/2015	04/12/2015		03/12/2015	03/12/2015		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito. A SUDENE rescindiu 61 TC's.
15	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/2015	01/05/2016	R\$ 34.632.000,00	01/12/2015		R\$ 9.360.000,00	60%	Atrasado	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje com os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE, a Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento.	A SUDENE continua com 18 municípios em Restos a Pagar.
16	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/2016	31/03/2017		01/02/2016			20%	Em Andamento	Os municípios que receberam recursos de forma integral, em média possuem 20% das obras executadas. Estes municípios tiveram seus TC's prorrogados.	
17	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/2015	30/05/2017		10/12/2015			64%	Em Andamento	A Comissão fiscalizou as obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Porém resta a SUDENE fiscalizar 36% dos recursos financeiros liberados na primeira parcela, e voltar a fiscalizar aqueles que ainda não haviam licitado. Logo, a SUDENE deve fiscalizar um montante de R\$2.262.000,00 em aproximadamente 29 municípios, liberados ainda em 2013.	Existem dezoito municípios que receberam a primeira parcela e encontram-se empenhados, faltando fiscalização das obras. A Comissão de Força Tarefa, através do Memorando n° 0050/2016-FT_PAPT/NE informou ao Gabinete da SUDENE e a Diretoria de Planejamento, acompanhou este menorando os dez roteiros necessários para a ação.
18	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	31/03/2017	30/05/2017					0%	A Iniciar		
19	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	30/05/2017	30/07/2017					0%	A Iniciar		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	30/05/2017	30/07/2017					0%	A Iniciar		
21	Encerramento do PAPT	FTAPT	30/07/2017	30/09/2017					0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 43.290.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 17.238.000,00	73,0%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretária de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progrmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progrmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.

Observações:  
3º Ciclo 2016

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	40 (ex PO 31)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2008
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Transnordestina Logística S/A - TLSA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/12/2015
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira
--	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>08/08/08</b>	<b>28/11/08</b>	<b>0,00</b>	<b>08/08/08</b>	<b>24/11/08</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/01/10</b>	<b>31/05/15</b>	<b>3.876.491.700,00</b>	<b>12/01/10</b>	<b>-</b>	<b>3.065.105.668,00</b>	<b>83%</b>	<b>Atrasado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>92%</b>	<b>Atrasado</b>		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>					<b>Valor Previsto:</b>	<b>3.876.491.700,00</b>		<b>3.065.105.668,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros Institucionais:**

<b>Observações:</b>
<b>4º Ciclo 2016</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 41 (ex PO 32)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2013
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.593.233.020,25
A realizar no exercício	R\$ 365.766.979,75
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 245.019.314,75
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 120.747.665,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.838.252.335,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>18/12/12</b>	<b>31/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>18/12/12</b>	<b>24/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	

13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00				0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/09/13</b>	<b>31/12/16</b>	<b>1.959.000.000,00</b>	<b>24/10/13</b>	<b>00/01/00</b>	<b>1.838.252.335,00</b>	<b>90%</b>	<b>Em Andamento</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>95%</b>	<b>Em Andamento</b>	
16	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 1.959.000.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 1.838.252.335,00</b>	<b>82,35%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------	---------------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.

Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.

Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.

Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Obs.6

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 42 (ex PO 33)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2008
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia termoeétrica - 290 MW - Candeias/BA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/03/2010
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/07/08</b>	<b>31/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>24/07/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGGF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/03/12</b>	<b>20/04/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>21/03/12</b>	<b>01/06/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 43 (ex PO 34)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2008
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 11.099.063,37
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para implantação do empreendimento.

<b>Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/01/08</b>	<b>05/01/09</b>	<b>0,00</b>	<b>21/01/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/12/2016	31/12/2016	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	A Iniciar	O BNB indica que há possibilidade de não liberação do restante dos recursos, sendo esta condicionada à readequação do projeto. Ainda não houve formalização.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/12/16</b>	<b>31/12/16</b>	<b>53.576.481,00</b>	<b>13/10/15</b>	<b>-</b>	<b>42.477.417,63</b>	<b>50%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco								75%	Em Andamento
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar

Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar
----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

- 4º Ciclo 2016
- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
- Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
- Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
- Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
- Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
- Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está pro
- Obs9: Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.
- Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 44 (ex PO 35)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2015
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>59.700.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>02/02/15</b>	<b>59.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 45 (ex PO 36)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87
A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 1.264.056,13
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	13/08/2016	Data prevista para implantação do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>31/05/14</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>15/02/16</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 46 (ex PO 37)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faísia I Geração e Comercialização de Energia Ltda			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
<b>Total Liberado até o exercício</b>	<b>R\$ 63.942.862,59</b>

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/01/17	31/01/17	496.137,41	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/01/17</b>	<b>64.439.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>63.942.862,59</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco							83%	Em Andamento
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar

Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar
----------------------	--	--	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		63.942.862,59	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 47 (ex PO 38)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/01/17	31/01/17	428.678,72	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/01/17</b>	<b>59.864.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>59.435.321,28</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>59.864.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>59.435.321,28</b>	<b>70,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 48 (ex PO 39)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faísca III Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$ 429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	<b>Concluído</b>		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	<b>Concluído</b>		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	<b>Concluído</b>	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	<b>Concluído</b>		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	<b>Concluído</b>	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/01/17	31/01/17	429.090,12	-	-		0,00%	<b>A Iniciar</b>	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/01/17	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.278.000,00	Valor realizado:		54.848.909,88	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 49 (ex PO 40)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/01/17	31/01/17	1.056.552,40	-	-		0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/01/17	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco									83%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		54.216.447,60	70,00%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 50 (ex PO 41)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia Eólica - 27.3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	64.455.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	09/03/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>11/09/15</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 51 (ex PO 42)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2011</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2015	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>26/12/13</b>	<b>02/02/15</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>Atrasado</b>
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

**Observações:**  
**4º Ciclo 2016**  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.  
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.  
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.  
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.  
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 52 (ex PO 43)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	<b>2011</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39
A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 3.213.914,61
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	13/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>07/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>15/02/16</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado				0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 53 (ex PO 44)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

<b>Previsão de Conclusão:</b>	08/02/2015	Data prevista para conclusão do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J. Emerson/ A.F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído	
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>										
<b>Observações:</b>										
<b>4º Ciclo 2016</b>										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.										
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 54 (ex PO 45)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>		<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eólica Moxotó S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/05/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>14/06/13</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>15/05/13</b>	<b>01/12/15</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A Iniciar</b>

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>40.845.410,40</b>	<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

**Parceiros Institucionais:**

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

- Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
- Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
- Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
- Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
- Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 55 (ex PO 46)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/05/2015	Data prevista para conclusão do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13	-	15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>20/11/14</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	-	-	100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado de conclusão do empreendimento e o encaminhou por meio do Ofício nº DIRET - 2016/106, de 29/08/2016. Durante a análise a área técnica da Sudene encontrou pendências e solicitou ao banco as devidas correções. Até o momento ainda aguarda-se a resposta.
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>75%</b>	<b>Atrasado</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>29.040.000,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**  
**4º Ciclo 2016**  
 Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
 Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.  
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.  
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.  
 Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 56 (ex PO 47)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Eólica Pedra do Reino S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	19/05/2015
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>20/11/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado de conclusão do empreendimento e o encaminhou por meio do Ofício nº DIRET - 2016/105, de 29/08/2016. Durante a análise a área técnica da Sudene encontrou pendências e solicitou ao banco as devidas correções. Até o momento ainda aguarda-se a resposta.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Atrasado	

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.959.000,00	Valor realizado:	53.959.000,00	95,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:

Observações:  
**4º Ciclo 2016**  
 Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
 Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.  
 Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.  
 Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 57 (ex PO 48)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2011
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ 3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício (RAP)	0,00
Saldo a liberar	R\$ 3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Claudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>23/08/10</b>	<b>07/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>23/08/10</b>	<b>22/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13	-	22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/01/17	31/01/17	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>22/05/13</b>	<b>31/01/17</b>	<b>99.970.000,00</b>	<b>22/05/13</b>	<b>-</b>	<b>96.407.194,96</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>99.970.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>96.407.194,96</b>	<b>70,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 58 (ex PO 47)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva			
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fábrica de Cimento			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 269.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ 33.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 30.000.000,00
Saldo a liberar	R\$ 3.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/04/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/12/12</b>	<b>21/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>21/12/12</b>	<b>19/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>19/04/13</b>	<b>31/10/16</b>	<b>303.000.000,00</b>	<b>19/04/13</b>	<b>-</b>	<b>299.869.740,06</b>	<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>92%</b>	<b>Em Andamento</b>		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Emoreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>		<b>303.000.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>299.869.740,06</b>	<b>72,73%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>4º Ciclo 2016</b>	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 59 (ex PO 50)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de Condomínio Logístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 108.616.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/03/2019
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>14/12/12</b>	<b>11/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>14/12/12</b>	<b>19/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>19/04/13</b>	<b>30/09/18</b>	<b>270.582.240,00</b>	<b>19/04/13</b>	<b>-</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>Em Andamento</b>		

Competência da SUDENE /Banco								56%	Em Andamento			
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>				<b>Valor Previsto:</b>	<b>270.582.240,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22,73%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		
<b>Parceiros institucionais:</b>												
<b>Observações:</b>												
<b>4º Ciclo 2016</b>												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 60 (ex PO 51)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Natulab Laboratório S.A.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Laboratório de Farmacos para Humanos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016	<b>Data prevista para conclusão do empreendimento.</b>
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>06/09/12</b>	<b>16/08/13</b>	<b>0,00</b>	<b>06/09/12</b>	<b>20/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13	-	20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>20/06/13</b>	<b>-</b>	<b>23.855.042,00</b>	<b>20/06/13</b>	<b>-</b>	<b>19.539.983,88</b>	<b>60%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>80%</b>	<b>Em Andamento</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>23.855.042,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>19.539.983,88</b>	<b>60,00%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

**Observações:**  
**4º Ciclo 2016**  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.  
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.  
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.  
Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recurso foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido ao descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 61 (ex PO 52)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Deten Química S.A.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação da Produção de Produtos Químicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/12/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>05/02/13</b>	<b>26/10/13</b>	<b>0,00</b>	<b>05/02/13</b>	<b>10/09/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14	-	10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>10/09/13</b>	<b>01/07/17</b>	<b>31.256.000,00</b>	<b>10/09/13</b>	<b>-</b>	<b>15.447.600,00</b>	<b>67%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>31.256.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>15.447.600,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 62 (ex PO 53)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Shineray do Brasil S.A.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Produção de Motocicletas		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	23/12/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016	

<b>Responsáv(el)eis técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>26/04/13</b>	<b>19/12/13</b>	<b>0,00</b>	<b>26/04/13</b>	<b>27/11/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>27/11/13</b>	<b>01/10/14</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>27/11/13</b>	<b>-</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>61.867.350,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 63 (ex PO 54)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Cone Multicenter Ltda			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de Complexo Turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/08/2017
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 177.367.554,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>14/12/12</b>	<b>27/08/13</b>	<b>0,00</b>	<b>14/12/12</b>	<b>28/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14	-	02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Ver Observação 3.	
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberção 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberção 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberção 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>28/06/13</b>	<b>03/03/17</b>	<b>191.238.424,00</b>	<b>02/06/13</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>56%</b>	<b>Em Andamento</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>		<b>191.238.424,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>0,00</b>	<b>28,57%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
<b>4º Ciclo 2016</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: O projeto está sendo totalmente reanalisado pelo agente operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 64 (ex PO 55)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Braskem S.A.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	18/02/2015
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Data prevista para conclusão do empreendimento.

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/09/13</b>	<b>08/06/14</b>	<b>0,00</b>	<b>03/09/13</b>	<b>12/05/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/05/14</b>	<b>31/08/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>16/05/14</b>	<b>22/08/14</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015.	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto: 50.000.000,00</b>			<b>Valor realizado: 50.000.000,00</b>			<b>71,43%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 65 (ex PO 57)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva				
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. ( antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 178.622.724,54
A realizar no exercício	R\$ 120.175.845,12
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 67.883.618,19
Saldo a liberar	R\$ 169.076.219,79
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 246.506.342,73

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2018
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>03/05/13</b>	<b>20/03/14</b>	<b>0,00</b>	<b>03/05/13</b>	<b>21/02/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	97.309.707,23	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/06/17	01/07/17	57.749.083,67	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/12/17	31/12/17	14.017.428,89	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/02/14</b>	<b>31/12/17</b>	<b>415.582.562,52</b>	<b>21/02/14</b>	<b>-</b>	<b>246.506.342,73</b>	<b>62,50%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>81%</b>	<b>Em Andamento</b>		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 415.582.562,52	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 246.506.342,73	62%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
<b>Parceiros institucionais:</b>							
<b>Observações:</b>							
<b>4º Ciclo 2016</b>							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs3: A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.							

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 66 (ex PO 58)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Cone S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de plataforma de serviços de logística			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/08/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>12/12/13</b>	<b>02/05/14</b>	<b>0,00</b>	<b>12/12/13</b>	<b>12/11/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-			-	0,00%	Atrasado	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Cronograma de desembolso será repactuado.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>18/11/14</b>	<b>02/03/16</b>	<b>123.186.471,03</b>	<b>00/01/00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>50,00%</b>	<b>Atrasado</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 123.186.471,03</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>21,43%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros Institucionais:

Observações:  
4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 67 (ex PO 59)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Iraeta Brasil S/A			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de uma unidade de fabricação de flanges eólicas			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	34.102.182,00	89.861.866,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 34.102.182,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 34.102.182,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 34.102.182,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 34.102.182,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/04/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>07/10/14</b>	<b>27/09/15</b>	<b>0,00</b>	<b>07/10/14</b>	<b>23/09/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	22/09/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Cronograma de desembolso será repactuado no momento da contratação do financiamento.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>28/09/15</b>	<b>31/10/15</b>	<b>34.102.182,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>Atrasado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>75%</b>	<b>Atrasado</b>		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 34.102.182,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>57%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:  
4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b> PO 68 (ex PO 60)	
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			<b>Exo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de			
<b>Objetivo da ação:</b>							<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva							
<b>Problema (causa):</b>	Saupe S/A							
<b>Projeto:</b>	Ampliação e modernização de um complexo turístico							
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação e modernização de um complexo turístico							

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	68.299.987,00	193.893.821,06

Previsão de Conclusão:		30/07/2018
Data Atualização:		30/11/2016

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir Vilaça/Claudia da Silva (SUDENE/DFIN)	09/10/14	08/11/14	-	09/10/14	30/10/14	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/05/15	22/10/15	-	25/05/15	26/10/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	26/10/15	25/11/15	-	26/10/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 231/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>09/10/14</b>	<b>25/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>09/10/14</b>	<b>12/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	10.133.063,55	-	-	-	0,00%	Atrasado	Cronograma de desembolso será repactuado no momento da contratação do financiamento.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	16.330.175,83	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	6.085.184,11	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	12.766.884,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/04/17	01/05/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/10/17	31/10/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	5.731.169,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>16/11/15</b>	<b>31/01/18</b>	<b>68.299.987,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>56%</b>	<b>Em Andamento</b>		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>		<b>R\$ 68.299.987,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>R\$ -</b>	<b>29%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:  
4º Ciclo 2016  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 69 (ex PO 61)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2015
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Problema (causa):</b>				
<b>Projeto:</b>	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.			
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação e modernização de um complexo turístico			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	31/12/2016
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 39.800.940,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>29/06/15</b>	<b>03/12/15</b>	<b>0,00</b>	<b>29/06/15</b>	<b>12/11/15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>16/11/15</b>	<b>31/12/15</b>	<b>39.800.940,00</b>	<b>-</b>	<b>13/06/16</b>	<b>39.800.940,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 39.800.940,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 39.800.940,00	71%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-----	---------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
4º Ciclo 2016	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			<b>Número do Projeto:</b>	PO 70(ex PO 64)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			<b>Ano:</b>	
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Caetex Florestal S.A.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Cultivo de eucalipto.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	R\$ 25.459.126,00	R\$ 95.852.598,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 8.954.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 25.459.126,00
Valor Empenhado no Exercício	-
Valor liberado no Exercício	-
Saldo a liberar	R\$ 25.459.126,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.459.126,00
Total Liberado até o exercício	-

<b>Previsão de Conclusão:</b>	29/06/2022
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	24/11/15	04/12/16	-	24/11/15	04/12/16	-	100%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	05/02/16	05/06/16	-	05/02/16	30/05/16	-	100%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/06/16	21/07/16	-	21/06/16	20/06/16	-	100%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/11/15</b>	<b>21/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>24/11/15</b>	<b>20/06/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/07/16	18/09/16	-	-	-	-	100%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/07/16	30/09/16	R\$ 5.312.000,00	-	-	-	0,0%	Atrasado		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/10/16	31/12/16	R\$ 3.642.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/01/17	31/03/17	R\$ 867.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/04/17	30/06/16	R\$ 1.742.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/07/17	30/09/17	R\$ 1.742.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
10	Liberção 6	SUDENE/BB	01/10/17	31/12/17	R\$ 867.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
11	Liberção 7	SUDENE/BB	01/01/18	31/03/18	R\$ 860.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
12	Liberção 8	SUDENE/BB	01/04/18	30/06/18	R\$ 1.753.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
13	Liberção 9	SUDENE/BB	01/07/18	30/09/18	R\$ 1.753.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
14	Liberção 10	SUDENE/BB	01/10/18	31/12/18	R\$ 860.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
15	Liberção 11	SUDENE/BB	01/01/19	30/03/19	R\$ 773.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
16	Liberção 12	SUDENE/BB	01/04/19	30/06/19	R\$ 1.111.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
17	Liberção 13	SUDENE/BB	01/07/19	30/09/19	R\$ 1.111.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
18	Liberção 14	SUDENE/BB	01/10/19	31/12/19	R\$ 773.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		
19	Liberção 15	SUDENE/BB	01/01/20	31/03/20	R\$ 252.000,00	-	-	-	0,0%	A Iniciar		

20	Liberação 16	SUDENE/BB	01/04/20	30/06/20	R\$	703.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
21	Liberação 17	SUDENE/BB	01/07/20	30/09/20	R\$	703.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
22	Liberação 18	SUDENE/BB	01/10/20	31/12/20	R\$	252.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
23	Liberação 19	SUDENE/BB	01/01/21	31/03/21	R\$	3.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
24	Liberação 20	SUDENE/BB	01/04/21	30/06/21	R\$	189.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
25	Liberação 21	SUDENE/BB	01/07/21	30/09/21	R\$	189.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
26	Liberação 22	SUDENE/BB	01/10/21	31/12/21	R\$	3.000,00	-	-		0,0%	A Iniciar	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/07/21</b>	<b>31/12/21</b>		<b>25.460.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>4,35%</b>	<b>Em Andamento</b>
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>52%</b>	<b>Em Andamento</b>	

27	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado			-	-	-	0,00%	A Iniciar	
28	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado			-	-	-	0,00%	A Iniciar	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>	

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$</b>	<b>25.460.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>26%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	------------	----------------------	-------------------------	------------	----------	------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2016

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 71 (ex PO 65)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Suzano Papel e Celulose S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	27/12/2024
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 223.997.049,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 260.189.953,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 260.189.953,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>21/10/15</b>	<b>27/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>21/10/15</b>	<b>20/07/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	31/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/12/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/12/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>20/07/16</b>	<b>31/12/16</b>	<b>260.189.953,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>63%</b>	<b>Em Andamento</b>		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 260.189.953,00</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>31%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	--	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------	--------------------------

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>4º Ciclo 2016</b>	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		<b>Número do Projeto:</b>	PO 72 (ex PO 66)	
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		<b>Ano:</b>	2016	
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
<b>Objetivo da ação:</b>			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF	
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva				
<b>Problema (causa):</b>					
<b>Projeto:</b>	Brametal S.A				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/12/2018
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto: Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 4.095.556,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.095.556,81
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>27/08/15</b>	<b>20/08/16</b>	<b>0,00</b>	<b>27/08/15</b>	<b>01/08/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	-	-	-	0,00%	Atrasado		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/08/16</b>	<b>30/09/16</b>	<b>4.095.556,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>75%</b>	<b>Em Andamento</b>		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 4.095.556,81</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>38%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**  
4º Ciclo 2016  
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 73 (ex PO 67)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa do PPA:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação do PPA:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
<b>Objetivo da ação:</b>		<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Diretor:</b>	Sergio Wanderley Silva		
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Placas do Brasil S/A		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/07/2019
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 162.843.330,73
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 162.843.330,73
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>15/02/16</b>	<b>08/12/16</b>	<b>0,00</b>	<b>15/02/16</b>	<b>23/11/16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contratos SUDENE/BB e BB/Empresa em fase de formalização.	
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	38.539.362,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/03/17	31/03/17	23.854.994,90	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	24.589.791,29	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/09/17	01/10/17	27.684.373,59	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/12/17	31/12/17	29.341.232,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberção 6	SUDENE/BB	01/03/18	31/03/18	13.415.567,03	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberção 7	SUDENE/BB	01/06/18	01/07/18	5.418.008,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>28/11/16</b>	<b>01/07/18</b>	<b>162.843.330,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6,25%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>53%</b>	<b>Em Andamento</b>		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 162.843.330,73</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>27%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
4º Ciclo 2016	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016-2017**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 74</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Sub-objetivo:</b>	<b>3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.</b>		
<b>Programa:</b>	-	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	Ação interna	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
<b>Unidade Responsável:</b>	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
<b>Responsável:</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros
<b>Problema (causa):</b>	Modificação da Estrutura Regimental por parte do Governo Federal		
<b>Projeto:</b>	Atualização do Regimento Interno.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adequar o atual RI da SUDENE aos novos cargos sancionados por meio de Decreto nº 8.891, de 27/10/2016.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
				0,00	R\$ -

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	12/01/2017
<b>Data Atualização:</b>	02/12/2016

<b>Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto</b>	Carmen Lúcia Couto Fonseca
--	----------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Passar orientações sobre o RI em Reunião de Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	04/11/2016	04/11/2016		04/11/16	04/11/16	--	100,00%	<b>Concluído</b>	Todo o andamento das providências para a construção do RI começou com a publicação do Decreto nº 8.891, de 27/10/2016, com a nova estrutura regimental da SUDENE. As informações foram passadas à Diretoria Colegiada na 246ª reunião, de 04/11/2016	Prazo dado pelo Decreto nº 8.891/2016 para o novo RI: 60 dias a partir de 30/11/2016.
2	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/11/2016	07/11/2016		07/11/16	07/11/16		100,00%	<b>Concluído</b>	A análise objetivou verificar as diferenças entre o Decreto nº 8.276/2014 e o atual, bem como, o impacto dos cortes nas estruturas internas afetadas, além dos cargos convertidos de DAS para FCPE.	
3	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	08/11/2016	25/11/2016		22/11/16	02/12/16		100,00%	<b>Concluído</b>		
4	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/11/2016	09/12/2016		22/11/16			75,00%	<b>Em Andamento</b>		
5	Retorno das unidades e últimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/11/2016	09/12/2016					0,00%	<b>A Iniciar</b>		
6	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final e ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	12/12/2016	16/12/2016					0,00%	<b>A Iniciar</b>		
7	Elaboração/revisão das Siglas da Sudene em função das modificações da estrutura	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/12/2016	19/12/2016					0,00%	<b>A Iniciar</b>		
8	Encaminhamento às unidades das novas siglas	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	20/12/2016	21/12/2016					0,00%	<b>A Iniciar</b>		

9	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	16/12/2016	27/12/2016					0,00%	A Iniciar	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD.
10	Apresentação da proposta final à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/01/2017	11/01/2017					0,00%	A Iniciar	
11	Aprovação pela DC, publicação no DOU e Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	12/01/2017	12/01/2017					0,00%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	0,00	<b>Valor realizado:</b>				34,09%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

**Observações:**

4º Ciclo 2016

Fonte: CGGI/Núcleo de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado




**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 75 (ex PO 69)</b>
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	<b>3.1.2. Modernizar a gestão</b>	<b>Ano:</b>	<b>2016</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
<b>Diretor:</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Heber Leandro Nunes
<b>Problema (causa):</b>	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
<b>Projeto:</b>	Monitoramento das últimas etapas de finalização de convênios.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Corrigir competências institucionais para o planejamento e execução de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Valor de Despesa	Validade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
				-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Previsão de Conclusão:</b>	ñ se aplica
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016



<b>Responsáv(el)is técnico(s) pelo Projeto</b>	Heber Leandro Nunes
--	---------------------

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1 Processo nº 59335.000175/2012-20 (SIAFI n.º 769473), Aprovação de Relatório de Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/01/2016	19/01/2016	ñ se aplica	04/01/2016	04/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
2 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/01/2016	03/02/2016	ñ se aplica	19/01/2016	20/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
3 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/01/2016	05/02/2016	ñ se aplica	21/01/2016	26/01/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
4 Processo nº 59335.000124/2012-06 (SIAFI n.º 769783), Análise Financeira complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	22/03/216	ñ se aplica	100%	Concluído			
5 Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/03/2016	05/04/2016	ñ se aplica	21/03/2016	31/03/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
6 Processo nº 59335.000116/2012-51 (SIAFI n.º 769782), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/04/2016	19/04/2016	ñ se aplica	04/04/2016	29/04/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
7 Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 542944), Análise Financeira complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	19/04/2016	04/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
8 Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Reanálise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/05/2016	04/06/2016	ñ se aplica	20/05/2016	24/05/2016	ñ se aplica	100%	Concluído			
9 Processo nº 03054.000003/99-74 (SIAFI n.º 374633), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	27/05/2016	11/06/2016	ñ se aplica	27/05/2016		ñ se aplica	50%	Em Andamento			
<b>Valor Previsto:</b>				-	<b>Valor realizado:</b>				-	94%	Em Andamento	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
<b>Observações:</b>	2º ciclo 2016 - Jan/2016 a Mai/2016 3º Ciclo 2016 - Dados não recebidos da unidade.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 76 (ex PO 70)
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	3.1.2. Modernizar a gestão			<b>Ano:</b>	2016
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial		
<b>Diretor:</b>	Eugênio Pacelli	<b>Gestor da subunidade:</b>	Heber Leandro Nunes		
<b>Problema (causa):</b>	Localização inadequada das etapas administrativas em convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
<b>Projeto:</b>	Monitoramento das últimas etapas administrativas de finalização de convênios.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Corrigir competências institucionais e acompanhar a execução de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

<b>Previsão de Conclusão:</b>	ñ se aplica
<b>Data Atualização:</b>	31/05/2016



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %				
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	30/06/2016	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar		
2	Processo TCE n.º , Ref. Conv. SIAFI n.º 317557 (Processo n.º 03057.000002/96-93) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações		
3	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	03/10/2016	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Em Andamento			
4	Processo TCE n.º 59335.000538/09-21, Ref. Conv. SIAFI n.º 406596 (Processo n.º 59313.000105/00-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	26/10/2015	30/06/2016	N/A	26/10/2015		N/A	66%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações		
			<b>Valor Previsto:</b>			-	<b>Valor realizado:</b>			77%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
<b>Observações:</b>	2º ciclo 2016 - Jan/2015 a Mai/2016 3º Ciclo 2016 - Dados não recebidos da unidade.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 77 (ex PO 71)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe				
<b>Projeto:</b>	Desenvolvimento de Lideranças				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	9.580,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	6.254,51
Saldo a liberar		
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	15.834,51

<b>Previsão de Conclusão:</b>	17/11/2019
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/06/16	15.420,00	04/05/15	17/10/16	6.254,51	100%	Concluído		
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/12/15	30/06/16	7.980,00	04/12/15	30/06/16	7.980,00	100%	Concluído		
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/07/16	30/11/16		01/07/16	26/10/16		100%	Concluído		
9	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e equipe	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	01/08/16	16/12/16		01/08/16	31/10/16		100%	Concluído		
10	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/16	30/12/16		01/11/16	17/11/16		100%	Concluído		

	<b>Valor Previsto:</b>	25.000,00	<b>Valor realizado:</b>	15.834,51	100%	<b>Concluído</b>	<b>Status do Projeto</b>
--	------------------------	-----------	-------------------------	-----------	------	------------------	--------------------------

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

Ciclo janeiro a novembro de 2016. O projeto é uma ação interligada ao Projeto Gestão por Competências e ambos ocorrerão nos próximos 04 anos conforme previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2016/2019.

4º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 78 (ex PO 72)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.				
<b>Projeto:</b>	Gestão por Competências				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 25.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 24.020,40
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 24.020,40

<b>Previsão de Conclusão:</b>	10/11/2019
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/06/16	25.000,00	01/04/15	10/06/16	24.020,40	100%	Concluído		
5	Reunião de orientação para descrição de competências por unidade organizacional	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	16/02/16	16/02/16		16/02/16	16/02/16		100%	Concluído		
6	Levantamento das competências das unidades organizacionais	Gestores das unidades organizacionais	16/02/16	29/02/16		16/02/16	29/02/16		100%	Concluído		
7	Mapeamento das competências	Marlene Franklin e Marina Braga	29/02/16	23/03/16		29/02/16	23/03/16		100%	Concluído		
8	Elaboração do projeto de gestão por competências	Marlene Franklin e Marina Braga	23/03/16	30/03/16		23/03/16	30/03/16		100%	Concluído		
9	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16		18/07/16	01/09/16		100%	Concluído		
10	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	27/06/16	18/10/16		18/07/16	01/09/16		100%	Concluído		
11	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	06/07/16	15/09/16		18/07/16	31/10/16		100%	Concluído		

12	Elaboração de Plano para o desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	21/09/16	14/12/16		07/11/16			50%	Em andamento	Data repactuada devido ao atraso de entrega dos trabalhos pelos representantes de área.
13	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
14	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
<b>Valor Previsto:</b>					25.000,00	<b>Valor realizado:</b>		24.020,40	82%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

CENTRESAF/PE - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

**Observações:**

Ciclo de janeiro a novembro de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento, de Pessoas, quando serão definidas as etapas.

**4º Ciclo 2016**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			<b>Número do Projeto:</b>	PO 79 (ex PO 73)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			<b>Ano:</b>	2014
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
<b>Programa:</b>	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos				
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas		
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Ângela Maria Lima Gouveia		
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral				
<b>Projeto:</b>	Investindo nos Sonhos				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laboral.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		10.000,00	10.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	6.200,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	6.200,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/11/2019
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2016

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
---	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído		
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		

8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído		
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.	
10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	Concluído		
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	Concluído		
12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15	22/09/15		100%	Concluído		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilitadores	15/09/15	02/10/15		15/09/15	02/10/15		100%	Concluído		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilitadores	16/10/15	18/12/15	2.500,00	16/10/15	18/12/15	1.200,00	100%	Concluído		
15	Encerramento do Projeto de 2015	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	18/12/15	18/12/15		18/12/15	18/12/15		100%	Concluído		
16	Planejamento do Projeto para 2016	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	01/09/16	09/09/16		01/09/16	09/09/16		100%	Concluído		
17	Realização dos Encontros - terceira turma	CGGP e facilitadores	18/11/16	16/12/16		18/11/16			50%	Em Andamento	Data repactuada	
<b>Valor Previsto:</b>					10.000,00	<b>Valor realizado:</b>			6.200,00	97%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Banco Central; Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Igreja Batista do Cordeiro

**Observações:**

Ciclo de janeiro a novembro de 2016. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.

4º Ciclo 2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 80 (ex PO 74)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho</b>	<b>Ano:</b>	<b>2012</b>
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	3.271.552,15
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$	155.878,20
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício	R\$	32.560,90
Valor liberado no Exercício	R\$	65.815,10
Saldo a liberar no Exercício	R\$	122.624,00
Saldo a Empenhar no exercício		
Total liberado até o exercício	R\$	3.337.367,25

<b>Previsão de Conclusão:</b>	06/09/2017
<b>Data Atualização:</b>	02/12/2016

<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino / Paula Aragão de Souza
---	---

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	R\$ 1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	R\$ 908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	R\$ 0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	R\$ 0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	R\$ 0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	R\$ 0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	R\$ 1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	R\$ 1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.	

5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	R\$ 140.000,00	11/03/13	11/02/14	R\$ 140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	R\$ 0,00	20/01/14	13/04/15	R\$ 0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.	
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	R\$ 960.000,00	06/02/14	05/12/14	R\$ 555.861,00	100%	Concluído		As poltronas foram entregues nesta Autarquia e pagas em 28/12/2015, aguardando a reforma dos auditórios para serem instaladas.
8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	15/06/16	R\$ 273.000,00	11/06/15			99,7%	Atrasado	Foi celebrado em 05/02/2015 o 1º Termo Aditivo ao Contrato, acrescentando o valor de R\$ 32.560,90 e prazo de 45 dias.	
8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15	28/10/15	R\$ 25.356,00	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 25.356,00.	Os serviços foram concluídos em 28/10/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	31/12/15		27/07/15	14/12/15	R\$ 60.220,50	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 60.220,50.	Os serviços foram concluídos em 14/12/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.3	Projeto Executivo	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	15/06/16		17/08/15		R\$ 65.815,10	99%	Atrasado	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 87.478,20.	A Área de Engenharia da Sudene recebeu da Contratada os elementos deste Projeto em desacordo com a análise realizada por este Setor técnico, que já sugeriu à CGAF a aplicação das sanções administrativas previstas em contrato.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	01/07/16	01/11/16	R\$ 0,00				0%	Atrasado		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	07/11/16	06/09/17	R\$ 3.300.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Eng. e Automação Ltda.	07/11/16	06/09/17	R\$ 72.000,00				0%	A Iniciar	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			06/09/17					0%	A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 7.553.642,89	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 3.337.367,25	67%	Em Andamento	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 81 (ex PO 75)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho</b>	<b>Ano:</b>	<b>2009</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
<b>Problema (causa):</b>	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
<b>Projeto:</b>	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	6.458.613,62
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$	2.211.931,24
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)		
Valor Empenhado no Exercício		
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar no Exercício		
Saldo a Empenhar no exercício		
Total liberado até o exercício	R\$	6.458.613,62

<b>Previsão de Conclusão:</b>	20/08/2015
<b>Data Atualização:</b>	02/12/2016

<b>Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino
--	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encaminhar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12	20/08/15	3.533.874,44	88%	Paralisado	A Diretoria Colegiada da Sudene autorizou a realização da vistoria final dos serviços, a qual foi realizada em 25/05/16.	

9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12	20/08/15	0,00	88%	Paralisado	A Comissão de Força-Tarefa, nomeada pela Portaria Sudene nº 027/2016, elaborou o Projeto Básico para a contratação de uma empresa de consultoria, que será responsável pela elaboração, dentre outros, do projeto executivo para a recuperação dos 27 blocos de fundação remanescentes.	A Comissão de Força-Tarefa encaminhou o referido Projeto Básico para a Diretoria de Administração da Sudene, estando o processo aguardando decisão superior para a contratação dos serviços.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00				0%	Paralisado		
			<b>Valor Previsto:</b>		9.673.041,23	<b>Valor realizado:</b>		6.458.613,62	90%	Paralisado	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

**Observações:**

4º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 82 (ex PO 76)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho</b>	<b>Ano:</b>	<b>2009</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
<b>Diretor :</b>		<b>Gestor da subunidade:</b>	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
<b>Problema (causa):</b>	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
<b>Projeto:</b>	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	33	90	4.226.603,89	4.226.603,89

<b>Previsão de Conclusão:</b>	28/02/2017
<b>Data Atualização:</b>	02/12/2016

<b>Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto</b>	José Wilson Galdino / Diego Vêras Emerenciano / Thiago Teles da Silva
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
A realizar no exercício 2016 (RAP 2014)	R\$ 48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar no Exercício	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	<b>Concluído</b>	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	<b>Concluído</b>	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	<b>Concluído</b>	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.

6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhou Memorando à CGAF, em 20/03/2015, solicitando a contratação dos serviços de modernização das subestações elétricas.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15	15/04/15	0,00	100%	Concluído	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que aguardasse a decisão final sobre que órgão condominial iria realizar esta licitação.	Ficou decidido que a contratação será realizada pela Sudene, tendo sido solicitada a autorização do MI, através do Ofício GAB/SUDENE nº 371/2015, em 17/07/15, e reiterado através do Ofício GAB/SUDENE nº 492/2015, em 1º/12/2015.
8	Autorização para a contratação dos serviços	Ministério da Integração Nacional	17/07/15	17/08/15	0,00	17/07/15	17/12/15	0,00	100%	Concluído	A autorização do Ministério da Integração Nacional foi proferida em 17/12/2015, em despacho do Secretário-Executivo Substituto, Sr. Laércio Roberto Lemos de Souza.	Face à necessidade de atender à Decisão judicial que anulou a interdição do Edifício SUDENE, a autorização ministerial caracterizou a contratação como emergencial.
9	Novo processo de contratação da obra	SUDENE/DAD	18/12/15	30/08/16	0,00	18/12/15			45%	Paralisado	Em 11/04/2016, a Área de Engenharia encaminhou o Projeto Básico para a contratação da obra, que recebeu a aprovação do Diretor de Administração, reduzindo o orçamento básico da obra para R\$ 4.066.603,89.	Atendendo solicitações, a Área de Engenharia realizou alterações no Projeto Básico, atualizando o orçamento básico da obra para R\$ 4.301.293,77, estando o processo aguardando decisão superior para a contratação dos serviços.
10	Execução da Obra	A definir	01/09/16	28/02/17	4.066.603,89					A Iniciar		
11	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Vêras e empresa de consultoria	01/09/16	28/02/17	60.000,00					A Iniciar		
12	Entrega da obra			28/02/17						A Iniciar		
					<b>Valor Previsto:</b>	4.226.603,89	<b>Valor realizado:</b>	100.000,00	38,41%	Paralisado	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2016

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 83 (ex PO 77)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	-
<b>Problema (causa):</b>	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)		
<b>Projeto:</b>	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	90	565.700,00	565.700,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	565.700,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	565.700,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>31/07/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>24/09/2016</b>



<b>Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Departamento (UFPE)
---	---------------------

N.E.	Atividades/ Etapas		Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído		
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído		
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	31/07/2016		30/04/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassete e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		
10	Produção de Artigos e pesquisas para o site e para o Ciclo de Debates. (R\$ 24.000,00)	Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015	31/07/2016		100%	Concluído		

11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
12	Coleta de depoimento na elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	20/07/2016		01/10/2015	19/08/2016		100%	Concluído	Apesar da vigência do TED ter sido 31/07/2016, a entrevista com o senador Armando Monteiro Neto estava agendada e adiada por conveniência do entrevistado.
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fabício Silva	15/05/2015	31/07/2016		15/05/2015	31/08/2016		100%	Concluído	
14	Produção de Artigos para o livro (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	31/05/2016		01/06/2015	31/05/2016		100%	Concluído	
15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Contratado	01/10/2015	31/07/2016		01/10/2015	31/07/2016		100%	Concluído	
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Contratado	01/08/2015	20/07/2016		30/09/2015	22/08/2016		100%	Concluído	Foi prevista a transcrição do último depoimento.
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Contratado	20/06/2016	31/07/2016		20/06/2016			99%	Atrasado	A gráfica atrasou a produção dos exemplares. Nova data de fim previsto para dia 10/10/2016.
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Contratado	01/04/2016	31/07/2016		01/04/2016			99%	Atrasado	As especificidades dos documentos, tornou o processo mais lento. Nova data de fim previsto para dia 10/10/2016.
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	31/07/2016		01/06/2015	31/07/2016		90%	Concluído	A realização do último Ciclo de Debates desta fase, será realizado em parceria com o Centro D[Celso Furtado e o BNB, que custeará as despesas, previsto para o mês de novembro.
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016						Cancelado	Por necessidade de outras atividades do projeto esta ação foi cancelada.
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/09/2015	31/07/2016		01/09/2015	31/07/2016		100%	Concluído	
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015	31/08/2016		100%	Concluído	O bolsista participou mais um mês devido a agenda externa.
			<b>Valor Previsto:</b>	<b>565.700,00</b>		<b>Valor realizado:</b>	<b>565.700,00</b>		<b>99%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia para o Conhecimento

**Observações:**

3º ciclo 2016

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2016**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 84 (ex PO 78)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
<b>Diretor:</b>	Eugenio Pacelli Remigio Araujo	<b>Gestor da subunidade:</b>	Josué Ribeiro
<b>Problema (causa):</b>	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
<b>Projeto:</b>	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88

<b>Previsão de Conclusão:</b>	<b>30/12/2016</b>
<b>Data Atualização:</b>	<b>30/11/2016</b>

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ 383.999,07
A realizar no exercício	R\$ 229.863,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 77.842,04
Saldo a liberar	R\$ 152.021,77
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 461.841,11

<b>Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto</b>	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada.	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE	
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	19/10/15	-	76.046,79	97%	Atrasado		
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos, modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	10/11/15	-	77.842,04	100%	Concluído		
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	29/07/16	-	26/02/16	-	-	60%	Atrasado		
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador	Área de TI, Empresa Contratada.	01/08/16	30/12/16	-	14/10/16	-	-	40%	Em Andamento		
<b>Valor Previsto:</b>					613.862,88	<b>Valor realizado:</b>			461.841,11	95%	Em Andamento	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Ministério da Integração Nacional e SUDAM

**Observações:**

**4º Ciclo 2016**

Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

**ANEXO II**  
**Gestão Orçamentária e Financeira**  
**Exercício 2016**

SUDENE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2016

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/0001	A	1	11.292.780,00	11.292.780,00	11.292.779,42	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	212.025,00	212.025,00	212.025,00	100,00	100,00	Servidor capacitado	199		0,00		
4	122	2111	216H/0020	A	1	102.594,00	102.594,00	92.952,62	100,00	90,60						
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	366.819,62	100,00	63,68	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001		1	53.867,00	53.867,00	49.289,55	100,00	91,50	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	132.831,05	100,00	55,35	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.243.671,00	1.243.671,00	1.137.485,54	100,00	91,46	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	22.044,00	22.044,00	3.096,32	100,00	14,05	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.900.000,00	3.900.000,00	3.229.511,27	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	28.721.138,00	28.721.138,00	25.815.596,64	100,00	-	-	-	-	-	-	
<b>2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI</b>						<b>Total</b>	<b>46.364.119,00</b>	<b>46.364.119,00</b>	<b>42.332.387,03</b>	<b>100,00</b>	<b>91,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
09	272	0089	0181	OP	1	2.503.124,00	2.503.124,00	2.389.985,96	100,00	95,48	-	-	-	-	-	
<b>0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>						<b>Total</b>	<b>2.503.124,00</b>	<b>2.389.985,96</b>	<b>100,00</b>	<b>95,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11	128	2029	4640	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	608	2029	214S/0001	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO006	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/7192	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0024	A	1	7.059.219,00	7.059.219,00	5.431.497,00	100,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
<b>2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária</b>						<b>Total</b>	<b>7.659.219,00</b>	<b>7.659.219,00</b>	<b>5.431.497,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,91</b>					
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
<b>2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres</b>						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: 30/11/2016 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

Observações:

a) Até o mês de novembro/2016 o SIAFI apresentava o valor de R\$ 12.291.618,00 bloqueado referente às Emendas parlamentares;

b) Até o mês de novembro/2016 o SIAFI apresentava o valor de R\$ 9.035.407,00 bloqueado para cancelamento por solicitação do Ministério da Integração referente às ações administrativas e finalísticas (desde outubro de 2016).

**ANEXO III**  
**Projetos tabulados segundo Diretrizes**  
**e Objetivos Estratégicos da SUDENE**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provisão de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provisão de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
7	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	10%
8	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
9	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	100%
10	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	50%
11	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	50%
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	0%
13	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
14	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
15	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Bioessencial de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	-
16	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	-
17	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	-
18	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	100%
19	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.838.252.335,00	-
20	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
21	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	100%
22	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
23	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	79%
24	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	94%
25	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	100%
26	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	79%
27	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
28	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
29	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	99%
30	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	99%
31	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99%
32	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	98%
33	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
34	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
35	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	100%
36	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99,995%
37	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	100%
38	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	100%
39	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	100%
40	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	96%
41	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	89%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
42	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	11%
43	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	82%
44	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	49%
45	67	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	100%
46	68	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
47	69	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
48	70	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Caetex Florestal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 25.459.126,00	R\$ 0,00	0%
49	71	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	59%
50	72	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
51	73	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 0,00	0%
<b>Total do Objetivo 1.1</b>								<b>8.796.239.053,36</b>	<b>6.542.816.805,54</b>	<b>74%</b>
52	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Construção de uma base de geoinformação para subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IV - Redução da Taxa de Analfabetismo estabelecido, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
56	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Relatório contendo Análise de viabilidade de elaborar um Painel de indicadores da Dimensão Institucional do Desenvolvimento Sustentável	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste 2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
65	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático - Painel do Orçamento Público - Relatório de Acompanhamento e Análise do grau de regionalização da execução orçamentária do Governo Federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
66	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Manual de rotinas de acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de Desenvolvimento. Políticas Regionais -MI	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 1.4</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-</b>
68	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
<b>Total do Objetivo 1.5</b>								<b>234.105,49</b>	<b>234.105,49</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 1</b>								<b>8.796.473.158,85</b>	<b>6.543.050.911,03</b>	<b>74%</b>

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
69	39	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Objetivo 2.2</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
70	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
71	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
72	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>Total do Objetivo 2.3</b>								<b>1.825.305,97</b>	<b>1.182.390,74</b>	<b>65%</b>
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 2</b>								<b>45.115.305,97</b>	<b>18.420.390,74</b>	<b>41%</b>
73	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno	Ação interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
74	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
75	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
76	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 25.414,51	R\$ 15.834,51	-
77	78	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 24.020,40	96%
78	79	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
<b>Total do Objetivo 3.1</b>								<b>60.414,51</b>	<b>46.054,91</b>	<b>76%</b>
79	83	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
80	84	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	75%
<b>Total do Objetivo 3.2</b>								<b>1.179.562,88</b>	<b>1.027.541,11</b>	<b>87%</b>
81	80	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	44%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2016, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
82	81	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
83	82	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	2%
<b>Total do Objetivo 3.3</b>								21.453.288,01	9.895.980,87	46%
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 3</b>								<b>22.693.265,40</b>	<b>10.969.576,89</b>	<b>48%</b>
84	17	4. Fortalecer a imagem da Sudene	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 4.1</b>								0,00	0,00	-
<b>TOTAL DA DIRETRIZ 4</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.864.281.730,22</b>	<b>6.572.440.878,66</b>	<b>74,1</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2016

**ANEXO IV**  
**Projetos tabulados segundo a**  
**Programação do PPA**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.838.252.335,00	94%
3	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
15	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
20	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
27	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
28	67	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
29	68	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Saupe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
30	69	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotivo PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
31	70	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Caetex Florestal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 25.459.126,00	R\$ 0,00	0%
32	71	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
33	72	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
34	73	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 0355</b>								<b>8.787.468.912,52</b>	<b>6.535.933.393,18</b>	<b>74%</b>
35	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
36	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 211.000,00	27%
<b>P 2029 - Ação 20N7</b>								<b>1.114.585,70</b>	<b>417.151,42</b>	<b>37%</b>
37	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
<b>P 2029 - Ação 4640</b>								<b>1.069.868,00</b>	<b>326.618,00</b>	<b>31%</b>
38	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
39	9	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
40	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8689</b>								<b>1.825.305,97</b>	<b>1.182.390,74</b>	<b>65%</b>
41	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	60%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
42	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
43	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
44	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
45	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	100%
46	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	50%
47	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UPPE para Aeroportadores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	50%
48	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
<b>P 2029 - Ação 8902</b>								<b>3.231.234,02</b>	<b>2.885.377,73</b>	<b>89%</b>
49	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
<b>P 2029 - Ação 8917</b>								<b>207.542,62</b>	<b>107.354,71</b>	<b>52%</b>
50	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Atrasado	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
51	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8340</b>								<b>1.882.015,99</b>	<b>1.882.015,99</b>	<b>100%</b>
52	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 7K66</b>								<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100%</b>
53	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
54	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Campina Grande 2035 e Municípios do Entorno (Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas - PED/CG-2035	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100%
55	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
56	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Construção de uma base de geoinformação para subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
57	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
58	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IV - Redução da Taxa de Analfabetismo estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
59	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
60	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
61	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Relatório contendo Análise de viabilidade de elaborar um Painel de indicadores da Dimensão Institucional do Desenvolvimento Sustentável	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
62	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
63	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
64	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
65	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
66	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
67	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
68	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim Temático - Painel do Orçamento Público - Relatório de Acompanhamento e Análise do grau de regionalização da execução orçamentária do Governo Federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
69	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Manual de rotinas de acompanhamento e avaliação da programação de projetos e atividades da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
70	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IIICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de Desenvolvimento. Políticas Regionais -MI	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
71	83	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
<b>P 2029 - Ação 20WQ</b>								<b>1.814.700,00</b>	<b>1.814.700,00</b>	<b>100%</b>
<b>Total do Programa 2029</b>								<b>8.798.864.164,82</b>	<b>6.544.799.001,77</b>	<b>74%</b>
72	75	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
73	76	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
74	77	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 25.414,51	R\$ 15.834,51	-
75	78	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 24.020,40	62%
76	79	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	96%
77	80	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 3.337.367,25	62%
78	81	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	44%
79	82	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.226.603,89	R\$ 100.000,00	67%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2016, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
80	84	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 461.841,11	2%
<b>P 2111 - Ação 2000</b>								<b>22.127.565,40</b>	<b>10.403.876,89</b>	<b>47%</b>
<b>Total do Programa 2111</b>								<b>22.127.565,40</b>	<b>10.403.876,89</b>	<b>47%</b>
81	39	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
<b>Total do Programa 2069</b>								<b>43.290.000,00</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>40%</b>
82	17	4. Fortalecer a imagem da SudeNE	4.1. Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	"Café com Sustentabilidade" - Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Tema 7 - Acesso à Energia	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
83	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	I Encontro de Energia e Meio Ambiente: A Inserção Sustentável da Biomassa na Matriz Energética	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
84	74	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno	Ação interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total das Ações Internas/ Não se aplicam</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>8.864.281.730,22</b>	<b>6.572.440.878,66</b>	<b>74,1</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2016

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2016
