



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2017



**Recife
05 de outubro de 2017**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	7
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	13
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	27
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	34
5 – Indicadores de Gestão de Pessoas	52
6 - Indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	55
7 - Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) (resultado out/16 - set/17)	65
8 – Observações e Deliberações em plenária de 05/10/2017	67
9 – Conclusão	70
Anexo I – Planos Operativos do monitoramento	71
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira 2017 (posição até agosto)	219
Anexo III – Planos Operativos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	221
Anexo IV – Planos Operativos tabulados segundo a programação do PPA	229
Anexo V - Planos Operativos tabulados segundo unidades administrativas da SUDENE	237
Anexo VI - Planos Operativos prioritários, relacionados pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE	247

Introdução

Sob condução do Superintendente da SUDENE, Marcelo José Almeida das Neves, e suporte da Coordenação-Geral de Gestão Institucional, foi realizada no dia 05 de outubro de 2017 a reunião do 3º Ciclo de Monitoramento da SUDENE, inaugurando o espaço de rodadas no novo prédio, localizado na Av. Domingos Ferreira, 1967, 14º andar, em Boa Viagem.

A reunião inicialmente marcada para o dia 21/09, foi adiada em razão de agenda concorrente e inesperada do Superintendente.

O evento foi aberto pelo Superintendente, acompanhado pelo Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Sérgio Wanderley e contou com a participação de mais 14 servidores, entre Coordenadores-Gerais, Coordenadores e técnicos. Os Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas, Alexandre Gusmão, e de Administração, Antônio Ribeiro, estavam em missão em outros Estados.

Na oportunidade estavam em processo de monitoramento, um total de 95 planos operativos, inclusos os 24 projetos abrigados pelas 8 (oito) prioridades que compuseram a Resolução nº 281, de 13 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE.

A reunião foi aberta pelo próprio Superintendente, que repassou a palavra para que o Coordenador-Geral de Gestão Institucional (CGGI) desse início às apresentações.



Foto 1 - Momento em que o Superintendente abria a reunião do 3º ciclo de monitoramento 2017, tendo ao seu lado o Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Sérgio Wanderley, e o Coordenador-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, Maurício José de Garcia Maia.

O Superintendente Marcelo Neves aproveitou o momento para fazer um relato sobre os efeitos positivos dos Acordos de Cooperação celebrados entre a SUDENE, a Confederação Nacional da Indústria e a APEX-Brasil, e os frutos que a Autarquia vem colhendo com os RoadShows. Enfatizou que esse tipo de evento visa fomentar, estimular e criar alternativas que propiciem o desenvolvimento da área de atuação da Sudene, ampliando as possibilidades de investimentos, acrescentando que o “Roadshow se

constitui de uma série de encontros que estão sendo realizados nos estados do Nordeste, com o objetivo de viabilizar um modelo de atração de empresas para a região, inclusive facilitando o acesso de micro, pequenas e médias aos instrumentos disponibilizados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A proposta é levar informações aos empresários sobre a atuação da Superintendência e das instituições parceiras, focando nas políticas capazes de atrair projetos que impulsionem o desenvolvimento, ampliando a geração de emprego e renda”. Esses eventos, cuja abertura começou em Recife (PE) com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), contam com o apoio Confederação Nacional da Indústria (CNI) e das Federações de Indústria dos estados da área de atuação do órgão, com Roadshows já realizados nos estados de Alagoas, da Paraíba, de Ceará e do Rio Grande do Norte. O mais recente ocorreu no início de outubro na Federação das Indústrias do Estado do Piauí como mostra a foto adiante.



Foto 1 - Momento em que o Superintendente da SUDENE proferia palestra no Roadshow realizado na Federação das Indústrias do Estado do Piauí no início de outubro de 2017.

No que tange ao portfólio trabalhado durante a reunião do monitoramento da SUDENE, foram discutidos, em obediência ao art. 3º da Resolução nº 281/2017, os planos operativos priorizados, a saber: a formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE); a formulação do Plano de Desenvolvimento Integrado de Feira de Santana; o acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus Planos de Trabalho; a estruturação do Observatório do Desenvolvimento do Nordeste (ODNE); o acompanhamento das atividades sobre a delimitação do Semiárido; a estruturação da Rede Palma, bem como o acompanhamento e a execução das atividades dela decorrentes; a capacitação de gestores municipais para uso do SICONV; o acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como, ao apoio técnico à articulação de novas emendas.

Afora os 24 projetos prioritários apresentados, foram tratados e publicizados, mas não abordados na reunião deste ciclo, outros 71 que integraram documento também pormenorizado, entregue aos Diretores e ao Superintendente antes da Reunião. Esses 71 POs foram classificados segundo as unidades administrativas e ficaram assim distribuídos: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) (17); Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP) (15); Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP) (1); Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) (33);

Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI) (1); Comissão Permanente de Convênios, Congêneres, e Tomada de Contas Especial (CCONT) (2); Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) (2).



Foto 2 - Momento em que o Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, tecia comentários sobre alguns dos projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada.

Adiante, flagrante de diferentes momentos dos debates realizados no 3º ciclo de monitoramento.



Foto 3 - Momento em que o Coordenador-Geral da CGEP, tecia comentários sobre os projetos de sua unidade.



Foto 4 - Momento em que o Ouvidor-Geral, Martinho Almeida tecia comentários sobre a experiência da SUDENE em projetos integrados.

Os referenciais estratégicos (diretrizes e objetivos) adotados no enquadramento dos planos operativos foram os mesmos de ciclos anteriores.

Em relação às metas institucionais, tratadas no portfólio dos 71 projetos, foram elas fixadas pela Portaria SUDENE nº 166, de 14 de dezembro de 2016. A metodologia para a confrontação entre o previsto e o realizado constitui-se de relação matemática entre o percentual alcançado pelos respectivos Planos Operativos ou valor absoluto, na data de 30 de setembro, e o percentual ou valor absoluto previsto no anexo da referida portaria. A Portaria SUDENE Nº 166/2016 definiu 21 metas que incluem projetos da

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-CGDS/DPLAN (5 metas); da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação-CGEP/DPLAN (10 metas); atividades da Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento-CGDF/DFIN (2 metas); da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais-CGIF/DFIN (1 meta); projetos da Coordenação-Geral de Gestão Institucional-CGGI/Superintendência (1 meta) e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas-CGGP/DAD (2 metas). Os detalhes sobre os conteúdos previstos por essas metas estão disponíveis no site da SUDENE, no endereço http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Portaria_166-2016.pdf.

Manteve-se neste ciclo a mesma situação tratada no anterior quanto ao projetos do FDNE, concluídos no que toca aos compromissos da SUDENE, mas mantidos na condição de atraso pelo Banco do Nordeste devido à pendência na emissão dos Certificados de Empreendimentos Implantados (CEI).

Por outro lado, vários POs não apresentam execução orçamentária. São exemplos, a CGDS com 3 (três) nessa condição (POs 15 a 17), a CGEP com 12 (doze) nessa situação (POs 21 a 32), a CGGI tem 1 (um) (PO 67) e a Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial (CCONT), tem 2 (dois) POs (68 e 69) que também não envolvem recursos orçamentários na execução do trabalho, o primeiro, dedicado a demonstrar os pareceres de análise financeira concluídos ou em andamento, e o segundo, as tomadas de contas especial.

Foram suprimidos deste ciclo, por decisão da alta administração no ciclo anterior, até por força da suspensão das tratativas para execução haja vista a mudança para o novo prédio, os projetos:

- a) Recuperação do Anexo Nilo Coelho;
- b) Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE; e
- c) Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.

Como importante instrumento para mitigação de riscos, o monitoramento deve ser visto pela alta administração como oportunidade para demonstração de transparência, imparcialidade e estabelecimento de medidas que possam garantir o alcance do objeto e a oportunidade desse encaminhamento. Por essa razão, entende a CGGI que atenção especial deva ser dada às reuniões, pois é nelas que gestores de diferentes unidades se reúnem para discutir soluções e compartilhar responsabilidades, prática que deve ser vista com dedicação até que todos a percebam como inserida na cultura organizacional.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 3º Ciclo de Monitoramento 2017

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 3º ciclo 2017, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
A Iniciar								-
Concluído		6		15				21
Em Andamento	34	5	3	7	1	2	2	54
Atrasado	1	6		10*				17
Cancelado	1			1				2
Paralisado				1				1
TOTAL	36	17	3	34	1	2	2	95

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Projetos com pendência de emissão de certificado do empreendimento implantado.

Nota: As análises de convênios para emissão de parecer financeiro e as tomadas de conta especial foram trabalhadas, para fins de monitoramento, como planos operativos da Comissão Permanente de Convênios, Congêneres e Tomada de Contas Especial (CCONT/DAD)

O Gráfico 1, adiante, mostra a situação dos 95 projetos neste terceiro ciclo de 2017 segundo status, lembrando que no 2º Ciclo eles ainda não eram computados.

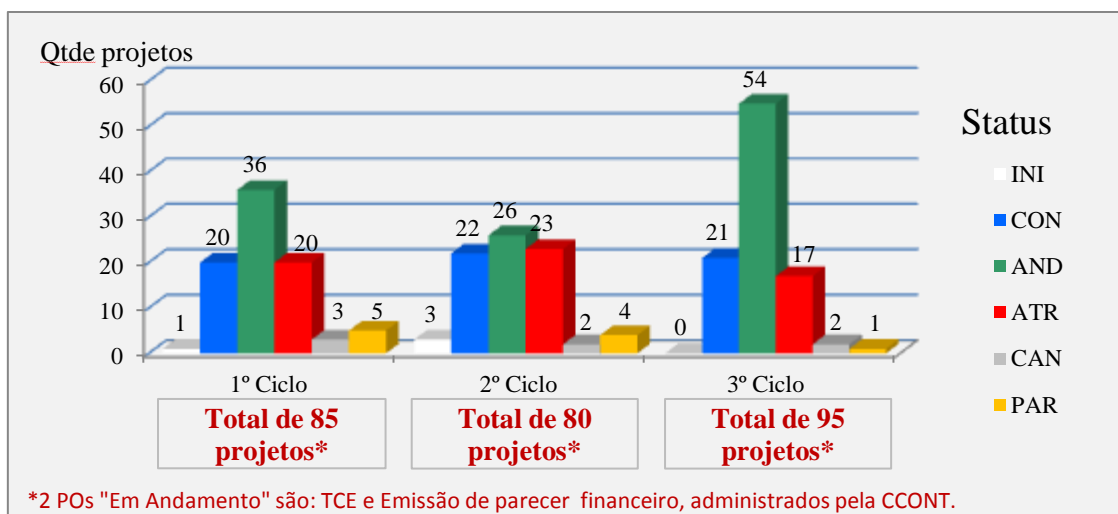


Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2017, inclusive os prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

**Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 3º ciclo 2017,
por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto, incluindo
os classificados como prioritários pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE**

ANO	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
2008	-			3				3
2011	-			5				5
2012	2	1		16				19
2013	4		1	1				6
2014	5			2				7
2015	3	2		1				6
2016	15	12		3				30
2017	7	2	2	3	1	2	2	19
TOTAL	36	17	3	34	1	2	2	95

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

O Quadro 2 revela que 46 projetos decorrentes de convênios ou TEDs ou contratos de financiamento que foram celebrados entre 2008 e 2015, ainda estão em execução, e desses, 28 são de projetos do FDNE, no caso do fundo, grande parte pendente devido à não emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI), e 18 estão distribuídos entre CGDS (14), a CGEP (3) e a CGCP (1). Lembra-se que neste quadro também estão computados os POs considerados prioritários pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE.

A Tabela 1 não incluiu os projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada por que a ênfase pretendida foi a análise do comportamento desses projetos stricto sensu já que não foram apresentados na reunião do 3º Ciclo 2017. O mesmo se aplica às Tabela 2 e 3.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2017

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	Status ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	50	8.706.681,12	6.663.951,14		18	19	11	1	1	50
	1.4	11	0,00	0,00		3	2	6			11
	1.5	1	234,11	234,11			1				1
Sub-Total		62	8.706.915,22	6.664.185,24	0	21	22	17	1	1	62
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00			1				1
	2.3	2	989,48	724,24			2				2
Sub-Total		3	44.279,48	17.962,24	0	0	3	0	0	0	3
3	3.1	5	400,00	48,71			5				5
Sub-Total		5	400,00	48,71	0	0	5	0	0	0	5
4	4.1	1	0,00	0,00			1				1
Sub-Total		1	400,00	48,71	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		71	8.751.594,70	6.682.196,19	0	21	31	17	1	1	71

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho e **4-Fortalecer a imagem da SUDENE; 4.1** - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes).

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/08/2017 (3º Ciclo de monitoramento-2017)

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos não-prioritários, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2017

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadra- dos ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	33	8.698.660,98	6.656.681,06		15	6	10	1	1	33
	20N7	2	1.114,59	977,15			2				2
	20WQ	13	749,00	749,00		4	3	6			13
	4640	1	1.069,87	764,87			1				1
	8689	2	989,48	724,24			2				2
	8902	8	3.231,23	3.023,79			7	1			8
	8917	1	207,54	107,35			1				1
	8340	2	1.882,02	1.882,02		2					2
Sub-Total		62	8.707.904,70	6.664.909,48	0	21	22	17	1	1	62
2111	2000	4	400,00	48,71			4				4
Sub-Total		4	400,00	48,71	0	0	4	0	0	0	4
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		1	43.290,00	17.238,00	0	0	1	0	0	0	1
Ações Internas		4	0,00	0,00			4				4
Sub-Total		4	0,00	0,00	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		71	8.751.594,70	6.682.196,19	0	21	31	17	1	1	71

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Sigla para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/08/2017 (3º Ciclo de monitoramento-2017)

Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos não-prioritários, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2017

Diretoria	Unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	17	6.612,71	5.597,41			16	1			17
	CGEP	15	2.631,02	2.631,02		6	3	6			15
	CGCP	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		33	52.533,73	25.466,42	0	6	20	7	0	0	33
DFIN	CGDF/ FDNE	33	8.698.660,98	6.656.681,06		15	6	10	1	1	33
		33	8.698.660,98	6.656.681,06	0	15	6	10	1	1	33
SUP.	CGGI	1	0,00	0,00			1				1
Sub-Total		1	0,00	0,00	0	0	1	0	0	0	1
DAD	CCONT	2	0,00	0,00			2				2
	CGGP	2	400,00	48,71			2				2
Sub-Total		4	400,00	48,71	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		71	8.751.594,70	6.682.196,19	0	21	30	17	1	1	71

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se em anexo ao final deste relatório.


² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

³Projetos do FDNE na condição de espera para receber o Certificado de Empreendimento Implantado.

⁴TCE e Emissão de parecer financeiro.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 31/08/2017 (3º Ciclo de monitoramento-2017)

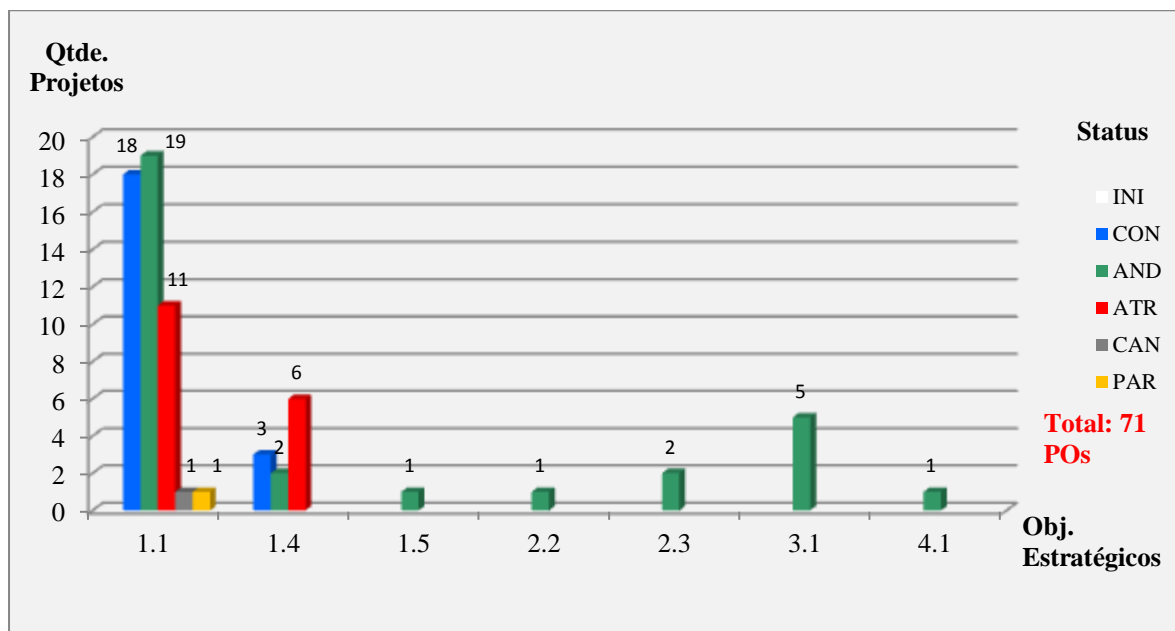


Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho e **4-Fortalecer a imagem da SUDENE; 4.1** - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes).

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2017), exclusive os Projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

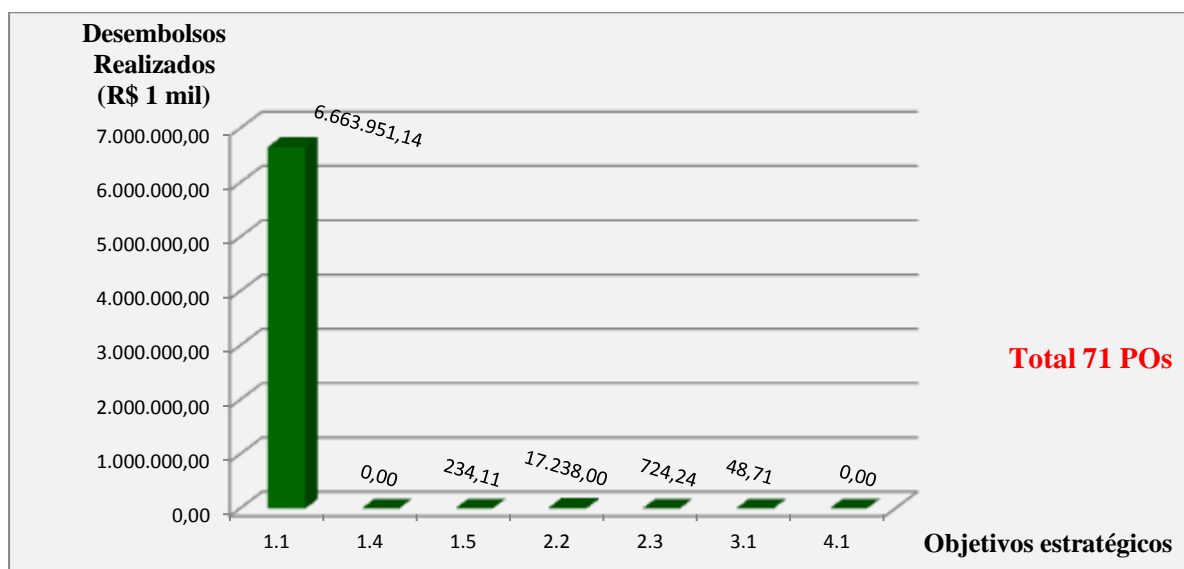

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º ciclo - 2017), exclusive os projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE


2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}^1} = \frac{59 \times 100}{59} = 100,00 \%$
- b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Não informado
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica

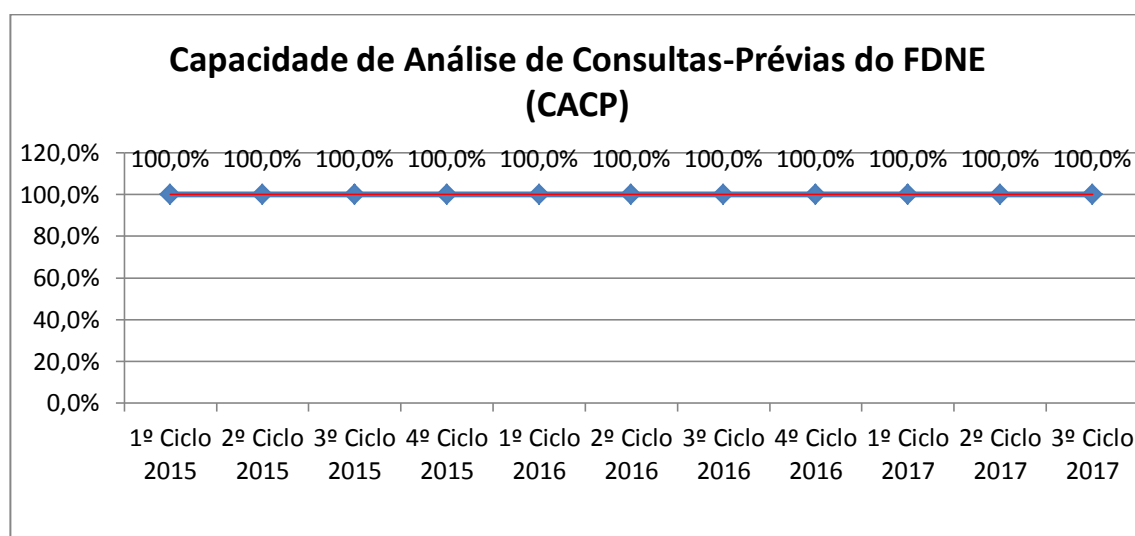

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévia em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévia do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{59}{9} = 6,56 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévia no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	3,57 análises/técnico	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,43 análises/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	1,67 análises/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,5 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	3 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	3 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	7,13 análises/técnico	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

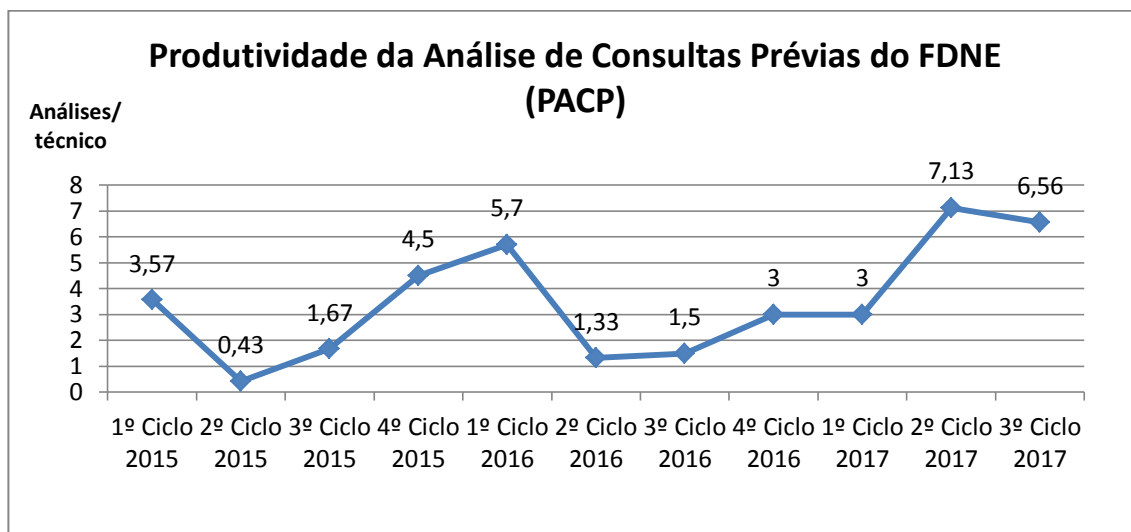

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.


A melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda em determinados períodos, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia que ainda se manteve em 2016, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser considerado com cuidado.

2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{47 \times 100}{59} = 79,7\%$
- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	63%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	55,5%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	50%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	50%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	78,9%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

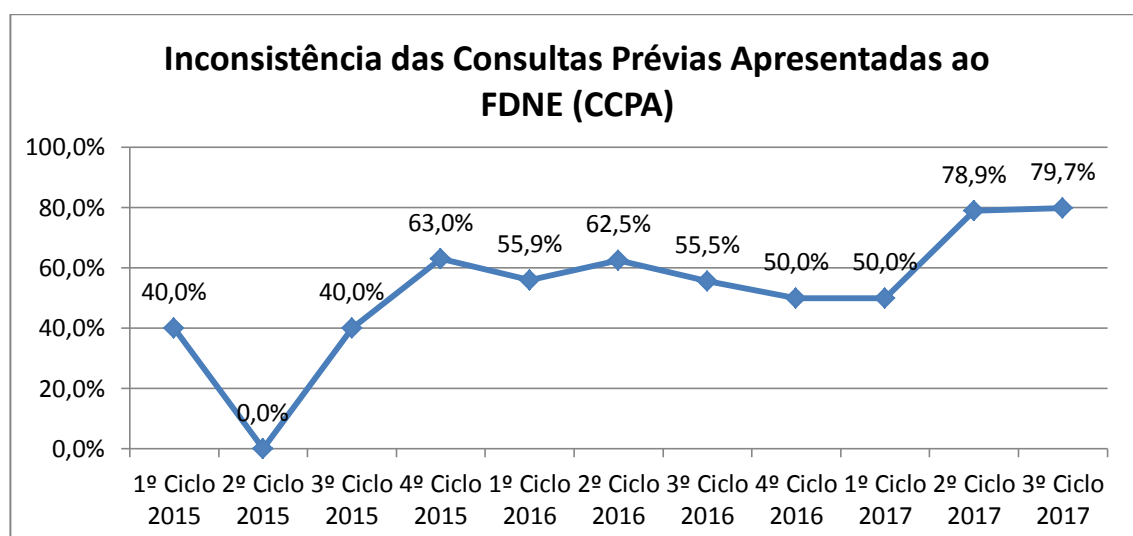

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{125 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,39$

a.2) Banco do Brasil – BB


Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

- a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB. A CEF não concluiu nenhuma análise de projeto no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0,00; BB 1,48; CEF 0,00	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

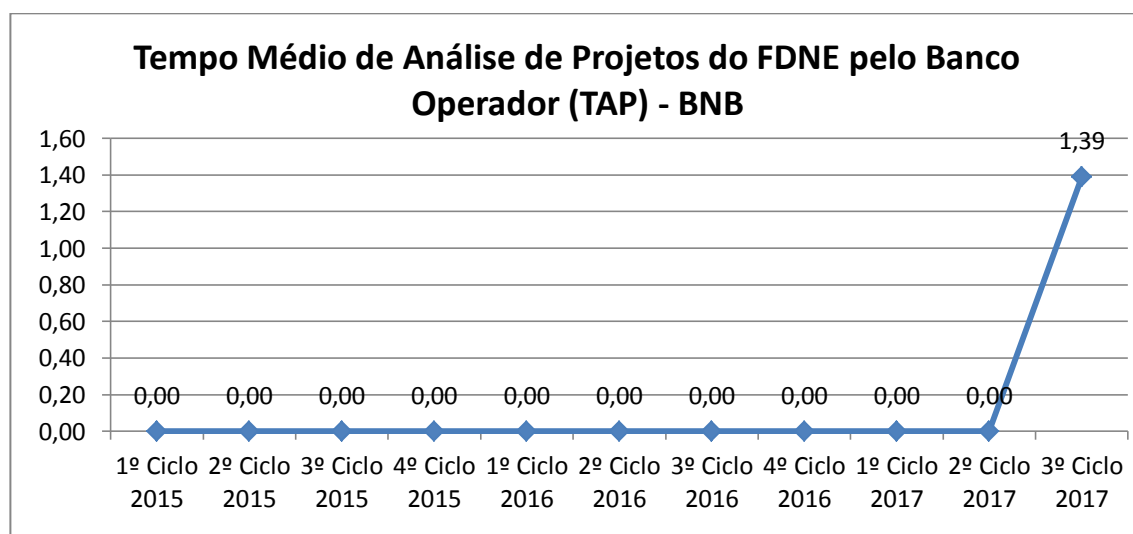


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

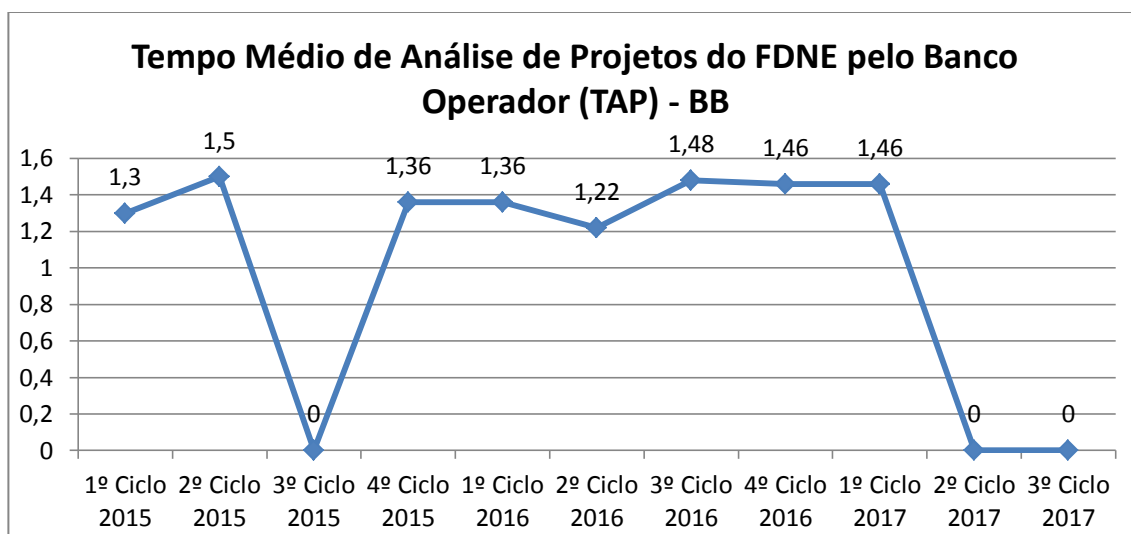

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

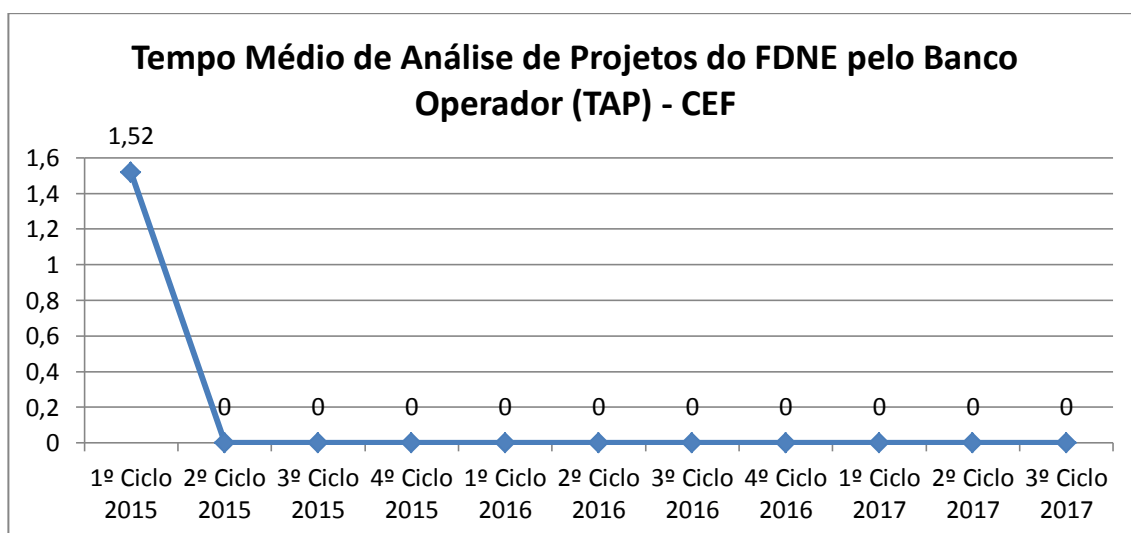

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.
- (2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.


a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Foram apresentados 02 (dois) projetos ao BNB e 02 (dois) à CEF no período observado. Apenas o BNB concluiu a análise dos projetos apresentados.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

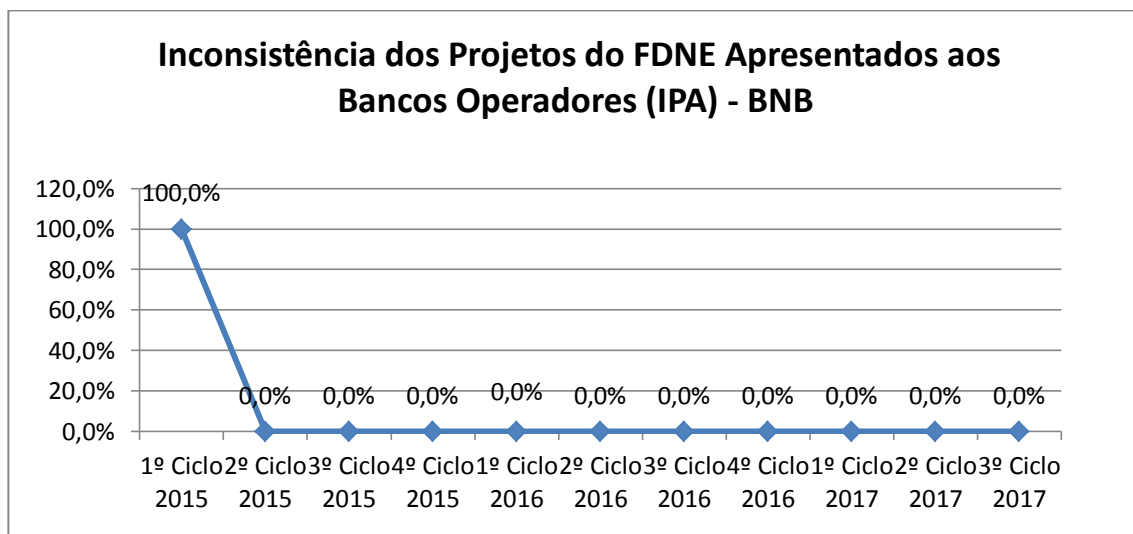


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

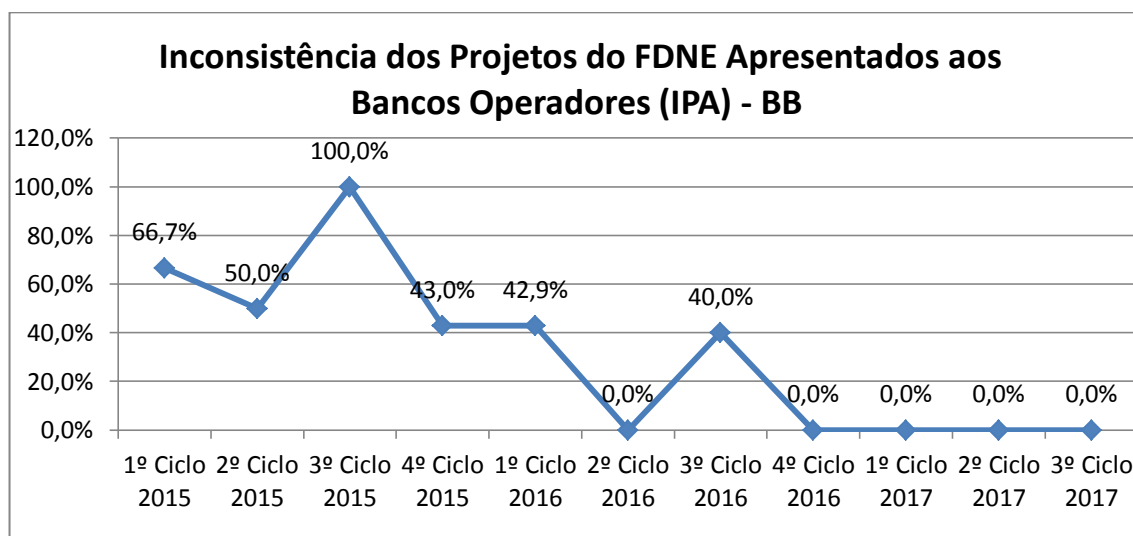

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

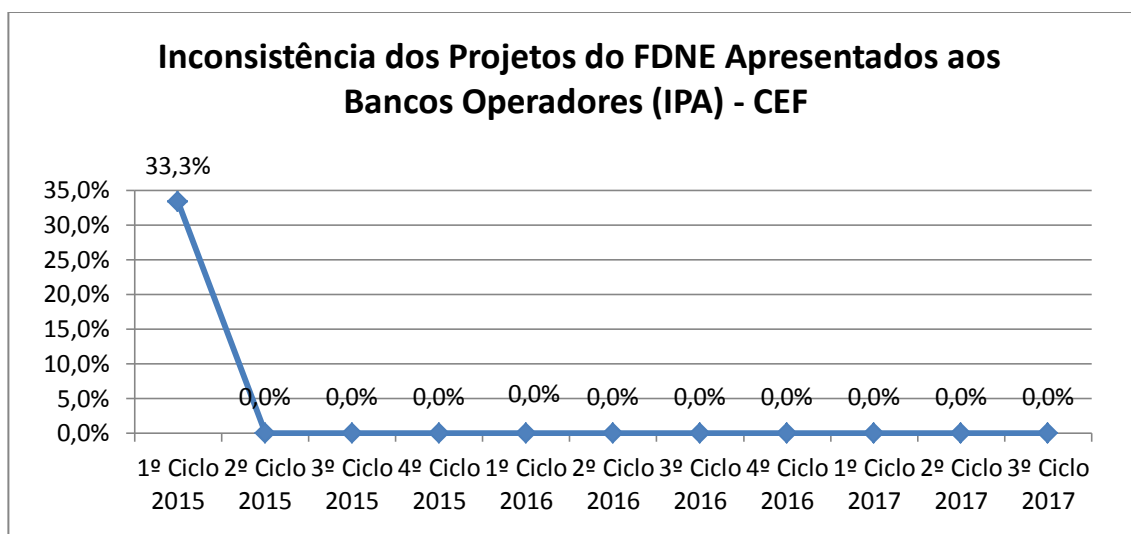

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2017} \times 100}{\text{Dotação LOA 2017}} = \frac{21.965.302,00}{1.497.686.861,00} \times 100 = 1,47\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

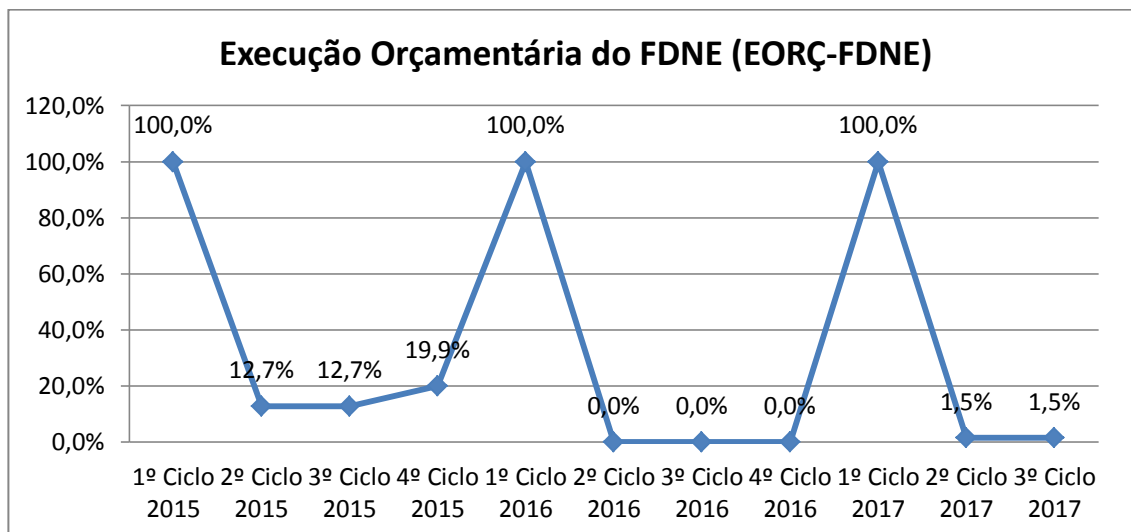

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{123.162.618,30 \times 100}{4.791.033.050,28} = 2,57\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	10,9%	3º ciclo 2016

Jan a nov/2016	11,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	7,6%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	2,57%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

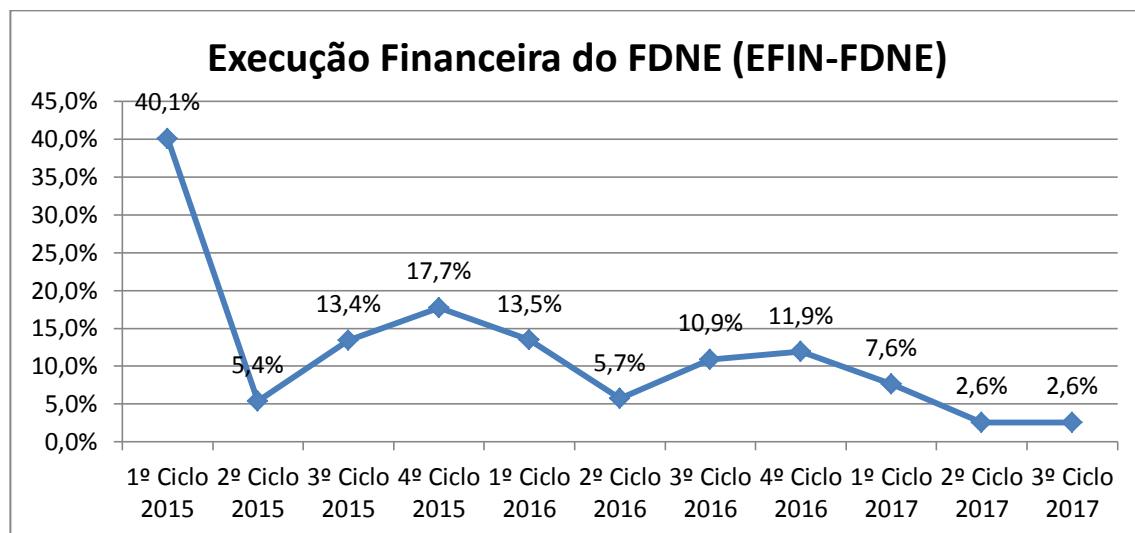

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{30}{30} = 1,00$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2017


f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0,58	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016

Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,9	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,9	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,78	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

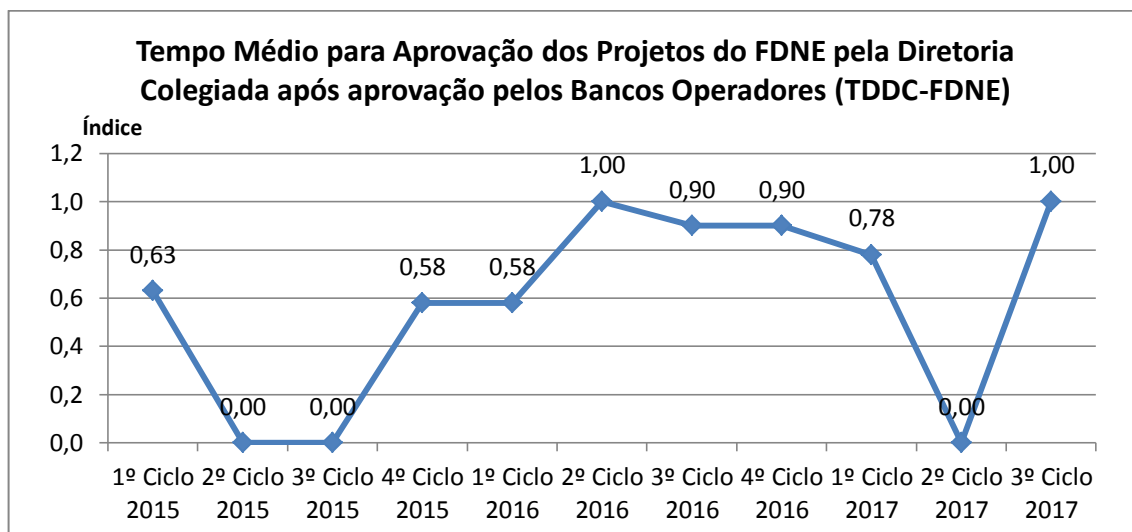

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{504}{2} = 252$ dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	321,8 dias	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	315,2 dias	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	315,2 dias	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0 dias	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

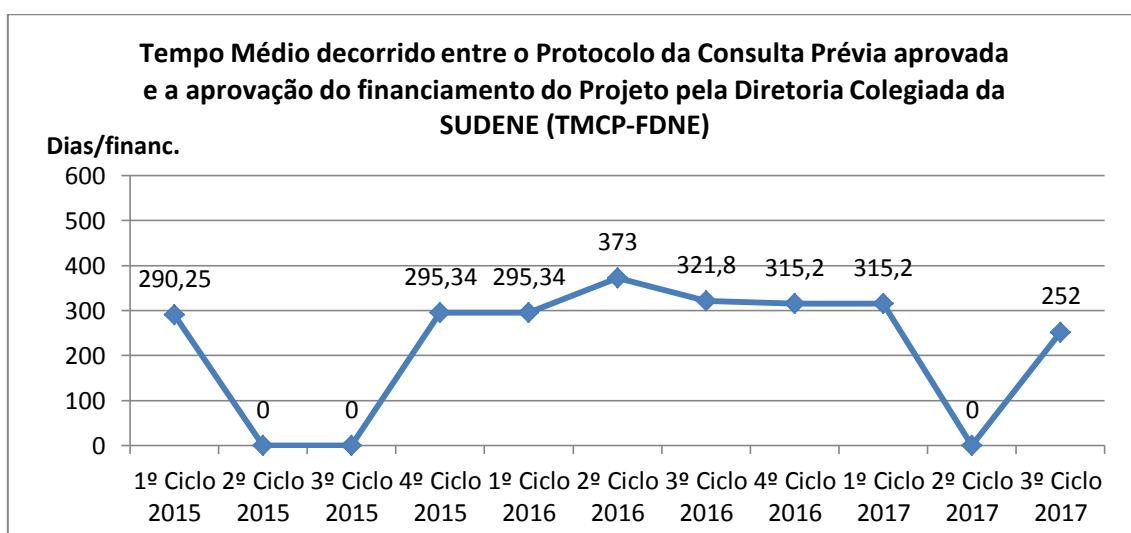

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{2}{2} = 1,00$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	1,0	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,0	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	1,0	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	1,0	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

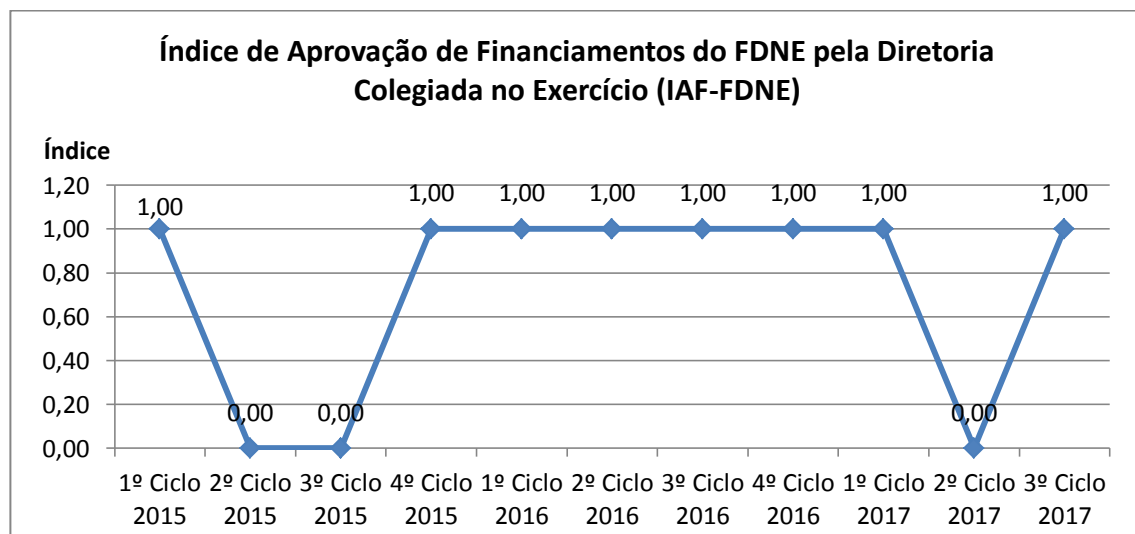

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: $T_1 = \frac{5.423 \text{ dias}}{87 \text{ processos}} = 62,3 \text{ dias/processos}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2017 e encerrado em 31 de agosto de 2017, foram **vistoriados 87 estabelecimentos dos 107 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 62,3 dias**. O resultado alcançado, em comparação com idêntico período do ano anterior foi bastante significativo uma vez que naquele período o prazo médio para as vistorias foi de 76,4 dias.

Observação importante, uma vez que influencia diretamente no cálculo do indicador, **é que, por regulamento, processos protocolados a partir de 31 de outubro de 2016** somente serão vistoriados no exercício seguinte. No presente caso, estamos falando de **29 processos nessa situação, com prazo médio entre a data do protocolo e a data da vistoria de 84,6 dias**.

Convenções:

T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.


N = Número de processos no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	74,9 dias/ processo	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/ processo	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	72,9 dias/ processo	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	73,7 dias/ processo	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	92,30 dias/ processo	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/ processo	2º ciclo 2016

Jan a ago/2016	76,4 dias/ processo	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80,70 dias/processo	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	71,32 dias/processos	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,4 dias/processos	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

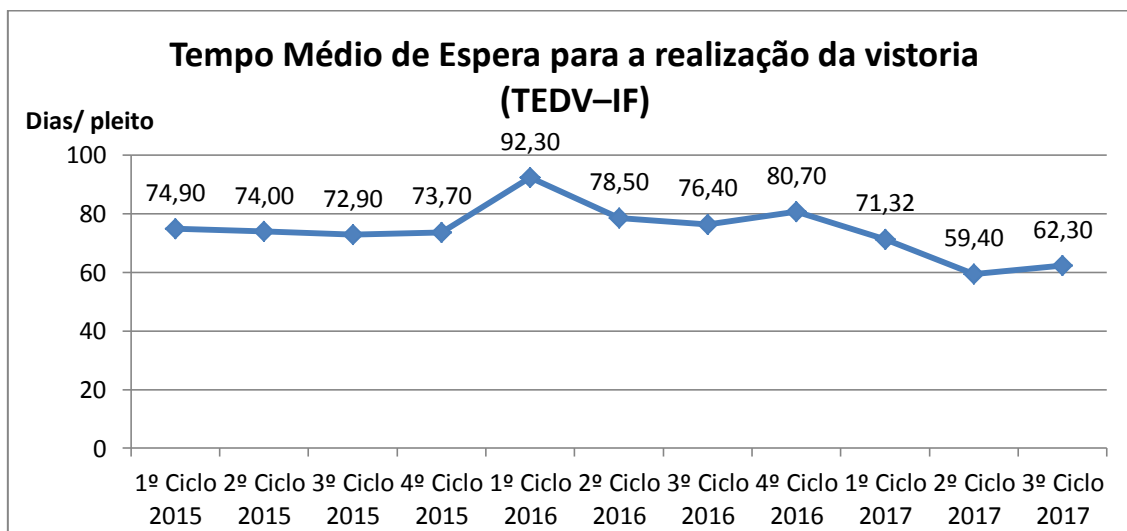

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} =$$

$$= \frac{0 \times 100}{141} = 0 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2017


f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015

Jan a nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,00%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

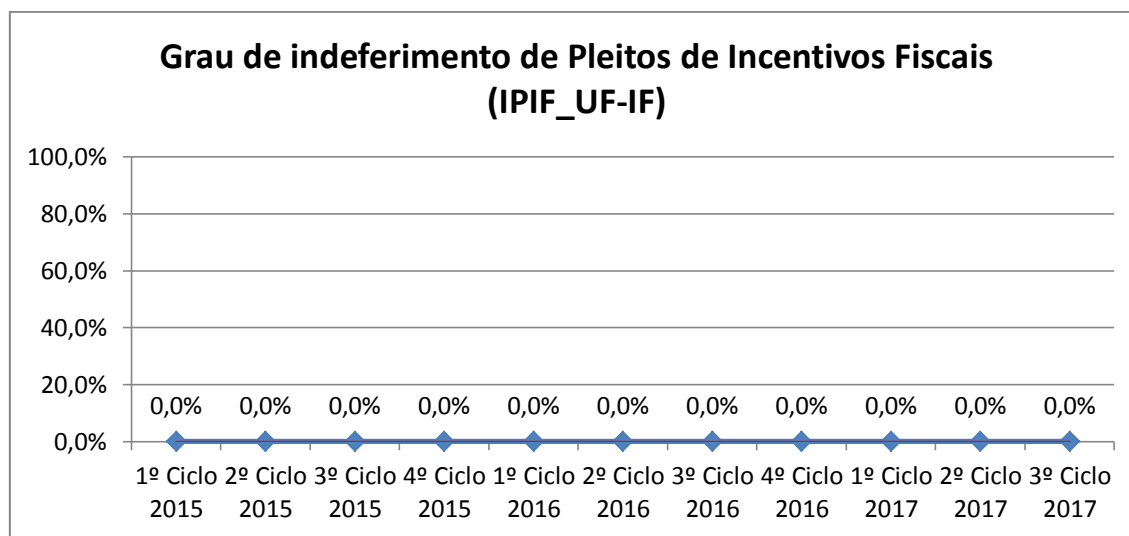

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{141 \times 100}{167} = 84,4 \%$$


b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: no período foram concluídas 141 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 84,4% dos pleitos ingressados. Geralmente, nos primeiros meses do ano, por conta das férias regulamentares são realizadas menos vistorias que nos demais meses o que se reflete no desempenho observado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	71,2%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	91%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,5%	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

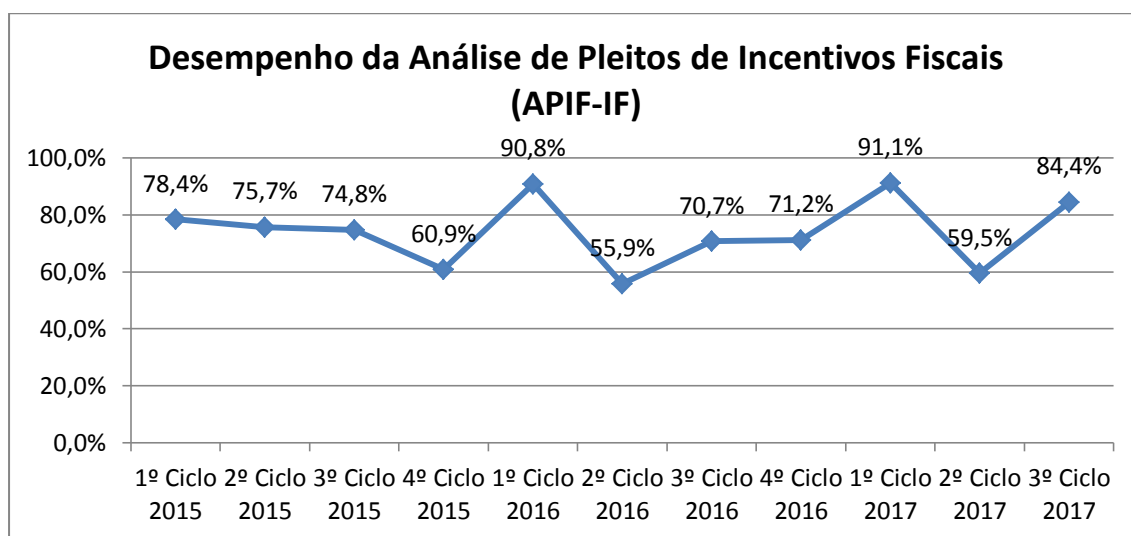

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

Com relação ao cálculo do **Tempo Médio de Espera**, oportuno destacar o grande número de pleitos relativos a Transferências de Laudos que se observou nesses oito meses objeto do monitoramento. Ao contrário do que ocorre com os demais processos de incentivos fiscais, quando os procedimentos estabelecidos no Manual de Instruções implicam na devolução daqueles encaminhados com inconformidade na documentação exigida e não regularizadas as pendências

no prazo improrrogável de 30 dias, no exame de pedidos de Transferência de Laudos, seja por mudança de controle societário, seja por qualquer outro motivo, não há prazo para atendimento de inconformidades detectadas. O pleito somente será encaminhado para deliberação da Diretoria Colegiada quando atendidos todos os requisitos.


Assim, pode ocorrer, como de fato tem acontecido, que determinados processos permaneçam pendentes de solução por prazo considerável. No período em exame, por exemplo, tivemos dois pleitos que somente tiveram seus processos concluídos passados mais de 800 dias (Companhia Maranhense de Refrigerantes). Outros, mais de 200 dias, sem que isso signifique deficiência dos técnicos responsáveis pela conclusão dos exames.

Diante disso passamos a desconsiderar, a partir do último monitoramento, os pleitos de Transferência de Laudos no cômputo do **Tempo Médio de Espera** para conclusão dos exames de incentivos fiscais, mesmo porque referidos processos não fazem parte do cálculo de dias decorridos entre a formalização e a vistoria, uma vez que os mesmos não são vistoriados.

- a) Fórmula:
$$T1 = \frac{13.927 \text{ dias}}{121 \text{ pleitos}} = 115,1 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: o prazo médio observado, de **115,1 dias** é função do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros oito meses de 2017. Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 105,9 dias, sendo de 138,7 dias o prazo para os processos de reinvestimento. **De se ressaltar que esse prazo foi influenciado negativamente pelos 29 processos que ingressaram após 31.10.2016 e que somente foram vistoriados a partir de fevereiro de 2017.**
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	93,3 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	118,5 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	107,7 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	110,8 dias/pleito	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

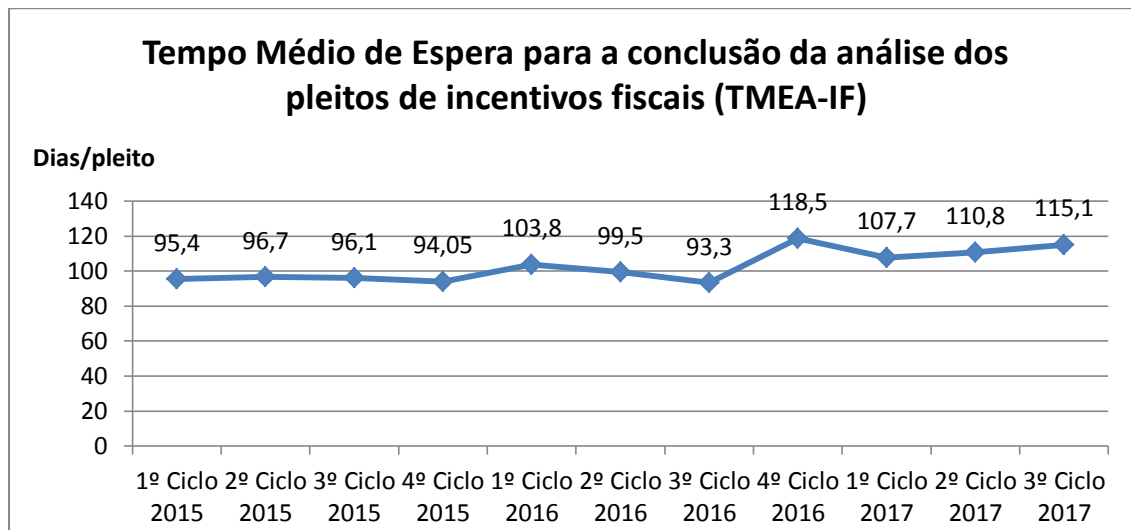

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{141}{18} = 7,8 \text{ análises/técnico}$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2017


f) Comentários: o número observado, de 7,8 análises por técnico, é função do número de processos examinados entre janeiro e agosto, uma vez que o número de servidores encarregados de realizar as devidas análises é fixo (18 servidores).

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015

Jan a dez/2015	16,5 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	6,3 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	10,8 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	15,5 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

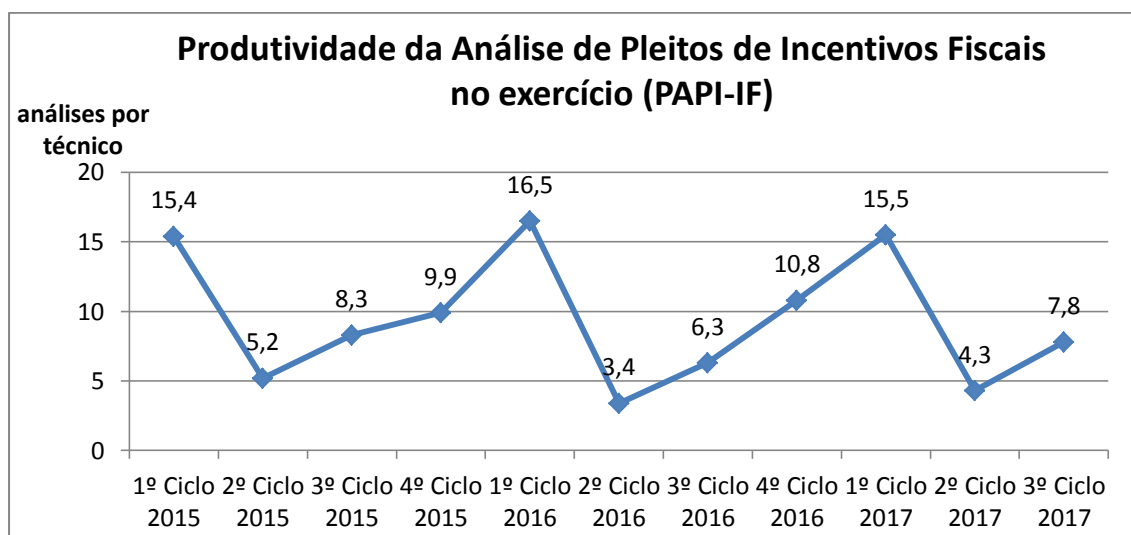

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{87}{9} = 9,7 \text{ vistorias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 87 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	19,3 vitórias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vitórias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	7,5 vitórias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	8,3 vitórias/equipe	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	20,1 vitórias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vitórias/equipe	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	9,5 vitórias/equipe	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	15,4 vitórias/equipe	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	24,5 vitórias/equipe	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 vitórias/equipe	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{47 \times 100}{72} = 65,3\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-ago/2017.

f) Comentários: Houve o recebimento de 72 propostas, das quais 47 foram analisadas até a data do presente relatório. Todas as propostas recebidas são convênios. Cabe observar, porém, que, das 72 propostas protocoladas, apenas 66 foram enviadas para análise, pois 06 delas foram canceladas.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	91,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	58,2%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

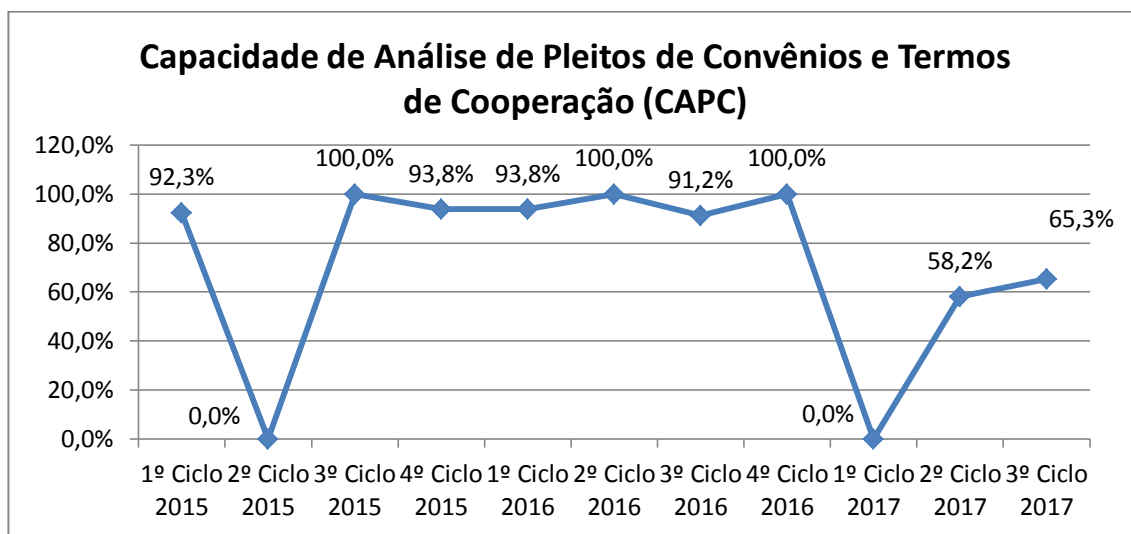

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{27 \times 100}{47} = 57,4\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-ago/2017

f) Comentários: Foram analisadas 47 propostas, das quais 27 foram aprovadas, 17 foram rejeitadas e 03 estão em complementação.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	67,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	27,66%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

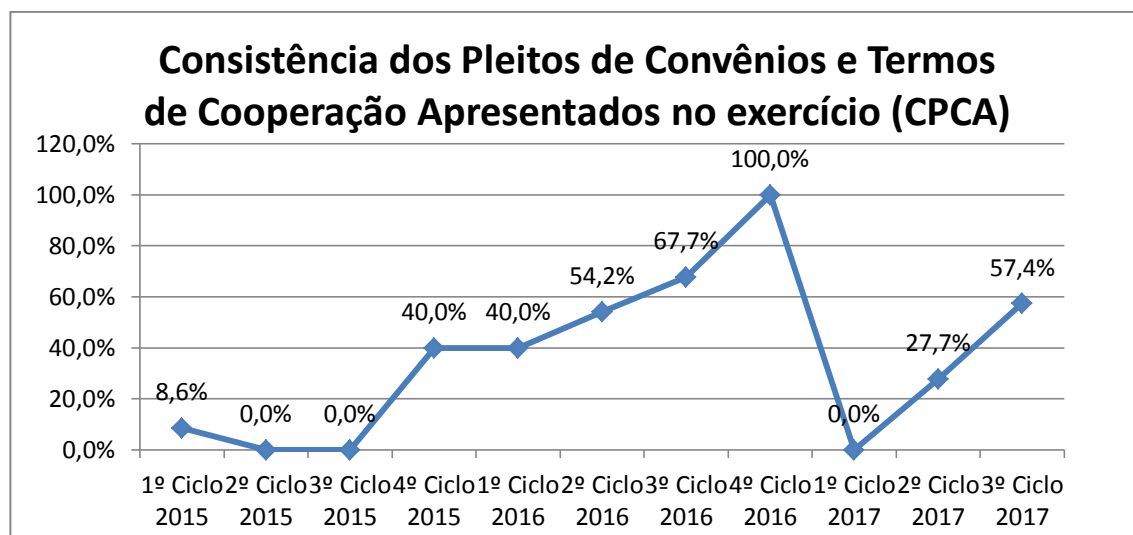

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$$

$$= \frac{17 \times 100}{72} = 23,6\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-ago/2017

f) Comentários: Foram recebidas 72 propostas, das quais 17 foram rejeitadas. Cabe aqui uma observação com relação ao resultado do ciclo anterior: no 2º ciclo, 18 propostas haviam sido rejeitadas tecnicamente, porém, destas, 13 foram resgatadas, em atendimento à Portaria Interministerial nº 152 de 25 de maio de 2017. Assim, 05 propostas do 2º ciclo permaneceram rejeitadas e foram somadas a outras 12 propostas rejeitadas, resultando em 17 no total.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	20,6%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	32,72%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

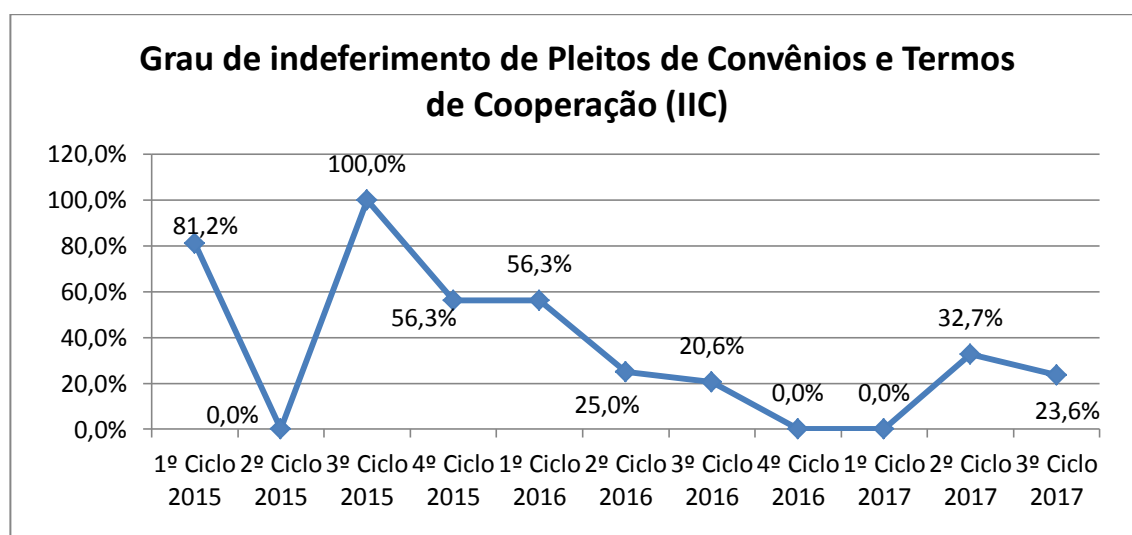

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:


- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

- a) Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0,00\%$$
- b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).
- d) Resultado Ideal (%): 100 %
- e) Período da aferição: Jan-ago/2017
- f) Comentários: No período de aferição indicado acima não foram realizadas fiscalizações sob a responsabilidade desta Coordenação-Geral, uma vez que não havia previsão para tal atividade.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

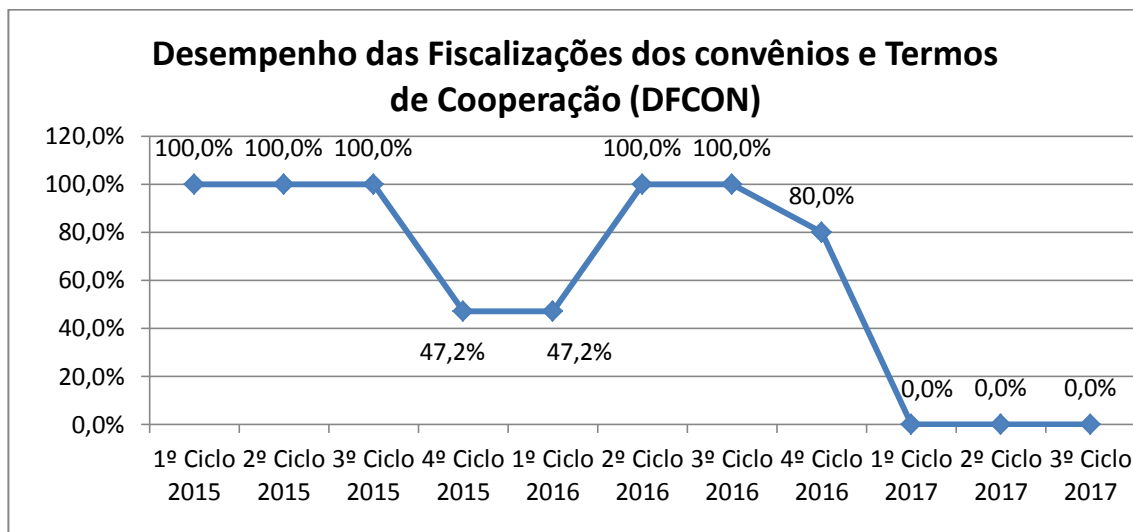

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, de janeiro a agosto de 2017. Ainda, também descreve demais atividades, internas e externas, afetas às atribuições da Coordenação, desempenhadas no mesmo período.

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participação na I Conferência Nacional da Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	25 a 26.01.17	Brasília -DF	Vera Lúcia, Marcelo Saiki
Reunião SUDENE e EMEPA-PB, para tratar sobre ações do convênio 813986-14 Projeto “Qualificação do arranjo produtivo local da caprinocultura leiteira no semiárido PB”	06.02.17	SUDENE/CGDS	Vera Lúcia, Marcelo Viana, Victor Uchôa, Marcelo Saiki,
Reunião CONDEPE/FIDEM, sobre andamento dos convênios Bom Conselho/PE, Salgueiro/PE e Goiana/PE – CV 794329/2013.	07.02.17	SUDENE/CGDS	Vera Lúcia, Maria Helena, Victor Uchôa, Teresa Oliveira, Juliana Borges, Renato Vaz
Reunião no INSA para discussão dos resultados Projeto TED/SUDENE/UFPE-Parceria REDESFITO, a convite da UFPE	14.02.17	Campina Grande-PB	Renato Vaz e Teresa Oliveira
Reunião Técnica: Acompanhamento dos TEDs 4/2015 e 05/2016.	16.02.17	UFPE - Centro de Energias Renováveis	Maria Helena e Isis Moreira

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião de acompanhamento do Convênio 794329/2013 com o CONDEPE/FIDEM.	23.02.17	SUDENE/CGDS	Teresa Oliveira, Victor Uchôa, Vera Lúcia, Carlos Almiro
Participar de oficina sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	05 a 11.03.17	Juazeiro-BA / Petrolina-PE	Marcelo Viana
Visita preliminar às metas previstas no convênio SICONV nº 828298/2016, celebrado com o município de Tibau do Sul-RN.	07 a 08.03.17	Tibau do Sul-RN	Agrimon Marcos
Reunião para apresentação do projeto “O Sertão vai virar mar” do professor Ranilson Bezerra, do Departamento de Bioquímica da UFPE.	08.03.17	SUDENE/CGDS	Carlos Almiro, Victor Uchôa, Teresa Oliveira, Macira Régia , Renato Vaz, Marcelo Saiki
Café com sustentabilidade: Parcerias da Sudene para o Desenvolvimento Tecnológico das Energias Renováveis.	09.03.17	SUDENE/JK	Equipe CGDS
Assessorar o Superintendente no Seminário Convivência Produtiva com a Seca: Soluções Tecnológicas e Estratégias de Ação.	13 a 14.03.17	Petrolina-PE	José Aildo
Acompanhamento técnico da execução do TED Inventário das Plantas da Caatinga (Meta 4).	13 e 14.03.17	Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista - PE	Tersa Oliveira e Renato Vaz
Participar de reuniões sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	14 a 17.03.17	Monteiro-PB	Marcelo Saiki
Participar de reuniões sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	14 a 17.03.17	Floresta-PE	Marcelo Viana
Participar do seminário e de um encontro de atores estratégicos que tiveram por finalidade contribuir para a execução do Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco(BHSF).	14 a 15.03.17	Brasília-DF	Victor Uchôa
Café com sustentabilidade: “Estratégias para o desenvolvimento sustentável: inovação em produtos da biodiversidade da caatinga”.	30.03.17	SUDENE/JK	Equipe CGDS
Reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA	31.03-17	CONSEMA-PE	Victor Uchôa
Reunião na Empresa Hebron para apresentação dos seus produtos na linha de fitomedicamentos	31.03.17	Recife-PE	Renato Vaz

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar do Workshop Energia Renováveis e Inovações Interconectadas Mercados Sustentáveis do Século XXI.	04 a 06.04.17	Auditório do Paço Alfândega Recife-PE	Isis Moreira e Maria Helena
Reunião no IBAMA, para comemoração do Dia Nacional da Caatinga.	27.04.17	IBAMA-PE	Victor Uchôa, José Aildo
Participar do ciclo de debates: Desafios do Saneamento Ambiental – Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental	08.05.17	Escola Politécnica de Pernambuco Recife-PE	Isis Moreira e Teresa Oliveira
Apresentação da colheitadeira da palma forrageira prof. Ítalo Ataíde Notaro (UFRPE)	10.05.17	UFRPE	José Aildo
Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, para acompanhamento do Convênio 770859/2012 Zoneamento Ambiental das Áreas Vulneráveis a Desertificação no Estado de Pernambuco.	11.05.17	SUDENE/DPLAN	Alexandre Gusmão, Mauricio Maia, Maria Helena, Victor Uchôa, Renato Vaz, Maria do Socorro.
Reunião sobre protótipo de colheitadeira da palma CASALE.	12.05.17	IPA-PE	Jose Aildo
Reunião de acompanhamento da execução e entrega de relatórios do TED Inventário das Plantas da Caatinga.	12.05.2017	SUDENE/DPLAN	Vera Lúcia, Renato Vaz, Alexandre Silva, Márcia Vanusa, Miguel Vieira e Maurício Maia.
Reunião sobre Delimitação do Semiárido SUDENE/Consórcio de Municípios Paraibanos.	22.05.17	SUDENE/CGDS	Maurício Maia, Marcelo Viana, Victor Uchôa
Capacitação em Controle Interno, gestão de risco e governança, ofertado pela CGU.	22 a 23.05.17	UFRPE	Vera Lúcia, Maria do Socorro, Isis Moreira, Renato Vaz, José Amauri, Teresa Oliveira, Juliana Borges, José Aildo, Givanildo Ramos
Apresentação sobre as ações da SUDENE em Encontro com a Associação dos Municípios da área Mineira da SUDENE-AMAMS e Empresários da Região.	24 a 25.05.17	Belo Horizonte-MG	Isis Moreira
Reunião com Prof. Paulo Cavalcanti Filho (UFPB) para apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável para os Arranjos Produtivos Locais da Paraíba (Plades), a fim de solicitar apoio da Sudene.	26.05.17	Sudene/JK	Renato Vaz, José Amauri, Victor Uchôa, Maria do Socorro, Vera Lúcia
Reunião de articulação com a CENTRESAF-PE para projeto em capacitação de municípios - SICONV	06.07.17	SUDENE/DPLAN	Vera Lúcia, Maria do Socorro, Isis Moreira, Teresa Oliveira

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião de acompanhamento técnico sobre a entrega de produtos a execução e o calendário do Convênio 794329/2013, com a Agência Condepe/Fidem.	04.08.17	SUDENE/CGDS	Teresa Oliveira, Vera Assunção, Maurício Maia, Gliedson Silva, Paulo da Fonte, Daniella Santos e Cláudia Melo.
Reunião de ACOMPANHAMENTO com a Agência CONDEPE/FIDEM – convênios: PDS Salgueiro, PDS Bom Conselho	23.08.17	SUDENE/CGDS	Maria Helena, Isis Moreira, Renato Vaz e Juliana Borges

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN/SUDENE)

PROPOSTAS RECEBIDAS – JANEIRO A AGOSTO DE 2017

De janeiro a agosto de 2017, a Coordenação recebeu, via SICONV, 72 propostas, todas relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”. Destas, 07 estão vinculadas à Ação 214S, 07 à Ação 8902, 04 à Ação 8340 e 54 à Ação 7K66, sendo esta última referente a Emendas Parlamentares.

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)Conv

- Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = 0 \text{ dias/pleito}$$
- Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.
- Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
- Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)
- Periodicidade: Jan-ago/2017
- Comentários: entre janeiro e agosto/2017, a SUDENE recebeu 72 propostas de convênios, mas até o momento nenhum ainda foi convertido em pré-convênio. Contudo, 32 deles já possuem parecer técnico. A tabela abaixo ilustra a posição:


Propostas encaminhadas à SUDENE entre 01/01 e 31/08/2017	Estados										
Possui Parecer?/Situação	AL	BA	CE	ES	MA	MG	PB	PE	RN	SE	Total Geral
Não	1	3						1	1		6
Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados									1		1
Proposta/Plano de Trabalho Cancelados	1	3						1			5
Sim	5	29	3	1	1	2	1	2	20	2	66
Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação								1	1		2
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados		18							10		28
Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise		1							1		2
Proposta/Plano de Trabalho em Análise						1				1	2
Proposta/Plano de Trabalho em Complementação		7	3						5		15
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados	5			1	1	1	1	1	1	1	12
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico		3							2		5
Total Geral	6	32	3	1	1	2	1	3	21	2	72

Fonte: SICONV

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	22,8 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	22,8 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

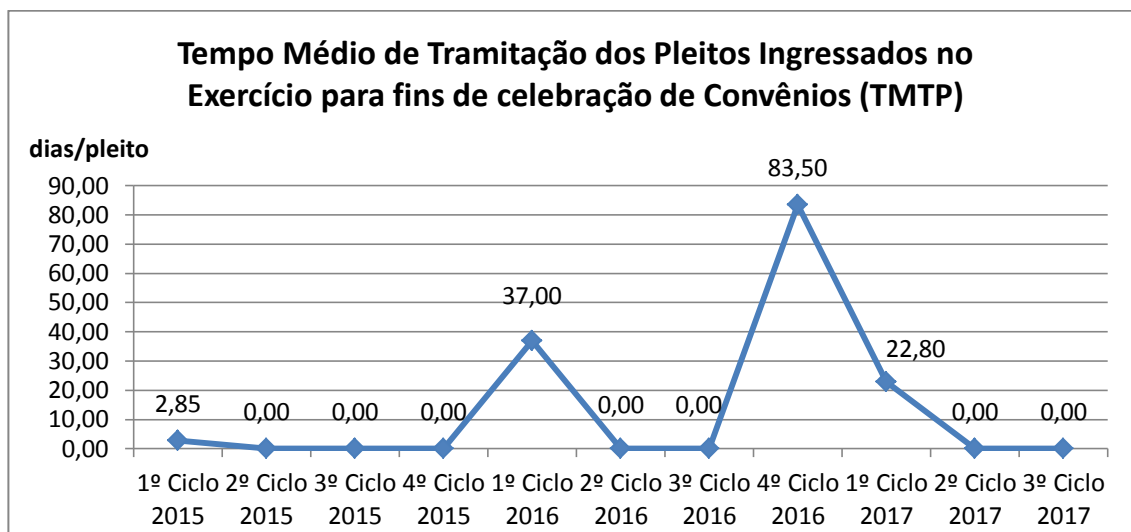

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = 0 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: Entre Janeiro e Maio/2017 não houve celebração de TED.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	39,25 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_{a_Aprovar_{FINAL}}}{\text{Convênios}_{a_Aprovar_{INICIAL}}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%) = 100 \times \frac{23}{30} = 76,67\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial (CCONT)

d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: : A posição dos convênios na condição “**A Aprovar**” no SIAFI em Ago/2017 é:

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENIENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1993	069547	SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	6.044.165,46		Localizado na Auditoria 4 volumes
1995	135783	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	10.800.000,00		TCE concluída em 17/12/2015
1996	312117	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS	5.700.000,00		Em conciliação da CJU/PE
1996	317428	FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	65.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1996	317554	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000.000,00		Convênio encerrado em 12/04/2016 por recolhimento do débito.
1997	337849	INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL – CENTRO	250.000,00		Em conciliação na CJU/RN
1997	338364	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE
1997	338425	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	512.500,00		TCE concluída em 12/12/2016
1997	338444	ESTADO DE MINAS GERAIS	395.964,79	I.SU 310	TCE concluída em 22/08/2014
1997	338456	ASSOCIACAO CEARENSE DE ESTUDOS E PE	90.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1997	338464	ESTADO DA PARAIBA	219.800,00		Aguardando instrução de TCE

Continua

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENIENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1997	338496	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		TCE concluída em 12/06/2015.
1997	338502	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		TCE em instrução
1998	339202	ESTADO DE PERNAMBUCO	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	348985	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE
1998	363977	ESTADO DE MINAS GERAIS	884.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368374	MUNICIPIO DE ASSARE	1.521,02		Aguardando instrução de TCE
1998	368485	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	52.066,80	I.SU 306	Aguardando instrução de TCE
1998	368496	CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECN	124.802,00		Em conciliação. Autos foram remetidos para MI
1998	368525	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE	139.000,00		Está na DPLAN/CGDS para emissão de Laudo Técnico
1998	368547	FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVE	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368692	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA	24.000,00		DESAPARECIDO
1999	374633	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA	20.000,00		Convênio estava desaparecido. Em cobrança administrativa
1999	383671	ESTADO DO PIAUI	300.000,00		TCE concluída em 27/02/2015.
2000	399481	ASSEMP-ASSOC DAS EMP DE PLAN E CONS	30.000,00		Prestação de contas aguardando análise
2000	402702	FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO	132.500,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406357	ASSOCIACAO ALFASOL	3.000.000,00		TCE concluída em 21/11/2014
2000	406376	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO EST	46.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406570	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	952.000,00		TCE em instrução
2000	407086	INSTITUTO ANTHROPOS	156.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE

Fonte: SIAFI e NETDOC

Totalizando a posição dos convênios supra por posição resumida, temos:


Posição Resumida	Quant Convênios	Soma Val. Concedente (R\$ 1,00)
Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE	8	1.673.500,00
Aguardando instrução de TCE	5	573.387,82
Convênio encerrado	1	2.000.000,00
DESAPARECIDO	1	24.000,00
Em cobrança administrativa	1	20.000,00
Em conciliação	3	6.074.802,00
Localizado na Auditoria 4 volumes	1	6.044.165,46
Na DPLAN/CGDS para emissão Laudo Técnico	1	139.000,00
Prestação de contas aguardando análise	1	30.000,00
TCE concluída	6	17.008.464,79
TCE em instrução	2	2.952.000,00
Total Geral	30	36.539.320,07

Fonte: CCONT/DAD/SUDENE

f) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017

g) Representação gráfica:



Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial, e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{26}{26} = 100\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2017

f) Comentários: De um total de 41 convênios em 01/01/2017, 20 continuam em plena em execução e 15 estão em fase de prestação de contas em 31/05/2017, conforme posições a seguir indicadas:

Posição dos Convênios SICONV em 01/01/2017

Status do Convênio	Quantidade
Em Execução (sendo 15 novos)	26
PTC Atrasada	15
Total Geral	41

Posição dos Convênios SICONV em 31/08/2017

Status do Convênio	Contagem de SICONV
Cancelado	1
Em Execução	20
PTC Atrasada	20
Total Geral	41

A grande quantidade de convênios com Prestação de Contas Atrasadas mostra a necessidade de providências urgentes da CCONT e CGDS no sentido de iniciar uma cobrança administrativa consistente, visando evitar a necessidade de TCE. A tabela abaixo detalha a posição de cada um dos 48 convênios:

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2017	Status em 31/05/2017
627487/2008	LAGOA DE PEDRAS PREFEITURA (*)	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
707430/2009	RIACHUELO PREFEITURA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
710365/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
718521/2009	ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada
736175/2010	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
737121/2010	GRUPO GESTAO - PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO SOCIAL	PE	PTC Atrasada	PTC Atrasada
744654/2010	MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
768007/2011	MUNICIPIO DE ASSU	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada

Continua


SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2017	Status em 31/05/2017
769473/2012	ESTADO DE SERGIPE - ADMINISTRACAO DIRETA	SE	PTC Atrasada	PTC Atrasada
769782/2012	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	PTC Atrasada
770741/2012	ESTADO DA PARAIBA	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada
770859/2012	SEMAS	PE	Em Execução	PTC Atrasada
770860/2012	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
789013/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	CE	PTC Atrasada	PTC Atrasada
789015/2013	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
792551/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
794329/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
794997/2013	IDENE	MG	PTC Atrasada	PTC Atrasada
802144/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	RN	Em Execução	Em Execução
802415/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	Em Execução	Em Execução
812155/2014	Sec. Des. Agrário	CE	Em Execução	Em Execução
813604/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada
813665/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	Em Execução	Em Execução
813695/2014	SERHMACT	PB	Em Execução	PTC Atrasada
813986/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	Em Execução	Em Execução
822608/2015	SEMAS	PE	PTC Atrasada	Cancelado
827249/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Execução
827250/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Execução
827251/2016	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	RN	Em Execução	PTC Atrasada
827676/2016	TANGARA	RN	Em Execução	Em Execução
828295/2016	LAGOA D'ANTA	RN	Em Execução	Em Execução
828296/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
828297/2016	JUCURUTU	RN	Em Execução	Em Execução
828298/2016	TIBAU DO SUL	RN	Em Execução	Em Execução
828299/2016	PARELHAS	RN	Em Execução	Em Execução
828300/2016	CAMPO REDONDO	RN	Em Execução	Em Execução
828301/2016	NATAL	RN	Em Execução	Em Execução
836181/2016	LUCRÉCIA	RN	Em Execução	Em Execução
836220/2016	PARAZINHO	RN	Em Execução	Em Execução
838038/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
839953/2016	UPANEMA	RN	Em Execução	Em Execução

Fonte: SICONV e NETDOC

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	87,5%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	65%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	65%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

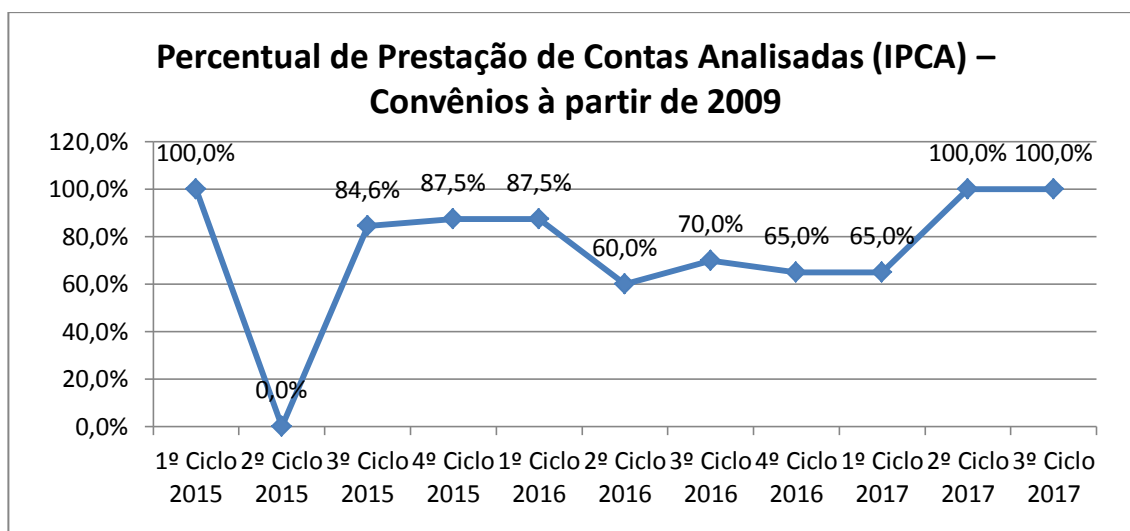

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

5 - Indicadores de Gestão de Pessoas


5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{76 \times 100}{200} = 38\%$$
- Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 %

- e) Período da aferição: Jan-ago/2017
- f) Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores, até o momento, foi parcialmente atingida em 38%, alcançando 76 (setenta) servidores. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 114 (cento e quatorze) inscrições efetivamente realizadas.
- g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	69%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	72%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	72,5%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	35%	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

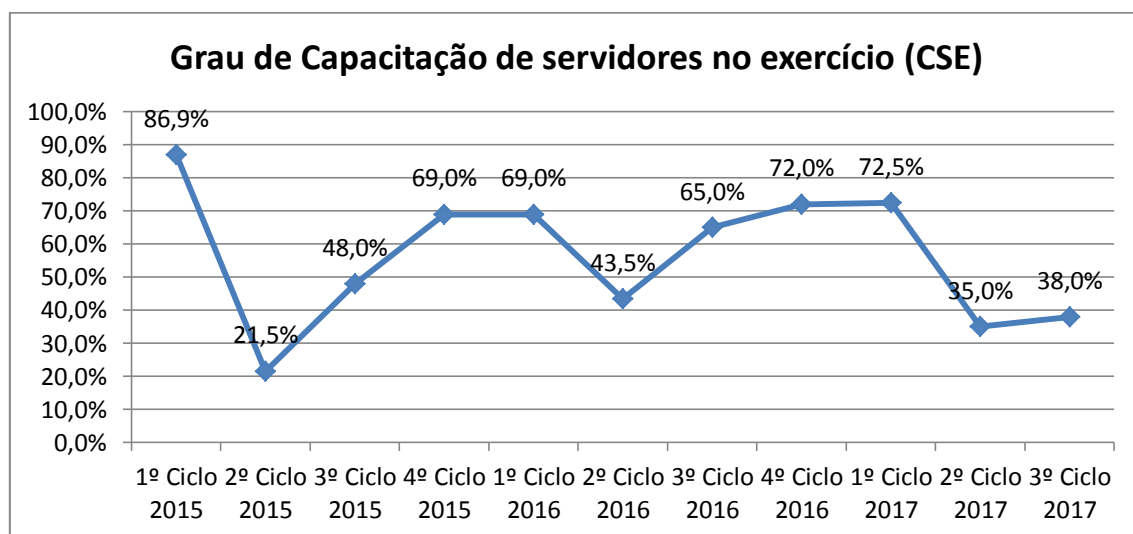

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{20 \times 100}{50} = 40\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)
- e) Período da aferição: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Foram realizados 20 (vinte) eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	180%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	84%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	134%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	162%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	12%	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

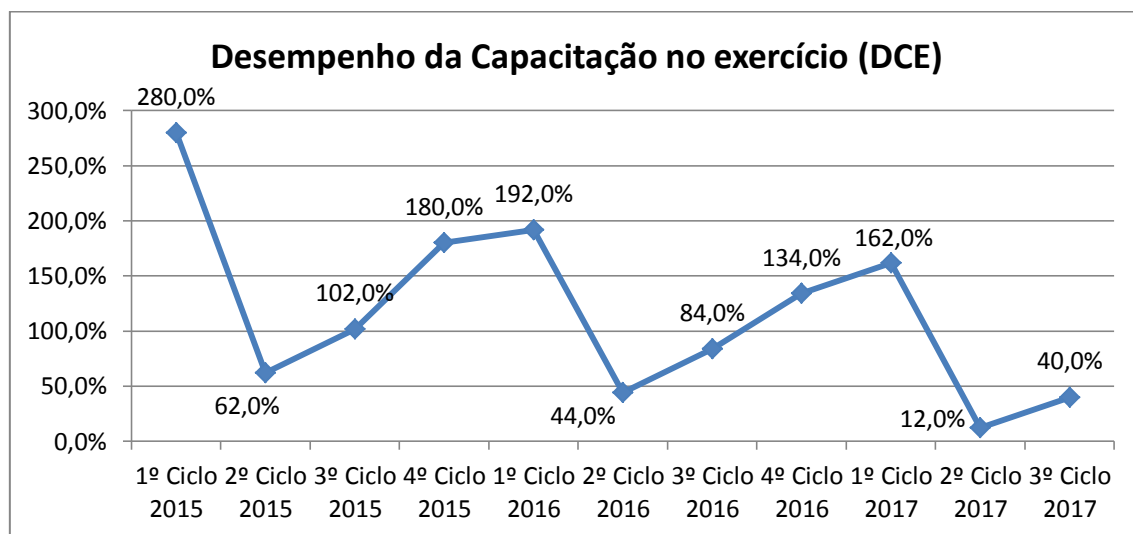

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{48.710,75 \times 100}{400.000,00} = 12,2\%$
- b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.
- c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: Jan-ago/2017
- f) Comentários: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 24.769,00 (vinte e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais) e R\$23.941,75 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) com diárias e passagens, representando 12,18 %.
- g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	18,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	32,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	32,9%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,31%	2º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

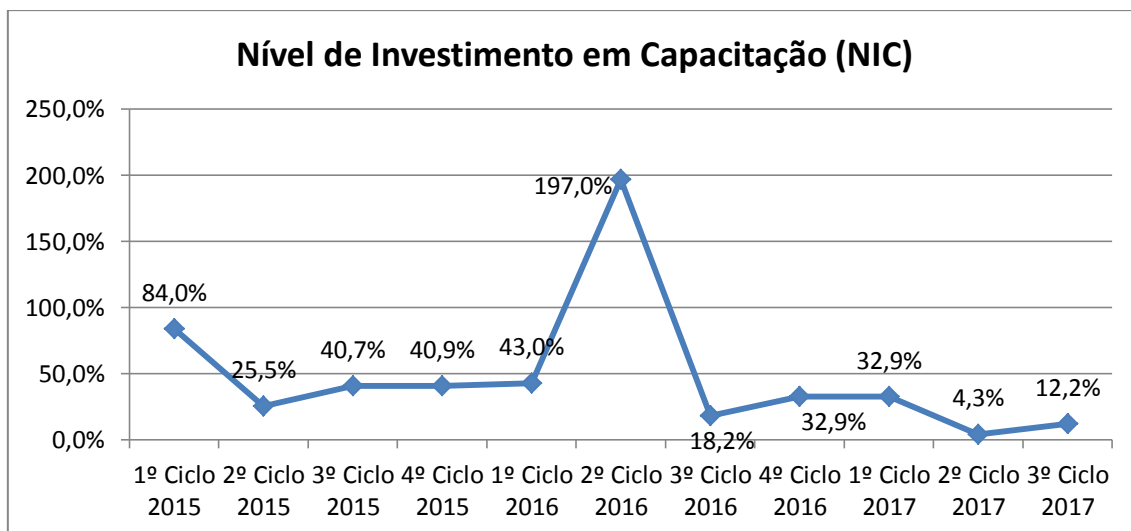

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6 - Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)


- a) Fórmula: Média de acessos = 20.525 acessos
(Google Analytics)
- b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.

- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal: não há um índice de resultado ideal para esta métrica. A ideia é sempre tê-la com crescimento constante. Para fins práticos, a Ascom estabelece como meta inicial o crescimento de 5% em relação aos dados aferidos no ciclo anterior.
- e) Período da aferição: 03/maio/2017 a 31/ago/2017.
- f) Comentários: o aumento do número de usuários pode ser atribuído ao aumento de referências ao site a partir das publicações de conteúdo nos canais oficiais da Sudene. Sempre que possível, a Ascom insere o endereço SUDENE.gov.br nas peças das redes sociais e nos vídeos produzidos.
- g) Resultados Anteriores (AU - site):

01/nov/2016 a 01/fev/2017	18.221	-
02/fev/2017 a 02/maio/2017	12.747	2º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 06/06/2017.

- h) Representação gráfica:

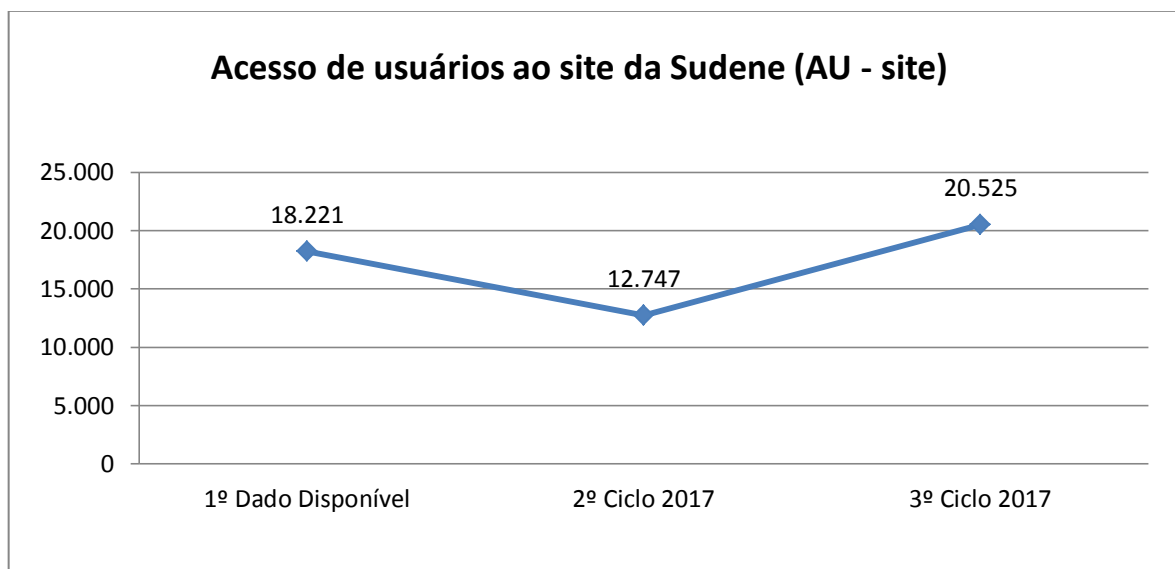

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)


- a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'56''
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

- d) Resultado Ideal (%): não há um índice de resultado ideal para esta métrica. A ideia é sempre tê-la com crescimento constante. Para fins práticos, a Ascom estabelece como meta inicial o aumento de 10 segundos em relação ao tempo de permanência registrado no ciclo anterior.
- e) Período da aferição: 03/maio/2017 a 31/ago/2017.
- f) Comentários: a queda do tempo de permanência no site da Sudene pode ser interpretado da seguinte maneira:
- As pessoas levam menos tempo para encontrar as informações no site;
 - Páginas cujo conteúdo ainda não passou por atualização e redesign foram consultadas. Isso aumenta a rejeição do público ao espaço, fazendo com que o tempo de permanência diminua;
 - Os poucos dias em que o site ficou indisponível no mês de julho em virtude da mudança de sede pode ter tido impacto neste índice.
- g) Resultados Anteriores:

01/nov/2016 a 01/fev/2017	2'40''	-
02/fev/2017 a 02/maio/2017	3'28''	2º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 06/06/2017.

- h) Representação gráfica:

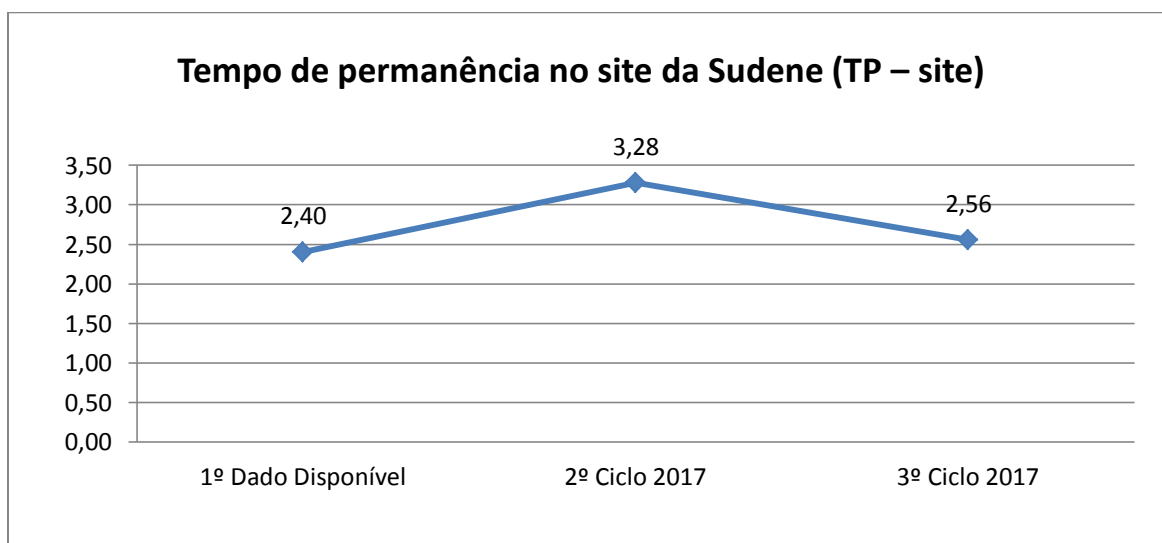

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 53,68%
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.

De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: 03/maio/2017 a 31/ago/2017.


f) Comentários: a taxa de rejeição pode ter aumentado pelo fato de páginas que ainda não passaram por revisão de conteúdo e design terem sido consultadas.

g) Resultados Anteriores:

01/nov/2016 a 01/fev/2017	56,09%	-
02/fev/2017 a 02/maio/2017	48,65%	2º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 06/06/2017.

h) Representação gráfica:

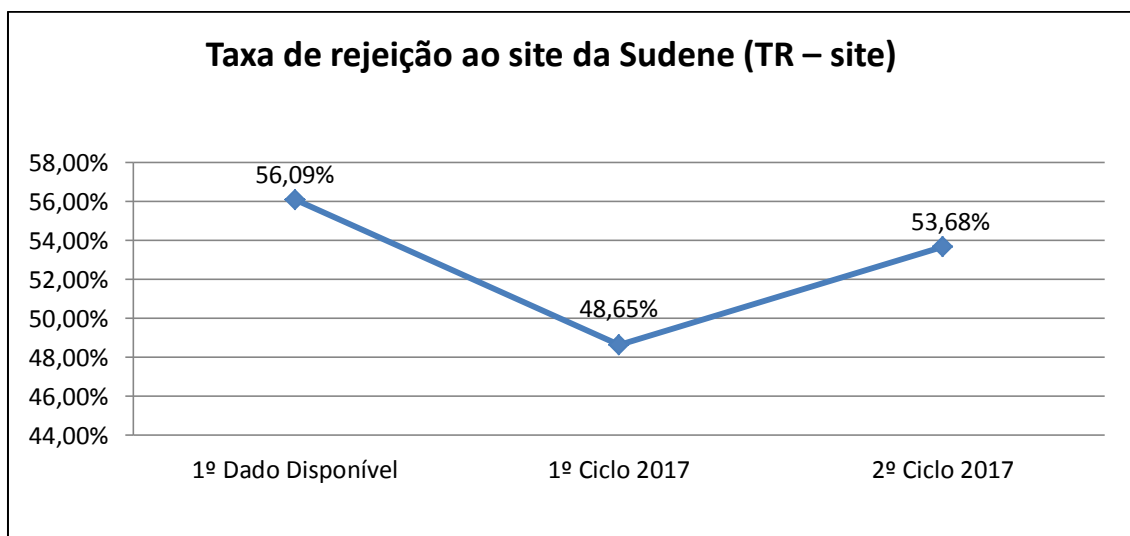

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


a) Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.413
(Facebook)

- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Para fins práticos e considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta o aumento de 5% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento, com possibilidade de revisão desta taxa.
- e) Período da aferição: até 06/set/2017.
- f) Comentários: embora as curtidas tenham aumentado em relação ao índice anterior, a taxa de crescimento verificada do 2º para o 3º ciclo foi de 3%. Considerando o período entre o 1º e o 2º ciclos, o índice é de 3,5%. Portanto, vê-se que o índice de crescimento possui média de 3%. Como a ASCOM não possuía referenciais anteriores para estipular uma meta, solicita-se revisão da taxa, conforme previsto no ciclo anterior.
- g) Resultados Anteriores:

30/mar/2017	2.259	-
08/jun/2017	2.339	2º ciclo 2017

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 08/06/2017.

- h) Representação gráfica:

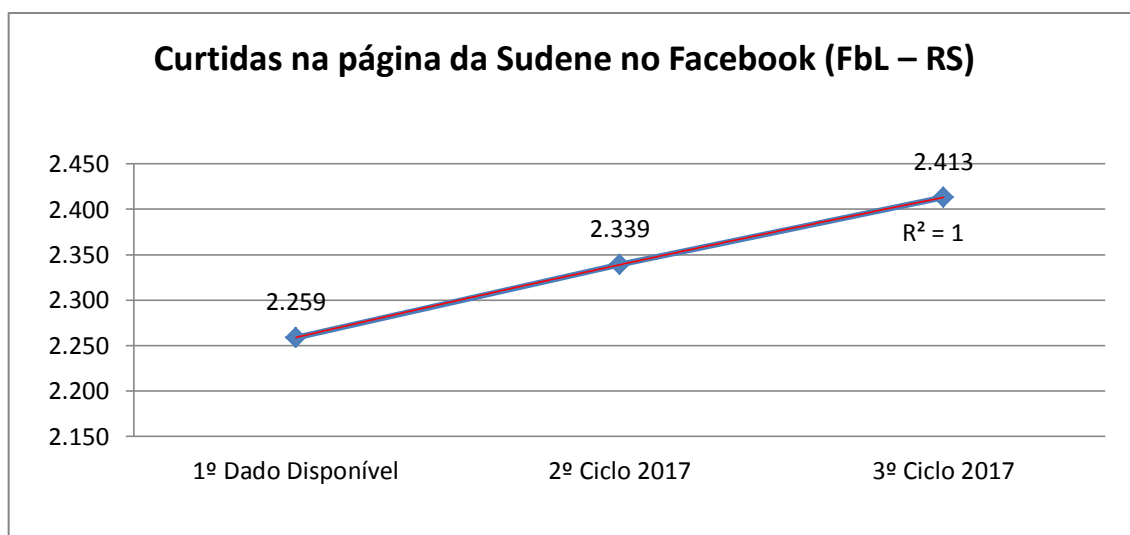

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)


- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 623
(Twitter)

- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta o aumento de 5% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento, com possibilidade de revisão desta taxa.
- e) Período da aferição: até 06/set/2017.
- f) Comentários: Destaca-se que o crescimento registrado foi de 4% em relação ao ciclo anterior. A ASCOM têm empreendido esforços para garantir a publicação contínua de conteúdo neste espaço.
- g) Resultados Anteriores:

08/abr/2017	467	-
08/jun/2017	599	2º ciclo 2017

Fonte: Tweetcount.com, acesso em 08/06/2017.

- h) Representação gráfica:

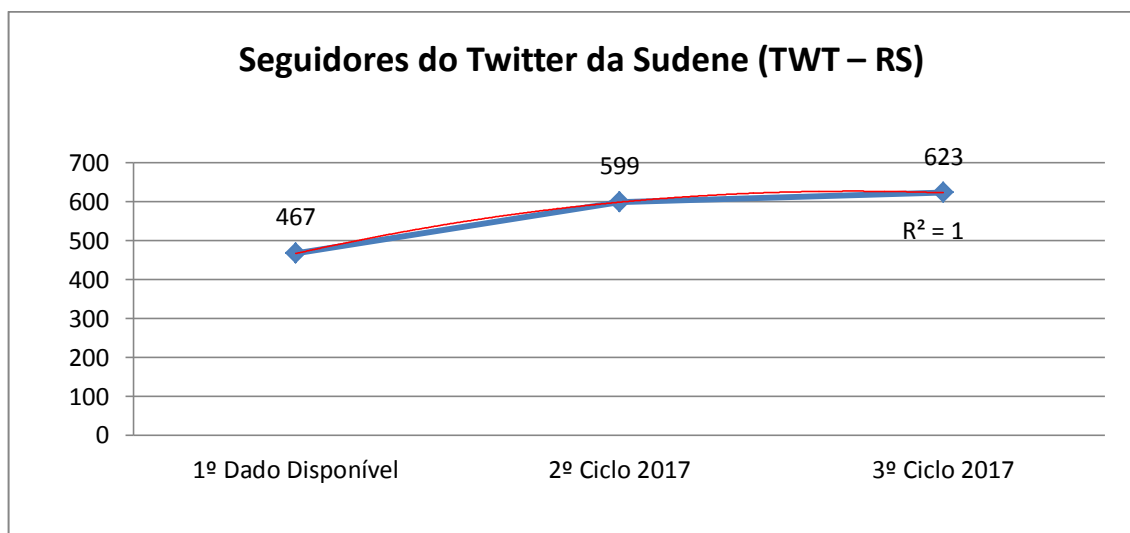

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

6.6 - Taxa de engajamento do Instagram da Sudene (INSTA – RS)

- Fórmula: $\frac{\text{Qtde de Curtidas}}{\text{Qtde de Seguidores}} = \frac{26}{270} = 9,6\%$
- Objetivo: avaliar o engajamento dos seguidores do Instagram da Sudene com relação ao conteúdo publicado nesta rede social.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da taxa de engajamento no Instagram. Para fins de cálculo, estabelece-se como meta o aumento de 2% no índice alcançado a cada novo ciclo de monitoramento.
- Período da aferição: 09/jun/2017 a 31/ago/2017.
- Comentários: a taxa de engajamento caiu em virtude do aumento de seguidores.
- Resultados Anteriores:

-	-	-
30/mar/2017 a 08/jun/2017	10%	2º ciclo 2017

Fonte: Gabstats.com, acesso em 08/06/2017.

- Representação gráfica:

***Não há representação gráfica para este indicador, visto que existem somente dois resultados.**

6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 35 + 19 = 54 \text{ matérias}$
(Internet + Intranet)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- Período da aferição: 09/jun/2017 a 31/ago/2017.
- Comentários: os números apurados dizem respeito ao período compreendido entre a reunião do 1º Ciclo de 2017 (30/mar) até 08/jun/2017.

g) Resultados Anteriores:

-	-	-
30/mar/2017 a 08/jun/2017	39	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

***Não há representação gráfica para este indicador, visto que existem somente dois resultados.**

6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

a) Fórmula: \sum Sugestões de Pauta Publicadas = 12

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 15 sugestões de pauta por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.

e) Período da aferição: 30/mar/2017 a 08/jun/2017.

f) Comentários: convém registrar que houve crescimento em relação ao período anterior. Sobre a meta estabelecida ser de 15 sugestões, a Ascom poderá rever esta meta a partir do próximo ciclo, pois haverá mais dados para estipular um dado mais próximo da realidade. De todo modo, o trabalho de assessoria de imprensa tem se destacado, sobretudo para fortalecer a imagem de uma Sudene mais dinâmica e participativa. Costumeiramente há menções na imprensa nordestina sobre a autarquia. Os clippings disparados pela Ascom comprovam este trabalho.

g) Resultados Anteriores:

-	-	-
30/mar/2017 a 08/jun/2017	8	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

***Não há representação gráfica para este indicador, visto que existem somente dois resultados.**

6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: $\sum \text{Produções em Vídeo e Áudio} = 9 \text{ áudios} + 4 \text{ vídeos} = 13 \text{ produções}$
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 09/jun/2017 a 31/ago/2017.
- Comentários: embora o resultado tenha sido atingido, a ASCOM fará revisão deste indicador no próximo ciclo, pois haverá mais dados para se estabelecer uma média de produção de peças audiovisuais.
- Resultados Anteriores:

-	-	-
30/mar/2017 a 08/jun/2017	10	2º ciclo 2017

- Representação gráfica:

*Não há representação gráfica para este indicador, visto que existem somente dois resultados.

6.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

- Fórmula: $\sum \text{Produções em Ações de Publicidade e Design} = 46 + 54 + 29 = 129$
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - Produções para jornalismo;
 - Produções para demandas internas;
 - Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.

e) Período da aferição: 09/jun/2017 a 31/ago/2017.

f) Comentários: nota-se o aumento significativo das atividades voltadas para as redes sociais e demandas internas. É importante destacar que a criação de uma peça para redes sociais ou o desenvolvimento de uma campanha publicitária demanda um trabalho multidisciplinar e técnico que envolve ações como atendimento ao cliente, pesquisa de mercado, desenvolvimento do produto, uso de softwares especializados, revisão e publicação. Há produtos mais complexos que outros, fazendo com que o tempo dedicado à atividade de produção seja bastante alto (a exemplo da produção de um boletim do ODNE, vinculado à CGEP, ou o desenvolvimento de uma campanha publicitária).

O aumento do volume de demandas de jobs de publicidade e design impacta, ainda, no desenvolvimento de outras atividades relacionadas ao site e às redes sociais.

g) Resultados Anteriores:

-	-	-
30/mar/2017 a 08/jun/2017	68	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

*Não há representação gráfica para este indicador, visto que existem somente dois resultados.

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI)

Tendo em vista que a reunião de monitoramento ocorreu no dia 05 de outubro, posterior portanto, ao período de avaliação de desempenho institucional (out/17 a set/18) achou por bem a Coordenação-Geral de Gestão Institucional oferecer uma consolidação já agora. Essa consolidação só foi possível em função de atualização complementar solicitada por esta unidade para os Planos Operativos integrantes deste quadro, realizada posteriormente ao levantamento de agosto, que resultou nos insumos da reunião de 05 de outubro.

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Resultados do período out/2016-set/2017 com base na Portaria nº 166, de 14 de dezembro de 2016

Nº Ordem	Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e D4- Fortalecer a Imagem da SUDENE	O1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; O4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Eventos temáticos realizados	2 (dois)	100%	80	Realização dos eventos temáticos de difusão de potencialidades regionais por meio da articulação de parcerias. (PO 17-Café com Sustentabilidade-Desenvolvimento Tecnológico das Energias Renováveis; PO 19-Café com Sustentabilidade - Estratégias para o desenvolvimento sustentável: inovação em produtos da biodiversidade da caatinga.)-2º Ciclo 2017 (CGDS/DPLAN)
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e D4- Fortalecer a Imagem da SUDENE	O1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e APLs, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; O4.1- Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes)	Encontros realizados	3 (três)	100%	80	Realizar encontros para discussão e aprofundamento de temas relativos ao desenvolvimento sustentável. CGDS/DPLAN)-(PO -Café com Sustentabilidade, Reuso da água como estratégia de convivência com o Semiárido; PO - Evento: Estudo comparativo das Cisternas de Captação de Água para Consumo Humano no semiárido; PO -Evento - 1ª reunião técnica de articulação da Rede Palma)-pós 3º Ciclo 2017
3	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4- Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Relatório entregue	1	100%	80	PO 22-Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal e de seus impactos para a unidade de estudos e pesquisas da SUDENE - pós 3º ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
4	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Base de Dados disponível para equipe de geoinformação da CGEP	1	100%	80	PO 25-Construção de uma base de geoinformação para subsidiar a elaboração dos Boletins Temáticos da SUDENE-2º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)

Continua

Nº Ordem	Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
5	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Mapas disponibilizados para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 23-Publicação contendo mapas geopolíticos e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE - pós 3º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
6	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 27-Boletim Temático da SUDENE: Painel Analfabetismo - 2º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
7	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 24-Boletim Temático da SUDENE: Painel Saúde-pós 3º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
8	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 25-Boletim Temático da SUDENE: Painel Ciência, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN)- 3ºciclo 2017
9	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Relatório contendo a Análise de Viabilidade entregue	1	100%	80	PO 30-Análise de Viabilidade de Construção de um Boletim Temático da SUDENE com tema: Painel Institucional do Desenvolvimento Sustentável - 2º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
10	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 26-Boletim Temático da SUDENE: Painel Saneamento Básico-3º Ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
11	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 27-Boletim Temático da SUDENE: Painel PIB e PIB per capita - 3º ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
12	D1-Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim disponibilizado para publicação em meio digital	1	100%	80	PO 28-Boletim Temático da SUDENE: Painel Demografia – Fluxo das Migrações no Nordeste-3º ciclo 2017 (CGEP/DPLAN)
13	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas.	100%	98,6%	79	Analisar as consultas prévias protocoladas junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 3º, art. 18 do Decreto nº 7.838/2012).(71 pleitos analisados de um total de 72)- pós 3ºciclo 2017 . (CGDF/DFIN)
14	2029-Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355- Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamentos analisados.	100%	100%	80	Analisar a participação do FDNE nos projetos aprovados pelos agentes operadores protocolados junto à Sudene dentro do prazo legal de 30 dias (§ 2º, art. 22 do Decreto nº 7.838/2012). (todos os 3 (três) financiamentos que deram entrada no período, foram analisados)- pós 3º ciclo 2017 (CGDF/DFIN)

Continua

Nº Ordem	Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
15	D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e Portarias aprovadas	300	100%	80	Aprovação de incentivos fiscais. 326 pleitos aprovados conforme comunicação (relatório de resultados do período out/2016-set/2017) por e-mail da CGIF/DFIN de 19/10/2017 - pós 3º ciclo 2017 (CGIF/DFIN)
16	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.1.1 - Reestruturar as unidades gestoras.	Regimento da SUDENE atualizado	1	100%	80	PO 74-1º Ciclo 2017 - Adequação do Regimento interno da SUDENE ao Decreto nº 8.891, de 27/10/2016, que alterou o Decreto nº 8.276/2014. Este PO foi retirado no 2º ciclo/2017 por motivo de conclusão -1º Ciclo 2017. (CGGI/SUP)
17	2111 - Gestão e Manutenção do MI	4575 - Capacitação de servidores Públicos Federais - Plano Orçamentário 0001	Sub-projeto 1 : Desenvolvimento por Competências	70%	114,2%	80	PO 76-Projeto Estratégico de Desenvolvimento por Competências - pós 3º ciclo 2017 (alcançou 80 % para o período out/16-set/17) (CGGP/DAD)
18	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.3.3 Valorizar e qualificar os servidores	Sub-projeto 2: Avaliação por Competências	30%	283,3%	80	PO 77-Projeto Estratégico de Avaliação por Competências -pós 3º ciclo 2017 (alcançou 85% para o período out/16-set/17) (CGGP/DAD)
MÉDIA ARITMÉTICA					-	79,9	

Fontes: Diretoria de Administração; Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

Notas:

1-De acordo com o Decreto nº 7.133/2010, o resultado do desempenho institucional está limitado a 80 pontos. O complemento para os 100 pontos é dado pela avaliação de desempenho individual.

2-Na coluna “Identificação do projeto” constam registros em letra de cor azul com termos como “1º Ciclo 2017”, “2º Ciclo 2017”, “3º Ciclo 2017” ou “pós 3º Ciclo 2017”. Eles mostram o momento em que a meta foi alcançada. Por exemplo: “pós 3º ciclo” significa que o resultado foi alcançado no período out/16-set/17, porém, após a data de travamento dos dados do 3º ciclo, que foi ago/17.

Referência: 05/10/2017

8 – Observações e Deliberações em plenária de 05/10/2017

Destaques da reunião:

Tendo em vista o foco dado pela Diretoria Colegiada a um conjunto de 8 metas, algumas com desdobramentos, objeto da Resolução nº 281, de 13 de junho de 2017, do mesmo colegiado, a apresentação do 3º Ciclo de Monitoramento priorizou esses projetos e a Coordenação-Geral de Gestão Institucional colheu da reunião os seguintes comentários e deliberações:

PO 01 – Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE). O projeto do PRDNE está em andamento, e foi reforçada a sua importância para a Sudene. A Autarquia está aguardando a liberação de limite por parte do MI. Tratativas estão sendo feitas pelo

Superintendente e pelo Diretor de Administração para a liberação de limite. Na data da reunião do 3º ciclo de monitoramento os recursos ainda não tinham sido disponibilizados pelo MI.

PO 02 – Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana. Os recursos já estão garantidos e a execução será feita dentro do Acordo de Cooperação entre a SUDENE e o PNUD.

PO 03 – Acordo de Cooperação Técnica entre a SUDENE e a APEX-Brasil visando a promoção da atração de investimento estrangeiros diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste. Segundo o Superintendente Marcelo Neves, o projeto, em parceria com a Apex, visa não só o aumento das exportações como também, atrair investimentos para a região Nordeste. Lembrou também o plano “Nordeste Forte”, outra parceria da SUDENE com a CNI, que se constitui de trabalho com as federações das indústrias dos estados da região, que, capitaneado pela federação do Rio Grande do Norte, tem sido outra importante forma de se levar adiante pautas do desenvolvimento do nordeste.

No contexto do trabalho com a CNI, o Superintendente Marcelo Neves também socializou o ocorrido em relação ao evento internacional “Solar Power” que aconteceu em Las Vegas/EUA, em setembro/2017. Comentou que havia sido disponibilizado um espaço para a Sudene expor seus instrumentos, entretanto, por questões burocráticas do Ministério da Integração Nacional, a participação da autarquia teve que ser cancelada.

PO 04 – Estruturação do Plano de Projeto para o ODNE. O coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), Frederico Cavalcanti informou que o projeto do sistema do ODNE esta sendo feito em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação da SUDENE, porem está paralisado por falta de recurso. Informou ainda, que o conteúdo está pronto faltando a parte de software e a interface do sistema informacional, que necessita da contratação de empresa especializada para realizar tal trabalho.

PO 05 – Acompanhamento da participação da Sudene na nova delimitação do Semiárido brasileiro. Em relação ao projeto de delimitação do semiárido o Coordenador-Geral da CGEP informou que no começo a participação da Sudene foi reduzida pelo Ministério da Integração e que após a pressão de alguns estados, esse papel se ampliou. Frederico sugeriu que fosse criado um comitê permanente e que isso fosse pauta do próximo Condel. O Superintendente pediu para a CGEP acelerar a instituição desse grupo. O Coordenador-Geral informou ainda, que recebeu demandas de vários estados do Nordeste para revisão do Semiárido, e destacou que todas apresentavam vícios de origem. É que vários pedidos foram elaborados e encaminhados por instituições que não possuem competência para tratar dessas questões. É o caso das universidades e prefeituras dos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

Vale lembrar que, de acordo com a Resolução nº 107, de 27 de julho de 2017, do Conselho Deliberativo da SUDENE,

“Art. 3º Os Estados poderão apresentar à Sudene recursos à delimitação proposta no Relatório, no prazo de 60 dias, a partir da publicação da resolução aprovada pelo Conselho Deliberativo da Autarquia (CONDEL).

§ 1º Os recursos de que trata o *caput* deverão ser embasados por Relatório Técnico dos órgãos de Clima e Tempo oficiais dos estados.”

E essa condição não foi observada.

PO 06 – Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário). Segundo o Coordenador-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), Mauricio José de Garcia Maia, houve necessidade de inversão na sequência da etapa pois a criação do

grupo de trabalho previsto no item 4.1 foi transferido para após a primeira reunião técnica. Segundo o mesmo, o projeto “caminha bem”.

PO 7.1 – Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte no sistema SICONV do Governo Federal. De acordo com o Coordenador-Geral da CGDS, são dois Termos de descentralização, sendo que um já foi para empenho e o outro, relativo ao estado da Bahia, está em fase de finalização.

PO 7.3 – Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará no sistema SICONV do Governo Federal. A CGDS informou que o projeto de capacitação de servidores do estado do Ceará foi cancelado em virtude da dificuldade dos instrutores da Escola de Administração Fazendária (ESAF) para, na época proposta, realizar tal trabalho naquele estado.

PO 8.1 – Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas/RN. De acordo com o Coordenador-Geral da CGDS, já foi liberada uma parcela e estão sendo verificadas as obras para liberar a segunda etapa.

PO 8.2 – Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - Projeto 1. O projeto estava orçado inicialmente em R\$ 250.000,00, entretanto passou por adequações e serão cancelados R\$ 38.000,00 de saldo.

PO 8.5 – Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de São José do Seridó/RN. De acordo com Maurício Maia, da CGDS/DPLAN, a obra já foi realizada e está em fase de fiscalização

PO 8.8 – Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN. Informou o Coordenador-Geral da CGDS que a prefeitura não fez o depósito da contrapartida do projeto e em razão disso algumas etapas estão em atraso.

PO 8.9 – Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - Projeto 1. A CGDS já encaminhou solicitação à CGAF para o pagamento da 2ª etapa, e a 1ª está sendo fiscalizada.

PO 8.10 – Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - Projeto 2. A etapa 9, de pavimentação de vias, que estava com o status “A iniciar” já foi concluída após a data do travamento dos dados (31/08) para o presente ciclo de monitoramento.

PO 8.11 - Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN. O município recebeu a 1ª parcela e está realizando as obras.

PO 8.12 – Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN. O município recebeu a 1ª parcela e está realizando as obras.

PO 8.13 – Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN. Houve atraso no envio de documentos pelo município o que ocasionou atraso na liberação dos recursos

PO 8.14 – Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo em Campo Redondo/RN. Foi liberado o recurso para a aquisição de equipamento e a SUDENE está aguardando a documentação comprobatória.

PO 8.15 – Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN. O Coordenador-Geral da CGDS, Maurício projeto está em ajuste do cronograma para o recurso ser liberado.

9 – Conclusão

A grande mudança deste ciclo foi o tratamento especial conferido aos 24 projetos considerados prioritários pela Resolução nº 281, de 17 de outubro de 2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE. Um caminho escolhido até para adequar o tempo oferecido pelo Superintendente na manhã de 05 de outubro, única data disponível após sucessivos adiamentos (21, 26 e 28 de setembro) em razão de sua agenda e da pauta de compromissos de alguns de seus Diretores. A pauta do monitoramento foi considerada cumprida em parte, por que assuntos importantes, relacionados a planos operativos fora da portaria de prioridades, continuam a demandar tempo para debate. Ficaram de fora dessa reunião, por falta de tempo, as discussões sobre o andamento dos projetos considerados como metas de desempenho institucional do período out/16-set/17. A CGGI está estudando alternativas para administrar essas circunstâncias.

O maior problema verificado na administração dos planos operativos prioritários da Resolução nº 281/2017 continua sendo o contingenciamento de recursos, assunto que demandou a ida do Superintendente a Brasília para negociação junto ao Ministério da Integração Nacional.

A agenda do próximo ciclo de 2017 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
4º	30/11/2017	6/12/2017	15/12/2017

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

A agenda proposta para 2018 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2017	16/02/2018	15/03/2018
2º	31/05/2018	15/06/2018	29/06/2018
3º	31/09/2018	5/10/2018	18/10/2018
4º	30/11/2018	7/12/2018	20/12/2018

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Quadros do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO		01
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.		Ano:		2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.				
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.				
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Previsão de Conclusão:	30/07/2018	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)
Data Atualização:	31/08/2017	Vigência: 18/12/12 a 30/06/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 234.105,49
mai/12	139.865,15	7.361,32	147.226,47	A realizar no exercício	R\$ -
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	234.105,49	12.321,33	246.426,82	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 234.105,49

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
5	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013			100,0%	Concluído		
9.1	Proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	Concluído		

9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao conveniente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34	25/11/2016	25/11/2016	94.240,34	100,0%	Concluído	No ciclo anterior, foi recomendada a prorrogação da vigência do convênio e que aguardassemos a liberação da 2ª parcela que aconteceu em 25/11/2016	
9.6	Diretrizes, Estratégias e Proposições	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016		28/5/2015	21/01/2016		100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016		22/1/2016	30/6/2017		100,0%	Concluído	Realizada reunião em 05/04/2017 com equipe técnica da Agência para tratar da fase final do convênio. Relatório Técnico Final entregue a Sudene em 27/04/17.	Relatório de execução em análise pelo setor de convênios. CONDEPE/FIDEM está elaborando a prestação de contas
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	6/6/2016	7/6/2016		6/6/2016	7/6/2016		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	30/08/2017	30/07/2018					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
				Valor Previsto:		R\$ 234.105,49	Valor realizado:		R\$ 234.105,49	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

Liberação da segunda parcela realizada, no entanto devido ao atraso na liberação solicitou-se a prorrogação de ofício.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausência de recursos no Ministério da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício. Liberação da segunda parcela realizada, no entanto devido ao atraso na liberação solicitou-se a prorrogação de ofício. Relatório de execução em análise pelo setor de convênios. CONDEPE/FIDEM está elaborando a prestação de contas.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO	02
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental			Ano:		2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território					
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia		
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.					
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.					
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	01/03/2018	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)
Data Atualização:	31/08/2017	Vigência de 28/12/2012 à 30/03/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,8%	Atrasado		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		

6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	30/10/2016		15/11/2014	--	--	80,0%	Atrasado	Segundo informações dadas pela conveniente o processo licitatório para contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1, foi realizado e homologado no dia 07/10/2015, aguardando o repasse da segunda parcela para execução. Resta a contratação dos serviços para a realização do Seminário final.	Foi realizada, em 11 de maio de 2017, uma reunião que contou com a participação de representantes da SUDENE (área técnica, financeira e de gestão) e da SEMAS/PE, quando foi apontado como encaminhamento que a conveniente enviasse ofício ao Ministério do Planejamento solicitando orientações para solucionar questões técnicas, no SICONV, que impedem a correta inserção do relatório de execução. Como resposta, foi informado que o Relatório de Execução Físico do Plano de Trabalho, que estava apresentando problemas, só precisa ser apresentado no final da execução do projeto. Ademais, a conveniente apresentou ofício datado de 17/05/2017 solicitando aditamento do convênio, também em atendimento a outro encaminhamento definido nesta reunião. Convênio aditado até 30 de março de 2018. Entretanto, não foi possível à Conveniente realizar os ajustes necessários a esta nova vigência devido a tramitação das análises dos Relatórios de Execução, que impede este procedimento, portanto, o Plano de Trabalho não está com suas datas previstas atualizadas. Este fato tem repercussão negativa nos "status" das Metas/Etapas apresentados neste PO. Concluída a análise da parte física, aguarda-se a realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos Relatórios de Execução da parte financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio, com vista a liberação da segunda (última) parcela de recursos. Reunião marcada para o dia 11/09/2017 com a conveniente para avaliar quais medidas são cabíveis para dar continuidade ao convênio.
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	30/06/2017		08/12/2014	--	--	40,0%	Em Andamento		
7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015		08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído	Etapa concluída após a retomada da realização dos Encontros com a contratação de uma nova empresa.	
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/11/2016	30/11/2016	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do Concedente. A Concedente vem tentando solicitar esta pendência, inclusive registrando solicitação de esclarecimento no SICONV, junto ao SERPRO.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	04/07/2016	31/05/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos.	
7.3	Realizar Seminário Nordeste	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordeste com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	03/10/2016	30/06/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado		
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	30/06/2017		01/05/2014	--	--	45,0%	Atrasado		
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	--	--	90,0%	Atrasado	A conveniente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluí-la.	

8.2	Confeccionar documento final/livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2016	30/06/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado	
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	A Iniciar	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar	
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/10/2017	01/02/2018		--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 265.241,25	60%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.												
Observações:												
* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Reunião marcada para o dia 11/09/2017 com a convenente para avaliar quais medidas são cabíveis para dar continuidade ao convênio.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO	03
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.			
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 485.874,65

Previsão de Conclusão:	10/07/2017	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	31/08/2017	Vigência: 31/12/13 a 14/05/16

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255)
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta	Lançamento da Proposta no SICONS	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		60,0%	Concluído		
6	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/ SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Elaboração do PESI-NN	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%	Concluído	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	

8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Elaboração de Relatório de situação	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Elaboração de Relatório de análise de investimentos	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.	
	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído		
8.4	Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.	
8.5	Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.	
8.6	Publicação do PESI-NNE	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.	
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Técnica: Maria Helena de Castro Lima	
		ENCERRAMENTO (Peso 20 %)								18,0%	Atrasado		
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	25/05/2017	10/07/2017		23/05/2017			90%	Atrasado	Relatórios de Execução Físico e Financeiro Aprovados. Prestação de contas apresentada pelo conveniente em 23/05/17.	Em elaboração do Laudo Técnico Final.
				Valor Previsto:		R\$ 485.874,65	Valor realizado:		R\$ 485.874,65	98,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

Etapa 8.6 repactuada

A legislação prevê o prazo de um ano para o concedente finalizar a prestação de contas, por isso, a data de conclusão do convênio refere-se a um ano após a entrega da prestação de contas, o que corresponde a 23/05/18.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	04
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.	
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.	
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Mauricio José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.				
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 107.354,71
OUT/2014	107.354,71	5.650,24	113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 100.187,91
OUT/2015	100.187,91	5.273,04	105.460,95	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	207.542,62	10.923,28	218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

Previsão de Conclusão:	28/09/2017	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 28/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								95,0%	Atrasado		
8	Liberação da 1ª parcela	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		

9	Realização do processo de licitação e contratação	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	—	—		11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído	No período de referência, a equipe técnica recebeu a complementação dos produtos comprobatórios da Meta 1 e concluiu a análise dos relatórios de execução parcial (Meta 1), recomendando a aprovação e liberação da segunda/última parcela dos recursos. A conveniente apresentou justificativa ao início da execução da Meta 2, mesmo não havendo a liberação da segunda parcela. Os relatórios de acompanhamento técnico também foram inseridos no Siconv. Por fim, foi solicitado novo aditamento de prazo de 120 dias (dezembro/2017), para que seja possível a liberação da 2ª parcela dos recursos e concluída a execução da meta 2 (entrega de certificados, diagnóstico e mapas aos municípios).	Foi realizada reunião técnica com a conveniente (julho/2017) e pactuada agenda de cumprimento das atividades para conclusão do convênio no exercício de 2017.
10	Realizar 01 seminário	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	28/11/2016	--	25/11/2015	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.1	Reuniões Técnicas	Etapla 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	21/07/2016	--	25/11/2016	15/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.2	Diagnóstico e Levantamento de Dados	Etapla 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	30/11/2016	20/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.3	Seminário de Lançamento do Programa de capacitação Fortalecimento Institucional	Etapla 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	28/03/2016	28/11/2016	--	28/03/2017	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
11	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	28/04/2016	28/04/2016		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91	--	--	--	0,0%	Atrasado		
13	Oficinas de Capacitação / Monitoramento	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	29/04/2016	28/09/2017		29/04/2016	28/09/2017	--	93,0%	Em Andamento		
13.1	Oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano	Etapla 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	04/07/2016	14/02/2017	--	04/07/2016	14/02/2017	--	100,0%	Concluído		
13.2	Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional	Etapla 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	25/07/2016	07/03/2017	--	25/07/2016	07/03/2017	--	100,0%	Concluído		
13.3	Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social	Etapla 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	09/08/2016	28/09/2017	--	09/08/2016	--	--	85,0%	Em Andamento		
14	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	28/07/2016	11/08/2016	--	28/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/SUDENE	27/11/2017	27/11/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 207.542,62	Valor realizado:		R\$ 107.354,71	115%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO	05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.			
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.			
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
ago/15	221.267,56	11.645,66	232.913,22	Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56
nov/16	138.415,08	7.285,00	145.700,08	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
TOTAL	359.682,64	18.930,66	378.613,30	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 138.415,08
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 359.682,64

Previsão de Conclusão:	13/11/2018
Data Atualização:	31/08/2017

CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)

Vigência: 13/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Moreira - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								56,0%	Em Andamento		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	CGDS/COF/ SUDENE	Não Informado	Não Informado	R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído		

9	e Desenvolvimento Regional Sustentável	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	22/08/2017		28/08/2015			80,0%	Em Andamento		
	Realização do Fórum	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.	
9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/ 08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional	
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.	
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	01/04/2016	30/11/2016	R\$ 138.415,08	fev/17	25/04/2017	R\$ 138.415,08	100,0%	Concluído		
9.6	Diretrizes Gerais e Propostas	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	21/07/2016	10/05/2017		21/07/2016	31/05/2017		100,0%	Concluído	.Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016. A equipe técnica vem acompanhando o conveniente via e-mail e telefone, inclusive lembrando do prazo firmado para a entrega do produto da etapa 3, contudo, ainda não	
9.7	Consolidação do Plano	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	11/05/2017	13/11/2017		22/08/2017			20,0%	Em Andamento		

9.8	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	13/11/2017	13/11/2018					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
				Valor Previsto:	R\$ 359.682,64	Valor realizado:	R\$ 359.682,64	76%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:												
Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM												
Observações:												
a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2												
b) O conveniente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	06
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria		Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Vrticulação de Políticas		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraíba, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.				
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano				
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 813986/2014
Data Atualização:	31/08/2017	Vigência até: 31/12/2017

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,6%	Em Andamento	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	
8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1a parcela

9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		
11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	24/10/2015		-	75%	Atrasado	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	30/06/2017	-	03/12/2015		-	55%	Atrasado	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	14/09/2015		-	70%	Atrasado		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	30/06/2017	-	27/11/2015		-	60%	Atrasado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28				0%	Atrasado	A conveniente finalizou de anexar os relatórios parciais de execução em 22/08/2017. Foram analisados os relatórios de bens adquiridos, serviços contratados e beneficiários.	O processo será encaminhado à CCONT para análise dos relatórios financeiros, para posterior liberação da 2a parcela.
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	31/05/2017	-			-	0%	Atrasado	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das demais atividades, que estão dependendo da 2a liberação de recursos.	No aguardo da resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 206.151,42	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

A conveniente solicitou prorrogação do prazo da vigência do convênio em 08/05/2017, a qual foi acatada em 04/07/17. O convênio tem previsão para término em 31/12/2017.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Mauricio José de Garcia Maia		
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.				
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará				
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares , gerando renda e fixação do homem ao campo.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	A realizar no exercício	R\$ 560.000,00
TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 560.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 771.000,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	31/08/2017	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído		

		Execução (Peso 60%)								42,2%	Atrasado	A conveniente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto. O processo se encontra na CGCONT para elaboração do Termo Aditivo.	
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído		
9	Contratação	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016		100,0%	Concluído		
10	Seminários de divulgação	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016		100,0%	Concluído		
11	Cursos de capacitação	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016			50,0%	Atrasado	Realizados 03 cursos um em cada município (Piquet Carneiro, Jaguaratama e Banabuiú). - 21/06/2016	
12	Realizar 09 dias de campo	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016			33,0%	Atrasado	Os 03 Dia de Campo foram realizados no município de Quixeramobim. - 29/10/2016	
13	Intercâmbios interestaduais	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016			50,0%	Atrasado	O intercâmbio foi realizado na Estação Experimental de Pendências no município de Soledade no Estado da Paraíba. - 11/11/2016	
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído	A viagem teve por objetivo avaliar o andamento do projeto e verificar a possibilidade de liberar a segunda parcela dos recursos financeiros.	
15	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00	10.08.2017	10.08.2017	R\$ 560.000,00	100,0%	Concluído	A conveniente solicitou prorrogação de vigência do convênio, a qual foi analisada e aprovada, ficando o seu término de vigência para 27.12.2017	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016					0,0%	Atrasado	Após a liberação da 2ª parcela de recursos financeiros será dado início a aquisição dos animais e ao restante das metas previstas.	
		Encerramento - 20%								0,0%			
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	Atrasado		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 771.000,00	62%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL (R\$)	Pago até o ano anterior	R\$ 764.868,00
326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 305.000,00
438.250,00		dez/16	438.250,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
305.000,00		set/17	305.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
TOTAL			1.090.800,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 764.868,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Juliana Borges e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Otávio Araujo Lessa Santos (coordenador)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								40,2%	Em Andamento	
8	Depósito da contrapartida	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído	
10	Visita técnica	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.
11	Processo licitatório	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído	
12	Mobilização e divulgação	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído	

13	Contratação de entidade	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL	
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/04/2015	30/05/2016	-		Não informado		100%	Concluído		
15	Aquisição de equipamentos e materiais	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			40%	Concluído		
16	Elaboração do Material Didático	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		20/04/2016	22/06/2016		100%	Concluído		
17	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.	
18	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/09/2016	R\$ 438.250,00	29/12/2016	29/12/2016	R\$ 438.250,00	100%	Concluído		
19	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras, auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Vaalor R\$ 371.625,00	SEMTABES	16/06/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/06/2016		100%	Concluído	Foram capacitadas 192 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso de Abril a Junho/2016 e 198 mulheres de Março a Junho/2017	
20	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	06/07/2017	07/07/2017	-				0%	Atrasado	Visita técnica não realizada por falta de autorização superior	
21	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2017	30/09/2017	R\$ 305.000,00				0%	A Iniciar		
22	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 305.000,00	SEMTABES	02/05/2017	07/07/2017					0%	A Iniciar		
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/03/2018	30/12/2018	-				0%	A Iniciar		
24	Visita técnica	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2017	30/12/2017	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/2018	30/06/2018	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.069.868,00	Valor realizado:		R\$ 764.868,00	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do convênio para encerramento em 30/12/2017 foi assinado em 30/06/17.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92	CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
						R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	A realizar no exercício	R\$
						R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$
						R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Valor Empenhado no Exercício	R\$
						R\$ 852.088,92	R\$ 53.000,00		R\$ 905.088,92	Valor liberado no Exercício	R\$
										Saldo a liberar	R\$
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$
										Total Liberado até o exercício	R\$

Previsão de Conclusão:	15/11/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		30/09/13	14/01/14	-	30/09/13	09/01/15	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/13	02/10/13	-	03/04/14	03/04/14		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/13	12/12/13	-	30/09/13	12/12/13		100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/13	26/12/13	-	23/12/14	23/12/14		100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/14	14/01/14	-	09/01/15	09/01/15		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		30/12/13	14/12/16		05/02/14			59%	Atrasado		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/14	28/02/14		05/02/14	05/02/14		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/14	28/02/14	R\$ 400.000,00	13/02/14	13/02/14	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/15	30/03/15		07/04/15	07/04/15		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/15	30/11/15	R\$ 300.000,00	18/11/15	18/11/15	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		

12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/15	30/12/15		27/05/16	27/05/16		100%	Concluído		
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/16	30/08/16	R\$ 152.088,92	05/08/16	15/08/16	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)	
14	Reforma do Mercado Público	Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.	Município de Saboeiro	30/12/13	16/09/16		28/02/14	14/11/16		100%	Concluído	Ver Observação (1)	
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/16	14/12/16	-	07/12/16		-	90%	Atrasado	O município concluiu o Objeto, mas não energizou o mercado pois o transformador da rua não suporta a nova demanda. A concessionária de energia deu uma previsão distante para solucionar o problema.	O município solicitou à concessionária de energia a substituição do transformador e está aguardando a solução.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		15/11/16	15/11/17	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/16	15/11/17					0%	A Iniciar	Prestação de Contas Final ainda não foi encaminhada; Ver Observações (3) e (4)	Solicitado envio da Prestação de Contas Final, em Maio/2017
						R\$ 852.088,92	Valor realizado:		R\$ 852.088,92	79%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parcelas institucionais:

Município de Saboeiro/CE

Observações:

- (1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.
- (2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R\$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.
- (3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.
- (5) Visita de Recebimento do Objeto em 07.12.2016 e Relatório de Visita de Recebimento do Objeto elaborado em 16.08.2017 e inserido no SICONV em 05.09.2017.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 200.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 200.000,00

Previsão de Conclusão:	13/09/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/02/2014	15/01/2015	-	24/02/2014	09/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	15/07/2017		02/02/2015			39%	Atrasado		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016		100%	Concluído		

12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	10/12/2016			50%	Atrasado	O município não atendeu todas as solicitações da CCONT para a liberação da 2ª parcela.	O município está realizando as correções solicitadas
13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	30/06/2017					0%	Atrasado	Ver Observação (7)	
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	10/07/2017	15/07/2017	-			-	0%	Atrasado	Ver Observação (7)	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		13/09/2017	13/09/2018	-				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	13/09/2017	13/09/2018	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:	R\$ 200.000,00	59%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Jardim de Piranhas/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014													
(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.													
(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.													
(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.													
(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2015.													
(6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.													
(7) A vigência foi prorrogada para 30/06/2017													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 292.558,79
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 292.558,79

Previsão de Conclusão:	28/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/03/2014	15/01/2015	-	06/03/2014	08/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	30/06/2017		04/02/2015			51%	Atrasado		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	05/06/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído	Foi realizado ajuste que reduziu a segunda parcela para R\$ 142.558,79	O saldo remanescente de R\$ 7.441,21 somente será liberado caso haja ampliação no projeto

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	30/06/2017		19/10/2016			95%	Atrasado	Ver Observação (8)	
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	10/07/2017	15/07/2017	-			-	0%	Atrasado	Solicitada a prorrogação da vigência	Obs: (9)Vigência alterada para 28/09/2017
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/09/2017	28/09/2018					0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/08/2017	29/08/2018					0%	A Iniciar	Ver Observação (7)	
				Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 292.558,79	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Messias Targino/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014												
(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015												
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.												
(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.												
(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.												
(6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho												
(7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.												
(8) Foi efetuado Aditamento de Vigência, alterando a data de vigência do convênio para o dia 30/06/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV												
(9) Efetuado o Aditamento da Vigência para 28/09/2017												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: PO	12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Mauricio José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste			
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída			
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58

Previsão de Conclusão:	25/11/2018
Data Atualização:	31/08/2017

TED 05/2015
Vigência: 25/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	27/11/2015		27/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								38,7%	Em Andamento		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído		
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016		20/6/2016	22/6/2016		100%	Concluído	A Coordenadora de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou uma visita técnica ao Laboratório de Energias Renováveis – NREL dos Estados Unidos, que faz parte da etapa 1 do Plano de Trabalho aprovado	

11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2017		3/12/2015	3105/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER entregou o relatório correspondente a essa etapa.	
12	Definir a atuação da área de ensaios	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	30/03/2017		3/12/2015	4/5/2017		100%	Concluído	A partir dos intercâmbios realizados foram demandados alguns encaminhamentos. O mais importante deles é um acordo entre as partes para implantar uma área de ensaios de energias renováveis no Nordeste que influenciará no projeto em andamento, especificamente na etapa 1.1; Em 4/5/2017 a equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório da etapa correspondente	A universidade solicitou aditivo de prazo e de recursos, que foi acatado pela equipe técnica e está aguardando parecer das demais áreas competentes. Em 28/02/2017: Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
14	Definir a configuração da área de ensaios	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	A definir		1/5/2016			50%	Em Andamento	O TED teve nova prorrogação de vigência e as datas das etapas serão repactuadas.	
15	Dimensionar a área de ensaios	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2016	A definir		1/8/2016			20%	Em Andamento		
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	A definir	A definir					0%	A iniciar		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	A definir		1/10/2016			10%	Em Andamento		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A iniciar		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1 ano)	CGDS/DPLAN	25/11/17	25/11/18					0%	A iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 277.371,58	Valor realizado:		R\$ 277.371,58	59%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
UFPE - Centro de Energias Renováveis
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
Objetivo do projeto:	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74

Previsão de Conclusão:	25/11/2018
Data Atualização:	31/08/2017

TED
Vigência: 25/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015			29/06/2015			100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015			12/11/2015			100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015			27/11/2015			100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015			02/12/2015			100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,3%	Em Andamento		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído		

10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia da visita de acompanhamento foi constatado que o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo".	
11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/3/2017		3/12/2015	18/4/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório referente a etapa	
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	20/9/2017		3/12/2015			50%	Em Andamento	A UFPE e o CSEM formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica em outubro.	
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo	
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	9/10/2017		1/1/2016			20%	Em Andamento	Devido o atraso da formalização do ACT entre UFPE e CSEM, bem como a percepção de ampliar os testes necessários para realizar o projeto em tela, a UFPE solicitou aditivo de prazo e recursos, o qual foi acatada pela equipe técnica e está aguardando o posicionamento das demais áreas competentes	Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
15	Caracterização outdoor de células e módulos	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2019	23/10/2017					20%	Em Andamento	O CER/UFPE solicitou novo aditivo de prazo, acatado pela Unidade Técnica e enviado para as demais providências junto as demais Unidades.	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	17/11/2017					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		

18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1ano)	CGDS/DPLAN	25/11/17	25/11/18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 322.110,74	Valor realizado:		R\$ 322.110,74	59%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
UFPE - Centro de Energias Renováveis												
Observações:												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto: PO	14
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.			
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.			
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015 Vigência: 31/03/2017
Data Atualização:	31/08/2017	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Carlos Almiro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		

10	Liberação da única parcela	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		
11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	<p>Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.</p>	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído		
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	--		100%	Concluído	
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		--	--		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										6,0%	Em Andamento	
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017			30%	Em Andamento	No dia 24/04/2017 chegou à CGDS/DPLAN a documentação referente à prestação de contas, contando, inclusive, com duas mídias digitais (CDs), contendo os produtos previstos nesta iniciativa. O processo de análise foi iniciado.
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	86%	Em Andamento	Status do Projeto

Encontra-se em análise a prestação de contas. Ressalta-se que neste período o processo deste TED foi requisitado por duas vezes: para um pedido de vista pelo Diretor da DPLAN; e para apreciação da Controladoria Geral da União.

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa do PPA:	Não se aplica			Eixo temático (MI):	não se aplica
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MI):	não se aplica
Objetivo da ação:	Metas Institucionais 2016-2017				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT, COIM/CGDS
Diretor:	Alexandre Gusmão			Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia, Maria Helena
Problema (causa):	Escassez/restrrição hídrica, reforçando a busca e utilização de alternativas, a exemplo da utilização de águas residuárias como medida estratégica de convivência com o semiárido				
Projeto:	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido" - Meta Institucional 2 (Evento 3).				
Objetivo do projeto:	Aprofundar as discussões regionais sobre recursos hídricos e utilização de águas residuárias.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	29/09/2017
Data Atualização:	01/09/2017



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena, Vera Lucia, José Aildo, Marcelo Viana, Marcelo Saiki, Victor Uchoa, Amauri, Isis, Renato
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Pré-evento: Planejamento do "Café com Sustentabilidade"	-		15/12/16	11/08/17		15/12/16	11/08/17		10,0%	Concluído		
1.1	Definição do tema, abrangência (público alvo), proposta de programação	-	CGDS/DPLAN	15/12/2016	30/01/2016		15/12/2016	30/01/2016		100%	Concluído		
1.2	Elaboração de Nota Técnica (NT Nº 11/2017), para apreciação e deliberação da direção (DPLAN)	-	CGDS/DPLAN	30/01/2017	16/02/2017		30/01/2017	16/02/2017		100%	Concluído		
1.3	Definição / divisão de tarefas com vistas a preparação do evento	-	CGDS/DPLAN	27/07/2017	11/08/2017		27/07/2017	11/08/2017		100%	Concluído		
2	Preparação do evento "Café"	-		02/01/17	30/08/17		02/01/17	30/08/17		10,0%	Concluído		
2.1	Contatos com convidados-palestrantes, para convite e confirmação	-	CGDS/DPLAN	02/01/2017	18/08/2017		02/01/2017	18/08/2017		100%	Concluído		
2.2	Reuniões/Solicitações ref. organização do local; material; equipamentos; alimentação/lanche	-	CGDS/DPLAN - ASCOM	12/08/2017	14/08/2017		12/08/2017	14/08/2017		100%	Concluído		
2.3	Definição/Confecção de Convite, Programação, Folder, Banner	-	CGDS/DPLAN, ASCOM, CGAF/DAD	18/08/2017	23/08/2017		18/08/2017	23/08/2017		100%	Concluído		
2.4	Divulgação	-	CGDS/DPLAN; ASCOM	23/08/2017	30/08/2017		23/08/2017	30/08/2017		100%	Concluído		

3	Realização do "Café"	-	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/09/2017	01/09/2017		01/09/2017	01/09/2017		70,0%	Concluído		
4	Pós-evento	-		02/09/17	29/09/17		02/09/17			8,0%	Em Andamento		
4.1	Consolidação da documentação - relatório, lista de presença, notícia, registro fotográfico.	-	CGDS/DPLAN	02/09/2017	29/09/2017		02/09/2017			80%	Em Andamento		
Valor Previsto:				R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	98,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
No "Café" Reúso de água, contamos com o apoio e parceria do INSA, da UFRPE, da SDA-CE e da Compesa, mediante a participação de representantes como convidados-palestrantes trazendo suas experiências/atuações no tema.
Observações:
Trata-se de mais uma edição do "Café com Sustentabilidade", um dos tres eventos previstos como Meta Institucional 2016/2017 (Meta 2), realizado no 1º de setembro de 2017, no auditório panorâmico da SUDENE, em Boa Viagem. Programação: 8h30 às 12h30, incluindo: Credenciamento/inscrição; Abertura; Palestras (4); Debate; Encerramento.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	Fortalecer a imagem da SUDENE			Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional			Ano:	2017
Programa do PPA:	Não se aplica			Eixo temático (MI):	não se aplica
Ação do PPA:	Não se aplica			Objetivo estratégico (MI):	não se aplica
Objetivo da ação:	Metas Institucionais 2016-2017				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - COIM/CGDS
Diretor:	Alexandre Gusmão			Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Maria Helena
Problema (causa):					
Projeto:	"Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido" - Evento Temático - Meta Institucional 2016/2017				
Objetivo do projeto:					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	22/09/2017



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima , Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira, Marcelo Viana, José Amauri, Isis Moreira.
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento	Reunião com o Diretor de Planjemaneto para definição do tema do evento	CGDS/DPLAN	29/08/17	08/09/17	--	29/08/17	08/09/17	--	100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota técnica	Documento necessário à aprovação do projeto contendo informações sobre a importância e motivação da proposta	CGDS/DPLAN	05/09/17	08/09/17	--	05/09/17	08/09/17	--	100%	Concluído		
3	Articulações com os convidados/palestrantes	Realização de contatos e convites para os participantes	CGDS/DPLAN	11/09/17	12/09/17	--	11/09/17	12/09/17	--	100%	Concluído		
4	Planejamento da Oficina preparatória interna	Articulação com a ASCOM e a CGGP para viabilizar a participação do Servidor Francisco Cezar da FUNASA no evento	CGDS/DPLAN	11/09/17	13/09/17	--	11/09/17	13/09/17	--	100%	Concluído		
5	Evento - Tecnologias Inovadoras para Cisternas	Realização na sala JK.	CGDS/DPLAN	14/09/17	14/09/17	--	14/09/17	14/09/17	--	100%	Concluído		
6	Debate Interno - Considerações da Sudene	Realização de uma discussão entre os seridores participantes do evento para construção das considerações sobre as Cisternas e possíveis encaminhamentos para a SUDENE	DPLAN	20/09/17	29/09/17					0%	A Iniciar		
7	Pós-Evento e Encaminhamentos	Nesta fase final é realizado o relatório técnico, articulações posteriores, registro dos encaminhamentos.	CGDS/DPLAN	29/09/17	29/09/17	--				0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	71%	Em Andamento	Status do Projeto	
--	-----------------	-----	---	------------------	-----	---	-----	--------------	-------------------	--

Parceiros institucionais:

Funasa Rio Grande do Norte

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2017
Programa do PPA:		Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:	Articular e dialogar (Reconhecer, Conhecer, Cooperar) com as intuições que atuam com a cultura da palma			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção	
Problema (causa):	Baixa interação e diálogo entre as várias instituições/atores e os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.			
Projeto:	Evento Temático / Meta Institucional (1): 1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA			
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	29/09/2017
Data Atualização:	26/09/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, José Aildo, Marcelo Viana, Marcelo Saiki, Victor Uchoa
---	--



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Planejamento e organização do evento	Definição de atividades e papéis dos técnicos da cgds	CGDS	25/08/2017	25/08/2017		25/08/2017	25/08/2017		10%	Concluído		
1.1	Elaboração da nota técnica	-	CGDS	28/08/2017	29/08/2017		28/08/2017	28/08/2017		100%	Concluído		
1.2	Aprovação da nota técnica	-	DPLAN	30/08/2017	30/08/2017		01/09/2017	01/09/2017		100%	Concluído		
2	Preparação do evento "1ª Reunião Técnica"			06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		10%	Concluído		
2.1	Contatos com convidados-palestrantes, para convite e confirmação		CGDS	06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
2.2	Reuniões/Solicitações ref. organização do local; material; equipamentos; alimentação/lanche		CGDS, ASCOM, CGAF, CGTI	06/09/2017	22/09/2017		06/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
2.3	Definição/Confecção de Convite, Programação, Folder, Banner		GABINETE, ASCOM, CGDS,	06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
2.4	Divulgação		GABINETE, ASCOM, CGDS	14/09/2017	25/09/2017		14/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
3	Realização da Reunião	-	SUDENE	26/09/2017	26/09/2017		26/09/2017	26/09/2017		70%	Concluído		
4	Pós-evento	-	CGDS	27/09/2017	29/09/2017		27/09/2017			8%	Em Andamento		

4.1	Consolidação da documentação - relatório, lista de presença, registro fotográfico, outros.	-	CGDS	27/09/2017	29/09/2017		27/09/2017			80%	Em Andamento				
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	98%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Observações:													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica			Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.				
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE				
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação para replicagem em outros estados do Nordeste.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Convênio	857.015,99	965.632,35

Previsão de Conclusão:	28/10/16
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Conveniente	Jussara Santanna Alves

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	Liquidação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 857.015,99
274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69	A realizar no exercício	R\$ -
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012	Não se aplica	28/12/2012	28/12/2012	Não se aplica	100%	Concluído		
2	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013	Não se aplica	11/01/2013	11/01/2013	Não se aplica	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013	Não se aplica	06/03/2013	08/03/2013	Não se aplica	100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014	Não se aplica	26/03/2014	29/03/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (100%)
6	Vistoria de campo	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014	Não se aplica	04/12/2014	05/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Vistoria realizada	

7	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014
8	Assinatura do Termo Aditivo	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014	Não se aplica	01/12/2014	29/12/2014	Não se aplica	100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015
9	Visita técnica	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2015	Não se aplica			Não se aplica	-	Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	A SEDETEC/SE enviou o Relatório atualizado em 29/05/2015, sendo constatado neste relatório, bem como no SINCONV, que o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2o Termo Aditivo	Assinatura do 2o Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015	Não se aplica	27/07/2015	27/07/2015	Não se aplica	100%	Concluído	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015	Não se aplica	31/10/2015		Não se aplica	-	Cancelado	Atividade cancelada para este período devido ao erro que ocorreu no SICONV, a SEDETEC não conseguiu incluir a prestação de contas no sistema (reprogramada no item 14).	A SEDETEC está entrando em contato com o serviço de atendimento ao cliente do SICONV para solucionar o problema.
12	Envio de Relatório de Execução	Envio de Relatório de Execução por e-mail	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/03/2016	11/04/2016	Não se aplica	22/03/2016	29/03/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Devido ao erro que ocorreu no SICONV, foi acordado com a SEDETEC que seria elaborado e enviado por e-mail o relatório técnico final, sem incluir as questões financeiras. Prazos repactuados.	
13	Emissão de Relatório Técnico	Emissão de Relatório Técnico sobre a prestação de contas (sem incluir o SICONV)	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	18/03/2016	04/04/2016	Não se aplica	29/03/2016	04/04/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Este Relatório técnico será para acompanhamento interno e não terá validade perante o SICONV.	Foi alterada a previsão do término do Laudo Técnico sem a prestação de contas.
14	Apresentação da prestação de contas	Apresentação da prestação de contas (após solução dos problemas)	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	04/04/2016	04/04/2016	Não se aplica	04/04/2016		Não se aplica	100%	Concluído	Foi resolvido o problema da inclusão dos dados da prestação de contas, que se tratava do cálculo dos valores de devolução por meio do SICONV que não estão de acordo com os respectivos valores de devolução previstos.	A solução se deu com o apoio da SUDENE que encaminhou ofício para o Ministério do Planejamento solicitando que fosse alterado de OBTV para o modo não OBTV de forma que possibilitasse o cálculo manual dos valores que serão devolvidos para a Conveniente e Concedente, entretanto o MPOG para solucionar o problema preferiu corrigir a funcionalidade do sistema.

15	Visita técnica	Realização de visita técnica para subsidiar o laudo técnico.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão e Marcus Paz)	23/05/2016	25/05/2016	Não se aplica	23/05/2016	25/05/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Foi alterada a previsão da viagem tendo em vista que os problemas operacionais na prestação de contas ainda persistem. A elaboração do Laudo técnico será concluída após a solução das pendências no SICONV.	Foi realizada a visita técnica às instalações do CVT de Confecções de Tobias Barreto para levantar informações que serão utilizadas para embasar a análise da prestação de contas do conveniente. (de acordo com o status do item 14)
16	Relatório sobre a visita técnica	Elaboração de Relatório sobre a visita técnica	DPLAN (Robson e Marcus)	27/05/2016	08/06/2016	Não se aplica	27/05/2016	08/06/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída para registro da visita técnica.	
17	Emissão de Laudo Técnico	Emissão de Laudo Técnico (final)	DPLAN (Albertina Pereira, Marcus Paz)	18/06/2016	29/07/2016	Não se aplica	29/08/2016	11/10/2016	Não se aplica	100%	Concluído	Esta atividade foi reprogramada tendo em vista os problemas operacionais ocorridos na prestação de contas .	Processo enviado para o setor de convênios em 02/12/2016
18	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Emissão de Laudo Técnico Financeiro	Coordenação de Gestão de Convênios	11/10/2016	19/10/16	Não se aplica	02/12/2016	06/01/2017	Não se aplica	100%	Concluído		
19	Encerramento do Convênio	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	20/10/16	28/10/16	Não se aplica	09/01/2017	09/08/2017	Não se aplica	100%	Concluído	Saldo devolvido com sucesso. Encerramento homologado em 09/08/2017 na 273ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada.	
				Valor Previsto:		857.015,99	Valor realizado:		857.015,99	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações: Processo Nº 59335.000175/12-20
Houve necessidade de reprogramar este PO, acrescentando novas etapas, tendo em vista os problemas operacionais do SICONV.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 21)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação 8902 - Promoção de Investimento em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.			
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordeste.			
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	286 e 280	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	1.025.000,00	1.025.000,00

Crôno Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberção	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 1.025.000,00
800.000,00	0,00	Fevereiro/2016	800.000,00	A realizar no exercício	
225.000,00	0,00	Julho/2016	225.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	0,00	-	1.025.000,00	Valor Empenhado no Exercício	
				Valor liberado no Exercício	
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	
				Total Liberado até o exercício	R\$ 1.025.000,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Unidade Descentralizadora	Albertina de Souza Leão Pereira
	Unidade Descentralizada	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Visita técnica	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	17/11/2015	17/11/2015	-	17/11/2015	17/11/2015	-	100%	Concluído	A visita técnica foi substituída por reuniões realizadas nas instalações da CGEP nas quais estiveram presentes técnicos da UFPE e da SUDENE.
2	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	01/12/2015	01/12/2015	-	01/12/2015	01/12/2015	-	100%	Concluído	
3	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	03/12/2015	03/12/2015	-	03/12/2015	03/12/2015	-	100%	Concluído	
4	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	11/02/2016	11/02/2016	R\$ 800.000,00	100%	Concluído	
5	Programação das visitas técnicas e de campo	Reunião para programar visitas técnicas e de campo	SUDENE E UFPE	11/03/2016	11/03/2016	-	11/03/2016	11/03/2016	-	100%	Concluído	Verificou-se a importância e necessidade de que a equipe UFPE forneça relatórios parcial (regime trimestral) das atividades desenvolvidas no projeto. Em virtude disto, foram acrescentadas novas etapas no PO (Apresentação do relatório parcial).

6	Visita técnica e elaboração de relatório	Visita técnica e elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/03/2016	11/04/2016	-	17/03/2016	21/03/2016	-	100%	Concluído	Relatório entregue pelo técnico SUDENE em 21/03/2016	
7	Apresentação do 1º relatório	Apresentação do 1º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/03/2016	18/03/2016	-	18/03/2016	23/03/2016	-	100%	Concluído	Relatório entregue pela UFPE em 23/03/2016. Ressalta-se que este relatório apresenta informações relativas ao cronograma das atividades iniciais de abertura do projeto, não sendo necessário parecer técnico sobre o assunto.	
8	Vistoria de campo	Vistoria de campo aos seis municípios do projeto	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	11/04/2016	11/10/2016	-	14/06/2016	25/08/2016	-	100%	Concluído	As atividades de mobilização e sensibilização (visitas de campo iniciais) foram prejudicadas pela ausência de recursos financeiros (carro, motorista, combustível) que seriam disponibilizados pela UFPE.	A UFPE realizou visita ao município de Picos em 31/10/2016, sem acompanhamento da SUDENE em virtude de inviabilidade de agenda e orçamentária. Pelos motivos citados acima, também foram cancelada a participação da SUDENE nas demais visitas de campo.
8.1	Reunião de Abertura - Caruaru	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Cláudia Sampaio)	14/06/2016	12/08/2016	-	14/06/2016	14/06/2016	-	100%	Concluído	Foi realizada reunião de abertura (acompanhada pela servidora Ludmilla Calado) em 14/06, ficando pendente a coleta de materiais. Relatório técnico da Reunião de Abertura concluído em 07/07/2016	
8.2	Coleta de Material - Caruaru	Acompanhamento de visita de campo - Coleta de Material - Caruaru	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Cláudia Sampaio)	10/06/2016	10/06/2016	-	21/07/2016	21/07/2016	-	100%	Concluído		
8.3	Implementação de Ações Tecno Gerencial - Brejo da Madre de Deus	Acompanhamento de visita de campo - Implementação de Ações Tecno Gerencial - Brejo da Madre de Deus	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Cláudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	-	28/07/2016	28/07/2016	-	100%	Concluído		
8.4	Reunião de Abertura - Esperança/Campina Grande	Acompanhamento de visita de campo - Reunião de Abertura - Esperança/Campina Grande	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e UFPE (Cláudia Sampaio)	26/08/2016	26/08/2016	-	25/08/2016	25/08/2016	-	100%	Concluído	Visita realizada pelo técnico Miguel Araujo.	
9	Visita técnica	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	14/05/2016	-	14/05/2016	14/05/2016	-	100%	Concluído	Visita realizada pela Coordenadora Albertina em 14/05/16.	
10	Elaboração de relatório	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	14/05/2016	23/05/2016	-	16/05/2016	06/06/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica..	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	11/05/2016	11/06/2016	R\$ 225.000,00	20/05/2016	05/07/2016	R\$ 225.000,00	100%	Concluído	Os documentos comprobatórios estão em análise.	Repasse financeiro (PF Nº 2016PF000044)
12	Apresentação do 2º relatório	Apresentação do 2º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/06/2016	18/06/2016	-	27/05/2016	27/05/2016	-	100%	Concluído		

13	Visita técnica	Visita técnica	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel) e Técnico em Química	11/06/2016	11/07/2016	-	05/09/2016	05/09/2016	-	100%	Concluído	A visita foi realizada pela Coordenadora Albertina e a técnica Gabriela Isabel.	
13.1	Elaboração de relatório	Elaboração de relatório	DPLAN (Albertina Pereira, Gabriela Isabel)	08/09/2016	08/09/2016	-	03/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído	Esta atividade foi incluída, para registro das observações relativas à visita técnica (realizada com atraso, tendo em vista que aguardávamos relatório da UFPE).	
14	Apresentação do 3º relatório	Apresentação do 3º relatório parcial	UFPE (Cláudia Sampaio)	14/09/2016	18/09/2016	-	15/09/2016	15/09/2016	-	100%	Concluído		
15	Apresentação de relatório final	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	01/12/2016	30/01/2017	-	26/01/2017	26/01/2017	-	100%	Concluído		
16	Emissão de laudo/parecer final	Emissão de laudo/parecer final	DPLAN (Miguel, com apoio de Albertina Pereira e Gabriela Isabel)	30/01/2017	30/04/2017	-	01/03/2017	18/08/2017	-	100%	Concluído	Visita técnica realizada em 07/06/2017. Processo enviado para encerramento pelo Setor de Convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 1.025.000,00	Valor realizado:		R\$ 1.025.000,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações: Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.												

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo e		
Finalidade da ação:	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidades responsáveis:	CGEP e CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestores das subunidades:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Carlos Almiro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.				
Projeto:	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Previsão de Conclusão:	26/02/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Marcus Vinicius e Miguel Vieira - CGEP/DPLAN ; Caio de Assis e Renato Vaz (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		100%	Concluído		
2	Envio da proposta	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3	Parecer técnico	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído		
4	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
7	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído		

		EXECUÇÃO (Peso 60%)								38,1%	Em Andamento		
9	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SU DENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1: Levantamento etnobotânico	Meta 1: Levantamento etnobotânico	UFPE	10/12/2015	02/07/2017	R\$ 76.800,00	18/01/2016		R\$ 76.800,00	75%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016		10/03/2016	10/03/2016		100%	Concluído		
10.2	Visita técnica	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio.	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	23/05/2016	10/11/2016		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Foi encaminhado o Ofício ao reitor da UFPE cobrando providências para complementação do relatório.
10.4	Relatório de conclusão da Meta 1	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	02/07/2017		10/10/2016			50%	Atrasado		
11	Meta 2: Banco de dados de e sequenciamento de genes de interesse	Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico	UFPE	10/12/2015	02/07/2017	R\$ 138.000,00	18/01/2016		R\$ 138.000,00	66,7%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
11.1	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016		05/09/2016	06/09/2016		100%	Concluído		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016.
11.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	13/06/2016	10/11/2016		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	
11.3	Relatório de conclusão da Meta 2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	02/07/2016		10/10/2016			50%	Atrasado		
12	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	UFPE	10/12/2015	02/07/2017	R\$ 373.400,00	18/01/2016		R\$ 373.400,00	66,7%	Atrasado	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016		08/11/2016	09/11/2016		100%	Concluído		
12.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	12/09/2016	10/11/2016		10/10/2016			50%	Atrasado	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	A unidade descentralizada solicitou prorrogação da vigência do TED por 90 dias. O parecer técnico CGDS/DPLAN foi favorável e enviado ao setor de convênios, portanto as datas serão repactuadas.
12.3	Relatório de conclusão da Meta 3	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	02/07/2016		10/10/2016			50%	Atrasado		
13	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	UFPE	13/03/2017	24/10/2017	R\$ 160.800,00			Não se aplica	33,3%	Em Andamento	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
13.1	Visita técnica	Visita técnica (oficinas devolutivas)		13/03/2017	17/03/2017		13/03/2017	15/03/2017		100%	Concluído		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	20/03/2017	24/10/2017		20/03/2017			0%	Em Andamento		

14	Apresentação de relatório final	Apresentação de relatório final	UFPE	27/10/2017	27/11/2017					0%	A Iniciar		A unidade descentralizada solicitou, em 01/02/2017, nova prorrogação da vigência do TED por 30 dias, a partir de 01 de março, que está sendo analisada pelo setor técnico da CGDS/DPLAN.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	28/11/2017	26/02/2018					0%	A Iniciar	Foi agendada uma reunião para o dia 22/09/2017 para apresentação do Relatório Final e da Cartilha na SUDENE.	
				Valor Previsto:		R\$ 749.000,00		Valor realizado:		R\$ 749.000,00	58,1%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Fase preparatória interna para projeto de Regionalização da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações de forma que permita um recorte regional e uma visão voltada para a identificação de desigualdades inter-regionais e intrarregionais.				
Projeto:	Produto 1 - Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
Objetivo do projeto:	Realizar um estudo preliminar da Política de Dados Abertos do Governo Federal, a fim de subsidiar o projeto posterior de pesquisa da melhor solução para sistematizar informações de modo a subsidiar os processos de formulação, monitoramento e avaliação de planos e programas que promovam o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	31/08/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Joyce Queiroz e Silva
---	-----------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal	Joyce Queiroz e Silva	08/11/16	31/08/17	-	08/11/16		-	66%	Em Andamento		
1.1	Estudo através dos Cursos oferecidos pela ENAP Virtual	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal através dos Cursos oferecidos pela ENAP Virtual	Joyce Queiroz e Silva	08/11/16	28/11/16	-	08/11/16	28/11/16	-	100%	Concluído		
1.2	Reunião com o Cin para analisar viabilidade de proposta de parceria	Reunião de articulação com o Cin para analisar viabilidade de proposta de parceria	Joyce Queiroz e Silva/Albertina Pereira	17/11/16	17/11/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		
1.3	Apresentação interna dos resultados	Apresentação interna dos resultados das etapas anteriores	Joyce Queiroz e Silva	29/11/16	16/12/16	-	07/12/16	07/12/16	-	100%	Concluído	A professora Bernadette Lóscio, do Centro de Informática da UFPE, foi convidada para apresentar a Política de Dados Abertos do Governo Federal e um diagnóstico preliminar das publicações da SUDENE. Esta apresentação foi realizada no dia 07/12/2016	

1.4	Planejamento para apresentação do tema	Planejamento para apresentação do tema, aberta para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	02/01/17	31/01/17	-	02/01/17	-	95%	Atrasado	Será realizada apresentação com técnico da Sudene prevista para julho de 2017. As datas foram repactuadas visto a necessidade de infraestrutura adequada para apresentar a todos os servidores.			
1.5	Apresentação do tema aberta para a SUDENE	Apresentação do tema aberto para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	01/07/17	31/07/17	-		-	0%		Atrasado			
1.6	Entrega do Relatório da Apresentação	Entrega do Relatório da Apresentação para chefia imediata	Joyce Queiroz e Silva	01/08/17	31/08/17	-		-	0%		Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	66%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:														
Observações: Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.														
1.1 - Os cursos oferecidos pela ENAP sobre o tema foram Turma 1/2016 - Elaboração de Plano de Dados Abertos e Turma 4/2016 - Introdução à Interoperabilidade														

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE				
Objetivo do projeto:	Subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) através da elaboração de mapas				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	03/02/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado
---	-----------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Levantamento dos requisitos para construção dos mapas	Produto 1 - Levantamento dos requisitos para construção dos mapas	Ludmilla Calado	31/10/16	09/12/16	-	23/10/16	12/11/16	-	100%	Concluído		
1.1	Definição das temáticas utilizadas nos mapas	Definição das temáticas utilizadas nos mapas	Robson Brandao / Ludmilla Calado	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
1.2	Articulação com órgãos responsáveis para aquisição de arquivos cartográficos digitais	Articulação com orgaos responsáveis pela infraestrutura da Ferrovia Transnordestina e da Transposição do São Francisco para aquisição de arquivos cartográficos digitais	Ludmilla Calado	07/11/16	25/11/16	-	07/11/16	25/11/16	-	100%	Concluído		
1.3	Armazenamento dos dados	Armazenamento dos dados na base de geoinformação	Ludmilla Calado	28/11/16	02/12/16	-	28/11/16	02/12/16	-	100%	Concluído	As informações foram incluídas no disco específico para armazenar os dados georreferenciados	
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Robson Brandao / Ludmilla Calado	05/12/16	09/12/16	-	05/12/16	14/11/17	-	100%	Concluído	Obs: data da validação pela Coordenação.	Reagendar para o mês de janeiro
2	Produto 2 - Estruturação dos mapas	Produto 2 - Estruturação dos mapas	Ludmilla Calado	12/12/16	20/01/17	-	12/12/16	13/03/17	-	100%	Concluído		

2.1	Definição do layout e dimensões e normativas vigentes para elaboração dos mapas	Definição do layout e dimensões e normativas vigentes para elaboração dos mapas	Robson Brandao / Ludmilla Calado	12/12/16	21/12/16	-	12/12/16	21/12/16	-	100%	Concluído		ver se existe um produto desta atividade	
2.2	Elaboração do mapa	Elaboração do mapa, utilizando a base de geoinformação	Ludmilla Calado	22/12/16	07/01/17	-	21/12/16	08/03/17	-	100%	Concluído			
2.3	Verificação das nomenclaturas, símbolos e padronagens	Verificação das nomenclaturas, símbolos e padronagens	Ludmilla Calado	09/11/17	20/01/17	-	09/03/17	13/03/17	-	100%	Concluído			
3	Produto 3 - Validação dos mapas	Produto 3 - Validação dos mapas	Ludmilla Calado	23/01/17	03/02/17	-	13/03/17	06/07/17	-	100%	Concluído			
3.1	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Robson Brandao / Ludmilla Calado	23/01/17	27/01/17	-	13/03/17	16/03/17	-	100%	Concluído			
3.2	Disponibilização dos mapas em formato digital	Disponibilização dos mapas em formato digital	Ludmilla Calado	30/01/17	03/02/17	-	16/03/17	06/07/17	-	100%	Concluído	Tendo em vista o interesse da superintendência, definiu-se que seria providenciada a impressão de 700 exemplares para distribuição, com recursos orçamentários da Diretoria de Administração, concluída.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros Institucionais:													
Observações: Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.													
Os estagiários Manuella Lima e Antônio Henrique estão participando da execução das etapas deste PO.													
Escopo: Elaboração dos mapas político-administrativo e de infraestrutura (transposição do rio são francisco e ferrovia transnordestina) da área de atuação da sudene, no formato A1, disponibilizados apenas em meio digital (pdf ou png) para publicação interna na Sudene.													
Não-escopo: Não será contemplado neste Projeto a elaboração de análises dos mapas nem a confecção de outros mapas, salvo os citados no escopo. Este PO será concluído com a publicação digital, sem a realização da impressão dos mapas.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo III - redução das taxas de mortalidade materno-infantil, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	16/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
---	-------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Tássia	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Tássia	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Tássia	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Tássia	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Tássia	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Tássia	17/10/16	31/10/16	-	17/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Tássia	17/10/16	25/10/16	-	17/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Tássia	25/10/16	31/10/16	-	25/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de saúde materno infantil	Produto 3 - Boletim de saúde materno infantil	Tássia	01/11/16	16/12/16	-	01/11/16		-	83%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Tássia	01/11/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		

3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Tássia	11/11/16	18/11/16	-	11/11/16	18/11/16	-	100%	Concluído			
3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	21/11/16	25/11/16	-	21/11/16	25/11/16	-	100%	Concluído			
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Tássia	28/11/16	01/12/16	-	06/12/16	09/12/16	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/16	09/12/16	-	10/06/17	28/08/17	-	100%	Concluído	Marca finalizada em 16/12/2016.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/16	16/12/16	-			-	0%	Atrasado	Justificativa para atraso: 1-confecção da marca e 2-layout para padronização dos boletins e elaboração do briefing para publicação.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	94%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações: Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 24 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo IX - garantia de implantação de projetos para o desenvolvimento tecnológico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Miguel Vieira/Lautemyr Canel
---	------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Miguel Vieira	03/10/16	28/10/16	-	03/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Miguel Vieira	03/10/16	07/10/16	-	03/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Miguel Vieira	10/10/16	14/10/16	-	10/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados	Miguel Vieira	17/10/16	21/10/16	-	17/10/16	21/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Lautemyr Canel	24/10/16	28/10/16	-	24/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Miguel Vieira	31/10/16	18/11/16	-	31/10/16	18/11/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Miguel Vieira	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
2.2	Tabulação da base de dados	Tabulação dos dados	Miguel Vieira	07/11/16	11/11/16	-	07/11/16	11/11/16	-	100%	Concluído		
2.3	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Lautemyr Canel	14/11/16	18/11/16	-	14/11/16	18/11/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3- Boletim de C&TI	Produto 3- Boletim de C&TI	Miguel Vieira	21/11/16	30/12/16	-	21/11/16	04/07/17	-	100%	Concluído		

3.1	Análise dos dados	Análise dos dados	Miguel Vieira	21/11/16	02/12/16	-	21/11/16	21/11/16	-	100%	Concluído			
3.2	Redação do texto	Redação do texto	Miguel Vieira	05/12/16	09/12/16	-	21/11/16	22/11/16	-	100%	Concluído			
3.3	Validação final	Validação final (ajustes)	Lautemyr/Fred	12/12/16	16/12/16	-	22/11/16	25/11/16	-	100%	Concluído			
3.4	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	19/12/16	23/12/16	-	10/05/17	30/06/17	-	100%	Concluído			
3.5	Publicação do Boletim no sítio	Publicação do Boletim no sítio	ASCOM	26/12/16	30/12/16	-	01/07/17	04/07/17	-	100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. Aguardando solução de diagramação e de publicação.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 25 (ex PO 31)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores sobre saneamento básico, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI - universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	16/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
---	-------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Marina / Robson	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Marina / Robson	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Marina / Robson	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Marina / Robson	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Marina / Robson	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Marina	17/10/16	31/10/16	-	17/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Marina	17/10/16	25/10/16	-	17/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Marina	25/10/16	31/10/16	-	25/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de saneamento	Produto 3 - Boletim de saneamento	Marina	01/11/16	16/12/16	-	01/11/16		-	65%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Marina	01/11/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		

3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Marina	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído			
3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	25/01/17	-	100%	Concluído			
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Marina	28/11/16	01/12/16	-	25/01/17		-	90%	Atrasado	Previsão de conclusão: 04/09/2017		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/16	09/12/16	-			-	0%	Atrasado			
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/16	16/12/16	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	88%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2016

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 26 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
---	--------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/16	28/10/16	-	17/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/16	21/10/16	-	17/10/16	21/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/16	28/10/16	-	24/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de PIB e PIB per capita	Produto 3 - Boletim de PIB e PIB per capita	José Luiz	31/10/16	16/12/16	-	31/10/16	17/08/17	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/16	01/12/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		

3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/16	09/12/16	-	29/03/17	17/08/17	-	100%	Concluído	Marca finalizada em 16/12/2016.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/16	22/12/16	-	17/08/17	17/08/17	-	100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste no período 2000-2010, considerando que este tema se correlaciona fortemente com os objetivo do PRDNE, estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira
---	---------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Maria do Carmo	03/10/16	17/10/16	-	03/10/16	17/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Maria do Carmo	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Maria do Carmo	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Maria do Carmo	10/10/16	14/10/16	-	10/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Maria do Carmo	17/10/16	17/10/16	-	17/10/16	17/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Maria do Carmo	18/10/16	22/11/16	-	18/10/16	17/01/17	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Maria do Carmo	18/10/16	31/10/16	-	18/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Maria do Carmo	01/11/16	22/11/16	-	05/12/16	17/01/17	-	100%	Concluído	Foram identificados outros subsídios/informações para ampliação da análise, por este motivo, os prazos anteriormente planejados foram repactuados.	

3	Produto 3 - Boletim de Migração	Produto 3 - Boletim de Migração	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	25/09/17	25/09/17	-	21/08/17		-	20%	Em Andamento	Mudança da equipe		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	21/08/17	11/09/17	-	21/08/17		-	60%	Em Andamento			
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	21/08/17	11/09/17	-	21/08/17		-	60%	Em Andamento			
3.3	Validação final	Validação final	Albertina/ Fred	12/09/17	13/09/17	-			-	0%	A Iniciar			
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Albertina/Estagiário	14/09/17	15/09/17	-			-	0%	A Iniciar			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	15/09/17	22/09/17	-			-	0%	A Iniciar			
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	25/09/17	25/09/17	-			-	0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	73%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações: Meta Institucional													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Emprego	Produto 3 - Boletim de Emprego	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016		-	68%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		

3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/2016	09/12/2016	-	21/03/2017		-	10%	Atrasado	Briefing concluído. Foi dado prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/2016	22/12/2016	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	89%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 29 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Rendimento	Produto 3 - Boletim de Rendimento	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016		-	68%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído		

3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCON	02/12/2016	09/12/2016	-	20/03/2017		-	10%	Atrasado	Briefing concluído. Foi dado prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	89%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
*Boletim relativo ao PIB e PIB per capta da área de atuação da SUDENE.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:		1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		PO 30 (ex PO 36)	
Objetivo estratégico:		1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		Ano:		2016	
Programa do PPA:		2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial		Eixo temático (MI):		Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:		20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		Objetivo estratégico (MI):		Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País	
Finalidade da ação:		Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.					
Diretoria responsável:		DPLAN		Subunidade responsável:		Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:		Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		Gestor da subunidade:		Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):		Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido					
Projeto:		Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007					
Objetivo do projeto:		Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	23/02/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira/Gabriela Isabel
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Gabriela Isabel	16/11/2016	30/11/2016	-	16/11/2016	28/11/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Gabriela Isabel	16/11/2016	21/11/2016	-	16/11/2016	21/11/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Gabriela Isabel	21/11/2016	22/11/2016	-	21/11/2016	22/11/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Gabriela Isabel	22/11/2016	25/11/2016	-	22/11/2016	25/11/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Gabriela Isabel	25/11/2016	30/11/2016	-	25/11/2016	28/11/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Gabriela Isabel	01/12/2016	15/12/2016	-	29/11/2016	14/12/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Gabriela Isabel	01/12/2016	08/12/2016	-	29/11/2016	07/12/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Gabriela Isabel	08/12/2017	15/12/2016	-	07/12/2016	14/12/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim sobre Universalização da Educação Básica	Produto 3 - Boletim sobre Universalização da Educação Básica	Gabriela Isabel	01/11/2016	23/02/2016	-	14/12/2016		-	83%	Atrasado		

3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Gabriela Isabel	16/12/2016	21/01/2017	-	14/12/2016	19/01/2017	-	100%	Concluído	Servidora de férias no período 26/12/2016 a 13/01/2017.		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Gabriela Isabel	21/01/2017	25/01/2017	-	19/01/2017	09/02/2017	-	100%	Concluído			
3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	25/01/2017	02/02/2017	-	09/02/2017	18/04/2017	-	100%	Concluído	Enviado para validação da Coordenação em 09/02/2017.		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Gabriela Isabel	02/02/2017	09/02/2017	-	18/04/2017	16/05/2017	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	09/02/2017	16/02/2017	-	10/08/2017		-	95%	Atrasado	Diagramação do boletim em validação.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	16/02/2017	23/02/2017	-			-	0%	Atrasado			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	94%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO 31 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	
Finalidade da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	O Estado e seu conjunto de municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.			
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de Desenvolvimento. Políticas Regionais -MI			
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômicosocial e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Campina Gran			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-		-	-	-

Previsão de Conclusão:	28/03/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
0,00	0,00		0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
0,00	0,00	-	0,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUNDE	Lautemyr Canel/José Farias Gomes Filho
	Unidade Descentralizada	Não se aplica

	Nome da Etapa	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Articulação com o MI para elaboração do PED _ Alagoas	Articulação com o MI para elaboração do PED _ Alagoas	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	08/05/2015	08/05/2015	-	08/05/2015	08/05/2015	-	100%	Concluído	Articulação para elaboração dos Plano Estratégico do Estado de Alagoas	
2	Reunião com a SEDETUR - Governo de Alagoas	Reunião em Maceió com a SEDETUR - Governo de Alagoas	Diretor, Coordenador Geral e as Técnicas Marina e Tássia	08/08/2015	08/08/2015	-	08/08/2015	08/08/2015	-	100%	Concluído		
3	Parceria do MI com o IICA	Parceria do MI com o IICA (Projeto de Cooperação Técnica denominado PCT/BRA/IICA/09/003)	MI e IICA	21/12/2015	21/12/2015	-	21/12/2015	21/12/2015	-	100%	Concluído		
4	Reunião com o MI para alinhamento	Reunião com o MI para alinhamento do PED _Alagoas	MI e IICA	24/12/2015	24/12/2015	-	24/12/2015	24/12/2015	-	100%	Concluído		
5	Licitação para contratação consultoria para elaboração do Plano	Licitação para contratação pelo IICA de empresa de consultoria para elaboração do Plano	MI	26/02/2016	26/02/2016	-	26/02/2016	26/02/2016	-	100%	Concluído		
6	Enviado ofício para o IICA atendendo a dilação do cronograma	Enviado ofício para o IICA atendendo a dilação do cronograma de execução.	MI e IICA	21/03/2016	21/03/2016	-	21/03/2016	21/03/2016	-	100%	Concluído		
7	Publicação de novo edital para licitação	Publicação de novo edital para licitação de contratação de empresa para elaboração do PED _Alagoas.	MI	18/04/2016	18/04/2016	-	18/04/2016	03/05/2016	-	100%	Concluído		
8	Produto 1: Elaboração e validação do Plano de Trabalho	Produto 1: Elaboração e validação do Plano de Trabalho	MI	26/09/2016	29/09/2016	-	29/09/2016	29/09/2016	-	100%	Concluído	Reunião na sede do MI, em Brasília	

9	Produto 2 (a): Diagnóstico Situacional Participativo	Produto 2 (a): Diagnóstico Situacional Participativo (Construção paricipativa com base no MAPA DE ATORES)	MI	22/11/2016	29/11/2016	-	22/11/2016	29/11/2016	-	100%	Concluído	Oficinas nas cidades pólo de Penedo, Arapiraca, Maragogi e Demiro Golveia. Participação da SUDENE em Arapiraca e Maragogi (23 e 24/11/2016)	
10	Produto 2 (b): Diagnóstico Situacional Participativo Setorial	Produto 2 (b): Diagnóstico Situacional Participativo Setorial (Construção paricipativa com base no MAPA DE ATORES)	MI	06/12/2016	16/12/2016	-	01/12/2016	30/12/2016	-	100%	Concluído	Realizadas Oficinas temáticas setoriais na Cidade de Maceió - AL (Turismo, Agroindústria e Comércio). Participação da Sudene na Oficina de Agroindústria.	
11	Produto 3: Diretrizes Estratégicas	Produto 3: Diretrizes Estratégicas	MI	19/12/2016	20/12/2016	-	01/12/2016	01/03/2017	-	100%	Concluído	Obs: Videoconferência prevista para 07/03/2017 entre SUDENE/MI/IABS/SEDETUR-GOV AL	
12	Produto 4: a) Avaliação da proposta preliminar do Plano	Produto 4: a) Avaliação da proposta preliminar do Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Alagoas	MI	10/02/2017	10/02/2017	-	01/03/2017	30/05/2017	-	100%	Concluído		
13	Produto 4: b) Seminário de validação da proposta preliminar do Plano	Produto 4: b) Seminário de validação da proposta preliminar do Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Alagoas	MI	17/02/2017	17/02/2017	-	16/03/2017	16/03/2017	-	100%	Concluído	Participação do técnico José Farias na validação do Plano - 16/03/2017	
14	Publicação final do PDE Alagoas	Publicação final do PDE Alagoas	MI	15/03/2017	15/03/2017	-	25/05/2017	30/06/2017	-	100%	Concluído	Impresso em processo regido pelo MI	
15	Nota Técnica Interna de Acompanhamento SUDENE	Nota Técnica de acompanhamento SUDENE envolvendo todas as etapas do processo.	DPLAN (Lautemyr Canel e Marcus Vinicius)	24/03/2017	24/03/2017	-			-	-	Cancelado	Considerando que este produto é de responsabilidade financeira/orçamentária do MI, não há necessidade de emissão de Nota Técnica pela SUDENE. Entretanto, atestamos a execução adequada do Plano, sendo finalizada apenas com a impressão e entrega dos volumes.	
16	Nota Técnica Interna de Acompanhamento REVISADA SUDENE	NT acompanhamento SUDENE REVISADO.	DPLAN (Lautemyr Canel e Marcus Vinicius)	27/03/2017	28/03/2017	-			-	-	Cancelado	Considerando que este produto é de responsabilidade financeira/orçamentária do MI, não há necessidade de emissão de Nota Técnica pela SUDENE. Entretanto, atestamos a execução adequada do Plano, sendo finalizada apenas com a impressão e entrega dos volumes.	
				Valor Previsto:		R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Observações:

1. Plano de Desenvolvimento do Estado de Alagoas, custeado por intermédio da Agência IICA e Ministério do Integração Nacioanal. Por parte da SUDENE, com base na Minuta de Cooperação MI, SUDENE, Estado de Algoas (a ser assinada), a participação se dará em apoio às Reuniões e Oficinas no território.
2. O custo a ser arcado pela SUDENE será em passagens, combustível e diárias para o técnico que acompanha o Projeto e Motorista Oficial da SUDENE ou terceirizado.

3. esta previsto o último seminário de validação (oficina) com todas as propostas já prevista e possíveis sugestões no dia 16/03/2017, na cidade de Maceió-Alagoas.

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 32 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007		
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	14/10/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Quadro com metadados dos indicadores	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/16	28/10/16	-	17/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/16	21/10/16	-	17/10/16	21/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/16	28/10/16	-	24/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Rendimento	Produto 3 - Boletim de Rendimento	José Luiz	31/10/16	14/10/17	-	01/11/16		-	67%	Em Andamento		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/16	01/12/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		

3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/10/17	13/10/17	-			-	0%	A Iniciar	Foi recomendado pela coordenação CGEP que o produto fosse reestruturado no formato de textos para discussão. Por isso os prazos foram repactuados.	
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	14/10/17	14/10/17	-			-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	89%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

*Boletim relativo à compreensão das diferenças regionais.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos			Número do Projeto:	PO 33 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido			Ano:	2013
Programa do PPA:	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO			Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	-
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social				
Projeto:	Programa Água para Todos				
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Previsão de Conclusão:	01/05/2017
Data Atualização:	04/09/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 17.238.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Celebração do Termo de Cooperação	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/13	26/09/13		01/09/13	02/09/13		100%	Concluído	
2	Celebração do Termo de Compromisso	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/13	02/10/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído	
3	Abertura e Ingresso dos Processos	Abertura e Ingresso dos Processos	GTAPT	01/09/13	09/09/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído	
4	Recebimento de documentação - 1ª Parcela	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/13	23/12/13		01/10/13	01/10/13		100%	Concluído	
5	Análise de documentação - 1ª Parcela	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/14	30/01/14		01/11/13	01/12/13		100%	Concluído	
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 1ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/14	30/05/14		01/04/14	01/05/14		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.
7	Empenho da 1ª Parcela	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14		02/04/14	02/05/14		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram sucesso para empenho. Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da 1ª Parcela	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14	R\$ 8.658.000,00	01/04/14	01/05/14	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba. Um município do estado do Piauí foi empenhado, mas não se habilitou para o recebimento da primeira parcela.

9	Recebimento de documentação - 2ª parcela	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/15	31/07/15		01/03/15	31/07/15		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas as solicitações de Ofícios.	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.
10	Análise dos Projetos Básicos	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15			100%	Concluído	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT nº 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP nº 01/2016.
11	Análise do Trabalho Social	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	27/05/16		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas - 1ª Parcela	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	01/02/16		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 2ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/15	03/12/15		01/12/15	02/12/15		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho da 2ª Parcela	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/15	04/12/15		03/12/15	03/12/15		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito. A SUDENE rescindiu 61 TC's.
15	Liberação da 2ª Parcela	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/15	01/05/16	R\$ 34.632.000,00	01/12/15		R\$ 9.360.000,00	60%	Atrasado	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje com os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE, a Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento.	A SUDENE continua com 17 municípios em Restos a Pagar. Infelizmente, a SUDENE não tem prioridade de gestão para com o Programa Água Para Todos. Logo, o quantitativo de recursos humanos alocados na Comissão de Força Tarefa é insuficiente para toda a demanda de trabalho. O que gerou atraso e poderá ocorrer a não liberação da segunda parcela aos entes beneficiários. Tal situação já foi relatada em relatório gerencial de 2015 e atualmente no relatório de 2017.
16	Execução das Obras	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/16	30/09/17		01/02/16			70%	Atrasado	Os municípios que receberam recursos de forma integral (30 municipalidades), em média possuem 70% das obras executadas. Estes municípios tiveram seus TC's prorrogados.	

17	Fiscalização das obras	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/15	30/05/17		10/12/15			64%	Atrasado	A Comissão fiscalizou as obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Porém resta a SUDENE fiscalizar 36% dos recursos financeiros liberados na primeira parcela, e voltar a fiscalizar aqueles que ainda não haviam licitado. Logo, a SUDENE deve fiscalizar um montante de R\$2.262.000,00 em aproximadamente 29 municípios, liberados ainda em 2013. Não há engenheiros suficientes que possa fiscalizar com eficiência todas as municipalidades que receberam recursos financeiros da Autarquia, principalmente o recurso financeiro descentralizado as municipalidades para a primeira parcela ainda no ano de 2013 e 2014.	Existem dezoito municípios, que possuem compromisso vigente e receberam a primeira parcela estão também empenhados, faltando fiscalização da 1ª parcela. A Comissão de Força Tarefa, através do Memorando nº 0050/2016-FT_PAPT/NE informou ao Gabinete da SUDENE e a Diretoria de Planejamento. Acompanhou este menorando os dez roteiros de fiscalização necessários para a ação nas municipalidades que possuem seu compromisso vigente com a Autarquia, ou seja, apenas 47 municípios. Infelizmente, não há previsão para a fiscalização dos recursos liberados em 2013 e 2014, nas outras 64 municipalidades, devido a falta de prioridade de gestão da SUDENE para com o Programa Água Para Todos.
18	Recebimento de documentação - Final	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	31/03/17	01/05/18		01/03/17			10%	Em Andamento	A SUDENE efetuou a liberação total dos recursos financeiros para 30 municipalidades. Destas recebeu-se atualmente 5 prestações de contas final para análise.	
19	Análise da Prestação de Contas final	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		01/03/17			3%	Em Andamento		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		03/04/17			10%	Em Andamento	A Comissão fiscalizou 10% das obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Com a finalidade para o recebimento de objeto.	
21	Encerramento do PAPT	Encerramento do PAPT	FTAPT	30/07/17	01/05/18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 43.290.000,00	Valor realizado:		R\$ 17.238.000,00	77%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretária de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progrmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progrmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.													
Observações:													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	34 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).					
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA					
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
---	--------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	

9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

Parcelos institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eiseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto

Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto

Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).

Obs.15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.

Obs.15: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	35 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)					
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	29/06/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

29/06/2017

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.838.252.335,00
A realizar no exercício	R\$ 120.747.665,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 120.747.665,00
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.959.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído		
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído		
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído		
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído		
14	Liberação 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído		
15	Liberação 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	
16	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	Concluído		
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, este encontra-se em análise na SUDENE.	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:		R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5:	O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)					
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeétrica - 290 MW - Candeias/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão:	01/03/2010
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		

Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado, este foi analisado pela SUDENE que encontrou pendências e solicitou a correção.
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.728.156,00	Valor realizado:		61.728.156,00	85,71%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs:1	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO	37 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):							
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR						
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	30/11/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 11.099.063,37
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/2017	31/05/2017	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/05/17	31/05/17	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	50%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Atrasado		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.											
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.											
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.											
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.											
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.											
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está pro											
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.											
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	38 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto			
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------	--	--	--

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO	39 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):							
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A						
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	13/08/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(e)l(s) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	54.900.000,00	Valor realizado:	54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	40 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 63.942.862,59

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	496.137,41	10/03/17	-		75,00%	Atrasado	A SUDENE aprovou a liberação. Aguardando a disponibilização financeira dos recursos pelo MI/STN.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)				15/05/13	31/03/17	64.439.000,00		15/05/13	-	63.942.862,59	92%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco											96%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar				
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar				
Encerramento (Banco)				Não informado	Não informado	0,00		-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:		64.439.000,00		Valor realizado:		63.942.862,59		77,50%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:														
Observações:														
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.														
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.														
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.														
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.														
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.														
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.														

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísca II Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.435.321,28

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	428.678,72	10/03/17	-		75,00%	Atrasado	A SUDENE aprovou a liberação. Aguardando a disponibilização financeira dos recursos pelo MI/STN.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	59.864.000,00	15/05/13	-	59.435.321,28	92%	Atrasado		

Competência da SUDENE /Banco									96%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.435.321,28	77,50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº												
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísia III Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.848.909,88
A realizar no exercício	R\$ 429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.848.909,88

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	429.090,12	10/03/17	-		75,00%	Atrasado	A SUDENE aprovou a liberação. Aguardando a disponibilização financeira dos recursos pelo MI/STN.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/03/17	55.278.000,00	15/05/13	-	54.848.909,88	92%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									96%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.278.000,00	Valor realizado:		54.848.909,88	77,50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	43 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25.2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	1.056.552,40	10/03/17	-		75,00%	Atrasado	A SUDENE aprovou a liberação. Aguardando a disponibilização financeira dos recursos pelo MI/STN.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		15/05/13	31/03/17	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	92%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco								96%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		54.216.447,60	77,50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Plano de Ação 2017				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	44 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA			
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27.3 MW - Trairi/CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	11/03/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.455.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.455.000,00	Valor realizado:		64.455.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	45 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	02/08/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

Responsável(é)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão:	15/08/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		

Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)		-	-	0,00				0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto: 50.000.000,00			Valor realizado: 50.000.000,00			80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

PLANO DE AÇÃO 2017						
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	47 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	12/02/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J.Emerson/ A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		

Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	48 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Previsão de Conclusão:	01/06/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		40.845.410,40	Valor realizado:		40.845.410,40	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	49 (ex PO 57)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	20/05/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado mas durante a análise a SUDENE detectou pendências e solicitou a sua correção. Novo certificado foi emitido e novamente foram encontradas pendências e foi solicitada a retificação.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	29.040.000,00	95,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	50 (ex PO 58)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	20/05/2015
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/02/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado mas durante a análise a SUDENE detectou pendências e solicitou a sua correção. Novo certificado foi emitido e novamente foram encontradas pendências e foi solicitada a retificação.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		53.959.000,00	Valor realizado:		53.959.000,00	95,00%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	51 (ex PO 59)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00

Previsão de Conclusão:	28/02/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Claudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	-	-	-	-		Cancelado	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco								100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:		96.407.194,96	Valor realizado:		96.407.194,96	77,78%	Em Andamento	Status do Projeto		
----------------------------	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	--------------	-------------------	--	--

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.												
Obs6: A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projetou passou a ser de R\$ 96.407.194,96.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	52 (ex PO 60)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ 3.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberção 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	303.000.000,00	19/04/13	-	299.869.740,06	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		303.000.000,00	Valor realizado:		299.869.740,06	72,73%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
----------------------------------	--

Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Adequação do cronograma de desembolso.
Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO	53 (ex PO 61)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):							
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)						
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 206.292.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		270.582.240,00	Valor realizado:		30.000.000,00	22,73%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	54 (ex PO 62)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	31/12/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			23.855.042,00	Valor realizado:		19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:		PO	55 (ex PO 63)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:		2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:							
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):							
Projeto:	Deten Química S.A.						
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos						

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	28/12/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	-	-	50,00%	Atrasado	Análise da proposta de liberação em andamento.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	31.256.000,00	Valor realizado:	15.447.600,00	68,75%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:

Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	56 (ex PO 64)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.					
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	23/12/2014
Data Atualização:	31/08/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, este se encontra em análise na SUDENE.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.867.350,00	Valor realizado:		61.867.350,00	83,33%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	57 (ex PO 65)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Cone Multicenter Ltda					
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/08/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 177.367.554,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Ver Observação 3.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Atrasado		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	191.238.424,00	Valor realizado:	0,00	28,57%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------	------------------	------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: O agente operador sinalizou que o projeto seria reanalisado.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	58 (ex PO 66)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.00)		
Pago até o ano anterior	R\$	50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	50.000.000,00

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Observação/Problemas	Providências
Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Liberações concluídas.	

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, durante a análise a SUDENE encontrou pendências e solicitou as devidas correções.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	92,86%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											

Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO 59 (ex PO 67)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano: 2014	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão:	29/06/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 246.506.342,73
A realizar no exercício	R\$ 162.686.329,01
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 169.076.219,79
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 246.506.342,73

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberção 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberção 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberção 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberção 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	88.469.188,84	05/12/16	-	-	75,00%	Atrasado	Aguardando a liberação de recursos por parte do MI.	
10	Liberção 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	2.450.627,61	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberção 8	SUDENE/CEF	01/06/17	01/07/17	57.749.083,67	-	-	-	0,00%	Atrasado		
13	Liberção 9	SUDENE/CEF	01/12/17	31/12/17	14.017.428,89	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberção 10	SUDENE/CEF	01/12/18	31/12/18	6.389.890,79	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/18	415.582.562,53	21/02/14	-	246.506.342,73	57,50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									79%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,53	Valor realizado:	R\$ 246.506.342,73	58%	Em Andamento	Status do Projeto			
Parceiros Institucionais:										
Observações:										
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs2:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									
Obs3:	A empresa solicitou uma alteração de reestruturação societária. A CEF aprovou. A SUDENE está analisando.									
Obs3:	A empresa solicitou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). A CEF aprovou. A SUDENE está analisando.									

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Plano de Ação 2014		Número do Projeto:		PO	60 (ex PO 68)
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Ano:		2014	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores				
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):	Projeto arquivado devido à perda de prazo para contratação.				
Projeto:	Cone S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

Previsão de Conclusão:	29/08/2016
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 123.186.471,03
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-		-	-	0,00%	Cancelado	O prazo de contratação do financiamento expirou. Projeto arquivado.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	Cancelado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	-	-	0,00	0,00%	Cancelado		
Competência da SUDENE /Banco									50,00%	Cancelado		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 123.186.471,03	Valor realizado:		R\$ -	21,43%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	61 (ex PO 69)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.				
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão:	01/11/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		PO	62 (ex PO 70)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:		2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de		
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):						
Projeto:	Suzano Papel e Celulose S/A					
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00

Previsão de Conclusão:	27/12/2024
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 223.997.049,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 260.189.953,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 260.189.953,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	31/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/12/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/12/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/12/18	260.189.953,00	-	-	0,00	25,00%	25,00%	A Iniciar		
Competência da SUDENE /Banco										63%	Em Andamento		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 260.189.953,00			Valor realizado: R\$ -			31%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO 63 (ex PO 71)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	Brametal S.A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão:	28/12/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 4.095.556,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.095.556,81
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	-	-	50,00%	Atrasado	Proposta de liberação em análise.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	-	0,00	75,00%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									88%	Atrasado		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:	R\$ -	44%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	64 (ex PO 72)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Placas do Brasil S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov. no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 162.843.330,73
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 162.843.330,73
Total Liberado até o exercício	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Em Andamento		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	38.539.362,94	-	-	-	50,00%	Atrasado	Proposta de liberação em análise.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/03/17	31/03/17	23.854.994,90	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	24.589.791,29	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/09/17	01/10/17	27.684.373,59	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/12/17	31/12/17	29.341.232,04	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/03/18	31/03/18	13.415.567,03	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/06/18	01/07/18	5.418.008,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	01/07/18	162.843.330,73	-	-	0,00	18,75%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									59%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 162.843.330,73	Valor realizado:		R\$ -	30%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O BB enviou à SUDENE o pedido de liberação, mas este foi negado pois foram encontradas falhas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

PLANO DE AÇÃO 2017				
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO	65 (ex PO 73)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):				
Projeto:	Pedra Cheirosa I Energia S/A			
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	21.526.754,88	148.879.173,69
	280	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Responsável(e)(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 19.478.856,23
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 21.526.754,88
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contratos SUDENE/BNB e BNB/Empresa em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	09/08/17	08/09/17	9.155.604,44	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	2.408.536,96	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	5.512.912,37	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.612.903,16	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	788.899,30	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	675.437,49	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	899.694,43	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	472.766,73	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	21.526.754,88	-	-	0,00	5,56%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 21.526.754,88	Valor realizado:		R\$ -	26%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
----------------------------------	--

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	66 (ex PO 74)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2017	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Pedra Cheirosa II Energia S/A				
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	17.526.603,45	136.472.576,24
	144	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 16.016.162,83
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 21.965.302,00
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 17.526.603,45
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contratos SUDENE/BNB e BNB/Empresa em fase de formalização.	
1	Liberação 1	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	8.129.804,65	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
5	Liberação 2	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	113.892,12	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
6	Liberação 3	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	1.902.234,82	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 4	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	4.032.350,45	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
8	Liberação 5	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.217.507,54	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	620.373,25	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 7	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	495.565,26	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 8	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	618.539,92	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 9	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	396.335,44	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	17.526.603,45	-	-	0,00	5,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 17.526.603,45	Valor realizado:		R\$ -	26%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 67
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de orientações padronizadas e atualizadas para celebração de convênios.		
Projeto:	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)		
Objetivo do projeto:	Padronizar e formalizar os procedimentos para a celebração de Convênios (Checklist)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	20/10/2017
Data Atualização:	25/09/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto
---	--------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião Prévia 1 (nivelamento conceitual)	Reunião de compartilhamento de conhecimento entre os servidores que fizeram o curso do SICONV	DPLAN	07/04/2017	07/04/2017		07/04/2017	07/04/2017		100%	Concluído		
2	Formatação de curso de capacitação sobre convênios	Reunião para discussão de formatação de capacitação para convênios.	Carmen-CGGI / DPLAN	10/04/2017	10/04/2017		10/04/2017	10/04/2017		100%	Concluído		
3	Exploração de questões legais atuais e impactos na reformulação das regras adotadas pela SUDENE	Reunião com a PRD sobre adequação de procedimentos internos para convênios e TED	Carmen-CGGI/DPLAN/PRD	18/04/2017	18/04/2017		18/04/2017	18/04/2017		100%	Concluído		
4	Pesquisa e estudo da legislação atual	Estudo e pesquisas da nova legislação para fins de atualização dos procedimentos para convênios e TED	Carmen-CGGI	09/06/2017	10/08/2017		09/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
5	Elaboração de minuta preliminar de Checklist (lista de verificação)	Elaboração da primeira minuta da lista de verificação (checklist) para convênios (balizamento das discussões preliminares)	Carmen-Carmen-CGGI	12/06/2017	10/08/2017		12/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
6	Análise de consistência e coleta de sugestões para a proposta de lista de verificação pelas áreas técnicas	Análise e coleta de sugestões para a primeira minuta da lista de verificação, com a participação da DPLAN, e elaboração da primeira minuta.	Carmen-CGGI	23/08/2017	13/09/2017		23/08/2017	13/09/2017		100%	Concluído		
7	Elaboração da proposta de Resolução da DC que regulamentará os novos procedimentos para convênios	Atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013 que trata dos procedimentos para fiscalização e acompanhamento, e prestação de contas de convênios.	Carmen-CGGI	14/09/2017	28/09/2017		14/09/2017			60%	Em Andamento	Demanda da atualização sugerida na reunião para discussão de propostas para o check-list.	
8	Tratativas com a CCONT/DAD	Apresentação da lista de verificações à CCONT/DAD, para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	20/09/2017	20/09/2017		20/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído		

9	Tratativas com a CGAF/DAD	Apresentação à CGAF/COCF/DAD para análise da lista de verificação e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído			
10	Envio de check list, às áreas envolvidas	Minuta atualizada da lista de verificação (checklist)	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído			
11	Tratativas com a PRD	Apresentação da lista de verificação à PRD para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído			
12	Discussão com a AUD	Apresentação da lista de verificação à AUD para análise e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído			
13	Envio da minuta de Resolução às áreas envolvidas	Minuta atualizada da Resolução a ser submetida às áreas envolvidas no processo de trabalho.	Carmen-CGGI	29/09/2017	29/09/2017		29/09/2017			0%	A Iniciar			
14	Reunião para apresentação dos resultados, ajustes finais	Fechamento da Lista de verificação e da resolução que substituirá a portaria nº69/2013, e reunião com as unidades finalísticas da DPLAN, bem como a CCONT e a CGAF/DAD	Carmen-CGGI	06/10/2010	06/10/2010		06/10/2010			0%	A Iniciar	Sala, data e horário a confirmar.		
15	Análise pela Procuradoria da SUDENE	Envio das minutas para a análise da Procuradoria da Sudene (RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Coordenador-Geral CGGI	09/10/2017	20/10/2017		09/10/2017			0%	A Iniciar			
16	Apresentação prévia aos Diretores e superintendente, da proposta de Checklist e minuta de Resolução	Apresentação, para fins de conhecimento e futura deliberação na reunião da Diretoria Colegiada, da lista de verificação e da minuta de Resolução .	Coordenador-Geral CGGI	24/10/2017	24/10/2017		24/10/2017			0%	A Iniciar	A Resolução é a atualização da Portaria nº69/2013, baseada na portaria interministerial 424/2016, Juntamente com a Resolução, será aprovado o check list		
17	Aprovação do Checklist na Reunião da Diretoria Colegiada	Aprovação formal em reunião da DC	Superintendente; Diretores; Coordenador-Geral CGGI	27/10/2017	27/10/2017		27/10/2017			0%	A Iniciar	Publicização da Resolução no site da SUDENE e no Boletim Interno de Pessoal		
18	Capacitação	Capacitação promovida pela CGGI, com o apoio da CGGP, junto às unidades que integram o fluxo operacional, para absorção e aplicação dos novos procedimentos.	Coordenador-Geral CGGI	31/10/2017	31/10/2017		31/10/2017			0%	A Iniciar	(CGGI, CGGP/DAD, CCONT/DAD e DPLAN)		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	64,4%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:
CGDS, CCONT
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 68 (ex PO 74)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Premanente de Convênios e TCE		
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/08/2017

Colocar a data do último contato.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E. Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1 Processo n 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/12/2016	30/12/2016	ñ se aplica	15/12/2016	05/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
2 Processo n.º 59335.000469/14-13 (SIAFI n.º 812155), 2ª Análise Financeira complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	12/01/2017	27/01/2017	ñ se aplica	12/01/2017	03/02/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
3 Processo n.º 59335.000357/2013-81 (SIAFI n.º 792551), 2ª Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2017	17/01/2017	ñ se aplica	02/01/2017	16/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
4 Processo n.º 59335.000357/2013-81 (SIAFI n.º 792551), 3ª Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	17/01/2017	01/02/2017	ñ se aplica	17/01/2017	01/02/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
5 Processo n.º 59335.000543/14-00 (SIAFI n.º 813986), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/04/2017	16/04/2017	ñ se aplica	01/04/2017	26/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
6 Processo n.º 59333.000214/04-07 (SIAFI n.º 517207), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2017	17/01/2017	ñ se aplica	02/01/2017	24/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
7 Processo n.º 59335.000575/13-16 (SIAFI n.º 794997), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/12/2016	04/01/2017	ñ se aplica	20/12/2016	09/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
8 Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/01/2017	30/01/2017	ñ se aplica	15/01/2017	31/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
9 Processo nº 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/03/2017	04/04/2017	ñ se aplica	20/03/2017	07/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		

10	Processo nº 03054.000003/99-74, SIAFI n.º 374633, Análise Financeira	william Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/05/2017	03/06/2017	ñ se aplica	19/05/2017	03/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	23/05/2017	07/06/2017	ñ se aplica	23/05/2017	27/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59335.000172/2010-24, SIAFI n.º 737121 , Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/06/2017	16/06/2017	ñ se aplica	01/06/2017	21/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
13	Processo n 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/06/2017	16/06/2017	ñ se aplica	01/06/2017	12/07/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/07/2017	16/07/2017	ñ se aplica	01/07/2017	07/07/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	-	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.												
Observações:												
3º ciclo 2017 - Jan/2017 a Ago/2017												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 69 (ex PO 75)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Premanente de Convênios e TCE		
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes		
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	31/08/2017

Colocar a data do último contato.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
---	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE n.º /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/12/2016	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Atrasado	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar, mais análise financeira	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
2	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03, Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE n.º /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	30/06/2017	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Atrasado	TCE teve de aguardar remessa de nova notificação	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
3	Processo TCE n.º 59335.000036/2011-15, Ref. Conv. SIAFI n.º 365625 (Processo n.º 03050.000044/98-38) - Emissão de Relatório de TCE n.º 006/2016 (Concluído)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	15/07/2016	11/01/2017	N/A	15/07/2016	17/01/2017	N/A	100%	Concluído		
4	Processo TCE n.º 59335.000397/2009-47, Ref. Conv. SIAFI n.º 311214 (Processo n.º 06270.000001/96-94) - Emissão de Relatório de TCE n.º /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	01/02/2017	31/07/2017	n/A	01/02/2017		N/A	66%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
5	Processo TCE n.º 59335.000708/2010-0, Ref. Conv. SIAFI n.º 368125 (Processo n.º 03055.000074/98-40) - Emissão de Relatório de TCE n.º 001 /2017 (Concluído)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/02/2017	14/08/2017	N/A	15/02/2017	31/03/2017	N/A	100%	Concluído		
6	Processo TCE n.º 59335.000358/2010-83, Ref. Conv. SIAFI n.º 383709 (Processo n.º 03045.000058/99-75) - Emissão de Relatório de TCE n.º /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/02/2017	19/08/2017	N/A	20/02/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	

7	Processo TCE n.º 59335.000411/2010-46 , Ref. Conv. SIAFI n.º 135790 (Processo n.º 06270.000009/95-15) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	20/03/2017	16/09/2017	N/A	20/03/2017		N/A	66%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
8	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 03055.0000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	20/09/2017	N/A	24/03/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
9	Processo TCE n.º 59335.000160/2011-80, Ref. Conv. SIAFI n.º 338502 (Processo n.º 03055.000046/97-23) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	30/09/2017	N/A	03/04/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
10	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 03055.000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	30/09/2017	N/A	03/04/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
11	Processo TCE n.º 59335.000220/2012-46, Ref. Conv. SIAFI n.º 348997 (Processo n.º 03055.000018/98-79) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/05/2017	14/11/2017	N/A	18/05/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
12	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	14/02/2018	N/A	18/08/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	-	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

3º ciclo 2017 - Jan/2017 a Ago/2017

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 70 (ex PO 76)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.				
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000-Administração da Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	
Diretor :	Antonio Silva Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes	
Problema (causa):	Necessidade de desenvolver competências organizacionais e individuais				
Projeto:	Desenvolvimento por Competências				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências organizacionais e individuais, como parte do Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		300.000,00

Previsão de Conclusão:	29/12/2017
Data Atualização:	31/08/2017



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 48.710,75
Saldo a liberar	R\$ 251.289,25
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 48.710,75

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Marina Braga
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Revisão do Plano	Revisão do Plano "Desenvolvimento por Competências"	CGGP e Facilitador	16/01/17	31/03/17		16/01/17	30/03/17		100%	Concluído		
2	Adequação do Plano	Reajustes do Plano às necessidades das Unidades Administrativas	CGGP e Unidades Administrativas	03/04/17	20/04/17		03/04/17	18/04/17		100%	Concluído		
3	Validação	Apresentação e validação do Plano pelo Comitê de Gestão de Pessoas	CGGP e Comitê	24/04/17	05/05/17		24/04/17	09/05/17		100%	Concluído		
4	Projetos Básicos	Elaboração de Projetos Básicos referentes às capacitações	CGGP	08/05/17	31/05/17		09/05/17	29/05/17		100%	Concluído		
5	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para realização das ações de capacitação constantes no Plano e casos excepcionais	CGGP	13/03/17	30/11/17	R\$ 300.000,00	13/03/17		R\$ 48.710,75	40%	Em Andamento		
6	Realização de capacitações	Realização de ações de capacitações nas diversas modalidades	CGGP e parceiros	20/03/17	29/12/17		20/03/17			40%	Em Andamento		
				Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 48.710,75	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
CENTRESAF/PE -ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Observações:

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 71 (ex PO 77)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Avaliação de Competências		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		100.000,00

Previsão de Conclusão:	29/12/2017
Data Atualização:	31/08/2017



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Marina Braga
---	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 100.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 100.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre avaliação de competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	29/12/17	R\$ 10.000,00	01/06/17			50%	Em Andamento		
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17		08/06/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Formação e Capacitação de Grupos de Trabalho	Capacitação dos membros do Grupo no tema Avaliação de desempenho por competências. Socialização e discussão do tema	CGGP e Unidades Administrativas	05/02/18	23/03/18	R\$ 20.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas	
4	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para elaboração de instrumento de avaliação	CGGP	02/04/18	20/06/18	R\$ 70.000,00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas	
5	Elaboração de instrumentos avaliativos	Elaboração de instrumentos de avaliação de competências	CGGP/ Unidades Administrativas e facilitador	09/07/18	28/12/18					0%	A Iniciar	Datas repactuadas	
				Valor Previsto:		R\$ 100.000,00	Valor realizado:		R\$ -	30%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
CENTRESAF/PE - Escola de Administração Fazendária
Observações:

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira
Exercício 2017
(Posição até agosto)

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2017

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2018	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	15.255.994,00	6.830.842,00	6.643.745,12	44,77	97,26	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	400.000,00	88.725,87	88.725,87	22,18	100,00	Servidor capacitado	199		0,00		
4	122	2111	216H/0020	A	1	140.204,00	63.305,54	63.305,54	45,15	100,00						
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	452.696,00	273.956,03	273.956,03	60,52	100,00	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001		1	56.052,00	33.351,00	33.351,00	59,50	100,00	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	169.112,00	109.962,40	109.962,40	65,02	100,00	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.240.056,00	826.126,99	826.126,99	66,62	100,00	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	22.044,00	1.250,57	1.250,57	5,67	100,00	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	4.430.535,00	2.433.730,99	2.433.730,99	54,93	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	32.388.646,00	18.238.216,60	18.238.216,60	56,31	-	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	54.555.339,00	28.899.467,99	28.712.371,11	52,97	99,35	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.808.145,00	1.757.620,00	1.757.620,05	1.002.090,00	100,00	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	2.808.145,00	1.757.620,00	1.757.620,05	62,59	100,00	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	707.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	319.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	608	2029	214S/0001	A	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	1.357.889,00	709.382,21	709.382,21	0,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO006	A	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/0023	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0024	A	1	3.248.000,00	3.248.000,00	0,00	100,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0029	A	1	850.000,00	850.000,00	820.000,00	100,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/2089	A	1	211.803,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7216	A	1	103.348,00	0,00	0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
04	608	2029	214S/0001	A	1	18.166.853,00	18.166.853,00	8.500.000,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	27.783.806,00	22.974.235,21	10.029.382,21	82,69	0,00					
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: 31/08/2017 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Planos Operativos tabulados segundo
Diretrizes e Objetivos Estratégicos da
SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
15	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
16	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
17	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
18	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
19	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
20	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
21	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
22	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
23	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
24	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
25	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
26	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
27	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
28	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
29	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
30	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
31	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
32	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
33	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
34	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
36	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
37	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
38	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
39	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
40	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
41	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
42	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
43	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
44	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
45	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
46	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
47	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
48	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 0,00	0%
49	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
50	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo 1.1								8.706.681.116,69	6.663.951.135,62	77%
51	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
52	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste 2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
60	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
62	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
Total do Objetivo 1.5								234.105,49	234.105,49	100%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								8.706.915.222,18	6.664.185.241,11	77%
63	33	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
Total do Objetivo 2.2								43.290.000,00	17.238.000,00	40%
64	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
65	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	724.241,25	73%
TOTAL DA DIRETRIZ 2								44.279.482,50	17.962.241,25	41%
66	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
67	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
68	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
69	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 48.710,75	16%
70	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
		Total do Objetivo 3.1						400.000,00	48.710,75	12%
		TOTAL DA DIRETRIZ 3						400.000,00	48.710,75	12%
71	16	4. Fortelecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Total do Objetivo 4.1						0,00	0,00	0%
		TOTAL DA DIRETRIZ 4						0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								8.751.594.704,68	6.682.196.193,11	76,4%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2017
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
Posição: 31/08/2017

ANEXO IV
Planos Operativos tabulados segundo a
Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
3	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
13	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
20	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
25	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
27	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
28	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
29	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
30	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
31	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 0,00	0%
32	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
33	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 0355								8.698.660.975,85	6.656.681.058,18	77%
34	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
35	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	977.151,42	88%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
36	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
P 2029 - Ação 4640								1.069.868,00	764.868,00	71%
37	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
38	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
P 2029 - Ação 8689								989.482,50	724.241,25	73%
39	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
40	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
41	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
42	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
43	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
44	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
45	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
46	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
P 2029 - Ação 8902								3.231.234,02	3.023.792,81	94%
47	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
P 2029 - Ação 8917								207.542,62	107.354,71	52%
48	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
49	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia BioSustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
P 2029 - Ação 8340								1.882.015,99	1.882.015,99	100%
50	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
51	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
52	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
58	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/ICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
P 2029 - Ação 20WQ								749.000,00	749.000,00	100%
Total do Programa 2029								8.707.904.704,68	6.664.909.482,36	77%
63	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
65	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 48.710,75	16%
66	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%
P 2111 - Ação 2000								400.000,00	48.710,75	12%
Total do Programa 2111								400.000,00	48.710,75	12%
67	33	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
Total do Programa 2069								43.290.000,00	17.238.000,00	40%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
68	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
69	16	4. Fortalecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
70	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
71	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								8.751.594.704,68	6.682.196.193,11	76,4%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 3º Ciclo 2017

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/08/2017

ANEXO V

Planos Operativos tabulados segundo

Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
2	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
12	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
14	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
16	16	4. Fortalecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
TOTAL CGDS								6.612.712,84	5.597.408,19	85%
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia BioSustentável de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Produtos Orgânicos de Interesse Econômico em Arranjos Produtivos Locais do Semiárido Nordestino.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R\$ 1.025.000,00	R\$ 1.025.000,00	100%
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de uma publicação contendo mapas geopolítico e de infraestrutura da área de atuação da SUDENE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
24	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo IX, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
27	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Estado de Alagoas - Projeto de Cooperação Técnica BRA/IIICA/09/003 - A SUDENE foi convidada para acompanhar o Plano de Desenvolvimento. Políticas Regionais - MI	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGEP								2.631.015,99	2.631.015,99	100%
33	33	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
TOTAL CGCP								43.290.000,00	17.238.000,00	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
TOTAL DPLAN								52.533.728,83	25.466.424,18	48%
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísia III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísia IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísia V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
49	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
51	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
52	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
53	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
54	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
55	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
56	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
57	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
58	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
59	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
60	60	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Cancelado	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
61	61	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
62	62	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
63	63	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 4.095.556,81	R\$ 0,00	0%
64	64	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 0,00	0%
65	65	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
66	66	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
TOTAL DFIN								8.698.660.975,85	6.656.681.058,18	77%
67	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGGI								0,00	0,00	
68	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
69	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CCNT								0,00	0,00	0%
70	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 48.710,75	16%
71	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0%
TOTAL CGGP								400.000,00	48.710,75	12%
TOTAL DAD								400.000,00	48.710,75	12%
TOTAL GERAL								8.751.594.704,68	6.682.196.193,11	76,4%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2017

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 31/08/2017

ANEXO VI
Planos Operativos prioritários,
relacionados na Resolução nº 281/2017, da
Diretoria Colegiada da SUDENE

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

1 – Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - NE	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Luiz Eduardo Machado
Problema (causa):	Elevado número de focos de extrema pobreza e degradação ambiental, falta de competitividade de amplas porções da área de atuação da Sudene, baixos índices de educação e saúde e a falta de estrutura do setor público para as sufciências das demandas dos cidadãos.		
Projeto:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de Atuação da SUDENE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.140.376,40	

Previsão de Conclusão:	30/12/2018
Data Atualização:	27/09/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Outros atores		TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
1.140.376,40	0,00		1.140.376,40	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
1.140.376,40	0,00		1.140.376,40	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Termo de Referência para realização do PRDNE	Elaboração de Termo de Referência para orientação da realização do PRDNE	SUDENE/DPLAN/C GCP	19/06/2017	31/07/2017		19/06/2017	31/07/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o PNUD	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, intitulado "Desenvolvimento Regional na área de atuação da SUDENE", que inclui diversas atividades, entre elas apoio à elaboração do PRDNE,	SUDENE DPLAN/CGCP	01/08/2017	29/09/2017		01/08/2017	15/09/2017		100%	Concluído		
3	Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério da Relações Exteriores	Submissão do ACT (denominado de Prodóc - 017/2019) a ABC ; Envio do ACT preliminar para a Procuradoria da SUDENE	SUDENE DPLAN/CGCP	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017			80%	Em Andamento	Aguardando procedimentos e tratativas de assinatura do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Ajustes finais para celebração	Realização dos ajustes sugeridos pela ABC; Análise e realização dos ajustes sugeridos pelo Parecer da Procuradoria da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	18/09/2017	22/09/2017		18/09/2017			80%	Em Andamento	Procedendo os ajustes referendados pelas instituições partícipes	
5	Elaboração e aprovação do Termo de referência	Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação, para Contratação dos Serviços de Consultoria de Apoio à elaboração do PRDNE	SUDENE/GAB, SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	30/10/2017					0%	A Iniciar	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	

6	Realização do processo licitatório		SUDENE e PNUD	31/10/2017	30/11/2017					0%	A Iniciar		
7	Contração de serviços de Apoio à realização do Plano		SUDENE e PNUD	01/12/2017	12/12/2017					0%	A Iniciar		
8	Constituição do Comitê Técnico de Acompanhamento da realização do PRDNE	Documento contendo as atribuições do Comitê, Convite aos participantes, realização da primeira reunião deste Comitê	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	01/11/2017	30/11/2017					0%	A Iniciar		
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Reunião do Comitê Regional de Apoio ao PRDNE	SUDENE, PNUD, Consultoria Contratada	15/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
10	Aprovação do Projeto tecnico	Confecção do Plano de trabalho, metodologia e diretrizes do plano	SUDENE/DPLAN/C GCP	01/12/2018	30/12/2017					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE.	
11	Realização da primeira etapa do PRDNE	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional e suas interligações com o Território de atuação da SUDENE. Análise dos Planos estaduais existentes. Compatibilização com as diretrizes para o Desenvolvimento Regionaal. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/01/2018	30/03/2018	R\$ 171.056,46				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
12	Realização da segunda etapa do PRDNE	Produto 2: Visão Geral do Desenvolvimento regional à partir da construção das Agendas para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/04/2018	30/06/2018	R\$ 399.131,74				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
13	Realização da terceira etapa do PRDNE	Produto 3: PRDNE em versão preliminar discutido e aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano, com orçamentação mínima das ações consubstanciadas nas Agendas do Desenvolvimento. Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/07/2018	30/09/2018	R\$ 342.112,92				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
14	Realização da quarta etapa do PRDNE	Produto 4: PRDNE em versão final aprovado pelos parceiros. Versão final como formato de Lei para envio ao Congresso Nacional. Autorização da SUDENE para Liberação da 5ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/10/2018	30/11/2018	R\$ 228.075,28				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
14	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo. Aprovação do PRDNE e sua proposta de Lei pelo CONDEL	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	01/12/2018	30/12/2018					0%	A Iniciar		
15	Constituição do Comitê de Acompanhamento da execução do PRDNE	Constituição em conjunto com os Estados e atores sociais da área de atuação da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	15/12/2018	30/12/2018					0%	A Iniciar		
						Valor Previsto:	R\$ 1.140.376,40	Valor realizado:	R\$ 0,00	23%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.	
Observações:	

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

2 – Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - NE	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Luiz Eduardo Machado
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		709.382,21	

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
709.382,21	0,00		709.382,21	A realizar no exercício	-
709.382,21	0,00	-	709.382,21	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 709.382,21
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 709.382,21
				Valor liberado no Exercício	
				Saldo a liberar	R\$ 709.382,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/08/2018
Data Atualização:	20/09/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Protocolo de Intenções	Antes foi recebida uma comunicação Oficial da Prefeitura de Fiera de Santana -BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções convistas a elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2017		02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído		
3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno, contendo questões baseadas na economia, educação, infraestrutura e outros temas de relevância. Elaboração de documento contendo as diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017			80%	Em Andamento	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Validação do Plano de Trabalho e acordo com a Prefeitura.	Validação do Plano de Trabalho pela SUDENE e acordo com a Prefeitura de Feira de Santana e Municípios do Entorno. Aprovação das diretrizes do Plano de trabalho	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017					0%	A Iniciar		

5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017	25/09/2017			20%	Em Andamento	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência para Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017				0%	A Iniciar	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
7	Realização do processo licitatório		SUDENE e PNUD	21/10/2017	30/11/2017				0%	A Iniciar		
8	Contração de serviços especializados para elaboração do Plano		SUDENE e PNUD	21/10/2017	30/11/2017				0%	A Iniciar	Montagem do Comitê Local de Acompanhamento do Plano	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma		SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	01/12/2017	15/12/2017				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/12/2017	30/12/2017	R\$ 141.876,44			0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
11	Realização da primeira do PDE de Feira de Santana	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional e suas interligações com o Território de Feira de Santana. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	16/12/2017	28/02/2018	R\$ 141.876,44			0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
12	Realização da segunda do PDE de Feira de Santana	Produto 2: PDE de Feira de Santana construído em 1ª versão, em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/03/2018	30/06/2018	R\$ 212.814,66			0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
13	Realização da terceira do PDE de Feira de Santana	Produto 3: PDE aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/CGCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/07/2018	31/07/2018	R\$ 212.814,66			0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
14	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/CGCP	01/08/2018	20/08/2018				0%	A Iniciar		
15	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	21/08/2018	30/08/2018				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 0,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.											
Observações:											
(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365.											
(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.											
(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.											

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluido
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

**3 – Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil
e com a CNI, bem como a execução de seus planos de trabalho**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste				Número do Projeto:	3
Objetivo estratégico:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes				Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A				Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A				Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A					
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento				Subunidade responsável:	Coordenação de Normatização de Fundos de Desenvolvimento e de Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva				Gestor da subunidade:	Ademir Pedro Vilaça Júnior
Problema (causa):	N/A					
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil					
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior, Claudia Maria Silva e Artur Sedycias
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -			-	0%	A Iniciar		
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -			-	0%	A Iniciar		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/18	R\$ -			-	0%	A Iniciar		
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -			-	0%	A Iniciar		
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/18	R\$ -			-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	29%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	APEX-BR
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

4 – Estruturação do Observatório do Desenvolvimento do Nordeste



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos es			Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de
Objetivo da ação:	Elaborar projeto para construção do Observatório de Desenvolvimento do Nordeste				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CGEP
Diretor:	Alexandre Gusmão			Gestor da subunidade:	Frederico Cavalcanti
Problema (causa):	Informações sobre o Nordeste e Área de Atuação da Sudene não estão agrupadas ou não existem				
Projeto:	Estruturação do Plano de Projeto para o ODNE				
Objetivo do projeto:	Possibilitar a construção de um centro de informação sobre a Área de Atuação da Sudene				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/10/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
---	----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Autorização para a elaboração do projeto			01/06/17	13/06/17	-	01/06/2017	13/06/2017		20%	Concluído		
1.1	Reuniões internas	Reuniões internas para elaboração de justificativas para o projeto	Frederico Cavalcanti	01/06/17	10/06/17	R\$ -	01/06/2017	09/06/2017		100%	Concluído		
1.2	Encaminhamento para a DIRCOL	Encaminhamento para a DIRCOL	Frederico Cavalcanti	10/06/17	10/06/17	R\$ -	09/06/2017	12/06/20217		100%	Concluído		
1.3	Publicação da Resolução	Publicação da Resolução de autorização	Frederico Cavalcanti	13/06/17	13/06/17	R\$ -	13/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto			18/06/17	15/10/17		14/06/2017			28%	Em Andamento		
2.1	Definição do Escopo do projeto	-	Frederico Cavalcanti	18/06/17	30/06/17	R\$ -	14/06/2017	30/06/2017		100%	Concluído		
2.2	Elaboração do TAP	-	Frederico Cavalcanti	03/07/17	21/07/17	R\$ -	03/07/2017	21/07/2017		100%	Concluído		
2.3	Elaboração da EAP do projeto	-	Frederico Cavalcanti	24/07/17	31/08/17	R\$ -	24/07/2017	31/08/2017		100%	Concluído		
2.4	Aprovação do TAP e da EAP	-	Frederico Cavalcanti	01/09/17	15/09/17	R\$ -	01/09/2017			20%	Em Andamento		
2.5	Planejamento das atividades do	-	Frederico Cavalcanti	16/09/17	30/09/17	R\$ -				0%	A Iniciar		
2.6	Elaboração da sequenciação	-	Frederico Cavalcanti	02/10/17	04/10/17	R\$ -				0%	A Iniciar		
2.7	Definição dos recursos	-	Frederico Cavalcanti	04/10/17	06/10/17	R\$ -				0%	A Iniciar		
2.8	Definição dos prazos e custos	-	Frederico Cavalcanti	04/10/17	13/10/17	R\$ -				0%	A Iniciar		
2.9	Aprovação do Plano de Projeto	-	Frederico Cavalcanti	15/10/17	15/10/17	R\$ -				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	48%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

5 – Acompanhamento da participação da SUDENE no trabalho de delimitação do Semiárido



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: 5	
Objetivo estratégico: 1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano: 2017	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do	
Finalidade da ação:				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti	
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			
Projeto:	Acompanhamento da participação da Sudene na nova delimitação do Semiárido brasileiro.			
Objetivo do projeto:	Subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) através da elaboração de mapas			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	26/09/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado
---	-----------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Acompanhamento de Videoconferências	Produto 1 - Acompanhamento, por videoconferência, da discussão técnica do Grupo de Trabalho (GT) sobre a elaboração	Ludmilla Calado	12/04/17	19/06/17	-	12/04/17	19/06/17	-	100%	Concluído		
1.1	Videoconferencia 1	Discussões gerais propostas pelo GT Interministerial para o relatório técnico de delimitação do semiárido	Ludmilla Calado	12/04/17	12/04/17	-	12/04/17	12/04/17	-	100%	Concluído		
1.2	Videoconferencia 2	Análise do conteúdo proposto pelo GT para o relatório técnico de delimitação do semiárido, assim como para as minutas das Resoluções	Ludmilla Calado	10/05/17	10/05/17	-	10/05/17	10/05/17	-	100%	Concluído		
1.3	Videoconferencia 3	Alinhamento das conclusões do relatório técnico, assim como das minutas das Resoluções	Ludmilla Calado	06/06/17	06/06/17	-	06/06/17	06/06/17	-	100%	Concluído		
1.4	Videoconferencia 4	Ajustes e alterações finais do relatório técnico, assim como para as minutas das Resoluções, para posterior encaminhamento ao Condel	Ludmilla Calado	19/06/17	19/06/17	-	19/06/17	19/06/17	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Treinamento	Produto 2 - Treinamento sobre o uso da metodologia utilizada pelo GT para a elaboração da delimitação do Semiárido.	Ludmilla Calado	19/06/17	30/06/17	-	19/06/17	30/06/17	-	100%	Concluído		
2.1	Articulação	Alinhamento com órgãos responsáveis pelo treinamento sobre data e conteúdo	Ludmilla Calado	19/06/17	23/06/17	-	19/06/17	23/06/17	-	100%	Concluído		
2.2	Treinamento	Capacitação técnica para transferência de metodologia utilizada pelo GT para a elaboração da delimitação do Semiárido	Ludmilla Calado	27/06/17	27/06/17	-	27/06/17	27/06/17	-	100%	Concluído		
2.3	Validação	Apresentação para Coordenador-Geral	Ludmilla Calado	30/06/17	30/06/17	-	30/06/17	30/06/17	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Acompanhamento da aprovação da aprovação pelo Condel	Produto 3 - Acompanhamento da aprovação da nova delimitação pelo Condel	Ludmilla Calado, Frederico Cavalcanti	10/07/17	27/07/17	-	10/07/17	27/07/17	-	100%	Concluído		
3.1	Validação	Revisão e validação, na Sudene, das minutas das Resoluções a serem aprovadas no Condel	Frederico Cavalcanti	10/07/17	21/07/17	-	10/07/17	21/07/17	-	100%	Concluído		
3.2	Aprovação	Acompanhamento da aprovação, pelo Condel, da nova delimitação do Semiárido brasileiro e suas respectivas Resoluções	Ludmilla Calado	27/07/17	27/07/17	-	27/07/17	27/07/17	-	100%	Concluído		

4	Produto 4 - Acompanhamento dos recursos dos Estados	Ludmilla Calado	28/07/17	27/09/17	-	28/07/17	27/09/17	-	60%	Concluído				
4.1	Monitoramento	Monitoramento dos recursos dos Estados à delimitação proposta	Ludmilla Calado	28/07/17	25/09/17	-	28/07/17	-	90%	Em Andamento	Caso nenhum recurso seja solicitado pelos Estados dentro do prazo estabelecido, a etapa seguinte (4.2) perderá sua função, sendo então desconsiderada.			
4.2	Articulação	Articulação com o GT sobre recursos dos Estados	Ludmilla Calado	28/07/17	25/09/17	-	28/07/17	-	90%	Em Andamento				
4.3	Encerramento	Encerramento do prazo e oficialização da nova delimitação do Semiárido brasileiro	Ludmilla Calado	26/09/17	26/09/17	-	26/09/17	-	0%	A Iniciar				
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	90%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

6 – Estruturação e acompanhamento das atividades relacionadas com a Rede Palma



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:		Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MI):	III Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões
Objetivo da ação:	Criação da Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.		
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)		
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

Previsão de Conclusão:	01/06/2018
Data Atualização:	26/09/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lucia, José Aildo, Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Victor Uchoa
---	--

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma no Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE		01/05/2017	05/06/2017		01/05/2017	05/06/2017		20,0%	Concluído	
1.1	Atividades preparatórias	reserva de sala, coffee, etc.	Ascon	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.2	Divulgação	Preparação dos email marketing, Cofecção de Folders	Ascon/CGDS	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.3	Cofirmação de Presença	-	Gabinete	15/05/2017	29/05/2017		15/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.4	Contrução do Espaço no Site	-	Ascon	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.5	Elaboração da apresentação	-	CGDS	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído	
1.6	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE	Sudene e parceiros	01/06/2017	01/06/2017		01/06/2017	01/06/2017		100%	Concluído	
1.7	Registro da reunião	Registro de presença e gravação com	Ascon	01/06/2017	05/06/2017		01/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído	
2	Divulgação			06/06/2017	28/12/2017		06/06/2017			5,0%	Em Andamento	
2.1	Apresentação Evento do Sebrae Serra Talhada		CGDS/Ascon	06/06/2017	08/06/2017		06/06/2017	08/06/2017		100%	Concluído	
2.2	Apresentação Conselho Deliberativo do Sebrae AL		CGDS/Ascon	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017	22/06/2017		100%	Concluído	
2.3	Apresentação Sebrae PE		CGDS/Ascon	20/08/2017	27/12/2017					0%	A Iniciar	
2.4	Apresentação no Conselho dos Secretários de Agricultura (CONSEAGRI)		CGDS/Ascon	21/08/2017	28/12/2017					0%	A Iniciar	
3	Preparar a monção para o Condel			05/06/2017	27/07/2017		05/06/2017	27/07/2017		10,0%	Concluído	

3.1	Elaboração da Ata e encaminhar para CGGI		Gabinete	05/06/2017	05/06/2017		05/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído			
3.2	Elaboração de proposta de Moção de Apoio para o Condel		CCGI/Gabinete/CGDS	06/06/2017	15/07/2017		06/06/2017	15/07/2017		100%	Concluído			
3.3	Apresentação da Moção ao Comitê Técnico do Condel		CCGI/Gabinete	20/07/2017	20/07/2017		(*)	(*)			Cancelado	Cancelamento decorrente da mudança predial da Sede, impossibilitando a referida realização.		
3.4	Apresentação da Moção ao Condel		Superintendente	27/07/2017	27/07/2017		27/07/2017	27/07/2017		100%	Concluído			
4	Realização de Oficina para Formação da Arquitetura da Rede Palma			01/08/2017	30/03/2018		01/09/2017			6,7%	Em Andamento			
4.1	Instituição de Grupo de Trabalho da Sudene		DPLAN	01/08/2017	04/08/2017					0%	Atrasado			
4.2	Reunião Técnica		Sudene e parceiros	01/09/2017	21/09/2017		01/09/2017	26/09/2017		100%	Concluído			
4.3	Proposta de Programação e Participantes		CGDS/DPLAN-Gabinete	01/10/2017	30/10/2017					0%	A Iniciar			
4.4	Encaminhamento aos Parceiros para Conhecimento e Sugestões da Proposta		CGDS/DPLAN-Gabinete	01/11/2017	30/11/2017					0%	A Iniciar			
4.5	Elaboração da Programação Final e Lista dos Participantes		Ascon/Gabinete	01/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar			
4.6	Convite dos Parceiros		Sudene e parceiros	02/01/2018	04/01/2018					0%	A Iniciar			
4.7	Realização de Oficina		CGDS/DPLAN-Gabinete	20/02/2018	20/02/2018					0%	A Iniciar			
4.8	Definição da Arquitetura da Rede		Sudene e parceiros	02/03/2018	02/03/2018					0%	A Iniciar			
4.9	Elaboração de Relatório		CGDS/DPLAN	05/03/2018	30/03/2018					0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	42%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

7 - Capacitação de Gestores municipais para uso do SICONV (PE, PB, AL, RN, BA e CE)



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	7.1
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas			Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais			Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretor:	Alexandre Gusmão			Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV				
Projeto:	Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.30.00.00		85.806,24	85.806,24

Previsão de Conclusão:	31/12/2017
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Isis Moreira, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento, Renato Vaz
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 85.806,24
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/03/2017		01/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto	DPLAN / CGDS	06/07/2017	22/08/2017		06/07/2017	22/08/2017		100%	Concluído	
3	Formalização do Instrumento	A etapa refere-se a todo o procedimento - instrução do processo, e trâmites administrativos para a formalização	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CONJUR-SUDENE	23/08/2017	30/09/2017		23/08/2017	-		90%	Em Andamento	Processo está em análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.
4	Assinatura do Termo de Descentralização		Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/10/2017	06/10/2017					0%	A Iniciar	
5	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	06/10/2017	10/10/2017	R\$ 85.806,24				0%	A Iniciar	
6	Mobilização e Divulgação dos Cursos		CGDS/DPLAN/SCOM	06/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
7	Realização do curso - Fase de proposição em RECIFE - PE		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
8	Realização do curso - Fase de proposição em JOÃO PESSOA - PB		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
9	Realização do curso - Fase de proposição em NATAL - RN		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	

10	Realização do curso - Fase de proposição em MACEIÓ - AL	CENTRESAF-PE	30/10/2017	09/11/2017					0%	A Iniciar				
11	Laudo técnico Final	CGDS	02/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar				
			Valor Previsto:		R\$	85.806,24	Valor realizado:		R\$	-	26%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF EM PERNAMBUCO

Observações:

Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	7.2
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas			Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais			Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretor:	Alexandre Gusmão			Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV				
Projeto:	Capacitação de servidores municipais do Estado da Bahia				
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.30.00.00		10.071,50	10.071,50

Previsão de Conclusão:	30/06/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento, Renato Vaz
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 10.071,50
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %		
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/03/2017		01/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto	DPLAN / CGDS	06/07/2017	22/08/2017		06/07/2017	22/08/2017		100%	Concluído	
3	Formalização do Instrumento	A etapa refere-se a todo o procedimento instrução do processo, e trâmites administrativos para a formalização	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CONJUR-SUDENE	23/08/2017	02/10/2017		23/08/2017	-		50%	Em Andamento	Não houve autorização da chefia imediata da ESAF BA para liberação do instrutor do curso neste primeiro momento devido a quantidade de horas de dispensa.
4	Assinatura do Termo de Descentralização		Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/10/2017	06/10/2017					0%	A Iniciar	Aguarda-se envio do orçamento do curso, TED preenchido e plano de trabalho pela Centresaf Bahia.
5	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	06/10/2017	10/10/2017	R\$ 10.071,50				0%	A Iniciar	Ligações e contato por email foram realizadas para solicitar agilidade.
6	Mobilização e Divulgação dos Cursos		CGDS/DPLAN/ASC OM	06/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
7	Realização do curso - Fase de proposição em Salvador - BA		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
8	Laudo técnico Final		CGDS	02/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar	
				Valor Previsto:		R\$ 10.071,50	Valor realizado:		R\$ -	31%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA

Observações:

Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	7.3
Objetivo estratégico:	Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Alexandre Gusmão		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV		
Projeto:	Capacitação de servidores municipais do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.30.00.00		Valor não orçado	Valor não orçado

Previsão de Conclusão:	30/06/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Isis Moreira, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento, Renato Vaz
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/03/2017		01/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto	DPLAN / CGDS	06/07/2017	22/08/2017		06/07/2017	22/08/2017		100%	Concluído		
3	Formalização do Instrumento	A etapa refere-se a todo o procedimento instrução do processo, e trâmites administrativos para a formalização	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CONJUR-SUDENE	23/08/2017	02/10/2017		23/08/2017	-		0%	Cancelado	A CENTRESAF Ceará não dispunha de instrutores para ministrar o curso. Contactou-se a Escola de Gestão Pública do Ceará e o Ministério do Planejamento, no entanto, os servidores capacitados para serem multiplicadores não concluíram o curso e portanto, não estão aptos a ministrar o conteúdo pedido para este projeto.	Cancelar o projeto, será feito o contato em 2018 para retomar esta ação no Ceará.
4	Assinatura do Termo de Descentralização		Superintendente, Representante da Instituição Parceira							0%	A Iniciar		
5	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD							0%	A Iniciar		
6	Mobilização e Divulgação dos Cursos		CGDS/DPLAN/SCOM							0%	A Iniciar		
7	Realização do curso - Fase de proposição em Salvador - BA		CENTRESAF-PE							0%	A Iniciar		
8	Laudo técnico Final		CGDS							0%	A Iniciar		

	Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	25,0%	Cancelado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:										
CENTRO REGIONAL DA ESAF NO CEARÁ.										
Observações:										
Projeto cancelado devido à indisponibilidade de instrutores para ministrar o curso de capacitação no período em questão.										
* Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's . No caso do TED com a ESAF-CE, pela impossibilidade já referida, não poderá prosperar.										

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

8 - Acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como, do apoio técnico à articulação de novas emendas.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	252.692,18

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
				Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 102.692,18	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 252.692,18	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	27/03/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves - Diretor DPLAN/Maurício Jose de Garcia Maia - Coordenador CGDS
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		12/03/2016	01/03/2017	-	12/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	12/03/16	12/04/16	-	12/03/16	12/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/16	22/04/16	-	12/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	11/07/16	01/03/17	-	11/07/16	01/03/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/06/2016	01/03/2018	R\$ 250.000,00	13/06/2017		R\$ 50.000,00	25%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Parelhas	01/06/16	30/06/16		13/06/17	13/06/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	22/08/17	22/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Parelhas	16/08/17	30/09/17	R\$ 100.000,00	23/08/17	-	R\$ 50.000,00	50%	Em Andamento		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/17	15/10/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Parelhas	16/10/17	31/01/18	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/02/18	01/03/18	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/04/2018	27/03/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/04/18	27/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	45%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:												
Município de Parelhas/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828299/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	267.794,30

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 7.117,72		R\$ 107.117,72	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 10.676,58		R\$ 160.676,58	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 17.794,30		R\$ 267.794,30	Valor liberado no Exercício	R\$ 216.183,23
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 216.183,23

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		17/03/2016	11/06/2017	-	17/03/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	17/03/16	18/03/16	-	17/03/16	18/03/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	17/03/16	08/04/16	-	17/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	11/06/17	-	15/03/16	11/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/17	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	31/12/2017	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 216.183,23	51%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Passa e Fica	01/04/17	15/04/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/04/17	15/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Passa e Fica	16/04/17	30/06/17	R\$ 100.000,00	14/04/17	18/05/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	01/05/17	15/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 150.000,00	03/07/17	03/07/17	R\$ 116.183,23	100%	Concluído	Valor da liberação foi reduzido em virtude da verificação <i>in loco</i> de que parte da obra já havia sido executada	Será cancelado o empenho do saldo em restos a pagar e devolvido o recurso.
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Passa e Fica	16/07/17	31/12/17	R\$ 150.000,00	04/07/17	31/12/17	R\$ 116.183,23	97%	Em Andamento		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	31/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 216.183,23	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Passa e Fica/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827250/2016 - Proposta nº 003674/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100	GND 3	30	250.000,00	274.321,90					Pago até o ano anterior	R\$ -
						R\$ 100.000,00	R\$ 9.728,76		R\$ 109.728,76	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
						R\$ 150.000,00	R\$ 14.593,14		R\$ 164.593,14	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 250.000,00	R\$ 24.321,90		R\$ 274.321,90	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
										Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	17/03/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		26/02/2016	19/12/2016	-	26/02/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	30/03/16	30/01/17	-	30/03/16	30/01/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	18/10/16	07/11/16	-	18/10/16	07/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		15/02/2017	22/02/2019	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 100.000,00	34%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	15/02/17	15/02/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Passa e Fica	30/12/16	25/07/17	R\$ 100.000,00	30/12/16	25/07/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	19/05/17	19/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	31/07/17	R\$ 150.000,00			-	0%	Atrasado	O município não atendeu aos requisitos para liberação dos recursos	Pendências informadas ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Passa e Fica	01/08/17	21/01/18	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	22/01/18	22/02/19	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		22/03/2018	17/03/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	22/03/18	17/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	54%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:												
Município de Passa e Fica/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827249/2016 - Proposta nº 003674/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	262.868,86

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 7.721,32		R\$ 107.721,32	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.147,54		R\$ 155.147,54	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 12.868,86		R\$ 262.868,86	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	30/05/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/17	-	01/11/16	08/11/17	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	15/09/2017	R\$ 262.868,86	30/05/2017	30/11/2017	R\$ 20.000,00	19%	Em Andamento		
7	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de Tangará	01/05/17	15/05/17		30/05/17	30/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/17	15/06/17	R\$ 100.000,00	04/07/17	19/07/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Tangará	16/06/17	31/08/17	R\$ 100.000,00	20/07/17		R\$ 20.000,00	20%	Atrasado	Município não atendeu aos requisitos para recebimento da primeira parcela, o que acarretou no atraso da execução da obra; Não foi apresentado documentos da licitação no SICONV, nem registrado gastos.	Solicitada a conclusão da licitação e inclusão dos documentos no SICONV; aguardando início da execução da obra;
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Tangará	01/09/17	15/09/17					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Tangará	16/09/17	31/12/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	01/02/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Jardim de Tangará/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827676/2016 - Proposta nº 015210/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.5
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de São José do Seridó/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	275.137,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 10.054,90		R\$ 110.054,90	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 15.082,35		R\$ 165.082,35	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 25.137,25		R\$ 275.137,25	Valor liberado no Exercício	R\$ 150.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	25/08/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Édson Laranjeiras e Givanildo Ramos
---	-------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		11/03/2016	11/06/2017	-	11/03/2016	11/10/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/03/16	08/04/16	-	11/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/03/16	08/04/16	-	11/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	10/03/16	29/03/16	-	10/03/16	27/07/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	01/09/16	01/09/16	-	01/09/16	01/09/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	11/10/16	11/10/16	-	11/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2016	02/08/2017	R\$ 250.000,00	21/11/2016		R\$ 250.000,00	51%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de São José do Seridó	01/12/16	15/12/16		21/11/16	21/11/16		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/16	15/12/16	R\$ 100.000,00	26/12/16	26/12/16	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de São José do Seridó	16/12/16	30/04/17	R\$ 100.000,00	27/12/16	23/05/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de São José do Seridó	01/05/17	15/05/17		22/12/16	22/12/16		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/05/17	15/05/17	R\$ 150.000,00	24/05/17	24/05/17	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de São José do Seridó	16/05/17	01/07/17	R\$ 150.000,00	25/05/17	01/07/17	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	02/07/17	02/08/17	-				0%	Atrasado	Visita de Recebimento ainda não foi realizada em virtude de o técnico responsável estar vinculado à Força Tarefa do Programa Água para Todos	A visita está sendo planejada levando-se em conta disponibilidade técnica
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		30/08/2017	25/08/2018	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	30/08/17	25/08/18	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de São José do Seridó/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827251/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN		
Objetivo do projeto:	Promoção de melhorias no acesso às comunidades, transportes/serviços públicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	520.935,70

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 61.299,90	R\$ 4.187,14		R\$ 65.487,04	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 219.000,00	R\$ 8.374,00		R\$ 227.374,00	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 219.700,10	R\$ 8.374,56		R\$ 228.074,66	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 20.935,70		R\$ 520.935,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	21/04/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Marcelo de Castro Viana
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	01/03/2017	-	15/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	15/08/16	-	15/03/16	15/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	25/10/16	25/10/16	-	25/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	26/10/16	26/10/16	-	26/10/16	26/10/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	28/03/2018	R\$ 500.000,00	09/08/2017		R\$ 0,00	6%	Em Andamento		
7	Depósito 1a Parcela contrapartida	Depósito 1a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/08/17	30/08/17		09/08/17	09/08/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 61.299,90				0%	A Iniciar		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Tibau do Sul	16/09/17	31/10/17	R\$ 61.299,90				0%	A Iniciar		

10	Depósito 2a Parcela contrapartida	Depósito 2a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/11/17	30/11/17					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	15/11/17	R\$ 219.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Tibau do Sul	16/11/17	31/12/17	R\$ 219.000,00				0%	A Iniciar		
13	Depósito 3a Parcela contrapartida	Depósito 3a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/01/18	31/01/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	15/01/18	R\$ 219.700,10				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Município de Tibau do Sul	16/01/18	25/02/18	R\$ 219.700,10				0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	26/02/18	28/03/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		26/04/2018	21/04/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	26/04/18	21/04/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	26%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município deTibau do Sul/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828298/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.7
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida da comunidade em geral		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100	GND 3	30	259.000,00	259.971,60					Pago até o ano anterior	R\$ -
						R\$ 100.000,00	R\$ 971,60		R\$ 100.971,60	A realizar no exercício	R\$ 259.000,00
						R\$ 159.000,00			R\$ 159.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
										Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 259.000,00	R\$ 971,60		R\$ 259.971,60	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
										Saldo a liberar	R\$ 159.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	23/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/08/2016	13/01/2017	-	22/08/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	22/08/16	13/03/17	-	22/08/16	13/03/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/03/2017	30/01/2018	R\$ 259.000,00	24/03/2017		R\$ 0,00	22%	Em Andamento		
7	Depósito de parcela única de contrapartida	Depósito da parcela única da contrapartida.	Município de Parazinho	01/03/17	31/03/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	OCF /CGAF / DA	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	31/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Parazinho	16/08/17	30/08/17	R\$ 100.000,00	22/08/17			20%	Atrasado	O município não inseriu registro de pagamentos no Siconv	Cobrado ao município celeridade na execução da etapa

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	OCF /CGAF / DA	01/09/17	15/09/17	R\$ 159.000,00				0%	A Iniciar		
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Parazinho	16/09/17	30/12/17	R\$ 159.000,00				0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/12/17	30/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/02/2018	23/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/02/18	23/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 259.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	42%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Parazinho/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836220/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.8
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação do PPA:	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):			
Projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.		
Objetivo do projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN como meio de fomento e consolidação da agricultura urbana orgânica no município de Natal com vistas a beneficiar e potencializar o mercado de pequenos produtores de hortifrutis orgânicos das comunidades de Gramorezinho e Planalto, localidades inseridas na Mancha de Interesse Social e por conseguinte na Área Especial de Interesse Social 03 de Segurança Alimentar, definidas no macrozoneamento do Plano Diretor de Natal, Lei Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 4 (4440.42)		1.000.000,00	1.020.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		R\$
DEZ/2016	523.012,50	20.000,00	543.012,50	Pago até o ano anterior	-
FEV/2017	446.112,50	--	446.112,50	A realizar no exercício	R\$ 1.000.000,00
ABR/2017	30.875,00	--	30.875,00	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
TOTAL	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos, Maria Helena Lima, Victor Uchôa Silva, José Aildo Sabino - SUDENE; Karenine Dantas Monteiro - Prefeitura de Natal/RN.
---	---

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	16/03/2016	16/03/2016	--	16/03/2016	16/03/2016	--	100%	Concluído		
2	Proposta/Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação Proposta/Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/2016	12/03/2016	--	12/03/2016	12/03/2016	--	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	01/03/2017	28/06/2017	--	01/03/2017	27/06/2017	--	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/2016	04/11/2016	--	03/11/2016	03/11/2016	--	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/2016	30/12/2016	--	30/12/2016	30/12/2016	--	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/2017	13/01/2017	--	13/01/2017	13/01/2017	--	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)				R\$ 1.000.000,00				0%	Atrasado		
7	Depósito de parcela única da contrapartida	Depósito de parcela única da contrapartida	Município de Natal/RN	01/12/2016	31/12/2016		--	--	--	0%	Atrasado	Município ainda não realizou depósito por dificuldades operacionais	Informado e cobrado ao município depósito da contrapartida
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção pela Concedente da 1ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/12/2016	31/12/2016	R\$ 523.012,50	--	--	--	0%	Atrasado	Município não atendeu aos requisitos para liberação dos recursos	Informado e cobrado ao município depósito da contrapartida
9	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira	Município de Natal/RN	30/12/2016	31/05/2017	R\$ 523.012,50	--	--	--	0%	Atrasado		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação pela Concedente da 2ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/02/2017	28/02/2017	R\$ 446.112,50	--	--	--	0%	Atrasado		
11	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio	Município de Natal/RN	31/05/2017	30/09/2017	R\$ 446.112,50	--	--	--	0%	A Iniciar		
12	Liberação da 3ª parcela	Liberação pela Concedente da 3ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/04/2017	30/04/2017	R\$ 30.875,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
13	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana)	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana)	Município de Natal/RN	01/06/2017	31/12/2017	R\$ 30.875,00	--	--	--	0%	A Iniciar		
14	Visita de técnica de recebimento do Objeto	Visita de técnica de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/2018	31/01/2018	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	01/03/2018	24/02/2019	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:			20,0%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Município de Natal/RN

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.172.497,00	1.234.957,85

Previsão de Conclusão:	28/03/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 222.955,29	R\$ 6.819,30		R\$ 229.774,59	A realizar no exercício	R\$ 1.172.497,00
R\$ 352.000,00	R\$ 5.672,87		R\$ 357.672,87	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 352.000,00	R\$ 24.984,34		R\$ 376.984,34	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 245.541,71	R\$ 24.984,34		R\$ 270.526,05	Valor liberado no Exercício	R\$ 222.955,29
				Saldo a liberar	R\$ 949.541,71
R\$ 1.172.497,00	R\$ 62.460,85		R\$ 1.234.957,85	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 222.955,29

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		08/03/2016	30/05/2017	-	08/03/2016	21/09/2016	-	20%	Concluído	
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído	
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído	
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/04/16	08/08/16	-	06/04/16	08/08/16	-	100%	Concluído	
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído	
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	06/09/16	06/09/16	-	06/09/16	06/09/16	-	100%	Concluído	
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/09/16	21/09/16	-	21/09/16	21/09/16	-	100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	04/03/2018	R\$ 1.172.497,00	24/03/2017		R\$ 222.955,29	18%	Em Andamento	
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/04/17	15/04/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído	
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 222.955,29	13/07/17	13/07/17	R\$ 222.955,29	100%	Concluído	
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/07/17	30/08/17	R\$ 222.955,29	14/07/17	30/08/17	R\$ 222.955,29	100%	Concluído	
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	15/05/17		22/05/17	22/05/17		100%	Concluído	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 352.000,00				0%	A Iniciar	

12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/09/17	30/10/17	R\$ 352.000,00				0%	A Iniciar		
13	Depósito da 3ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/09/17	15/09/17					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	15/11/17	R\$ 352.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/11/17	30/12/18	R\$ 352.000,00				0%	A Iniciar		
16	Depósito da 4ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/11/17	15/11/17					0%	A Iniciar		
17	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	15/01/18	R\$ 245.541,71				0%	A Iniciar		
18	Pavimentação das Vias (Parte 4)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/01/18	01/02/18	R\$ 245.541,71				0%	A Iniciar		
19	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	02/02/18	04/03/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		02/04/2018	28/03/2019	-				0%	A Iniciar		
20	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	02/04/18	28/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 1.172.497,00	alor realizado:		R\$ 222.955,29	38%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de São Gonçalo do Amarante/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828296/2016 - Proposta nº 007532/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
	100	GND 3	30	600.000,00	611.924,74	R\$ 100.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 106.000,00	A realizar no exercício	R\$ 600.000,00
						R\$ 300.000,00	R\$ 5.924,74		R\$ 305.924,74	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 600.000,00	R\$ 11.924,74		R\$ 611.924,74	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
										Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	
										Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	24/06/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/09/2016	13/01/2017	-	06/09/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	06/09/16	04/11/16	-	06/09/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	06/09/16	25/11/16	-	06/09/16	25/11/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/09/16	07/02/17	-	06/09/16	07/02/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/02/2017	30/05/2018	R\$ 600.000,00	18/04/2017		R\$ 0,00	20%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/02/17	28/02/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	30/08/17	R\$ 100.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/09/17	30/09/17	R\$ 100.000,00				0%	A Iniciar		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito de 2ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	30/05/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído	O município depositou a segunda parcela da contrapartida em conjunto com a primeira	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/17	30/10/17	R\$ 300.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/11/17	30/11/17	R\$ 300.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	31/12/17	R\$ 200.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/01/18	30/04/18	R\$ 200.000,00			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/05/18	30/05/18	-			R\$ 0,00	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/06/2018	24/06/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/06/18	24/06/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 600.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de São Gonçalo do Amarante/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 838038/2016 - Proposta nº 28265/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	251.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 125.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 126.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 125.000,00			R\$ 125.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 125.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 125.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 251.000,00	Saldo a Empenhar no exercício	
				Total Liberado até o exercício	R\$ 125.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/07/2016	13/01/2017	-	18/07/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2016	31/01/2018	R\$ 250.000,00	17/07/2017		R\$ 0,00	20%	Em Andamento		
7	Depósito da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lucrécia/RN	01/12/16	31/12/17		17/07/17	17/07/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	31/12/17	17/07/17	R\$ 125.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 125.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Lucrécia/RN	18/07/17	30/09/17	R\$ 125.000,00				0%	A Iniciar		
10	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/17	30/10/17	R\$ 125.000,00				0%	A Iniciar		
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Lucrécia/RN	01/11/17	31/12/17	R\$ 125.000,00				0%	A Iniciar		

12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	31/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 125.000,00	40%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:													
Município de Lucrecia/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836181/2016 - Proposta nº 026883/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	R\$ 253.654,75

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 103.654,75	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 253.654,75	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Marcelo Saiki Braga
---	--

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	13/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	22/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	30/01/2018	R\$ 250.000,00	03/08/2017		R\$ 70.000,00	27%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lagoa Danta	01/08/17	15/08/17		03/08/17	03/08/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Lagoa Danta	16/08/17	30/11/17	R\$ 100.000,00	22/08/17		R\$ 70.000,00	70%	Em Andamento		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	15/12/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Lagoa Danta	16/12/17	31/12/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/12/17	30/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	47%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Lagoa Danta/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828295/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	503.901,97

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 3.901,96		R\$ 503.901,96	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	16/12/2018
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Victor Uchôa Ferreira da Silva
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		01/03/2016	30/11/2016	-	01/03/2016	30/11/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	03/05/17	19/05/17	-	03/05/17	19/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	22/11/16	22/11/16	-	22/11/16	22/11/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	30/11/16	30/11/16	-	30/11/16	30/11/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	23/11/2017	R\$ 500.000,00	10/08/2017		R\$ 0,00	27%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/08/17	15/08/17		10/08/17	10/08/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	30/08/17	30/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Jucurutu	16/08/17	30/08/17	R\$ 250.000,00	01/09/17			20%	Atrasado	O município não atendeu aos requisitos para liberação da 1ª parcela no prazo previsto, o que acarretou no atraso da execução; Não foi inserido documentos da licitação no Siconv e nenhum gasto foi registrado	Aguardando município concluir a execução da licitação e informar status da obra; comunicado ao município
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/09/17	15/09/17					100%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Jucurutu	16/09/17	22/10/17	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDEN E	23/10/17	23/11/17	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		21/12/2017	16/12/2018	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDEN E	21/12/17	16/12/18	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:	R\$ 250.000,00	47%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Jucurutu/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828297/2016 - Proposta nº 004041/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Deficiência na coleta de lixo do município		
Projeto:	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo em Campo Redondo/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida e higiene à população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	258.333,33

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	20/02/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		11/03/2016	13/01/2017	-	11/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/03/16	11/04/16	-	11/03/16	11/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/03/16	22/04/16	-	11/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação do Termo de Referência	CGDS/SUDENE	05/04/16	12/07/16	-	05/04/16	12/07/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	27/01/2018	R\$ 250.000,00	11/05/2017		R\$ 0,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito da Parcela única da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Campo Redondo	01/05/17	15/05/17		11/05/17	11/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção dos recursos	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
9	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo	Município de Campo Redondo	16/08/17	27/12/17	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	28/12/17	27/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		25/02/2018	20/02/2019	-				0%	A Iniciar		

14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	25/02/18	20/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:			50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Campo Redondo/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828300/2016 - Proposta nº 010961/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	526.970,57

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,29		R\$ 263.485,29	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,28		R\$ 263.485,28	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 26.970,57		R\$ 526.970,57	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 250.000,00
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	24/09/2019
Data Atualização:	31/08/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Marcelo Saiki Braga
---	---

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/07/2016	01/03/2017	-	28/07/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	28/07/16	16/06/17	-	28/07/16	16/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/07/2017	31/08/2018	R\$ 500.000,00	19/07/2017		R\$ 0,00	9%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela 1ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	01/07/17	15/07/17		19/07/17	19/07/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00				0%	Atrasado	O MI não repassou à Sudene o recurso referente à 1ª Parcela	Recurso solicitado ao MI
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Município de Upanema	16/08/17	30/12/17	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
10	Depósito de Parcela 2ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	01/12/17	15/12/17					0%	A Iniciar		
11	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	15/01/18	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Município de Upanema	16/01/18	31/07/18	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		

13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/08/18	31/08/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/09/2018	24/09/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/09/18	24/09/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	29%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros Institucionais:												
Município de Upanema/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 839953/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
