



SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

# Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

**4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação  
2015**

Recife  
17 de dezembro de 2015

## Sumário

	Pág.
Introdução .....	3
1 – Resultados do monitoramento .....	7
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) .....	11
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais .....	25
4 – Indicadores de Gestão de Convênios .....	32
5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos .....	44
6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos .....	47
7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) - Resultado out/2014 - set/2015	50
8 – Observações e Deliberações em plenária de 17/11/2015 .....	52
9 – Conclusão .....	54
Anexo I – Quadros do monitoramento .....	56
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira até nov/2015 .....	176
Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE .....	178
Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015 .....	183

## Introdução

Em 17 de dezembro de 2015 foi realizada a quarta reunião de monitoramento de 2015 e com este ciclo foi encerrado o conjunto de eventos programados para 2015. Conhecidas como ciclos, por que envolvem períodos de acompanhamento que culminam com as reuniões de apresentação dos resultados neles alcançados, estas reuniões têm por fulcro informar ao Superintendente, Diretores e compartilhar com os demais gestores e técnicos da Autarquia, a situação de cada projeto, as razões de algum atraso e, particularmente, providências/encaminhamentos que estão a demandar posição da administração superior. Portanto, trata-se de um processo proativo, que visa inclusive, e quando necessário, oferecer alternativas preventivas a possíveis riscos ao alcance dos objetivos desses projetos, e consequentemente, contribuir para se aquilatar a execução da programação estratégica. Trata-se hoje, de um dos processos mais importantes para a melhoria da gestão e a garantia da transparência.

Desta vez foram 73 os projetos tabulados no que se denominam Planos Operativos, assim chamados por que trata-se do “operacional” da casa no momento do monitoramento. Desses, 57 foram enquadrados como finalísticos e 16 como de apoio. Cada projeto, como sempre, é previamente detalhado em um quadro com os principais aspectos de sua execução, particularmente o problema a que se destina resolver no escopo da diretriz estratégica. Nele encontram-se ainda, informações sobre o que justifica a sua execução, prazos, instâncias administrativas e servidores responsáveis e envolvidos na coordenação e na execução, além de dados sobre o orçamento destacado para a execução e a evolução financeira. Neste ciclo foi mostrada a evolução alcançada até novembro de 2015.

Segundo a origem, foram apresentados 4 planos operativos (POs) da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI/Superintendência); 12 da Diretoria de Administração (DAD); 26 da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); e 31 da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN), todos, projetos em implantação pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Por sua vez, buscando otimizar as discussões, foram priorizados na reunião apenas os que apresentavam algum problema de execução, dificuldade de acompanhamento, dependiam de decisões de agentes externos para sua conclusão ou eram importantes para futuras replicagens. Nesse sentido, as unidades selecionaram 18 projetos dos quais 13 finalísticos e 5 de apoio.

A reunião foi aberta pelo Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Sérgio Alencar, representando o Superintendente João Paulo, em missão no estado de São Paulo. Saudando a todos, Sérgio Alencar enalteceu a importância do momento.

A foto adiante mostra os primeiros momentos da reunião.



Foto 1 – Abertura da reunião do 4º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE no dia 17/12/2015, pelo Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Sérgio Alencar, com os primeiros comentários.

Na foto a seguir o Coordenador-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Carlos Almiro, está detalhando a evolução dos principais projetos de sua unidade.



Foto 2 – Explanação do Coordenador-Geral da CGDS, Carlos Almiro, sobre os projetos de sua unidade, os desdobramentos para o futuro, e medidas necessárias para conferir maior segurança e a melhoria da gestão dos projetos de sua unidade.

O grande destaque dos gestores concentrou-se na preocupação com o acompanhamento dos projetos face à escassez de recursos para as vistorias de convênios e o incomodo com a possibilidade de liberação de recursos sem que essas vistorias venham a ser viabilizadas, ademais das incertezas com o futuro desses projetos nessas condições, como já aventa a secretaria de Orçamento Federal no orçamento de 2016.



Foto 3 – Explanação do técnico Marcelo Viana, da CGDS/DPLAN, sobre os problemas que estão afetando a execução dos projetos do Programa 2040, Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, do PPA.

Desta reunião participaram 29 servidores, entre gestores e técnicos, oportunidade em que cada unidade, além de ouvir recomendações do Diretor de Planejamento sobre a necessidade de se evitar ou minimizar os riscos para a execução, pode compartilhar suas expectativas para 2016 diante do quadro de contenção orçamentária apresentado pelo Governo Federal.

A metodologia do monitoramento continuou a mesma, com as unidades enviando os seus planos operativos à Coordenação-Geral de Gestão Institucional para serem analisados quanto à consistência obedecendo prazos previamente estabelecidos. Na sequência, cada unidade foi articulada para proceder aos devidos ajustes. O meio para isso foram reuniões prévias de esclarecimento, condição para a consolidação das apresentações. A apresentação do projeto na reunião foi feita pela própria unidade, cabendo ao técnico responsável pelo projeto as devidas explicações. Durante a reunião os problemas são apresentados e decisões são deliberadas. As questões mais complexos são levadas à discussão em reunião da Diretoria Colegiada. Essa prática em que pese ocorrer desde dezembro de 2012 está sempre sendo melhorada. Por exemplo, todo o portfólio de 73 projetos foi previamente enviado a todos, já revisado e consolidado, mas o que é levado à reunião foi previamente selecionado pelas próprias unidades e apresentado em “data show” em quadros resumidos. Além disso, cada ciclo tem ao final um relatório como o que ora está sendo lido, onde constam também diversos indicadores de capacidade e de produtividade que visam oferecer ao gestor a situação da dinâmica desses projetos no contexto do operacional de sua unidade.

Os planos operativos, ou projetos, que apresentaram etapas na situação de “Atraso”, desde que o prazo geral de execução não esteja vencido na data do “travamento das informações” foram considerados “Em Andamento” conforme definido em ciclos anteriores.

Relembra-se, também, que foi apropriado do Plano Plurianual do Governo Federal o conceito de “Medida Institucional Normativa (MIN)”, que é aquela que, de acordo com o PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.

Os referenciais para o enquadramento dos planos operativos na programação estratégica continuam os mesmos aprovados pela Diretoria Colegiada em sua 132<sup>a</sup> reunião, realizada em 27/02/2013, adiante reproduzidos:

**- Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**

**Objetivo 1.1** - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.

**Objetivo 1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva;

**Objetivo 1.3** – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;

**Objetivo 1.4** - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;

**Objetivo 1.5** - Fortalecer as administrações públicas.

**- Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos**

**Objetivo 2.1** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;

**Objetivo 2.2** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;

**Objetivo 2.3** - Promover a sustentabilidade ambiental;

**Objetivo 2.4** – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

**- Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**

**Objetivo 3.1** - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;

**Sub objetivo 3.1.1** – Reestruturar as unidades gestoras;

**Sub objetivo 3.1.2** – Modernizar a gestão;

**Sub objetivo 3.1.3** – Valorizar e qualificar os servidores;

**Objetivo 3.2** - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;

**Objetivo 3.3** – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

Nota:

- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

**- Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE**

**Objetivo 4.1** - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);

**Objetivo 4.2** – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

**Notas:**

- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.

- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês, sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

As diretrizes e objetivos estratégicos serão prorrogados até dez/2016 tendo em vista o realinhamento/atualização previsto para o próximo ano, já que a escassez orçamentária e a mudança da composição da Diretoria e da Superintendência inviabilizou essa medida.

Quanto ao desempenho institucional do período out/2014-set/2015, a Diretoria Colegiada da SUDENE aprovou na 210ª reunião realizada em 21 de outubro de 2015, e foi publicada no Boletim de Pessoal da SUDENE, a portaria nº 142, de mesma data. Ela também foi publicizada no site da Autarquia no endereço: <http://www.sudene.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/gestao-institucional> no final daquela página, juntamente com o detalhamento contido no anexo, que também encontra-se reproduzido em subitem específico deste relatório. No que tange ao resultado do desempenho institucional, foram alcançados 79 de um total que vai até 80 pontos, o melhor dos últimos quatro anos


Sobre a previsão para o período out/2015-set/2016, nos próximos dias deverão estar sendo submetidos à apreciação daquele colegiado. Nesse sentido, reuniões de orientação já foram realizadas com todas as unidades e com os Diretores.

As observações, deliberações e encaminhamentos da alta administração surgidas na plenária de 17/12/2015 constam de capítulo específico deste relatório, como também a programação de eventos para 2016.

## 1- Resultados do monitoramento

### 1.1- Resultados Gerenciais do 4º Ciclo de Monitoramento 2015

O Gráfico 1, adiante, visa mostrar o comportamento dos projetos quanto ao seu andamento entre o 1º e o 4º ciclo de monitoramento.

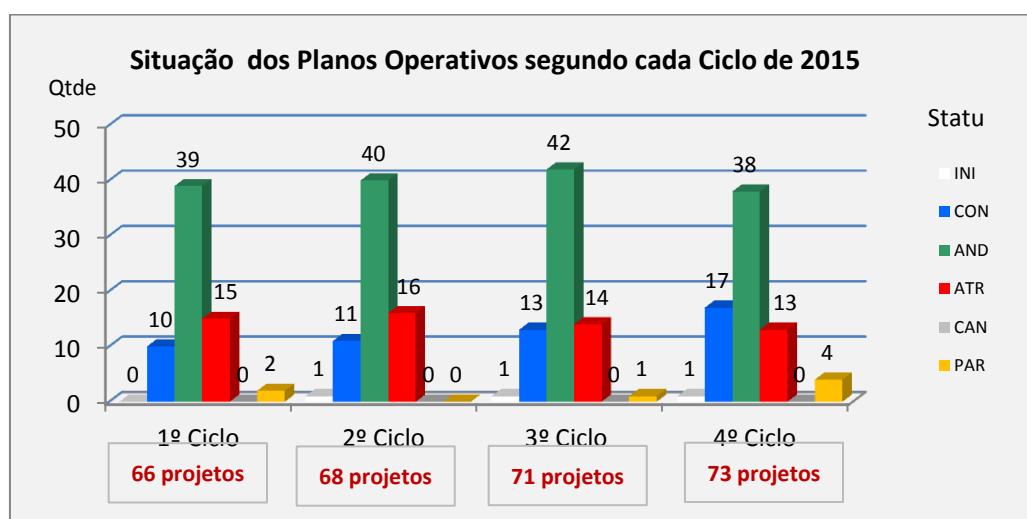

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2015

A Tabela 1 detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

**Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2015**

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico <sup>1</sup>	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status <sup>2</sup>						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	48	9.430.601,30	6.119.221,15	1	9	27	10	-	1	48
	1.2	1	0,00	0,00	-	1	-	-	-	-	1
	1.4	1	0,00	0,00	-	-	-	1	-	-	1
	1.5	2	234,11	139,87	-	1	1	-	-	-	2
<b>Sub-Total</b>		<b>52</b>	<b>9.430.835,40</b>	<b>6.119.361,02</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>52</b>
2	2.2	1	23.556,00	7.956,00	-	-	1	-	-	-	1
	2.3	3	1.366,31	723,39	-	1	1	1	-	-	3
	2.4	1	228,80	168,00	-	-	-	-	-	1	1
<b>Sub-Total</b>		<b>5</b>	<b>25.151,10</b>	<b>8.847,39</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
3	3.1	9	61,60	7,80	-	4	5	-	-	-	9
	3.2	4	3.563,96	3.334,10	-	1	2	1	-	-	4
	3.3	3	21.890,21	9.214,08	-	-	1	-	-	2	3
<b>Sub-Total</b>		<b>16</b>	<b>25.515,77</b>	<b>12.555,98</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	<b>9.481.502,28</b>	<b>6.140.764,39</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>73</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

**Convenções:**

1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e MIN – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

**Referência:** 30/11/2015 (4º Ciclo de monitoramento-2015)

De acordo com os dados acima, na data de referência mencionada na tabela, cerca de 23% dos projetos (13 em atraso e 4 paralisados) em relação ao total do portfólio, apresentam algum tipo de problema. Do total em atraso, 9 são do FDNE e referem-se ao caso de empreendimentos concluídos ao nível da SUDENE, mas que estão a mercê de procedimentos por parte dos agentes operadores, que requerem inclusive articulação da Diretoria Colegiada pois os argumentos oferecidos pelos agentes para a demora na emissão dos Certificados de Empreendimentos Implantados (CEI) não são claros ou convincentes. Por sua vez, metade dos projetos paralisados referem-se às obras de recuperação das fundações e modernização da subestação de energia. A primeira, devido a problemas contratuais da empresa Jatobeton. A segunda, devido ao contingenciamento orçamentário.

A Tabela 2 adiante, preparada para a mesma data de referência, detalha a distribuição dos 73 projetos segundo programas e ações do PPA 2012-2015, segundo o andamento de cada projeto.

**Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo  
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2015**

Programa do PPA <sup>1</sup> (Código)	Ação do PPA <sup>1</sup> (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R\$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	31	9.410.816,10	6.109.665,97		9	13	9			31
	20N7	2	1.114,59	427,15			2				2
	4640	2	2.252,99	1.509,74			2				2
	8689	2	1.366,31	723,39			1	1			2
	8902	7	12.232,50	3.849,33			7				7
	8917	2	617,75	107,35			1	1			2
	8340	2	2.857,02	2.857,02			2				2
	8918	1	694,46	694,46						1	1
	7K66	1	250,00	250,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>50</b>	<b>9.432.201,71</b>	<b>6.120.084,41</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
2040	8172	1	228,80	168,00						1	1
<b>Sub-Total</b>		<b>2</b>	<b>228,80</b>	<b>168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2111	2000	16	25.515,77	12.555,98		5	8	1		2	<b>16</b>
<b>Sub-Total</b>		<b>16</b>	<b>25.515,77</b>	<b>12.555,98</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
2069	-	1	23.556,00	7.956,00			1				1
<b>Sub-Total</b>		<b>1</b>	<b>23.556,00</b>	<b>7.956,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ações Internas		4	0,00	0,00	1	2		1			4
<b>Sub-Total</b>		<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	<b>9.481.502,28</b>	<b>6.140.764,39</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>73</b>

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

**Convenções:**

1– Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação;8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

2-INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

**Observações:**

a) Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.


**Referência:** 30/11/2015 (4º Ciclo de monitoramento-2015)

A tabela 2 revela que a maior parte dos projetos em atraso são do programa 2029, na ação 0355 do Programa 2029 do PPA, em razão da pendência com a emissão, por parte dos agentes financeiros do FDNE, com a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI). Também são dessa mesma ação do PPA, a maior quantidade de projetos concluídos ou em andamento.

Atenção especial da Diretoria Colegiada merecem os 4 projetos paralisados que envolvem recursos do orçamento. Neste caso, um é da ação 8918, que já teve todos os recursos liberados (R\$ 694,46 mil) referente ao projeto “PO 3-Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco” sob responsabilidade da

Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -CGDS/DPLAN, outro também da mesma unidade, enquadrado no Programa 2040, e na ação 8172, é o projeto “PO 21-Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba”. O valor orçamentário desse projeto é de R\$ 228,80 mil, dos quais R\$ 167,99 mil liberados. Na mesma situação estão dois projetos sob condução da Coordenação-Geral de Administração e Finanças-CGAF/DAD. O primeiro é o da “PO 68-Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE” no valor de R\$ 9.673,04 mil, dos quais R\$ 6.458,61 mil liberados. O outro é da “PO 69-Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE”, no valor de R\$ 4.663,52 mil dos quais R\$ 100 mil liberados. O detalhamento dos problemas será encontrado no quadro atinente a cada projeto.

O gráfico 2, adiante, foi elaborado com base nos dados da tabela 1. Ele ilustra o destaque da execução estratégica para os objetivos 1.1; 3.1 e 3.2.

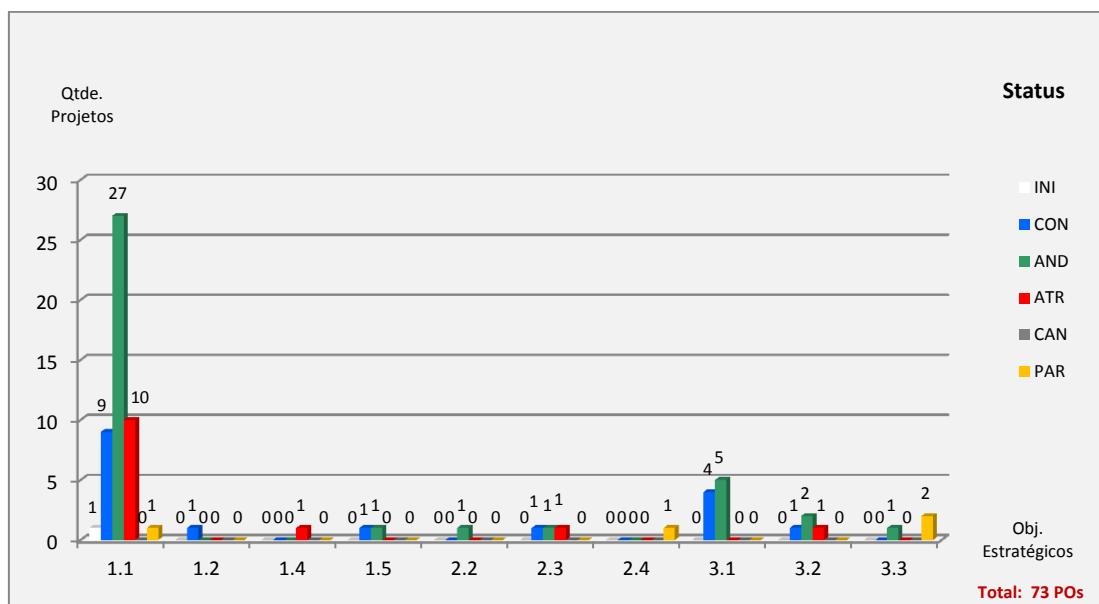


Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

**Convenções: Obj. Estratégicos:** **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **2.4**-Apoiar na atuação do sistema regional de defesa civil; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; **3.2**-Aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e garantir a segurança da informação e comunicação; **3.3**-Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.

**Gráfico 2 –** Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo – 2015)

Um outra forma de apresentação dos 73 projetos, ou POs como também são conhecidos, revela-se quando os sobreponemos ao organograma estabelecido pela estrutura regimental aprovada pelo Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014.

Nele pode-se observar que o maior número de projetos em execução, 57, encontra-se nas diretorias finalísticas. E por que essa distinção em relação a outras unidades administrativas, responsáveis por atividades meio, porém não menos importantes? Por que cabe a elas o cumprimento da finalidade institucional e da missão estratégica, apoiado em consistentes projetos.

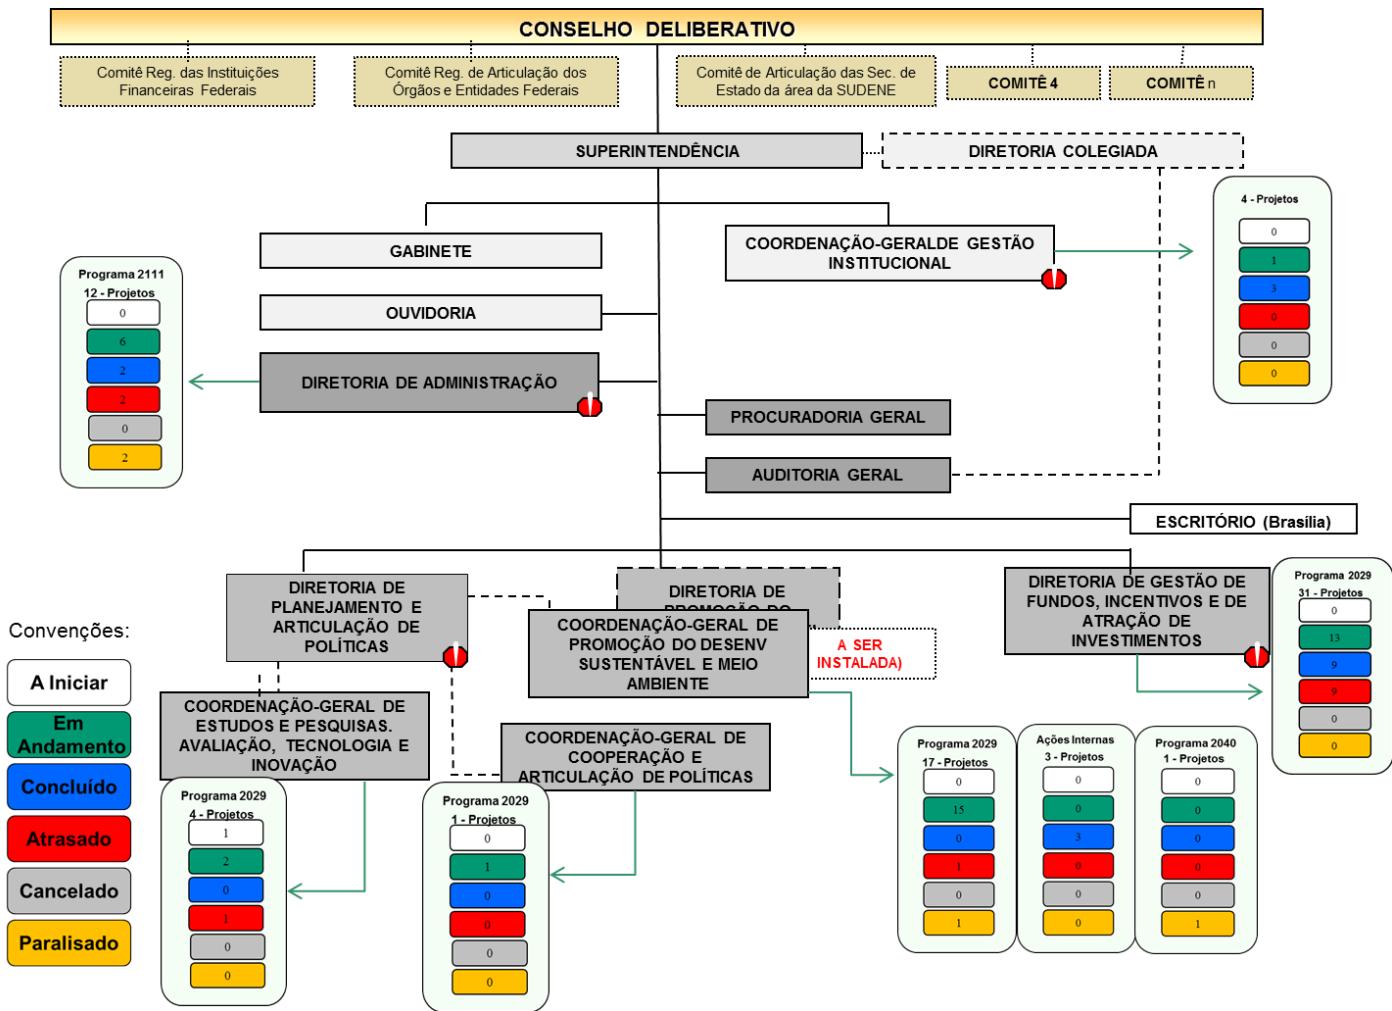

## 2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

### 2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC))

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{27 \times 100}{27} = 100,00 \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-nov/2015

f) Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	98,6 %	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica

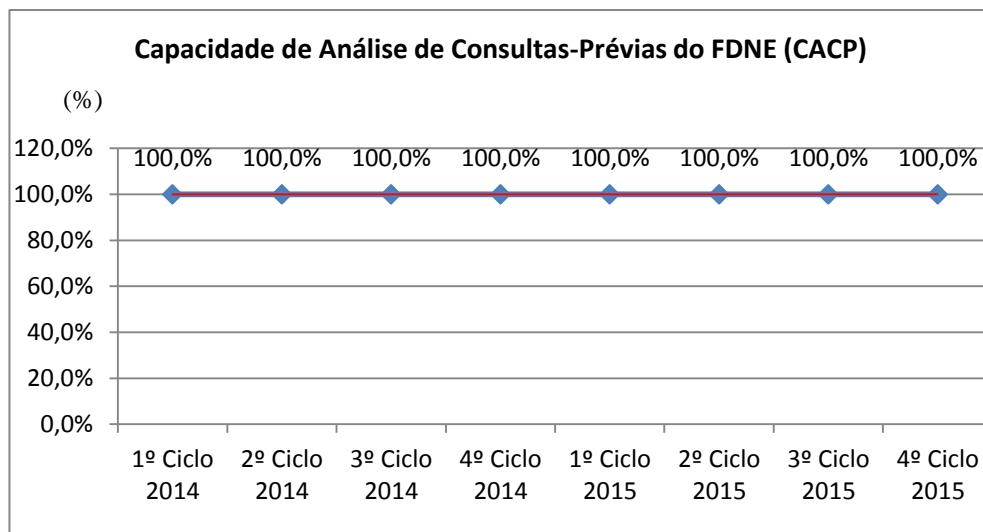

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Nota:**

<sup>1</sup> até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

**2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)**

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{27}{6} = 4,5$  análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2015

f) Comentários: -

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	2,05 análises/técnico	-
Jan a Nov/2012	0,67 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,43 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	1,67 análise/técnico	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

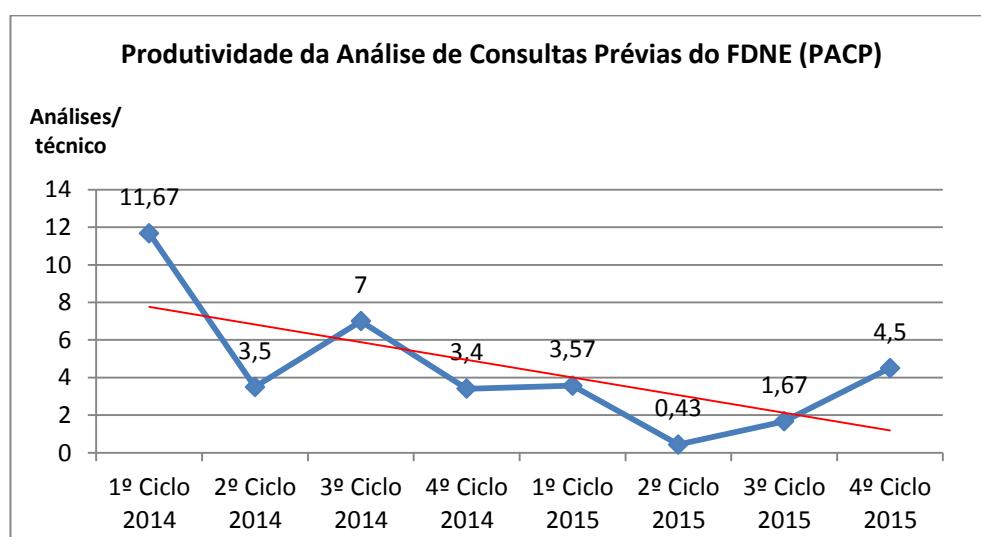

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### 2.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{17 \times 100}{27} = 63\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2015

f) Comentários: fazendo uma comparação entre os valores absolutos informados neste ciclo, em relação ao anterior, observou-se que o volume de devoluções de consultas prévias mais que quadruplicou (17 contra 4), para um volume de pleitos protocolados que aumentou em quase três vezes (27 contra 10 do ciclo anterior). O que chamou a atenção foi o crescimento dessas devoluções. Até a primeira apuração de 2015, representada pelo 2º ciclo, não haviam pleitos devolvidos.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	40,80 %	-
Jan a Nov/2012	100,00 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

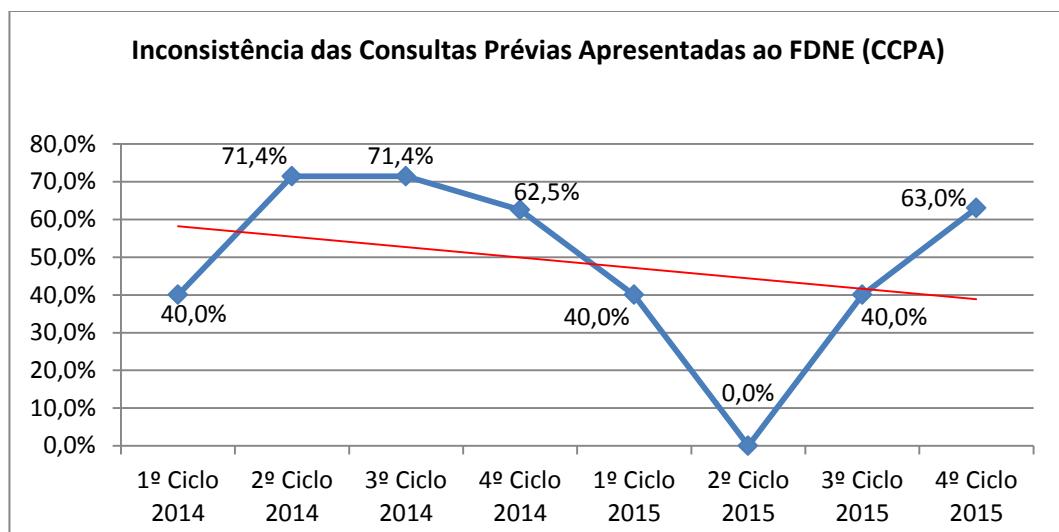

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

<sup>1</sup> Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

Atenção: A partir deste 4º ciclo o título do indicador passou a se chamar “Inconsistência das Consultas Prévias apresentadas ao FDNE (CCPA)” por adequar-se mais apropriadamente ao resultado apresentado.

## 2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{122 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,36$$

### a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula:  $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ..... (igual ou menor que 1 (um))


e) Periodicidade: Jan-nov/2015

f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:


Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE.	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

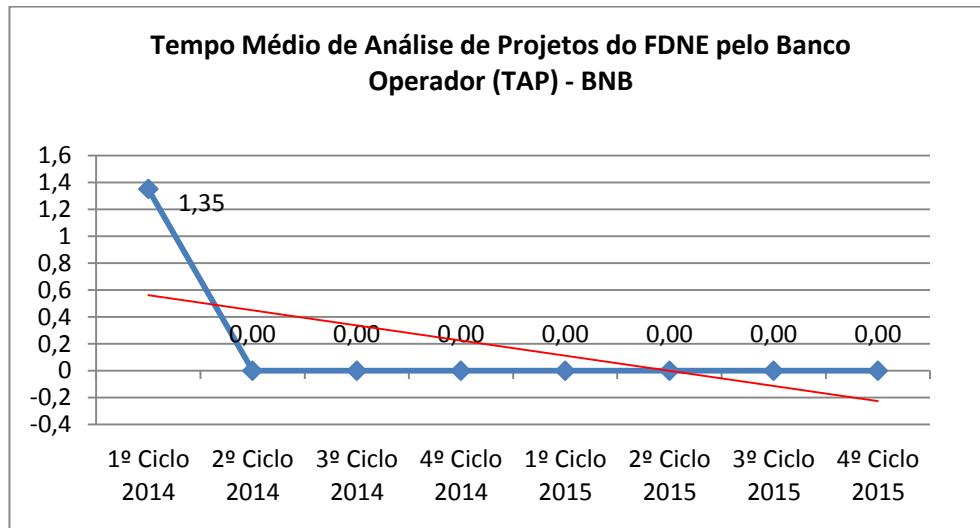


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

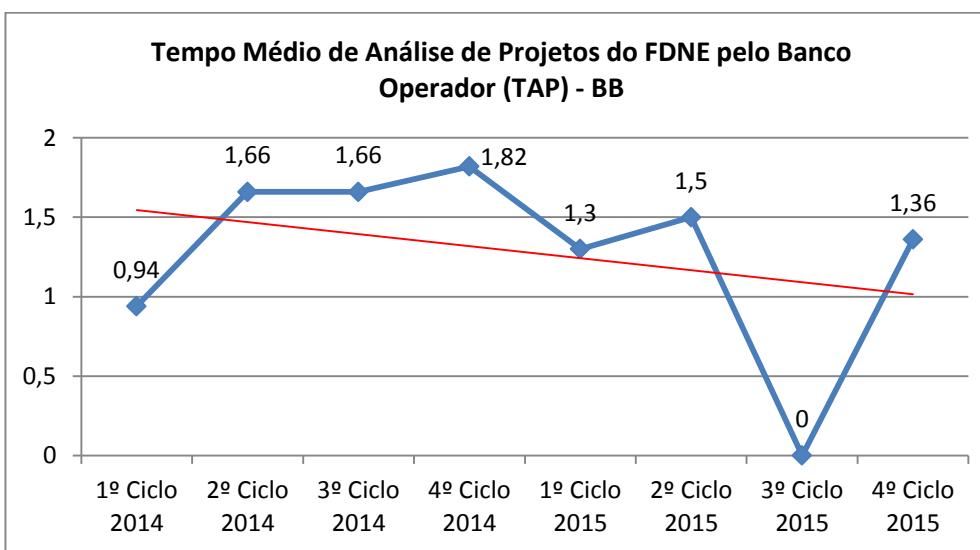

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

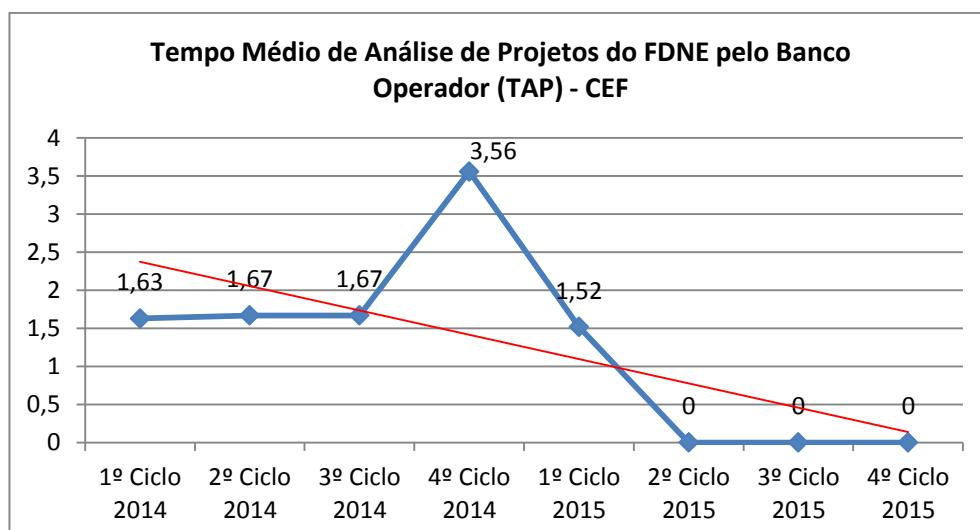

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## Notas

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

## 2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex- IPEP)

### a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

### a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{3 \times 100}{7} = 43\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.


### a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

- b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2015
- f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

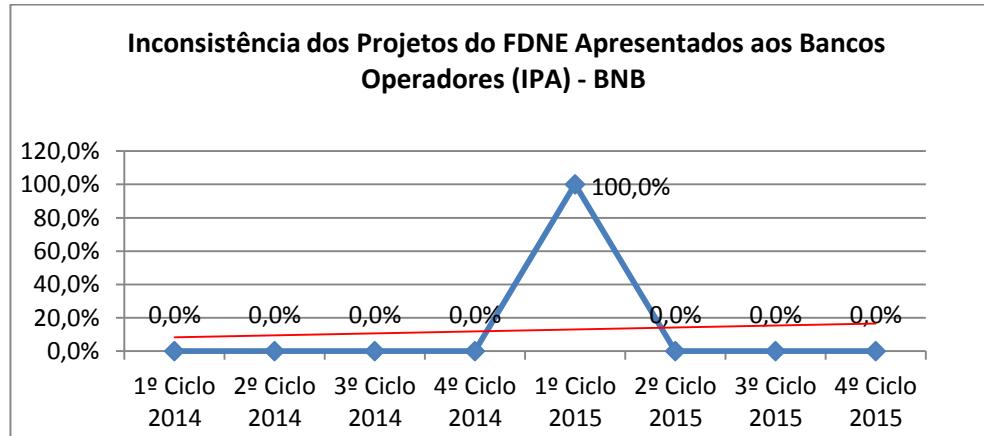


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

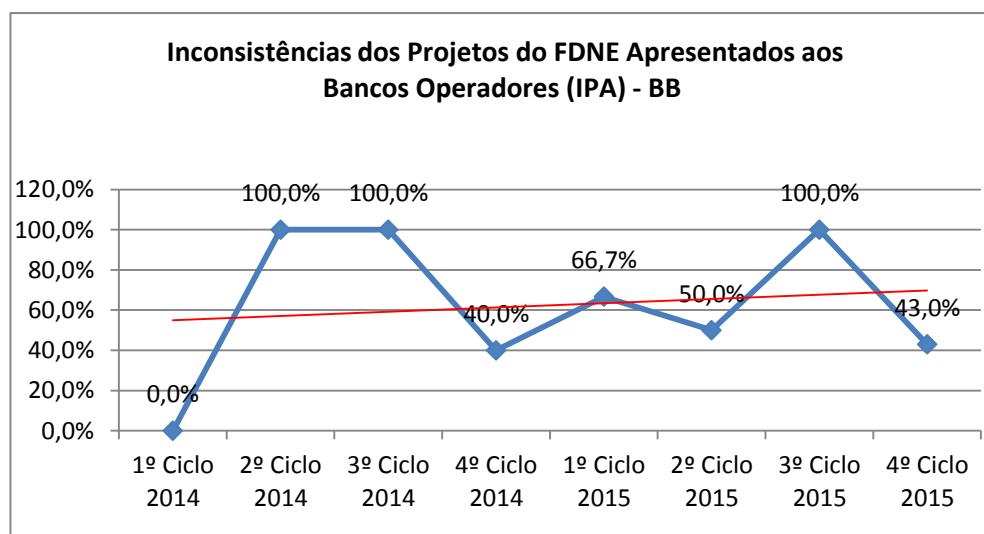

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

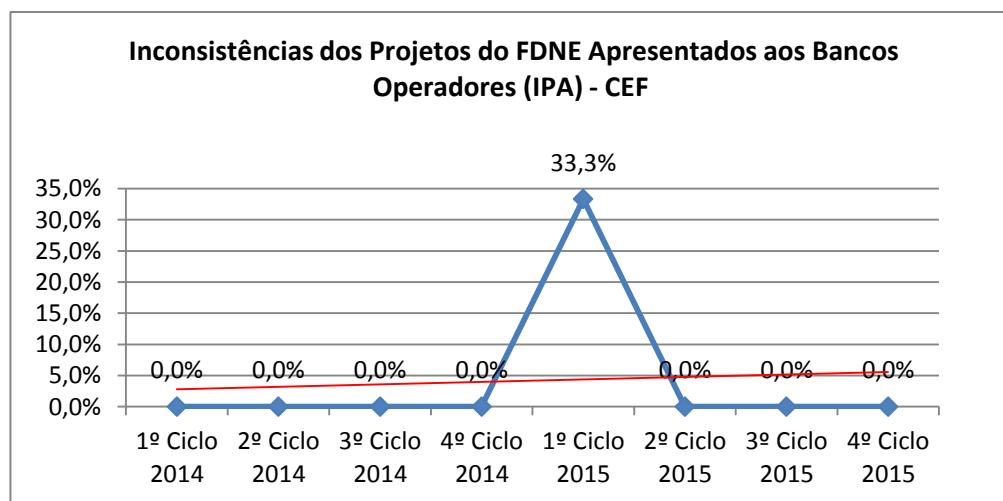

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2015} \times 100}{\text{Dotação LOA 2015}} = \frac{402.192.395,06 \times 100}{2.022.481.635,00} = 19,9\%$
- b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Periodicidade: Jan-nov/2015
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	100,0 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

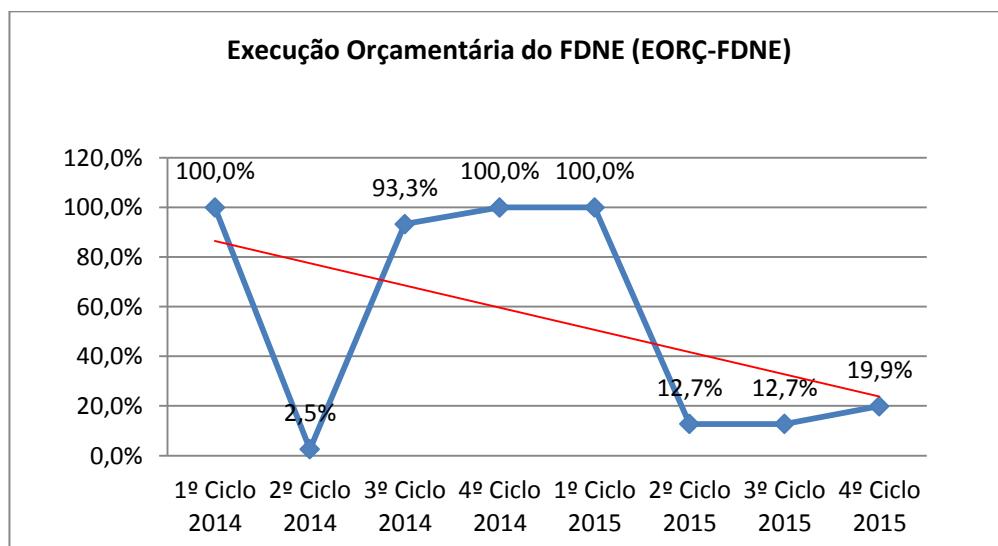


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento  
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{Recursos Lib. x 100}}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{738.895.409,15 \times 100}{4.165.761.987,26} = 17,74\%$
- b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 100,00 %
- e) Referência da aferição: jan-nov/2015
- f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	14,2 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

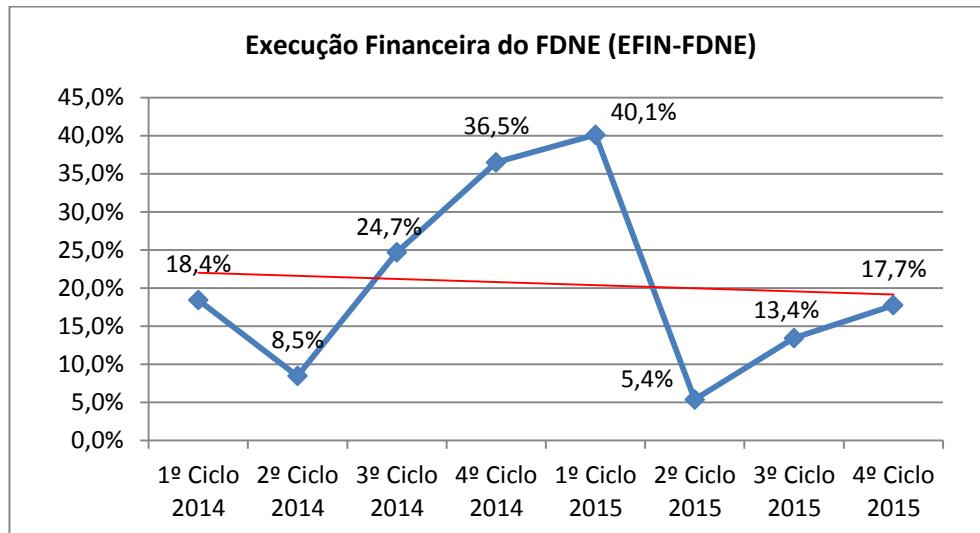

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{M_1}{30 \text{ dias}} = \frac{17,33}{30} = 0,58$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2015


f) Comentários: Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014

Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

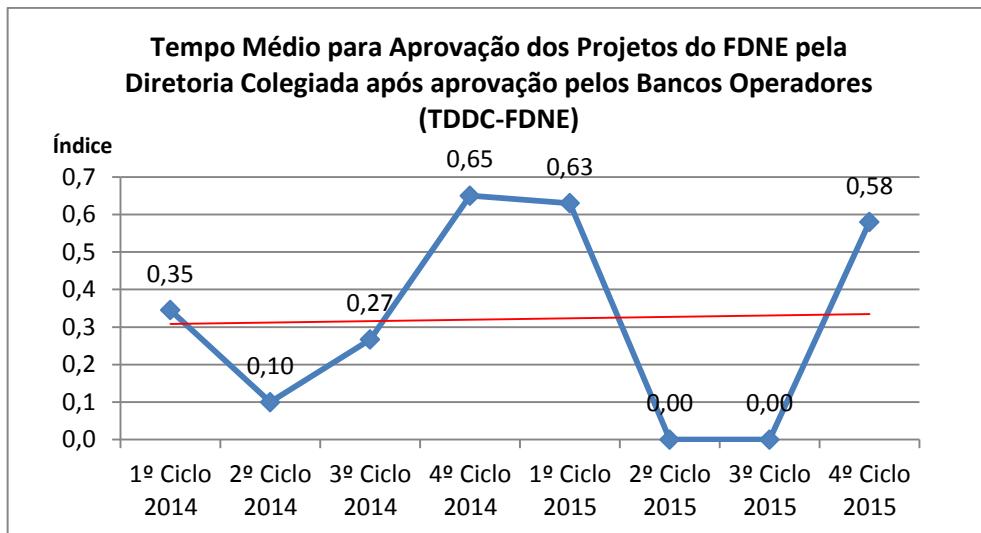

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### Convenção:

**M<sub>1</sub>** – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

#### Nota:

<sup>1</sup> 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

#### 2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula:  $Tm = \frac{T}{N} = \frac{886}{3} = 295,34$  dias/financiamento aprovado

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2015

f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

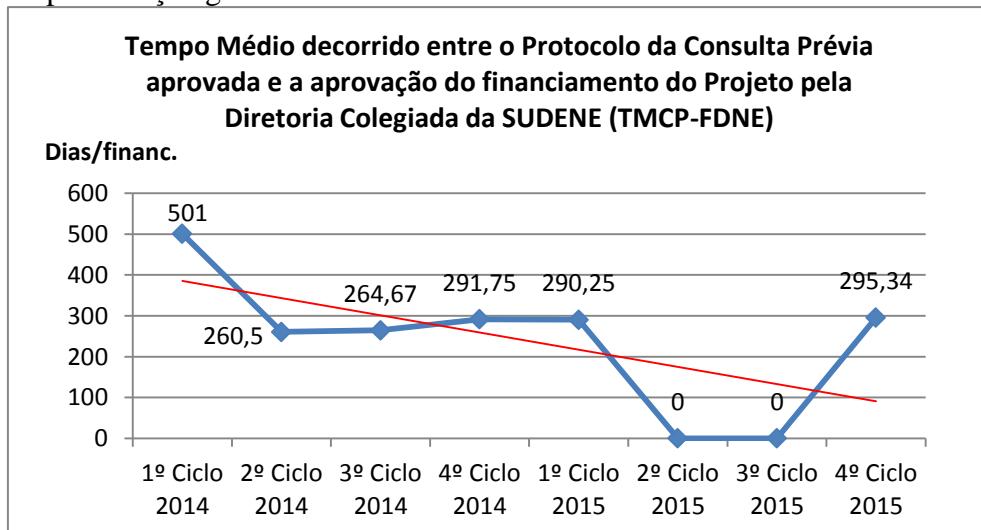

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **n** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).


#### 2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{3}{3} = 1,00$

- b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2015
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Cálculo prejudicado pelo aguardo do decreto de regulamentação do FDNE	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,0	3º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

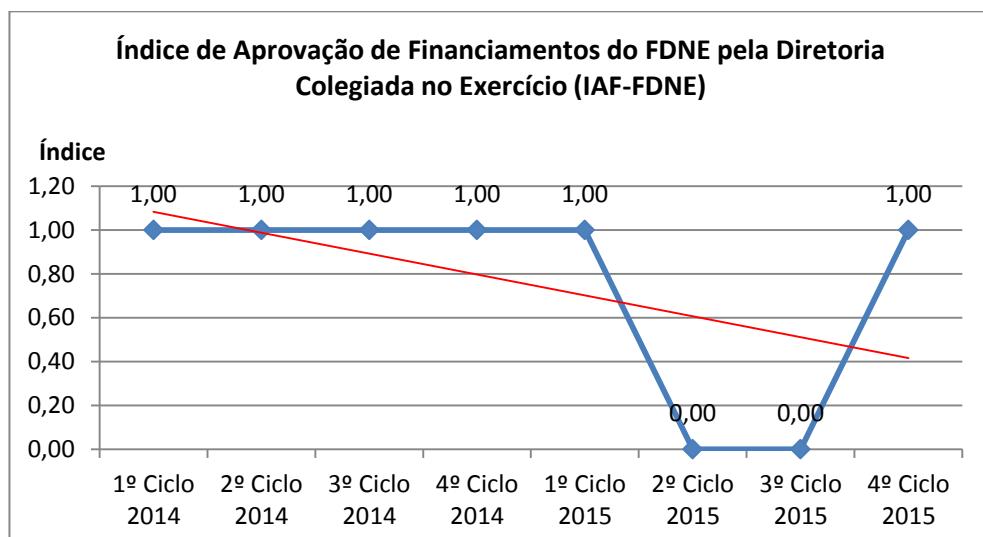

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Nota:** resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

### 3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

#### 3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- a) Fórmula: 
$$\frac{T_1}{N} = \frac{6117 \text{ dias}}{83 \text{ pleitos}} = 73,7 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- e) Periodicidade: jan-nov/2015.
- f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 30 de novembro de 2015, foram **vistoriados 83 estabelecimentos dos 110 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 73,7 dias**.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 210 dias (Aaron Indústria de Rótulos e Etiquetas Adesivas Ltda., estabelecida em Eusébio, no Ceará). O prazo mínimo, de 18 dias, foi observado no processo de interesse da empresa Bomar Maricultura Ltda.


O maior número de vistorias (24) situou-se entre 61 e 90 dias de espera e entre 91 a 120 dias (24). Entre 31 e 60 dias foram realizadas 18 vistorias.

Prazo em dias	Número de vistorias
Até 30 dias	12
De 31 a 60 dias	18
De 61 a 90 dias	24
De 91 a 120 dias	24
De 121 a 150 dias	4
De 151 dias a 180 dias	0
De 181 a 210 dias	1
Acima de 210 dias	0

- g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	64,60 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	72,9 dias/pleito	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

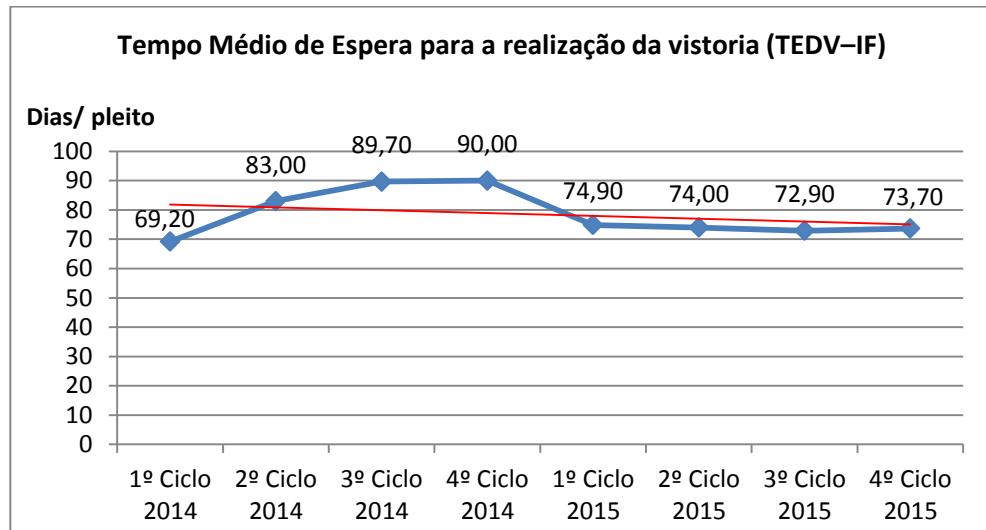

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

$T_1 = \Sigma$  do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.

$N$  = Número de pleitos vistoriados no período examinado

### 3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF\_UF-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{208} = 0,0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2015


f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	2,36 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013

Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

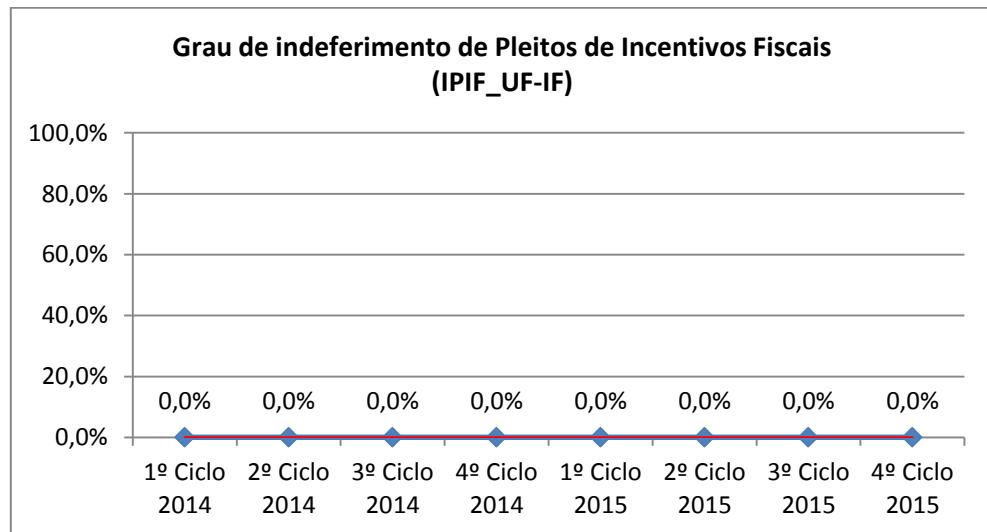

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.
- (3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

### 3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}}$

$$\frac{208 \times 100}{341} = 60,9 \%$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor


- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: no período, foram concluídas 208 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 60,9% dos pleitos ingressados.

Obs.: O desempenho do período janeiro/novembro, em relação ao observado até o mês de agosto sofreu acentuada queda, saindo da casa dos 70% para 60,9% tendo em vista a não realização de vistorias desde meados de maio de 2015, por força de restrições orçamentárias. A não realização de vistorias impede a conclusão das análises e interfere sensivelmente no desempenho da Unidade.

- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	77,16 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

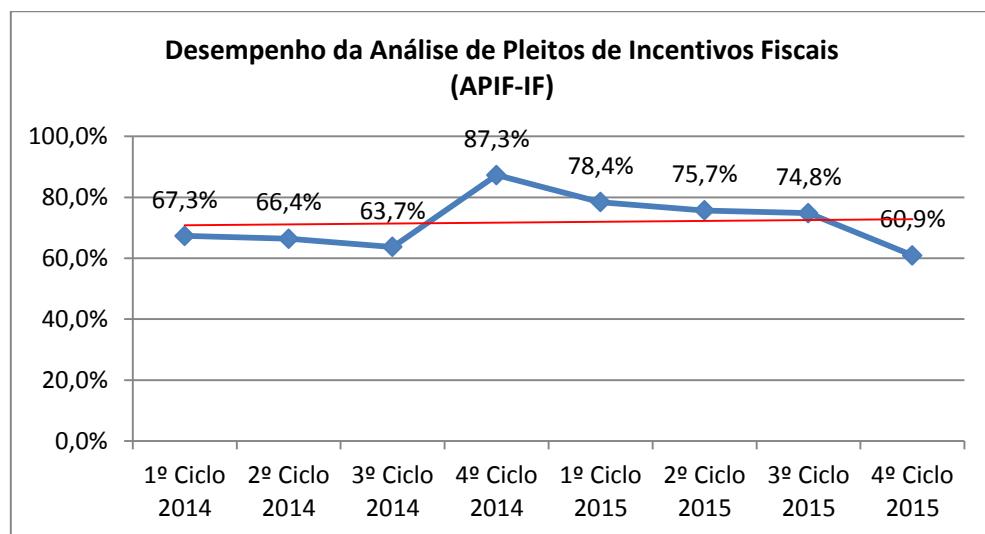

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### 3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{T1}{N} = \frac{17.024}{181} = 94,05$  dias/pleito


- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.
- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: o prazo médio observado, de **94,05 dias** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros oito meses de 2015.  
Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto com os processos de transferência de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados e aprovados anteriormente, quando do pedido inicial.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	53,86 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

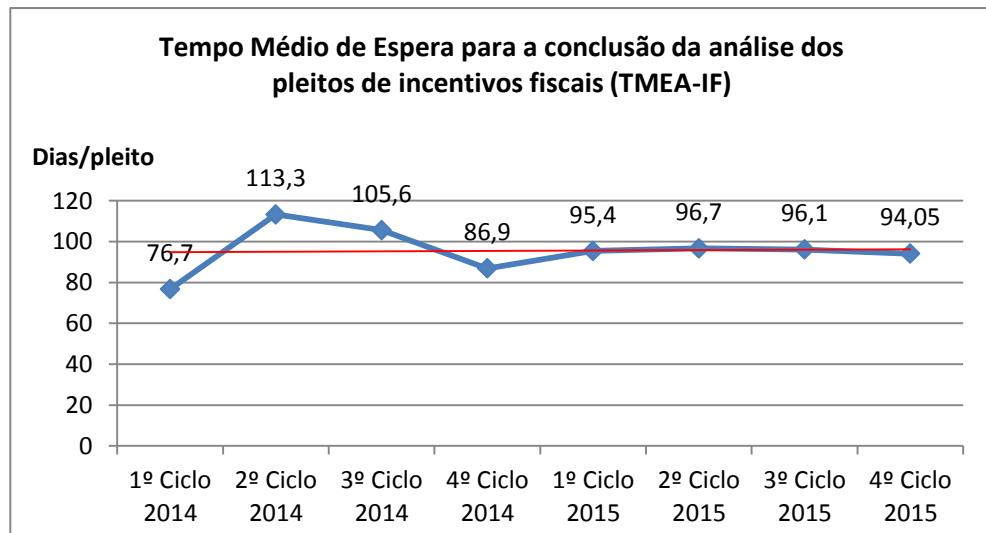

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:


$T1 = \Sigma$  do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

$N = \text{número de processos protocolados no período examinado.}$

### 3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

- a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{208}{21} = 9,9$
- b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: -
- g) Resultados anteriores:
- | Dez/2011       | Não existia o indicador | -                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Jan a Nov/2012 | 12,7 análises/técnico   | 1º e único ciclo 2012 |
| Jan a Dez/2012 | 14,4 análises/técnico   | 1º ciclo 2013         |
| Jan a mai/2013 | 9,6 análises/técnico    | 2º ciclo 2013         |
| Jan a ago/2013 | 15 análises/técnico     | 3º ciclo 2013         |
| Jan a nov/2013 | 21,6 análises/técnico   | 4º ciclo 2013         |
| Jan a dez/2013 | 29,8 análise/técnico    | 1º ciclo 2014         |
| Jan a mai/2014 | 8,5 análise/técnico     | 2º ciclo 2014         |
| Jan a ago/2014 | 15,1 análise/técnico    | 3º ciclo 2014         |
| Jan a Nov/2014 | 11,4 análise/técnico    | 4º ciclo 2014         |
| Jan a Dez/2014 | 15,4 análise/técnico    | 1º ciclo 2015         |
| Jan a mai/2015 | 5,2 análise/técnico     | 2º ciclo 2015         |
| Jan a Ago/2015 | 8,3 análise/técnico     | 3º ciclo 2015         |

- h) Representação gráfica:

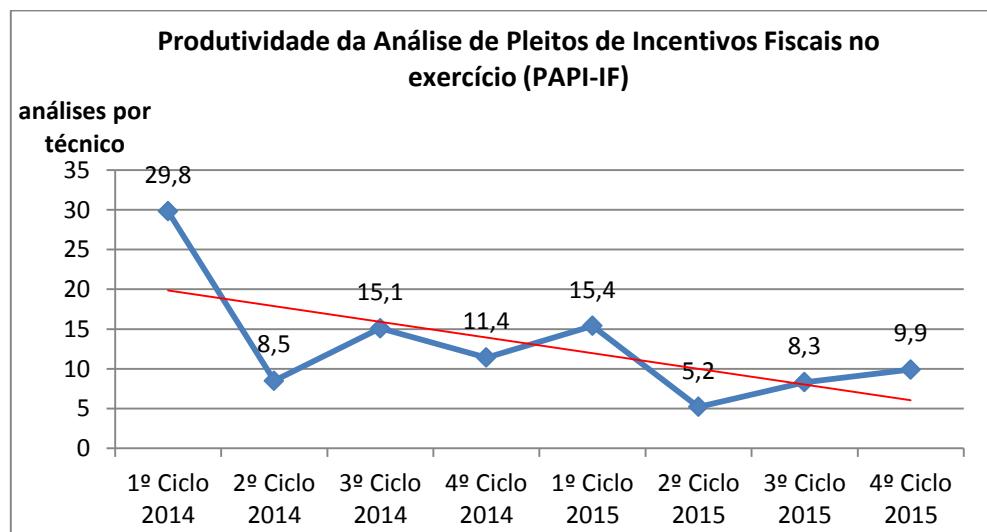

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros  
 Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

### 3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)


a) Fórmula:  $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} =$

$$= \frac{83}{10} = 8,3 \text{ vistorias/equipe}$$

- b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): .....(quanto maior melhor)
- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 83 vistorias de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.
- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,4 vistorias/equipe	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	7,5 vistorias/equipe	3º ciclo 2015

- h) Representação gráfica:

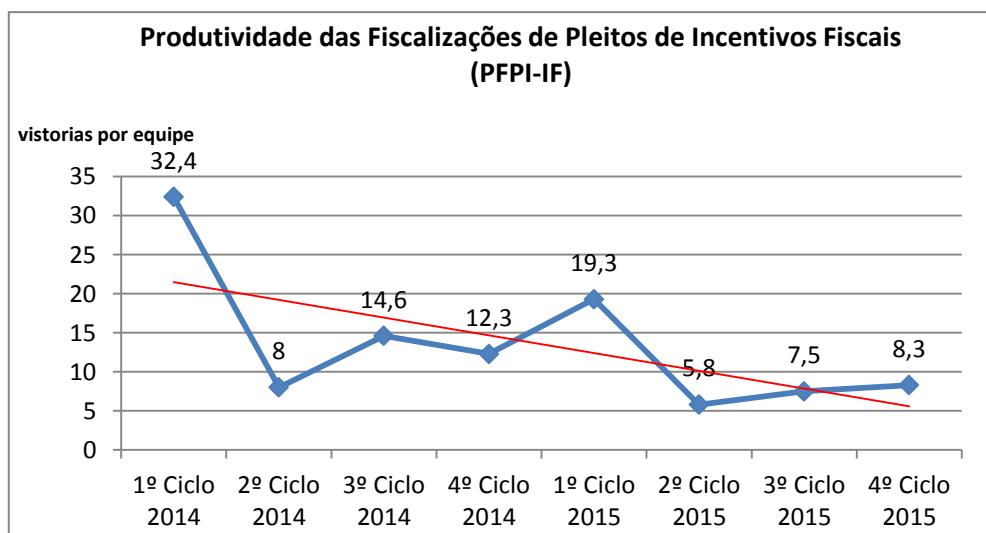

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

## 4 - Indicadores de Gestão de Convênios

### 4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{15 \times 100}{16} = 93,75\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: jan-nov/2015.

f) Comentários: Houve o recebimento de 16 propostas, das quais 15 foram analisadas.

h) Resultados Anteriores:

Dez/2011	100%	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015

g) Representação gráfica:

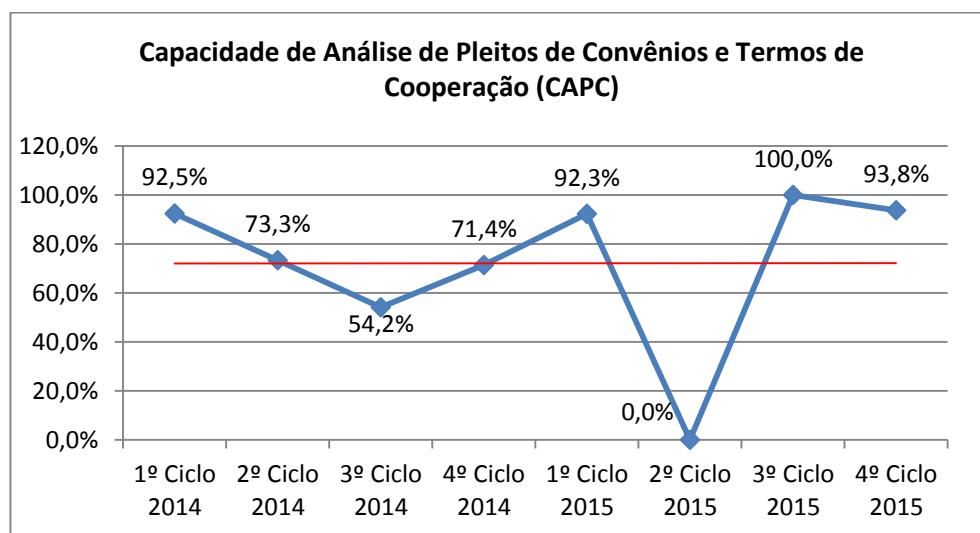

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{6 \times 100}{15} = 40\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: jan-nov/2015.

f) Comentários: Foram analisadas 15 propostas, das quais 6 foram aprovadas.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	14,6 %	-
Jan a Nov/2012	21,74 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

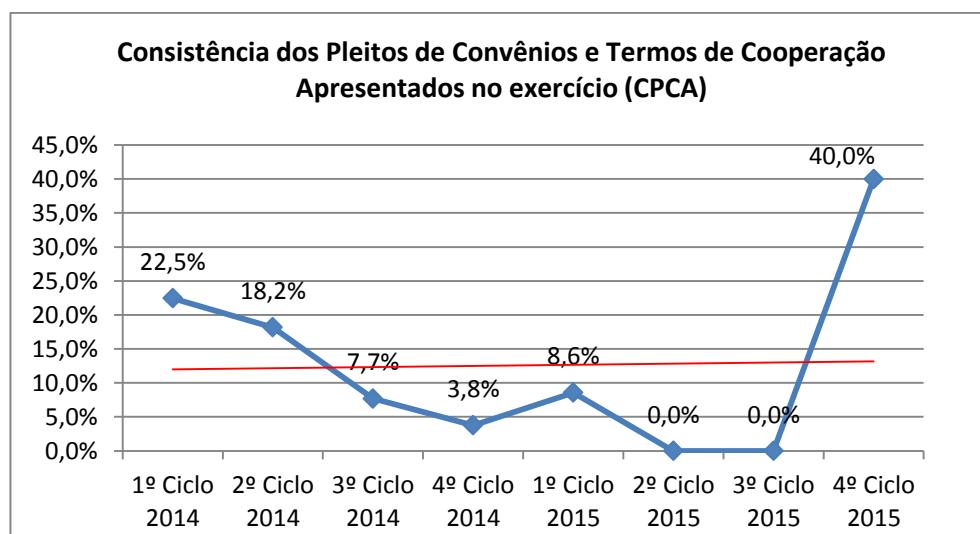

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.}}{\text{Pleitos protocolados no exercício}} \times 100 =$

$$= \frac{9 \times 100}{16} = 56,25 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: jan-nov/2015.

f) Comentários: 16 propostas foram recebidas, das quais se rejeitaram 9 pelos critérios técnicos.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,04 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

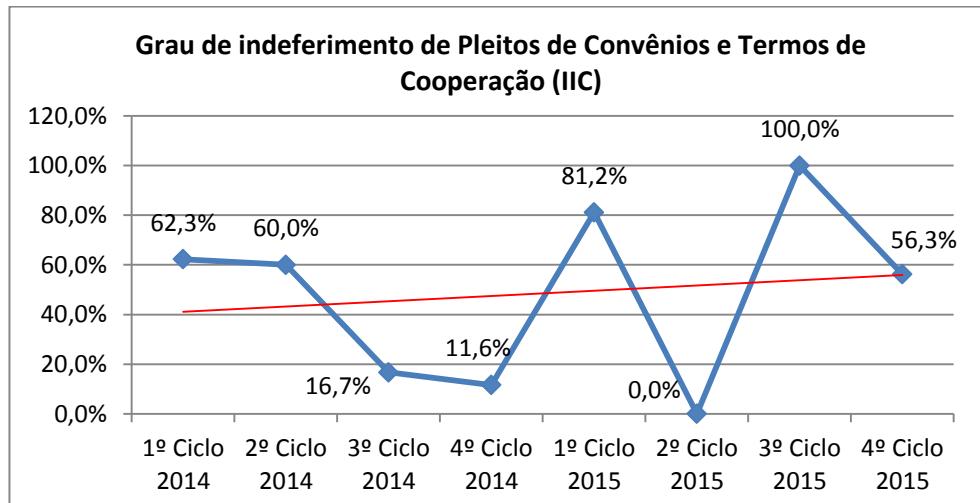

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**Notas:**

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

#### 4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula:  $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{17 \times 100}{36} = 47,22\%$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: jan-nov/2015.

f) Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 9 viagens de acompanhamento dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral e 8 reuniões para o acompanhamento. Devido à restrição orçamentária, não foi possível a realização das viagens programadas.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não informado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	100%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

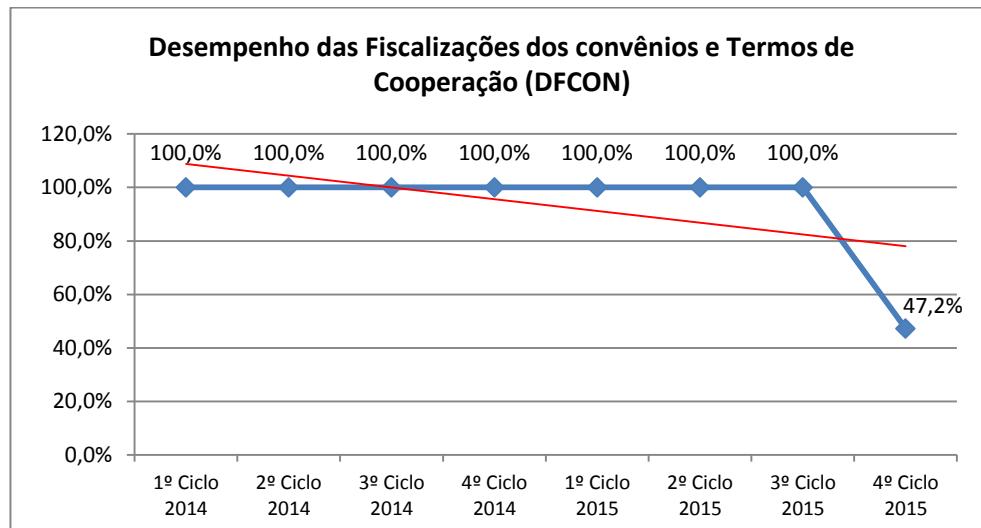

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

**ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE JANEIRO A NOVEMBRO 2015**

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar de reunião na EMEPA (Convênio 813986/2014-AL da caprinocultura) e Governo da Paraíba (Convênio 770741/2012 – Capacitação em Defesa Civil)	30.01.2015	João Pessoa PB	Carlos Almiro
Reunião com EMEPA-PB (Discussão sobre Termo de Referência do Convênio nº 813986/2014.	06.02.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Victor Uchoa Carlos Almiro, Marcelo de Castro

Reunião sobre o convênio ZEE-Borborema na SEIRHMACT	27.02.2015	João Pessoa PB	Isis Moreira Renato Vaz
Reunião CONDEPE/FIDEM sobre participação da SUDENE na Oficina para o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Bom Conselho	02.03.2015	SUDENE CGDS	Teresa Barbosa, Macira Régia, Vinícius Medeiros, Maria do Socorro, Renato Arruda e Maria Helena
Participar da Oficina de Validação da Caracterização e Diagnóstico Situacional do Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho-PE produto do convênio realizado entre a SUDENE e o CONDEPE/FIDEM nº 769782/2012.	04 a 05.03.2015	Bom Conselho PE	Macira Sotero, Renato Vaz, Vera Lúcia, Maria Helena Socorro Vilar
Reunião com a SEIRHMACT/PB PARA TRATAR DO Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema na Paraíba.	13.03.2015	SUDENE CGDS	Maria Helena, Victor Uchoa, Renato Vaz e Isis Guimarães
Realizar visita de acompanhamento do convênio nº 794987/2013- Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais-PESI/NNE e visita técnica ao CSEM Brasil.	18 a 20.03.2015	Belo Horizonte MG	Maria Helena, Isis Guimarães
Entrevistar alunos que participaram da 1ª etapa de capacitação nos campus de Monteiro e João Pessoa e acompanhar o início das capacitações em 03 campus dos 04 previstos: Monteiro, João Pessoa e Pedra de Fogo, objeto do convênio 59335.000033/2014-24 SUDENE/IFPB	24 a 27.03.2015	João Pessoa PB	Macira Régia Givanildo Ramos
Participar do Seminário do Agreste Setentrional, onde situa-se a “Bacia Leiteira” onde se encontra o município de Bom Conselho SUDENE/CONDEPE/FIDEM, convênio 59.335.000116/2012-51 – Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência de Bom Conselho “	09 a 10.04.2015	Garanhuns PE	Maria Helena Vera Lúcia Batista
Realizar visita técnica para alinhamento de idéias e orientações a respeito da execução do convênio Construindo com Mulheres 59.335.000533/2014-66	16 a 17.04.15	Maceió AL	Macira Sotero Givanildo Ramos
Reunião técnica com Agência CONDEPE/FIDEM sobre convênios em execução.	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Mª do Socorro, Vera Lucia, Teresa Barbosa, Renato Vaz, Victor Uchoa, Isis Moreira e

			Carlos Almiro
Reunião com representante da Prefeitura Municipal de Saboeiro sobre reforma e urbanização do mercado (Convênio).	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Edson, Agrimon,Givanildo
Reunião com a Agência CONDEPE/FIDEM sobre a e situação dos convênios em execução.	08.07.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Maria Helena, Caio Rodrigues, Victor Uchoa, Renato Arruda e Socorro Vilar
Reunião para discutir proposta de projeto das professoras Márcia Vanusa e Claudia Lima, sobre formalização de Acordo Cooperação Técnica e da continuidade do CVT Fitoterápicos	12.08.2015	SUDENE CGDS	Isis Moreira, Renato Vaz, Marcelo Saiki, Socorro Vilar, Vera Lúcia, Maria Helena, Caio Assis, Lautemyr e Jéssica
Reunião SEMAS—PE, elaborar a proposta tendo como foco o território da RESEX Acaú-Goiana	13.08.2015	SUDENE CGDS	Vera lúcia, Isis Moreira, Caio Assis e Victor Uchôa
Reunião com os professores Ricardo e Claudia da UFPE sobre Acordo de Cooperação	19.08.2015	SUDENE CGDS	Caio Renato, Marcelo Saiki, Teresa, Victor
Oficina – Projeto Piloto Semiárido. Território Salgueiro	20.08.2015	Auditório do GP/DENOR Recife	Maria Helena VeraAssunção
Workshop Energia Fotovoltaica no Norte de Minas. No evento acontecerá a apresentação e entrega oficial do  PESI – Planejamento Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas, objeto do convênio 794997/2013	10.09 11.09.15 a	Montes Claros MG	Maria Helena
Reunião com a SEMAS – Proposta para a Rota do Marisco	23.09.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Caio Rodrigues, Vera Lúcia
Reunião com a ASA, sobre a verificação no SICONV as ações divulgadas da SUDENE	14 e 15.10.2015	SUDENE CGPP	M <sup>a</sup> Helena
Reunião com “Movimento Via Trabalho” Articular com IPA e rever proposta à luz das orientações dos programas disponibilizados pela SUDENE e apresentar proposta	21.10.2015	SUDENE CGDS	M <sup>a</sup> Helena, Vera Lúcia
Reunião com a SEMAS para tratar sobre ajustes no Projeto dos Mariscos em comunidades tradicionais pesqueiras de moluscos de Goiana-PE	21.10.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki Caio Assis, Marcelo Viana
Reunião MST – Discussão Projeto	23.10..2015	SUDENE CGDS	Marcelo Viana Maria Helena Carlos Almiro, Vera Lúcia

Reunião com Via do Trabalho, enviar ofício ao Superintendente da SUDENE solicitando abertura do SICONV, conforme entendimento do IPA com a Superintendência	26.10.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro M <sup>a</sup> Helena, Maria do Socorro Marcelo Viana
Reunião sobre o convênio ZEE-PE entre técnicos da SEMAS/PE e SUDENE para ajustes Plano de Trabalho em virtude do 3º Termo Aditivo do Convênio	05.11.2015	CGDS SUDENE	Renato, Socorro Vilar, Victor Uchôa
Reunião Técnica – Reforma do Mercado Público de Saboeiro-CE	09.11.2015	SUDENE CGDS	Givanildo, Edson Laranjeiras, Agrimon Marcos
Reunião Agencia Xique Xique-PB/INCRA, sobre formalização de Acordo de Cooperação  técnica- ACT/SUDENE/INCRA	11-11-15	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Vera Assunção, Marcelo de Castro
Reunião com a UFRPE – APL Banana	13.11.2015	SUDENE CGDS	Almiro, Vera Lúcia Manoel
Reunião MST – proposta projeto	16.11.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Vera Assunção, Maria Helena
Viagem de acompanhamento técnico do Termo de Execução Descentralizada entre a SUDENE e o IFPB, referente ao projeto “Mulheres na Construção Civil” finalizado em 31 de agosto de 2015, com o objetivo de emissão de Parecer Final.	23 a 26.11.2015	Monteiro Cajazeiras PB	Givanildo Ramos

### PROPOSTAS RECEBIDAS - JANEIRO A NOVEMBRO / 2015

Entre janeiro e novembro de 2015, a coordenação recebeu via SICONV 11 propostas, das quais 5 estão relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”, 3 no âmbito do programa “Capacitação de recursos humanos para a competitividade (4640)”, 2 propostas para o programa “Fortalecimento das Administrações Locais (8917)” e uma proposta para o programa “Provimento De Infraestrutura Produtiva Para Arranjos Produtivos Locais (20N7)”. Além disso, foram recebidas 5 propostas para Termos de Execução Descentralizada. Das propostas recebidas, analisou-se 15 propostas, das quais foram aprovadas 6 e rejeitadas 9.

### **4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMT<sub>Conv</sub>)**

a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: jan-nov/2015

f) Comentários: **Não informado pela unidade.**

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,8 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

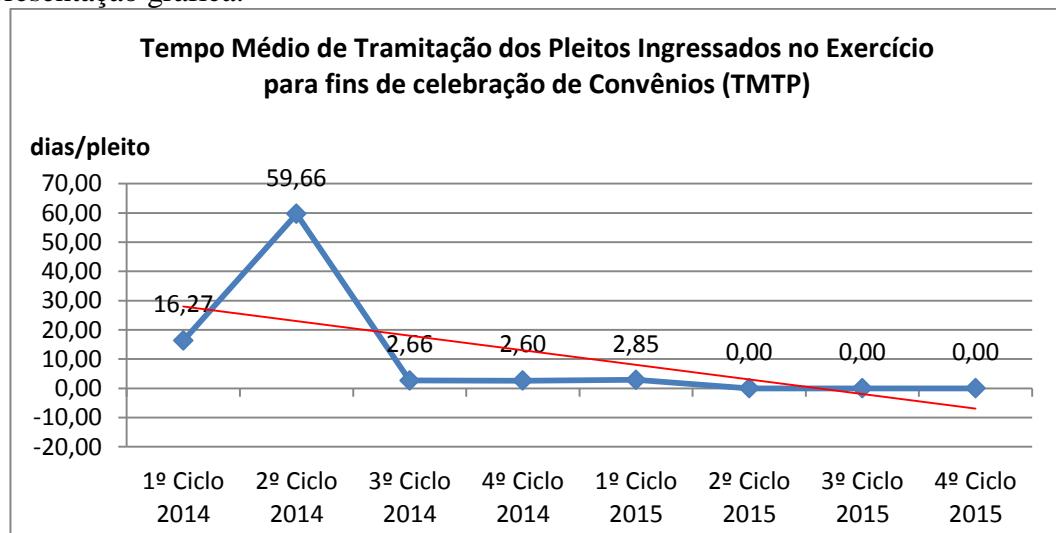

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

**Notas:**

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

#### 4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:  $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \text{Não informado pela unidade}$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: jan-nov/2015

f) Comentários: **Não informado pela unidade**

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

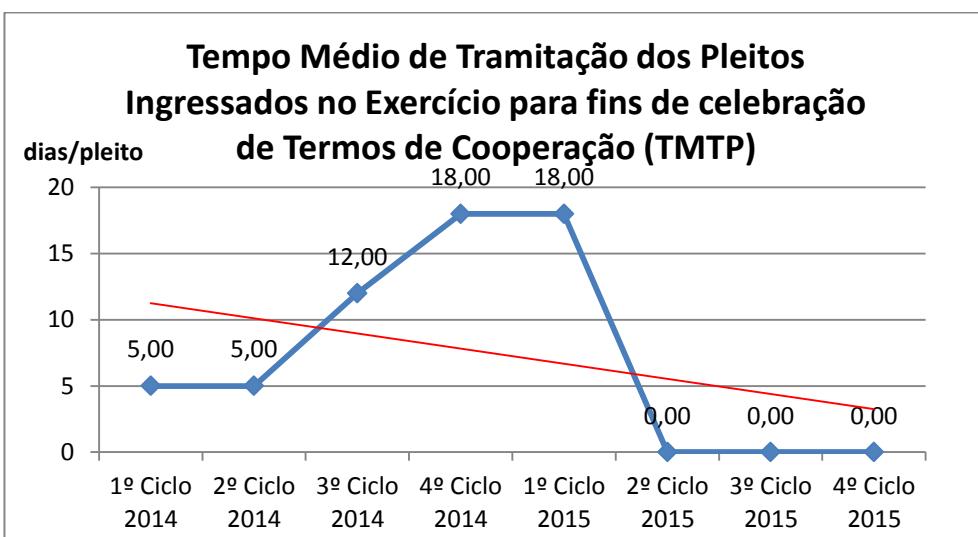

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

#### 4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$$


Valor do índice no ciclo: **Não informado pela unidade**

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.
- d) Resultado Ideal (%): .....% (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: **Não informado pela unidade.**

f) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não foi apurado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a Ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015

g) Representação gráfica:

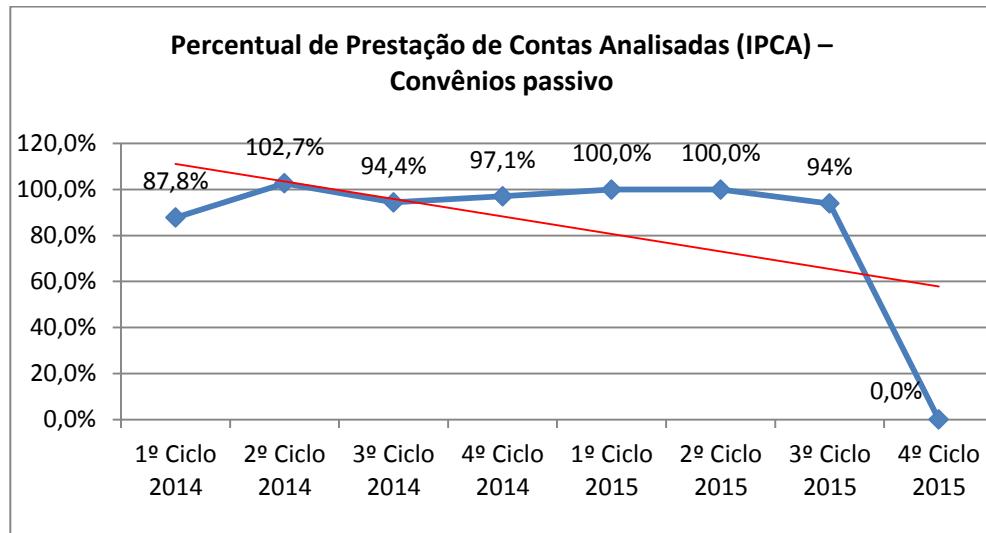

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE e SIAFI.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

#### 4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:  $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios\_a\_Aprovar_{FINAL}}{Convênios\_a\_Aprovar_{INICIAL}}$


Valor do índice no ciclo: **Não informado pela unidade.**

- b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
- d) Resultado Ideal (%): .... % (Quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: jan-nov/2015
- f) Comentários: **Não informado pela unidade.**

- g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	92,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

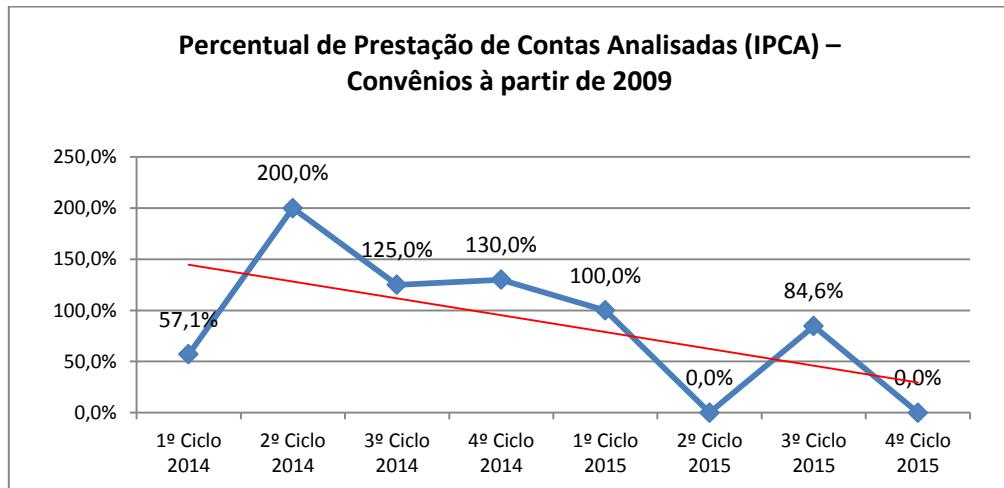

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

### 5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a)Fórmula:  $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{138 \times 100}{200} = 69\%$

b)Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100 %

e)Período da aferição: jan-nov/2015


f)Comentários: Até o momento, a meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores foi parcialmente atingida, alcançando 138 (cento e trinta e oito) servidores, representando 69% da meta. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 449 (quatrocentos e quarenta e nove) inscrições efetivamente realizadas. Entretanto, tendo em vista o contingenciamento de despesa referente a passagens e diárias, alguns eventos não foram realizados por serem promovidos fora da cidade do Recife, prejudicando assim, o alcance da meta estabelecida.

g)Resultados Anteriores (CSE):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	71,6 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014

Jan a ago/2014	60%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	48%	3º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

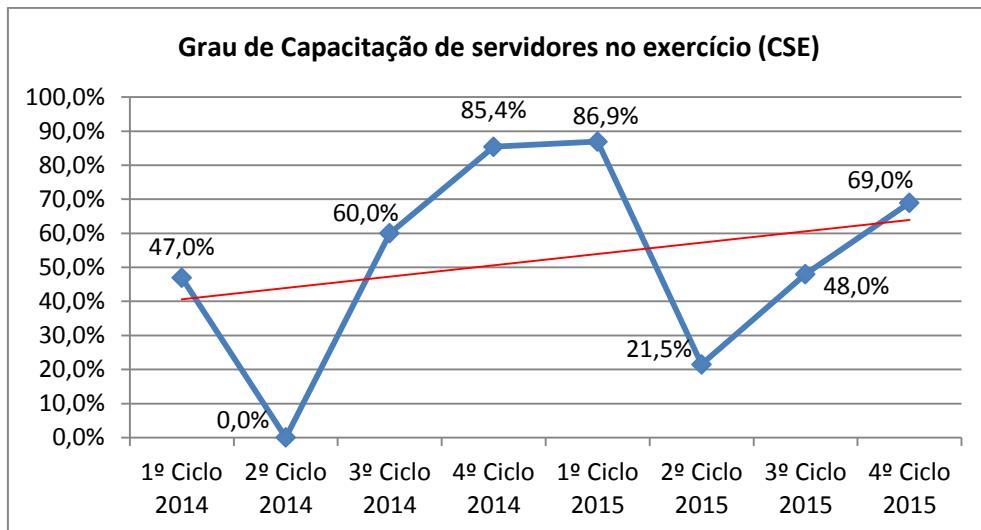

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

## 5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a)Fórmula:  $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{90 \times 100}{50} = 180\%$

b)Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100 %

e)Período da aferição: jan-nov/2015


f)Comentários: De janeiro a novembro (2015), foram realizados 90 (noventa) eventos de capacitação, ultrapassando a meta prevista de 50 (cinquenta) eventos de capacitação.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	66,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	90%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014

Jan a Dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	102%	3º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

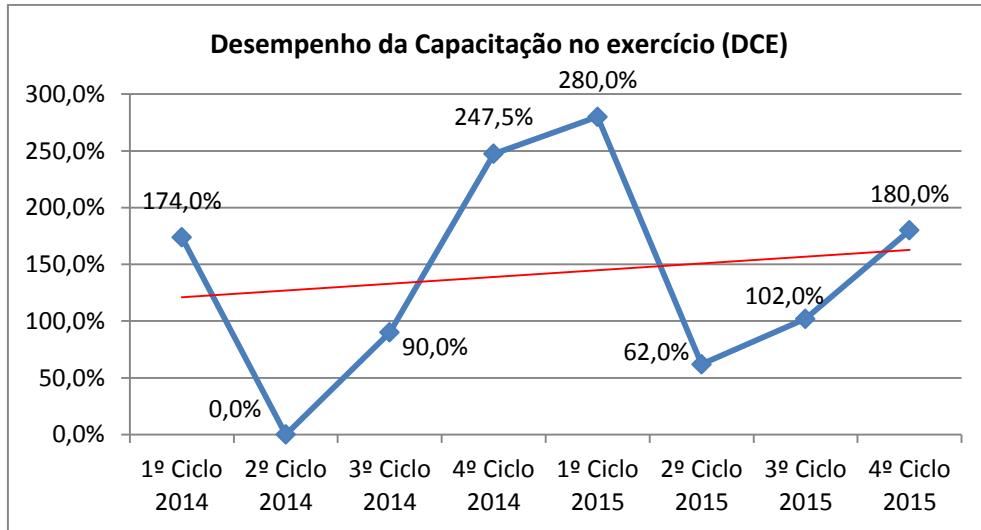

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

### 5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a)Fórmula:  $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.}}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} \times 100 = \frac{163.433,33}{400.000,00} \times 100 = 40,85\%$

b)Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c)Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100%

e)Periodicidade: jan-nov/2015


f)Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos de capacitações no valor de R\$ 76.737,50 (setenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Some-se a isso os custos com passagens e diárias no montante de R\$ 86.695,83 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), perfazendo assim, o total de R\$ 163.433,33 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), representando 40,85% do valor previsto para o investimento em capacitação. Considerando o contingenciamento de despesa referente a passagens e diárias, alguns eventos não foram realizados por serem promovidos fora da cidade do Recife, prejudicando assim, a realização do orçamento previsto.

g)Resultados Anteriores (NIC):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	27,8 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013

Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

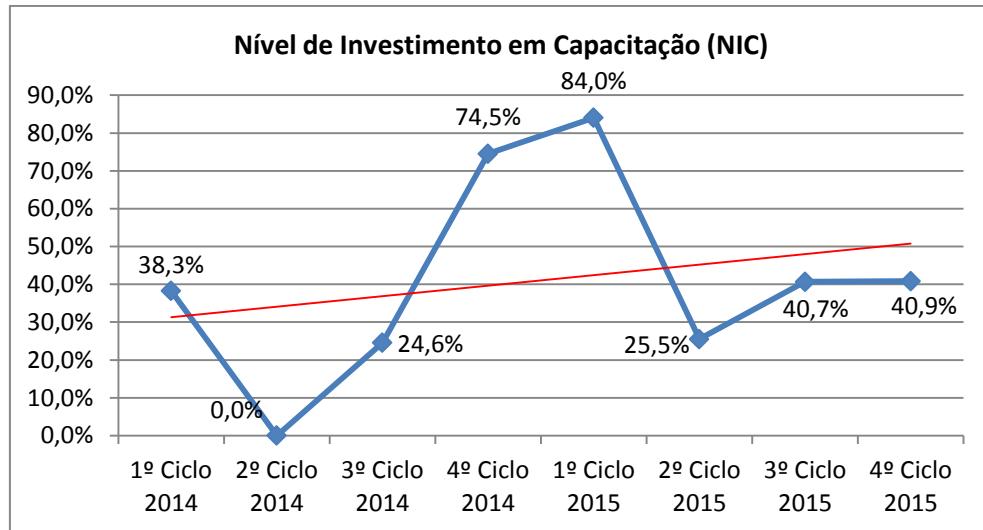

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recup./Modernização do Prédio da SUDENE e Anexos

### 6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a) Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos<sup>1</sup> =

$$\frac{68\% + 90\% + 26\%}{3} = 61,33\%$$

b) Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d) Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e) Data da aferição: 30/11/2015


f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (68%); f.2) sistema de combate a incêndios do Edf. Sudene e anexos (Cancelado); f.3) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (90%); f.4) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (26%). Esses projetos se utilizam dos recursos

previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	42,6%	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	47,6%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	58,70%	3º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

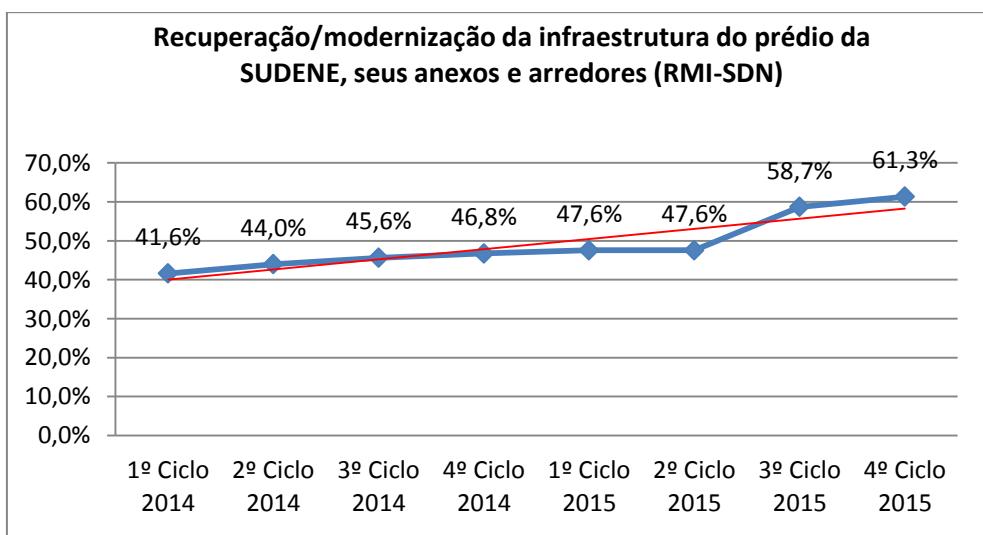

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

**Notas:**

<sup>1</sup> O percentual de execução de cada projeto é obtido da média aritmética geral lida no respectivo Plano Operativo. Neste caso, os POs 67, 68 e 69.

**6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)**

a) Fórmula:  $\frac{\Sigma \text{dos montantes aplicados nos Projetos}}{\Sigma \text{dos limites autorizados para os Projetos}} \times 100 =$

$$\frac{(2.655.470,65 + 6.458.613,62 + 100.000,00)}{2.871.569,35 + 8.670.544,86 + 148.000,00} \times 100 = 78,82 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, sistema de combate a incêndio, recuperação das fundações do prédio sede e sistema de energia) da SUDENE.


- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.
- d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)
- e) Data da aferição: 28/ago/2015
- f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R\$ 2.655.470,65 e limite autorizado acumulado=R\$ 2.871.569,35); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R\$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R\$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R\$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).
- g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	60,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	71,9 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	71,2 %	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	78,9%	3º ciclo 2015

**Nota:**

1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

- h) Representação gráfica:

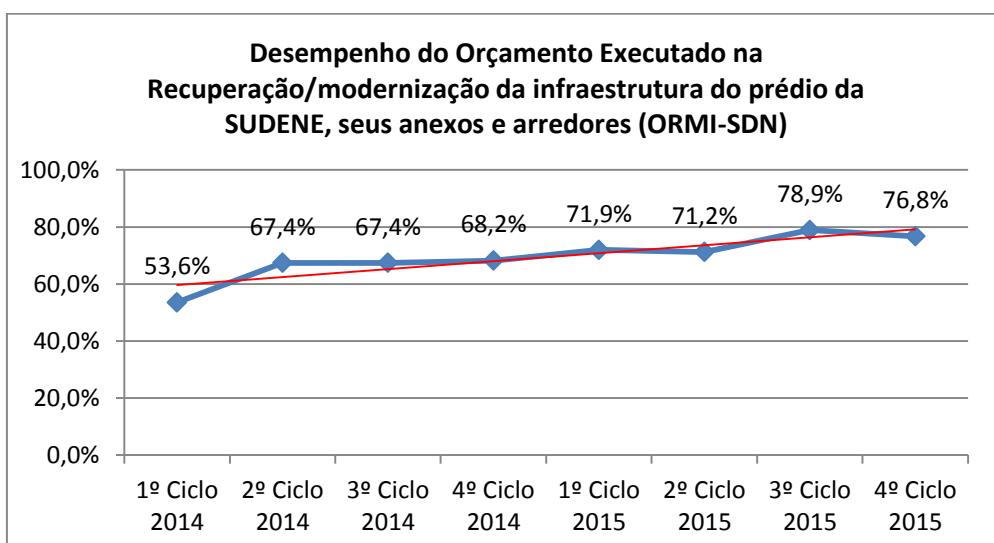

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

## 7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI)- Resultado out/2014 - set/2015

O resultado expresso a seguir, representa o que foi alcançado pelas metas definidas pelas unidades internas para o período outubro/2014-setembro/2015 nos termos definidos pela Portaria SUDENE nº 129, de 29/09/2015, que promoveu ajustes na Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014, no que tange às metas institucionais. Esse resultado visa atender, particularmente, ao estabelecido pelo Decreto nº 7.133/2010, que estabeleceu as regras para a concessão de gratificações aos servidores enquadrados no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, conhecida também, como GDPGPE, e aos enquadrados em Atividades de Cargos Específicos, conhecida como GDACE, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

a)Fórmula: Média Aritmética dos perc. executado segundo **metas** estabelecidas =

$$\frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+89\%+90\%}{13} =$$

$$= 98,38\%$$

Em pontos: 98,38 % x 0,80 pontos/fração percentual = 78,71 pontos

b)Objetivo: Aferir a parcela de desempenho institucional que integra o cálculo da avaliação de desempenho para fins de concessão da Gratificação de Desempenho aos servidores enquadrados no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, e àqueles que se enquadram em Atividades de Cargos Específicos, conhecida como GDACE, no âmbito da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI) com base em metas definidas pelas diferentes unidades da SUDENE.

d)Resultado ideal (%): 100%, que equivale a 80 pontos.

e)Data da aferição: após o término do período de vigência, que começa em outubro de cada ano.

f) Comentários: As **metas** compreendem índices de produtividade (comparações entre o previsto e o realizado em determinado período), como também, o percentual de execução física alcançado em 30 de setembro, data da apuração dos resultados, por projetos previamente escolhidos, trimestralmente monitorados por meio dos chamados planos operativos.

g)Resultado:

**Metas de Desempenho Institucional**  
**Resultado final do período out/2014-set/2015 com base na Portaria SUDENE nº 129/2015**

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	4572-Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada*	50	100%	80,00	DAD/CGGP-Auto-explicável. Entre out/14 e set/15 foram realizadas 123 capacitações, correspondendo a 246% da meta.
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos aprovados	296	100%	80,00	DFIN/Incent Fiscais -Pleitos aprovados efetivamente pela Diretoria Colegiada. Foram aprovados 318 pleitos entre out/2014 e 30/set/2015 (107,4%).
	0355- Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	100%	100%	80,00	DFIN/FDNE-Cálculo computado como 100 % dos financiamentos aprovados Total do período: R\$ 157.288.653,03
D1- Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.1-Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatórios elaborados	50%	100%	80,00	DPLAN/CGEP - (1) - Diretrizes para regionalização da política industrial-PO 27 [total=92%]. (2) - Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE. (Avaliação UAB) -PO 30 [total=99,2%]- (execução de 50 % das etapas, obtido da média aritmética dos projetos).
		Plano elaborado	1	100%	80,00	DPLAN/CGDS-Elaboração de plano de fomento à capacitação de gestão de projetos de desenvolvimento sub-regional (PO 20= 100%)
		Eventos realizados	2	100%	80,00	DPLAN/CGDS - Organização de eventos de difusão de conhecimentos sobre as potencialidades da região (Fórum SUDENE de energia-PO 19 =100%) e Seminário SUDENE APLs no semiárido (PO 23=100%)-Programa "Rotas da Integração Nacional"
		Projeto apoiado	2	100%	80,00	DPLAN/CGDS - Apoio à implementação de projetos para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, com prioridade para o semiárido. Foram celebrados os projetos de apoio à caprinocultura no Ceará e na Paraíba. PO 11 (100%)e PO 10 (100%).
		Oficina realizada	1	100%	80,00	DPLAN/CGDS-Promoção de evento de articulação de parceiros do desenvolvimento local com atuação na região com vistas ao diagnóstico e identificação de demandas de fortalecimento institucional (PO 22 = 100%)- I oficina de Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento.

Continua

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
D1- Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Fórum realizado	1	100%	80,00	DPLAN/CGDS-Organização de fóruns do meio ambiente com objetivo de troca de experiência de programas e projetos voltados a conservação, preservação e recuperação do meio ambiente e uso sustentável (PO 21= 100%)-Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional.
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	3	100%	80,00	DAD/CGGP-(1) Projeto de Desenvolvimento de lideranças-PO 62=100%; (2) Projeto de gestão por competências-PO 63=100%; (3) Projeto "Investindo nos Sonhos"-PO 64= 100%.
		Projeto implementado	2	100%	80,00	CGGI - (1) Mapeamento de processos-PO 60=100% ou outro; (2) Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA-(PO 61=100%);
		Projeto elaborado	1	89%	71,20	DAD/CGAF-Recuperação do Anexo Nilo Coelho (PO 65 = 89%)
		Sistema disponibilizado	1	90%	72,00	DAD/CGTI- Modernização da Infraestrutura da Rede Local (PO 70 = 90%)
<b>MÉDIA ARITMÉTICA</b>			98,4%	<b>78,71</b>		

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Observações:

\* Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.

Notas:

- a) Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada.
- b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional.
- c) O presente cálculo refere-se ao 6º Ciclo de avaliação GDPGPE e 3º Ciclo de avaliação GDACE, cuja contagem compreende o período de 01 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015 conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.
- d) Os resultados são obtidos da verificação sobre o que foi feito até a data de 30/09/2015, para cada meta.

## 8 – Observações e Deliberações em plenária de 17/11/2015

**PO 03** - Capacitação de prod. na caprinocultura e apicultura no estado de Pernambuco. A CGDS, por meio do Coordenador-Geral Carlos Almiro, enfatizou sua preocupação com a falta de recursos para diárias e passagens, impossibilitando a vistoria para a emissão do Laudo Técnico, questão que traz risco para o acompanhamento.

**PO 04** - Plano Regional de Energia. A Coordenadora Maria Helena, da CGDS, informou que o projeto será desdobrado em 3 projetos que serão apresentados em 2016.

**PO 05** - Mulheres na Construção - A técnica Macira Sotero (CGDS) pediu que fossem estabelecidas normas internas que amarram os encaminhamentos e citou o exemplo do Projeto Mulheres na Construção. Um projeto exitoso, que merece replicagem desde que sejam observadas as peculiaridades de cada estado ou entidade conveniente, mas que se defrontou com a má gestão do conveniente, o Instituto Federal de Educação Tecnológica da Paraíba mas entende que contribuiu para isso a dificuldade para se vistoriar o projeto por falta de recursos para diárias e passagens. Sugeriu que sejam criadas normas internas para um maior disciplinamento na utilização de Termos de Execução Descentralizada (TEDs). Entende que uma das falhas da legislação TED e a desobrigação do Convenente de apresentar a prestação de contas à SUDENE, e tão somente relatórios relatório de execução, talvez por que um TED não passa

pelo SICONV. Fica apenas no SIAFI. O Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), Frederico Cavalcanti, da DPLAN, sugere que uma pessoa da unidade seja destacada para fazer um relatório final dos resultados do projeto para que sirva como referência a desdobramentos futuros.

**PO 22** - Sobre o CVT de Sergipe o Coordenador-Geral da CGEP/DPLAN informou que o estado não consegue fazer a licitação para aquisição de equipamentos. O acompanhamento da SUDENE também foi prejudicado pela falta de diárias e passagens. Acrescentou que parte dos problemas de execução sugerem a elaboração de um manual que padronize os procedimentos para a execução, o que nos leva a perceber tratar-se de uma demanda que deve alcançar uma esfera de discussão maior haja vista que um conveniente não opera somente com a SUDENE, mas com diferentes fontes da administração pública e ONGs. Ainda dentro do contexto, a técnica Macira Sotero sugeriu que a administração buscassem estender o conhecimento das funcionalidades do SICONV a diferentes áreas haja vista ficar demonstrado o desconhecimento, por parte da CGEP/DPLAN, de alguns recursos oferecidos pelo sistema.

**PO 23** - Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial. O Coordenador-Geral da CGEP/DPLAN informou que o projeto encontra-se prejudicado, no momento, pela impossibilidade de articulação com os estados (falta de diárias e passagens).

**PO 25** - Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE. O Coordenador-Geral da CGEP/DPLAN informou que para 2016, um dos desdobramentos do projeto será a proposta de criação de um Comitê Gestor de C&T do Nordeste, voltado para as questões relacionadas ao Plano Regional de C&T para a Região. Significando dizer que o foco mudará da execução operacional para a de articulação. Nesse sentido, o PO será rediscutido em razão da mudança de foco.

**PO 26** - Programa Água para Todos. O Coordenador-Geral de Planejamento e Articulação de Políticas, George Meireles destacou os desafios para ressuscitar o programa, como também, o esforço para legalizar 111 municípios (111 processos diferentes), ademais da viabilização de cerca de 50 municípios e desses, a habilitação, já, de aproximadamente 20. Destacou a dificuldade de cobrir tantos municípios com a escassez de pessoal em sua área, principalmente por contar com apenas 2 engenheiros, mas particularmente a falta de técnicos capacitados em gestão de projetos, conhecimento mínimo, que percebe, grava boa parte dos quadros da Autarquia, e sugeriu que a Coordenação -Geral de Gestão de Pessoas incluísse esse tipo de curso em sua programação. Informou que irão começar 150 construções (3 por município habilitado). Observou que os municípios não foram capacitados sobre como gastar e os problemas foram se acumulando. Foi verificado que 58 municípios vão ter que devolver a primeira parcela de recursos que havia sido liberada. Entende que a SUDENE não deveria ter enveredado por esse programa. Também adiantou sua preocupação com a escassez de recursos para diárias e passagens no ano que vem, quando far-se-á obrigatória a vistoria das obras realizadas nesses municípios.

**PO 27** – Transnordestina Logística S/A. Em função de divergência entre os desembolsos financeiros e o andamento físico da obra o banco expediu uma série de exigência para a empresa, que não conseguiu supri-las em 2015, assim por este motivo não foram realizadas liberações.

**PO 28** – TCA/FIAT. A ultima liberação não foi realizada por um problema com a prefeitura municipal de Goiana, porem a fiat já conseguiu via judicial a concessão da CND para assim solicitar novamente a liberação.

**PO 50** - Cone Multicenter. A Coordenadora-Geral de Gestão de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento, Sabrina Oliveira, pediu a representante do Superintendente na reunião, o Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Sérgio Alencar, para levar à Diretoria Colegiada o problema que estava ocorrendo com a Caixa Econômica Federal, pois o projeto está contratado ao banco desde 28/06/2013, a CEF estabeleceu alguns fatores condicionantes que a empresa não consegue cumprir e as

explicações dadas pelo banco não são claras. Acrescentou a Sra. Sabrina que a empresa corre o risco, inclusive, de perder o valor que está empenhado desde 2013.

**PO 52** - Companhia Siderúrgica Suape. A Coordenadora-Geral da CGDF, Sra. Sabrina informou que há um problema entre a empresa e a CEF que não se resolve e, semelhantemente ao caso anterior, sugere Reunião da Diretoria Colegiada com a CEF para analisar o destino do projeto.

**PO 65** - Gestão por Competências. A Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Sra. Ângela Lima, informou que devido a problemas de contratação de orientadora para o projeto, cujo processo foi impugnado pela Procuradoria Federal junto à SUDENE, ele encontra-se em atraso, mas destacou que será retomado em 2016 e que os resultados do mapeamento a ser feito por ele condicionarão a realização dos demais, outros dois a ele vinculados: a avaliação de desempenho por competências; e, o planejamento da força de trabalho.

**PO 67** - Recuperação do Anexo Nilo Coelho. O projeto executivo já foi concluído e está apto para a realização da licitação.

**PO 68** - Recuperação das Fundações do Edf. Sede. Faltam recuperar 27 blocos, foi encaminhada a proposta de prorrogação e a empresa não aceitou, ficando medições a pagar e saldo empenhado. Esta em análise pela diretoria colegiada para a resolução.

**PO 69** - Modernização das subestações de energia do Edf. Sudene. Foi necessário adequação do projeto e está em negociação com a procuradoria da SUDENE para empenhar os valores ainda neste exercício.

**PO 73** - Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO. A implantação total está prevista para abril de 2016 sendo que em janeiro já estará disponível para o público externo para consulta.

## 9 – Conclusão

Neste ciclo as maiores preocupações se concentraram nas severas restrições orçamentárias tanto para a vistoria de convênios como para a fiscalização dos pleitos de incentivos fiscais. Mas também, na dificuldade para a manutenção dos compromissos assumidos pelos condôminos para a recuperação do prédio da SUDENE e a manutenção de serviços essenciais como limpeza e segurança. Hoje são condôminos a regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério da Saúde, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). Os dois primeiros são considerados órgãos-chaves no esforço de recuperação física das instalações e manutenção desses serviços, mas estão enfrentando problemas que repercutem no funcionamento das instalações a exemplo dos citados como essenciais. A administração da SUDENE tem se desdobrado para a manutenção dos compromissos assumidos, inclusive, com reuniões sucessivas, buscando sempre novas formas legais de encaminhamento.

Aliás, as últimas reuniões de monitoramento têm destacado as dificuldades orçamentárias, particularmente sobre as vistorias em convênios e empresas incentivadas por benefícios fiscais, como empecilho ao andamento normal dos processos, gerando atrasos e mesmo a impossibilidade da realização/aceitação de novos projetos. Essas dificuldades foram ressaltadas pelos Coordenadores Gerais Carlos Almiro e Sílvio Carlos titulares da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), e da Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais, da Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN), respectivamente. Com isso, pleitos de incentivos e convênios tiveram suas vistorias reprogramadas, afetando o prazo de conclusão de alguns projetos, como também, a significativa redução da demanda por novos financiamentos do FDNE, neste caso, afetados pelo custo do crédito tomado a terceiros, face à crise econômica do País. Como alternativa, as unidades internas estão

ajustando suas programações, explorando mais, a execução de atividades relacionadas com o processo de articulação, negociação e mobilização.

Por outro lado, naquilo que apetece exclusivamente às responsabilidades administradas pela SUDENE, melhorou o status do andamento dos projetos. O ciclo mostrou, mesmo em pequena escala, um maior número de projetos concluídos em relação aos ciclos anteriores, refletindo o esforço da instituição em buscar novos caminhos para dar continuidade ao seu trabalho na Região, mesmo diante de um cenário de adversidades externas e internas.

Sobre os compromissos para o próximo exercício, a agenda dos ciclos de monitoramento será a seguinte:

**Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos  
de Monitoramento da SUDENE no Exercício de 2016**

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2015	26/02/2016	17/03/2016
2º	31/05/2016	07/06/2016	22/06/2016
3º	31/08/2016	09/09/2016	22/09/2016
4º	28/11/2016	02/12/2016	15/12/2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

## **ANEXO I**

### **Quadros do Monitoramento**



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 01
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Dirutor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do Projeto (R\$ 1.00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				no Projeto (R\$ 1.00)	Projeto (R\$ 1.00)		
		100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82	
Previsão de Conclusão:	18/07/2016	CONVÉNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)					
Data Atualização:	30/11/2015	Vigência: 18/12/12 a 31/12/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM						

Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
		Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>										
1 Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído	
2 Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído	
3 Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído	
4 Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído	
5 Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído	
6 Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	Concluído	
7 Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>										
Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Em Andamento	
8 Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.
9 Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	31/12/2015		1/12/2013			59,4%	Em Andamento	
9.1 Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/1/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTIV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.
9.2 Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	Concluído	
9.3 Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	30/9/2014		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.
9.4 Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.
9.5 Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	18/12/2015	18/12/2015	R\$ 94.240,34				0,0%	A Iniciar	

9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	8/9/2015		28/5/2015			75,0%	Atrasado	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015. Solicitada a prorrogação da vigência.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	9/9/2015	30/12/2015					0,0%	A Iniciar		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>								0,0%	A Iniciar		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/02/2016	18/07/2016					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 234.105,49		<b>Valor realizado:</b>	R\$ 139.865,15	<b>71,9%</b>		<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

4º Ciclo - 2015. Repactuadas Etapas 9.3 - 9.5 e 9.6

**Histórico:** Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEPE/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Convenente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Solicitada a prorrogação da vigência e acatada pela equipe técnica, após a tramitação serão repactuadas as datas.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos</b>					<b>Número do Projeto:</b>	PO 02								
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>2.3. Promover a sustentabilidade ambiental</b>					<b>Ano:</b>	2012								
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária					Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria								
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico					Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.								
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território					Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS								
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas					Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto								
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães					Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.								
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.					Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE								
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
		100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25			
Previsão de Conclusão:		09/12/2015	CONVÉNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)					AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25		
Data Atualização:		30/11/2015						JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto		Concedente: Víctor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE Convenente: Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE								TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
														Valor liberado no Exercício	R\$ -
														Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
														Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
														Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25
N.E.	Metas/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas		Ações Corretivas	
				Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor						
INICIAÇÃO (Peso 20%)										20,0%	Concluído				
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico		CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído				
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012		CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído				
1.2	Análise de propostas		CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído				
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012		CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído				
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio		CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído				
3	Etapas de formalização do convênio		CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído				
4	Assinatura do convênio		CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído				
5	Publicação do convênio		CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído				
EXECUÇÃO (Peso 60%)										36,5%	Em Andamento				
6	Liberação da primeira parcela		SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído				
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços		SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado	--		65,0%	Em Andamento	Contratada a empresa para a conclusão das atividades da Etapa 1/Meta 1, em substituição a que realizou destrato. Além disso, encontra-se em fase de conclusão a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1.			
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco		SEMAS/PE	01/07/2014	31/08/2015	R\$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	38,0%	Atrasado	Foi selecionada uma nova empresa para dar continuidade às realizações dos Encontros / Diálogos Municipais.			
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano		SEMAS/PE	08/12/2014	30/06/2015	R\$ 146.400,00	08/12/2014	--	--	90,0%	Atrasado	Com a seleção de uma nova empresa a realização dos Encontros / Diálogos Municipais foi retomada em 21/09/2015, tendo sido realizados até esta data mais 33 eventos, que somados aos 22 realizadas anteriormente totalizam 55 Encontros / Diálogos Municipais.			
**	Visita técnica de acompanhamento		CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.			

	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/06/2015	30/06/2015	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	Em função da retomada e avanço na execução das atividades da Etapa 1/ Meta 1 e providências de contratação para realizar a Etapa 2/Meta 1, foi solicitado pela conveniente a liberação da segunda parcela. Diante deste quadro, a equipe técnica de concedente solicitou providências no sentido de realizar uma visita técnica para verificar a retomada das atividades. Entretanto, devido ao contingenciamento de despesas até o momento não houve a autorização para realizar tal procedimento. Persistindo esta situação faz-se necessário um posicionamento desta SUDENE, para que não ocorra solução de continuidade da execução deste convênio.	Em função do destrato ocorrido com a empresa que vinha realizando a Etapa 1/Meta 1 foi concedido o 3º Termo Aditivo para execução deste projeto levando a vigência a 30/04/2016. Entretanto, até a data limite deste PO a conveniente ainda não havia procedido os ajustes nos seus cronogramas físico e de desembolso, motivo pelo qual foram mantidas as datas ora registradas no SICONV em vermelho.
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	01/07/2015	16/08/2015	R\$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	Atrasado	Segundo informações da conveniente, encontra-se com seus procedimentos licitatórios em fase de conclusão o que demanda a liberação da segunda parcela.	
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	17/08/2015	31/08/2015	R\$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	Atrasado		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2014	31/08/2015	R\$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	40,0%	Atrasado		
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2014	31/08/2015	R\$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	80,0%	Atrasado		
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/07/2015	31/08/2015	R\$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	Atrasado		
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>												
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	30/10/2015	09/12/2015	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 265.241,25	<b>56,5%</b>	Atrasado	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

**Observações:**

\* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016.

4º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado





**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 04 (ex PO 05)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2009</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e CPL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Objetivo da ação:</b>	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.		
<b>Projeto:</b>	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Articular e coordenar o planejamento energético regional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00	

Previsão de Conclusão:	30/12/2016
Data Atualização:	30/11/2015

Responsável(s) pelo Projeto Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	1.352.840,00
A realizar no exercício	R\$	3.100.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	599.482,32
Saldo a liberar	R\$	2.500.517,68
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	1.952.322,32

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CIM	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100,0%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas -	DPLAN/CGDS/CIM	13/01/2010	01/12/2012	R\$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R\$ 352.840,00	100,0%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CIM	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100,0%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100,0%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CIM	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	R\$ 1.000.000,00	100,0%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Articulações com a EPE para a elaboração do Balanço Energético Regional 2015/2016 (digital) e apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais	DPLAN/CGDS/CIM	01/12/2012	30/12/2016	R\$ 3.000.000,00	01/05/2013			60,0%	Em Andamento	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais julho/2016. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético. Redefinindo orçamento para 2016/2017.
7	Formalização de Cooperação Técnica com a UFPE, para realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CIM	01/03/2013	30/04/2015	R\$ 600.000,00	19/06/2013	27/11/2015	R\$ 599.482,32	100,0%	Concluído	Identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região. Formalizados 2 (dois) TED's com o CER/UFPE	Termos de Execução Descentralizada com o Centro de Energias Renováveis/UFPE - 1)Solar: " Estudo das características de geração de células orgânicas e módulos fabricados no Brasil"; 2) Eólica: " Anteprojeto da área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída".

8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técnicas para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R\$ 100.000,00	30/11/2014	25/09/2015	Sem ônus	100,0%	Concluído	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Indústrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.
			Valor Previsto:	R\$ 5.052.840,00	Valor realizado:	R\$ 1.952.322,32	95,0%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs. 4º Ciclo 2015 - Repartuada a atividade 6, 7 e 8

Os recursos previstos na etapa 6 são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2014

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 05 (ex PO 06)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
<b>Projeto:</b>	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40		CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL
Previsão de Conclusão:	09/01/2016					IFPB	Sudene	1ª parc. Maio	R\$ 714.000,40	
Data Atualização:	30/11/2015					IFPB	Sudene	2ª parc. Agosto	R\$ 469.120,00	R\$ 1.183.120,40
Responsável(s) pelo Projeto		Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)							
		Convenente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Paulo Ditarso (IFPB).							

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>		11.02.2014	18.05.2014		11.02.2014	18.05.2014		20,0%	Concluído	
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014	2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100%	Concluído	
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100%	Concluído	
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>		02/05/2014	22/08/2015		02/05/2014	25/08/2015		60,0%	Concluído	
8	Liberação de Recursos	COFC/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R\$ 1.183.120,40	100%	Concluído	
9	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abri/Julho e Set/Nov/2014	01/03/2015		27/05/2014	20/08/2015		100%	Concluído	Até o presente momento, foram capacitadas 240 alunas das 640 previstas. Em virtude do Decreto nº 8.407/15, os recursos financeiros foram bloqueados, o que acarretou atrasos na execução das capacitações.
9.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	22/08/2013		100%	Concluído	
9.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	22/08/2013		100%	Concluído	
9.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	01/03/2014		100%	Concluído	
9.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013	29/10/2013		100%	Concluído	
9.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013					100%	Concluído	
9.6	Aquisição do Laboratório Móvel,	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	23/03/2015		100%	Concluído	

9.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico;Curso de Pintura de Obras; CursoAuxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abri/Julho e Set/Nov/2014	01/12/2014		01/04/2014	20/08/2015		100%	Concluído	Em virtude do Decreto nº 8.407/15, que dispõe sobre regulamentação das despesas inscritas em restos a pagar não processados até o exercício de 2014, houve o bloqueio dos recursos financeiros, acarretando atrasos nas ações.	Os cursos nos Campi João Pessoa e Pedra de Fogo iniciaram-se no dia 09/04/2015; no Campus Monteiro iniciaram-se no dia 27/04/2015; no Campus Cajazeiras iniciaram-se no dia 23/03/2015.
9.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	01/03/2015		01/11/2014			5%	Cancelado	O IFPB não estimou adequadamente as condições de absorção das alunas no mercado de trabalho.	Com o término da vigência do TED, a ação foi cancelada por impossibilidade da absorção das alunas no mercado de trabalho, que encontra-se em baixa.
10	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/2014	22/08/2015		24/11/2014	26/11/2015		100%	Concluído		
	<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>		<b>22/06/2015</b>	<b>11/12/2015</b>		<b>27/11/2015</b>			<b>5,0%</b>	<b>Em Andamento</b>		
11	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	30/09/2015	14/11/2015		30/11/2015			25%	Em Andamento		
<b>Valor Previsto:</b>				<b>R\$ 1.183.120,40</b>	<b>Valor realizado:</b>			<b>R\$ 1.183.120,40</b>	<b>85,0%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

IFPB

**Observações:**

(1) O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível concluir-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

(2) Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.

(3) A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.

(4) O encerramento do TED estava previsto para 22/05/2015, todavia devido a entraves observados na execução das ações e do decreto nº 8.407/15, foi enviado pelo IFPB o Ofício Nº 10/2015 - PROEXT/IFPB, de 27/05/2015, solicitando Aditivo de Prazo para 22/08/2015, sendo acatado pela SUDENE e publicado no DOU de 27/05/2015. Houve retificação do prazo de vigência no DOU de 12/06/2015 para a data de até 31/08/2015.

4º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
<span style="background-color: blue; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: green; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						Número do Projeto:	PO 06 (ex PO 07)					
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						Ano:	2013					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria								
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.								
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS								
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto								
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães			Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.								
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.			Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.								
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$	Cronograma de Desembolso							
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00	CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL				
Previsão de Conclusão:	22/08/2016	CONVENIO N° 794997/2013				R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52				
Data Atualização:	30/11/2015	Vigência: 31/12/13 a 14/05/16				R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48				
Responsável(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE												
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)													
Pago até o ano anterior			R\$										
A realizar no exercício													
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício			R\$										
Valor Empenhado no Exercício			R\$										
Valor liberado no Exercício			R\$										
Saldo a liberar													
Saldo a Empenhar no exercício			R\$										
Total Liberado até o exercício			R\$										
485.874,65			25.572,35			-	511.447,00						
Ações Corretivas													
Meta/ Etapas		Responsável	Previsto		Realizado		Observação/Problemas						
Iniciação (Peso 20%)		CGDS/SUDENE	Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %				
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%				
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE							Concluído				
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%				
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE							Concluído				
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE							Concluído				
EXECUÇÃO (Peso 60%)		IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		60,0%				
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%				
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%				
8	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			100%				
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%				
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%				
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%				
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%				
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%				
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%				
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%				
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%				
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%				
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%				
ENCERRAMENTO (Peso 20 %)									0,0%				
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	13/07/2016	22/08/2016					0%				
									A Iniciar				
									Aguardando relatórios de execução para emissão de LT.				

	Valor Previsto:	R\$ 485.874,65	Valor realizado:	R\$ 485.874,65	80,0%	Em Andamento	Status do Projeto	
--	-----------------	----------------	------------------	----------------	-------	--------------	-------------------	--

**Parceiros institucionais:**

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Etapas 8.6 repactuada

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

**Legenda**

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste					<b>Número do Projeto:</b>	PO 07 (ex PO 08)									
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores					<b>Ano:</b>	2013									
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.													
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.													
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS													
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto													
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães															
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.															
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.															
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.															
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)</b>										
				280	218.465,90	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE								
				GND 3	30	OUT/2014	107.354,71	5.650,24								
						OUT/2015	100.187,91	5.273,04								
						<b>TOTAL</b>	<b>207.542,62</b>	<b>10.923,28</b>								
<b>Previsão de Conclusão:</b>	09/02/2016	<b>CONVENÍO N° 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)</b>														
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015															
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)															
<b>Metas/ Etapas</b>																
		<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>										
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor								
								Físico %								
								20,0%								
								<b>Concluído</b>								
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
3	Analise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013	100,0%	<b>Concluído</b>							
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014	100,0%	<b>Concluído</b>							
								10,3%	<b>Atrasado</b>							
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de 27/10/2014)		R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	<b>Concluído</b>						
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	01/09/2014	--		01/09/2014	--	--	20,0%	<b>Atrasado</b>						
10	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do	CONDEPE/FIDEM	01/07/2015	30/09/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
10.1	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios	CONDEPE/FIDEM	01/07/2015	31/07/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
10.2	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	01/08/2015	14/09/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
10.3	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	15/09/2015	30/09/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>						
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/10/2015	30/10/2015	R\$ 100.187,91	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
13	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação /	CONDEPE/FIDEM	01/10/2015	01/11/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
13.1	Etapa 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em	CONDEPE/FIDEM	01/10/2015	10/10/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
13.2	Etapa 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão	CONDEPE/FIDEM	11/10/2015	19/10/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
13.3	Etapa 2.3: Realizar 02 Oficinas de monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	20/10/2015	01/11/2015	--	--	--	--	0,0%	<b>Atrasado</b>						
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>						
									0,0%	<b>A Iniciar</b>						
15	ANALISE DA PTC, SOB O ASPECTO FÍSICO, E EMISSÃO DE	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/01/2016	09/02/2016	--	--	--	--	0,0%	<b>A Iniciar</b>						
					<b>Valor Previsto:</b>	<b>R\$ 207.542,62</b>	<b>Valor realizado:</b>	<b>R\$ 107.354,71</b>	<b>30,3%</b>	<b>Atrasado</b>						
										<b>Status do Projeto</b>						

**Parceiros Institucionais:**

AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

**Observações:**

4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.

3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.

1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado ( 1º TA ), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.

4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral para item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	Legenda
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 08 (ex PO 09)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avale os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				100	359.682,64	378.613,30	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56	
Previsão de Conclusão:	08/04/2016	CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)				jun/14	221.267,56	11.645,66	232.913,22	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08		
Data Atualização:	30/11/2015	Vigência: 31/12/2015				dez/14	138.415,08	7.285,00	145.700,08	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
						<b>TOTAL</b>	<b>359.682,64</b>	<b>18.930,66</b>	<b>378.613,30</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
										Valor liberado no Exercício	R\$ -		
										Saldo a liberar	R\$ 138.415,08		
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
										Total Liberado até o exercício	R\$ 221.267,56		

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
--------------------------------------	--

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100,0%	Concluído	
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído	
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído	
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído	
9	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	30/12/2014					36,7%	Em Andamento	
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	03/03/2014		10/07/2015	09/10/2015		100,0%	Concluído	Em razão das dificuldades enfrentadas no processo licitatório, foi solicitada a prorrogação da vigência, para depois serem repactuadas as datas.
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/03/2014	06/06/2014		10/10/2015			30,0%	Em Andamento	

9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2014	30/12/2014	R\$ 138.415,08				0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.
9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	07/06/2014	07/09/2014					0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	08/09/2014	03/12/2014					0,0%	Atrasado	Em consequência dos atrasos nas etapas anteriores, decorrente do processo licitatório (8 e 9), recomendamos a prorrogação da vigência. Aguardando para repactuação das datas.
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Atrasado	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios
				<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 359.682,64	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 221.267,56	<b>70,5%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

**Observações:**

a) Repactuada a atividade 9.1 e 9.2

b) O convenente solicitou prorrogação da vigência, que acatamos, para que possamos repactuar as datas.

4º ciclo 2015.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 09 (ex PO 10)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2020 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escala		
<b>Dirutoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Carença de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
<b>Projeto:</b>	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
				no Projeto (R\$ 1,00)	Projeto (R\$ 1,00)			
				100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70
<b>Previsão de Conclusão:</b>	22/06/2017				Convênio N° 813986/2014			
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015							
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcélo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa							

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído	
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído	
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convênio solicitou ajustes no cronograma de desembolso
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível	EMEPA-PB	03/08/2015	21/04/2016	-	03/10/2015		-	20%	Em Andamento	o processo licitatório ocorreu no dia 27/11/2015
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais para	EMEPA-PB	21/09/2015	05/03/2016	-	04/11/2015		-	70%	Em Andamento	
11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2016	-	24/10/2015		-	65%	Em Andamento	Aguardando início do processo licitatório (previsto para 02/12/2015) para aquisição dos insumos veterinários
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	22/03/2016	-			-	0%	A Iniciar	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças -	EMEPA-PB	13/10/2015	21/04/2016	-	14/09/2015		-	40%	Em Andamento	O processo licitatório para contratação dos instrutores e serviços de terceiros ocorreu no dia 27/11/2015
14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	21/04/2016	-			-	0%	A Iniciar	Não houve liberação de recursos financeiros (diárias) para realização de viagem para acompanhamento.
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	26/10/2015	30/10/2015	-			-	0%	Paralisado	O convênio solicitou ajustes no cronograma de desembolso
16	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 137.434,28				0%	A Iniciar	
17	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/12/2015	31/12/2015	-			-	0%	A Iniciar	
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
18	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	22/06/2016	22/06/2017	-			-	0%	A Iniciar	
<b>Valor Previsto:</b>				<b>Valor realizado:</b>	R\$ 343.585,70	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 206.151,42	<b>Valor realizado:</b>	37,7%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

<b>Parceiros institucionais:</b>	
EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba	
<b>Observações:</b>	4º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 10 (ex PO 11)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
<b>Ação:</b>	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	<b>Objetivo estratégico (MI)</b>	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
<b>Projeto:</b>	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			
MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
nov/14	221.000,00	57.777,00	218.777,00
mar/15	550.000,00	161.000,00	771.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>771.000,00</b>	<b>218.777,00</b>	<b>989.777,00</b>

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1.000)			
Pago até o ano anterior	R\$		-
A realizar no exercício	R\$	550.000,00	000
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	000
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
Valor liberado no Exercício	R\$	221.000,00	
Saldo a liberar	R\$	550.000,00	
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
Total Liberado até o exercício	R\$	221.000,00	

**Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto:** SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira

### Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado
------	--------------------	-------------	----------	-----------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído	
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído	
5	Emissão de parecer técnico final ( analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído	
6	Aprovação do parecer técnico ( gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído	
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído	
	<b>Execução (Peso 60%)</b>								10,0%	Em Andamento	
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 221.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 221.000,00	100,0%	Concluído	
9	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	02/11/2015	22/04/2016					0,0%	A iniciar	
10	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	12/11/2015	11/12/2015					0,0%	A iniciar	
11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	18/01/2016	26/02/2016					0,0%	A iniciar	Aguardando conclusão do certame pela Procuradoria Geral do Estado por motivo de recurso impetrado
12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	01/03/2016	11/03/2016					0,0%	A iniciar	
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	15/02/2016	25/03/2016					0,0%	A iniciar	
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/11/2015	27/11/2015					0,0%	Atrasado	Viagem de Acompanhamento não realizada por não ter sido ainda iniciadas as ações do projeto.
15	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	16/11/2015	R\$ 550.000,00				0,0%	Atrasado	A liberação não foi realizada em função das ações do projeto não terem sido implementadas.
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	11/08/2015	29/02/2016					50,0%	Em Andamento	Realizado pregão eletrônico para aquisição de semoventes adjudicado, aguardando elaboração do contrato para publicação e empenho.
	<b>Encerramento - 20%</b>								0,0%		

17	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/05/2016	07/05/2016				0,0%	<b>A iniciar</b>		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	21/06/2016	21/06/2017				0,0%	<b>A iniciar</b>		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 771.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 221.000,00	30%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

**Observações:**

4º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	<b>A iniciar</b>
	<b>Concluído</b>
	<b>Em Andamento</b>
	<b>Atrasado</b>
	<b>Cancelado</b>
	<b>Paralisado</b>



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 11 (ex PO 12)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
<b>Ação:</b>	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
<b>Finalidade da ação:</b>	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Diretor:</b>	Sérgio Alencar	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Atender ao desafio de moldar o perfil do agente público na concepção moderna da nova gestão pública ou gestão pública gerencial, com o desafio de incluir características que atendam a objetivos e missão institucionais, convergindo com os interesses da sociedade.		
<b>Projeto:</b>	Capacitação estratégico-gerencial dos servidores públicos de 10 municípios do Sertão paraibano		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Capacitar e qualificar os servidores de 10 municípios do Sertão paraibano, visando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências nas áreas técnico-gerenciais, administrativo-organizacionais, financeiro-fiscais, elaboração de projetos e captação de recursos com vistas à melhoria da capacidade de gestão pública local.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -		
				dez/14	212.141,92	13.858,08	226.000,00	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$ 410.203,62		
				jun/15	198.061,70	12.938,30	211.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -		
				<b>TOTAL</b>	<b>410.203,62</b>	<b>26.796,38</b>	<b>437.000,00</b>	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
<b>Previsão de Conclusão:</b>	12/12/2017	<b>Convênio N° 813604/2014 (Proposta: 052390/2014)</b>						Valor liberado no Exercício	R\$ -		
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015							Saldo a liberar	R\$ 410.203,62		
<b>Responsáveis técnico(s) pelo Projeto</b>	SUDENE - Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção.							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
								Total Liberado até o exercício	R\$ -		

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Lançamento/divulgação do Programa	CGDS/SUDENE			R\$ -	06/08/2015		R\$ -	100,0%	Concluído	
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	30/10/2014	06/11/14	R\$ -	30/10/2014	06/11/2014	R\$ -	100,0%	Concluído	
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	04/11/2014	19/12/14	R\$ -	04/11/2014	19/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído	
4	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	20/12/2014	30/12/14	R\$ -	20/12/2014	31/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído	
5	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		31/12/2014	R\$ -	100,0%	Concluído	
6	Publicação do convênio	CGC/SUDENE			R\$ -		08/01/2015	R\$ -	100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
7	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	R\$ 212.141,92			R\$ -	0,0%	Atrasado	Pendências relativas ao ajuste do Plano de Trabalho (Cronograma Físico e de Desembolso), substituição, por parte da convenente, do responsável técnico pelo projeto, apresentação de termos de compromisso dos municípios a serem beneficiados pela capacitação.
8	Meta 1: Realizar 4 Capacitações em Gestão Financeira (R\$ 167.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	26/02/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
8.1	Etapa 1: Sensibilização e Mobilização/Procedimentos Licitatórios e Contratuais (R\$ 500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	27/12/2015				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
8.2	Etapa 2: Realizar 2 Cursos sobre E-social e Administração Pública (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/03/2015	27/01/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
8.3	Etapa 3: Realizar 1 Curso sobre GFIP-SEFIP (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/04/2015	12/02/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
8.4	Etapa 4: Realizar 1 Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira na Administração Pública (R\$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/05/2015	26/02/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
9	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0,0%	A Iniciar	
10	**Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	30/06/2015	30/06/2015	R\$ 198.061,70			R\$ -	0,0%	Atrasado	
11	Meta 2: Realizar 1 Capacitação em Patrimônio Público (R\$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	13/03/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar	

11.1	<b>Etapa 1: Realiza 1 Curso sobre Gestão do Patrimônio Público (R\$ 32.250,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	13/03/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
12	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0,0%	A Iniciar		
13	<b>Meta 3: Realizar 1 Capacitação em Gestão de Projetos (R\$ 26.500,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	29/03/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
13.1	<b>Etapa 1: 1 Curso sobre SICONV – Da Celebração à Prestação de Contas. (Elaboração de Projetos para Captação de Recursos</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	29/03/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
14	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0,0%	A Iniciar		
15	<b>Meta 4: Realizar 6 Capacitações em Compras Governamentais (R\$ 211.000,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	13/09/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.1	<b>Etapa 1: 1 Curso sobre Licitações Públicas (R\$ 34.750,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	27/04/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.2	<b>Etapa 2: 1 Curso sobre Elaboração de Edital e Termo de Referência (R\$ 34.750,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/07/2015	06/05/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.3	<b>Etapa 3: 1 Curso sobre Pregão Presencial e Eletrônico (R\$ 37.250,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/08/2015	13/06/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.4	<b>Etapa 4: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R\$ 34.750,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/09/2015	14/07/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.5	<b>Etapa 5: 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R\$ 32.250,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/10/2015	13/08/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
15.6	<b>Etapa 6: 1 Curso sobre Contratos Administrativos (Gestão e Fiscalização) (R\$ 37.250,00)</b>	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/11/2015	13/09/2016				R\$ -	0,0%	A Iniciar		Repatuar data com o executor.
16	*Visita Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R\$ -	0,0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>												
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	12/12/2016	12/12/2017					0,0%	A Iniciar	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios após emissão do laudo técnico.	
				<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 410.203,62	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 0,00	<b>20,0%</b>		<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Administração

**Observações:**

4º Ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 12 (ex PO 13)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>			<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.		
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Dirutor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos				
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN				
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros			
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$	-	
		100	GND 3	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15	R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizada no exercício	R\$	400.000,00	
						R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$	400.000,00	
Previsão de Conclusão:	06/07/2017									Valor Empenhado no Exercício	R\$	400.000,00	
Data Atualização:	30/11/2015									Valor liberado no Exercício	R\$	200.000,00	
										Saldo a liberar	R\$	200.000,00	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
										Total Liberado até o exercício	R\$	200.000,00	

<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
------------------------------------	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014		Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014		Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014		Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014		Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014		Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014		Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015		Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015	R\$ 10.000,00	02/02/2015	02/02/2015	R\$ 10.000,00	100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF/CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído	
10	Meta 1		23/12/2014	07/05/2016	R\$ 420.540,15					Em Andamento	
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	07/05/2016	R\$ 420.540,15					Em Andamento	O Município procedeu o ajuste do projeto básico e iniciou o processo de licitação
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	06/07/2016	06/07/2017					0%	A Iniciar	
					R\$ 420.540,15	Valor realizado:	R\$ 210.000,00	20%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros Institucionais:</b>	
Município de Jardim de Piranhas/RN	
<b>Observações:</b>	
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014	
(2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.	
(3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.	
(4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.	
(5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2015.	
4º Ciclo 2015	

Legenda	
A Iniciar	Concluído
Em Andamento	Atrasado
Cancelado	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 13 (ex PO 14)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do município de Messias Targino/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros			
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$	-	
		100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.001,00			R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
									R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ 300.000,00
									R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 310.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 300.000,00
												Valor liberado no Exercício	R\$ -
												Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
												Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
												Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão: 18/06/2017  
Data Atualização: 30/11/2015

Responsável(s) pelo Projeto: Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto				Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor		Inicio	Fim	Valor	Físico %			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>													
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014			04/04/2014	04/04/2014		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014			06/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014			18/05/2014	19/05/2014		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014			18/03/2014	25/08/2014		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014			26/08/2014	04/12/2014		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014			05/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015			08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído		
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>													
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 5.000,00		04/02/2015	04/02/2015	R\$ 5.000,00	100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00		28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Meta 1		05/12/2014	19/04/2016	R\$ 310.000,00						Em Andamento		
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	19/04/2016	R\$ 310.000,00		16/06/2015		R\$ 95.412,47	31%	Em Andamento	O Município ajustou o projeto básico.	O plano de trabalho está em fase de ajuste no Siconv.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>													
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/06/2016	18/06/2017						0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		R\$ 310.000,00		Valor realizado:		R\$ 155.000,00	51%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>
Município de Messias Targino/RN
<b>Observações:</b>
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014
(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para a encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.
4º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 14 (ex PO 15)</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>	<b>Ano:</b>	<b>2014</b>
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
<b>Finalidade da ação:</b>	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
<b>Dirutor:</b>	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almíro Moreira Pinto
<b>Problema (causa):</b>	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
<b>Projeto:</b>	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiárias de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL (R\$)	Pago até o ano anterior	R\$ 1.069.868,00
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00	326.618,00	R\$ 20.932,00	mar/15	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (2014)	R\$ 1.069.868,00
Previsão de Conclusão:	01/02/2017	31/12/2015				371.625,00		jun/15	371.625,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ 1.069.868,00
Data Atualização:	30/11/2015					371.625,00		set/15	371.625,00	Valor liberado no Exercício	R\$ 326.618,00
						<b>TOTAL</b>			<b>1.090.800,00</b>	Saldo a liberar	R\$ 743.250,00
Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
	Convenente	Vanessa Tenório Beltrão Barbirato (coordenadora), Adrianny Cristina De Lima Silva (técnica)								Total Liberado até o exercício	R\$ 326.618,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	<b>R\$ 20.932,00</b>	23/03/2015	23/03/2015	<b>R\$ 20.932,00</b>	100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	24/03/2015	24/03/2015	<b>R\$ 326.618,00</b>	100%	Concluído	
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao convenente sobre o processo de convênio.
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015			15%	Atrasado	A SEMTABES não conseguiu concluir o processo licitatório.
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído	
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	<b>R\$ 41.750,00</b>				10%	Atrasado	A SEMTABES não conseguiu concluir o processo licitatório.
14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	01/04/2015	31/05/2015	-	01/04/2015	31/05/2015		100%	Concluído	
15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	<b>R\$ 305.800,00</b>	01/03/2015		<b>R\$ 42.155,00</b>	20%	Atrasado	Só foram adquiridos os 'tablets' dos materiais e equipamentos previstos no Plano de Trabalho.

16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-				0%	Atrasado	A entidade a ser contratada para fornecer a capacitação é quem ficará responsável pela elaboração do material didático e como se encontra em processo licitatório esta etapa se encontra em atraso.	
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-				100%	Cancelado	Visita prevista cancelada em função da falta de recursos financeiros.	
18	<b>Liberação da 2ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	15/06/2015	<b>R\$ 371.625,00</b>				0%	Atrasado		
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2015	R\$ 371.625,00				0%	Atrasado	Dependendo da finalização do processo licitatório	
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	05/09/2015	-				0%	Atrasado		
21	<b>Liberação da 3ª parcela</b>	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2015	<b>R\$ 371.625,00</b>				0%	Atrasado		
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2015	R\$ 371.625,00				0%	Atrasado	Dependendo da finalização do processo licitatório	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2015	-				0%	Atrasado	Dependendo da finalização do processo licitatório	
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2015	-				0%	A Iniciar		
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>									<b>0,0%</b>	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	01/02/2017	-				0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>		<b>R\$ 1.090.800,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>R\$ 389.705,00</b>	<b>57,9%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:**

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

**Observações:**

Por meio do Ofício nº 428/SEMTABES 2015 foi solicitado prorrogação por mais 1 ano. Processo na Procuradoria para análise do pleito.

4º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 15 (ex PO 16)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	<b>Ano:</b>	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Problema (causa):	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.		
Projeto:	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-	
				280	3330.41 e 4430.42	30	R\$ 835.823,47	R\$ 928.692,75		AGO/2015	R\$ 458.149,49	R\$ 41.800,00	R\$ 499.949,49
						OUT/2015	R\$ 377.673,98	R\$ 51.069,28	R\$ 428.743,26	A realizar no exercício (RAP 2014)	R\$	835.823,47	835.823,47
						-	R\$ 835.823,47	R\$ 92.869,28	R\$ 928.692,75	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-	
Previsão de Conclusão:	09/11/2017									Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
Data Atualização:	30/11/2015									Valor liberado no Exercício	R\$	458.149,49	
										Saldo a liberar	R\$	377.673,98	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
										Total Liberado até o exercício	R\$	458.149,49	

Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Convenente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

N.E.	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto						Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %					
	<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>								20,0%			Concluído		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100%			Concluído		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100%			Concluído		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100%			Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100%			Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100%			Concluído		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100%			Concluído		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100%			Concluído		
	<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>								7,5%			Em Andamento		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R\$ 458.149,49	09/09/2015	09/09/2015	R\$ 458.149,49	100%			Concluído		
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	--	--	--	--	--	--	50%			Em Andamento	A Convenente informou que iniciou o processo licitatório.	
8	<b>Consolidação do Projeto</b>	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	31/08/2015	<b>R\$ 41.304,00</b>	--	--	--	0%			Atrasado	Tais etapas serão iniciadas após a finalização do processo licitatório. Houve atraso devido aos ajustes no TR e no plano de trabalho no SICONV como condicionantes para a liberação da primeira parcela.	O convênio foi prorrogado de ofício, tendo como nova vigência 09/09/2016. No entanto a convenente ainda não realizou o ajuste no plano de trabalho para o novo prazo. A convenente foi contatada para que solicite o ajuste do plano de trabalho.
9	<b>Elaboração de Diagnóstico</b>	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	31/10/2015	<b>R\$ 458.645,49</b>	--	--	--	0%			Atrasado		
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	31/10/2015	R\$ 134.729,10	--	--	--	0%			Atrasado		
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	31/10/2015	R\$ 80.969,09	--	--	--	0%			Atrasado		
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	31/10/2015	R\$ 69.449,10	--	--	--	0%			Atrasado		
9.4	Elaboração do Relatório da Síntese da Situação Atual	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	31/10/2015	R\$ 109.769,10	--	--	--	0%			Atrasado		
9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	31/10/2015	R\$ 63.729,10	--	--	--	0%			Atrasado		
10	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%			A Iniciar		
11	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R\$ 377.673,98	--	--	R\$ 0,00	0%			Atrasado		
12	Elaboração de Prognóstico	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	30/11/2015	<b>R\$ 294.170,50</b>	--	--	--	0%			Atrasado		

12.1	Elaboração de Cenários	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	30/11/2015	R\$ 44.674,10	--	--	--	0%	Atrasado
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	30/11/2015	R\$ 91.174,10	--	--	--	0%	Atrasado
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	30/11/2015	R\$ 45.094,10	--	--	--	0%	Atrasado
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	30/11/2015	R\$ 73.894,10	--	--	--	0%	Atrasado
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/11/2015	R\$ 39.334,10	--	--	--	0%	Atrasado
15	Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/12/2015	<b>R\$ 89.649,88</b>	--	--	--	0%	A Iniciar
16	Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	30/12/2015	<b>R\$ 44.922,88</b>	--	--	--	0%	A Iniciar
17	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0%	A Iniciar
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>								<b>0,0%</b>	<b>A Iniciar</b>	
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	09/11/2016	09/11/2017					0%	A Iniciar
			<b>Valor Previsto:</b>		R\$ 835.823,47	<b>Valor realizado:</b>		R\$ 458.149,49	27,5%	<b>Em Andamento</b>
										<b>Status do Projeto</b>

**Parceiros institucionais:**

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

**Observações:**

4º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Canceledo
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 16 (ex PO 17)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agricultura familiar
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos		
Projeto:	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN		
Objetivo do projeto:	Adquirir frota de equipamentos agrícolas (plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
						CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior (2014)	R\$ 250.000,00
		100	GND 3	30	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 16.400,00		R\$ 266.400,00	A realizar no exercício	R\$ -
Previsão de Conclusão:	#REF!									Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
Data Atualização:	01/12/2015									Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/Município de Currais Novos/RN.									Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013	-	20%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013	-	100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014	-	100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014	-	100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013	-	31/12/2014	31/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014	-	100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	31/01/2014	31/01/2014	R\$ 16.400,00	100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R\$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R\$ 250.000,00	100%	Concluído	
10	Meta 1		31/12/2013	05/06/2015	R\$ 266.400,00				100%	Concluído	
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 196.000,00	16/07/2014	16/07/2014	R\$ 196.000,00	100%	Concluído	A etapa foi concluída com valor reduzido. O laudo final avaliará a efetiva execução do convênio.
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 34.400,00	21/08/2014	21/08/2014	R\$ 34.400,00	100%	Concluído	A etapa foi concluída com valor reduzido. O laudo final avaliará a efetiva execução do convênio.
10.3	Grade aradora(02 Unid.)	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015	R\$ 36.000,00	22/08/2014	22/08/2014	R\$ 36.000,00	100%	Concluído	A etapa foi concluída com valor reduzido. O laudo final avaliará a efetiva execução do convênio.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS	04/08/2015	13/09/2015					0%	Atrasado	A visita técnica foi prejudicada por falta de recursos financeiros. Enquanto não houver visita técnica a etapa não se concluirá.
11	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	13/09/2015					0%	Atrasado	Laudo Técnico em fase de elaboração.
					R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 250.000,00	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Currais Novos/RN

**Observações:**

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;

(2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

4º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 17 (ex PO 18)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do município de Saboeiro/CE		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso	Valores Orçamentários/ Financeiros		
	100	GND 3	30	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.053.001,00		CONCEDENTE	CONVENENTE	MÊS
Previsão de Conclusão:	#REF!					R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00
Data Atualização:	30/11/2015					R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00
						R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00
						<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 53.000,00</b>		<b>R\$ 1.053.000,00</b>

Responsável(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
-----------------------------	--

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído	
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013	-	100%	Concluído	
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...	...	100%	Concluído	
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...	...	100%	Concluído	
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...	...	100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído	
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 23.000,00	05/02/2014	05/02/2014	R\$ 23.000,00	100%	Concluído	
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R\$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R\$ 400.000,00	100%	Concluído	
	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Município de Saboeiro			R\$ 15.000,00	07/04/2015	07/04/2015	R\$ 15.000,00		Concluído	
	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD			R\$ 300.000,00	18/11/2015	18/11/2015	R\$ 300.000,00		Concluído	
10	Meta 1		30/12/2013	21/12/2015	<b>R\$ 1.053.000,00</b>	28/02/2014		R\$ 416.990,32	70%	Em Andamento	O valor liberado foi aplicado parcialmente.
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Saboeiro	30/12/2013	21/12/2015	R\$ 1.053.000,00	28/02/2014		R\$ 416.990,32	70%	Em Andamento	O Convenente ajustou o projeto básico e executou serviços em desacordo com o plano de trabalho aprovado
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	19/02/2016	30/03/2016					0%	A Iniciar	
					<b>R\$ 1.053.000,00</b>	Valor realizado:	<b>R\$ 700.000,00</b>	62%		Em Andamento	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>
Município de Saboeiro/CE
<b>Observações:</b>
(1) O convênio teve a sua vigência prorrogada até 21/12/2015 em face da necessidade de se proceder o ajuste do plano de trabalho, que encontra-se em andamento;
(2) Os recursos financeiros da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
(4) O convênio encontra-se em processo de aditamento de prazo por mais 180 dias.
4º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b> 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b> PO 18 (ex PO 19)
<b>Objetivo estratégico:</b> 1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	<b>Ano:</b> 2015

Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APLs, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma política energética que considere as especificidades da região Nordeste.		
Projeto:	Fórum de Energia		
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma política energética regional		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Previsão de Conclusão:	30/09/2015
Data Atualização:	30/11/2015

Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena; Manoel Jardim; Isis Guimarães	Valores Orçamentários/ Financeiros
		Pago até o ano anterior R\$ -
		A realizar no exercício R\$ -
		Orçamento Aprov.no exercício R\$ -
		Valor Empenhado no Exercício R\$ -
		Valor liberado no Exercício R\$ -
		Saldo a liberar R\$ -
		Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
		Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	<b>LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (Peso 20%)</b>		04/05/2015	15/09/2015		04/05/2015			20,0%	Concluído	
1.1	Mobilização dos Contatos/Secretários	Maria Helena; Carlos Almiro	04/05/2015	15/09/2015		04/05/2015			100,0%	Concluído	
1.2	Atualização dos representantes das instituições envolvidas no GT- Planejamento Energético	Maria Helena; Manoel; Isis	04/05/2015	15/07/2015		04/05/2015	15/07/2015		100,0%	Concluído	
1.3	Identificação de instituições e participantes do Fórum de Energia	Maria Helena; Manoel; Isis	01/06/2015	30/07/2015		01/06/2015	30/07/2015		100,0%	Concluído	
1.4	Leitura de documentos, estudos e referencial teórico	Maria Helena; Manoel; Isis	04/05/2015	30/06/2015		04/05/2015	30/06/2015		100,0%	Concluído	
2	<b>REALIZAÇÃO DO FÓRUM (Peso 80%)</b>		29/09/2015	29/09/2015		01/07/2015	29/09/2015		80,0%	Concluído	
2.1	Elaboração de material em articulação com a ASCOM (folder, banner, cartaz, bloco, crachá...) da Gestão de Projetos	Maria Helena; Manoel; Isis; ASCOM	01/07/2015	18/09/2015		01/09/2015	28/09/2015		100,0%	Concluído	Já existe material de fóruns anteriores que será reutilizado.
2.2	Planejamento de logística e infraestrutura	Maria Helena; Manoel; Isis; ASCOM	01/07/2015	18/09/2015		01/09/2015	28/09/2015		100,0%	Concluído	
2.3	Divulgação do Fórum e convite de autoridades e palestrantes	Maria Helena; Almiro; Diretor; Superintendente	14/09/2015	23/09/2015		01/09/2015	24/09/2015		100,0%	Concluído	
2.4	Realização do Fórum	CGDS	29/09/2015	29/09/2015		29/09/2015	29/09/2015		100,0%	Concluído	
2.5	Elaboração de documento final e encaminhamentos do evento	Maria Helena; Manoel	29/09/2015	30/09/2015		29/09/2015	30/09/2015		100,0%	Concluído	O material do evento foi repassado à ASCOM no dia 06/10/2015
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	100%		Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>
Ministério do Meio Ambiente, CHESF, Fórum Nacional dos Secretários para assuntos de Energia, Federação das Indústrias, Centros de Pesquisas e Universidades.
<b>Observações:</b>
Repautadas as atividades/etapas: 2.1 e 2.4
4º Ciclo 2015

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: grey; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 19 (ex PO 20)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.5. Fortalecer as administrações públicas	<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Promover valorização e qualificação permanente dos servidores
Finalidade da ação:	-	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-CGDS/Coordenação de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-CGDS
Directoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Carlos Almiro Moreira Pinto (CGDS)/ Vera Lúcia Assunção (CDT)
Director:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Necessidade da melhoria na gestão de projetos dos municipais da área de atuação de Bom Conselho-PE, em virtude de investimentos privados na região.		
Projeto:	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional.		
Objetivo do projeto:	Qualificar os servidores públicos (gestores e técnicos) municipais da área de atuação de Bom Conselho quanto aos aspectos gerenciais de projetos de desenvolvimento local		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Previsão de Conclusão:	30/09/2015					
Data Atualização:	30/11/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza; Macira Régia Sotero; Manoel de Sá Jardim Neto; Renato Arruda Vaz de Oliveira;					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (Peso 20%)</b>											
1	Visita técnica para apresentação da proposta para os municípios, da área de influência de Bom Conselho/PE, por ocasião da realização da Oficina de Caracterização, realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Conselho.	Vera Lúcia, Maria do Socorro, Renato, Macira	02/03/2015	06/03/2015	-	02/03/2015	05/03/2015	-	100%	Concluído	
2	Apropriação do diagnóstico situacional - caracterização dos municípios da área de influência de Bom Conselho/PE	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	09/03/2015	20/03/2015	-	06/03/2015	21/03/2015	-	100%	Concluído	
3	Levantamento de documentos, estudos, referencial teórico e leitura	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	02/03/2015	10/04/2015	-	02/03/2015	01/04/2015	-	100%	Concluído	
<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS (Peso 60%)</b>											
2	Levantamento de Demandas e as situação da Gestão de Projetos	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	02/03/2015	31/07/2015	-	02/03/2015	21/09/2015	-	30%	Concluído	Dois integrantes do grupo foram deslocados para a força-tarefa do programa Água para Todos, de tal forma que houve prejuízo ao andamento das etapas do projeto, o que justifica o atraso nas etapas visto que o cronograma previsto foi elaborado contando com a participação dos 5 integrantes.
2.1	Elaboração do Questionário e Ofício	Vera Lúcia; Givanildo; Macira; Víncius	02/03/2015	19/06/2015	-	02/03/2015	08/06/2015	-	100%	Concluído	
2.2	Levantamento dos contatos dos envolvidos - gestores dos municípios	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	05/06/2015	10/06/2015	-	03/06/2015	09/06/2015	-	100%	Concluído	
2.3	Envio dos Questionários por meio de Ofício aos municípios	CGDS	03/06/2015	16/06/2015	-	12/06/2015	12/06/2015	-	100%	Concluído	
2.4	Identificação e listagem do público-alvo	Givanildo; Macira; Manoel;	18/03/2015	31/03/2015	-	19/03/2015	26/03/2015	-	100%	Concluído	
2.5	Recebimento dos Questionários preenchidos	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	20/06/2015	30/06/2015	-	20/06/2015	10/08/2015	-	100%	Concluído	Houve atraso no recebimento dos questionários respondidos pelos municípios
2.6	Analise dos dados coletados	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	01/07/2015	15/07/2015	-	09/07/2015	27/08/2015	-	100%	Concluído	vide observação do item 2
2.7	Resultados da Análise	Macira; Renato;	16/07/2015	31/07/2015	-	01/09/2015	21/09/2015	-	100%	Concluído	vide observação do item 2
3	<b>Estratégias de Capacitação</b>	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	27/05/2015	28/08/2015	-	29/05/2015	25/09/2015	-	30%	Concluído	vide observação do item 2
3.1	Melhores Práticas	Givanildo	28/05/2015	29/06/2015	-	29/05/2015	29/06/2015	-	100%	Concluído	
3.2	Perfil da Instituição Capacitadoras	Renato	27/05/2015	27/06/2015	-	29/05/2015	20/07/2015	-	100%	Concluído	
3.3	Modelo de Estruturas de Execução	Manoel	28/05/2015	15/07/2015	-	29/05/2015	20/07/2015	-	100%	Concluído	
3.4	Modelo de Projeto de Capacitação	Macira	29/05/2015	17/07/2015	-	29/05/2015	17/07/2015	-	100%	Concluído	

3.5	Consolidação das Informações	Givanildo; Macira; Manoel; Renato;	03/08/2015	28/08/2015	-	10/08/2015	25/09/2015	-	100%	Concluído	vide observação do item 2	
	<b>DIVULGAÇÃO DO PLANO (Peso 20%)</b>								20%			
4	Impressão (revisão e edição em pdf)	Equipe do Plano	31/08/2015	05/09/2015	-	29/09/2015	30/09/2015	-	100%	Concluído	vide observação do item 2	
5	Apresentação à CGDS	Equipe do Plano	11/09/2015	15/09/2015	-	30/09/2015	30/09/2015	-	100%	Concluído		
6	Distribuição (envio da proposta de plano consolidada) aos Municípios	Equipe do Plano	06/09/2015	12/09/2015	-	30/09/2015	30/09/2015	-	100%	Concluído	Distribuição por meio eletrônico.	
7	Publicização	Equipe do Plano	06/09/2015	15/09/2015	-	30/09/2015	30/09/2015	-	100%	Concluído	Publicização interna, com distribuição à DPLAN, CGGI e ASCOM	
					<b>Valor Previsto:</b>	R\$ -	<b>Valor realizado:</b>	R\$ -	<b>100,0%</b>	<b>Concluído</b>	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:

- (1) Reunião com o CONDEPE/FIDEM no dia 12/02/2015 para tratar de ações referentes ao Plano (proposta)
  - (2) Reunião com a SEPLAG/CONDEPE/FIDEM no dia 15/05/2015 para tratar de ações referentes ao Plano
  - (3) Reuniões internas da equipe às quintas às 14:30h
- 4º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 20 (ex PO 21)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	<b>Ano:</b>	2015
Programa:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Não se aplica	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Carlos Almíro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Falta de conhecimento da atuação entre os parceiros com atuação na área ambiental na área de atuação da SUDENE; Necessidade do recorte/ abordagem regional Nordeste para a discussão de questões ambientais para a região nordeste., para melhor identificação, compreensão dos processos associados, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019		
Objetivo do projeto:	Articular parceiros da área de atuação da SUDENE, com atuação no seguimento ambiental, para discussão, identificação, compreensão dos processos associados, para contribuir com o aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental, necessário à definição, priorização e implementação de políticas públicas ambientais, bem como, articulação com políticas setoriais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				--	0,00	0,00	MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$	-
Previsão de Conclusão:	30/09/2015			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	A realizar no exercício	R\$	-
Data Atualização:	30/11/2015			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	Orcamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$	-
Responsável(s) pelo Projeto	Maria Helena Lima, Victor Uchôa Silva, Isis Moreira, Renato Oliveira e Caio de Assis.			--	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
											Valor liberado no Exercício	R\$	-
											Saldo a liberar	R\$	-
											Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
											Total Liberado até o exercício	R\$	-

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				
1	Levantamento de instituições/ órgãos envolvidos com a temática na área de atuação da Sudene	CGDS/DPLAN/SUDENE	27/01/2015	06/02/2015	--	--	--	--	100,0%	Concluído		
2	Realizar contato prévio com órgãos ministeriais e conselhos de meio ambiente	CGDS/DPLAN/SUDENE	03/02/2015	06/03/2015	--	03/02/2015	06/03/2015	--	100,0%	Concluído		
2.1	Reunião com o MMA	CGDS/DPLAN/SUDENE	03/02/2015	03/02/2015	--	03/02/2015	03/02/2015	--	100,0%	Concluído		
2.2	Reunião com a Abema (Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente)	CGDS/DPLAN/SUDENE	06/03/2015	06/03/2015	--	06/03/2015	06/03/2015	--	100,0%	Concluído		
3	Construção da programação do evento (metodologia, temática)	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/06/2015	17/07/2015	--	17/08/2015	26/08/2015	--	100,0%	Concluído		
4	Elaboração de material em articulação com a ASCOM (folder, banner, cartaz, bloco, crachá...)	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	24/07/2015	--	17/08/2015	11/09/2015	--	100,0%	Concluído		
5	Planejamento de logística e infraestrutura	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	24/07/2015	--	17/08/2015	26/08/2015	--	100,0%	Concluído		
6	Divulgação do Fórum e convite de autoridades e palestrantes	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	04/08/2015	--	27/08/2015	17/09/2015	--	100,0%	Concluído		
7	Realização do Fórum	CGDS/DPLAN/SUDENE	18/09/2015	18/09/2015	--	18/09/2015	18/09/2015	--	100,0%	Concluído		
8	Elaboração de documento final e encaminhamentos do evento	CGDS/DPLAN/SUDENE	18/09/2015	30/09/2015	--	18/09/2015	30/09/2015	--	100,0%	Concluído		
9	Divulgação do documento final e encaminhamentos.	CGDS/DPLAN/SUDENE e ASCOM/SUDENE	18/09/2015	30/09/2015	--	30/09/2015	02/10/2015	--	100,0%	Concluído	O material do evento foi repassado à ASCOM no dia 02/10/2015	
			Valor Previsto:			R\$ 0,00			Valor realizado:			R\$ 0,00
									100%			Concluído
									Status do Projeto			

<b>Parceiros institucionais:</b>
Secretarias e Órgãos Estaduais, da área de influência da SUDENE, bem como, instituições federais e da sociedade civil com atuação na área de meio ambiente.
<b>Observações:</b>
O Fórum foi realizado no Auditório Panorâmico, na sede da SUDENE, em Recife/PE.

4º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 21 (ex PO 24)
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	<b>Eixo temático (MI):</b>	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessoas nas atividades de defesa civil.	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	<b>Gestor da subunidade:</b>	Carlos Almiro Moreira Pinto
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastres naturais e antrópicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)			Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
						MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 167.999,61
	100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12	dez/12	167.999,61	25.421,91	193.421,52	A realizar no exercício	R\$ 60.797,60
Previsão de Conclusão:	09/09/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)				fev/13	60.797,60	--	60.797,60	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Data Atualização:	30/11/2015					-	228.797,21	25.421,91	254.219,12	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ 60.797,60
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 167.999,61

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
<b>INICIAÇÃO (Peso 20%)</b>											
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		20,0%	Concluído	
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12			Concluído	
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100,0%	Concluído	
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100,0%	Concluído	
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100,0%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100,0%	Concluído	
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100,0%	Concluído	
<b>EXECUÇÃO (Peso 60%)</b>											
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R\$ 167.999,61	100,0%	Paralisado	
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50,0%	Concluído	
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100,0%	Paralisado	
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0,0%	Concluído	
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	Paralisado	
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R\$ 60.797,60				0,0%	Paralisado	
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0,0%	Paralisado	Processo em tramitação na Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas, para devolução dos recursos financeiros não aplicados.
<b>ENCERRAMENTO (Peso 20%)</b>											
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	09/09/15					0,0%	Paralisado	
					Valor Previsto:	R\$ 228.797,21	Valor realizado:	R\$ 167.999,61	41,4%	Paralisado	Status do Projeto

<b>Parceiros Institucionais:</b>	Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
<b>Observações:</b>	
Obs.: De acordo com o técnico Marcelo Viana, o projeto será cancelado por dificuldades de execução	
4º ciclo 2015	

<b>Legenda</b>	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 22 (ex PO 26)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN)	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação, para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros				
				250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35	CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 857.015,99
Previsão de Conclusão:	29/02/2016								274.405,33	108.616,36	Mai/2013	383.021,69	A realizar no exercício (RAP 2012)	R\$ -
Data Atualização:	30/11/2015								582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira							857.015,99	108.616,36	-	965.632,35	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
	Convenente	Jussara Santanna Alves											Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R\$ -
													Saldo a liberar	R\$ -
													Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
													Total Liberado até o exercício	R\$ 857.015,99

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído	
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído	
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruven Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e avaiamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada
											Prorrogado para 31/07/2015

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2014					0%	Cancelado	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	SEDETEC/SE irá enviar o Relatório atualizado até 29/05/2015, será avaliada a necessidade de se fazer uma visita anterior a prestação de contas, mas de acordo com informações colhidas no SICONV, o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2º Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015		27/07/2015	27/07/2015		100%	Concluído	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações financeiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santana Alves) - SEDETEC	31/10/2015	30/12/2015		31/10/2015			50%	Em Andamento	Prestação de contas adiada devido ao 2º termo aditivo	Providenciada no SICONV
12	Realização de visita técnica para parecer, se houve incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	15/01/2016	30/01/2016					0%	A Iniciar	Adiada devido ao 2º Termo Aditivo	Planejada
13	Emissão de Laudo Técnico	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/02/2016	29/02/2016					0%	A Iniciar		
14	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	01/02/2016	29/02/2016					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		857.015,99	Valor realizado:		857.015,99	73%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 23 (Ex PO 27)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.	<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN)	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.		
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal		
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/Financeiros
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Previsão de Conclusão:	23/11/2015					
Data Atualização:	30/11/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Albertina Pereira					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais	Miguel Vieira	09/03/2015	09/04/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	25/03/2015		100%	Concluído	
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	02/04/2015		100%	Concluído	
1.4	Relatório Produto 1	Miguel Vieira, com o apoio de José Luis e Marcus Vinícius	30/03/2015	09/04/2015		06/04/2015	09/04/2015		100%	Concluído	
2	Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais	José Luis	10/04/2015	01/06/2015		10/04/2015	16/06/2015		100%	Concluído	
2.1	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/05/2015		10/04/2015	12/05/2015		100%	Concluído	
2.2	Relatório Produto 2	José Luis, com o apoio de Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015		13/05/2015	16/06/2015		100%	Concluído	
3	Produto 3 - Gargalos e Potencialidades do Nordeste por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	16/09/2015		10/04/2015	14/09/2015		100%	Concluído	
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		10/04/2015	27/08/2015		100%	Concluído	Atividade antecipada oportunizada em razão de articulação com os governos da Bahia e Pernambuco.
3.2	Relatórios parciais, por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		05/05/2015	14/09/2015		100%	Concluído	O planejamento inicial previa visita aos estados para execução desta etapa. Devido ao corte de diárias e passagens, esta etapa precisou ser replanejada e, consequentemente, as posteriores
3.3	Matrizes estaduais e síntese	Marcus Vinícius	09/07/2015	11/09/2015		09/07/2015	22/09/2015		100%	Concluído	
3.4	Matriz regional e síntese	Marcus Vinícius	14/09/2015	16/09/2015		09/07/2015	24/09/2015		100%	Concluído	
4	Produto 4 - Relatório Base para Elaboração de Diretrizes para Regionalização da Política Industrial	Marcus Vinícius, Marina Barbosa, Miguel Vieira e Tássia Germano	31/08/2015	23/09/2015		25/09/2015	29/10/2015		100,0%	Concluído	

4.1	Introdução	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	17/09/2015	18/09/2015		25/09/2015	30/09/2015		100%	Concluido		
4.2	Capítulo 1 - Síntese das três últimas políticas industriais	Marina Barbosa	31/08/2015	04/09/2015		05/10/2015	19/10/2015		100%	Concluido		
4.3	Capítulo 2 - Síntese dos indicadores da indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	08/09/2015	11/09/2015		19/10/2015	23/10/2015		100%	Concluido		
4.4	Capítulo 3A - Apreciação geral sobre as potencialidades e gargalos nos estados	Marina Barbosa	14/09/2015	18/09/2015		23/10/2015	26/10/2015		100%	Concluido		
4.5	Capítulo 3B - Gargalos e Potencialidades à indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	21/09/2015	23/09/2015		26/10/2015	29/10/2015		100%	Concluido		
4.6	Conclusão	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	24/09/2015	25/09/2015		28/10/2015	29/10/2015		100%	Concluido		
5	Revisão e entrega final	Albertina Pereira	28/09/2015	23/11/2015		29/10/2015			60%	Atrasado	As atividades foram desdobradas para melhor esclarecer o andamento.	
5.1	Revisão	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	28/09/2015	21/11/2015		29/10/2015	03/11/2015		100%	Concluido		
5.2	Ajustes	Marina Barbosa e Marcus Vinícius	03/11/2015	21/11/2015		18/11/2015			80%	Atrasado		
5.3	Entrega final	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	23/11/2015	23/11/2015					0%	Atrasado		

Valor Previsto: R\$ -      Valor realizado: R\$ -      92%      Atrasado      Status do Projeto

Parceiros institucionais:
Observações:
Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícius; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira. Inclusão de uma atividade do produto 3 em função de maior compreensão do produto via desmembramento de atividade
2º ciclo 2015
Observação para o 3º ciclo: dada a restrição de diárias e passagens, houve a necessidade de readequar o planejamento e execução deste PO
4º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 24 (ex PO 28)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN)	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biosustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE		
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros		
				no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 1.277.000,00	
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00	1.277.000,00	0,00	Novembro/2014	1.277.000,00	A realizar no exercício	R\$ 723.000,00	
						723.000,00	0,00	Março/2015	723.000,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -	
						2.000.000,00	0,00	-	2.000.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
										Valor liberado no Exercício	R\$ 723.000,00	
										Saldo a liberar	R\$ -	
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
										Total Liberado até o exercício	R\$ 2.000.000,00	

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014		13/08/2014	13/08/2014		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014		12/11/2014	12/11/2014		100%	Concluído	
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014		17/11/2014	17/11/2014		100%	Concluído	
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	100%	Concluído	
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015		27/02/2015	27/02/2015		100%	Concluído	
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	723.000,00	10/03/2015	23/03/2015	723.000,00	100%	Concluído	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro. (Foi liberado com atraso)
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015					0%	Cancelado	Foi solicitado um aditivo no valor de R\$252.045,00, mas a executora decidiu não pedir mais o termo aditivo financeiro, uma vez que conseguiu adequar o andamento do plano de trabalho ao valor inicial.
8	Parácer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015					0%	Cancelado	
9	Trâmites burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015					0%	Cancelado	
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	11/11/2015	08/01/2016					60%	Em Andamento	Datas alteradas tendo em vista que a vigência do TED se encerrou em 11/11/2015, sendo o prazo para entrega do relatório final até 08/01/2016 (60 dias).
11	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	13/01/2016	13/01/2016					0%	A Iniciar	
12	Apresentação da prestação de contas	UFPE (Cláudia Sampaio)	11/12/2015	08/01/2016					0%	A Iniciar	
13	Realização de visita técnica para parecer, se houver incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	13/01/2016	13/01/2016					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	2.000.000,00		Valor realizado:	2.000.000,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
4º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 25 (ex PO 29)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	Ação interna	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas
Finalidade da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN)	Gestor da subunidade:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães		Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Desatualização dos critérios e das prioridades adotadas na aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em P&D e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5%, calculados sobre o produto do retorno das operações financeiras concedidos pelo FDNE conforme estabelecido pela alínea "d", inciso XIII, art. 4º do Decreto nº 8276/14.		
Projeto:	Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE.		
Objetivo do projeto:	Melhorar seletividade no custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em critérios objetivos para aplicação de 1,5% oriundo do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Previsão de Conclusão:	A definir					Pago até o ano anterior R\$ -
Data Atualização:	30/11/2015					A realizar no exercício R\$ -
Responsável(s) pelo Projeto	Albertina Pereira (CGEP/DPLAN)					Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.) R\$ -
						Valor Empenhado no Exercício R\$ -
						Valor liberado no Exercício R\$ -
						Saldo a liberar R\$ -
						Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
						Total Liberado até o exercício R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	<b>Produto 1 - Estudos dos critérios anteriormente definidos</b>	Albertina	30/11/2015	11/12/2015	-			-	0%	A Iniciar	<b>Estratégia em definição</b>
1.1	Leitura do relatório resultante do Estudo VIII da Coordenação de Estudos e Pesquisas	Albertina	30/11/2015	11/12/2015	-			-	0%	A Iniciar	
1.2	Identificação dos projetos que utilizam recursos do 1,5% (usar como apoio Estudo VIII citado acima)	Albertina	30/11/2015	11/12/2015	-			-	0%	A Iniciar	
2	<b>Produto 2 - Levantamento dos critérios utilizados por outras instituições executoras de fundos de C&amp;T</b>	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
2.1	Identificar instituições que executam fundos de C&T (CNPq, Finep...)	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
2.2	Contactar tais instituições (Faz-se necessária a coordenação de articulação)	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
2.3	Contactar o CETENE para alinhar os critérios	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
3	<b>Produto 3 - Definição dos critérios de aplicação do 1,5%</b>	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
3.1	Reunião interna para discussão do que foi levantado e definição dos critérios	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
3.2	Redigir relatório parcial com os critérios definidos	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
4	<b>Produto 4 - Definição das prioridades de aplicação do 1,5%</b>	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
4.1	Oficina para discussão de prioridades para aplicação dos recursos	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
4.2	Redigir relatório parcial com as prioridades definidas	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
5	<b>Produto 5 - Apresentação Interna</b>	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
5.1	Reunião para apresentação interna dos critérios e aplicações eleitos pela equipe	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
6	<b>Produto 6 - Relatório Final</b>	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
6.1	Elaboração do relatório final	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
6.2	Validação do relatório	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
6.3	Possíveis correções e entrega do relatório final	Albertina	A definir	A definir	-			-	0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	R\$ -		Valor realizado:	R\$ -	0,0%	A Iniciar	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Responsável Produto  
4º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos	<b>Número do Projeto:</b>	PO 26
<b>Objetivo estratégico:</b>	2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	<b>Ano:</b>	2013
Programa do PPA:	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional - PLANO DE AÇÃO	Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:		Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade suficiente à segurança alimentar e nutricional.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN)	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Planejamento e Articulação de Políticas
Diretor:	Sérgio Alencar	Gestor da subunidade:	George Meireles
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social		
Projeto:	Programa Água para Todos (Sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR)/MI)		
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	44	
				40.42	R\$ 23.556.000,00	
				40.42	R\$ 43.290.000,00	

Previsão de Conclusão:	28/03/2017
Data Atualização:	16/12/2015

Responsável(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
Pago até o ano anterior R\$ 7.956.000,00
A realizar no exercício R\$ -
Orçamento Aprov.no Exercício (LOA+Créd.) R\$ -
Valor Empenhado no Exercício R\$ 15.600.000,00
Valor liberado no Exercício R\$ -
Saldo a liberar R\$ 15.600.000,00
Saldo a Empenhar no exercício R\$ -
Total Liberado até o exercício R\$ 7.956.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/2013	26/09/2013		01/09/2013	26/09/2013		100%	Concluído	
2	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/2013	02/10/2013		01/09/2013	02/09/2013		100%	Concluído	
3	Abertura e Intrução dos Processos	GTAPT	01/09/2013	09/09/2013		01/09/2013	09/09/2013		100%	Concluído	
4	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/2013	23/12/2013		08/10/2013	12/03/2014		100%	Concluído	
5	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/2014	30/01/2014		06/01/2014	15/04/2014		100%	Concluído	
6	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/2014	30/04/2014	R\$ 7.956.000,00	28/04/2014	30/04/2014	R\$ 7.956.000,00	100%	Concluído	
7	Execução da 1ª Meta do Plano de Trabalho	Municípios	16/09/2013	15/12/2013		16/09/2013			90%	Atrasado	Alguns municípios não concluíram todas as etapas da 1ª meta
8	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/07/2015	15/11/2015		15/07/2015			70%	Atrasado	Houve inserção de mais 21 municípios, devido recursos remanescente do MI. Equipe insuficiente para analisar e fiscalizar toda a documentação.
9	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	15/12/2015		01/12/2015			50%	Atrasado	Os recursos humanos alocados na FT/PAPT não são suficiente para suprir a demanda de 50 processos.
10	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/2015	15/12/2015		01/12/2015			50%	Atrasado	Os recursos humanos alocados na FT/PAPT não são suficiente para suprir a demanda de 50 processos.
11	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/2015	15/12/2015		01/12/2015			70%	Atrasado	Os recursos humanos alocados na FT/PAPT não são suficiente para suprir a demanda de 50 processos.
12	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	18/01/2016	01/02/2016	R\$ 15.600.000,00				0%	A Iniciar	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015, 50 municípios se encontram empenhados.
13	Execução da 2ª Meta do Plano de Trabalho	Municípios	21/02/2016	27/09/2016						A Iniciar	O prazo para conclusão do Programa foi prorrogado para 27/09/2016, o que alterou as datas para execução da 2ª meta
14	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/12/2015	27/09/2016		14/12/2015			2%	Em Andamento	Alguns municípios já iniciaram as obras, mesmo sem projeto aprovado.
15	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	27/09/2016	26/11/2016					0%	A Iniciar	
16	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	27/11/2016	25/02/2017					0%	A Iniciar	

17	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	28/09/2016	27/11/2016					0%	A Iniciar		
18	Encerramento do PAPT	FTAPT	26/02/2017	28/03/2017					0%	A Iniciar		
			<b>Valor Previsto:</b>	R\$ 23.556.000,00	<b>Valor realizado:</b>	R\$ 7.956.000,00	54,8%	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>			

**Parceiros institucionais:**

Municípios dos Estados do Piauí, Pernambuco e Paraíba

**Observações:**

(1) 4º Ciclo de monitoramento 2015

(2) Nove municípios não se habilitaram ao recebimento da primeira parcela

(3) Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram êxito para empenho da 1ª parcela

(4) A FT-PAPT notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.

(5) A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados para recebimento da 2ª parcela

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 27 (ex PO 31)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA		
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	5	
				90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08
Previsão de Conclusão:	01/12/2015	Data prevista para implantação do empreendimento.				
Data Atualização:	30/11/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08		-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08		-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09		-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08		-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		

5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluido	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.		
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluido	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.	
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluido	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).		
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluido	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.		
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.		
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Atrasado			
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>12/01/10</b>	<b>31/05/15</b>	<b>3.876.491.700,00</b>	<b>12/01/10</b>	<b>-</b>	<b>3.065.105.668,00</b>	<b>83%</b>	<b>Em Andamento</b>			
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>												<b>92%</b>	<b>Em Andamento</b>

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			-	-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		

<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>	<b>3.876.491.700,00</b>		<b>3.065.105.668,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	--	-------------------------	---------------	-----------------	--------------------------

#### Parceiros institucionais:

#### Observações:

##### 4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)/ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteração do cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluido	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 28 (ex PO 32)</b>				
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2013</b>				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria				
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social				
<b>Objetivo da ação:</b>												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:			DFIN/CDF					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler				
Problema (causa):												
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)											
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano											
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>							
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00							
<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/12/2016		Data prevista para implantação do empreendimento.									
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015											
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler											
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>												
Pago até o ano anterior	R\$ 1.180.925.388,15											
A realizada no exercício	R\$ 778.074.611,85											
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -											
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -											
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 379.080.596,10											
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -											
Saldo a liberar	R\$ 398.994.015,75											
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -											
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.560.005.984,25											
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>	
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>18/12/12</b>	<b>31/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>18/12/12</b>	<b>24/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	126.942.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	277.052.015,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>01/09/13</b>	<b>15/12/15</b>	<b>1.959.000.000,00</b>	<b>24/10/13</b>	<b>-</b>	<b>1.560.005.984,25</b>	<b>75%</b>	<b>Em Andamento</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>											<b>88%</b>	<b>Em Andamento</b>

14	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	
	<b>Encerramento (Banco)</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.560.005.984,25	73,33%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------

#### Parceiros institucionais:

##### Observações:

###### 4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para rerepresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.

Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.

Obs4: Empresa rerepresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.

Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.

Obs.6 A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b> PO 29 (ex PO 33)					
<b>Objetivo estratégico:</b>							<b>Ano:</b> 2008					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
<b>Objetivo da ação:</b>												
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF							
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
<b>Problema (causa):</b>												
<b>Projeto:</b>	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)											
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA											
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>				<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>		
		100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06				Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00	
<b>Previsão de Conclusão:</b>		01/03/2010		Data prevista para implantação do empreendimento.							A realizar no exercício	R\$ -
<b>Data Atualização:</b>		30/11/2015									Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
									Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
									Saldo a liberar	R\$ -		
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
									Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00		
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>	
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>				<b>Físico %</b>
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011. Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>24/07/08</b>	<b>31/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>24/07/08</b>	<b>15/08/11</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>21/03/12</b>	<b>20/04/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>21/03/12</b>	<b>01/06/12</b>	<b>61.728.156,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		

6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	A Iniciar	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concluído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibilização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto			
<b>Parceiros institucionais:</b> <b>Observações:</b> 4º Ciclo 2015 Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 30 (ex PO 34)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR		
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	27/11/2015	Data prevista para implantação do empreendimento.
Data Atualização:	30/11/2015	

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 53.576.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 42.477.417,63
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGF)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/rerepresentação do projeto por 3 vezes.
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/16	31/03/16	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/03/16	31/03/16	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	0%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco								50%	Atrasado		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)				Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:	53.576.481,00	Valor realizado:	42.477.417,63	57,14%	Em Andamento	Status do Projeto	

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
<b>4º Ciclo 2015</b>
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3: A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4: Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs5: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs6: Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7: Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8: Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe da ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB e
Obs9: Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.
Obs10: Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 31 (ex PO 35)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2011</b>			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Problema (causa):											
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 42.723.785,57			
Previsão de Conclusão:		01/08/2014					A realizar no exercício	R\$ -			
Data Atualização:		30/11/2015					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 16.976.214,43			
							Saldo a liberar	R\$ -			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00			
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 59.700.000,00			Valor realizado: 59.700.000,00			80,00%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 32 (ex PO 36)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2011
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:		Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Gestor da subunidade:	DFIN/CDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
				100	54.900.000,00	111.820.000,00	R\$ 53.635.943,87	
Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para implantação do empreendimento.				Pago até o ano anterior	R\$ 53.635.943,87	
Data Atualização:	30/11/2015					A realizar no exercício	R\$ 1.264.056,13	
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	
						Saldo a liberar	R\$ 1.264.056,13	
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	
						Total Liberado até o exercício	R\$ 53.635.943,87	

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Manlio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	-	53.635.943,87	67%	Atrasado	
Competência da SUDENE /Banco									83%	Atrasado	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	54.900.000,00	Valor realizado:	53.635.943,87	70,00%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 33 (ex PO 37)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
		100	5	90	64.439.000,00
					111.845.737,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$	496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Valor liberado (LOA)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	63.942.862,59

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	30/11/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.

Atividades da Unidade (SUDENE)	13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
--------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	--	--

6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	496.137,41	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)	15/05/13	31/07/14	64.439.000,00	15/05/13	-	63.942.862,59	67%	Atrasado		
---	----------	----------	---------------	----------	---	---------------	-----	----------	--	--

Competência da SUDENE /Banco							83%	Atrasado		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	----------	--	--

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	64.439.000,00	Valor realizado:	63.942.862,59	70,00%	Atrasado	Status do Projeto	
----------------------------	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	----------	-------------------	--

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Número do Projeto:</b>	PO 34 (ex PO 38)
<b>Objetivo estratégico:</b>		<b>Ano:</b>	2012
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
<b>Problema (causa):</b>			
<b>Projeto:</b>	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geracão de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R\$	59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$	428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total liberado até o exercício	R\$	59.435.321,28

Responsável(s) técnico(s) pelo Projeto: Sabrina Lyra de Oliveira Guendle

#### Data prevista para conclusão do empreendimento

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Ínicio	Fim	Valor	Ínicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013

Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	428.678,72	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.

<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>	15/05/13	31/07/14	59.864.000,00	15/05/13	-	59.435.321,28	67%	<b>Atrasado</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>							83%	<b>Atrasado</b>	

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.435.321,28	70,00%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 35 (ex PO 39)					
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social					
<b>Objetivo da ação:</b>							<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CDDF					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros												
Problema (causa):													
Projeto:	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA												
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE												
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>						
		100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60							
<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2014						Data prevista para conclusão do empreendimento.						
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015												
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler											
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>		<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>		<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>		
1	Carta-consulta		Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise		Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe: Daniel/ Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>				<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1			01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2			01/07/14	31/07/14	429.090,12	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>				<b>15/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>55.278.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>-</b>	<b>54.848.909,88</b>	<b>67%</b>	<b>Atrasado</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>83%</b>	<b>Atrasado</b>		
9	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>				<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>				<b>Valor Previsto:</b> 55.278.000,00			<b>Valor realizado:</b> 54.848.909,88			<b>70,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fónt: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CCGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 36 (ex PO 40)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
<b>Objetivo da ação:</b>			
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	55.273.000,00	
				97.724.438,55		

Previsão de Conclusão:	01/08/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	30/11/2015	
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.216.447,60
A realizar no exercício	R\$ 1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.216.447,60

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.

Atividades da Unidade (SUDENE)	13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
--------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	--	--

6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	1.056.552,40	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.

Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)	15/05/13	31/07/14	55.273.000,00	15/05/13	-	54.216.447,60	67%	Atrasado		
---	----------	----------	---------------	----------	---	---------------	-----	----------	--	--

Competência da SUDENE /Banco							83%	Atrasado		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	----------	--	--

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	----	-----------	--	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	55.273.000,00	Valor realizado:	54.216.447,60	70,00%	Atrasado	Status do Projeto
<b>Parceiros institucionais:</b>							
<b>Observações:</b>							
<b>4º Ciclo 2015</b>							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.							
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fórmula: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 37 (ex PO 41)</b>				
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2012</b>				
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
Objetivo da ação:												
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CDF							
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
Problema (causa):												
Projeto:	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA											
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairi/CE											
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>					
		100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83						
<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.									
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015											
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler											
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>	
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>13/07/11</b>	<b>05/06/13</b>	<b>0,00</b>	<b>13/07/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>31/07/14</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>11/09/15</b>	<b>64.455.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b> 64.455.000,00			<b>Valor realizado:</b> 64.455.000,00			<b>80,00%</b>	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 38 (ex PO 42)					
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2011					
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social					
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CDF					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros												
Problema (causa):													
Projeto:	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia												
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE												
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)						
		100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00							
Previsão de Conclusão:	30/05/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.										
Data Atualização:	30/11/2015												
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90					
							A realizar no exercício	R\$ -					
							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -					
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -					
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10					
							Saldo a liberar	R\$ -					
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -					
							Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00					
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
1	Carta-consulta		Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	Valor	13/07/11	28/07/11	Valor	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise		Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe: Daniel/ Marluio/ E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1			01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2			01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
	Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução N° 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-		0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	33.900.000,00	Valor realizado:	33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
<b>Parceiros institucionais:</b>							
<b>Observações:</b>							
<b>4º Ciclo 2015</b>							
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.							
Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.							
Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 39 (ex PO 43)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2011</b>			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGDF			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 46.786.085,39			
Previsão de Conclusão:		30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.						A realizar no exercício	R\$ 3.213.914,61	
Data Atualização:		30/11/2015							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
								Saldo a liberar	R\$ 3.213.914,61		
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
								Total Liberado até o exercício	R\$ 46.786.085,39		
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído	
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	-	46.786.085,39	67%	Atrasado	
Competência da SUDENE /Banco										83%	Atrasado
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 50.000.000,00			Valor realizado: 46.786.085,39			70,00%	Atrasado	Status do Projeto

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.

Obs3: Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.

Obs4: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobreestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs5: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 40 (ex PO 44)</b>																																			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2012</b>																																			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																						
<b>Objetivo da ação:</b>																																											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																																						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																						
Problema (causa):																																											
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A																																										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN																																										
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>																																					
		100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62																																					
<b>Previsão de Conclusão:</b>		30/05/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.																																							
<b>Data Atualização:</b>		30/11/2015																																									
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10"><b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>49.687.713,17</td> </tr> <tr> <td>A realizada no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>49.687.713,17</td> </tr> </tbody> </table>										<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>										Pago até o ano anterior	R\$	49.687.713,17	A realizada no exercício	R\$	-	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	Saldo a liberar	R\$	-	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	49.687.713,17
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																																											
Pago até o ano anterior	R\$	49.687.713,17																																									
A realizada no exercício	R\$	-																																									
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-																																									
Saldo a liberar	R\$	-																																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																									
Total Liberado até o exercício	R\$	49.687.713,17																																									
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>																																
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído																																	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído																																	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.																																
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Joema/J.Emerson/A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.																																
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.																																
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	Concluído																																	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído																																	
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído																																	
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.																																
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>49.690.000,03</b>	<b>15/05/13</b>	<b>12/08/14</b>	<b>49.687.713,17</b>	<b>100%</b>	Concluído																																	
										<b>100%</b>	<b>Concluído</b>																																
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>																																											

8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	49.690.000,03	Valor realizado:	49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							<b>Número do Projeto:</b>	PO 41 (ex PO 45)											
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							<b>Ano:</b>	2012											
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																	
Objetivo da ação:																				
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																	
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																	
Problema (causa):																				
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A																			
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN																			
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)															
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31															
Previsão de Conclusão:	01/04/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.																		
Data Atualização:	30/11/2015																			
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																			
N.E.	Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas								
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %										
1	Carta-consulta		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído									
2	Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído									
3	Análise de Projeto		BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.								
4	Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.								
Atividades da Unidade (SUDENE)				01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído									
6	Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído									
6	Liberação 1		SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído									
7	Liberação 2		SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	-	-	0,00	50,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.								
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)				15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	-	34.986.862,96	83%	Atrasado									
Competência da SUDENE /Banco											92%	Atrasado								
8	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar									
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar									
Encerramento (Banco)				Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	A Iniciar									
Resultado Geral do Projeto				Valor Previsto:		40.845.410,40	Valor realizado:		34.986.862,96	75,00%	Atrasado	Status do Projeto								

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 42 (ex PO 46)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,00 MW - Sobradinho/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				100	5	
				90	29.040.000,00	61.107.977,00
Previsão de Conclusão:	30/05/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.				
Data Atualização:	30/11/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12		-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído	
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído	

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	29.040.000,00	Valor realizado:	29.040.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:****Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							<b>Número do Projeto:</b>	PO 43 (ex PO 47)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
<b>Objetivo da ação:</b>				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF							
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros											
<b>Problema (causa):</b>												
<b>Projeto:</b>	Eólica Pedra do Reino S/A											
<b>Objetivo do projeto:</b>	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA											
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>						
		100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00						
<b>Previsão de Conclusão:</b>	01/08/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.									
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015											
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler											
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>												
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00											
A realizar no exercício	R\$ -											
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -											
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -											
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -											
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -											
Saldo a liberar	R\$ -											
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -											
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00											
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>		<b>Ações Corretivas</b>
			<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Inicio</b>	<b>Fim</b>	<b>Valor</b>	<b>Físico %</b>			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/ Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>01/09/11</b>	<b>24/04/13</b>	<b>0,00</b>	<b>01/09/11</b>	<b>15/05/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>15/05/13</b>	<b>01/05/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>15/05/13</b>	<b>20/11/14</b>	<b>53.959.000,00</b>	<b>100%</b>	Concluído		
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>100%</b>	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015.	
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	A Iniciar		
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b> 53.959.000,00			<b>Valor realizado:</b> 53.959.000,00			<b>80,00%</b>	Atrasado	<b>Status do Projeto</b>	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 44 (ex PO 48)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2011			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				Subunidade responsável:	DFIN/CGDF						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A										
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Elétrica - 42,0 MW - Paracuru/CE										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96			
Previsão de Conclusão:		01/08/2014			Data prevista para conclusão do empreendimento.						
Data Atualização:		30/11/2015									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído	
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise. Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobreestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído	
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído	
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído	
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	99.970.000,00	22/05/13	-	96.407.194,96	67%	Atrasado	
Competência da SUDENE /Banco										83%	Atrasado
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 99.970.000,00			Valor realizado: 96.407.194,96			70,00%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											

**Observações:****4º Ciclo 2015**

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.

Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobretestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.

Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Obs5: Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

**Legenda**

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 45 (ex PO 49)																																			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012																																			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																																						
Objetivo da ação:																																											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																																						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																						
Problema (causa):																																											
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP																																										
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento																																										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)																																					
		100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00																																					
Previsão de Conclusão:		31/12/2016																																									
Data Atualização:		30/11/2015																																									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$</td> <td>197.811.049,39</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>105.188.950,61</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$</td> <td>72.058.690,67</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$</td> <td>33.130.259,94</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$</td> <td>269.869.740,06</td> </tr> </tbody> </table>										Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)										Pago até o ano anterior	R\$	197.811.049,39	A realizar no exercício	R\$	105.188.950,61	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	72.058.690,67	Saldo a liberar	R\$	33.130.259,94	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total Liberado até o exercício	R\$	269.869.740,06
Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																											
Pago até o ano anterior	R\$	197.811.049,39																																									
A realizar no exercício	R\$	105.188.950,61																																									
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-																																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-																																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	72.058.690,67																																									
Saldo a liberar	R\$	33.130.259,94																																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-																																									
Total Liberado até o exercício	R\$	269.869.740,06																																									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto	Realizado	Status	Observação/Problemas			Ações Corretivas																																		
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %																																		
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído																																	
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído																																	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído																																	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído																																	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído																																	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído																																	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído																																	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído																																	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.130.259,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	3.000.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/01/16	303.000.000,00	19/04/13	-	269.869.740,06	67%	Em Andamento																																	
Competência da SUDENE /Banco										83%	Em Andamento																																
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar																																	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar																																	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar																																	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	303.000.000,00	Valor realizado:	269.869.740,06	63,64%	Em Andamento	Status do Projeto																																		
Parceiros institucionais:																																											
Observações:																																											
4º Ciclo 2015																																											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																											
Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.																																											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 46 (ex PO 50)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
<b>Objetivo da ação:</b>											
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Problema (causa):											
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)										
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico										
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>					
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00	Pago até o ano anterior	R\$	-			
Previsão de Conclusão:	30/09/2018					A realizar no exercício	R\$	86.845.000,00			
Data Atualização:	30/11/2015					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-			
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					Valor Empenhado no Exercício	R\$	-			
						Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	30.000.000,00			
						Saldo a liberar	R\$	240.582.240,00			
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-			
						Total Liberado até o exercício	R\$	30.000.000,00			
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco										56%	Em Andamento
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:			270.582.240,00	Valor realizado:	30.000.000,00	22,73%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado


  
 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
 PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 47 (ex PO 51)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Sólida - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
Objetivo da ação:				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.										
Objetivo do projeto:	Laboratório de Fármacos para Humanos										
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)						
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61						
Previsão de Conclusão:	31/12/2015		Data prevista para conclusão do empreendimento.								
Data Atualização:	30/11/2015										
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler										
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>											
	Pago até o ano anterior	R\$ 13.862.197,00									
	A realizar no exercício	R\$ 9.992.845,00									
	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -									
	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -									
	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.677.786,88									
	Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12									
	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -									
	Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobretempo dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	03/11/15	03/12/15	4.037.814,18	03/11/15	-	-	50,00%	Em Andamento	Em análise.
8	Liberação 4	SUDENE/BB	04/12/15	03/01/16	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	03/01/16	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	70%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco										85%	Em Andamento
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	23.855.042,00	Valor realizado:	19.539.983,88	65,00%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
4º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											
Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							<b>Número do Projeto:</b>	PO 48 (ex PO 52)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria							
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social							
<b>Objetivo da ação:</b>												
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF							
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							
<b>Problema (causa):</b>												
<b>Projeto:</b>	Deten Química S.A.											
<b>Objetivo do projeto:</b>	Ampliação da Produção de Produtos Químicos											
<b>Dados Orçamentários</b>	<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>							
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00							
<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/01/2016								<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>			
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015								Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00		
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00			
								Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -			
								Valor Empenhado no Exercício	R\$ -			
								Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -			
								Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00			
								Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
								Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00			
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>	
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
	<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>		<b>05/02/13</b>	<b>26/10/13</b>	<b>0,00</b>	<b>05/02/13</b>	<b>10/09/13</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>Concluído</b>		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>		<b>10/09/13</b>	<b>30/12/15</b>	<b>31.256.000,00</b>	<b>10/09/13</b>	<b>-</b>	<b>15.447.600,00</b>	<b>29%</b>	<b>Em Andamento</b>		
	<b>Competência da SUDENE /Banco</b>								<b>64%</b>	<b>Em Andamento</b>		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	<b>Encerramento (Banco)</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>A Iniciar</b>			
	<b>Resultado Geral do Projeto</b>	<b>Valor Previsto:</b>			<b>31.256.000,00</b>	<b>Valor realizado:</b>			<b>15.447.600,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Status do Projeto</b>

Parceiros institucionais:

Observações:

4º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	PO 49 (ex PO 53)																		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	2012																		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social																					
<b>Objetivo da ação:</b>				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF																					
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																					
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros																									
<b>Problema (causa):</b>																										
<b>Projeto:</b>	Shineray do Brasil S.A.																									
<b>Objetivo do projeto:</b>	Produção de Motocicletas																									
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>																				
		100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00																				
<b>Previsão de Conclusão:</b>		30/10/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.																						
<b>Data Atualização:</b>		30/11/2015																								
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																								
<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>																										
<table border="1"> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ 61.867.350,00</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício (RAP)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ 61.867.350,00</td> </tr> </table>											Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00																									
A realizar no exercício	R\$ -																									
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -																									
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																									
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -																									
Saldo a liberar	R\$ -																									
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																									
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00																									
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>		<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>		<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>															
1	Consulta prévia		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Ínicio 26/04/13	Fim 25/06/13	Valor -	Ínicio 26/04/13	Fim 22/05/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído															
2	Análise de Projeto		BB	Ínicio 12/07/13	Fim 09/12/13	Valor -	Ínicio 12/07/13	Fim 18/11/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído															
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Ínicio 19/11/13	Fim 19/12/13	Valor -	Ínicio 19/11/13	Fim 27/11/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.														
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>				26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído															
4	Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Ínicio 27/11/13	Fim 27/03/14	Valor -	Ínicio 27/11/13	Fim 10/12/13	Valor -	Físico % 100,00%	Concluído															
5	Liberação 1		SUDENE/BB	Ínicio 01/05/14	Fim 31/05/14	Valor 43.716.664,18	Ínicio 14/04/14	Fim 25/04/14	Valor 43.716.664,18	Físico % 100,00%	Concluído															
6	Liberação 2		SUDENE/BB	Ínicio 01/06/14	Fim 01/07/14	Valor 8.932.605,95	Ínicio 10/06/14	Fim 26/06/14	Valor 18.150.685,82	Físico % 100,00%	Concluído	Liberações concluídas.														
7	Liberação 3		SUDENE/BB	Ínicio 01/09/14	Fim 01/10/14	Valor 9.218.079,87	Ínicio -	Fim -	Valor -	Físico % 0,00%	Cancelado															
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>				27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído															
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>											100%	Concluído														
8	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar															
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo Único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .														
<b>Encerramento (Banco)</b>				Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar															
<b>Resultado Geral do Projeto</b>				Valor Previsto:	61.867.350,00	Valor realizado:	61.867.350,00	66,67%	Atrasado	Status do Projeto																
<b>Parceiros institucionais:</b>																										
<b>Observações:</b>																										
4º Ciclo 2015																										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																										
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.																										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste							<b>Número do Projeto:</b>	PO 50 (ex PO 54)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores							<b>Ano:</b>	2012			
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE							Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).							Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social			
Objetivo da ação:								Subunidade responsável:	DFIN/CGDF			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos							Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros											
Problema (causa):												
Projeto:	Cone Multicenter Ltda											
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico											
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
		100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00	Pago até o ano anterior	R\$	-			
Previsão de Conclusão:		30/03/2017							A realizar no exercício	R\$	161.068.054,00	
Data Atualização:		30/11/2015							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler							Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	
									Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$	-	
									Saldo a liberar	R\$	191.238.424,00	
									Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	
									Total Liberado até o exercício	R\$	-	
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				Físico %
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco											56%	Em Andamento
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 191.238.424,00			Valor realizado: 0,00			28,57%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
4º Ciclo 2015												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 51 (ex PO 55)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012			
<b>Programa:</b>	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria						
<b>Ação:</b>	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social						
<b>Objetivo da ação:</b>							<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF			
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						
<b>Diretor:</b>	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
<b>Problema (causa):</b>											
<b>Projeto:</b>											
<b>Objetivo do projeto:</b>											
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>				<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>	
		100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00				Pago até o ano anterior R\$ 50.000.000,00	
<b>Previsão de Conclusão:</b>		30/11/2014		Data prevista para conclusão do empreendimento.					A realizar no exercício R\$ -		
<b>Data Atualização:</b>		30/11/2015							Orçamento Aprovado (LOA + Crédito) R\$ -		
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Valor Empenhado no Exercício R\$ -			
								Valor liberado no Exercício (RAP) R\$ -			
								Saldo a liberar R\$ -			
								Saldo a Empenhar no exercício R\$ -			
								Total Liberado até o exercício R\$ 50.000.000,00			
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>			<b>Realizado</b>			<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGF)	<b>Início</b> 03/09/13	<b>Fim</b> 03/10/13	<b>Valor</b> -	<b>Início</b> 03/09/13	<b>Fim</b> 27/09/13	<b>Valor</b> -	<b>Físico %</b> 100,00%	<b>Concluído</b>	
2	Análise de Projeto	BB	<b>Início</b> 13/11/13	<b>Fim</b> 12/04/14	<b>Valor</b> -	<b>Início</b> 13/11/13	<b>Fim</b> 11/04/14	<b>Valor</b> -	<b>Físico %</b> 100,00%	<b>Concluído</b>	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	<b>Início</b> 09/05/14	<b>Fim</b> 08/06/14	<b>Valor</b> -	<b>Início</b> 09/05/14	<b>Fim</b> 12/05/14	<b>Valor</b> -	<b>Físico %</b> 100,00%	<b>Concluído</b>	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.
<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>Início</b> 03/09/13	<b>Fim</b> 08/06/14	<b>Valor</b> 0,00	<b>Início</b> 03/09/13	<b>Fim</b> 12/05/14	<b>Valor</b> 0,00	<b>Físico %</b> 100%	<b>Concluído</b>	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	<b>Início</b> 12/05/14	<b>Fim</b> 11/07/14	<b>Valor</b> -	<b>Início</b> 16/05/14	<b>Fim</b> 10/06/14	<b>Valor</b> -	<b>Físico %</b> 100,00%	<b>Concluído</b>	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	<b>Início</b> 01/08/14	<b>Fim</b> 31/08/14	<b>Valor</b> 50.000.000,00	<b>Início</b> 23/07/14	<b>Fim</b> 22/08/14	<b>Valor</b> 50.000.000,00	<b>Físico %</b> 100,00%	<b>Concluído</b>	Liberações concluídas.
<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>Início</b> 12/05/14	<b>Fim</b> 31/08/14	<b>Valor</b> 50.000.000,00	<b>Início</b> 16/05/14	<b>Fim</b> 22/08/14	<b>Valor</b> 50.000.000,00	<b>Físico %</b> 100%	<b>Concluído</b>	
<b>Competência da SUDENE /Banco</b>										<b>Concluído</b>	
6	Fiscalizações	A definir	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>		-	-	-	<b>Físico %</b> 0,00%	<b>A Iniciar</b>	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>		-	-	-	<b>Físico %</b> 0,00%	<b>A Iniciar</b>	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1º reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, parágrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .
<b>Encerramento (Banco)</b>			<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Valor</b> 0,00	<b>Início</b> -	<b>Fim</b> -	<b>Valor</b> 0,00	<b>Físico %</b> 0%	<b>A Iniciar</b>	
<b>Resultado Geral do Projeto</b>			<b>Valor Previsto:</b> 50.000.000,00			<b>Valor realizado:</b> 50.000.000,00			<b>Físico %</b> 71,43%	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>
<b>Parceiros institucionais:</b>											
<b>Observações:</b>											
4º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 52 (ex PO 56)		
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2012		
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			<b>Eixo temático (MI):</b>	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social					
<b>Objetivo da ação:</b>				<b>Subunidade responsável:</b>	DFIN/CGDF					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			<b>Gestor da subunidade:</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros									
Problema (causa):										
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A									
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço									
<b>Dados Orçamentários</b>		<b>Fonte</b>	<b>Grupo de Despesa</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</b>	<b>Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)</b>			
		100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00				
<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/09/2017						Pago até o ano anterior	R\$ -		
<b>Data Atualização:</b>	30/11/2015						A realizar no exercício	R\$ 363.477.082,00		
<b>Responsável(s) pelo Projeto</b>	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler						Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
							Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -		
							Saldo a liberar	R\$ 1.075.935.159,00		
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
							Total Liberado até o exercício	R\$ -		
<b>N.E.</b>	<b>Atividades/ Etapas</b>		<b>Responsável</b>	<b>Previsto</b>		<b>Realizado</b>		<b>Status</b>	<b>Observação/Problemas</b>	<b>Ações Corretivas</b>
1	Consulta prévia		Casimiro SUDENE/DGFI	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00% <b>Concluído</b>
2	Análise de Projeto		CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00% <b>Concluído</b>
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00% <b>Concluído</b>
	<b>Atividades da Unidade (SUDENE)</b>			<b>19/12/13</b>	<b>06/07/14</b>	<b>0,00</b>	<b>19/12/12</b>	<b>27/06/14</b>	<b>0,00</b>	<b>100% <b>Concluído</b></b>
4	Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00% <b>Atrasado</b>
5	Liberação 1		SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-	-	0,00% <b>Atrasado</b>
6	Liberação 2		SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-	-	0,00% <b>Atrasado</b>
7	Liberação 3		SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-	-	0,00% <b>Atrasado</b>
8	Liberação 4		SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
9	Liberação 5		SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
10	Liberação 6		SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
11	Liberação 7		SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
	<b>Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</b>			<b>27/06/14</b>	<b>31/07/17</b>	<b>1.075.935.159,00</b>	<b>16/05/14</b>	-	<b>0,00</b>	<b>6% <b>Em Andamento</b></b>
	<b>Competência da SUDENE /Banco</b>									<b>53% <b>Em Andamento</b></b>
12	Fiscalizações		A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00% <b>A Iniciar</b>
	<b>Encerramento (Banco)</b>		<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0% <b>A Iniciar</b></b>	
	<b>Resultado Geral do Projeto</b>		<b>Valor Previsto:</b>		<b>1.075.935.159,00</b>	<b>Valor realizado:</b>		<b>0,00</b>	<b>26,92% <b>Em Andamento</b></b>	<b>Status do Projeto</b>
<b>Parceiros institucionais:</b>										
<b>Observações:</b>										
4º Ciclo 2015										
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

<b>Legenda</b>	
<span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>A Iniciar</b>
<span style="background-color: green; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>Concluído</b>
<span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>Em Andamento</b>
<span style="background-color: yellow; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>Atrasado</b>
<span style="background-color: gray; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>Cancelado</b>
<span style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	<b>Paralisado</b>



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste						<b>Número do Projeto:</b>	PO 53 (ex PO 57)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Ano:</b>	2014			
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE			Eixo temático (MI):		Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria					
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):		Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social					
<b>Objetivo da ação:</b>				Subunidade responsável:		DFIN/CDDF					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Gestor da subunidade:		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler					
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiânia SPE S.A. (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)										
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88	Pago até o ano anterior	R\$ 70.152.822,60			
Previsão de Conclusão:		01/06/2016			A realizar no exercício	R\$ 345.429.739,92					
Data Atualização:		30/11/2015			Orçamento Aprovado no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -					
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			Valor Empenhado no Exercício	R\$ -					
					Valor liberado no Exercício	R\$ -					
					Saldo a liberar	R\$ 345.429.739,92					
					Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -					
					Total Liberado até o exercício	R\$ 178.622.724,54					
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído	Liberação concluída.
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	110.824.763,86	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando pedido de liberação.
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/05/16	31/05/16	126.135.074,12	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/05/16	415.582.562,52	21/02/14	-	178.622.724,54	60,00%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco								80,00%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 415.582.562,52	Valor realizado:	R\$ 178.622.724,54	60,00%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
4º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs3: A sudene está aguardando novo cronograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.											

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 54 (ex PO 58)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	<b>2014</b>			
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CDFD			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Cone S/A										
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97	Pago até o ano anterior	R\$	-		
							A realizar no exercício	R\$	123.186.471,03		
							Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$	123.186.471,03		
							Valor Empenhado no Exercício	R\$	123.186.471,03		
							Valor liberado no Exercício	R\$	-		
							Saldo a liberar	R\$	123.186.471,03		
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-		
							Total Liberado ate o exercício	R\$	-		
Previsão de Conclusão:		28/02/2016									
Data Atualização:		31/08/2015									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.
Atividades da Unidade (SUDENE)			12/12/13	02/05/14	0,00	12/12/13	12/11/14	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-			-	0,00%	A Iniciar	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. autorizado a prorrogação do prazo de contratação pela Sudene até 15/12/15.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador. Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			18/11/14	02/03/16	123.186.471,03	00/01/00	-	0,00	0,00%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco										50,00%	Em Andamento
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: R\$ 123.186.471,03			Valor realizado: R\$ -			21,43%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
4º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
<span style="background-color: #0070C0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: #6B8E23; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #6B8E23; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: #C80000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste 1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores						<b>Número do Projeto:</b> PO 55 (ex PO 59)																																																																																																																																																																																																																							
<b>Objetivo estratégico:</b>							<b>Ano:</b> 2015																																																																																																																																																																																																																							
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria																																																																																																																																																																																																																						
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas																																																																																																																																																																																																																						
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGDF																																																																																																																																																																																																																						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																																																																																																																																																																																						
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros																																																																																																																																																																																																																													
Problema (causa):																																																																																																																																																																																																																														
Projeto:	Iraeta Brasil S/A																																																																																																																																																																																																																													
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de flanges eólicas																																																																																																																																																																																																																													
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																																																																																																																							
		100	5	90	34.102.182,00	89.861.866,00	Pago até o ano anterior	R\$ -																																																																																																																																																																																																																						
							A realizar no exercício	R\$ 34.102.182,00																																																																																																																																																																																																																						
							Orcamento Aprovado no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 34.102.182,00																																																																																																																																																																																																																						
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ 34.102.182,00																																																																																																																																																																																																																						
							Valor liberado no Exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																						
							Saldo a liberar	R\$ 34.102.182,00																																																																																																																																																																																																																						
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																						
							Total Liberado até o exercício	R\$ -																																																																																																																																																																																																																						
Previsão de Conclusão:		31/12/2016																																																																																																																																																																																																																												
Data Atualização:		30/11/2015																																																																																																																																																																																																																												
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.E.</th> <th rowspan="2">Atividades/ Etapas</th> <th rowspan="2">Responsável</th> <th colspan="3">Previsto</th> <th colspan="3">Realizado</th> <th rowspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Observação/Problemas</th> <th rowspan="2">Ações Corretivas</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Inicio</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Consulta prévia</td> <td>Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)</td> <td>07/10/14</td> <td>06/11/14</td> <td>-</td> <td>07/10/14</td> <td>24/10/15</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Análise de Projeto</td> <td>BB</td> <td>02/04/15</td> <td>30/08/15</td> <td>-</td> <td>02/04/15</td> <td>28/08/15</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada</td> <td>SUDENE</td> <td>28/08/15</td> <td>27/09/15</td> <td>-</td> <td>28/08/15</td> <td>23/09/15</td> <td>-</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atividades da Unidade (SUDENE)</td> <td>07/10/14</td> <td>27/09/15</td> <td>0,00</td> <td>07/10/14</td> <td>23/09/15</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratação do banco operador</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>28/09/15</td> <td>26/01/16</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50,00%</td> <td>Em Andamento</td> <td>Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Autorizado a prorrogação do prazo de contratação pelo BB até 26/01/2016.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Liberação 1</td> <td>SUDENE/BB</td> <td>01/10/15</td> <td>31/10/15</td> <td>34.102.182,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>Atrasado</td> <td>Aguardando proposta de liberação do agente operador. Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)</td> <td>28/09/15</td> <td>31/10/15</td> <td>34.102.182,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>25,00%</td> <td>Em Andamento</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Competência da SUDENE /Banco</td> <td>62,50%</td> <td>Em Andamento</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Fiscalizações</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Emissão de Certificado de Empreend. Implantado</td> <td>A definir</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Encerramento (Banco)</td> <td>Não informado</td> <td>Não informado</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>A Iniciar</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Resultado Geral do Projeto</td> <td>Valor Previsto:</td> <td>R\$ 34.102.182,00</td> <td>Valor realizado:</td> <td>R\$ -</td> <td>50,00%</td> <td>Em Andamento</td> <td colspan="3">Status do Projeto</td> </tr> <tr> <td colspan="11">Parceiros institucionais:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Observações:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">4º Ciclo 2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído		2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído		3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.	Atividades da Unidade (SUDENE)			07/10/14	27/09/15	0,00	07/10/14	23/09/15	0,00	100,00%	Concluído		4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	26/01/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Autorizado a prorrogação do prazo de contratação pelo BB até 26/01/2016.	5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador. Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/09/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	0,00	25,00%	Em Andamento		Competência da SUDENE /Banco											62,50%	Em Andamento	13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 34.102.182,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto			Parceiros institucionais:												Observações:												4º Ciclo 2015												Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas				Ações Corretivas																																																																																																																																																																																																																
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			Físico %																																																																																																																																																																																																																			
1	Consulta prévia	Breno Oliveira (SUDENE/DFIN)	07/10/14	06/11/14	-	07/10/14	24/10/15	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																				
2	Análise de Projeto	BB	02/04/15	30/08/15	-	02/04/15	28/08/15	-	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																				
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/08/15	27/09/15	-	28/08/15	23/09/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 227/2015.																																																																																																																																																																																																																			
Atividades da Unidade (SUDENE)			07/10/14	27/09/15	0,00	07/10/14	23/09/15	0,00	100,00%	Concluído																																																																																																																																																																																																																				
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/09/15	26/01/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização. Autorizado a prorrogação do prazo de contratação pelo BB até 26/01/2016.																																																																																																																																																																																																																			
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador. Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.																																																																																																																																																																																																																			
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/09/15	31/10/15	34.102.182,00	-	-	0,00	25,00%	Em Andamento																																																																																																																																																																																																																				
Competência da SUDENE /Banco											62,50%	Em Andamento																																																																																																																																																																																																																		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																				
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																				
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar																																																																																																																																																																																																																				
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 34.102.182,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto																																																																																																																																																																																																																					
Parceiros institucionais:																																																																																																																																																																																																																														
Observações:																																																																																																																																																																																																																														
4º Ciclo 2015																																																																																																																																																																																																																														
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.																																																																																																																																																																																																																														

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #6B8E23; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: #A9A9A9; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste</b>						<b>Número do Projeto:</b>	PO 56 (ex PO 60)			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores</b>						<b>Ano:</b>	2015			
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE						Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria			
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).						Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de			
Objetivo da ação:							Subunidade responsável:	DFIN/CGDF			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos						Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler			
Dirutor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros										
Problema (causa):											
Projeto:	Sauípe S/A										
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico										
Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)				
		100	5	90	68.299.987,00	193.893.821,06	Pago até o ano anterior	R\$ -			
							A realizar no exercício	R\$ -			
							Orçamento Aprovado no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 68.299.987,00			
							Valor Empenhado no Exercício	R\$ 68.299.987,00			
							Valor liberado no Exercício	R\$ -			
							Saldo a liberar	R\$ 68.299.987,00			
							Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -			
							Total Liberado até o exercício	R\$ -			
Previsão de Conclusão:		31/01/2018									
Data Atualização:		30/11/2015									
Responsável(s) pelo Projeto		Sabrina Lyra de Oliveira Guendler									
Atividades/ Etapas		Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %		
1	Consulta prévia	Ademir Vilaça/Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	09/10/14	08/11/14	-	09/10/14	30/10/14	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	25/05/15	22/10/15	-	25/05/15	26/10/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	26/10/15	25/11/15	-	26/10/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 231/2015.
Atividades da Unidade (SUDENE)			09/10/14	25/11/15	0,00	09/10/14	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/16	01/05/16	10.133.063,55	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/16	31/07/16	16.330.175,83	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	6.085.184,11	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/01/17	31/01/17	12.766.884,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/04/17	01/05/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/07/17	31/07/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/10/17	31/10/17	5.751.169,71	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	5.731.169,69	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/01/18	68.299.987,00	-	-	0,00	5,56%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco								52,78%	Em Andamento		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	R\$ 68.299.987,00	Valor realizado:	R\$ -	25,00%	Em Andamento	Status do Projeto		
Parceiros institucionais:											
Observações:											
4º Ciclo 2015											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											

Legenda	
<span style="background-color: #0070C0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: #6B8E23; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #808000; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: #C80000; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: #A9A9A9; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: #FFD700; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	<b>Número do Projeto:</b>	PO 57 (ex PO 61)
<b>Objetivo estratégico:</b>	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	<b>Ano:</b>	2015
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/Financeiros (R\$ 1,00)			
				100	39.800.940,00				
Previsão de Conclusão:	30/06/2016								
Data Atualização:	30/11/2015								
Responsável(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler								

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído	
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído	
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído	
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Aguardando proposta de liberação do agente operador.
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	-	0,00	25,00%	Em Andamento	
Competência da SUDENE /Banco								62,50%		Em Andamento	

13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar	
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	0,00%	A Iniciar	

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar	
----------------------	---------------	---------------	------	---	---	------	-------	-----------	--

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:	R\$ -	50,00%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
4º Ciclo 2015	

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>				<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 58 (ex PO 56)</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências</b>				<b>Ano:</b>	<b>2014</b>			
<b>Sub-objetivo:</b>	<b>3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.</b>								
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva						
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão						
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão								
<b>Unidade Responsável:</b>	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional						
<b>Responsável:</b>	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros						
<b>Problema (causa):</b>	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.								
<b>Projeto:</b>	Atualização do Regimento Interno da SUDENE.								
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio do Decreto nº 8.276, de 27/06/14.								

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)			
				0,00	R\$ -	Pago até o ano anterior	R\$ -		
Previsão de Conclusão:	15/04/2015					A realizar no exercício	R\$ -		
Data Atualização:	30/11/2015					Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -		
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca					Valor Empenhado no Exercício	R\$ -		
						Valor liberado no Exercício	R\$ -		
						Saldo a liberar	R\$ -		
						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -		
						Total Liberado até o exercício	R\$ -		

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído	
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído	
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído	
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14	03/10/14		100,00%	Concluído	
8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		06/10/14	24/10/14		100,00%	Concluído	
9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14		29/10/14	14/11/14		100,00%	Concluído	

10	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	19/11/14	15/12/14		19/11/14	15/12/14		100,00%	Concluído	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD, que foi seguida por sugestões de ajustes e o envio para apreciação da versão final no dia 15/12/14.	
11	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/12/14	29/12/14		27/02/15	27/02/15		100,00%	Concluído	Aguardando agenda da Diretoria colegiada.	Em reunião realizada dia 25/03/15, a Diretoria pediu que as unidades internas apresentassem, no prazo de 48 horas, sugestões à proposta de RI que ainda percebiam como necessárias.
12	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/03/15	25/03/15		29/04/15	29/04/15		100,00%	Concluído	Essa reunião objetivou o encontro de soluções para a implantação da Coordenação de Gestão de Convênios e TCE, para a retomada do cargo da coordenação da CGGI e para a troca de cargo DAS 102-3 por 101.3, da unidade de Suprimentos para a Coordenação de Gestão de Convênios e TCE.	A CGGI preparou nota técnica com data de 12/05/15 para subsidiar decisão do Superintendente sobre o assunto.
13	Aprovação pela DC, publicação no DOU e Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	01/03/15	29/05/15		13/05/15	21/10/15		100,00%	Concluído		
			Valor Previsto:		0,00	Valor realizado:		100,00%	Concluído	Status do Projeto		

**Parceiros institucionais:**

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

**Observações:**

4º Ciclo 2015

O prazo de conclusão foi reajustado para 15/04/2015 em função de agenda da Diretoria colegiada.

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
<span style="background-color: blue; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Concluído
<span style="background-color: green; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**  
**PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>			<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 59</b>
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências</b>			<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
<b>Sub-objetivo:</b>	<b>3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.</b>				
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão				
<b>Unidade Responsável:</b>	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional		
<b>Responsável:</b>	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros		
<b>Problema (causa):</b>	Desatualização do regimento interno do Conselho Deliberativo da Autarquia face à nova regulamentação da estrutura regimental posta pelo Decreto nº 8.276/2014.				
<b>Projeto:</b>	Atualização do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (CONDEL) da SUDENE.				
<b>Objetivo do projeto:</b>	Adequar o atual RI do CONDEL da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio do Decreto nº 8.276/14.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)		Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)					
				0,00	R\$ -		Pago até o ano anterior	R\$ -	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Previsão de Conclusão:	30/10/2015						Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -
Data Atualização:	30/11/2015						Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ -		
Responsável(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca											

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor				
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE e seu rebatimento no funcionamento do CONDEL	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	04/08/15	26/08/15		04/08/15	30/08/15		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.	O Decreto nº 8.276 foi assinado em 27/06/14 e publicado no DOU de 30/06/14, Seção 1, pág. 5..
2	Envio da minuta à Procuradoria para análise.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	28/08/15	28/08/15		31/08/15	31/08/15		100,00%	Concluído		
3	Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	31/08/15	15/09/15		31/08/15	24/09/15		100,00%	Concluído	Efetuados os ajustes recomendados pela Procuradoria Jurídica junto à SUDENE conforme o Parecer nº90/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU de 24/09/2015.	
4	Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação sobre a proposta de RI	Manoel Barreiros (CGGI)	18/09/15	18/09/15		28/09/14	28/09/15		100,00%	Concluído		
5	Apreciação e deliberação sobre a nova proposta de RI CONDEL	Diretoria Colegiada	23/09/15	23/09/15		21/10/15	21/10/15		100,00%	Concluído	Proposta aprovada conforme Ata da 210ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 21/10/15.	
6	Emissão e envio de Proposição ao Presidente do CONDEL para aprovação.	Superintendente João Paulo	24/09/15	24/09/15		21/10/15	21/10/15		100,00%	Concluído	Emitida a Proposição nº 086, de 21/10/15, para envio ao MI e emissão de Resolução com aprovação na forma de "ad referendum" em razão da urgência e relevância do assunto.	
7	Edição de Resolução pelo Presidente do CONDEL, sancionando a proposta do novo RI do CONDEL.	Gilberto Magalhães Occhi (Ministro do MI e Presidente do CONDEL)	30/09/15	30/09/15		30/10/15	30/10/15		100,00%	Concluído	Emitida a Resolução nº 088, de 30/10/15, aprovando, na condição de "ad referendum" o novo Regimento Interno do CONDEL da SUDENE. DOU de 25/11/2015	
8	Inserção do novo RI do CONDEL no site da SUDENE e sua respectiva Resolução de aprovação e demais documentos.	Solange Melo (CGTI)	30/09/15	30/10/15		07/12/15	07/12/15		100,00%	Concluído		

Valor Previsto: 0,00 Valor realizado: 0,00 100,00% Concluído

Parceiros institucionais:

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

<b>Legenda</b>	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 60																																																																																																																					
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2015																																																																																																																					
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.																																																																																																																							
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva																																																																																																																					
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão																																																																																																																					
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional																																																																																																																					
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros																																																																																																																					
Responsável:	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)																																																																																																																							
Problema (causa):	Falta de amparo legal para uma maior frequência de reuniões ordinárias anuais além da necessidade de adequação às alterações do Decreto nº 7.838/2012, do FDNE, e outras alterações julgadas necessárias. Medida reforçada por pedido da Diretoria Colegiada da SUDENE na sua 210ª reunião realizada em 21/10/15.																																																																																																																							
Projeto:	Atualização do Regimento Interno da Diretoria Colegiada da SUDENE.																																																																																																																							
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da Diretoria Colegiada da SUDENE à demanda pelo aumento da frequência de reuniões ordinária além de ajustes inspirados pela regulamentação do FDNE (Decreto nº 7.838/12) e da própria SUDENE (Decreto nº 8.276/14).																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados Orçamentários</th> <th>Fonte</th> <th>Grupo de Despesa</th> <th>Modalidade</th> <th>Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)</th> <th>Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)					-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valores Orçamentários/Financeiros (R\$ 1,00)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago até o ano anterior</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>A realizar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Orçamento Aprovado (LOA + Credito)</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor Empenhado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Valor liberado no Exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a liberar</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Saldo a Empenhar no exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Liberado até o exercício</td> <td>R\$ -</td> </tr> </tbody> </table>		Valores Orçamentários/Financeiros (R\$ 1,00)		Pago até o ano anterior	R\$ -	A realizar no exercício	R\$ -	Orçamento Aprovado (LOA + Credito)	R\$ -	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -	Valor liberado no Exercício	R\$ -	Saldo a liberar	R\$ -	Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -	Total Liberado até o exercício	R\$ -																																																																																			
Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)																																																																																																																			
				-	-																																																																																																																			
Valores Orçamentários/Financeiros (R\$ 1,00)																																																																																																																								
Pago até o ano anterior	R\$ -																																																																																																																							
A realizar no exercício	R\$ -																																																																																																																							
Orçamento Aprovado (LOA + Credito)	R\$ -																																																																																																																							
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -																																																																																																																							
Valor liberado no Exercício	R\$ -																																																																																																																							
Saldo a liberar	R\$ -																																																																																																																							
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -																																																																																																																							
Total Liberado até o exercício	R\$ -																																																																																																																							
Previsão de Conclusão:	12/11/2015																																																																																																																							
Data Atualização:	30/11/2015																																																																																																																							
Responsável(s) pelo Projeto	Maznoel Barreiros																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N.E.</th> <th rowspan="2">Atividades/ Etapas</th> <th rowspan="2">Responsável</th> <th colspan="3">Previsto</th> <th colspan="2">Realizado</th> <th rowspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Observação/Problemas</th> <th rowspan="2">Ações Corretivas</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Inicio</th> <th>Fim</th> <th>Valor</th> <th>Físico %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pedido da Diretoria Colegiada para aumento da frequência de reuniões ordinárias.</td> <td>Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)</td> <td>21/10/15</td> <td>21/10/15</td> <td></td> <td>21/10/15</td> <td>21/10/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Pedido emitido na 210ª reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 21/10/15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Análise do RI da Diretoria Colegiada e adequação do texto ao pedido da mesma, além de ajustes de alinhamento às novas normas do FDNE (Decreto nº 7.838/2012).</td> <td>Manoel Barreiros (CGGI)</td> <td>21/10/15</td> <td>22/10/15</td> <td></td> <td>22/10/15</td> <td>22/10/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Envio da minuta à Procuradoria para análise.</td> <td>Manoel Barreiros (CGGI)</td> <td>22/10/15</td> <td>22/10/15</td> <td></td> <td>22/10/15</td> <td>22/10/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica</td> <td>Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)</td> <td>29/10/15</td> <td>29/10/15</td> <td></td> <td>27/10/15</td> <td>27/10/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Não houve recomendação de ajustes, da parte da Procuradoria Jurídica junto à SUDENE conforme o Parecer nº 112/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU de 27/10/2015.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação sobre a proposta de RI</td> <td>Manoel Barreiros (CGGI)</td> <td>03/11/15</td> <td>30/11/15</td> <td></td> <td>03/11/15</td> <td>03/11/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Apreciação e deliberação sobre a nova proposta de RI da Diretoria Colegiada</td> <td>Diretoria Colegiada</td> <td>11/11/15</td> <td>11/11/15</td> <td></td> <td>12/11/15</td> <td>12/11/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td>Proposta aprovada conforme Ata da 212ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 12/11/15.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Envio do RI da Diretoria Colegiada para publicação no site da SUDENE e no Boletim interno da Autarquia.</td> <td>Manoel Barreiros (CGGI)</td> <td>12/11/15</td> <td>12/11/15</td> <td></td> <td>13/11/15</td> <td>13/11/15</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Valor Previsto:</td> <td>0,00</td> <td>Valor realizado:</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Concluído</td> <td colspan="2">Status do Projeto</td> </tr> </tbody> </table>								N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas	Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %	1	Pedido da Diretoria Colegiada para aumento da frequência de reuniões ordinárias.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	21/10/15	21/10/15		21/10/15	21/10/15		100,00%	Concluído	Pedido emitido na 210ª reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 21/10/15	2	Análise do RI da Diretoria Colegiada e adequação do texto ao pedido da mesma, além de ajustes de alinhamento às novas normas do FDNE (Decreto nº 7.838/2012).	Manoel Barreiros (CGGI)	21/10/15	22/10/15		22/10/15	22/10/15		100,00%	Concluído		3	Envio da minuta à Procuradoria para análise.	Manoel Barreiros (CGGI)	22/10/15	22/10/15		22/10/15	22/10/15		100,00%	Concluído		4	Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	29/10/15	29/10/15		27/10/15	27/10/15		100,00%	Concluído	Não houve recomendação de ajustes, da parte da Procuradoria Jurídica junto à SUDENE conforme o Parecer nº 112/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU de 27/10/2015.	5	Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação sobre a proposta de RI	Manoel Barreiros (CGGI)	03/11/15	30/11/15		03/11/15	03/11/15		100,00%	Concluído		6	Apreciação e deliberação sobre a nova proposta de RI da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	11/11/15	11/11/15		12/11/15	12/11/15		100,00%	Concluído	Proposta aprovada conforme Ata da 212ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 12/11/15.	7	Envio do RI da Diretoria Colegiada para publicação no site da SUDENE e no Boletim interno da Autarquia.	Manoel Barreiros (CGGI)	12/11/15	12/11/15		13/11/15	13/11/15		100,00%	Concluído					Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	100,00%	Concluído	Status do Projeto	
N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado					Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas																																																																																																											
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor	Físico %																																																																																																															
1	Pedido da Diretoria Colegiada para aumento da frequência de reuniões ordinárias.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	21/10/15	21/10/15		21/10/15	21/10/15		100,00%	Concluído	Pedido emitido na 210ª reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 21/10/15																																																																																																													
2	Análise do RI da Diretoria Colegiada e adequação do texto ao pedido da mesma, além de ajustes de alinhamento às novas normas do FDNE (Decreto nº 7.838/2012).	Manoel Barreiros (CGGI)	21/10/15	22/10/15		22/10/15	22/10/15		100,00%	Concluído																																																																																																														
3	Envio da minuta à Procuradoria para análise.	Manoel Barreiros (CGGI)	22/10/15	22/10/15		22/10/15	22/10/15		100,00%	Concluído																																																																																																														
4	Emissão de Parecer pela Procuradoria Jurídica	Elvira Carrasqueira (PRD/SUDENE)	29/10/15	29/10/15		27/10/15	27/10/15		100,00%	Concluído	Não houve recomendação de ajustes, da parte da Procuradoria Jurídica junto à SUDENE conforme o Parecer nº 112/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU de 27/10/2015.																																																																																																													
5	Envio à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação sobre a proposta de RI	Manoel Barreiros (CGGI)	03/11/15	30/11/15		03/11/15	03/11/15		100,00%	Concluído																																																																																																														
6	Apreciação e deliberação sobre a nova proposta de RI da Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	11/11/15	11/11/15		12/11/15	12/11/15		100,00%	Concluído	Proposta aprovada conforme Ata da 212ª reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 12/11/15.																																																																																																													
7	Envio do RI da Diretoria Colegiada para publicação no site da SUDENE e no Boletim interno da Autarquia.	Manoel Barreiros (CGGI)	12/11/15	12/11/15		13/11/15	13/11/15		100,00%	Concluído																																																																																																														
			Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	100,00%	Concluído	Status do Projeto																																																																																																															

<b>Parceiros institucionais:</b>	Diretoria Colegiada da SUDENE e DAD/CGTI
<b>Observações:</b>	
4º Ciclo 2015	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 61 (ex PO 57)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b>	2013
<b>Sub-objetivo:</b>	3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.		
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.		
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Responsável :	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)	<b>Gestor da subunidade:</b>	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.		
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE (Mapeamento Experimental da atividade CONVÉNIOS)		
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rutinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Eixo temático (MI): Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	Objetivo estratégico (MI): Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
				no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)			
	100	1	90	0,00	0,00			
Previsão de Conclusão:	29/04/2016							
Data Atualização:	30/11/2015							
Responsável(s) pelo Projeto	Manoel Barreiros, Carmen Lúcia Couto Fonseca e Vinícius Almeida Vieira (CGGI)							

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de videoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	Concluído	
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	Concluído	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).
3	Reunião com unidades internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	Concluído	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explicação sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14	-	11/09/14	11/09/14	-	100%	Concluído	
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14	-	11/09/14	18/09/14	-	100%	Concluído	
6	Seleção da área a ser mapeada	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15	26/03/15	-	100%	Concluído	Foi escolhido o tema "convênios"
7	Definição da Metodologia	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	12/06/15	12/06/15	-	12/06/15	12/06/15	-	100%	Concluído	
8	Ajuste/revisão a minuta de portaria	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	10/06/15	18/06/15		10/06/15	18/06/15		100%	Concluído	
9	Revisão do projeto de GESTÃO DE PROCESSOS e elaboração versão final com base na metodologia escolhida.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	12/06/15	19/06/15	-	100%	Concluído	
10	Preparar Material a ser distribuído aos interlocutores	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	20/08/15	20/08/15	-	100%	Concluído	
11	Reunião com representante das unidades envolvidas no processo "convênios" (CGGI; CGDS/DPLAN; CGEP/DPLAN; AUD; CGC-CPTCE; COC/CGAF) para tratar das orientações que irão nortear o mapeamento das atividades/ Início dos trabalhos e início do mapeamento na temática "Convênios".	Manoel, Vinícius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	21/08/15	21/08/15	-	21/08/15	21/08/15	-	100%	Concluído	É importante que o servidor indicado seja mantido no trabalho até o seu final.

12	Acompanhamento dos trabalhos com os interlocutores envolvidos no convênio, para elaboração e conclusão das entrevistas	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	24/08/15	30/09/15	-	24/08/15	30/09/15	-	100%	Concluído	Agendado quartas-feiras pela manhã (9h-11h)	
13	Trabalhos internos do grupo de processos relativo ao processo de convênios	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	01/11/15	29/04/16		01/11/15			19%	Em Andamento		
13.1	Elaboração do mural de sub-processos adotados por cada unidade e consolidação em um fluxo único sobre a realidade	Manoel Barreiros, Vinicius Oliveira e Carmen Fonseca (CGGI)	21/10/15	23/10/15		21/10/15	23/10/15		100%	Concluído		
13.1.1	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela Coordenação de convênios e Tomada de Contas Especial (CGC/DAD) e retorno à CGGI	Heber Nunes (DAD/CGC)	05/11/15	10/11/15					50%	Atrasado	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.1.2	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGDS/DPLAN e retorno à CGGI	Marcelo Viana (CGDS)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.1.3	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGEP/DPLAN e retorno à CGGI	Frederico Cavalcanti e Joyce Queiroz (CGEP/DPLAN)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.1.4	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela CGAF/COC e retorno à CGGI	Brivaldo Soares e Eva (CGAF/COC)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.1.5	Análise do fluxo real de funcionamento da tramitação pela AUD e retorno à CGGI	Taciana e Lúcio Flávio (AUD)	A definir	A definir					0%	A Iniciar	Objetiva verificar duplicidades e correções, com supressão de operações desnecessárias.	A unidade deverá apresentar proposta de correção com a assessoria da CGGI.
13.2	Elaboração da proposta de um novo fluxo de convênios	Vinicius Vieira e Manoel Barreiros (CGGI)	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
13.3	Reunião com as unidades que integram o processo de convênios para discussão da proposta, aperfeiçoamento e consolidação	Manoel Barreiros (CGGI)	A definir	A definir					0%	A Iniciar		
14	Apresentação, para o Superintendente e Diretores, dos resultados do mapeamento do Processo "Convênio".	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE) GAB Diretoria Colegiada	29/04/16	29/04/16	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	0,00	Valor realizado:	0,00	87%	Em Andamento	Status do Projeto		

#### Parceiros institucionais:

Auditoria interna; Coordenação-Geral de Logística, Administração e Finanças/DAD; Coordenação de Gestão de Convênios/DAD; Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente/DPLAN e Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação/DPLAN.

#### Observações:

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

#### 4º Ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão e Coordenação de Gestão de Processos de Desenvolv. Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CPA e CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 62</b>
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	<b>3.1.2. Modernizar a gestão</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
Diretor:	Eugenio Pacelli Remigio Araújo	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
Previsão de Conclusão:	ñ se aplica				
Data Atualização:	27/11/2015	Colocar a data do último contato.			
Responsável(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes				

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Processo nº 03055.000006/97-17 (SIAFI n.º 321499), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2015	08/01/2015	-	02/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído	
2	Processo nº 03057.000018/96-15 (SIAFI n.º 317428), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/12/2014	06/01/2015	-	15/12/2014	06/01/2015	-	100%	Concluído	
3	Processo nº 03045.000086/99-19 (SIAFI n.º 383890), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/12/2014	14/01/2015	-	22/12/2014	14/01/2015	-	100%	Concluído	
4	Processo nº 59335.000705/2010-78(SIAFI n.º 750323), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/02/2015	12/02/2015	-	02/02/2015	19/02/2015	-	100%	Concluído	
5	Processo nº 03054.000032/97-19(SIAFI n.º 339202), Emissão de Parecer Financeiro	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	16/02/2015	24/02/2015	-	16/02/2015	24/02/2015	-	100%	Concluído	
6	Processo nº 59335.000172/2010-24 (SIAFI n.º 737121), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/02/2015	27/02/2015	-	13/02/2015	27/02/2015	-	100%	Concluído	
7	Processo nº 59333.000214/04-07 (SIAFI n.º 517207), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/02/2015	06/03/2015	-	20/02/2015	06/03/2015	-	100%	Concluído	
8	Processo nº 59333.000181/2005-78 (SIAFI n.º 538618), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	26/02/2015	12/03/2015	-	26/02/2015	12/03/2015	-	100%	Concluído	
9	Processo nº 59313.000007/00-59 (SIAFI n.º 403449), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/03/2015	17/03/2015	-	02/03/2015	17/03/2015	-	100%	Concluído	
10	Processo nº 59333.000262/2005-78 (SIAFI n.º 542944), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	05/03/2015	02/04/2015	-	05/03/2015	16/03/2015	-	100%	Concluído	
11	Processo nº 59335.000445/09-05 (SIAFI n.º 707420), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	04/04/2015	18/04/2015	-	04/04/2015	18/04/2015	-	100%	Concluído	

12	Processo nº 59335.000577/2009-29 (SIAFI n.º 716701), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/03/2015	02/04/2015	-	19/03/2015	02/04/2015	-	100%	Concluído		
13	Processo nº 03057.000012/98-17 (SIAFI n.º 368220), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	06/04/2015	20/04/2015	-	06/04/2015	20/04/2015	-	100%	Concluído		
14	Processo nº 03057.000018/96-15 (SIAFI n.º 317428), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Felipe Pinto Nunes (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	05/05/2015	19/05/2015	-	05/05/2015	19/05/2015	-	100%	Concluído		
15	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/06/2015	15/06/2015	-	08/06/2015	15/06/2015	-	100%	Concluído		
16	Processo nº 59335.000520/2009-20 (SIAFI n.º 710365), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/05/2015	18/06/2015	-	13/05/2015	18/06/2015	-	100%	Concluído	detectada ausência de laudo técnico em 03/06/2015. Remessa à CGDS para emissão de laudo técnico em 03/06/2015. Retorno da CGDS em 10/06.	remessa à CGDS para emissão de laudo técnico em 03/06/2015. Retorno da CGDS em 10/06.
17	Processo nº 03057.000036/97-96 (SIAFI n.º 337849), Emissão de Parecer Financeiro Complementar (reanálise global)	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/06/2015	05/08/2015	-	08/06/2015	05/08/2015	-	100%	Concluído		Processo em conciliação na CJU/RN
18	Processo nº 59335.000211/2010-93 (SIAFI n.º 744427), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/06/2015	11/08/2015	-	22/06/2015	11/08/2015	-	100%	Concluído		
19	Processo nº 59335.000293/2012-76 (SIAFI n.º 746462), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	22/06/2015	14/08/2015	-	22/06/2015	14/08/2015	-	100%	Concluído		
20	Processo nº 59335.000449/2009-85 (SIAFI n.º 707430), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/04/2015	17/08/2015	-	15/04/2015	17/08/2015	-	100%	Concluído	O convênio precisou: a) mudança de status (A comprovar para A Aprovar; b) consulta a PRD	a) remetido à COCF em 20/04 para mudança de status. Devolvido em 24/04. b) Remetido à PRD em 25/05/2015.
21	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	09/07/2015	24/08/2015	-	09/07/2015	29/09/2015	-	100%	Concluído		
22	Processo nº 59335.000118/2012-41 (SIAFI n.º 769784), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/08/2015	28/08/2015	-	25/08/2015	28/08/2015	-	100%	Concluído		
23	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	28/09/2015	13/10/2015	-	28/09/2015	16/11/2015	-	100%	Concluído		
24	Processo nº 59335.000210/2012-19 (SIAFI n.º 770860), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/10/2015	23/10/2015	-	08/10/2015	22/10/2015	-	100%	Concluído		
25	Processo nº 03054.000027/98-51 (SIAFI n.º 368547), Emissão de Parecer Financeiro	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	08/10/2015	23/10/2015	-	08/10/2015	06/11/2015	-	100%	Concluído		
26	Processo nº 59335.000211/2010-93 (SIAFI n.º 744427), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	14/10/2015	29/10/2015	-	14/10/2015	10/11/2015	-	100%	Concluído		
27	Processo nº 59335.000130/2012-55 (SIAFI n.º 770355), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	29/10/2015	13/11/2015	-	29/10/2015	29/09/2015	-	100%	Concluído		
28	Processo nº 03054.000027/98-51 (SIAFI n.º 770860), Emissão de Parecer Financeiro Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	11/06/2015	26/06/2015	-	11/06/2015	22/10/2015	-	100%	Concluído		
				Valor Previsto:	R\$ 0,00	Valor realizado:		R\$ 0,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

**Parceiros institucionais:** Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

**Observações:**

4º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	<b>3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE</b>	<b>Número do Projeto:</b>	<b>PO 63</b>
<b>Sub-Obj. estratégico:</b>	<b>3.1.2. Modernizar a gestão</b>	<b>Ano:</b>	<b>2015</b>
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial
Diretor:	Eugenio Pacelli Remigio Araújo	Gestor da subunidade:	Heber Leandro Nunes
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros	
Previsão de Conclusão:	ñ se aplica					
Data Atualização:	27/11/2015	Colocar a data do último contato.				
Responsável(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Processo TCE n.º 59335.000329/2013-64, Ref. Conv. SIAFI n.º 383689 (Processo n.º 03045.000074/99-21) - Emissão de Relatório de TCE nº 001/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	17/08/2014	13/02/2015	-	17/08/2014	13/02/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 25/02/2015 (Ofício n.º 049/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)
2	Processo TCE n.º 59335.000324/2013-31, Ref. Conv. SIAFI n.º 383671 (Processo n.º 03045.000061/99-80) - Emissão de Relatório de TCE nº 002/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	17/08/2014	13/02/2015	-	17/08/2014	13/02/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 27/02/2015 (Ofício n.º 051/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)
3	Processo TCE n.º 59335.000584/2013-15, Ref. Conv. SIAFI n.º 365635 (Processo n.º 03050.000045/98-09) - Emissão de Relatório de TCE nº 003/2015	Rivaldo Alves, Eliane Acioly (CPTCE)	27/08/2014	23/02/2015	-	27/08/2014	23/02/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 09/03/2015 (Ofício n.º 0612015-SUDENE/DAD/CPTCE)
4	Processo TCE n.º 59335.000586/2013-04, Ref. Conv. SIAFI n.º 767395 (Processo n.º 59335.000373/2011-11) - Emissão de Relatório de TCE nº 004/2015	Heber Nunes, Rivaldo Alves (CPTCE)	06/09/2014	05/03/2015	-	06/09/2014	05/03/2015	-	100%	Concluído	TCE encerrada por saneamento de pendência (remessa de prestação de contas e devolução do saldo do convênio). Arquivamento autorizado no item "g" da 191ª Ata da Diretoria Colegiada da SUDENE
5	Processo TCE n.º 59335.000257/2011-93, Ref. Conv. SIAFI n.º 135783 (Processo n.º 06270.000005/95-64) - Emissão de Relatório de TCE nº 005/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	27/11/2014	26/05/2015	-	27/11/2014	26/05/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 02/06/2015 (Ofício n.º 143/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)
6	Processo TCE n.º 59335.000158/2011-01, Ref. Conv. SIAFI n.º 338496 (Processo n.º 03055.000034/97-44) - Emissão de Relatório de TCE nº 006/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	-	03/03/2015	31/07/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 12/06/2015 (Ofício n.º 162/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)
7	Processo TCE n.º 59335.000171/2010-80., Ref. Conv. SIAFI n.º 383513 (Processo n.º 03045.000037/99-03) - Emissão de Relatório de TCE nº 007/2015	Rivaldo Alves, Eliane Acioly (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	-	03/03/2015	31/07/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 15/06/2015 (Ofício n.º 165/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)

8	Processo TCE n.º 59335.000037/2011-60, Ref. Conv. SIAFI n.º 348331 (Processo n.º 03050.000007/98-10) - Emissão de Relatório de TCE nº 008/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	-	03/03/2015	31/07/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 30/06/2015 (Ofício n.º 175/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
9	Processo TCE n.º 59335.000038/2012-95, Ref. Conv. SIAFI n.º 118907 (Processo n.º 28.110.JO.0037/94-7) - Emissão de Relatório de TCE nº 009/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	03/03/2015	31/07/2015	-	03/03/2015	31/07/2015	-	100%	Concluído	TCE remetida à CGU/PR em 30/06/2015 (Ofício n.º 174/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
10	Processo TCE n.º 59335.0000587/2013-41, Ref. Conv. SIAFI n.º 767312 (Processo n.º 59335.0000370/2011-79) - Emissão de Relatório de TCE nº 010/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	27/11/2013	26/05/2014	-	27/11/2013	30/06/2015	-	100%	Concluído	TCE encerrada por saneamento de pendência (remessa de prestação de contas e devolução do saldo do convênio). Arquivamento autorizado no item "g" da 191ª Ata da Diretoria Colegiada da SUDENE	
11	Processo TCE n.º 59335.000063/2011-98, Ref. Conv. SIAFI n.º 364921 (Processo n.º 03050.000035/98-47) - Emissão de Relatório de TCE nº 011/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	04/03/2015	31/08/2015	-	04/03/2015	11/11/2015	-	100%	Concluído	TCE concluída em 28/10/15, com envio à CGU em 11/11/2015. (Ofício n.º 277/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
12	Processo TCE n.º 59335.000412/2010-90, Ref. Conv. SIAFI n.º 368499 (Processo n.º 03054.000023/98-09) - Emissão de Relatório de TCE nº 012 /2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/07/2015	16/01/2016	-	20/07/2015	17/11/2015	-	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 286/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
13	Processo TCE n.º 59335.000354/2012-67, Ref. Conv. SIAFI n.º 383832 (Processo n.º 03045.000089/99-07) - Emissão de Relatório de TCE nº 013/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	02/01/2016	-	06/07/2015	17/11/2015	-	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 285/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
14	Processo TCE n.º 59335.000059/2010-49, Ref. Conv. SIAFI n.º 338465 (Processo n.º 03055.000045/97-61) - Emissão de Relatório de TCE nº 014/2015	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	13/07/2015	09/01/2016	-	13/07/2015	17/11/2015	-	100%	Concluído	TCE concluída em 09/11/15, com envio à CGU em 17/11/2015. (Ofício n.º 284/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
15	Processo TCE n.º 59335.000207/2012-97, Ref. Conv. SIAFI n.º 383999 (Processo n.º 03045.000012/99-74) - Emissão de Relatório de TCE nº 015/2015	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/06/2015	12/12/2015	-	15/06/2015	26/11/2015	-	100%	Concluído	TCE concluída em 23/11/15, com envio à CGU em 26/11/2015. (Ofício n.º 290/2015-SUDENE/DAD/CPTCE)	
16	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	02/01/2016	-	06/07/2015		-	66%	Em Andamento	Tendo em vista a remessa de documentação pelo potencial responsável, foi solicitada a emissão de laudo técnico complementar	
17	Processo TCE n.º 59335.000038/2011-04, Ref. Conv. SIAFI n.º 370305 (Processo n.º 03050.000007/99-92) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	27/03/2015	23/09/2015	-	27/03/2015		-	66%	Atrasado	Em fase de notificação dos potenciais responsáveis	A data final prevista será repartida em função do estoque de providências relacionadas à tramitação de TCEs.
18	Processo TCE n.º 59335.000185/2010-01, Ref. Conv. SIAFI n.º 395796 (Processo n.º 59313.000019/00-83) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/08/2015	30/01/2016	-	03/08/2015		-	66%	Em Andamento	Em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
19	Processo TCE n.º , Ref. Conv. SIAFI n.º 317557 (Processo n.º 03057.000002/96-93) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	26/10/2015	23/04/2016	-	26/10/2015		-	33%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
20	Processo TCE n.º 59335.000538/09-21, Ref. Conv. SIAFI n.º 406596 (Processo n.º 59313.000105/00-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2015 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	26/10/2015	23/04/2016	-	26/10/2015		-	33%	Em Andamento	Elaborando relatório preliminar, para início das notificações	
				Valor Previsto:	R\$ 0,00	Valor realizado:	R\$ 0,00	88%	Em Andamento			

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.

Observações:

4º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b> 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b> PO 64 (ex PO 62)
<b>Objetivo estratégico:</b> 3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b> 2014
<b>Sub-objetivo:</b> 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.	
<b>Programa:</b> 2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b> IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
<b>Ação:</b> 2000-Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b> Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
<b>Objetivo da ação:</b> Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	
<b>Unidade responsável:</b> COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	<b>Subunidade responsável:</b> DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
<b>Responsável :</b> ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	<b>Gestor da subunidade:</b> MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
<b>Problema (causa):</b> Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe	
<b>Projeto:</b> DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS	
<b>Objetivo do projeto:</b> Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.	

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE	Valor Total
				no Projeto (R\$ 1,00)	do Projeto (R\$ 1,00)
				250	26.600,00
<b>Previsão de Conclusão:</b>		27/11/2015			
<b>Data Atualização:</b>		04/12/2015			
<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>		Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga			

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	1.600,00
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	-
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	25.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$	1.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído	
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído	
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído	
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído	
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído	
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/09/15	25.000,00	04/05/15	27/10/15		0%	Atrasado	Data repactuada. As propostas recebidas apresentaram inconsistências legais, conforme o Parecer da Procuradoria da Sudene.
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
9	Elaboração de Projetos Desenvolvimento de coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
10	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
11	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	26.600,00		<b>Valor realizado:</b>	1.600,00	45%	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>	

<b>Parceiros institucionais:</b>
<b>Observações:</b>
Ciclo janeiro a novembro de 2015. O projeto é uma ação interligada ao Projeto Gestão por Competências e ambos ocorrerão nos próximos 04 anos conforme previsto no Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2016/2019.
4º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
A Iniciar	
Concluído	
Em Andamento	
Atrasado	
Cancelado	
Paralisado	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b> 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b> PO 65 (ex PO 63)
<b>Objetivo estratégico:</b> 3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	<b>Ano:</b> 2015
<b>Sub-objetivo:</b> 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.	
<b>Programa:</b> 2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b> IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
<b>Ação:</b> 2000 - Administração da Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b> Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
<b>Objetivo da ação:</b> Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos	
<b>Unidade responsável:</b> COORDENAÇÃO GERAL DE PESSOAS	<b>Subunidade responsável:</b> DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
<b>Responsável :</b> ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	<b>Gestor da subunidade:</b> MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
<b>Problema (causa):</b> Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.	
<b>Projeto:</b> Gestão por Competências	
<b>Objetivo do projeto:</b> Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.	

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros
				(R\$ 1,00)	(R\$ 1,00)	
				250	3.3.90.00	
					25.000,00	25.000,00

<b>Previsão de Conclusão:</b>	30/10/2015
<b>Data Atualização:</b>	04/12/2015

<b>Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto</b>	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga
---	--

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ 25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 25.000,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído	
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído	
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído	
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/07/15	25.000,00	01/04/15	27/10/15		0%	Atrasado	Repactuação de datas. As propostas recebidas apresentaram inconsistências legais para contratação, conforme o Parecer da Procuradoria da Sudene.
5	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
6	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
7	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
8	Desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
9	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
10	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	A definir	A definir					0%	A Iniciar	
			<b>Valor Previsto:</b>	25.000,00	<b>Valor realizado:</b>	0,00	30%	<b>Atrasado</b>	<b>Status do Projeto</b>		

Parceiros institucionais:

Observações:

Ciclo de janeiro a novembro de 2015. O projeto é de ação contínua e está sendo incluído no PPA 2016-2019. As ações do mesmo ocorrerão nos próximos 04 anos através de projetos previstos no Plano de Desenvolvimento de Pessoas, quando serão redimensionadas as etapas.  
4º Ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
<span style="background-color: #0070C0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: #00A0C0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: #00C0A0; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: #FF0000; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: #808080; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: #FFD700; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	PROMOVER A EXCELÊNCIA TÉCNICA E A QUALIDADE DA GESTÃO DA SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 66 (ex PO 64)
<b>Objetivo estratégico:</b>	MODERNIZAR A GESTÃO E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E A CAPACITAÇÃO POR COMPETÊNCIAS	<b>Ano</b>	2015
<b>Sub-objetivo:</b>	VALORIZAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES		
Programa:	2111- Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e Gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	Subunidade responsável:	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	Gestor da subunidade:	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laborativa.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros			
				250	3.3.90.00				
Previsão de Conclusão:	18/12/2015								
Data Atualização:	04/12/2015								

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.
--	--

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído	
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído	
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído	
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicosociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído	
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído	
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído	
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído	
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído	
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.
10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	Concluído	
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	Concluído	

12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15	22/09/15		100%	Concluído		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilitadores	15/09/15	02/10/15	2.500,00	15/09/15	02/10/15		100%	Concluído		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilitadores	16/10/15	18/12/15		16/10/15		1.200,00	80%	Em Andamento		
15	Encerramento do Projeto	CGGP, facilitadores e participantes do projeto	18/12/15	18/12/15					0%	A Iniciar		

Valor Previsto: 10.000,00 Valor realizado: 6.200,00 92% **Em Andamento** **Status do Projeto**

**Parceiros Institucionais:**

Banco Central; Secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura do Recife, Igreja Batista do Cordeiro

**Observações:**

Ciclo janeiro a novembro/2015

4º Ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 67 (ex PO 65)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	<b>Ano:</b>	2012
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Previsão de Conclusão:	13/11/2016
Data Atualização:	04/12/2015

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino
-----------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 2.630.114,65
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 555.861,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 241.454,70
Valor liberado no Exercício	R\$ 25.356,00
Saldo a liberar no Exercício	R\$ 216.098,70
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 2.655.470,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R\$ 658.668,51.
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído	
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estrutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R\$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R\$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R\$ 98.490,80.
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R\$ 105 mil em 2013 e R\$ 35 mil já este ano.
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14	13/04/15	0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R\$ 241.454,70.
7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14		100%	Concluído	A Nota de Empenho, no valor global de R\$ 555.861,00, foi realizada em 05/12/2014, aguardando autorização superior para fabricação das poltronas.

8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	11/02/16	273.000,00	11/06/15			82%	Em Andamento	Foi celebrado em 07/05/2015 o Contrato Sudene nº 02/2015 e emitida a Ordem de Execução dos Serviços em 11/06/2015, com prazo de entrega dos projetos em 180 dias.	Foi emitida a Portaria nº 48, de 20/05/2015, nomeando a Comissão de Fiscalização dos serviços, composta pela arquiteta Paula Aragão de Souza e pelos engenheiros José Wilson Galdino, Thiago Teles da Silva e Diego Véras Emerenciano.
8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15	28/10/15	25.356,00	100%	Concluído	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 25.356,00.	Os serviços foram concluídos em 28/10/2015, após a análise da Fiscalização na documentação apresentada pela Contratada.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	31/12/15		27/07/15			95%	Em Andamento	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 60.220,50.	Os serviços foram iniciados em 27/07/2015, tendo a Contratada apresentado os resultados desta fase para análise da Fiscalização
8.3	Projeto Executivo	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	11/02/16		17/08/15			50%	Em Andamento	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 87.478,20.	A partir dos elementos já acordados com a Fiscalização nas etapas anteriores, a Contratada vem elaborando o Projeto Executivo.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	12/02/16	12/05/16	0,00				0%	A Iniciar		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	13/05/16	13/11/16	3.300.000,00				0%	A Iniciar		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Eng. e Automação Ltda.	13/05/16	13/11/16	72.000,00				0%	A Iniciar	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R\$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			13/11/16					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		7.553.642,89	Valor realizado:		2.655.470,65	68%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica: 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE					Número do Projeto: PO 68 (ex PO 66)
Objetivo estratégico: 3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho					Ano: 2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva		
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão		
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças		
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares		
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.				
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.				
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)
		100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Previsão de Conclusão:	20/08/2015
Data Atualização:	04/12/2015

Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixoto Bem
-----------------------------	---

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 5.191.716,42
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$ 3.478.828,44
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exerc. (LOA 2015+RAP 2014)	R\$ 1.266.897,20
Saldo a liberar no Exercício	R\$ 2.211.931,24
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total liberado até o exercício	R\$ 6.458.613,62

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído	
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído	
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R\$ 4.225.259,21.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12		3.533.874,44	88%	Paralisado	A Sudene encaminhou o 6º Termo Aditivo, sugerindo o acréscimo de 180 dias no prazo contratual, porém a Contratada não assinou esse documento dentro do prazo legal.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12		0,00	88%	Paralisado	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve e pelos engenheiros elétricos Diogo Véras e Thiago Teles e pela arquiteta Rebeca Ramalho.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00				0%	Paralisado	Paralisado
			Valor Previsto:	9.673.041,23	Valor realizado:	6.458.613,62	90%	Paralisado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

4º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: gray; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 69 (ex PO 67)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	<b>Ano:</b>	2009
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	Gestor da subunidade:	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Exaustão e obsolescência das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)																							
						Pago até o ano anterior	R\$	100.000,00	A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R\$	48.000,00	Orcamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$	-	Valor Empenhado no Exercício	R\$	-	Valor liberado no Exercício	R\$	-	Saldo a liberar no Exercício	R\$	-	Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-	Total liberado até o exercício	R\$	100.000,00
	250	33	90	4.663.522,50	4.663.522,50																								
Previsão de Conclusão:	10/12/2015																												
Data Atualização:	04/12/2015																												
Responsável(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino, Diego Véras Emerenciano e Thiago Teles da Silva																												

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R\$ 78.000,00, sendo R\$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R\$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R\$ 4.503.522,50.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15			0%	Paralisado	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que aguardasse a decisão final sobre que órgão condonarial iria realizar esta licitação.
8	Execução da Obra	A definir	10/08/15	10/12/15	4.503.522,50				0%	A Iniciar	
9	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Véras e empresa de consultoria	10/08/15	10/12/15	60.000,00				0%	A Iniciar	
10	Entrega da obra			10/12/15					0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	4.663.522,50	Valor realizado:	100.000,00	26,09%	Paralisado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:  
4º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
<span style="background-color: blue; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	A Iniciar
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Concluído
<span style="background-color: lightgray; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Em Andamento
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Atrasado
<span style="background-color: gray; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Cancelado
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span>	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 70 (ex PO 68)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	<b>Ano:</b>	2014
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:		Gestor da subunidade:	
Diretor:			
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.		
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL entre 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto				Valores Orçamentários/ Financeiros				
	100	33	90	484.650,00				Pago até o ano anterior	R\$ 484.650,00			
Previsão de Conclusão:	30/06/2015											
Data Atualização:	30/11/2015											
Responsável(s) pelo Projeto	Angela Nascimento (UFPE).											

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído	
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciéncia da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciéncia Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
6	Coordenação Científica (R\$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R\$ 82.100,00) (642 docs./10.413 imagens)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
8	Tratamento do acervo iconográfico (R\$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
9	Pesquisa em jornais (R\$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/214		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.
10	Produção de Artigos (R\$ 12.000,00)	Dejenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução iniciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Streaming; Capacitação (R\$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R\$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R\$ 9.000,00)	Alaíde Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL

15	Revisão e normatização de material textual (R\$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	30/06/2014		100%	Concluído		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R\$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros da organização); Realização igual a R\$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozembli	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R\$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	Concluído		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R\$ 5.600,00)	Severino Silva	02/06/2014	30/11/2014		02/12/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
20	Serviço de tradução (R\$ 40.000,00)	Pessoa Jurídica	02/06/2014	30/11/2014		-	-		-	Cancelado	Atividade não executada.	
21	Serviço de transcrição (R\$ 20.000,00)	Arabera Traduções Técnicas	02/06/2014	30/11/2014		10/10/2014	30/11/2014		100%	Concluído		
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	Concluído		
23	Finaização (Relatório)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	28/02/2015	30/06/2015					0%	Atrasado	Aguardando o relatório da UFPE.	
				<b>Valor Previsto:</b>	484.650,00	<b>Valor realizado:</b>	484.650,00	95%	Atrasado	<b>Status do Projeto</b>		

**Parceiros institucionais:**

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

**Observações:**

4º ciclo 2015

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 71 (ex PO 69)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	<b>Ano:</b>	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	
Diretoria responsável:		Gestor da subunidade:	
Diretor:			
Problema (causa):	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)		
Projeto:	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	565.700,00

Previsão de Conclusão:	31/07/2016
Data Atualização:	30/11/2015

Responsável(s) pelo Projeto	Ângela Nascimento (UFPE).
-----------------------------	---------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R\$	-
A realizar no exercício	R\$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-
Valor Empenhado no Exercício	R\$	-
Valor liberado no Exercício	R\$	565.700,00
Saldo a liberar	R\$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-
Total Liberado até o exercício	R\$	565.700,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperação para Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído	Portaria nº 046 de 13/05/2015, pela o qual o Chefe de Gabinete passa a ser o coordenador institucional do Projeto
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros
6	Coordenação Científica (R\$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	30/05/2016		30/04/2015			50%	Em andamento	
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R\$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			60%	Em andamento	
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassette e 200 fitas de vídeo (R\$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015			40%	Em andamento	
9	Pesquisa em jornais (R\$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			40%	Em andamento	
10	Produção de Artigos (R\$ 24.000,00)	Dejenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			30%	Em andamento	
11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R\$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			65%	Em andamento	
12	Coleta de depoimento ne elaboração de documentário (R\$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	31/03/2016					40%	Em andamento	
13	Alimentação e monitoramento do site (R\$ 7.800,00)	Fábio Silva	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			40%	Em andamento	
14	Produção de Artigos (R\$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	30/09/2015		01/06/2015			45%	Em andamento	

15	Revisão, normatização e diagramação (R\$ 6.000,00)	Não selecionado	01/10/2015	31/12/2015					0%	A Iniciar		
16	Transcrição de depoimentos (R\$ 10.000,00)	Não selecionado	01/08/2015	29/02/2016		30/09/2015			30%	Em andamento		
17	Publicação do livro (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	02/01/2015	30/04/2016					0%	A Iniciar		
18	Preservação analógica do acervo textual (R\$ 20.000,00)	Não selecionado	01/07/2015	29/02/2016					0%	A Iniciar		
19	Realização de Ciclos de Debates (R\$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	30/04/2016		01/06/2015			30%	Em Andamento	Realização do III Ciclo de Debates em caruaru, 31/08/2015	
20	Assistência administrativa (R\$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016					0%	A Iniciar		
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R\$ 16.000,00)	M2S	01/07/2015	31/05/2016					50%	Em andamento		
22	Assessoria de comunicação (R\$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015			30%	Em Andamento		

Valor Previsto:

565.700,00

Valor realizado:

565.700,00

45%

Em Andamento

Status do Projeto

**Parceiros institucionais:**

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciéncia Política e Ciéncia da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

**Observações:**

4º ciclo 2015

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015**

<b>Diretriz estratégica:</b>	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	<b>Número do Projeto:</b>	PO 72 (ex PO 70)
<b>Objetivo estratégico:</b>	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	<b>Ano:</b>	2014
<b>Programa:</b>	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	<b>Eixo temático (MI):</b>	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
<b>Ação:</b>	2000 - Administração de Unidade	<b>Objetivo estratégico (MI):</b>	Assegurar participação, transparéncia e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
<b>Objetivo da ação:</b>	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
<b>Diretoria responsável:</b>	Diretoria de Administração	<b>Subunidade responsável:</b>	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
<b>Dirutor:</b>	Eugenio Pacelli Remigio Araujo	<b>Gestor da subunidade:</b>	Josué Ribeiro
<b>Problema (causa):</b>	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI.		
<b>Projeto:</b>	Modernização da Infraestrutura da Rede Local		
<b>Objetivo do projeto:</b>	Melhoria da Infraestrutura de TI.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	Rec. Próprios	44	90	1.899.749,20
Previsão de Conclusão:	30/11/2015			
Data Atualização:	03/12/2015			
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.			
Valores Orçamentários/ Financeiros				
Pago até o ano anterior	R\$	-		
A realizar no exercício	R\$	1.899.749,20		
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$	-		
Valor Empenhado no Exercício	R\$	1.899.749,20		
Valor liberado no Exercício	R\$	1.899.749,20		
Saldo a liberar	R\$	-		
Saldo a Empenhar no exercício	R\$	-		
Total Liberado até o exercício	R\$	1.899.749,20		

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.	01/10/14	28/11/14	-	22/09/14	13/11/14		100%	Concluído	
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/12/14	29/08/14	-	14/11/14	09/02/15		100%	Concluído	
3	Contratação da 1a etapa	Setor de Licitação	11/06/15	30/06/15	-	11/06/15	18/06/15		100%	Concluído	
4	Contratação da 2a etapa	Setor de Licitação	01/07/15	31/07/15	-	21/07/15	03/09/15		100%	Concluído	
5	Realização do serviço da 1a. etapa.	Fornecedor	01/08/15	30/09/15	1.065.604,20	03/09/15	30/09/15	1.065.604,20	100%	Concluído	
6	Realização do serviço da 2a. etapa.	Fornecedor	01/09/15	30/11/15	834.145,00	03/09/15	30/11/15	834.145,00	100%	Concluído	
			Valor Previsto:		1.899.749,20	Valor realizado:		1.899.749,20	100%	Concluído	Status do Projeto

<b>Parceiros institucionais:</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>4º Ciclo 2015</b>	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralizado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL  
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 73 (ex PO 71)
Objetivo estratégico:	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Ano:	2015
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Gestor da subunidade:	Josué Ribeiro
Diretor:	Eugenio Pacelli Remigio Araujo		
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto	Valores Orçamentários/ Financeiros	
	a definir	44	90	613.862,88		
Previsão de Conclusão:	30/12/2015					
Data Atualização:	03/12/2015					
Responsável(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.					

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Inicio	Fim	Valor	Inicio	Fim	Valor			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído	
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído	
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído	
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - especificação de requisitos, arquitetura, processos,modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	19/10/15	-	76.046,79	70%	Atrasado	
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos,modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	10/11/15	-	-	20%	Em Andamento	
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	31/03/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar	
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador e da SUDENE	Área de TI, Empresa Contratada,	01/04/16	30/06/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar	
			Valor Previsto:	613.862,88	Valor realizado:	383.999,07	85%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:
Ministério da Integração Nacional e SUDAM
Observações:
4º Ciclo 2015
Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento e implantação do sistema.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

**ANEXO II**  
**Gestão Orçamentária e Financeira**  
**até nov/2015**

**SUDENE**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2015)**

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2016	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	26.198.061,00	15.678.836,00	12.365.755,17	59,85	78,87	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	600.000,00	400.000,00	169.426,08	66,67	42,36	Servidor capacitado	199		0,00		
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	287.325,15	100,00	49,88	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	31.680,00	31.680,00	8.738,40	100,00	27,58	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	124.753,25	100,00	51,98	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.075.416,00	1.075.416,00	936.687,73	100,00	87,10	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	21.204,00	21.204,00	1.182,64	100,00	5,58	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.848.455,00	3.848.455,00	3.106.961,10	100,00	-	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	28.862.954,00	28.862.954,00	26.162.753,41	100,00	-	-	-	-	-	-	
<b>2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI</b>						<b>Total</b>	<b>61.509.870,00</b>	<b>50.790.645,00</b>	<b>43.163.582,93</b>	<b>82,57</b>	<b>84,98</b>					
09	272	0089	0181	OP	1	2.356.309,00	2.258.123,00	2.127.718,07	95,83	94,23	-	-	-	-	-	
<b>0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União</b>						<b>Total</b>	<b>2.356.309,00</b>	<b>2.258.123,00</b>	<b>2.127.718,07</b>	<b>95,83</b>	<b>94,23</b>					
11	128	2029	4640	A	1	1.100.000,00	800.000,00	0,00	72,73	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	1.211.233,00	253.000,00	0,00	20,89	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	0,00	Zoneamento realizado - km <sup>2</sup>	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	1.000.000,00	541.010,00	0,00	54,10	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	532.475,00	532.475,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/7002	A	1	900.000,00		0,00	0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/7004	A	1	100.000,00		0,00	não inf.	não inf.	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	1.000.000,00	600.000,00	534.417,84	60,00	89,07	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1			0,00	#DIV/0!	não inf.	Avaliação Realizada		não inf.	-		
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	2.964.293,00	1.612.316,00	565.700,00	54,39	35,09	Plano Elaborado		não inf.			
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/71243	A	1	800.000,00		700.000,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71243	A	1	262.300,00		0,00	0,00	não inf.	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71244	A	1	800.000,00		0,00	0,00							
<b>2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária</b>						<b>Total</b>	<b>11.535.301,00</b>	<b>5.203.801,00</b>	<b>1.800.117,84</b>	<b>45,11</b>	<b>34,59</b>					
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
<b>2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres</b>						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>					
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: em 30/11/2015 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

**ANEXO III**

**Projetos tabulados segundo Diretrizes  
e Objetivos Estratégicos da SUDENE**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Paralizado	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.952.322,32	21%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 221.000,00	29%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
12	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
13	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
14	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
15	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confeções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
16	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Brossutentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
17	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.560.005.984,25	80%
20	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
21	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
22	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
23	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
24	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
25	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
26	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
27	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
28	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
29	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
30	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
31	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
32	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 40.845.410,40	R\$ 34.986.862,96	86%
33	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
34	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
36	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
37	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
38	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
39	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
40	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
41	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
42	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
43	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
44	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 178.622.724,54	43%
45	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
46	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
47	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
48	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
<b>Total do Objetivo 1.1</b>								<b>R\$ 9.430.601.297,79</b>	<b>R\$ 6.119.221.150,30</b>	<b>65%</b>
49	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fórum de Energia	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 1.2</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
50	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
<b>Total do Objetivo 1.4</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total -</b>

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
51	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
52	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
				<b>Total do Objetivo 1.5</b>				<b>234.105,49</b>	<b>139.865,15</b>	<b>60%</b>
		<b>TOTAL DA DIRETRIZ 1</b>						<b>9.430.835.403,28</b>	<b>6.119.361.015,45</b>	<b>65%</b>
53	26	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 23.556.000,00	R\$ 7.956.000,00	34%
				<b>Total do Objetivo 2.2</b>				<b>23.556.000,00</b>	<b>7.956.000,00</b>	<b>34%</b>
54	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
55	15	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
56	20	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
				<b>Total do Objetivo 2.3</b>				<b>1.366.305,97</b>	<b>723.390,74</b>	<b>53%</b>
57	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
				<b>Total do Objetivo 2.4</b>				<b>228.797,21</b>	<b>167.999,61</b>	<b>73%</b>
		<b>TOTAL DA DIRETRIZ 2</b>						<b>25.151.103,18</b>	<b>8.847.390,35</b>	<b>35%</b>
58	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
59	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (CONDEL) da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno da Diretoria Colegiada da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
64	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 1.600,00	6%
65	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
66	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1. Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
		<b>Total do Objetivo 3.1</b>						<b>61.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>13%</b>
67	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
68	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
69	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 1.899.749,20	R\$ 1.899.749,20	100%
70	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 383.999,07	63%
		<b>Total do Objetivo 3.2</b>						<b>3.563.962,08</b>	<b>3.334.098,27</b>	<b>94%</b>
71	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 2.655.470,65	35%
72	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
73	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%
		<b>Total do Objetivo 3.3</b>						<b>21.890.206,62</b>	<b>9.214.084,27</b>	<b>42%</b>
		<b>TOTAL DA DIRETRIZ 3</b>						<b>25.151.768,70</b>	<b>12.555.982,54</b>	<b>49%</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>						<b>9.481.502.275,16</b>	<b>6.140.764.388,34</b>	<b>64,8</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2015

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2015

**ANEXO IV**  
**Projetos tabulados segundo a**  
**Programação do PPA 2012-2015**

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.560.005.984,25	80%
3	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 54.900.000,00	R\$ 53.635.943,87	98%
7	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 64.439.000,00	R\$ 63.942.862,59	99%
8	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.435.321,28	99%
9	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.278.000,00	R\$ 54.848.909,88	99%
10	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 55.273.000,00	R\$ 54.216.447,60	98%
11	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faisa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
13	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 50.000.000,00	R\$ 46.786.085,39	94%
14	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 40.845.410,40	R\$ 34.986.862,96	86%
16	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
17	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 303.000.000,00	R\$ 269.869.740,06	89%
20	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
25	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 1.075.935.159,00	R\$ 0,00	0%
27	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 178.622.724,54	43%
28	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 123.186.471,03	R\$ 0,00	0%
29	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Iraeta Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 34.102.182,00	R\$ 0,00	0%
30	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sauípe S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 68.299.987,00	R\$ 0,00	0%
31	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 39.800.940,00	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 0355</b>								<b>9.410.816.104,98</b>	<b>6.109.665.966,06</b>	<b>65%</b>
32	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraíbano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
33	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 221.000,00	29%
<b>P 2029 - Ação 20N7</b>										
34	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.183.120,40	R\$ 1.183.120,40	100%
<b>P 2029 - Ação 4640</b>										
35	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 326.618,00	31%
<b>P 2029 - Ação 8689</b>										
36	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
37	15	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 835.823,47	R\$ 458.149,49	55%
<b>P 2029 - Ação 8902</b>										
38	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Piano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 139.865,15	60%
39	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 9.452.840,00	R\$ 1.952.322,32	21%
40	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
41	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Piano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 221.267,56	62%
42	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	50%
43	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	50%
44	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 1.000.000,00	R\$ 700.000,00	70%
<b>P 2029 - Ação 8917</b>										
45	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecendo as administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Atrasado	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
46	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estratégico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municípios do Semiárido paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 410.203,62	R\$ 0,00	0%
<b>P 2029 - Ação 8918</b>										
47	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 857.015,99	R\$ 857.015,99	100%
48	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Bissotutável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 8340</b>										
49	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Paralisado	R\$ 694.459,19	R\$ 694.459,19	100%
<b>P 2029 - Ação 8918</b>										

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
50	16	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	100%
<b>P 2029 - Ação 7K66</b>										
<b>Total do Programa 2029</b>										
51	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do sistema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Paralisado	R\$ 228.797,21	R\$ 167.999,61	73%
<b>P 2040 - Ação 8172</b>										
<b>Total do Programa 2040</b>										
52	58	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (CONDEL) da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno da Diretoria Colegiada da SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
56	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
57	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 26.600,00	R\$ 1.600,00	6%
59	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0%
60	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 10.000,00	R\$ 6.200,00	62%
61	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 7.553.642,89	R\$ 2.655.470,65	35%
62	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 9.673.041,23	R\$ 6.458.613,62	67%
63	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R\$ 4.663.522,50	R\$ 100.000,00	2%
64	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R\$ 484.650,00	R\$ 484.650,00	100%
65	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 565.700,00	R\$ 565.700,00	100%
66	72	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Concluído	R\$ 1.899.749,20	R\$ 1.899.749,20	100%
67	73	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 613.862,88	R\$ 383.999,07	63%
<b>P 2111 - Ação 2000</b>										
<b>Total do Programa 2111</b>										
68	26	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional		Em Andamento	R\$ 23.556.000,00	R\$ 7.956.000,00	34%
<b>Total do Programa 2069</b>										
69	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fórum de Energia	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
70	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional	Ação interna	Ação interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
71	20	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
72	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
73	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
<b>Total das Ações Internas/ Não se aplicam</b>										
<b>TOTAL GERAL</b>										
								<b>9.481.502.275,16</b>	<b>6.140.764.388,34</b>	<b>64,8</b>

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2015

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2015
