

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DA SUDENE

1º Ciclo de Monitoramento
e Avaliação 2022



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

**Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da Sudene
1º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2022**

**RECIFE/PE
2022**

Sumário

1. Introdução.....	5
2. Monitoramento dos projetos	6
2.1 Resumo dos Resultados	6
2.2 Projetos concluídos no ciclo	11
2.3 Principais oportunidades e desafios	12
3. Monitoramento dos indicadores	14
3.1 Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional	14
3.2 Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação	14
3.3 Metas de Desempenho Institucional.....	15
4. Recomendações	15
5. Conclusão.....	16

Lista de Anexos

Anexo I - Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III - Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV - Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

Anexo V - Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Anexo VI - Acompanhamento da série histórica dos Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Anexo VII – Resultado parcial das metas de desempenho institucional

Lista de Figuras

Figura 1 - Projetos por Unidade Administrativa em 31/03/2022	6
Figura 2 - Projetos Prioritários em 31/03/2022	7
Figura 3 - Projetos por Objetivo Estratégico em 31/03/2022.....	8
Figura 4 - Projetos da Diretoria de Administração em 31/03/2022	9
Figura 5 - Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 31/03/2022	9
Figura 6 - Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 31/03/2022	10
Figura 7 - Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 31/03/2022.....	10
Figura 8 - Convênios concluídos no primeiro trimestre de 2022.....	11
Figura 9 - Projetos em Atraso e Paralisados em 31/03/2022	12

1. Introdução

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional para o primeiro trimestre de 2022, com ênfase nos eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e principalmente no intuito de antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte.

Até o último ciclo, o monitoramento se baseou nos Planos Operativos, acompanhados pelas Coordenações-Gerais das Diretorias de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) e Diretoria de Fundos e de Atração de Investimentos (DFIN) e pela Diretoria de Administração (DAD), e nos indicadores estabelecidos na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada na 121ª Reunião da Diretoria Colegiada, em 01 de novembro de 2012.

Com o novo Planejamento Estratégico Institucional, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, o monitoramento passa a abranger os projetos de todas as unidades da Sudene, bem como os indicadores aprovados no Planejamento Estratégico.

Uma das primeiras iniciativas após a aprovação do novo Planejamento Estratégico foi a implantação de um sistema de monitoramento de projetos, necessidade esta já levantada na 1ª Reunião Ordinária do CGRC, realizada em 25 de agosto de 2021. Foi viabilizado, então, em fevereiro de 2022, o Sistema de Informações Gerenciais da Sudene (SIGSudene), que utiliza a plataforma Monday para realizar o acompanhamento sistemático e contínuo dos projetos da Instituição.

Alguns dos principais ganhos obtidos com o SIGSudene, já percebidos neste ciclo de monitoramento, foram a tempestividade para geração da informação e a possibilidade de extração dos dados de forma automatizada o que ocasionou na drástica diminuição de tempo para elaboração do relatório, que passou da média de 119 dias (média referente aos últimos 7 relatórios publicados) para 11 dias.

Neste primeiro ciclo de 2022, foram monitorados 484 projetos, dos quais: 49 foram concluídos, 264 estão em andamento, 50 estão atrasados em sua execução, 10 estão paralisados, 102 encontram-se a iniciar e 9 foram cancelados. Além disso, foram monitorados os indicadores setoriais estabelecidos na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação e os indicadores estratégicos do novo Planejamento Estratégico da Sudene.

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no Anexo I e de forma analítica no Anexo II, os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o primeiro trimestre, e os resultados parciais das metas de desempenho institucional para o período de out/2021 a set/2022.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página [Site Sudene - Gestão Institucional](#), para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e acesso à informação.


2. Monitoramento dos projetos

2.1 Resumo dos Resultados

Com a implantação do SIGSudene, as unidades administrativas da Sudene foram incentivadas a cadastrar seus principais projetos. Sendo assim, nesse ciclo há um grande salto no número de projetos monitorados, saindo de 228 projetos registrados no 4º Ciclo de 2021 para um total de 484 projetos monitorados neste 1º ciclo de 2022, conforme Figura 1.

As principais unidades responsáveis por esse aumento, são a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF), com o cadastramento de 74 projetos, todos em andamento, e a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial (CPTCE), com 144 novos projetos, sendo 37 destes já concluídos e 95 a iniciar.


Figura 1 - Projetos por Unidade Administrativa em 31/03/2022

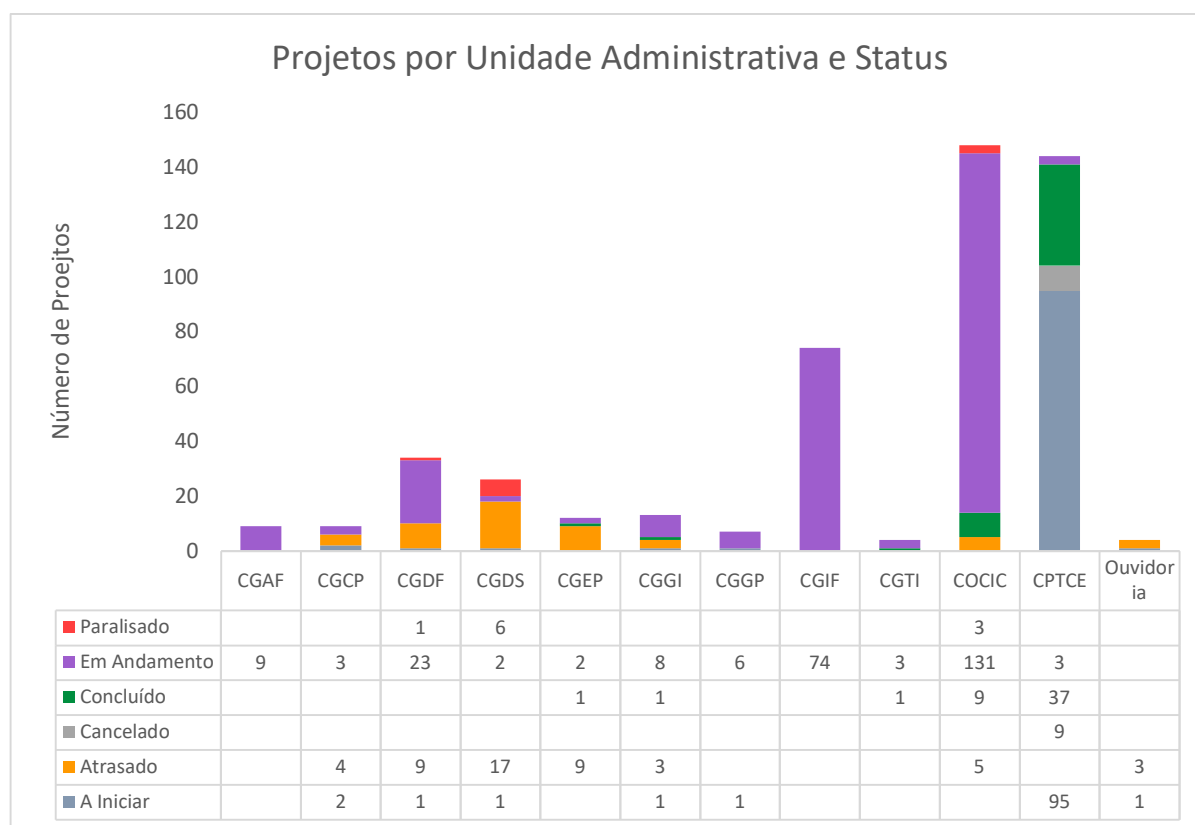

Fonte: SIGSudene

A partir de um recorte específico dos projetos prioritários definidos pela Ata da 304ª Reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 16 de maio de 2018, e Resolução DC/Sudene nº 281, de 13 de junho de 2017, posteriormente alterada pela Resolução DC/Sudene nº 601, de 25 de fevereiro de 2021, tem-se a representação dos projetos prioritários por Unidade e por status na Figura 2.

Figura 2 - Projetos Prioritários em 31/03/2022

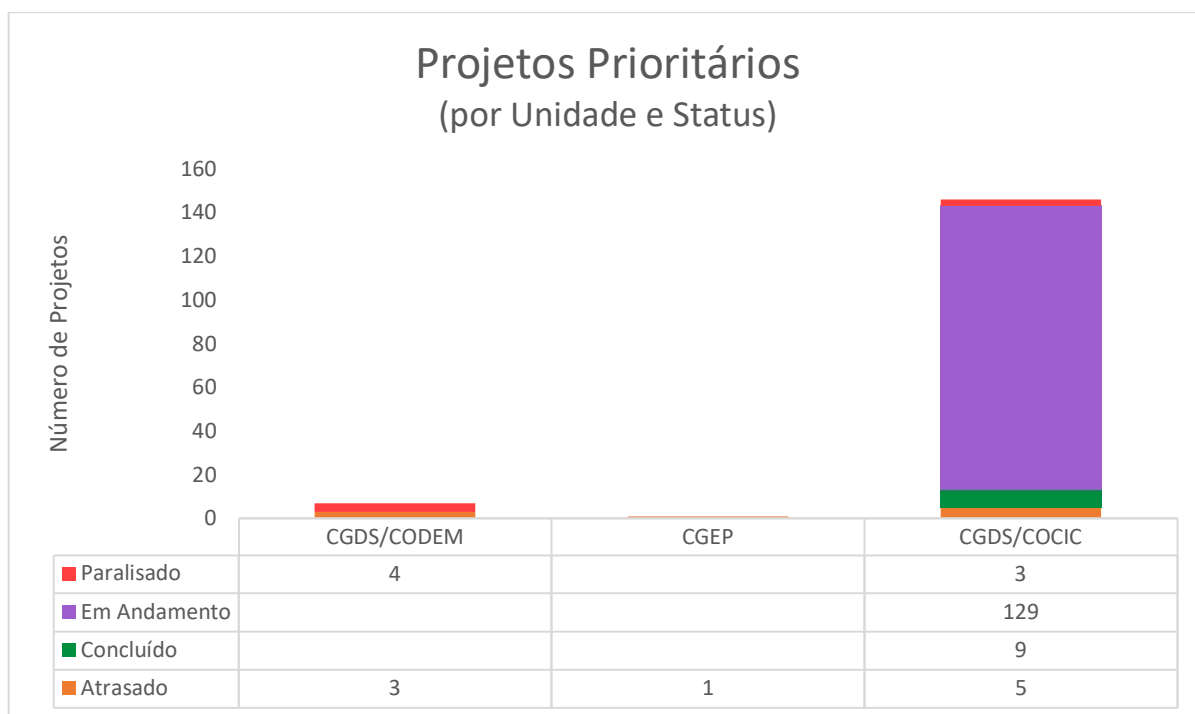


Fonte: SIGSudene

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. Dois dos 14 objetivos estratégicos encontram-se sem projetos vinculados, contudo, isso não significa que não são executadas atividades e adotadas medidas para a sua consecução: indica, provavelmente, que ainda não foram cadastrados os projetos correspondentes no SIGSudene. Portanto, é importante que as unidades e gestores responsáveis façam um esforço para identificar, cadastrar e atrelar no SIGSudene os projetos aos respectivos objetivos estratégicos, que são:

- a) Objetivo Estratégico 6, consolidar o Condell como órgão superior de articulação e decisões estratégicas, sob responsabilidade da CGGI; e
- b) Objetivo Estratégico 9, monitorar índices socioeconômicos da região, sob responsabilidade conjunta da Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF) e Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP).

Cabe destacar que aproximadamente 60% projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.


Figura 3 - Projetos por Objetivo Estratégico em 31/03/2022

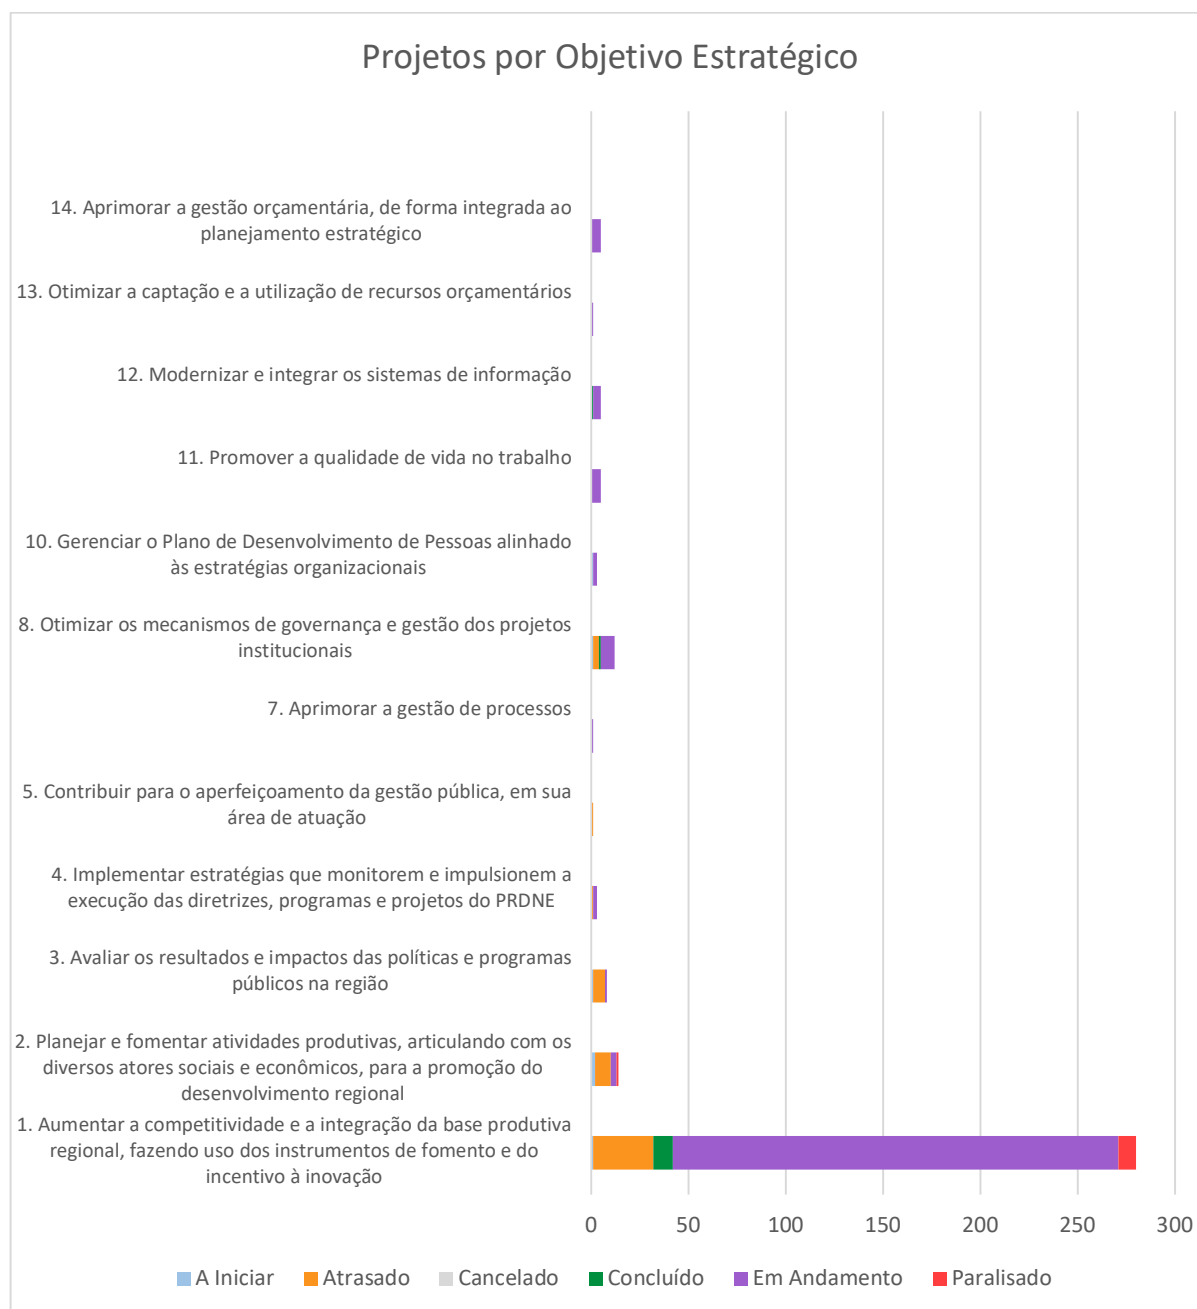

Fonte: SIGSudene


Como foi exposto acima, após a implantação do SIGSudene, todas as unidades administrativas da Sudene foram incentivadas a cadastrar seus principais projetos para monitoramento no Sistema, o que expandiu consideravelmente a quantidade de projetos a serem acompanhados por cada Diretoria, especialmente nas Diretorias de Administração (DAD) e de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN) e nas unidades vinculadas diretamente à Superintendência. As Figuras 4 a 7 apresentam a quantidade de projetos e seus status por Diretoria da Sudene.

Figura 4 - Projetos da Diretoria de Administração em 31/03/2022

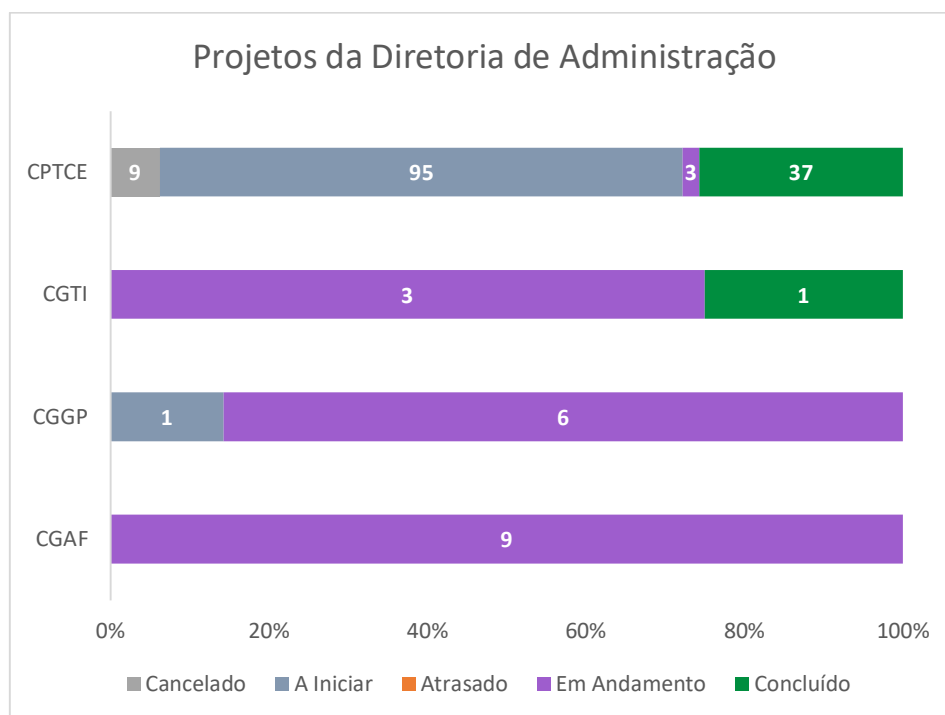


Fonte: SIGSudene

Figura 5 - Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 31/03/2022

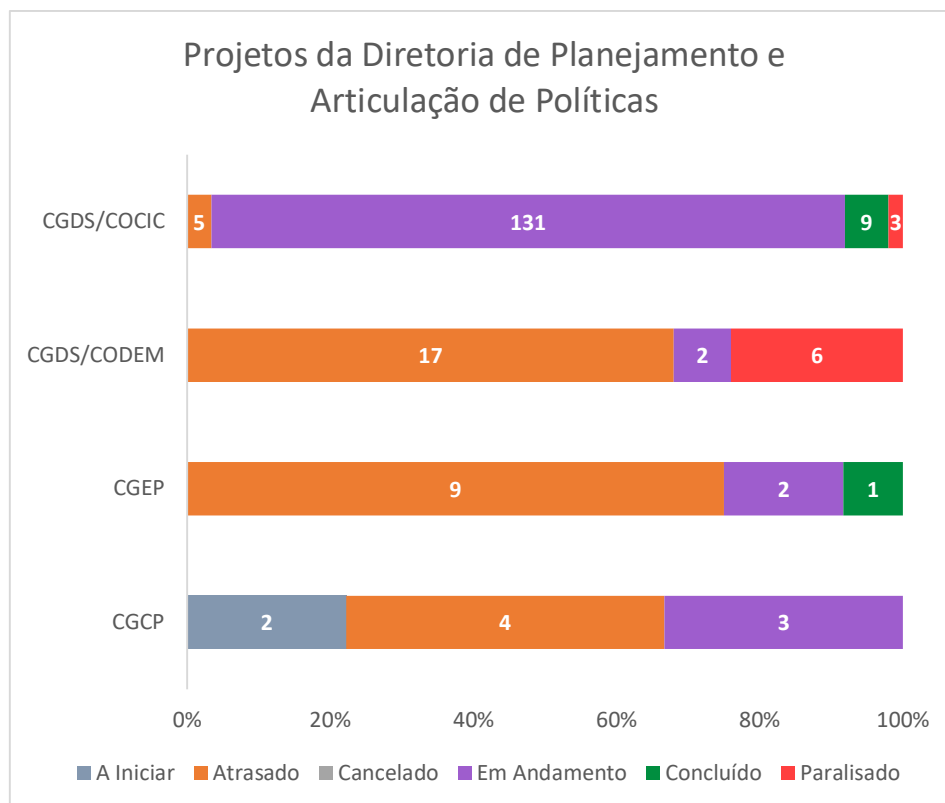


Fonte: SIGSudene

Figura 6 - Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 31/03/2022

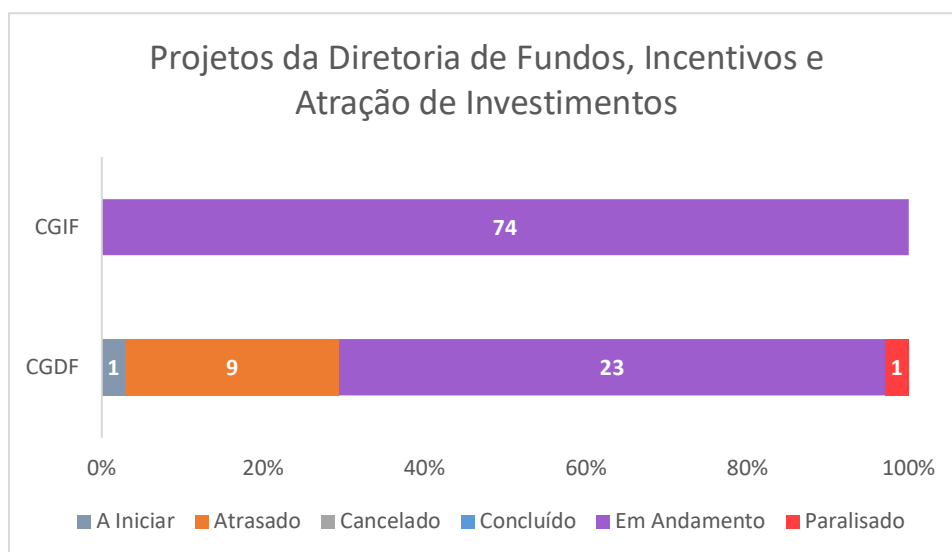

Fonte: SIGSudene

Figura 7 - Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 31/03/2022

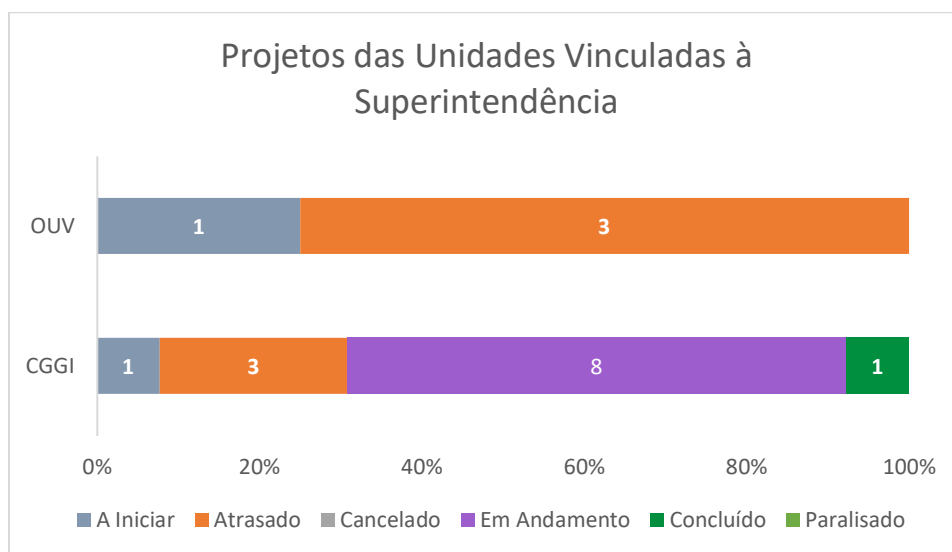


Fonte: SIGSudene

2.2 Projetos concluídos no ciclo

Entre os projetos concluídos neste ciclo, cita-se 9 convênios relativos a Emendas Parlamentares, com base na ação do Plano Plurianual (PPA) 7K66, com valor total de R\$ 4.640.590,00, sendo referentes a projetos executados nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, com objetos relativos à pavimentação de vias e aquisição de máquinas e equipamentos conforme Figura 8 abaixo.

Figura 8 - Convênios concluídos no primeiro trimestre de 2022

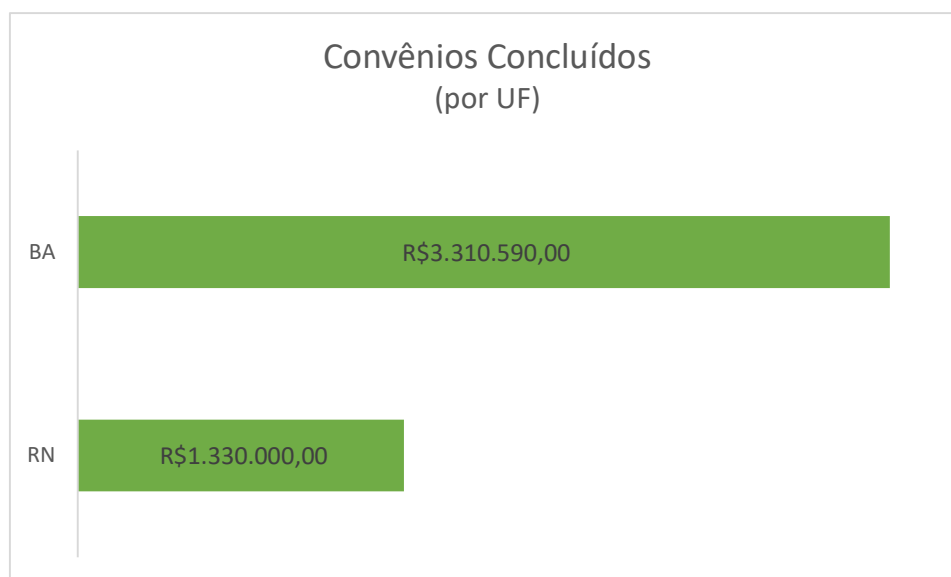

Fonte: SIGSudene

O Projeto CGEP2019005, referente ao Monitoramento do PRDNE, contratado junto ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), no âmbito do acordo de cooperação técnica (ACT) firmado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) BRA/17/019, tinha um total de 7 produtos a serem entregues à Sudene, dos quais 5 foram cancelados e apenas 2 aprovados, sendo 1 em caráter parcial. O projeto tinha como objetivo a implantação, na Sudene, de um núcleo capacitado na aplicação de inteligência no tratamento de dados e visualização de informação, que ao mesmo tempo subsidiasse uma governança do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), bem como acompanhamento da carteira de projetos.

Citando também unidades que não tinham projetos cadastrados anteriormente, mas cadastraram e concluíram neste ciclo, temos:

- **Projeto CGGI2022002**, referente à elaboração do Relatório de Gestão da Sudene do exercício de 2021, para o qual a CGGI, unidade responsável pela compilação de informações e elaboração em forma de relato integrado, fez o monitoramento das suas etapas através do SIGSudene. O Relatório de Gestão 2021 foi publicado em 31/03/2022 e está disponível no endereço [Relatório de Gestão Sudene - 2021](#).
- **Projeto CGTI2022001**, referente à contratação de solução de software para as atividades de design gráfico (criação publicitária e edição de imagens), e edição de


conteúdo multimídia (áudio e vídeo), que foi monitorado pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) e concluído em 14/03/2022.

Cabe destacar também que foram apontados 37 processos concluídos referentes à Tomada de Contas Especial.

2.3 Principais oportunidades e desafios

Neste ciclo de monitoramento, referente ao primeiro trimestre de 2022, observa-se uma elevação na quantidade de projetos em atraso e paralisados, estes passando de 5 para 10 e, aqueles, de 12 para 50. Tal elevação ocorreu, em parte, pela utilização do SIGSudene para acompanhar e monitorar os projetos, pois ele passou a abranger projetos que não faziam parte do portfólio monitorado pelos Planos Operativos e, também, passou a impossibilitar a repactuação unilateral de prazos por parte das unidades que executam e monitoram projetos. A Figura 9 representa os projetos em atraso e paralisados por unidade da Sudene.

Figura 9 - Projetos em Atraso e Paralisados em 31/03/2022

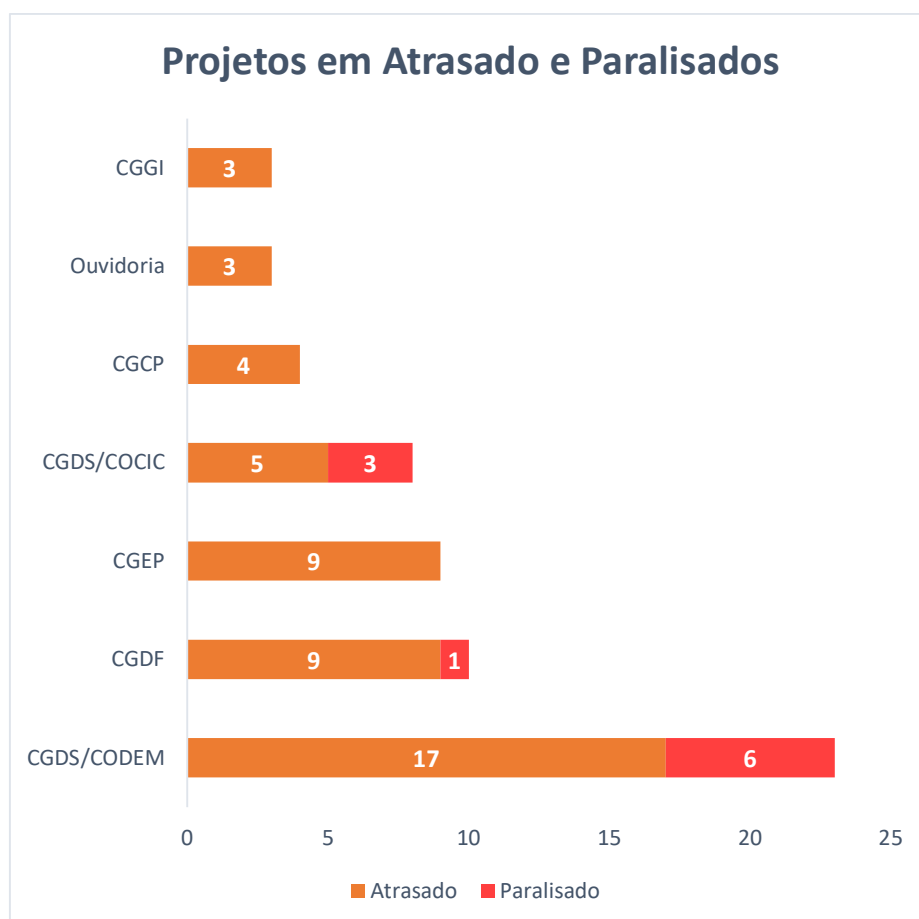

Fonte: SIGSudene

Em razão do elevado número de projetos com status em atraso e paralisados, tais projetos merecem um olhar mais profundo, e, neste ciclo de monitoramento, destinou-se um foco maior nos projetos

paralisados, para destacar a necessidade de que ações sejam tomadas com vistas a tirá-los desta situação, sendo eles:

- **Projeto CGDF 2008001** - Transnordestina Logística S/A - TLSA: projeto paralisado desde 2017, por orientação do Tribunal de Contas da União, que suspendeu, por meio do Acórdão nº 67/2017, as liberações de recursos para este empreendimento.
- **Projeto CGDS2014001** - Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano: projeto atualmente em andamento, porém com algumas ações paralisadas desde 2020 devido à situação de pandemia decorrente da Covid-19, mas essas situações serão expostas no Relatório Final de Prestação de Contas do Convênio.
- **Projeto CGDS2018002** - Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto): projeto paralisado desde 2018, não tendo logrado êxito na articulação com a Embrapa, restando apenas a FAO como possível parceiro para este projeto.
- **Projeto CGDS2018003** - Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (Rede Palma) no semiárido mineiro: projeto paralisado devido a atrasos nos procedimentos licitatórios realizados pelo convenente, estando ainda na fase de elaboração de Termo de Referência. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho foi cancelado automaticamente no SIAFI em 31/12/2021, resultando na rescisão do convênio e posterior cancelamento do projeto.
- **Projeto CGDS2018004** - Bioágua Familiar - Convênio nº 878341/2018: projeto encontra-se paralisado desde 2021, pois o convenente apresentou pendência no CAUC, o que impediu a liberação de recursos. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho foi cancelado automaticamente no SIAFI em 31/12/2021, resultando na rescisão do convênio e posterior cancelamento do projeto.
- **Projeto CGDS2020001** - Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN: projeto paralisado desde 2021, pois o convenente apresentou pendência no CAUC, o que impediu a liberação da primeira parcela de recursos.
- **Projeto CGDS2020008** - Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte: projeto paralisado devido a pendências no procedimento licitatório, etapa executada pelo convenente.

Além disso, 3 Emendas Parlamentares encontram-se paralisadas, tendo como objeto a pavimentação de ruas nos municípios de Simões Filho/BA (projeto COCIC2018012) e de Monte Santo/BA (projeto COCIC2018030) e a construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata/BA (projeto COCIC2018044).

Outra situação que merece registro, mesmo sem se encontrar em uma das duas situações críticas (em atraso ou paralisados), é a quantidade de projetos da CPTCE, comissão diretamente vinculada à DAD, em situação “a iniciar”, o que representa um grande desafio para os próximos ciclos. Em sua maioria, estes novos projetos referem-se a um passivo dos convênios do Programa Água para Todos que serão transferidos para a comissão.

3. Monitoramento dos indicadores

3.1 Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) foi aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, e, visando realizar o monitoramento do plano estratégico institucional de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do plano são apresentados de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Nos indicadores vinculados ao PEI, observamos um elevado número de índices que, já no primeiro trimestre de 2022, atingiram a meta estabelecida para o corrente ano, como: os indicadores relacionados aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) relativos ao objetivo estratégico nº 1, bem como nos indicadores de Percentual de Contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene (CONDEL) e de Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades, vinculados ao objetivo estratégico nº 2, que tinham como meta para o ano de 2022, respectivamente, atingir 75% de contratações, tendo alcançado 100%, e realizar 56 parcerias, o que foi alcançado já no primeiro trimestre com a realização de 60 parcerias.

De modo inverso, alguns índices estão bem aquém do que foi estipulado para atingimento em 2022, estando alguns indicadores nesse primeiro ciclo com resultado nulo, o que demandará uma maior esforço e atenção pelos setores da Autarquia e monitoramento pelo CGRC.

3.2 Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Apesar da aprovação do Planejamento Estratégico Institucional pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, os indicadores monitorados até o momento considerando a [Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação](#), aprovada na 121ª Reunião da Diretoria Colegiada, em 01 de novembro de 2012, continuam a ser monitorados. Os resultados desses indicadores e sua série histórica constam, respectivamente, nos Anexos V e VI deste Relatório.

Em relação ao mencionado rol de indicadores, observamos alguns pontos que merecem destaque. Nos indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), mais precisamente no de Inconsistências das consultas prévias apresentadas ao FDNE (CCPA), com uma elevação de 36% para 67% das consultas com inconsistências, observamos também que os indicadores tanto de produtividade (PAPC) quanto de tempo médio entre o protocolo e aprovação da consulta prévia pela Diretoria colegiada (TMCP) tiveram uma piora em relação ao 4º ciclo de 2021, voltando aos patamares dos outros ciclos de 2021. Tal fato se deve, ao nosso ver, pelo elevado número de pleitos no último trimestre de 2021, retornando no primeiro semestre 2022 aos patamares normais. Ainda nos indicadores do FDNE, vale ressaltar a diminuição nos seus índices de execução orçamentária e de execução financeira.

De modo semelhante aos indicadores do FDNE, nos indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros também se observou uma diminuição nos índices de produtividade em relação ao ciclo de monitoramento anterior, e de forma análoga visualizamos o mesmo motivo para tal

resultado, qual seja, o aumento exponencial de pleitos de incentivos fiscais no último trimestre de 2021, o que sobrecarregou as equipes dos setores responsáveis.

Nos indicadores de Gestão de Convênios, boa parte encontrou-se com índice zerado neste ciclo em função de não se ter nenhum convênio analisado no período. De forma análoga, os indicadores de Gestão de Pessoas apresentaram resultados bem próximos a zero, isso porque os indicadores iniciam zerados e são acumulados ao longo do exercício, não havendo continuidade de ações do exercício anterior. Já os indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional apresentaram resultados dentro do esperado, com queda em alguns deles em relação ao último trimestre de 2021, isto se deve especificamente à reunião do CONDEL, que movimentou bastante as notícias em torno da Sudene.

3.3 Metas de Desempenho Institucional

Além dos indicadores acima tratados, deve ser alvo de monitoramento constante as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as [Metas de Desempenho Institucional Previstas](#) pela [Portaria Sudene nº 138, de 22 de dezembro de 2021](#), para o 13º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 10º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2021 e se encerram em 30 de setembro de 2022.

O Anexo VII apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de outubro de 2021 a março de 2022.

O resultado geral neste ciclo 1º trimestre de 2022 teve uma discreta evolução em relação à pontuação atingida no último ciclo, passando de 30,4 para 32 pontos, dos 80 pontos possíveis de atingimento ao final de todo o período do ciclo avaliativo como mencionado acima. A maioria dos projetos se mantiveram com o mesmo andamento do ciclo anterior, o que reforça a necessidade de maior engajamento nestes projetos nos próximos dois ciclos, para que assim se consigam atingir as metas estabelecidas.

4. Recomendações

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e atingimento da estratégia da Sudene:

1. Considerando o grande número de projetos cadastrados no portfólio de projetos da Sudene – 484 projetos ao total – constatou-se a necessidade de realização de uma priorização dos projetos visando à criação do portfólio de projetos estratégicos, última etapa para finalização do Plano Estratégico Institucional. Para tanto, esta Coordenação-Geral sugere que sejam tomadas as seguintes medidas para a criação do portfólio de projetos estratégicos:
 - a) as unidades com projetos cadastrados no SIGSudene, a nível de Coordenação-Geral ou equivalente, deverão encaminhar, à CGGI, até 30 dias após a data da reunião que aprova este Relatório, a lista com a priorização dos seus projetos, e

- b) a CGGI, em até 15 dias após findo o prazo anterior, analisará, consolidará e emitirá parecer acerca das propostas recebidas e encaminhará a proposta consolidada para deliberação do CGRC.
- 2. Após aprovado o portfólio de projetos estratégicos em reunião do CGRC, deve-se providenciar a revogação das Resoluções DC/Sudene nº 281, de 13 de junho de 2017, e nº 601, de 25 de fevereiro de 2021, que tratam dos projetos prioritários, uma vez que o portfólio em questão virá a substituí-lo.
- 3. Criação de projetos estratégicos para os objetivos que ainda se encontram sem projetos cadastrados:
 - a) Objetivo Estratégico 6, consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas, sob responsabilidade da CGGI; e
 - b) Objetivo Estratégico 9, monitorar índices socioeconômicos da região, sob responsabilidade conjunta da CGDF e CGEP.

5. Conclusão

Visando à apresentação do monitoramento e da avaliação da sua estratégia organizacional para o primeiro trimestre de 2022, a Sudene enfatizou os eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e buscou antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte.

Cabe citar a mudança no paradigma de gestão de projetos na Sudene, com a implantação de um sistema de monitoramento de projetos, que entre outros benefícios, incorre num aumento da tempestividade no processamento das informações, facilitando e melhorando a tomada de decisões na Autarquia.

Neste primeiro ciclo de 2022, foram monitorados 484 projetos, dos quais: 49 foram concluídos, 264 estão em andamento, 50 estão atrasados em sua execução, 10 estão paralisados, 101 a iniciar e 9 foram cancelados.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores setoriais estabelecidos na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação já anteriormente monitorados, e os indicadores estratégicos do novo Planejamento Estratégico da Sudene.

Foram também apresentadas informações específicas sobre projetos concluídos no ciclo em questão, sendo destacadas nove convênios relativos a emendas parlamentares e três projetos desenvolvidos na Sudene. Dois destes que não eram alvo de acompanhamento nos ciclos prévios.

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no Anexo I e de forma analítica no Anexo II; os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o primeiro trimestre; e os resultados parciais das metas de desempenho institucional para o período de out/2021 a set/2022.

Além disso, foram realizadas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

Anexo I - Projetos Tabulados (posição de 31.03.2022)

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - Quantitativo - Receita	CGAF2022001	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)	CGAF2022002	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Alterações Orçamentárias	CGAF2022003	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)	CGAF2022004	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)	CGAF2022005	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Restos a Pagar (RP)	CGAF2022006	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Digitalização do Acervo da Sudene	CGAF2022007	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação		2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Reforma Predial para adequação do novo leiaute da Sudene	CGAF2022008	Em Andamento	Não				2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Plano de Contratação Anual 2023	CGAF2022009	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais		2000 - Administração de Unidade	DAD	CGAF	R\$-	R\$-
Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras	CGCP2020002	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	R\$-	R\$-
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	R\$1.998.021,94	R\$1.998.021,94
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	CGCP2021002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$725.810,00	R\$725.810,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	CGCP2021003	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$483.189,57	R\$-
Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	CGCP2021004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$750.000,00	R\$-
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba	CGCP2021005	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$893.809,13	R\$446.904,57
Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).	CGCP2022001	A Iniciar	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	R\$-	R\$-
Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	CGCP2022002	A Iniciar	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	R\$-	R\$-
Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	CGCP2220003	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	R\$309.985,00	R\$-
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	Paralisado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$3.876.491.700,00	R\$3.065.105.668,00
Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	CGDF2008002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$61.728.156,00	R\$61.728.156,00
Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$59.700.000,00	R\$59.700.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$54.900.000,00	R\$54.900.000,00
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$50.000.000,00	R\$50.000.000,00
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	CGDF2014001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$415.582.562,52	R\$413.011.416,34
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$228.672.439,20	R\$228.672.439,20
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$113.680.904,39	R\$41.435.881,68

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$102.312.813,95	R\$32.968.329,74
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$107.686.880,50	R\$103.459.637,40
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$94.964.244,39	R\$90.858.400,56
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020007	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$58.577.007,99	R\$55.786.889,22
Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	CGDF2021001	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Ação Interna	n/a	DFIN	CGDF	R\$-	R\$-
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$183.361.938,16	R\$88.049.841,59
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$183.361.938,16	R\$144.820.026,76
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$60.000.000,00	R\$-
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$140.841.810,36	R\$-
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$140.841.810,36	R\$-
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$274.179.982,11	R\$-
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$77.808.580,65	R\$-
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$77.808.580,65	R\$-
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$77.808.580,65	R\$-
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$111.715.126,17	R\$-
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$348.968.580,64	R\$-
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$136.700.004,97	R\$-
Assuruá 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$127.304.765,68	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Assuruá S III Energia S.A.	CGDF2021015	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$134.805.486,72	R\$-
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	R\$191.780.000,00	R\$-
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	A Iniciar	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$-	
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$-	
Taxa efetiva de juros dos Fundos de Desenvolvimento (TFD)	CGDF2022004	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação		0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$-	
Contrapartidas sociais ao beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)	CGDF2022005	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$-	
Programação FNE para o exercício de 2022	CGDF2022006	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	R\$-	
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	R\$27.935.000,00	R\$-
Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	R\$530.482,50	R\$530.482,50
Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leiteira no Semiárido Paraibano	CGDS2014001	Paralisado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	DPLAN	CGDS	R\$343.585,70	R\$343.585,70
Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	CGDS2018002	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$-	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	CGDS2018003	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$255.000,00	R\$-
BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	CGDS2018004	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	R\$547.369,48	R\$-
FORTEALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	CGDS2018005	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	R\$339.517,00	R\$339.517,00
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2019001	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$206.730,00	R\$-
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$199.412,43	R\$-
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2020002	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$255.000,00	R\$-
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	R\$425.000,00	R\$319.360,49
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	R\$340.000,00	R\$241.376,80
Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	CGDS2020007	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$649.777,57	R\$-
Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	CGDS2020008	Paralisado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$550.000,00	R\$550.000,00
Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$476.011,69	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	R\$969.572,00	R\$969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste através da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020011	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$1.264.680,00	R\$-
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$426.466,90	R\$426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$465.839,00	R\$465.839,00
Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.	CGDS2022001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGDS	R\$-	R\$-
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pesca Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$831.600,00	R\$831.600,00
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA – GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$230.000,00	R\$230.000,00
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 2145 – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$860.000,00	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE (TED N°10/2021)	CGDS2022005	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	R\$210.000,00	R\$210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	R\$191.000,00	R\$-
Disseminação+B1:B31o e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH.IA) - Convênio nº 907639/2020	CGDS2022007	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	PPA 2020-2023	2145	DPLAN	CGDS	R\$615.600,00	R\$-
Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	CGEP2018001	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGEP	R\$199.399,80	R\$-
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação Interna	n/a	DPLAN	CGEP	R\$-	R\$-
Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3	CGEP2019005	Concluído	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$1.481.361,00	R\$322.538,67
IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	CGEP2020002	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação Interna	n/a	DPLAN	CGEP	R\$-	R\$-
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	R\$479.849,09	R\$350.707,09

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	R\$298.932,28	R\$218.511,98
Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	CGEP2020009	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$384.000,00	R\$384.000,00
Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	CGEP2020010	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$480.600,00	R\$480.600,00
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGEP	R\$-	R\$-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$-	R\$-
Elaboração de estudo de competitividade dos principais polos dos setores de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	Atrasado	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$-	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	R\$399.945,00	R\$199.972,50
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos	CGGI2022001	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$25.773,00	R\$-
Elaboração do Relatório de Gestão 2021	CGGI2022002	Concluído	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Revisão e Consolidação dos Atos Inferiores a Decreto	CGGI2022003	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
PDA/Sudene 2020-2022	CGGI2022004	Atrasado	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
PDA/Sudene 2022-2024	CGGI2022005	Atrasado	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Revisão do Planejamento Estratégico da Sudene	CGGI2022006	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	Em Andamento	Não	Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2022008	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Implantação do Programa de Gestão na Sudene	CGGI2022009	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Elaboração da Política de Gestão de Riscos da Sudene	CGGI2022010	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Implantação do MEG-Tr	CGGI2022011	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Implantação do TransformaGov	CGGI2022012	Atrasado	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Elaboração do Proposta Orçamentária - fase qualitativa	CGGI2022013	A Iniciar	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	R\$-	R\$-
Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	CGGP2018001	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$25.000,00	R\$9.414,51
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	A Iniciar	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$75.000,00	R\$-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022	CGGP2022001	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$200.000,00	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Psicoterapia Ativa	CGGP2022002	Em Andamento	Não	Aprendizado e Conhecimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$21.600,00	R\$-
Contratação de Maestro	CGGP2022003	Em Andamento	Não	Aprendizado e Conhecimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$14.500,00	R\$-
Contratação de Médico Generalista	CGGP2022004	Em Andamento	Não	Aprendizado e Conhecimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	45.00,00	R\$-
Balcão de Talentos	CGGP2022005	Em Andamento	Não	Aprendizado e Conhecimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	R\$-	R\$-
Aprimorar os produtos de design gráfico e conteúdo multimídia da Sudene	CGTI2022001	Concluído	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	R\$10.000,00	R\$10.000,00
SigMapas	CGTI2022002	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	R\$49.073,84	R\$49.073,84
Agenda Compartilhada	CGTI2022003	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	R\$5.000,00	R\$-
Aprimorar a realização de reuniões por videoconferência	CGTI2022004	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	R\$50.000,00	R\$-
Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	COCIC2016001	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COCIC2016002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	COCIC2016003	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COCIC2016004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$813.633,43
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COCIC2016005	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.172.497,00	R\$926.955,29
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COCIC2016006	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$600.000,00	R\$559.952,79
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COCIC2016008	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	COCIC2017001	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$400.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	COCIC2017002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$500.000,00
Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	COCIC2017003	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	COCIC2017004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$385.000,00	R\$384.999,99
Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	COCIC2017005	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	COCIC2017008	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00
Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	COCIC2017009	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$1.989.238,23	R\$1.989.238,23
Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	COCIC2017010	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	COCIC2017012	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COCIC2017013	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$700.855,00	R\$490.598,50
Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	COCIC2017014	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COCIC2017018	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COCIC2017019	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00
Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	COCIC2017020	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$264.608,17	R\$52.921,63
Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	COCIC2017021	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$390.020,00	R\$390.020,00
Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	COCIC2017022	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$350.000,00	R\$350.000,00
Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	COCIC2017024	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.493,20	R\$210.000,00
CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	COCIC2017025	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$700.000,00
Pavimentação - Município de Urucuca	COCIC2018001	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDO E GUIAS DE SARIETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	COCIC2018002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$200.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	COCIC2018003	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$586.135,00	R\$586.135,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COCIC2018004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$175.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COCIC2018005	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	COCIC2018006	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00
Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	COCIC2018007	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COCIC2018008	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COCIC2018009	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.755.787,09	R\$1.298.524,73
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	COCIC2018010	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$-
RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COCIC2018011	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$400.000,00	R\$400.000,00
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	COCIC2018012	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$-
Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	COCIC2018013	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COCIC2018014	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$700.000,00	R\$490.000,00
Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	COCIC2018015	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$995.818,64
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	COCIC2018016	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	COCIC2018017	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$100.000,00	R\$100.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COCIC2018018	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$46.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	COCIC2018019	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COCIC2018020	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COCIC2018021	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COCIC2018022	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Aquisição de Retroscavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COCIC2018023	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$802.936,73	R\$-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	COCIC2018024	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COCIC2018025	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$150.000,00
Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	COCIC2018026	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$175.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COCIC2018027	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$350.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COCIC2018028	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$115.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COCIC2018029	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	COCIC2018030	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracaju em Maxaranguape/RN.	COCIC2018031	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$183.485,84
Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	COCIC2018032	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$3.000.000,00	R\$3.000.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	COCIC2018033	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$380.000,00	R\$380.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COCIC2018034	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$600.000,00	R\$600.000,00
Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	COCIC2018035	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$260.000,00	R\$159.708,52
Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	COCIC2018036	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COCIC2018037	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	COCIC2018038	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$100.000,00	R\$-
Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	COCIC2018039	Atrasado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	2145 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	COCIC2018040	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$350.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	COCIC2018041	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$350.000,00
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	COCIC2018042	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.438.556,24	R\$1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COCIC2018043	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$350.000,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	COCIC2018044	Paralisado	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.050.000,00	R\$-
Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	COCIC2018045	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COCIC2018046	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	COCIC2018047	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	COCIC2018048	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$500.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	COCIC2018049	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$150.000,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	COCIC2018050	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Teixeira de Freitas	COCIC2018051	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$150.000,00
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COCIC2018052	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	COCIC	R\$800.000,00	R\$-
Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroco – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	COCIC2018053	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00
Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	COCIC2018054	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$3.000.000,00	R\$2.810.590,05

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	COCIC2018055	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$400.000,00
Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	COCIC2018056	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$350.000,00	R\$70.000,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	COCIC2018057	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	COCIC2018058	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COCIC2019001	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$162.500,00
Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	COCIC2019002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$-
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COCIC2019003	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COCIC2019004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	COCIC2019005	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COCIC2019006	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$850.000,00	R\$-
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	COCIC2019007	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$320.000,00	R\$320.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	COCIC2019008	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$291.831,01	R\$180.000,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Parati no município de Assú/RN	COCIC2019009	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$900.000,00	R\$900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COCIC2019010	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$-
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	COCIC2019011	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.700.000,00	R\$340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COCIC2019012	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COCIC2019013	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$-
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COCIC2019014	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	COCIC2019015	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$260.000,00	R\$220.086,98
Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	COCIC2019016	Concluído	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$100.000,00	R\$100.000,00
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	COCIC2019017	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$700.000,00	R\$280.000,00
Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	COCIC2019018	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$60.000,00
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	COCIC2019019	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COCIC2019020	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$2.410.387,00	R\$2.086.232,20
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COCIC2019021	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$2.000.000,00	R\$1.447.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELÉPIDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COCIC2019022	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$50.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COCIC2019023	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.700.000,00	R\$340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COCIC2019024	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	COCIC2019025	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$779.525,47	R\$779.525,47
Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	COCIC2019026	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	COCIC2019027	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	COCIC2019028	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COCIC2019029	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COCIC2019030	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$700.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COCIC2019031	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$60.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	COCIC2019032	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$600.000,00	R\$240.000,00

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COCIC2019033	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$700.000,00	R\$-
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COCIC2019034	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COCIC2019035	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ) na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COCIC2019036	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$350.000,00	R\$70.000,00
Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	COCIC2019037	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$800.000,00	R\$-
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	COCIC2020001	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COCIC2020002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COCIC2020003	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COCIC2020004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$450.227,00	R\$-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	COCIC2020005	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$-
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Gualbim no Município de Valença - BA.	COCIC2020006	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$-
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	COCIC2020007	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COCIC2020008	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	COCIC2020009	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$150.000,00	R\$-
Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraiba e Soledade no Município de Caicó/RN.	COCIC2020010	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$250.000,00	R\$-
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	COCIC2020011	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$300.000,00	R\$60.000,00
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COCIC2020012	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$-
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COCIC2021001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$-	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COCIC2021001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$-	R\$-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	COCIC2021002	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COCIC2021003	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA-CE.	COCIC2021004	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	COCIC2021005	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
AQUISIÇÃO DE RETROSCAVIDEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SERRITA/PE.	COCIC2021006	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$307.230,00	R\$-
aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	COCIC2021007	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$389.158,00	R\$-
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COCIC2021008	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$500.000,00	R\$-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COCIC2021009	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$184.338,00	R\$-
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COCIC2021010	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$2.984.100,00	R\$-
Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	COCIC2021011	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$398.158,00	R\$-
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COCIC2021012	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COCIC2021013	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$368.676,00	R\$-
Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	COCIC2021014	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$398.158,00	R\$-
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	Em Andamento	Sim	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	R\$1.000.000,00	R\$-
Relatório da Ouvidoria do FNE Exercício 2021	OUV2022001	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	R\$-	R\$-
Relatório de Ouvidoria da Sudene Exercício 2021	OUV2022002	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	R\$-	R\$-

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
Relatório de Pesquisa de Satisfação Externa 2021	OUV2022003	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	R\$-	R\$-
Pesquisa de Satisf- 2022	OUV2022004	A Iniciar	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	R\$-	R\$-
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	CGIF2022001	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$6.250.000,00	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA.	CGIF2022002	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$194.349,00	
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2022003	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$49.358.242,00	
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	CGIF2022004	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$106.964.068,76	
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022005	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$41.955.529,12	
SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A	CGIF2022006	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$27.000.000,00	
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	CGIF2022007	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$2.328.314,37	
PERNAMBUCO QUIMICA S A	CGIF2022008	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$4.000.000,00	
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022009	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$4.169.646,61	
LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	CGIF2022010	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$84.726,00	
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	CGIF2022011	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$3.299.665,67	
MEGA FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CGIF2022012	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$1.437.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA	CGIF2022013	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$2.319.019,00	
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	CGIF2022014	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$6.277.232,00	
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A	CGIF2022015	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$32.936.452,58	
MOINHO NORDESTE DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	CGIF2022016	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$3.000.000,00	

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022017	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$200.000,00	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022018	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$15.886.301,76	
NUTRANE NUTRICA0 ANIMAL LTDA	CGIF2022019	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$350.000,00	
SP ACOS BRASIL LTDA	CGIF2022020	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$810.411,10	
GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A	CGIF2022021	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$8.197.053,90	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CGIF2022022	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$154.433,07	
SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA EM ERP LTDA.	CGIF2022023	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$225.219,28	
JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	CGIF2022024	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$978.196.950,14	
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOS GOLFINHO LTDA	CGIF2022025	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$4.385.447,37	
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.	CGIF2022026	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$33.422.750,59	
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A	CGIF2022027	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$6.785.675,62	
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022028	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$428.671,93	
OASIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022029	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$15.242.656,14	
ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	CGIF2022030	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$442.979,84	
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	CGIF2022031	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$4.189.913,00	
ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA.	CGIF2022032	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$3.000.000,00	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022033	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$1.500.000,00	
KNAUF DO BRASIL LTDA	CGIF2022034	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$75.052.619,12	

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
ECOFOR AMBIENTAL S/A	CGIF2022035	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$22.129.496,33	
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022036	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
REFINARIA DE MATARIFE S.A.	CGIF2022037	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	CGIF2022038	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022039	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$128.168,96	
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022040	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$458.748,77	
PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA	CGIF2022041	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAC...	CGIF2022042	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$20.000.000,00	
CMP DE FARIAS LTDA	CGIF2022043	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$272.558,83	
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022044	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
TECON SALVADOR S/A	CGIF2022045	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$947.226.992,39	
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	CGIF2022046	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$21.264.823,20	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022047	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$15.886.301,76	
RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CGIF2022048	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$690.000,00	
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022049	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022050	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022051	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$208.651.895,79	
ARA TEXTIL LTDA	CGIF2022052	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$347.200,00	

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
CLARO S.A.	CGIF2022053	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$96.489.757,99	
ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	CGIF2022054	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$1.485.287,31	
JRS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	CGIF2022055	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$3.257.003,78	
LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	CGIF2022056	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$9.616.435,89	
MESSER GASES LTDA.	CGIF2022057	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$5.634.850,44	
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022058	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$428.671,93	
ALTENBURG NORDESTE LTDA	CGIF2022059	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA	CGIF2022060	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$10.745.010,76	
CLARO S.A.	CGIF2022061	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$18.758.104,08	
CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ...	CGIF2022062	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$5.184.568,00	
EVC INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022063	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$1.593.251,43	
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022064	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$-	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022065	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$38.364.830,00	
LATICINIOS VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	CGIF2022066	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$3.000.000,00	
LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A.	CGIF2022067	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$297.024.503,75	
MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA.	CGIF2022068	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$429.791.999,96	
PONTES & LANDIM HOTELARIA E ALUGUEIS LTDA	CGIF2022069	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$7.229.503,96	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	CGIF2022070	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$932.481,00	

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	CGIF2022071	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$219.294.920,41	
IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA	CGIF2022072	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$6.950.000,00	
FRIGORIFICO LESTE LTDA	CGIF2022073	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$18.748.800,96	
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CGIF2022074	Em Andamento	Não	Resultados para a sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	R\$1.481.040,74	
TCE Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85)	CPTCE2022001	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17)	CPTCE2022002	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. DPS n.º 038/97, SIAFI nº 338592, Morro Cabeça no Tempo-PI (Processo Convênio nº 03057.000045/97-87)	CPTCE2022003	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 406373, IPSA/PE (Processo n.º 59313.000114/00-87) - Relatório de TCE nº 004/2021	CPTCE2022004	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 368482, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03057.000016/1998-60)	CPTCE2022005	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 384007, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03045.000085/1999-48)	CPTCE2022006	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 407080, Escada-PE (Processo n.º 59313.000103/2000-05)	CPTCE2022007	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 328386, Flexeiras-AL (Processo n.º 03057.000004/1997-08)	CPTCE2022008	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 348984, Governo do Estado de Alagoas (proc. Nº 03055.000025/98-34)	CPTCE2022009	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 406593 (Processo n.º 59313.000095/2000-99) - AEDA - Autarquia Educacional do Araripe	CPTCE2022010	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI n.º 580885 (Processo n.º 59333.000146/2006-30) - Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	CPTCE2022011	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 406129 (Processo n.º 59313.000006/2000-12), Centro Nordeste de Medicina Popular-CNMP	CPTCE2022012	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 371426 (Processo n.º 03057.00002/1999-36), Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022013	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 406420 (Processo n.º 59313.000067/2000-71), Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022014	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 407096 (Processo n.º 59313.000098/2000-22), Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022015	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 406134 (Processo n.º 59313.000065/2000-82), Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE – IDSTP	CPTCE2022016	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 338794 (Processo n.º 03055.000056/1997-87), Governo do Estado do Piauí	CPTCE2022017	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv. SIAFI nº 737121 (Processo n.º 59335.000172/2010-24), GRUPO GESTÃO - PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL	CPTCE2022018	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	Em Andamento	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 317590 (Processo nº 03057.000017/1996-61) - Gov. AL	CPTCE2022020	Em Andamento	Não					DAD	CPTCE		

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TCE Conv SIAFI nº 384829 (Processo nº 03045.000101/199-01) - Pref. Campina Grande/PB	CPTCE2022021	Em Andamento	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 407063 (Processo nº 59313.000131/2000-14) - Prefeitura Municipal de Buenos Aires /PE	CPTCE2022022	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 383780 (Processo nº 03045.000049/1999-84) - Pref. Tianguá/CE) - Prefeitura Municipal de Buenos Aires /PE	CPTCE2022023	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 368683 (Processo nº 03055.000093/1998-96) - Gov. AL	CPTCE2022024	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 368442 (Processo nº 03055.000082/1998-78) - Pref. Croatá/CE	CPTCE2022025	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 348990 (Processo nº 03055.000024/1998-71) - Gov. AL	CPTCE2022026	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 384179 (Processo nº 03045.000098/1999-90) - Gov. PI	CPTCE2022027	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 407141 (Processo nº 59313.000085/00-53) - CEFET - RN	CPTCE2022028	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 337714 (Processo nº 03057.000033/97-06) - CEFET/MA	CPTCE2022029	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 406422 (Processo nº 59313.000071/2000-30) - FOCCA - Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior	CPTCE2022030	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 338364 (Processo nº 03054.000042/97-64) - Gov AL	CPTCE2022031	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 317573 (Processo nº 03057.000018/96-23) - Gov SE	CPTCE2022032	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE Conv SIAFI nº 406121 (Processo nº 59313.000076/00-62) - Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 022/2013, SIAFI nº 677774 (Processo nº 59335.000458/2013-52) - Jacaraú - PB	CPTCE2022034	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 084/2013, SIAFI nº 677858 (Processo nº 59335.000388/2013-32) - Salgadinho - PE	CPTCE2022035	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 041/2013, SIAFI nº 677759 (Processo nº 59335.000424/2013-68) - Pípirituba - PB	CPTCE2022036	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 138/2013, SIAFI nº 677780 (Processo nº 59335.000416/2013-11) - São João da Varjota - PI	CPTCE2022037	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 017/2013, SIAFI nº 677765 (Processo nº 59335.000459/2013-05) - Imaculada - PB	CPTCE2022038	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 004/2013, SIAFI nº 677790 (Processo nº 59335.000382/2013-65) - Araçagi - PB	CPTCE2022039	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 027/2013, SIAFI nº 677744 (Processo nº 59335.000442/2013-40) - Marcação - PB	CPTCE2022040	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 117/2013, SIAFI nº 677775 (Processo nº 59335.000470/2013-67) - Itainópolis - PI	CPTCE2022041	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 021/2013, SIAFI nº 677807 (Processo nº 59335.000457/2013-16) - Itatuba - PB	CPTCE2022042	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 053/2013, SIAFI nº 677767 (Processo nº 59335.000398/2013-78) - Calçado - PE	CPTCE2022043	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 040/2013, SIAFI nº 677815 (Processo nº 59335.000423/2013-13) - Pilõesinhos - PB	CPTCE2022044	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 144/2013, SIAFI nº 677840 (Processo nº 59335.000393/2013-45) - Tanque do Piauí - PI	CPTCE2022045	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 153/2013, SIAFI nº 677763 (Processo nº 59335.000601/2013-14) - Nazarezinho - PB	CPTCE2022046	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 060/2013, SIAFI nº 677755 (Processo nº 59335.000396/2013-89) - Vertente do Lério - PE	CPTCE2022047	Concluído	Não					DAD	CPTCE		

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TCE TComp nº 057/2013, SIAFI nº 677779 (Processo nº 59335.000400/2013-17) - Jucati - PE	CPTCE2022048	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 047/2013, SIAFI nº 677786 (Processo nº 59335.000407/2013-21) - São José de Caiana - PB	CPTCE2022049	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 151/2013, SIAFI nº 677813 (Processo nº 59335.000563/2013-91) - Solânea - PB	CPTCE2022050	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 110/2013, SIAFI nº 677793 (Processo nº 59335.000476/2013-34) - Dom Expedito Lopes - PI	CPTCE2022051	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 016/2013, SIAFI nº 677742 (Processo nº 59335.000460/2013-21) - Guarabira - PB	CPTCE2022052	Concluído	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 002/2013, SIAFI nº 677747 (Processo nº 59335.000380/2013-76) - Alagoinha - PB	CPTCE2022053	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 001/2013, SIAFI nº 677859 (Processo nº 59335.000384/2013-54) - Alagoa Nova - PB	CPTCE2022054	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 034/2013, SIAFI nº 677828 (Processo nº 59335.000428/2013-46) - Olivados - PB	CPTCE2022055	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 033/2013, SIAFI nº 677838 (Processo nº 59335.000438/2013-81) - Nova Palmeira - PB	CPTCE2022056	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 025/2013, SIAFI nº 677844 (Processo nº 59335.000439/2013-26) - Juripiranga - PB	CPTCE2022057	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 018/2013, SIAFI nº 677764 (Processo nº 59335.000452/2013-85) - Itabaiana - PB	CPTCE2022058	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 008/2013, SIAFI nº 677772 (Processo nº 59335.000474/2013-45) - Boa Vista - PB	CPTCE2022059	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 007/2013, SIAFI nº 677738 (Processo nº 59335.000480/2013-01) - Assunção - PB	CPTCE2022060	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 104/2013, SIAFI nº 677797 (Processo nº 59335.000486/2013-70) - Bocaína - PI	CPTCE2022061	Cancelado	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 005/2013, SIAFI nº 677788 (Processo nº 59335.000379/2013-41) - Areia - PB	CPTCE2022062	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 003/2013, SIAFI nº 677832 (Processo nº 59335.000381/2013-11) - Alcantil - PB	CPTCE2022063	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 139/2013, SIAFI nº 677574 (Processo nº 59335.000385/2013-07) - São José do Peixe - PI	CPTCE2022064	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 037/2013, SIAFI nº 677563 (Processo nº 59335.000386/2013-43) - Picuí - PB	CPTCE2022065	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 099/2013, SIAFI nº 677801 (Processo nº 59335.000387/2013-98) - Alagoinha do Piauí - PI	CPTCE2022066	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 148/2013, SIAFI nº 677746 (Processo nº 59335.000389/2013-87) - Vila Nova do Piauí - PI	CPTCE2022067	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 147/2013, SIAFI nº 677823 (Processo nº 59335.000390/2013-10) - Vera Mendes - PI	CPTCE2022068	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 146/2013, SIAFI nº 677860 (Processo nº 59335.000391/2013-56) - Várzea Grande - PI	CPTCE2022069	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 145/2013, SIAFI nº 677839 (Processo nº 59335.000392/2013-09) - Valença do Piauí - PI	CPTCE2022070	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 143/2013, SIAFI nº 677736 (Processo nº 59335.000394/2013-90) - Simpício Mendes - PI	CPTCE2022071	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 142/2013, SIAFI nº 677818 (Processo nº 59335.000395/2013-34) - Simões - PI	CPTCE2022072	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TCE TComp nº 059/2013, SIAFI nº 677768 (Processo nº 59335.000397/2013-23) - Santa Maria do Cambucá - PE	CPTCE2022073	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 058/2013, SIAFI nº 677855 (Processo nº 59335.000399/2013-12) - Orobó - PE	CPTCE2022074	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 052/2013, SIAFI nº 677796 (Processo nº 59335.000401/2013-53) - Brejão - PE	CPTCE2022075	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 054/2013, SIAFI nº 677877 (Processo nº 59335.000402/2013-06) - Capoeiras - PE	CPTCE2022076	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 055/2013, SIAFI nº 677760 (Processo nº 59335.000403/2013-42) - Casinhas - PE	CPTCE2022077	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 056/2013, SIAFI nº 677773 (Processo nº 59335.000404/2013-97) - Frei Miguelinho - PE	CPTCE2022078	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 045/2013, SIAFI nº 677783 (Processo nº 59335.000405/2013-31) - Santa Terezinha - PB	CPTCE2022079	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 048/2013, SIAFI nº 677791 (Processo nº 59335.000408/2013-75) - São José do Sabugi - PB	CPTCE2022080	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 049/2013, SIAFI nº 677822 (Processo nº 59335.000409/2013-10) - São José dos Ramos - PB	CPTCE2022081	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 050/2013, SIAFI nº 677824 (Processo nº 59335.000410/2013-44) - Sapé - PB	CPTCE2022082	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 051/2013, SIAFI nº 677843 (Processo nº 59335.000411/2013-99) - Bom Jardim - PE	CPTCE2022083	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 134/2013, SIAFI nº 677825 (Processo nº 59335.000412/2013-33) - Santo Inácio do Piauí - PI	CPTCE2022084	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 135/2013, SIAFI nº 677734 (Processo nº 59335.000413/2013-88) - São Felix do Piauí - PI	CPTCE2022085	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 136/2013, SIAFI nº 677792 (Processo nº 59335.000414/2013-22) - São Francisco do Piauí - PI	CPTCE2022086	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 137/2013, SIAFI nº 677789 (Processo nº 59335.000415/2013-77) - São João da Canabrava - PI	CPTCE2022087	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 140/2013, SIAFI nº 677737 (Processo nº 59335.000417/2013-66) - São Luís do Piauí - PI	CPTCE2022088	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 141/2013, SIAFI nº 677741 (Processo nº 59335.000418/2013-19) - São Miguel do Fidalgo - PI	CPTCE2022089	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 124/2013, SIAFI nº 677830 (Processo nº 59335.000419/2013-55) - Paquetá - PI	CPTCE2022090	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 125/2013, SIAFI nº 677831 (Processo nº 59335.000420/2013-80) - Patos do Piauí - PI	CPTCE2022091	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 126/2013, SIAFI nº 677856 (Processo nº 59335.000421/2013-24) - Pimenteiras - PI	CPTCE2022092	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 127/2013, SIAFI nº 677805 (Processo nº 59335.000422/2013-79) - Pio IX - PI	CPTCE2022093	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 042/2013, SIAFI nº 677851 (Processo nº 59335.000425/2013-11) - Princesa Isabel - PB	CPTCE2022094	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 043/2013, SIAFI nº 677809 (Processo nº 59335.000426/2013-57) - Queimadas - PB	CPTCE2022095	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 044/2013, SIAFI nº 677753 (Processo nº 59335.000427/2013-00) - Rio Tinto - PB	CPTCE2022096	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 035/2013, SIAFI nº 677817 (Processo nº 59335.000429/2013-91) - Pedra Lavrada - PB	CPTCE2022097	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TCE TComp nº 036/2013, SIAFI nº 677794 (Processo nº 59335.000430/2013-15) - Pedro Régis - PB	CPTCE2022098	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 038/2013, SIAFI nº 677795 (Processo nº 59335.000431/2013-60) - Pilar - PB	CPTCE2022099	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 128/2013, SIAFI nº 677811 (Processo nº 59335.000432/2013-12) - Prata do Piauí - PI	CPTCE2022100	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 039/2013, SIAFI nº 677812 (Processo nº 59335.000433/2013-59) - Pilões - PB	CPTCE2022101	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 030/2013, SIAFI nº 677816 (Processo nº 59335.000434/2013-01) - Matinhas - PB	CPTCE2022102	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 129/2013, SIAFI nº 677735 (Processo nº 59335.000435/2013-48) - Ribeira do Piauí - PI	CPTCE2022103	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 031/2013, SIAFI nº 677770 (Processo nº 59335.000436/2013-92) - Mogeiro - PB	CPTCE2022104	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 032/2013, SIAFI nº 677837 (Processo nº 59335.000437/2013-37) - Monteiro - PB	CPTCE2022105	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 026/2013, SIAFI nº 677739 (Processo nº 59335.000440/2013-51) - Lagoa de Dentro - PB	CPTCE2022106	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 130/2013, SIAFI nº 677826 (Processo nº 59335.000441/2013-03) - Rio Grande do Piauí - PI	CPTCE2022107	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 131/2013, SIAFI nº 677841 (Processo nº 59335.000443/2013-94) - Santa Rosa do Piauí - PI	CPTCE2022108	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 029/2013, SIAFI nº 677806 (Processo nº 59335.000445/2013-83) - Mataraca - PB	CPTCE2022109	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 132/2013, SIAFI nº 677820 (Processo nº 59335.000448/2013-17) - Santana do Piauí - PI	CPTCE2022110	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 133/2013, SIAFI nº 677847 (Processo nº 59335.000449/2013-61) - Santo Antônio de Lisboa - PI	CPTCE2022111	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 122/2013, SIAFI nº 677842 (Processo nº 59335.000450/2013-96) - Novo Oriente do Piauí - PI	CPTCE2022112	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 123/2013, SIAFI nº 677821 (Processo nº 59335.000451/2013-31) - Padre Marcos - PI	CPTCE2022113	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 120/2013, SIAFI nº 677827 (Processo nº 59335.000453/2013-20) - Massapê do Piauí-PI	CPTCE2022114	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 019/2013, SIAFI nº 677810 (Processo nº 59335.000454/2013-74) - Itaporanga - PB	CPTCE2022115	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 121/2013, SIAFI nº 677854 (Processo nº 59335.000455/2013-19) - Monsenhor Hipólito - PI	CPTCE2022116	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 020/2013, SIAFI nº 677743 (Processo nº 59335.000456/2013-63) - Itapororoca - PB	CPTCE2022117	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 015/2013, SIAFI nº 677834 (Processo nº 59335.000461/2013-76) - Frei Martinho - PB	CPTCE2022118	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 113/2013, SIAFI nº 677752 (Processo nº 59335.000462/2013-11) - Francisco Macedo - PI	CPTCE2022119	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 114/2013, SIAFI nº 677776 (Processo nº 59335.000463/2013-65) - Francisco Santos - PI	CPTCE2022120	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 115/2013, SIAFI nº 677857 (Processo nº 59335.000464/2013-18) - Ipiranga do Piauí - PI	CPTCE2022121	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 009/2013, SIAFI nº 677804 (Processo nº 59335.000465/2013-54) - Borborema - PB	CPTCE2022122	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		

Projeto	Número do Projeto	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estratégico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R\$)	Total Liberado até o exercício
TCE TComp nº 010/2013, SIAFI nº 677808 (Processo nº 59335.000466/2013-07) - Cacimba de Dentro - PB	CPTCE2022123	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 116/2013, SIAFI nº 677803 (Processo nº 59335.000467/2013-43) - Isaias Coelho - PI	CPTCE2022124	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 011/2013, SIAFI nº 677782 (Processo nº 59335.000468/2013-98) - Cubati - PB	CPTCE2022125	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 012/2013, SIAFI nº 677784 (Processo nº 59335.000469/2013-32) - Capim - PB	CPTCE2022126	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 013/2013, SIAFI nº 677756 (Processo nº 59335.000471/2013-10) - Curral Velho - PB	CPTCE2022127	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 014/2013, SIAFI nº 677845 (Processo nº 59335.000472/2013-56) - Cuitégi - PB	CPTCE2022128	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 118/2013, SIAFI nº 677819 (Processo nº 59335.000473/2013-09) - Jalcós - PI	CPTCE2022129	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 119/2013, SIAFI nº 677836 (Processo nº 59335.000475/2013-90) - Lagoa do Sítio - PI	CPTCE2022130	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 111/2013, SIAFI nº 677777 (Processo nº 59335.000477/2013-89) - Floresta do Piauí - PI	CPTCE2022131	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 006/2013, SIAFI nº 677848 (Processo nº 59335.000478/2013-23) - Areial - PB	CPTCE2022132	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 101/2013, SIAFI nº 677798 (Processo nº 59335.000479/2013-78) - Aroazes - PI	CPTCE2022133	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 109/2013, SIAFI nº 677749 (Processo nº 59335.000481/2013-47) - Caridade do Piauí - PI	CPTCE2022134	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 112/2013, SIAFI nº 677751 (Processo nº 59335.000482/2013-91) - Francinópolis - PI	CPTCE2022135	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 100/2013, SIAFI nº 677829 (Processo nº 59335.000483/2013-36) - Alegrete - PI	CPTCE2022136	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 102/2013, SIAFI nº 677799 (Processo nº 59335.000484/2013-81) - Aroeiras do Itaim - PI	CPTCE2022137	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 103/2013, SIAFI nº 677745 (Processo nº 59335.000485/2013-25) - Belém do Piauí - PI	CPTCE2022138	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 106/2013, SIAFI nº 677740 (Processo nº 59335.000488/2013-69) - Caldeirão Grande - PI	CPTCE2022139	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 107/2013, SIAFI nº 677769 (Processo nº 59335.000489/2013-11) - Campinas do Piauí - PI	CPTCE2022140	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 108/2013, SIAFI nº 677761 (Processo nº 59335.000490/2013-38) - Campo Alegre do Fidalgo - PI	CPTCE2022141	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 149/2013, SIAFI nº 677778 (Processo nº 59335.000514/2013-59) - João Costa - PI	CPTCE2022142	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 152/2013, SIAFI nº 677849 (Processo nº 59335.000561/2013-01) - Sertãozinho - PB	CPTCE2022143	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
TCE TComp nº 150/2013, SIAFI nº 677758 (Processo nº 59335.000562/2013-47) - Sossego - PB	CPTCE2022144	A Iniciar	Não					DAD	CPTCE		
Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene	CGDS2022002	A Iniciar	Não	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66	DPLAN	CGDS		

Anexo II - Projetos do Monitoramento (posição de 31.03.2022)

CGGI - Projetos CGGI2022013 - Elaboração do Proposta Orçamentária - fase qualitativa												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Indicação de 02 (dois) pontos focais para tratar da fase qualitativa da elaboração da PLOA junto ao MDR		CGGI	A Iniciar	25-abr-22	26-abr-22	-					Os prazos foram previstos baseando-se no cronograma das atividades da fase qualitativa da PLOA 2022. No ano de 2021, a atividade de indicação ocorreu após solicitação do MDR.	
Análise do Cadastro de Ações Orçamentárias		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	A Iniciar	26-abr-22	11-mai-22	-						
Proposta de alteração da classificação da ação		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	A Iniciar	26-abr-22	11-mai-22	-						
Proposta de inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias e dos Projetos de Investimentos de Grande Vulto		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	A Iniciar	9-mai-20	13-mai-22	-						
Consolidação das propostas de inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias e dos projetos de investimento de grande vulto.		CGGI	A Iniciar	14-mai-22	18-mai-22	-						
Resumo Projeto			A Iniciar									
				De 2020-05-09 até 2022-05-14	De 2022-04-26 até 2022-05-18	-			-	#DIV/0!		
CGGI2022012 - TransformaGov												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Atualizar e validar as informações do Painel Raio-X		CGAF	Concluído		31-out-21			2021-10-30				
Aderir à Rede TransformaGov no estado de Pernambuco		CGGI	Concluído		28-fev-21			2021-02-28				
Revisar a Cadeia de Valor integrada com seus principais elementos		CGGI	Concluído		31-mar-22			2021-12-16				
Realinhar o Planejamento Estratégico Institucional ao PRDNE		CGGI	Concluído		28-fev-22			2021-12-16				
Instituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)		CGAF	Concluído		28-fev-21			2021-02-28				
Realizar levantamento dos conjuntos documentais, incluindo sem tratamento, com identificação de volume (em metros lineares) e dos locais de armazenamento		CGAF	Concluído		31-ago-21			2021-08-31				
Implantar o módulo estatístico do SEI para acompanhamento remoto do órgão central		CGTI	Concluído		30-nov-20			2020-11-30				
Incentivar a adoção do módulo Central de Mensagens como ferramenta para utilização junto aos servidores da entidade		CGGP	Concluído		31-out-20			2020-10-30				
Incentivar cadastro dos servidores no Banco de Talentos e implementar o uso do Painel Banco de Talentos pela área de Gestão de Pessoas Banco de Recadastrar no módulo AJ do SIGEPE as ações judiciais que estiverem sendo pagas via sistema SICAJ		CGGP	Concluído		30-nov-20			2020-11-30				
Estabelecer os perfis profissionais desejáveis para todos os cargos em comissão do grupo DAS ou FCPE da estrutura (níveis 5 a 6)		CGGP	Concluído		31-jan-21			2021-01-31				
Elaborar plano de trabalho para migração dos serviços de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões para o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – DECIPEX		CGGP	Concluído		31-jan-22			2022-01-31				
Implantação do Programa de Gestão, nos moldes da IN 65, de 30/07/2020, do Ministério da Economia		CGGP	Concluído		30-nov-20			2021-11-30				
Implantar o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet)		CGAF	Concluído		30-set-20			2020-09-30				
Cadastrar as informações de locação de imóveis no Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) imóveis		CGAF	Concluído		28-fev-21			2021-02-28				
Realizar diagnóstico da ocupação predial, considerando os parâmetros definidos pela SPU		CGAF	Concluído		30-mar-21			2021-03-30				
Definir, em parceria com a SPU e SEGES, estratégia de racionalização de ocupação predial		CGAF	Concluído		30-out-21			2021-10-30				
Aderir à Rede +Brasil		CGDS	Concluído		30-jun-21			2021-06-30				
Capacitar os agentes públicos no aplicativo												
Fiscalização Mais Brasil		CGDS	Concluído		31-mar-21	Página 1 de 82		2021-03-31				

Capacitar os servidores que trabalham com as transferências de recursos da União		CGDS	Concluído		30-abr-22				2022-04-30				
Aderir à análise automatizada de Prestação de Contas		CGDS	Concluído		30-out-21				2021-10-30				
Capacitar e promover a adesão ao Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr)		CGGI/ CGDS	Concluído		30-out-21				2021-10-30				
Implantar o Barramento de serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN)		CGTI	A Iniciar		30-abr-22							Considerando que o TRF4 não nos concedeu acesso ao código-fonte do SEI atualizado, estamos avaliando a possibilidade de integrar o SEI da Sudene ao SEI do MDR. No entanto, mesmo após diversas tentativas de contato por telefone com o sr. Romeu, diretor de administração do MDR, ainda não obtivemos sucesso neste contato, e portanto, não conseguimos avançar neste ponto.	
Adotar o Protocolo Digital do Governo Federal (utilizando a solução gov.br)		CGTI	Atrasado		31-mar-22							Mesmo com as limitações da nossa atual versão do SEI, conseguimos implantar o Protocolo Digital, que está integrado ao SEI da Sudene e disponível no link abaixo: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolo-da-superintendencia-do-desenvolvimento-do-nordeste No entanto, os responsáveis pelo Protocolo da Sudene ainda não estão utilizando o serviço. O servidor Diego Véras, indicado responsável pela área de negócios do Protocolo, está ciente da necessidade de orientar a equipe do Protocolo, mas como ele está sobrecarregado com a reforma do prédio da Sudene, ainda não foi possível repassar as informações para a equipe de servidores do Protocolo.	
Elaborar o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos, conforme Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal		CGAF	A Iniciar		30-jun-22							A política de gestão de documentos e arquivos será instituída a partir da publicação do decreto, mas ainda está em fase de consolidação. A previsão é que seja normatizada em breve. O Arquivo Nacional também está trabalhando no desenvolvimento de cursos Ead e programas de capacitação para que todos os órgãos da administração pública federal elaborem os seus planos de gestão de documentos e arquivos. A partir da instituição da política, os órgãos terão o prazo de 12 meses para elaborarem os seus respectivos planos.	
Elaborar e aprovar junto ao Arquivo Nacional o código de classificação e tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos às atividades-fim do órgão ou entidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019		CGAF	Em Andamento		30-jun-22			2021-10-01				Em curso.	
Aplicar o código de classificação e a tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos à atividade-meio do Poder Executivo Federal, conforme Portaria Arquivo Nacional, nº 47/2020		CGAF	Atrasado		30-mar-22			2021-10-01				A aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade está sendo feita em etapas e por coordenação. No momento está sendo aplicado nos documentos da CGGP.	
Proceder a eliminação dos documentos que cumpriram a respectiva temporalidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019 e as orientações do Arquivo Nacional		CGAF	A Iniciar		30-set-22							Conforme o OFÍCIO CIRCULAR nº 01/2022/GABIN/AN, a eliminação de documentos públicos está suspensa até nova decisão judicial.	
Resumo Projeto			Atrasado										
					De 2020-09-30 até 2022-09-30		-	2021-10-01	De 2020-09-30 até 2022-04-30		-	#DIV/0!	

CGGI2022011 - Adesão ao MEG-Tr

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados ao MEG-TR no Governo Federal		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	-	2021-08-20	2021-09-08	-	100		
Elaboração de proposta de composição do Comitê de Aplicação do MEG-TR		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	-	2021-08-20	2021-09-08	-	100		
Elaboração de documento contendo análise técnica		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	-	2021-08-20	2021-09-08	-	100		
Análise jurídica do ato normativo que instituirá o Comitê de Aplicação		PF-SUDENE	Concluído	9-set-21	23-set-21	-	2021-09-09	2021-09-23	-	100		
Complementação da análise técnica		CGGI	Concluído	24-set-21	28-set-21	-	2021-09-24	2021-09-28	-	100		
Instituição Comitê de Aplicação para implementação do MEG-Tr		GAB	Concluído	20-out-21	20-out-21	-	2021-10-20	2021-10-20	-	100		
Adesão ao MEG-TR		Presidente do Comitê de Aplicação	Concluído			-			-	100	Falta a data da efetiva adesão ao MEG-Tr	
Participação dos integrantes do Comitê de Aplicação em capacitação do MEG-TR		Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Início do primeiro ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido		Presidente e Membros do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					

Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão		Unidades avaliadas no IMG-TR	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	-	2021-10-01					
Início do novo ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido		Pesidente e Membros do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão		Unidades avaliadas no IMG-TR	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	-						
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-08-20 até 2022-10-01	De 2021-09-08 até 2023-09-30	-	De 2021-08-20 até 2021-10-20	De 2021-09-08 até 2021-10-20	-	100		

CGGI2022010 - Elaboração da Política de Gestão de Riscos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados a Política de Gestão de Riscos (PGR) no Governo Federal		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	-	2021-07-09	2021-08-30	-	100		
Elaboração de proposta de PGR		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	-	2021-07-09	2021-08-30	-	100	Falta anexar ao processo	
Validação técnica da PGR		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	-	2021-07-09	2021-08-30	-	100		
Elaboração de nota técnica		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	-	2021-07-09	2021-08-30	-	100	Verificar necessidade de revisão	
Revisão da proposta de PGR e da nota técnica para alinhamento com novo Plano Estratégico Institucional (PEI)		CGGI	Concluído	17-dez-21	7-jan-22	-	2021-12-17	2022-03-31	-	100		
Análise jurídica do ato normativo que instituirá a PGR		PF-SUDENE	Em Andamento	31-mar-22	7-abr-22	-	2022-03-31					
Inclusão da proposta de PGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	A Iniciar	7-abr-22	8-abr-22	-						
Deliberação sobre a PGR		CGRC	A Iniciar	11-abr-22	11-abr-22	-						
Ajustes na PGR		CGGI	A Iniciar	12-abr-22	20-abr-22	-						
Publicação da PGR		CGGI e ASCOM	A Iniciar	21-abr-22	22-abr-22	-						
Benchmarking de metodologias de Gestão de Riscos no Governo Federal		CGGI	A Iniciar	22-abr-22	22-mai-22	-					Na atual proposta de PGR, prazo é de 180 dias após a aprovação/publicação da PGR	
Elaboração de proposta de Metodologia de Gestão de Riscos (MGR)		CGGI	A Iniciar	22-abr-22	20-jun-22	-						
Validação técnica da MGR		CGGI	A Iniciar	20-jun-22	4-jul-22	-						
Inclusão da proposta de MGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	A Iniciar	4-jul-22	11-jul-22	-						
Deliberação sobre a MGR		CGRC	A Iniciar	11-jul-22	11-jul-22	-					Data prevista para reunião do CGRC	
Ajustes na MGR		CGGI	A Iniciar	11-jul-22	15-jul-22	-						
Publicação da MGR		CGGI e ASCOM	A Iniciar	15-jul-22	15-jul-22	-						
Apresentação institucional sobre PGR e MGR		CGGI	A Iniciar	18-jul-22	29-jul-22	-						
Implementação da gestão de riscos na Sudene		Todas as unidades	A Iniciar	18-jul-22	18-jul-24	-					Previsto na atual proposta de PGR prazo de até 24 meses para um ciclo de avaliação de riscos.	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-05-06 até 2022-07-18	De 2021-11-06 até 2024-07-18	-	De 2021-07-09 até 2022-03-31	De 2021-08-30 até 2022-03-31	-	100		

CGGI2022009 - Programa de Gestão

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Normatização interna		CGGP	Concluído	31-jul-20	5-nov-21	-	2020-07-31	2021-11-05	-	100	Portaria nº 122/2020	
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão		CGGP e CGGI	Concluído	5-nov-21	31-dez-21	Página 3 de 82	2021-11-05	2021-12-31	-	100		
Alteração da norma interna		CGGI	Concluído	5-jan-21	19-jan-21	-	2021-01-05	2021-01-19	-	100	Portaria nº 142/2020	3 de 82

Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão conforme nova Portaria		CGGP e CGGI	Em Andamento	19-jan-21	31-dez-22	-	2021-01-19	-			Atividade rotineira que será realizada ao longo de todo o Programa de Gestão	
Elaboração de Relatório de acompanhamento do PGD		CGGP e CGGI	A Iniciar	5-mai-22	20-mai-22	-	2022-04-01	2022-05-05	-			
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-07-31 até 2022-05-05	De 2021-01-19 até 2022-12-31		De 2020-07-31 até 2022-04-01	De 2021-01-19 até 2022-05-05	-	100		
CGGI2022008 - Monitoramento do Desempenho Institucional												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	1-jan-22	31-mar-22	-	2022-01-01	2022-03-31	-	100		
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-abr-22	14-abr-22							
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	14-abr-22	14-abr-22							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-abr-22	30-abr-22						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-abr-22	30-jun-22							
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-jul-22	15-jul-22							
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	15-jul-22	15-jul-22							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-jul-22	30-jul-22						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22							
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	3-out-22	17-out-22							
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	17-out-22	17-out-22							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-out-22	30-out-22						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	A Iniciar	1-ago-22	17-ago-22							
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	A Iniciar	17-ago-22	22-ago-22							
Aprovação do Plano de Ação da Sudene e, consequentemente, das metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	22-ago-22	26-ago-22							
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	26-ago-22	31-ago-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	31-ago-22	14-set-22							
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	14-set-22	16-set-22							
Aprovação da Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	19-set-22	21-set-22							
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	19-set-22	21-set-22							
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	A Iniciar	21-set-22	21-set-22							
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	A Iniciar	21-set-22	21-set-22							
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	1-out-22	10-out-22							
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	A Iniciar	1-out-22	10-out-22							

Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE Análise jurídica		CGGI PF-Sudene	A Iniciar A Iniciar	10-out-22 14-out-22	14-out-22 26-out-22								
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	26-out-22	28-out-22								
Aprovação da Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	28-out-22	31-out-22								
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	28-out-22	31-out-22								
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	A Iniciar	31-out-22	31-out-22								
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	31-out-22	31-out-22								
4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22								
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-jan-23	15-jan-23								
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	15-jan-23	15-jan-23								
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23							Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-01-01 até 2023-01-15	De 2022-03-31 até 2023-01-31		-	2022-01-01	2022-03-31		-	100	
CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos													

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	1-abr-22	30-abr-22	-	2022-03-18	2022-03-22	-	100		
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	1-abr-22	30-abr-22	-	2022-03-21	2022-03-21	-	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Em Andamento	30-abr-22	15-abr-22	-	2022-03-21			80		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado		CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	15-abr-22	15-jun-22	-					A partir desta atividade, as atividades se repetem para cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria		CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	15-abr-22	15-jun-22	-						
Representação gráfica do processo		CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	15-jun-22	15-jul-22	-						
Normatização interna do processo, quando for o caso		CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	15-jun-22	15-ago-22	-						
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-04-01 até 2022-06-15	De 2022-04-15 até 2022-08-15		De 2022-03-18 até 2022-03-21	De 2022-03-21 até 2022-03-22	-	93,33333333		

CGGI2022006 - Revisão do Planejamento Estratégico da Sudene

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Revisão da Missão, da Visão e dos Valores Institucionais		CGGI	Concluído	25-nov-19	27-dez-20	10.800,00	2019-11-25	2020-12-27	6.000,00	100	Relatório Planejamento Estratégico (SEI 0214188)	
Análise ambiental (análise SWOT)		CGGI	Concluído	27-dez-20	10-mar-21	4.800,00	2020-12-27	2021-03-10	4.800,00	100	Devolutiva Análise Ambiental (SEI 0256809)	
Elaboração da Cadeia de Valor Integrada		CGGI	Concluído	1-fev-21	8-set-21	-	2021-02-01	2021-09-08	-	100	Proposta Cadeia de Valor (0268502)	
Definição dos objetivos estratégicos e elaboração do Mapa Estratégico (BSC adaptado)		CGGI	Concluído	27-abr-21	10-set-21	6.300,00	2021-04-27	2021-09-10	6.300,00	100	Mapa Estratégico 1º Desenho (0273232)	
Elaboração do Painel de Indicadores e Metas		CGGI	Concluído	7-jun-21	14-dez-21	-	2021-06-07	2021-12-14	-	100	Planilha Indicadores Estratégicos (0306031)	
Aprovação do Plano Estratégico Institucional no CGRC		CGGI	Concluído	1-dez-21	31-dez-21	-	2021-12-01	2021-12-16	-	100	Ata 2ª reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle (SEI 0312845)	
Elaboração do Sumário executivo do Plano Estratégico Institucional (PEI)		CGGI	Em Andamento	8-mar-22	9-abr-21	-	2022-03-08			80		
Resumo Projeto			Em Andamento									

				De 2019-11-25 até 2022-03-08	De 2020-12-27 até 2021-12-31	21.900,00	De 2019-11-25 até 2022-03-08	De 2020-12-27 até 2021-12-16	17.100,00	97,14285714		
CGGI2022005 - PDA 2022-2024												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25-mai-21	4-jun-21	-	2021-05-25	2021-06-04	-	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	17-jan-22	21-jan-22	-	2022-01-17	2022-01-21	-	100		
Priorização das bases de dados		Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	Concluído	24-jan-22	4-fev-22	-	2022-01-24	2022-02-04	-	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	1-jan-22	11-fev-22	-	2022-01-17	2022-02-10	-	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	14-fev-22	14-fev-22	-	2022-02-18	2022-02-18	-	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Atrasado	10-fev-22	28-fev-22	-					A CGTI, enquanto Secretaria-Executiva do Comitê, está analisando o documento para encaminhamento ao Comitê.	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Atrasado	28-fev-22	28-fev-22	-					Como o Comitê ainda não aprovou o Plano, as demais etapas decorrentes desta aprovação estão atrasadas.	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Atrasado	1-mar-22	31-mar-24	-					Como o Comitê ainda não aprovou o Plano, as demais etapas decorrentes desta aprovação estão atrasadas.	
Publicação e manutenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Atrasado	1-mar-22	31-mar-24	-					Como o Comitê ainda não aprovou o Plano, as demais etapas decorrentes desta aprovação estão atrasadas.	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Atrasado	1-mar-22	31-mar-24	-					Como o Plano ainda não foi aprovado pelo CGD, o seu monitoramento ainda não foi iniciado.	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	A Iniciar	30-set-22	30-set-22	-						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	A Iniciar	31-out-22	31-out-22	-						
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	1-jan-23	1-mar-23	-						
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	1-mar-23	1-mar-23	-						
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	A Iniciar	31-mar-23	31-mar-23	-						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	A Iniciar	30-abr-23	30-abr-23	-						
Abertura da base de dados do RAIN'T		AUD e CGTI	A Iniciar	30-set-23	30-set-23	-						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAIN'T		ASCOM	A Iniciar	31-out-23	31-out-23	-						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	29-fev-24	29-fev-24	-						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	A Iniciar	31-mar-24	31-mar-24	-						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	A Iniciar	1-jan-24	1-fev-24	-						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	1-fev-24	1-fev-24	-						
Resumo Projeto		Atrasado										
				De 2021-05-25 até 2024-03-31	De 2021-06-04 até 2024-03-31		De 2021-05-25 até 2022-02-18	De 2021-06-04 até 2022-02-18				
						-			-	100		
CGGI2022004 - PDA 2020-2022												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificação dos pontos focais		CGTI	Concluído	1-ago-19	31-ago-19	-	2019-08-01	2019-08-31	-	100		
Reunião de apresentação e divulgação das orientações		CGTI e DAD	Concluído	1-ago-19	31-ago-19	-	2019-08-01	2019-08-31	-	100		
Planejamento da coleta, seleção e sistematização dos dados candidatos à abertura		CGGI	Concluído	1-set-19	30-set-19	-	2019-09-01	2019-09-30	-	100		
Inventário de dados da Sudnee		Todas Unidades da Sudene	Concluído	1-set-19	30-set-19	-	2019-09-01	2019-09-30	-	100		
Elaboração do Plano de Dados Abertos da Sudene 2020-2022		CGTI, CGGI, OUV e Autoridade de Monitoramento	Concluído	17-jul-19	4-dez-19	-	2019-08-02	2020-03-17	-	100		
Pesquisa de satisfação 2019		OUV	Concluído	1-jan-19	31-dez-19	-	2019-01-01	2019-12-31	-	100		
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2019		OUV	Concluído	31-dez-19	31-dez-19	-	2020-01-01	2020-01-31	-	100		
Publicação do relatório de satisfação do usuário 2019		ASCOM	Concluído	31-dez-19	31-dez-19	-	2020-01-31	2020-01-31	-	100		
Pesquisa de satisfação 2020		OUV	Concluído	1-jan-20	31-dez-20	-	2021-12-01	2022-01-29	-	100		
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2020		OUV	Atrasado	31-dez-20	31-dez-20	-	2022-01-29				A pesquisa foi finalizada pela Ouvidoria e o relatório foi aprovado com ressalvas na Reunião DC de 29/03/2022. A Ouvidoria está finalizando os ajustes no relatório para enviar para publicação.	

Publicação do relatório de satisfação do usuário 2020		ASCOM	Atrasado	31-dez-20	31-dez-20	-						Aguardando ajustes no Relatório, decorrentes de discussão na Reunião da Diretoria Colegiada de 29/03/2022.	
Curadoria dos dados		Unidades responsáveis por dados a serem abertos	Atrasado	1-mar-20	31-mar-22	-	2020-03-01						
Abertura da base de dados do FNE		CGDF e CGTI	Concluído	30-jun-20	30-jun-20	-	2022-02-13	2022-02-13	-	100			
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do FNE		ASCOM	Atrasado	30-jun-20	30-jun-20	-						A publicação da matéria é posterior à abertura da base de dados, como a base foi aberta com atraso, tal atividades atrasou.	
Pesquisa de satisfação 2021		OUV	Concluído	1-jan-21	31-dez-21	-	2021-12-01	2022-01-29	-	100			
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2021		OUV	Atrasado	31-dez-21	31-dez-21	-	2022-01-29					A pesquisa foi finalizada pela Ouvidoria e o relatório foi aprovado com ressalvas na Reunião DC de 29/03/2022. A Ouvidoria está finalizando os ajustes no relatório para enviar para publicação.	
Publicação do relatório de satisfação do usuário 2021		ASCOM	Atrasado	31-dez-21	31-dez-21	-						Aguardando ajustes no Relatório, decorrentes de discussão na Reunião da Diretoria Colegiada de 29/03/2022.	
Abertura da base de dados de satisfação do usuário		OUV e CGTI	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	-	2022-02-13	2022-02-13	-	100			
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados de satisfação do usuário		ASCOM	Atrasado	30-jun-21	30-jun-21	-						A publicação da matéria é posterior à abertura da base de dados, como a base foi aberta com atraso, tal atividades atrasou. Demanda passada para ASCOM em 14/02/2022 e reforçada em 29/03/2022.	
Consulta pública para priorização das bases a serem abertas		OUV	Concluído	1-jan-21	30-jun-21	-	2021-05-13	2021-06-22	-	100			
Elaboralação de relatório de priorização das bases de dados a serem abertas		CGGI	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	-	2021-06-22	2021-06-22	-	100			
Publicação do relatório de priorização das bases de dados a serem abertas		ASCOM	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	-	2021-06-22	2021-06-22	-	100			
Relatório de Acompanhamento do PDA/Sudene 2020-2022		CGGI	Concluído	1-jan-21	31-dez-21	-	2021-03-19	2021-12-24	-	100			
Aprovação do Relatório de Acompanhamento do PDA/Sudene 2020-2022		Diretoria Colegiada	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	-	2021-12-29	2021-12-29	-	100			
Publicação do relatório de acompanhamento do PDA		ASCOM	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	-	2022-01-06	2022-01-06	-	100			
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2019-01-01 até 2021-12-31	De 2019-08-31 até 2022-03-31		De 2019-01-01 até 2022-02-13	De 2019-08-31 até 2022-02-13		-	100		
CGGI2022003 - Atos Inferiores a Decreto													
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Normalização interna da matéria		CGGI	Concluído	28-nov-19	30-nov-20	-	2019-12-03	2020-11-09	-	100			
Envio dados à SEME etapa I			Concluído	23-nov-20	4-dez-20	-	2020-11-30	2020-11-30	-	100			
Consolidação etapa II			Concluído	30-nov-20	26-fev-21	-	2021-02-02	2021-02-25	-	100			
Envio dados à SEME etapa II			Concluído	22-fev-21	5-mar-21	-	2021-03-01	2021-03-01	-	100			
Consolidação etapa III			Concluído	26-fev-21	31-mai-21	-	2021-04-12	2021-05-31	-	100			
Envio dados à SEME etapa III			Concluído	24-mai-21	4-jun-21	-	2021-06-02	2021-06-02	-	100			
Consolidação etapa I			Concluído	9-nov-20	30-nov-20	-	2020-11-19	2020-11-30	-	100			
Consolidação etapa IV			Concluído	31-mar-21	31-ago-21	-	2021-06-30	2021-08-18	-	100			
Envio dados à SEME etapa IV			Concluído	23-ago-21	3-set-21	-	2021-08-31	2021-08-31	-	100			
Consolidação etapa V			Concluído	31-ago-21	31-mar-22	-	2021-10-04	2022-03-31	-	100			
Envio dados à SEME etapa V			A Iniciar	1-abr-22	8-abr-22	-			-				
Consolidação atos que necessitam de análise mais profunda			A Iniciar	1-abr-22	1-ago-22	-			-				
Envio dados à SEME etapa extra			A Iniciar	1-ago-22	5-ago-22	-			-				
Edição de ato com relação de normas vigentes			A Iniciar	1-ago-22	1-set-22	-						Datas ainda não foram divulgadas pela SEME	
Divulgação de todos os atos, nos termos do art. 16 do Decreto nº 10.139/2019			A Iniciar	1-abr-22	1-ago-22	-							
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2019-11-28 até 2022-08-01	De 2020-11-30 até 2022-09-01		De 2019-12-03 até 2021-10-04	De 2020-11-09 até 2022-03-31		-	100		
CGGI2022002 - Relatório de Gestão													
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Recepção das informações		CGGI	Concluído	1-jan-22	31-jan-22	-	2022-01-31	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Capítulo de Visão Geral		Camila	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Capítulo de Riscos		Vinicius	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Subcapítulo Governança		Mauricio e Camila	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-02	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Subcapítulo Estratégia		Mauricio	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-02	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Desempenho DAD		Camila	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Desempenho DFIN		Mauricio	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-03	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Desempenho DPLAN		Vinicius	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Capítulo de Informações													
Finaceiras e Contábeis		Camila	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-15	2022-02-25	-	100			
Consolidação do Relatório		CGGI	Concluído	1-fev-22	25-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-25	-	100			
Revisão do Relatório		Renan	Concluído	1-mar-22	4-mar-22	-	2022-03-01	2022-03-04	-	100			
Envio à ASCOM		Rafael	Concluído	4-mar-22	4-mar-22	-	2022-03-04	2022-03-04	-	100			
Envio à AUD		Rafael	Concluído	4-mar-22	4-mar-22	-	2022-03-04	2022-03-04	-	100			
Diagramação do Relatório		ASCOM	Concluído	4-mar-22	25-mar-22	-	2022-03-04	2022-03-31	-	100			
Análise do Relatório pela Auditoria		AUD	Concluído	4-mar-22	25-mar-22	-	2022-03-04	2022-03-25	-	100			
Aprovação		DC	Concluído	25-mar-22	31-mar-22	Página 7 de 82	2022-03-25	2022-03-29	-	100			
Publicação do Relatório		ASCOM	Concluído	31-mar-22	31-mar-22	-	2022-03-31	2022-03-31	-	100			

Resumo Projeto			Concluído	De 2022-01-01 até 2022-03-31	De 2022-01-31 até 2022-03-31		De 2022-01-31 até 2022-03-31	De 2022-02-25 até 2022-03-31	-	100		
CGGI2022001 - Implantação do Sistema de Gestão de Projetos												
Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Analíse das alternativas disponíveis no mercado		CGTI	Concluído	27-dez-21	31-dez-21	-	2021-12-27	2021-12-31	-	100		
Apresentação das alternativas para escolha		CGTI	Concluído	3-jan-22	7-jan-22	-	2022-01-03	2022-01-07	-	100		
Criação de protótipo		CGTI/CGGI	Concluído	3-jan-22	7-jan-22	-	2022-01-03	2022-01-07	-	100		
Contratação do Monday.com		Camila	Concluído	10-jan-22	31-jan-22	25.773,00	2022-01-10	2022-02-10	24.380,00	100		
Elaboração Manual do SigSudene		Maurício	Concluído	1-fev-22	17-fev-22	-	2022-02-01	2022-02-17	-	100		
Planejamento do treinamento		Maurício e Camila	Concluído	15-fev-22	18-fev-22	-	2022-02-15	2022-02-18	-	100		
Oficina do SIGSudene		Maurício	Concluído	18-fev-22	18-fev-22	-	2022-02-18	2022-02-18	-	100		
Inserção de dados no Sistema		Maurício e Camila	Concluído	16-fev-22	22-fev-22	-	2022-02-16	2022-02-28	-	100		
Consultorias às Unidades		Maurício e Camila	Concluído	21-fev-22	15-mar-22	-	2022-02-21	2022-03-15	-	100	Consultorias iniciais foram feitas com foco na disponibilização de dados em 16/03.	
Criar automações de prazo para todas as unidades		Maurício	Concluído	8-mar-22	19-mar-22	-	2022-03-15	2022-03-16	-	100		
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 1º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	1-abr-22	7-abr-22	-						
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	A Iniciar	5-abr-22	8-abr-22	-						
Implementação de Melhorias		Maurício	A Iniciar	12-abr-22	15-abr-22	-						
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 2º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	1-jul-22	7-jul-22							
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	A Iniciar	6-jul-22	12-jul-22	-						
Implementação de Melhorias		Maurício	A Iniciar	12-jul-22	15-jul-22	-						
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 3º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	3-out-22	7-out-22							
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 4º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	3-jan-23	10-jan-23							
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-12-27 até 2023-01-03	De 2021-12-31 até 2023-01-10	25.773,00	De 2021-12-27 até 2022-03-15	De 2021-12-31 até 2022-03-16	24.380,00	100		

OUIVITORIA
OUIV 2022004 - Pesquisa Satisfação
Interna 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações através de questionário		OUIV	Atrasado	28-mar-22	15-abr-22	0						
Tabular resultados		OUIV	A Iniciar	18-abr-22	22-abr-22	0						
Diagramação		CGTI	A Iniciar	25-abr-22	29-abr-22	0						
Confecção da capa		ASCOM	A Iniciar	2-mai-22	3-mai-22	0						
Apresentação na Reunião Estratégica		OUIV	A Iniciar	4-mai-22	4-mai-22	0						
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	A Iniciar	9-mai-22	13-mai-22	0						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2022-03-28 até 2022-05-09	De 2022-04-15 até 2022-05-13	0			0			

OUIV 2022003 - Pesquisa de Satisfação
Externa 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento das Informações		OUIV	Concluido	17-dez-21	29-jan-22	0						
Redigir Relatório		OUIV	Concluido	1-fev-22	28-fev-22	0						
Confecção da Capa		ASCOM	Concluido	3-mar-22	4-mar-22	0						
Apresentação na Reunião Estratégica		OUIV	Concluido	9-mar-22	9-mar-22	0						
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	Atrasado	21-mar-22	25-mar-22	0						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-17 até 2022-03-21	De 2022-01-29 até 2022-03-25	0			0			

OUIV 2022002 - Relatório de Ouvidoria
da Sudene 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações no Fala.BR		OUIV	Atrasado	21-mar-22	31-mar-22	0						
Redigir Relatório		OUIV	A Iniciar	4-abr-22	15-abr-22	0						
Diagramação		CGTI	A Iniciar	16-abr-22	30-abr-22	0						
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	A Iniciar	2-mai-22	6-mai-22	0						
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2022-03-21 até 2022-05-02	De 2022-03-31 até 2022-05-06	0			0			

OUIV 2022001 - Relatório de Ouvidoria do
FNE 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações no Fala.BR		OUIV	A Iniciar	25-abr-22	29-abr-22	0						
Redigir Relatório		OUIV	A Iniciar	2-mai-22	13-mai-22	0						
Diagramação		CGTI	A Iniciar	16-mai-22	20-mai-22	0						
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	A Iniciar	23-mai-22	27-mai-22	0						
Resumo Projeto			A Iniciar								Status do Projeto	
				De 2022-04-25 até 2022-05-23	De 2022-04-29 até 2022-05-27	0			0			

COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Tomadas de Contas Especiais

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Processo nº 59335.000035/2011-70	TCE Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	9-abr-20	31-dez-20	0-jan-00	9-abr-20	3-dez-21	0	100	Relatório TCE 2021-001
Processo nº 59335.000102/2011-57	TCE Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	9-abr-20	30-jun-21	0-jan-00	9-abr-20	14-abr-21	0	100	Relatório TCE 2021-002
Processo nº 59335.000032/2010-56	TCE Conv. DPS nº 038/97, SIAFI nº 385592, Morro Cabeça no Tempo-PI (Processo Convênio nº 03057.000045/97-87)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	31-mar-21	29-jun-21	0-jan-00	31-mar-21	14-abr-21	0	100	Relatório TCE 2021-003
Processo n.º 59335.000720/2010-16	TCE Conv. SIAFI n.º 406373, IPSA/PE (Processo n.º 59313.000114/00-87) - Relatório de TCE nº 004/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	9-abr-20	31-dez-20	0-jan-00	9-abr-20	30-abr-21	0	100	Relatório TCE 2021-004
Processo n.º 59335.000394/2009-11	TCE Conv. SIAFI n.º 368482, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03057.000016/1998-60)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	19-abr-21	16-out-21	0-jan-00	19-abr-21	5-mar-21	0	100	Relatório TCE 2021-005
Processo n.º 59335.000036/2008-10	TCE Conv. SIAFI n.º 384007, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03045.000085/1999-48)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	29-abr-21	26-out-21	0-jan-00	29-abr-21	12-mai-21	0	100	Relatório TCE 2021-006
Processo n.º 59335.000550/2009-36	TCE Conv. SIAFI n.º 407080, Escada-PE (Processo n.º 59313.000103/2000-05)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	13-fev-21	12-ago-21	0-jan-00	13-fev-21	6-out-21	0	100	Relatório TCE 2021-007
Processo n.º 59335.000060/2010-73	TCE Conv. SIAFI n.º 328386, Flexeiras-AL (Processo n.º 03057.000004/1997-08)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	17-mai-21	13-nov-21	0-jan-00	17-mai-21	28-jun-21	0	100	Relatório TCE 2021-008
Processo nº 59335.000184/2010-59	TCE Conv. SIAFI nº 348984, Governo do Estado de Alagoas (proc. Nº 03055.000025/98-34)	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	3-abr-19	30-set-19	0-jan-00	3-abr-19	7-jan-21	0	100	Relatório TCE 2021-009
Processo n.º 59335.000356/2009-08	TCE Conv. SIAFI n.º 406593 (Processo n.º 59313.000095/2000-99) - AEDA - Autarquia Educacional do Araripe	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	8-jul-21	4-jan-22	0-jan-00	8-jul-21	31-ago-21	0	100	Relatório TCE 2021-010
Processo n.º 59335.000365/2011-66	TCE Conv. SIAFI n.º 580885 (Processo n.º 59333.000146/2006-30) - Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	2-ago-21	29-jan-22	0-jan-00	2-ago-21	31-ago-21	0	100	Relatório TCE 2021-011
Processo nº 59335.000005/2012-45	TCE Conv. SIAFI nº 406129 (Processo n.º 59313.000006/2000-12), Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	22-abr-21	19-out-21	0-jan-00	22-abr-21	21-set-21	0	100	Relatório TCE 2021-012
Processo nº 59335.000544/2009-89	TCE Conv. SIAFI nº 371426 (Processo n.º 03057.00002/1999-36), Fundação Quinteto Violado	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	20-ago-21	16-fev-22	0-jan-00	20-ago-21	29-set-21	0	100	Relatório TCE 2021-013
Processo nº 59335.000103/2011-00	TCE Conv. SIAFI nº 406420 (Processo n.º 59313.000067/2000-71), Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	24-ago-21	20-fev-22	0-jan-00	24-ago-21	11-nov-21	0	100	Relatório TCE 2021-014
Processo nº 59335.000571/2009-51	TCE Conv. SIAFI nº 407096 (Processo n.º 59313.000098/2000-22),Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	17-nov-21	16-mai-22	0-jan-00	17-nov-21	2-dez-21	0	100	Relatório TCE 2021-015
Processo nº 59335.000063/2010-15	TCE Conv. SIAFI nº 406134 (Processo n.º 59313.000065/2000-82), Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE – IDSTP	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	30-set-21	29-mar-22	0-jan-00	30-set-21	12-fev-21	0	100	Relatório TCE 2021-016
Processo nº 59333.000402/2006-16	TCE Conv. SIAFI nº 338794 (Processo n.º 03055.000056/1997-87), Governo do Estado do Piauí	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	14-set-21	13-mar-22	0-jan-00	14-set-21	12-jun-21	0	100	Relatório TCE 2021-017
Processo nº 59336.000406/2021-86	TCE Conv. SIAFI nº 737121 (Processo n.º 59335.000172/2010-24),GRUPO GESTÃO - PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Heber Nunes (CPTCE)	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	24-fev-21	23-ago-21	0-jan-00	24-fev-21	21-dez-21	0	100	Relatório TCE 2021-018
Processo nº 59335.000049/2010-11	TCE Conv SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	Concluído	Concluído			Em Andamento	Em Andamento	14-dez-21	14-jun-22	0-jan-00	18-ago-21		0	35	Relatório em Elaboração
Processo nº 59335.000187/2010-92	TCE Conv SIAFI nº 317590 (Processo nº 03057.000017/1996-61) - Gov. AL	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído			Em Andamento	Em Andamento	13-dez-21	13-mai-22	0-jan-00	13-dez-21		0	25	Relatório em Elaboração
Processo nº 59335.000050/2010-38	TCE Conv SIAFI nº 384829 (Processo nº 03045.000101/199-01) - Pref. Campina Grande/PB	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	Concluído	Concluído			Em Andamento	Em Andamento	21-fev-22	21-ago-22	0-jan-00	21-fev-22		0	25	Relatório em Elaboração
Processo nº 59335.000062/2010-62	TCE Conv SIAFI nº 407063 (Processo nº 59313.000131/2000-14) - Prefeitura Municipal de Buenos Aires /PE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-jun-22	28-nov-22	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59313.000412/2009-57	TCE Conv SIAFI nº 383780 (Processo nº 03045.000049/1999-84) - Pref. Tianguá/CE) - Prefeitura Municipal de Buenos Aires /PE	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-jun-22	28-nov-22	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
Processo nº 59335.000419/2009-79	TCE Conv SIAFI nº 368683 (Processo nº 03055.000093/1998-96) - Gov. AL	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-jun-22	28-nov-22	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000421/2009-48	TCE Conv SIAFI nº 368442 (Processo nº 03055.000082/1998-78) - Pref. Croatá/CE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-jun-22	28-nov-22	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000426/2009-71	TCE Conv SIAFI nº 348990 (Processo nº 03055.000024/1998-71) - Gov. AL	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-set-22	28-fev-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000710/2010-80	TCE Conv SIAFI nº 384179 (Processo nº 03045.000098/1999-90) - Gov. PI	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-set-22	28-fev-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59333.000071/2005-14	TCE Conv SIAFI nº 407141 (Processo nº 59313.000085/00-53) - CEFET - RN	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-set-22	28-fev-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000040/2012-64	TCE Conv SIAFI nº 337714 (Processo nº 03057.000033/97-06) - CEFET/MA	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-set-22	28-fev-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000091/2011-05	TCE Conv SIAFI nº 406422 (Processo nº 59313.000071/2000-30) - FOCCA - Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-dez-22	30-mai-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000153/2012-60	TCE Conv SIAFI nº 338364 (Processo nº 03054.000042/97-64) - Gov. AL	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-dez-22	30-mai-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000208/2011-50	TCE Conv SIAFI nº 317573 (Processo nº 03057.000018/96-23) - Gov. SE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-dez-22	30-mai-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
Processo nº 59335.000554/2009-14	TCE Conv SIAFI nº 406121 (Processo nº 59313.000076/00-62) - Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mar-23	28-ago-23	0-jan-00			0		Passivo de Convênio da Extinta SUDENE
* Processo nº 59335.000458/2013-52	TCE TComp nº 022/2013, SIAFI nº 677774 (Processo nº 59335.000458/2013-52) - Jacaraú - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		12-jul-17	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000388/2013-32	TCE TComp nº 084/2013, SIAFI nº 677858 (Processo nº 59335.000388/2013-32) - Salgadinho - PE	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		3-set-18	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000424/2013-68	TCE TComp nº 041/2013, SIAFI nº 677759 (Processo nº 59335.000424/2013-68) - Píripituba - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		2-ago-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000416/2013-11	TCE TComp nº 138/2013, SIAFI nº 677780 (Processo nº 59335.000416/2013-11) - São João da Varjota - PI	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		4-out-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000459/2013-05	TCE TComp nº 017/2013, SIAFI nº 677765 (Processo nº 59335.000459/2013-05) - Imaculada - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		29-out-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000382/2013-65	TCE TComp nº 004/2013, SIAFI nº 677790 (Processo nº 59335.000382/2013-65) - Aracagi - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		4-nov-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000442/2013-40	TCE TComp nº 027/2013, SIAFI nº 677744 (Processo nº 59335.000442/2013-40) - Marcação - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		4-nov-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000470/2013-67	TCE TComp nº 117/2013, SIAFI nº 677775 (Processo nº 59335.000470/2013-67) - Itainópolis - PI	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		5-nov-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000457/2013-16	TCE TComp nº 021/2013, SIAFI nº 677807 (Processo nº 59335.000457/2013-16) - Itatuba - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		12-nov-19	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000398/2013-78	TCE TComp nº 053/2013, SIAFI nº 677767 (Processo nº 59335.000398/2013-78) - Calçado - PE	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		8-jan-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000423/2013-13	TCE TComp nº 040/2013, SIAFI nº 677815 (Processo nº 59335.000423/2013-13) - Pilõesinhos - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		16-jan-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000393/2013-45	TCE TComp nº 144/2013, SIAFI nº 677840 (Processo nº 59335.000393/2013-45) - Tanque do Piauí - PI	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		9-set-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000601/2013-14	TCE TComp nº 153/2013, SIAFI nº 677763 (Processo nº 59335.000601/2013-14) - Nazarezinho - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		23-set-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000396/2013-89	TCE TComp nº 060/2013, SIAFI nº 677755 (Processo nº 59335.000396/2013-89) - Vertente do Lério - PE	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		5-nov-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000400/2013-17	TCE TComp nº 057/2013, SIAFI nº 677779 (Processo nº 59335.000400/2013-17) - Jucati - PE	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		5-nov-20	0	100	Concluído por devolução de recursos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
* Processo nº 59335.000407/2013-21	TCE TComp nº 047/2013, SIAFI nº 677786 (Processo nº 59335.000407/2013-21) - São José de Caiana - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		11-nov-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000563/2013-91	TCE TComp nº 151/2013, SIAFI nº 677813 (Processo nº 59335.000563/2013-91) - Solânea - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		13-nov-20	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000476/2013-34	TCE TComp nº 110/2013, SIAFI nº 677793 (Processo nº 59335.000476/2013-34) - Dom Expedito Lopes - PI	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		8-jan-21	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000460/2013-21	TCE TComp nº 016/2013, SIAFI nº 677742 (Processo nº 59335.000460/2013-21) - Guarabira - PB	Equipe do PAPT	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído			0-jan-00		18-fev-22	0	100	Concluído por devolução de recursos
* Processo nº 59335.000380/2013-76	TCE TComp nº 002/2013, SIAFI nº 677747 (Processo nº 59335.000380/2013-76) - Alagoinha - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000384/2013-54	TCE TComp nº 001/2013, SIAFI nº 677859 (Processo nº 59335.000384/2013-54) - Alagoa Nova - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000428/2013-46	TCE TComp nº 034/2013, SIAFI nº 677828 (Processo nº 59335.000428/2013-46) - Olivedos - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000438/2013-81	TCE TComp nº 033/2013, SIAFI nº 677838 (Processo nº 59335.000438/2013-81) - Nova Palmeira - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000439/2013-26	TCE TComp nº 025/2013, SIAFI nº 677844 (Processo nº 59335.000439/2013-26) - Juripiranga - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000452/2013-85	TCE TComp nº 018/2013, SIAFI nº 677764 (Processo nº 59335.000452/2013-85) - Itabaiana - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000474/2013-45	TCE TComp nº 008/2013, SIAFI nº 677772 (Processo nº 59335.000474/2013-45) - Boa Vista - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000480/2013-01	TCE TComp nº 007/2013, SIAFI nº 677738 (Processo nº 59335.000480/2013-01) - Assunção - PB	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000486/2013-70	TCE TComp nº 104/2013, SIAFI nº 677797 (Processo nº 59335.000486/2013-70) - Bocaína - PI	Equipe do PAPT						Cancelado			0-jan-00			0		Beneficiário não quis continuar (desistência). Não houve liberação de recursos
* Processo nº 59335.000379/2013-41	TCE TComp nº 005/2013, SIAFI nº 677788 (Processo nº 59335.000379/2013-41) - Areia - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000381/2013-11	TCE TComp nº 003/2013, SIAFI nº 677832 (Processo nº 59335.000381/2013-11) - Alcantil - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000385/2013-07	TCE TComp nº 139/2013, SIAFI nº 677574 (Processo nº 59335.000385/2013-07) - São José do Peixe - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000386/2013-43	TCE TComp nº 037/2013, SIAFI nº 677563 (Processo nº 59335.000386/2013-43) - Picuí - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000387/2013-98	TCE TComp nº 099/2013, SIAFI nº 677801 (Processo nº 59335.000387/2013-98) - Alagoinha do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000389/2013-87	TCE TComp nº 148/2013, SIAFI nº 677746 (Processo nº 59335.000389/2013-87) - Vília Nova do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000390/2013-10	TCE TComp nº 147/2013, SIAFI nº 677823 (Processo nº 59335.000390/2013-10) - Vera Mendes - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000391/2013-56	TCE TComp nº 146/2013, SIAFI nº 677860 (Processo nº 59335.000391/2013-56) - Várzea Grande - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000392/2013-09	TCE TComp nº 145/2013, SIAFI nº 677839 (Processo nº 59335.000392/2013-09) - Valença do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000394/2013-90	TCE TComp nº 143/2013, SIAFI nº 677736 (Processo nº 59335.000394/2013-90) - Simplicio Mendes - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000395/2013-34	TCE TComp nº 142/2013, SIAFI nº 677818 (Processo nº 59335.000395/2013-34) - Simões - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)
* Processo nº 59335.000397/2013-23	TCE TComp nº 059/2013, SIAFI nº 677768 (Processo nº 59335.000397/2013-23) - Santa Maria do Cambucá - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO Á REVISÃO)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
* Processo nº 59335.000399/2013-12	TCE TComp nº 058/2013, SIAFI nº 677855 (Processo nº 59335.000399/2013-12) - Orobó - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000401/2013-53	TCE TComp nº 052/2013, SIAFI nº 677796 (Processo nº 59335.000401/2013-53) - Brejão - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000402/2013-06	TCE TComp nº 054/2013, SIAFI nº 677787 (Processo nº 59335.000402/2013-06) - Capoeiras - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000403/2013-42	TCE TComp nº 055/2013, SIAFI nº 677760 (Processo nº 59335.000403/2013-42) - Casinhas - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000404/2013-97	TCE TComp nº 056/2013, SIAFI nº 677773 (Processo nº 59335.000404/2013-97) - Frei Miguelinho - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000405/2013-31	TCE TComp nº 045/2013, SIAFI nº 677783 (Processo nº 59335.000405/2013-31) - Santa Terezinha - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000408/2013-75	TCE TComp nº 048/2013, SIAFI nº 677791 (Processo nº 59335.000408/2013-75) - São José do Sabugi - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000409/2013-10	TCE TComp nº 049/2013, SIAFI nº 677822 (Processo nº 59335.000409/2013-10) - São José dos Ramos - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-23		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000410/2013-44	TCE TComp nº 050/2013, SIAFI nº 677824 (Processo nº 59335.000410/2013-44) - Sapé - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000411/2013-99	TCE TComp nº 051/2013, SIAFI nº 677843 (Processo nº 59335.000411/2013-99) - Bom Jardim - PE	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000412/2013-33	TCE TComp nº 134/2013, SIAFI nº 677825 (Processo nº 59335.000412/2013-33) - Santo Inácio do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000413/2013-88	TCE TComp nº 135/2013, SIAFI nº 677734 (Processo nº 59335.000413/2013-88) - São Felix do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000414/2013-22	TCE TComp nº 136/2013, SIAFI nº 677792 (Processo nº 59335.000414/2013-22) - São Francisco do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000415/2013-77	TCE TComp nº 137/2013, SIAFI nº 677789 (Processo nº 59335.000415/2013-77) - São João da Canabrava - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000417/2013-66	TCE TComp nº 140/2013, SIAFI nº 677737 (Processo nº 59335.000417/2013-66) - São Luís do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000418/2013-19	TCE TComp nº 141/2013, SIAFI nº 677741 (Processo nº 59335.000418/2013-19) - São Miguel do Fidalgo - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000419/2013-55	TCE TComp nº 124/2013, SIAFI nº 677830 (Processo nº 59335.000419/2013-55) - Paquetá - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000420/2013-80	TCE TComp nº 125/2013, SIAFI nº 677831 (Processo nº 59335.000420/2013-80) - Patos do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000421/2013-24	TCE TComp nº 126/2013, SIAFI nº 677856 (Processo nº 59335.000421/2013-24) - Pimenteiras - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000422/2013-79	TCE TComp nº 127/2013, SIAFI nº 677805 (Processo nº 59335.000422/2013-79) - Pio IX - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000425/2013-11	TCE TComp nº 042/2013, SIAFI nº 677851 (Processo nº 59335.000425/2013-11) - Princesa Isabel - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000426/2013-57	TCE TComp nº 043/2013, SIAFI nº 677809 (Processo nº 59335.000426/2013-57) - Queimadas - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000427/2013-00	TCE TComp nº 044/2013, SIAFI nº 677753 (Processo nº 59335.000427/2013-00) - Rio Tinto - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000429/2013-91	TCE TComp nº 035/2013, SIAFI nº 677817 (Processo nº 59335.000429/2013-91) - Pedra Lavrada - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000430/2013-15	TCE TComp nº 036/2013, SIAFI nº 677794 (Processo nº 59335.000430/2013-15) - Pedro Régis - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
* Processo nº 59335.000431/2013-60	TCE TComp nº 038/2013, SIAFI nº 677795 (Processo nº 59335.000431/2013-60) - Pilar - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000432/2013-12	TCE TComp nº 128/2013, SIAFI nº 677811 (Processo nº 59335.000432/2013-12) - Prata do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000433/2013-59	TCE TComp nº 039/2013, SIAFI nº 677812 (Processo nº 59335.000433/2013-59) - Pilões - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-24		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000434/2013-01	TCE TComp nº 030/2013, SIAFI nº 677816 (Processo nº 59335.000434/2013-01) - Matinhas - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000435/2013-48	TCE TComp nº 129/2013, SIAFI nº 677735 (Processo nº 59335.000435/2013-48) - Ribeira do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000436/2013-92	TCE TComp nº 031/2013, SIAFI nº 677770 (Processo nº 59335.000436/2013-92) - Mogeiro - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000437/2013-37	TCE TComp nº 032/2013, SIAFI nº 677837 (Processo nº 59335.000437/2013-37) - Monteiro - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000440/2013-51	TCE TComp nº 026/2013, SIAFI nº 677739 (Processo nº 59335.000440/2013-51) - Lagoa de Dentro - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000441/2013-03	TCE TComp nº 130/2013, SIAFI nº 677826 (Processo nº 59335.000441/2013-03) - Rio Grande do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000443/2013-94	TCE TComp nº 131/2013, SIAFI nº 677841 (Processo nº 59335.000443/2013-94) - Santa Rosa do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000445/2013-83	TCE TComp nº 029/2013, SIAFI nº 677806 (Processo nº 59335.000445/2013-83) - Mataraca - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000448/2013-17	TCE TComp nº 132/2013, SIAFI nº 677820 (Processo nº 59335.000448/2013-17) - Santana do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000449/2013-61	TCE TComp nº 133/2013, SIAFI nº 677847 (Processo nº 59335.000449/2013-61) - Santo Antônio de Lisboa - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000450/2013-96	TCE TComp nº 122/2013, SIAFI nº 677842 (Processo nº 59335.000450/2013-96) - Novo Oriente do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000451/2013-31	TCE TComp nº 123/2013, SIAFI nº 677821 (Processo nº 59335.000451/2013-31) - Padre Marcos - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000453/2013-20	TCE TComp nº 120/2013, SIAFI nº 677827 (Processo nº 59335.000453/2013-20) - Massapê do Piauí-PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000454/2013-74	TCE TComp nº 019/2013, SIAFI nº 677810 (Processo nº 59335.000454/2013-74) - Itaporanga - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000455/2013-19	TCE TComp nº 121/2013, SIAFI nº 677854 (Processo nº 59335.000455/2013-19) - Monsenhor Hipólito - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000456/2013-63	TCE TComp nº 020/2013, SIAFI nº 677743 (Processo nº 59335.000456/2013-63) - Itapororoca - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000461/2013-76	TCE TComp nº 015/2013, SIAFI nº 677834 (Processo nº 59335.000461/2013-76) - Frei Martinho - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000462/2013-11	TCE TComp nº 113/2013, SIAFI nº 677752 (Processo nº 59335.000462/2013-11) - Francisco Macedo - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000463/2013-65	TCE TComp nº 114/2013, SIAFI nº 677776 (Processo nº 59335.000463/2013-65) - Francisco Santos - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000464/2013-18	TCE TComp nº 115/2013, SIAFI nº 677857 (Processo nº 59335.000464/2013-18) - Ipiranga do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-25		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000465/2013-54	TCE TComp nº 009/2013, SIAFI nº 677804 (Processo nº 59335.000465/2013-54) - Borborema - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000466/2013-07	TCE TComp nº 010/2013, SIAFI nº 677808 (Processo nº 59335.000466/2013-07) - Cacimba de Dentro - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Pré Análise dos Autos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Renotificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas
* Processo nº 59335.000467/2013-43	TCE TComp nº 116/2013, SIAFI nº 677803 (Processo nº 59335.000467/2013-43) - Isaías Coelho - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000468/2013-98	TCE TComp nº 011/2013, SIAFI nº 677782 (Processo nº 59335.000468/2013-98) - Cubati - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000469/2013-32	TCE TComp nº 012/2013, SIAFI nº 677784 (Processo nº 59335.000469/2013-32) - Capim - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000471/2013-10	TCE TComp nº 013/2013, SIAFI nº 677756 (Processo nº 59335.000471/2013-10) - Curral Velho - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000472/2013-56	TCE TComp nº 014/2013, SIAFI nº 677845 (Processo nº 59335.000472/2013-56) - Cuitegi - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000473/2013-09	TCE TComp nº 118/2013, SIAFI nº 677819 (Processo nº 59335.000473/2013-09) - Jaicós - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000475/2013-90	TCE TComp nº 119/2013, SIAFI nº 677836 (Processo nº 59335.000475/2013-90) - Lagoa do Sítio - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000477/2013-89	TCE TComp nº 111/2013, SIAFI nº 677777 (Processo nº 59335.000477/2013-89) - Floresta do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-mai-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000478/2013-23	TCE TComp nº 006/2013, SIAFI nº 677848 (Processo nº 59335.000478/2013-23) - Areial - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000479/2013-78	TCE TComp nº 101/2013, SIAFI nº 677798 (Processo nº 59335.000479/2013-78) - Aroazes - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000481/2013-47	TCE TComp nº 109/2013, SIAFI nº 677749 (Processo nº 59335.000481/2013-47) - Caridade do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000482/2013-91	TCE TComp nº 112/2013, SIAFI nº 677751 (Processo nº 59335.000482/2013-91) - Francinópolis - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000483/2013-36	TCE TComp nº 100/2013, SIAFI nº 677829 (Processo nº 59335.000483/2013-36) - Alegrete - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000484/2013-81	TCE TComp nº 102/2013, SIAFI nº 677799 (Processo nº 59335.000484/2013-81) - Aroeiras do Itaim - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000485/2013-25	TCE TComp nº 103/2013, SIAFI nº 677745 (Processo nº 59335.000485/2013-25) - Belém do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000488/2013-69	TCE TComp nº 106/2013, SIAFI nº 677740 (Processo nº 59335.000488/2013-69) - Caldeirão Grande - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000489/2013-11	TCE TComp nº 107/2013, SIAFI nº 677769 (Processo nº 59335.000489/2013-11) - Campinas do Piauí - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000490/2013-38	TCE TComp nº 108/2013, SIAFI nº 677761 (Processo nº 59335.000490/2013-38) - Campo Alegre do Fidalgo - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-nov-26		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000514/2013-59	TCE TComp nº 149/2013, SIAFI nº 677778 (Processo nº 59335.000514/2013-59) - João Costa - PI	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-27		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000561/2013-01	TCE TComp nº 152/2013, SIAFI nº 677849 (Processo nº 59335.000561/2013-01) - Sertãozinho - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-27		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
* Processo nº 59335.000562/2013-47	TCE TComp nº 150/2013, SIAFI nº 677758 (Processo nº 59335.000562/2013-47) - Sossego - PB	A definir	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	1-fev-27		0-jan-00			0		As datas de início são mera estimativa, dado que pelo atual contingente de servidores não é possível atender na data aprazada (SUJEITO À REVISÃO)
									De 2019-04-03 até 2027-02-01	De 2019-09-30 até 2023-08-28		De 2019-04-03 até 2022-02-21	De 2019-07-12 até 2022-02-21	0	94,625	

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CGTI2022001 Adobe

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI/VASCOM	Concluído				27-dez-21	31-jan-22				
Contratar solução de software Adobe	Fazer	CGTI/VASCOM	Concluído			10.000,00	31-jan-22	14-mar-22	10.000,00			
Resumo Projeto			Concluído									
						10.000,00	De 2021-12-27 até 2022-01-31	De 2022-01-31 até 2022-03-14	10.000,00	#DIV/0!		

CGTI2022002 SIGMapas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI/VCGE	Concluído				27-dez-21	7-jan-22				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado	Planejar	CGTI/VCGE	Concluído				7-jan-22	21-jan-22				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI/VCGE	Concluído				21-jan-22	11-fev-22				
Criar protótipo (validar alternativa)	Fazer	CGTI/VCGE	Concluído				21-jan-22	11-mar-22				
Contratar a solução escolhida	Fazer	CGTI/VCGE	Concluído		25-mar-22	49.073,84	31-jan-22	16-mar-22	49.073,84			
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI/VCGE	Em Andamento	21-mar-22	8-abr-22		19-mar-22					
Incluir Mapas	Fazer	CGTI/VCGE	Concluído		1-abr-22		11-mar-22	28-mar-22				
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Monitorar	CGTI/VCGE	Em Andamento	1-abr-22	15-abr-22		28-mar-22					
Realizar as melhorias (a ser definido)	Melhorar	CGTI/VCGE	Em Andamento	1-abr-22	15-abr-22		28-mar-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-21 até 2022-04-01	De 2022-03-25 até 2022-04-15	49.073,84	De 2021-12-27 até 2022-03-28	De 2022-01-07 até 2022-03-28	49.073,84	#DIV/0!		

CGTI2022003 Agenda Compartilhada

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI	Concluído				22-nov-21	26-nov-21				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado	Planejar	CGTI	Concluído				22-nov-21	26-nov-21				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI	Concluído				22-nov-21	26-nov-21				
Criar protótipo (validar alternativa)	Fazer	CGTI	Concluído				22-nov-21	17-dez-21				
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI	Concluído				29-nov-21	17-dez-21				
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Monitorar	CGTI	Concluído				17-dez-21	21-jan-22				
Realizar as melhorias	Melhorar	CGTI	Em Andamento		30-abr-22	5.000,00	21-jan-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
					2022-04-30	5.000,00	De 2021-11-22 até 2022-01-21	De 2021-11-26 até 2022-01-21	-	#DIV/0!		

CGTI2022004 Videoconferência

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI	Concluído				27-dez-21	31-dez-21				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado (hardware + software)	Planejar	CGTI	Concluído				3-jan-22	18-fev-22				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI	Concluído				18-fev-22	4-mar-22				
Contratar solução de software (Zoom)	Fazer	CGTI	Em Andamento		1-abr-22	35.000,00	4-mar-22					
Contratar solução de hardware (Câmera + Microfone)	Fazer	CGTI	Em Andamento		8-abr-22	15.000,00	11-mar-22					
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI	A Iniciar	1-abr-22	15-abr-22							
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Melhorar	CGTI	A Iniciar	15-abr-22	30-abr-22							
Realizar as melhorias	Melhorar	CGTI	A Iniciar	15-abr-22	30-abr-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-04-01 até 2022-04-15	De 2022-04-01 até 2022-04-30	50.000,00	De 2021-12-27 até 2022-03-11	De 2021-12-31 até 2022-03-04	-	#DIV/0!		

CGGP2022005 - Balcão de Talentos

7 de 82

				De 2022-02-14 até 2022-04-11	De 2022-02-17 até 2023-02-11	45.000,00	De 2022-02-14 até 2022-03-22	De 2022-02-17 até 2022-03-17	-	100			
CGGP2022003 - Coral													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	15-fev-22	2-mar-22	-	15-fev-22	2-mar-22	-	100			
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	encaminhamento processo para apreciação daDiretoria de Administração	CGGP/DIDAS	Concluído	2-mar-22	2-mar-22	-	2-mar-22	2-mar-22	-	100			
Encaminhamos a DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DIDAS	Concluído	23-mar-22	23-mar-22	-	23-mar-22	23-mar-22	-	100			
Análise DAD	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	DAD	Concluído	25-mar-22	25-mar-22	-	25-mar-22	25-mar-22	-	100			
Análise da Autoridade Máxima	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	GAB	Em Andamento	25-mar-22	6-abr-22	-	25-mar-22		-	50			
Encaminhamento de Processo a CGAF	Providências CGAF quanto à contratação	CGGP/DIDAS	A Iniciar	7-abr-22	7-abr-22	-							
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	A Iniciar	7-abr-22	20-abr-22	-							
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	A Iniciar	6-abr-22	20-abr-22	-							
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	A Iniciar	4-mai-22	28-fev-23	14.500,00							
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-02-15 até 2022-05-04	De 2022-03-02 até 2023-02-28	14.500,00	De 2022-02-15 até 2022-03-25	De 2022-03-02 até 2022-03-25	-	90			
CGGP2022002 - Psicoterapia													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
E-mail solicitando abertura de Processo para contratação de Psicólogo	Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de Processo	CGGP/DIDAS	Concluído	24-mar-22	24-mar-22	-	24-mar-22	24-mar-22	-	100			
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado.	CGGP/DIDAS	Concluído	15-fev-22	22-fev-22	-	15-fev-22	22-fev-22	-	100			
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	24-mar-22	28-mar-22	-	24-mar-22	28-mar-22	-	100			
Encaminhamos a DAD	Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação da DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	28-mar-22	29-mar-22	-	30-mar-22	30-mar-22	-	100			
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	29-mar-22	31-mar-22	-	30-mar-22	30-mar-22	-	100			
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	A Iniciar	1-abr-22	6-abr-22	-							
Elaboração de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima.	CGGP/DIDAS	A Iniciar	8-abr-22	12-abr-22	-							
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	A Iniciar	7-abr-22	7-abr-22	-							
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	A Iniciar	7-abr-22	19-abr-22	-							
Divulgação dos dias e horários do atendimento.	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	A Iniciar	4-nov-22	22-abr-22	-							
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	A Iniciar	26-abr-22	30-abr-23	21.600,00							
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-02-15 até 2022-11-04	De 2022-02-22 até 2023-04-30	21.600,00	De 2022-02-15 até 2022-03-30	De 2022-02-22 até 2022-03-30	-	100			
CGGP2022001 - PDP 2022													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Levantamento de necessidades de desenvolvimento	Unidades Administrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores)	Concluído	6-set-21	23-set-21	-	6-set-21	23-set-21	-	100	Datas conforme execução		
Elaboração do PDP	Consolidação das necessidades e lançamentos no Portal SIPEC	CGGP	Concluído	24-set-21	29-set-21	-	24-set-21	29-set-21	-	100	Datas conforme execução		
Aprovação e envio do PDP	Aprovação e envio do PDP ao órgão central do SIPEC pela autoridade máxima do órgão	Superintendência	Concluído	29-set-21	30-set-21	-	29-set-21	30-set-21	-	100	Datas conforme execução		
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	30-set-21	30-nov-21	-	30-set-21	30-nov-21	-	100	Datas conforme execução		
Acolhimento da Manisfestação Técnica	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	17-fev-22	17-fev-22	-	17-fev-22	17-fev-22	-	100	Datas conforme execução		
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Em Andamento	2-jan-22	31-dez-22	200.000,00	2-jan-22		3.540,00	3	Valor Previsto: apenas previsão de custos com inscrições. Não estão sendo considerados gastos de diárias e passagens (Orientação do Órgão Central no preenchimento do PDP no Portal SIPEC).		
Primeiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/03/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 06/04/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	18-fev-22	6-abr-22	-			-	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO - NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO NO PERÍODO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/03/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 06/04/2022		
Segundo Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/06/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 07/07/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	7-abr-22	7-jul-22	-					PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/06/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 07/07/2022		
Terceiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 08/09/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 10/10/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	8-jul-22	10-out-22	-					PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 08/09/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 10/10/2022		

Quarto Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/12/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 19/12/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	11-out-22	19-dez-22	-						PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/12/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 19/12/2022	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	2-jan-23	31-jan-23	-							
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2021-09-06 até 2023-01-02	De 2021-09-23 até 2023-01-31	200.000,00	De 2021-09-06 até 2022-02-17	De 2021-09-23 até 2022-02-17	3.540,00	86,14285714			
CGGP 2021001													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	A Iniciar	1-abr-22	31-mai-22						Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força		
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	1-jun-22	30-set-22						Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto		
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso publico de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22						0 Necessidade de capacitação da equipe do projeto		
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	A Iniciar	1-jan-23	30-jun-23						0 Necessidade de capacitação da equipe do projeto		
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	1-jul-23	31-dez-23						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto		
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	1-jan-24	30-abr-24						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto		
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	1-mai-24	31-dez-24						0 Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada		
Resumo Projeto				De 2022-04-01 até 2024-05-01	De 2022-05-31 até 2024-12-31	-			-	0			
CGGP2018001 Força de Trabalho													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	Concluído	1-mar-18	31-dez-18		1-mar-18	17-ago-18		100			
Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	30-jul-18	28-fev-19		30-jul-18	17-mai-19		100	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.		
Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios quatitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	Concluído	1-mar-19	31-ago-19		19-jul-18	31-ago-19		100	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas. Não estando previstos outros gastos com este PO.		
Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos qualitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP	Concluído	1-mar-19	31-ago-21		5-abr-20	31-ago-21		100	Realização de reuniões técnicas da CGGP no período para definição de dados e deliberação do estudo técnico.		
Apresentação do Resultado	Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de TrabalhoO Relatório do Dimensionamento da Força de Trabalho para recomposição do Quadro de Pessoal Permanente da Sudene foi concluído no início de Fevereiro porem necessita ser revisado e apresentado a Diretoria Colegiada para aprovação a Diretoria ao à Diretoria Colegiada para aprovação	CGGP	Em Andamento	1-set-21	30-abr-22		1-set-21			90	O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos. Na etapa 5 (Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação), tendo em vista que a consolidação das respostas/informações das unidades administrativas, colacionadas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05, o documento técnico exigiu grande esforço e tempo da equipe envolvida, 2 servidores. O Relatório com o Resultado do Documento Técnico foi concluído em 31/12/2021, porém os 10% estão atribuídos a apresentação do mesmo à validação da Diretoria Colegiada.	Enviado OFÍCIO Nº 1812/2021/CGGP/DAD/SUDENE, DE 03 de setembro de 2021 aos Gestores da Unidade da Sudene, com a finalidade de atualização do Lotacionograma para compor o Planejamento das Ações do Dimensionamento da Força de Trabalho da Sudene, com a juntada das respostas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05. Considerando a transição de Titularidade da Superintendência, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022. Trabalho Concluso aguardando apresentação do resultado e do plano de ação ao Superintendente, para posterior apresentação e deliberação final da Diretoria Colegiada, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022.	
Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	Em Andamento	1-nov-21	30-abr-22		1-nov-21			50	O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos. A Etapa 6 - Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho foi iniciado em 01/12/2021, e está com 50% do trabalho em andamento, não sendo ainda finalizado para apresentação, cuja proposta é o mesmo ser apresentado junto com o Relatório do Documento Técnico para apreciação da Diretoria Colegiada validar. Os 50% posteriores seriam a apresentação aos Gestores do Resultado do Documento Técnico e do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho.	Considerando a transição de Titularidade da Superintendência, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022. Trabalho Concluso aguardando apresentação do resultado e do plano de ação ao Superintendente, para posterior apresentação e deliberação final da Diretoria Colegiada, para apresentação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho aos Gestores	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2018-03-01 até 2021-11-01	De 2018-12-31 até 2022-04-30	-	De 2018-03-01 até 2021-11-01	De 2018-08-17 até 2021-08-31	-	90			

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CGAF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11-mar-22	15-mar-22	-	2022-03-11	2022-03-14				'.
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15-mar-22	18-mar-22	-	14-mar-22	16-mar-22				
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Em Andamento	14-mar-22	1-abr-22	-	14-mar-22					'.
Consolidação das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Competente.	COLIC	A Iniciar	1-abr-22	30-abr-22	-						'.
Aprovação do PCA 1ª Revisão e Alteração do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas..	Superintendência	A Iniciar	1-mai-22	14-mai-22	-						'.
	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	A Iniciar	15-set-22	15-nov-22	-						'.
	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento	Áreas Requisitantes	A Iniciar	1-jan-23	30-abr-23	-					Depende da data de sanção da LOA 2023	'.
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-11 até 2023-01-01	De 2022-03-15 até 2023-04-30	-	De 2022-03-11 até 2022-03-14	De 2022-03-14 até 2022-03-16	-	#DIV/0!		

CGAF 2022008 - Reforma das Instalações da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Execução do 10º e 11º andares	Adequação de toda infraestrutura e instalações dos pavimentos para o novo leiaute	Comissão de Fiscalização da Reforma	Concluído	21-fev-22	18-mar-22	77.771,69	21-fev-22	21-mar-22	77.022,21	99	'.	'.
Execução do 7º e 9º andares	Adequação de toda infraestrutura e instalações dos pavimentos para o novo leiaute	Comissão de Fiscalização da Reforma	Em Andamento	21-mar-22	8-abr-22	77.771,69	21-mar-22			0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-02-21 até 2022-03-21	De 2022-03-18 até 2022-04-08	155.543,38	De 2022-02-21 até 2022-03-21	2022-03-21	77.022,21	49,5		

CGAF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25-set-20	28-set-20	-	25-set-20	28-set-20	-	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	1-fev-20	3-fev-20	-	1-fev-20	3-fev-20	-	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empenho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	1-mar-21	31-mar-21	-	1-mar-21	31-mar-21	-	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19-abr-21	31-mar-23	40.999,99	19-abr-21	26-ago-21	40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	334,00	19-abr-21		57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	2.385,00	1-ago-21		637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	56.880,20	1-ago-21		35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	4.676,00	1-ago-21		28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	3.339,00	1-ago-21		892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Em Andamento	18-jan-22	18-mai-22	-	18-jan-22				Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2023-03-31	108.614,19	De 2020-02-01 até 2022-01-18	De 2020-02-03 até 2021-08-26	78.366,74	59,34222222		

CGAF 2022006 - Restos a Pagar (RP)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação as áreas acerca dos Restos a Pagar passíveis de cancelamento	Orientação sobre os Restos a Pagar com possibilidade de cancelamento no exercício	COCF	A Iniciar	1-abr-22	31-mai-22	-						
Verificação do Bloqueio das notas de empenho do ano de 2020	O sistema SIAFI fará o bloqueio automaticamente dos empenhos do exercício de 2020. A COCF irá realizar a devida verificação.	COCF	A Iniciar	30-jun-22	1-jul-22	-					Bloqueio por processo automático.	
Desbloqueio das notas de empenhos do exercício de 2020	A COCF mediante solicitação e justificativa da área e demais responsáveis fará o desbloqueio via sistema SIAFI. Os que não forem solicitados serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jul-22	31-dez-22	-						
Acompanhamento dos restos a pagar a liquidar do exercício de 2019. Os que não forem solicitados, pela área e demais reponsáveis, liquidação e/ou pagamento/liberação serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.		COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	3-jan-22	31-dez-22	-	3-jan-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-01-03 até 2022-07-01	De 2022-05-31 até 2022-12-31	-	2022-01-03		-	#DIV/0!		

CGAF 2022005 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Abril	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	7-mar-22	5-abr-22		7-mar-22					
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Maio	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-abr-22	5-mai-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Junho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-mai-22	3-jun-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Julho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-jun-22	5-jul-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Agosto	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-jul-22	5-ago-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Setembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-ago-22	5-set-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Outubro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-set-22	5-out-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Novembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-out-22	4-nov-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Dezembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	7-nov-22	5-dez-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-03-07 até 2022-11-07	De 2022-04-05 até 2022-12-05	-	2022-03-07		-	#DIV/0!		

CGAF 2022004 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discrionárias)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação para a 12ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	11-mar-22	17-mar-22		11-mar-22	17-mar-22				
Solicitação para a 13ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	18-mar-22	24-mar-22		18-mar-22	24-mar-22				
Solicitação para a 14ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	25-mar-22	31-mar-22		25-mar-22	31-mar-22				
Solicitação para a 15ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-abr-22	7-abr-22							
Solicitação para a 16ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-abr-22	14-abr-22							
Solicitação para a 17ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15-abr-22	21-abr-22							
Solicitação para a 18ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	22-abr-22	28-abr-22							
Solicitação para a 19ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	29-abr-22	5-mai-22							
Solicitação para a 20ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-mai-22	12-mai-22							
Solicitação para a 21ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	13-mai-22	19-mai-22							
Solicitação para a 22ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	20-mai-22	26-mai-22							
Solicitação para a 23ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	27-mai-22	2-jun-22							
Solicitação para a 24ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	3-jun-22	9-jun-22							
Solicitação para a 25ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	10-jun-22	16-jun-22							
Solicitação para a 26ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	17-jun-22	23-jun-22							
Solicitação para a 27ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	24-jun-22	30-jun-22							
Solicitação para a 28ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jul-22	7-jul-22							
Solicitação para a 29ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-jul-22	14-jul-22							
Solicitação para a 30ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15-jul-22	21-jul-22							
Solicitação para a 31ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	22-jul-22	28-jul-22							
Solicitação para a 32ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	29-jul-22	4-ago-22							
Solicitação para a 33ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	5-ago-22	11-ago-22							
Solicitação para a 34ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	12-ago-22	18-ago-22							
Solicitação para a 35ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	19-ago-22	25-ago-22							
Solicitação para a 36ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	26-ago-22	1-set-22							
Solicitação para a 37ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	2-set-22	8-set-22							
Solicitação para a 38ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	9-set-22	15-set-22							
Solicitação para a 39ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-set-22	22-set-22							
Solicitação para a 40ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-set-22	29-set-22							
Solicitação para a 41ª Semana 2022 - Despesas Discrionárias	Levantamento e envio das despesas discrionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	30-set-22	6-out-22							

Solicitação para a 42ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	7-out-22	13-out-22								
Solicitação para a 43ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	14-out-22	20-out-22								
Solicitação para a 44ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	21-out-22	27-out-22								
Solicitação para a 45ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	28-out-22	3-nov-22								
Solicitação para a 46ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	4-nov-22	10-nov-22								
Solicitação para a 47ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	11-nov-22	17-nov-22								
Solicitação para a 48ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	18-nov-22	24-nov-22								
Solicitação para a 49ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	25-nov-22	1-dez-22								
Solicitação para a 50ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	2-dez-22	8-dez-22								
Solicitação para a 51ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	9-dez-22	15-dez-22								
Solicitação para a 52ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-dez-22	22-dez-22								
Solicitação para a 1ª Semana 2023 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-dez-22	29-dez-22								
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2022-03-11 até 2022-12-23	De 2022-03-17 até 2022-12-29		-	De 2022-03-11 até 2022-03-25	De 2022-03-17 até 2022-03-31		-	#DIV/0!	

CGAF 2022003 - Alterações Orçamentárias

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informações às áreas acerca do Calendário	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF	Concluído	1-fev-22	31-mar-22	-	23-fev-22	23-fev-22	-	100		
Primeira Janela Resultado Primário 1 (Despesas Financeiras e Obrigatórias) - Março	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-mar-22	3-mar-22	-	1-mar-22	3-mar-22	-	100		
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Abril	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-abr-22	6-abr-22							
Resultado Primário 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Abril - Portaria RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Maio	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-abr-22	6-abr-22							
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Junho	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-mai-22	4-mai-22							
RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Junho	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jun-22	8-jun-22							
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jun-22	8-jun-22							
RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Setembro (Até 07/09 por Portaria / Até 08/09 por Projeto de Lei)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-set-22	4-set-22							
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-set-22	8-set-22							
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro - Portaria RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Novembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-set-22	27-set-22							
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Dezembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-nov-22	3-nov-22							
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro (somente para as alterações previstas nos incisos I, alíneas "a", "b" e "e", e II do caput do art. 4º da LOA-2022) - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-nov-22	8-out-22							
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	1-dez-22	7-dez-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-02-01 até 2022-12-10	De 2022-03-03 até 2022-12-31		-	De 2022-02-23 até 2022-03-04	De 2022-02-23 até 2022-03-03	-	100	

CGAF 2022002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação do calendário anual da estimativa de receita a áreas responsáveis	Envio para as áreas das datas para reestimativa das receitas 2022	COCF	Concluído	3-jan-22	31-jan-22		14-jan-22	14-jan-22				
Reestimativa das Receitas - Primeiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-fev-22	25-fev-22		15-fev-22	25-fev-22				
Reestimativa das Receitas - Segundo Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	14-abr-22	29-abr-22							
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	24-jun-22	1-jul-22							
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-ago-22	26-ago-22							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	17-out-22	28-out-22							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Em Andamento	3-jan-22	31-dez-22		3-jan-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-01-03 até 2022-10-17	De 2022-01-31 até 2022-12-31	Página 22 de 82	-	De 2022-01-03 até 2022-02-15	De 2022-01-14 até 2022-02-25	-	#DIV/0!	

CGAF 2022001 - Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA) 2023 -
Quantitativo - Receita

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação do calendário anual da estimativa de receita a áreas responsáveis	Envio para as áreas das datas a receita do PLOA 2023	COCF	Concluído	3-jan-22	31-jan-22		14-jan-22	14-jan-22				
Primeira previsão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-mar-22	25-mar-22		15-mar-22	25-mar-22				
Segunda previsão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15-jun-22	23-jun-22							
Revisão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15-jul-22	18-jul-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2022-01-03 até 2022-07-15	De 2022-01-31 até 2022-07-18	-	De 2022-01-14 até 2022-03-15	De 2022-01-14 até 2022-03-25	-	#DIV/0!		
Novo grupo												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTUDOS E PESQUISAS, AVALIAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CGEP20222001 - TED UFV													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	6-nov-21	10-nov-21			9-dez-21	9-dez-21				
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13-nov-21	15-nov-21			10-dez-21	10-dez-21	100			
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	15-nov-21	22-nov-21	199.972,50	10-dez-21	10-dez-21	199.972,50	100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.		
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo.	Relatório contendo a estratégia detalhada para a execução das avaliações do FNE contendo/considerando: - articulação dos diversos fatores materiais e humanos necessários à pesquisa. - revisão da literatura e especificação do referencial teórico e dos modelos analíticos a serem empregado na análise - descrição da estratégia metodológica para cada objetivo de avaliação - reuniões com os técnicos da área de estudos econômicos da Sudene visando um melhor acompanhamento dos produtos acordados.	UFV	Em Andamento	9-dez-21	8-abr-22		9-jan-22			70	Circunstâncias associadas aos trâmites internos da UFV para formalização da gestão dos recursos financeiros do projeto por intermédio da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) impactaram o início dos trabalhos, que se deu efetivamente a partir do início de janeiro de 2022 (SEI 0329219).Ademais, as tratativas com o Banco do Nordeste para disponibilização da base de dados demorou mais do que o previsto, devido à sobrecarga de demandas internas daquele Banco.		
Produto 1: Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	22-abr-22	6-mai-22					0			
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	6-mai-22	14-mai-22					0			
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	14-mai-22	22-mai-22					0			
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo.	Relatório descritivo acerca da construção do banco de dados necessário para a execução do diagnóstico socioeconômico da região, da análise exploratória quanto a aplicação dos recursos do FNE e das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, detalhando as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos iniciais e estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados construído.	UFV	Em Andamento	9-dez-21	22-abr-22		9-jan-22			35	A justificativa do novo cronograma para as entregas dos produtos do TED firmado (SEI 0329219), circunstâncias associadas aos trâmites internos da UFV para formalização da gestão dos recursos financeiros do projeto por intermédio da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) impactaram o início dos trabalhos, que se deu efetivamente a partir do início de janeiro de 2022, conforme foi informado para a gestão da Coordenação de Avaliação e Estudos - COAE, unidade desta Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP da Sudene. Além disso, sobretudo em relação ao não cumprimento do prazo de entrega do Produto 2 - "Relatório de construção de banco de dados", que se trata de um "relatório descritivo acerca da construção do banco de dados necessário para a execução do diagnóstico socioeconômico da região, da análise exploratória quanto a aplicação dos recursos do FNE e das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, detalhando as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos iniciais e estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados construído", que estava previsto para o dia 09/02/2022, o responsável técnico do projeto por parte da UFV, expõe que: i. os dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa não foram disponibilizados pela Sudene; e ii. o acesso da equipe técnica da UFV aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS ainda está sob análise da a Equipe de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério da Fazenda.	Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329088; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desidentificação das informações para compartilhar com a equipe da UFV.	
Produto 2: Relatório de construção de banco de dados	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	22-abr-22	6-mai-22								
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	6-mai-22	14-mai-22								
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	14-mai-22	22-mai-22								
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo.	O Relatório de diagnóstico deverá considerar, entre outros, os aspectos demográficos, econômicos, sociais e ambientais que caracterizam a área de atuação da Sudene, área de intervenção do FNE, no período de 2000 a 2019. Integra ainda o relatório a construção de tabelas, quadros, figuras, gráficos e mapas.	UFV	Em Andamento	2-fev-22	8-abr-22		9-fev-22			65	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-abr-22	23-abr-22								
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-abr-22	1-mai-22								
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-mai-22	8-mai-22								
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	A Iniciar	8-mai-22	15-mai-22	199.972,50					Datas repactuadas: 08/05/2022 a 15/05/2022		
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE	Relatório contendo os modelos a serem utilizados na avaliação da aplicação dos recursos do FNE: Diferenças em Diferenças (Dif-Dif), Propensity Score Matching, Regressão Quantílica, análise de convergência, funções dose-resposta, estimadas pelo Escore de Propensão Generalizado.	UFV	A Iniciar	9-mai-22	8-ago-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ago-22	23-ago-22					0	Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022		
Análise	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ago-22	31-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022		
Ajustes	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	UFV	A Iniciar	31-ago-22	8-set-22					0	Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022		
Aprovação	Relatório contendo a Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE, indicando a forma de estimação dos efeitos dos financiamentos do FNE sobre o emprego e renda, entre outros indicadores que se mostrarem pertinentes, a combinação dos métodos de Diferenças em Diferenças (Dif-Dif) e Propensity Score Matching, além da Regressão Quantílica aplicada a Dados em Painel (efeitos fixos). Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	A Iniciar	9-mai-22	8-jul-22					0	Datas repactuadas: 01/05/2022 a 08/05/2022		
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-jul-22	2-ago-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).		
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	2-ago-22	10-ago-22					0	Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022		
Análise	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	10-ago-22	18-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022		
Ajustes										0	Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022		
Aprovação										0	Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022		

Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE	Relatório da avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE com os modelos de utilizados no estudo. Para tanto, propõem-se de início o uso da Análise envoltória de dados (DEA), considerando dois modelos. O primeiro, é um modelo Global, cujo objetivo é verificar onde e em quais setores ocorre maior eficiência no faturamento das empresas, considerando dois recortes de estudo: municipal e setorial. O segundo modelo, denominado como modelo FNE, o objetivo principal é verificar em quais setores produtivos o FNE é mais eficiente na geração de emprego, renda e faturamento dos beneficiários, nos diversos períodos. Para as duas análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis), o que sugere que será empregado uma abordagem dinâmica DEA.	UFV	A Iniciar	9-mai-22	8-jul-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-jul-22	2-ag-22				0 Datas: 09/05/2022 a 08/07/2022
Análise	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	2-ag-22	10-ag-22				0 Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022
Ajustes	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	10-ag-22	18-jun-22				0 Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022
Aprovação	Relatório contendo os resultados da avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE. Para tanto, sugere-se de início adotar os modelos de Regressão Quantílica e de Dados em Painel. Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	A Iniciar	9-mai-22	8-ag-22				0 Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ag-22	23-ag-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ag-22	31-ag-22				0 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Análise	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	31-ag-22	8-set-22				0 Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022
Ajustes									0 Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022
Aprovação									0 Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE	Relatório da Avaliação do retorno econômico e social do FNE, indicando a metodologia utilizada no estudo. Para tanto, sugere-se de início considerar como estratégia metodológica o uso Matriz de Insumo-Produto e do Modelo de Equilíbrio Geral, com suas versões dinâmicas. Por sua vez, ao estimar os custos com a política e de posse dos resultados da avaliação de efetividade, objetiva-se adotar a Razão Custo-Efetividade para mensuração do retorno da política. Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	A Iniciar	9-mai-22	8-ag-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ag-22	23-ag-22				0 Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022
Análise	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ag-22	31-ag-22				0 Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022
Ajustes	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	31-jul-22	8-set-22				0 Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022
Aprovação									0 Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022
Meta 3: Gestão de conhecimento no uso de metodologia de avaliação de impactos	Documento técnico com a estruturação detalhada da descrição das metodologias de avaliação e das rotinas de programação empregadas no estudo. Integra ainda este produto a realização de oficina(s) e curso(s) sobre as metodologias de avaliação empregados no estudo.	UFV	A Iniciar	9-jul-22	8-set-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.									0 Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022
Realização de Oficina	Realização de oficina por parte da descentralizada com repasse dos conhecimentos e metodologias utilizadas no estudo.	UFV	A Iniciar	8-set-22	16-set-22				0 Datas repactuadas: 08/09/2022 a 16/09/2022
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	16-set-22	24-set-22				0 Datas repactuadas: 16/09/2022 a 24/09/2022
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	24-set-22	1-out-22				0 Datas repactuadas: 24/09/2022 a 01/10/2022
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-out-22	9-out-22				0 Datas repactuadas: 01/10/2022 a 09/10/2022
Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias.	Relatório(s) Final(is) em pdf e em formato editável (Word) consolidando as avaliações quanto à eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico dos financiamentos do FNE.								Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Versão final do banco de dados, das rotinas de programação implementadas em software estatístico, protocolos, vídeos, etc.	UFV	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22				0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22				0 Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22				0 Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22				0 Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022
Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias.	Relatório voltado para gestores que sintetiza os resultados identificados nas análises de diagnóstico e avaliações de eficácia, eficiência, efetividade e do retorno econômico, com destaque também para os desafios identificados e contribuições de melhoria para a política de financiamento do FNE como instrumento de Política de Desenvolvimento Regional do país.	UFV	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22				0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Análise	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22				0 Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022
Ajustes	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22				0 Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022
Aprovação									0 Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022
Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias.	Realização de Workshop. Nesta etapa está prevista a entrega de apresentações por parte da descentralizada no formato editável e não editável.	UFV/CGEP	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22				Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados									0 Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22				Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022. Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22				Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022. Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22				Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022. Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.
Prestação de Contas Final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFV	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22				0 Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	23-nov-22	18-dez-22				0 Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	23-nov-22	18-dez-22				0 Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022
Resumo Projeto			Em Andamento						

Página 25 de 82

						De 2021-11-06 até 2022-12-01	De 2021-11-10 até 2022-12-18	399.945,00	De 2021-12-09 até 2022-02-09	De 2021-12-09 até 2021-12-10	199.972,50	7,708333333		
CGEP 2021004 Estudo Calçados														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início		Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	8-mar-21	8-mar-21		8-mar-21	8-mar-21			100			
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	1-abr-21	30-abr-21		1-abr-21	30-abr-21			100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc).		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16-abr-21	16-mar-21		19-abr-21	19-abr-21			100			
Elaboração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	7-mai-21		3-mai-21	7-mai-21			100			
												Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		14-jun-21	30-jun-21			100	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	30-jun-21			100			
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	1-jul-21	30-jul-21		1-jul-21	30-jul-21			100			
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2-ago-21	13-ago-21		2-ago-21	9-ago-21			100			
												Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data.		
												Apesar do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confeções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP.		
												Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16-ago-21	20-ago-21		9-ago-21	23-ago-21			100	A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.		
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23-ago-21	10-set-21		24-ago-21	16-set-21			100			
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	6-set-21	8-set-21		17-set-21	21-set-21			100			
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	8-set-21	14-set-21		21-set-21	22-set-21			100			
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15-set-21	20-set-21		22-set-21	23-set-21			100			
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27-set-21	29-set-21		1-nov-21	3-nov-21			100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019		
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30-set-21	6-out-21		4-nov-21	4-nov-21			0			
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	19-nov-21			100			
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	5-nov-21			100			
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18-out-21	18-out-21		9-nov-21	9-nov-21			100			
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18-out-21	26-out-21		9-nov-21	10-nov-21			100			
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26-out-21	5-nov-21		10-nov-21	19-nov-21			100			
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	8-nov-21	10-nov-21		19-nov-21	19-nov-21			100			

26 de 82

	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24-nov-21	24-nov-21			24-nov-21	24-nov-21		100	
Reunião Preparatória para o processo licitatório												
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10-dez-21	10-nov-21			13-dez-21	13-dez-21		100	
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	3-dez-21	3-dez-21			3-dez-21	3-dez-21		100	
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14-dez-21	14-dez-21			14-dez-21	14-dez-21		100	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	14-dez-21	15-dez-21			14-dez-21	15-dez-21		100	
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15-dez-21	17-dez-21			15-dez-21	17-dez-21		100	
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25-nov-21	7-jan-22			25-nov-21	7-jan-22		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022
			Atrasado									
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Atrasado	17-jan-22	4-fev-22			17-jan-22			90	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD.
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Atrasado	7-fev-22	7-fev-22						0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Atrasado	7-fev-22	17-fev-22						0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.
			Atrasado									
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Atrasado	18-fev-22	25-fev-22			17-jan-22			90	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD.
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Atrasado	3-mar-22	9-mar-22			17-jan-22			90	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Técnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada.
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Atrasado	10-mar-22	11-mar-22						0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamnets do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Atrasado	11-mar-22	22-mar-22						0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	25-mar-22	25-mar-22						0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	28-mar-22	29-mar-22							
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Atrasado	30-mar-22	31-mar-22						0	
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusign	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	A Iniciar	1-abr-22	11-abr-22						0	
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	A Iniciar	11-abr-22	18-abr-22						0	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.
Elaboração e envio do Produto 1	Detalhamento Metodológico	Contratada	A Iniciar	11-abr-22	11-mai-22						0	
Análise Ajustes	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	12-mai-22	25-mai-22						0	
	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	26-mai-22	6-jun-22						0	
Aprovação do Produto 1	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	7-jun-22	20-jun-22						0	
Elaboração e envio do Produto 2	Identificação dos principais polos regionais do setor de Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	A Iniciar	11-abr-22	31-mai-22						0	
			A Iniciar									
Análise Ajustes	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	1-jun-22	21-jun-22						0	Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 1, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. Desta forma, foi estendido o prazo de análise em relação ao Produto 2.
	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	22-jun-22	1-jul-22						0	
Aprovação do Produto 2	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	4-jul-22	15-jul-22						0	
Elaboração e envio do Produto 3	Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	A Iniciar	11-abr-22	19-ago-22						0	
Análise Ajustes	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	22-ago-22	2-set-22						0	
	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	5-set-22	15-set-22						0	

Aprovação do Produto 3	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	16-set-22	29-set-22						0	
Elaboração e envio do Produto 4	Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	A Iniciar	11-abr-22	28-set-22						0	
Análise Ajustes	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	30-set-22	14-out-22						O início da etapa de análise do Produto 4 coincide com a concidria com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 3, após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi extendido o prazo para a análise do Produto 4.	
		Contratada	A Iniciar	17-out-22	26-out-22							
		Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	27-out-22	11-nov-22							
Aprovação do Produto 4	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Contratada	A Iniciar	11-abr-22	28-out-22						0	
Elaboração e envio do Produto 5	Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene											
Análise Ajustes	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	31-out-22	28-nov-22						0	
		Contratada	A Iniciar	29-nov-22	9-dez-22							
		Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	12-dez-22	23-dez-22							
Aprovação do Produto 5	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto		Atrasado								0	
Resumo Projeto				De 2021-03-08 até 2022-12-12	De 2021-03-08 até 2022-12-23	-	De 2021-03-08 até 2022-01-17	De 2021-03-08 até 2022-01-07	-	50,33898305		
CGEP 2021003 Estudo Têxtil												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23-fev-21	23-fev-21		23-fev-21	23-fev-21		100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confeções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioeconômicas sobre o setor Têxtil/Confeções para a região Nordeste	COAE	Concluído	24-fev-21	9-mar-21		1-mar-21	18-mar-21		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc), além da prospeção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	9-mar-21	9-mar-21		9-mar-21	9-mar-21		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confeções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10-mar-21	10-mar-21		19-mar-21	19-mar-21		100		
Elabororação de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confeções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confeções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15-mar-21	19-mar-21		22-mar-21	26-mar-21		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26-mar-21	26-mar-21		19-abr-21	19-abr-21		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR) Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confeções nos estados da área de atuação da Sudene Elaboração do escopo, objetivos e descrição das principais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		17-mai-21	28-mai-21		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros.	
		COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		17-mai-21	28-mai-21		100		
		COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		17-mai-21	28-mai-21		100		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confeções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	2-jul-21		100	Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confeções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	2-jul-21		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	1-jul-21	7-jul-21		2-jul-21	20-jul-21		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	8-jul-21	12-jul-21		20-jul-21	28-jul-21		100	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	30-jul-21	31-ago-21		30-ago-21	16-set-21		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	1-set-21	7-set-21		17-set-21	22-set-21		100		

											Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07.	
											Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de Confeções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e ao TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21.	
											Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro.	
											Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições.	
											A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 23/09/21, que remeteu ao PNUD na mesma data.	
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	8-set-21	14-set-21			22-set-21	23-set-21	100		
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15-set-21	20-set-21			23-set-21	23-set-21	100		
Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	Concluído	21-set-21	24-set-21			24-set-21	27-out-21	100		
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27-set-21	29-set-21			1-nov-21	3-nov-21	100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30-set-21	6-out-21			4-nov-21	4-nov-21	100		
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21			5-nov-21	19-nov-21	100		
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21			5-nov-21	5-nov-21	100		
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18-out-21	18-out-21			9-nov-21	9-nov-21	100		
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18-out-21	26-out-21			9-nov-21	10-nov-21	100		
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGCI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26-out-21	5-nov-21			10-nov-21	19-nov-21	100		
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	8-nov-21	10-nov-21			19-nov-21	19-nov-21	100		
Reunião Preparatória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confeções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24-nov-21	24-nov-21			24-nov-21	24-nov-21	100		
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	24-nov-21	24-nov-21			24-nov-21	24-nov-21	100		
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	25-nov-21	25-nov-21			25-nov-21	25-nov-21	100		
Audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	10-dez-21	10-dez-21			16-dez-21	16-dez-21	100	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	10-dez-21	15-dez-21			16-dez-21	20-dez-21	100		
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15-dez-21	17-dez-21			20-dez-21	21-dez-21	100		
Recebimento das propostas	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25-nov-21	7-jan-21			25-nov-21	7-jan-22	100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022	
	Recebimento das propostas (técnica e financeira)											
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17-jan-22	4-fev-22			17-jan-22	16-mar-22	100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02/22 para apreciação. Em 04/03 o Pnud compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.	
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	7-fev-22	7-fev-22			25-mar-22	25-mar-22	100	Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.	
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Atrasado	7-fev-22	17-fev-22					0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.	
Análise das Propostas Comerciais - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Atrasado	18-fev-22	25-fev-22					0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.	
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Atrasado	3-mar-22	9-mar-22					0	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência.	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do retorno das operações do FDNE para gestão pelo agente de		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13-mai-20	9-jun-21			13-mai-20	29-jun-21		100	Os encaminhamentos aqui tratadose documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB. Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo de Cooperação Técnica com as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, AL,		GAB/Sudene e GAB/BNB Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP. Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	30-jun-21	30-jun-21			30-jun-21	30-jun-21		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custória Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	2-jun-21	15-out-21			2-jun-21	19-out-21		100		
Articulação com MCTI, FINEP, FAPes para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPes e SEBRAE/RN	Concluído	2-jun-21	15-out-21			2-jun-21	21-out-21		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPes, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRAE/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPes e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Centelha II		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21-out-21	21-out-21			21-out-21	21-out-21		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene. Emilita a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21-out-21	22-out-21			22-out-21	22-out-21		100		
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-AL para fins de padronização junto às demais FAPes e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.0023532021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25-out-21	17-nov-21			22-out-21	12-nov-21		100	Emilito o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 11/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18-nov-21	18-nov-21			12-nov-21	16-nov-21		100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19-nov-21	3-dez-21			16-nov-21	1-dez-21		100	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convenicionado como padrão.	
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPes para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas aas Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	1-dez-21	1-dez-21			1-dez-21	1-dez-21		100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPes para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPes, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPes, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direitos e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene. Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		FAPEAL	Concluído	3-dez-21	3-dez-21			3-dez-21	3-dez-21		100		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14-dez-21	22-dez-21			14-dez-21	22-dez-21		100	Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.	
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22-dez-21	23-dez-21			22-dez-21	23-dez-21		100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos ao Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23-dez-21	31-dez-21			27-dez-21	27-dez-21		100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.
Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23-dez-21	31-dez-21			23-dez-21	28-dez-21		100	Inclue a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE FAPes, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Concluído	31-dez-21	7-jan-22			30-dez-21	30-dez-21		100		
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPes MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPes e SEBRAE/RN	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22			30-dez-21	30-jun-22		34		
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usuário extemo SEI.			Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22			29-dez-21			80	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa	
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPes e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22	Página 31 de 82		30-dez-21			30	Inclue verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	

Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						9				
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						66	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						58	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Atrasado	3-jan-22	30-jun-22						0	Em 08/03/2022 foi encaminhado e-mail com orientações à entidade, porém até esta data, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado não encaminhou minuta para análise.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						54	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						43	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						43	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						77	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						33	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						0	Envolve todas as etapas precedentes.			
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Atrasado	3-jan-22	30-jun-22						0	O SEBRAE/RN foi contatado mas ainda não enviou minuta de 0 ACT.			
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Atrasado	3-jan-22	30-jun-22						0				
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Em Andamento	3-jan-22	30-jun-22						9	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato co ACT e PT celebrado.			
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P,D&I (2022/2024)			Concluído	3-jan-22	30-jun-24						29-mar-22	30-mar-22	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Em 30/12/21 foi enviado cópia do extrato à FAPEAL para publicação também no DOE.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2022, com base em ACTs	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	3-jan-22	30-jun-22						29-mar-22	30-mar-22	100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R\$ 586.674,00, (R\$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R\$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 66.000,00, resultando no total de R\$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R\$ 60.000,00, resultando no total de R\$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R\$ 6.036.066,00
Processo de acompanhamento da execução do ACT			Atrasado	30-mar-22	30-jun-25								0		
Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPEs e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPEs e SEBRAE/RN	Atrasado	30-mar-22	30-jun-25								0		
Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)		Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Atrasado	30-mar-22	30-jun-25								0		
Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)															
Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)		Sudene	Atrasado	30-mar-22	30-jun-25								0		
Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	31-jan-24	30-jun-25								0		
Relatórios finais de execução do ACT			Atrasado												
Resumo Projeto				De 2020-05-13 até 2024-01-31	De 2020-06-12 até 2025-06-30		-	De 2020-05-13 até 2022-03-29	De 2020-06-12 até 2022-06-30		-		66		
CGEP 2020010 TED UFC															

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	4-dez-20	16-dez-20		4-dez-20	16-dez-20		100	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	17-dez-20	22-dez-20		17-dez-20	22-dez-20		100	
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	16-dez-20	23-dez-20		16-dez-20	23-dez-20		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	Concluído	23-dez-20	23-dez-20		23-dez-20	23-dez-20		100	
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	23-dez-20	28-dez-20		23-dez-20	28-dez-20		100	
		CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE									
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única		Concluído	31-dez-20	31-dez-20	480.600,00	28-dez-20	28-dez-20	480.600,00	100	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	Concluído	1-jan-21	30-abr-21		1-jan-21	29-abr-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021.
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	18-out-21	29-out-21		6-out-21	19-out-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	30-out-21	14-nov-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 29/10/2021 Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021.
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	15-nov-21	29-nov-21		3-mar-22	9-mar-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 (0332400), no dia 09/03/2022.
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobre o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.	UFC	Concluído	1-jan-21	30-mai-21		1-jan-21	29-abr-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação cerca de um mês antes do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	4-out-21	15-out-21		15-out-21	29-out-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	16-out-21	31-out-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/10/2021 Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021.
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	1-nov-21	15-nov-21		14-fev-22	18-fev-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 (0332400), no dia 09/03/2022.
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	UFC	Concluído	1-jan-21	31-mai-21		1-jan-21	31-mai-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	1-nov-21	12-nov-21		1-nov-21	12-nov-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 12/11/2021

Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	13-nov-21	28-nov-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme acordado com a COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 3 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	29-nov-21	13-dez-21		28-out-21			90	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 09/03/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão prioritização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. Em 17/03/22 foi concluída a análise técnica da segunda versão (SEI 0311526) do Produto 1 da Meta 3, gerando o Parecer Técnico 70/2022 (SEI 0334739), apontando necessidade de novos ajustes. Após apreciação, em 18/03 novos ajustes são solicitados (SEI 0335467). Recebida a 3ª versão	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	16-nov-21	23-nov-21		6-dez-21	17-dez-21		100	O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	24-nov-21	9-dez-21		23-dez-21	7-jan-22		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 23/11/2021. Após nova programação acordada com a gestão da COAE/CGEP, a análise foi concluída em 17/12/2022, por meio da Nota Técnica 286 (SEI 0308050).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	10-dez-21	24-dez-21		22-dez-21	31-mar-22		100	Foi acordado com a UFC uma nova pactuação para encaminhado do Produto 2 da Meta 1 revisado até o dia 07/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194), que foi entregue na data prevista. A nova pactuação não implicou em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED se estende até abril de 2022, conforme previsto no seu Plano de Trabalho (SEI 0211534).	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 2 da Meta 1 foi programada para 30/03/2022. O Parecer Técnico 97 aprova o produto (0338373)	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	24-nov-21	1-dez-21		20-jan-22	1-fev-22		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	2-dez-21	17-dez-21		7-fev-22	14-fev-22		100	O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	18-dez-21	1-jan-22		19-jan-22			95	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 01/12/2021. Nova pactuação se fez necessária (SEI 0321651), devido à priorização de outros projetos (Produtos do TED 17/2020 - UFPE, do Projeto de Bacias Hidrográficas e do Estudo sobre IDEB, a análise (em regime parcial ou integral) das propostas referente aos TRs dos Estudos sobre os Polos Têxtil e Confecções e os Polos Calçadistas na área de atuação, cuja contratação está sendo apoiada pela JOF-BR/PNUD, o acompanhamento do TED firmado com a UFV para as avaliações do FNE - 1º ano de avaliações referente à Portaria Interministerial Nº 07/2020), férias de servidores e atividades relacionadas ao período de substituição da coordenação da COAE e de apoio ao Coordenador-Geral. A apreciação foi concluída por meio do Parecer Técnico 17 (0322680), no dia 01/02/2022, que solicitou alguns ajustes no Produto.	

Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 2: Relatório contendo as estimativas de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21			1-jan-21	30-jun-21	100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	2-dez-21	15-dez-21			10-mar-22	23-mar-22	100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista. O parecer Técnico 84 (0336428) solicita ajustes	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Atrasado	16-dez-21	31-dez-21					0	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	1-jan-22	15-jan-22					0	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política de distribuição de cota parte municipal do ICMS, estratégia de identificação e estimação dos efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos da cota parte municipal do ICMS com base em resultados educacionais.	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21			1-abr-21	20-dez-21	100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 3 da Meta 1 foi programada para 27/04/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21			1-abr-21	13-dez-21	100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise do Produto 3 da Meta 2 foi programada para 11/05/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas públicas executadas pelos estados da região Nordeste (Ceará Pacífico; Pacto pela Vida - Pernambuco, etc)	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21			1-abr-21	20-dez-21	100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise do Produto 3 da Meta 3 foi programada para 25/05/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527). O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	21-dez-21	4-fev-22					0	Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites necessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise de cada produto foi programada para: 27/06/2022 - Produto 4 da Meta 1; 14/07/2022 - Produto 4 da Meta 2; e 21/07/2022 - Produto 4 da Meta 3.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Atrasado	5-fev-22	20-fev-22					0		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	21-fev-22	7-mar-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	Atrasado	21-dez-21	19-fev-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	20-fev-22	21-abr-22					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	22-abr-22	21-jun-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-12-04 até 2022-04-22	De 2020-12-16 até 2022-06-21	480.600,00	De 2020-12-04 até 2022-03-10	De 2020-12-16 até 2022-03-31	480.600,00	80,5952381		
CGEP 2020009- TED UFPE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	11-nov-20	4-dez-20		11-nov-20	12-abr-20		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	7-dez-20	22-dez-20		12-jul-20	22-jan-21		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	7-dez-20	7-dez-20		12-jul-20	12-jul-20		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	Concluído	23-dez-20	23-dez-20		23-jan-21	23-dez-20		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	24-dez-20	28-dez-20		24-dez-20	28-jan-21		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	384.000,00	24-dez-20	28-dez-20	384.000,00	100		
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE. Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização da análise foi redefinido para 30/09/2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	30-jun-21	30-set-21		7-jan-21	9-out-21		100	Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	1-out-21	16-out-21		20-set-21	8-out-21		100		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	17-out-21	31-out-21		15-out-21	26-nov-21		100		

Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	1-jan-21	30-set-21			1-jan-21	30-set-21			No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE.		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	1-out-21	31-out-21			10-abr-21	9-nov-21			100		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Atrasado	1-nov-21	16-nov-21			9-nov-21				90	No dia 09 de novembro de 2021 foram solicitados ajustes na primeira versão do produto. No dia 25 de novembro de 2021 a versão ajustada foi enviada pela descentralizada. No dia 1º de dezembro de 2021 foram solicitados novos ajustes, tendo em vista que os primeiros ajustes não atenderam ao esperado. Os novos ajustes ainda são aguardados.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	17-nov-21	2-dez-21							0		
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	Concluído	1-jan-21	31-dez-21			1-jan-21	31-dez-21			100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do relatório final.	
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	Atrasado	1-out-21	31-dez-21							50	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será marcada em data oportuna.	
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Resumo executivo	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21				2-jan-22			100	A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	1-jan-22	31-jan-22							0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Atrasado	1-fev-22	15-fev-22							0		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	16-fev-22	3-mar-22							0		
	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.													
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde		UFPE	Concluído	1-jan-21	31-dez-21			1-jan-21	31-dez-21			100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do relatório final.	
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	Atrasado	1-out-21	31-dez-21			1-jan-21				50	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será marcada em data oportuna.	
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Resumo executivo	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21			1-out-21	2-jan-22			100	A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	1-jan-22	31-jan-22							0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Atrasado	1-fev-22	16-fev-22							0		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	17-fev-22	4-mar-22							0		
Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	Atrasado	31-dez-21	31-dez-21							0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	Atrasado	1-jan-22	2-mar-22							0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	Atrasado	3-mar-22	2-mai-22							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	3-mai-22	2-jul-22							0		
Resumo Projeto			Atrasado											
				De 2020-11-11 até 2022-05-03	De 2020-12-04 até 2022-07-02	384.000,00	De 2020-07-12 até 2021-11-09	De 2020-04-12 até 2022-01-02	384.000,00	59,66666667				
CGEP 2020004 TED INSA Leite														
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas		
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	13-jul-20	11-ago-20		13-jul-20	11-ago-20		100				
	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11-ago-20	1-set-20		11-ago-20	1-set-20		100				
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	1-set-20	29-set-20		1-set-20	29-set-20		100				
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30-set-20	9-out-20		5-out-20	5-out-20		100				
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30-set-20	9-out-20		7-out-20	7-out-20		100				
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	9-out-20	16-out-20	75.397,01	14-out-20	19-fev-21	75.397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R\$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224569, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.			
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut														
	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Atrasado	16-out-20	12-ago-21	26.570,08	19-fev-21					78 8%	Cada etapa da meta, quando finalizada equivale a 20%. 5 etapas x 20 = 100% Etapa 1.1. – está sendo feito o levantamento bibliográfico = 10% realizada; Etapa 1.2. Todos os atores (produtores, secretários e secretárias municipais e técnicos já foram mobilizados) – 20% realizado Etapa 1.3. Já foram realizadas as entrevistas dos municípios de Cajazeirinhas, Paulista, Pombal, São Bento e Coremas, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, totalizando 200 entrevistas, representando 100% das entrevistas. Etapa 1.4. Já foram sistematizados em planilha do Microsoft Excel, 200 formulários das 200 entrevistas que serão realizadas nos municípios abrangidos pelo projeto. Cada questionário com 80 respostas dos produtores – 100% realizada; Etapa 1.5. Esta etapa foi iniciada após o término de todas as entrevistas e sistematização dos dados em planilha – 78 8% realizada; No total já foram realizados 78% desta Meta 1.	

Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Em Andamento	15-mar-21	8-jun-22	12.687,37	19-fev-21			39	A Etapa 2.1.1. equivale a 33% da meta. Nesta etapa, a sistematização e análise dos dados dos indicadores já está em fase final portanto, considera-se executada; A Etapa 2.1.2. equivale a 34% da meta. Já foram visitados 20 das 100 propriedades rurais para coleta de dados zootécnicos, representando 6,8% de execução; A Etapa 2.1.3. representa 33% da meta. Esta etapa ainda será realizada. Portanto, no total, já foram realizados 39,2% da Meta 2.	
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Em Andamento	14-jan-21	5-nov-22	22.720,81	19-fev-21			37	A Etapa 3.1. já foi concluída e equivale a 10% da meta; A Etapa 3.2. equivale a 30% da meta. Nesta etapa já foram visitadas 51 das 200 previstas, o que e representa 7,65 do valor da etapa; A Etapa 3.3. equivale a 50% da Meta. Nesta etapa já se iniciaram a determinações químico-bromatológicas de 128 amostras, o que representa 16% do valor da etapa. A Etapa 3.4. representa 10% da meta; desta etapa já foram realizadas 2%. No total, a Meta 3, já foi realizada 36,65%.	
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Em Andamento	13-fev-21	9-mai-22	6.300,13	19-fev-21			14	A Etapa 4.1 foi subdividida para melhor dimensionamento, passando a ser ter as seguintes descrições e resultados: a) Etapa 4.1.1., referente à seleção das propriedades já foi concluída e representa 10% Meta 4; b) A Etapa 4.1.2. foi iniciada, recentemente, para o levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico, o que representa o valor de 1% de realização; c) A Etapa 4.1.3. equivale a 48% da Meta. Esta etapa foi iniciada e já foram realizados três registros da movimentação financeira das 48 propriedades selecionadas, o que equivale a 3% de execução. d) As etapas 4.14 e 4.1.5 ainda serão realizadas. No total, já foram realizados 14% da Meta 4.	
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Em Andamento	14-jan-21	15-abr-22	75.004,62	19-fev-21			10	Nesta Meta 5, as etapas de seleção (5.1) e elaboração do cronograma (5.2) já foram realizadas e representam a 2,5% da meta cada uma. Já foi realizado o treinamento da equipe que fará as coletas de leite. A Etapa 5.3. equivale a 30% da Meta 5. Já foram realizadas 8 visitas das 200 previstas, o que representa 1,2%. A Etapa 5.4. equivale a 30% da Meta 5. Já foram realizadas 8 coletas das 200 previstas, o que representa 1,2%. A Etapa 5.5. equivale a 30% da Meta 5. As análises para a determinação do perfil de ácidos graxos do leite ainda será iniciada; A Etapa 5.6 representa 5% da Meta 5. Ainda não houve atividade nesta etapa. Considera-se que Meta 5 está em foi iniciada e já foram realizadas 7,4% do total.	
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	13-jul-21	9-mai-22	22.530,00				0	A iniciar de acordo com o cronograma proposto. As reuniões da equipe, para o planejamento das atividades desta meta, já se iniciaram	
Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Em Andamento	6-out-21	4-jan-23	23.726,04	6-out-21			0	A iniciar de acordo com o cronograma proposto. Porém, a equipe técnica do projeto também passou a considerar que visitas de comitativas, reuniões, apresentação do projeto em eventos e outras ocorrências, também serão computadas na Meta 7, como eventos complementares. Espera-se que ocorram em torno de 10 eventos dessa natureza, o que equivale a 10% da Meta. Entre os anos de 2021 e 2022 ocorreram os seguintes eventos complementares: a) Apresentação do projeto no Agrinordeste/2021, no Centro de Convenções, em Olinda-PE; b) Visita das comitativas da SUDENE e do INSA ao produtor de leite Anderson Augusto Fernando Brito, participante do projeto, no município de Jardim de Piranhas – RN. Estes dois eventos representam 2% dos 10% estabelecidos para os eventos complementares.	
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados	Produto: Três artigos científicos	INSA	Atrasado	13-jun-21	3-fev-23	4.500,00				0	A iniciar de acordo com a sistematização, análise e interpretação dos dados obtidos no desenvolvimento do projeto.	
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	15-dez-20	14-jan-21	75.000,00	5-mar-21	28-abr-21		100	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI INSA (6999729)	
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Em Andamento	14-jan-21	8-jun-22		19-fev-21			32	Já foram enviados para a SUDENE, o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de Julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022, o que equivale a 32% de execução da Meta 10.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-21	30-jan-21		25-mar-21	25-mai-21		100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	1-fev-21	28-fev-21	139.342,00	19-ago-21	23-set-21	143.114,00	100	As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R\$ 143.114,97)	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-22	30-jan-22		1-set-21	2-set-21		100	O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Atrasado	1-fev-22	28-fev-22	129.142,00				0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	3-fev-23	4-abr-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	5-abr-23	4-jun-23					0		

Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A. Iniciar	5-jun-23	4-ago-23						0	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-07-13 até 2023-06-05	De 2020-08-11 até 2023-08-04	612.920,06	De 2020-07-13 até 2021-09-01	De 2020-08-11 até 2021-09-23	218.511,01	52,60869565		
CGEP 2020003 TED INSA Palma												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira Análise jurídica	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta. Análise e parecer jurídico	CGEF	Concluído	21-mai-20	11-ago-20		21-mai-20	11-ago-20		100		
		PROCURADORIA	Concluído	11-ago-20	27-ago-20		11-ago-20	27-ago-20		100		
Elaboração da minuta do TED Assinatura do TED Publicação do TED	Elaboração da minuta do TED	COCIC	Concluído	28-ago-20	29-set-20		28-ago-20	29-set-20		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30-set-20	9-out-20		5-out-20	5-out-20		100		
	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30-set-20	9-out-20		7-out-20	7-out-20		100		
Liberação da primeira parcela de recursos Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético. Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação. Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos. Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação. Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade físico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1. Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	9-out-20	16-out-20	211.365,09	8-out-20	14-out-20	211.365,09	100	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	Concluído	16-out-20	12-ago-21	13.600,00	11-fev-21	31-mar-21		100		
	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Em Andamento	16-out-20	8-jul-22	8.500,00	11-fev-21			25		
	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Atrasado	16-out-20	9-jan-22	15.000,00	11-fev-21			50		
	Produto: 142 acessos caracterizados bioquimicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na indústria	INSA	Atrasado	16-out-20	9-jan-22	28.400,00	1-fev-21			10		
	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Atrasado	10-nov-21	8-jul-22	15.000,00				0		
	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Atrasado	14-jan-21	8-jul-22	10.000,00				0		
	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Atrasado	11-set-21	1-out-23	25.000,00				0		
	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	A Iniciar	8-jul-22	1-out-23	35.000,00				0		
	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	Em Andamento	13-fev-21	7-ago-22	10.000,00	1-out-21			15		
Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina). Meta 11: Reduzir o tempo de juvenildade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia. Meta 12: Avaliar todos os clones e progênes S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba. Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental. Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Em Andamento	13-fev-21	7-ago-22	13.000,00	1-jun-21			40		
	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenildade	INSA	Atrasado	14-mai-21	10-nov-21	6.611,83	1-set-21			10		
	Produto: Campos instalados com clones e progenies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Em Andamento	14-abr-21	1-out-23	7.600,00	1-jun-21			20		
	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Atrasado	11-out-21	1-out-23	6.000,00				0		
	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	16-out-20	1-out-23		11-fev-21			60		
	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municípios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Em Andamento	16-out-20	3-jun-23	15.000,00	11-mar-21			50		
	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	Em Andamento	15-mar-21	4-mai-23	25.000,00	1-abr-21			45		
	Produto:Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	Em Andamento	13-jul-21	4-jan-23	35.850,24	1-set-21			15		
	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	Em Andamento	13-jul-21	4-abr-23	15.000,00	1-set-21			4		
	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	Em Andamento	9-mai-22	3-jul-23	25.000,00	1-mai-21			10		
Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	Atrasado	14-jan-21	3-fev-23	27.000,00				0		
Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	14-abr-21	1-out-23	25.000,02	1-out-21			15		
Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	Concluído	16-out-20	10-nov-21	31.153,40	11-fev-21	1-mar-22		100		

Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos científicos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Unidades experimentais instaladas e nível de severidade das doenças determinados	INSA	Em Andamento	13-jun-21	5-dez-22	41.240,00	15-ago-21				45	
	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	Em Andamento	6-out-22	4-abr-23	21.946,00	11-fev-21				30	
	Produto: Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	Em Andamento	5-nov-22	4-mai-23	9.333,60	1-dez-21				25	
	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	Em Andamento	5-nov-22	2-ago-23	14.614,00	15-ago-21				40	
	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	13-jun-21	1-out-23		30-set-21				25	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-21	30-jan-21		1-abr-21	14-abr-21			100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo Parecer Técnico 160.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Concluído	1-fev-21	28-fev-21	139.342,00	1-dez-21	10-dez-21	139.342,00		100	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-22	30-jan-22		27-jul-21	18-out-21			100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF / DAD / GABINETE	Atrasado	1-fev-22	28-fev-22	129.142,00					0	
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	1-jan-23	30-jan-23						0	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	1-out-23	30-nov-23						0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	1-dez-23	30-jan-24						0	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	31-jan-24	31-mar-24						0	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-05-21 até 2024-01-31	De 2020-08-11 até 2024-03-31	959.698,18	De 2020-05-21 até 2021-12-01	De 2020-08-11 até 2022-03-01	350.707,09	39.85365854		

CGEP 2020002- IDEB

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Gloria Sistelos	Concluído	1-jan-20	28-fev-20			1-jan-20	28-fev-20		100	
Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	1-jan-20	30-out-20			1-jan-20	13-out-20		100	Em virtude da divulgação do resltado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no levantamento
			Concluído	1-jan-20	30-out-20			1-jan-20	13-out-20		100	
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	Concluído	1-jan-20	30-out-20			1-jan-20	4-set-20		100	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019
Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	2-mar-20	30-nov-20			24-fev-20	13-out-20		100	
Elaboração de ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	2-mar-20	30-nov-20			24-fev-20	13-out-20		100	
Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	2-mar-20	30-nov-20			24-fev-20	30-jan-21		100	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 25/10/2020
Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	Concluído	2-mar-20	30-nov-20			13-out-20	28-out-20		100	Os mapas foram resultados do IDEB 2019
Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	1-abr-20	30-nov-20			28-out-20	30-jan-21		100	
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	Concluído	1-abr-20	30-dez-20			24-fev-20	30-jan-21		100	Falta incluir os dados do IDEB 2019
Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	Concluído	4-set-20	30-jan-21			4-set-20	30-jan-21		100	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO
Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento do IDEB	Joyce	Concluído	13-jul-20	30-jan-21			13-jul-20	30-jan-21		100	
Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas encontradas	Joyce	Concluído	1-ago-20	30-jan-21			1-ago-20	30-jan-21		100	
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	Concluído	1-ago-20	30-jan-21			1-ago-20	30-jan-21		100	
Consolidação do Relatório final	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	1-fev-21	31-mar-22			13-jul-20	30-mar-22		100	Em 30 de março foi entregue à Coordenação a versão para revisão
Revisão do Relatório final	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	Em Andamento	31-mar-22	30-abr-22			31-mar-22			2	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-01-01 até 2022-03-31	De 2020-02-28 até 2022-04-30	-	De 2020-01-01 até 2022-03-31	De 2020-02-28 até 2022-03-30	-		93,875	

CGEP 2019005 Trilha 3 PRDNE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Análise do Relatório P14	P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE (Documento de arquitetura da informação). A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para elicitación de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE										
			Concluído	2-set-19	31-out-19	139.828,50		10-dez-19	120.403,17		100	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudeene.

Análise do Relatório P15	P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE. Com a condução de especialistas em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	Concluído	11-nov-19	30-nov-20	269.514,00			31-jan-22	202.135,50	100	Foi entregue versão preliminar em fevereiro de 2020. A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. A versão final foi enviada à Sudene no dia 18 de dezembro. A apreciação técnica do produto se deu pela COAE/CGEP, com o envio da Nota Técnica 2 (0216636) no dia 05/01/2021. Neste momento, a CGEP e CGCP aguardam o envio do produto revisado e com os ajustes solicitados. Em 31/03/2021, foi realizada reunião com CGEE para alinhar as solicitações realizadas no Nota Técnica 2 (SEI 0216636). Dentre os encaminhamentos da reunião, as partes acordaram que a nova versão do produto com os ajustes apontados na Nota Técnica se dará até o dia 20/04/2021. A segunda versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 22/04/21. Em razão da priorização de outros projetos que demandaram maior dedicação dos técnicos, a conclusão da análise se deu apenas em 02/06/21 por meio da Técnica 117 (SEI 0247260) , que novamente apontou uma série de recomendações. A terceira versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 26/06/21, sendo encaminhada a área técnica em 28/06/21. O prazo acordado para o atendimento da demanda é o dia 20/07/2021, conforme consta no Despacho SEI 0255121. Em 20/07/2021, a equipe emitiu Nota Técnica nº 144 SEI 0259152, o qual opinou-se, novamente, pela não aprovação do Produto 15. Em 07/12/2021, o CGEE encaminha documento com justificativas do não atendimento das Notas Técnicas anteriores e proposta de novo capítulo a ser inserido ao documento. Em 22/12/2021, foi emitida Nota Técnica nº290 (SEI 0309658) que ratifica as solicitações anteriores. Em 24/12/2021, o CGEE encaminhou a quinta versão do Produto 15. Em 29/12/2021 a área técnica enviou análise preliminar desta última versão, com o
Análise do Relatório P16	P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE. A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenhada será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	Cancelado	23-mar-20	31-dez-20	70.397,50					0	A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 12/04/2021 (início) a 21/05/2021 (término). Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.
Análise do Relatório P17	P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE. O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a capta e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	Cancelado	1-nov-20	28-fev-21	389.177,25					0	Repactuado conforme aditivo à carta acordo.No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 17/05/2021 (início) a 22/09/2021 (término) Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos Produtos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.
Análise do Relatório P18	P18 - Relatório descritivo dos instrumentos e mapas de conhecimento afeitos à carteira de projetos do PRDNE. A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de Inteligência em CTI do CGEE para geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos de informação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	Cancelado	1-fev-21	31-mai-21	355.850,25					0	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 02/06/2021 (início) a 11/11/2021 (término) Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.

												Existem duas empresas desenvolvendo a colheiteadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda em 2021;PO reprogramado para 2021;Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textos do prototipo da colheiteadeira; A Sudene participou do Palma Tech, organizado pela Epamig, no sia 22 /09/21; A Casale pretende concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021; Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e Coconilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João Pessoa (PB), por meio da parceria entre Faepa/PB, Sociedade Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), oportunidade na qual as empresas irão apresentar as evoluções do desenvolvimento da Colheiteadeira.o X CONGRESSO INTERNACIONAL DA PALMA E COCHONILHA, foi adiado e ocorrerá emJoão Pessoa, Paraíba, Brasil, de 26 a 29 de setembro de 2022; foi PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021	
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Atrasado	1-mai-20	31-dez-21			23-ago-20			65		
Avaliação dos resultados do projeto	Balanco das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	Atrasado	1-out-21	30-mar-22						0		
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	Atrasado	30-mar-22	29-abr-22						0		
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar	29-abr-22	29-mai-22						0		
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2019-03-01 até 2022-04-29	De 2019-03-31 até 2022-05-29		-	De 2019-03-01 até 2020-08-23	De 2019-03-31 até 2021-11-30	-	81,38888889		
CGEP 2018001- Agro Familiar													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	Concluído	13-jun-18	29-jun-18		13-jun-18	6-jul-18		100			
Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019	CGEP/SUDENE	Concluído	8-jun-18	15-jun-18		8-jun-18	15-jun-18		100			
Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	Concluído	18-jun-18	22-jun-18		18-jun-18	6-jul-18		100	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene		
Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	Concluído	26-jun-18	28-jun-18		25-jun-18	6-jul-18		100			
Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	Concluído	28-jun-18	29-jun-18		28-jun-18	6-jul-18		100			
Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	2-jul-18		11-jul-18	11-jul-18		100	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)		
Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	4-jul-18		6-jul-18	7-dez-18		100	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)		
Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	19-dez-18		2-jul-18	20-dez-18		100	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)		
Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	Concluído	6-ago-18	6-ago-18		11-dez-18	11-dez-18		100	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo andarà em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.		
Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	Concluído	19-dez-18	26-dez-18		26-dez-18	26-dez-18		100			
Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	Concluído	26-dez-18	26-dez-18		27-dez-18	27-dez-18		100	Parecer Técnico nº 135 (0047530)		
Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	Concluído	31-dez-18	31-dez-18		28-dez-18	31-dez-18		100	CONVÊNIO SEI nº 0049175		
Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	Concluído	31-dez-18	31-dez-18		11-jan-19	11-jan-19		100	Publicação no DOU 11/01/2019		
Licitação		UEFS	Atrasado	1-jan-19	1-abr-19		19-set-19			50	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de setembro de 2019 até o mês de abril de 2020 e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, conveniente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022, a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é 31/12/2022	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)	
Acerte do processo licitatório		CGEP E COCIC	Atrasado	1-abr-19	16-abr-19					0	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.		
Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	Atrasado	16-abr-19	21-abr-19	106.536,26				0	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro de 2021.		
Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	Atrasado	1-abr-19	30-jan-20	Página 43 de 82				0	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	43 de 82	

Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	Atrasado	26-abr-19	26-abr-19						0	
Etapa 1.2 _Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.		UEFS	Atrasado	24-ago-19	30-jan-20						0	
Meta 2 _Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	Atrasado	26-abr-19	30-jan-20						0	
Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	Atrasado	26-abr-19	26-abr-19						0	
Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rôtu		UEFS	Atrasado	24-ago-19	30-jan-20						0	
1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	Atrasado	14-fev-20	29-fev-20						0	
Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	A Iniciar			1.062,00					0	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R\$ 177,00
Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	Atrasado	29-fev-20	15-mar-20	90.385,54					0	
Meta 3 _Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	Atrasado	15-mar-20	30-out-20						0	
Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	A Iniciar			1.416,00					0	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R\$ 177,00
2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	Atrasado	30-out-20	30-nov-20						0	
Prestação de Contas Final		UEFS	Atrasado	30-nov-20	29-jan-21						0	
Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	Atrasado	29-jan-21	29-jan-22						0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
Resumo Projeto			Atrasado								0	
				De 2018-06-08 até 2021-01-29	De 2018-06-15 até 2022-01-29	199.399,80	De 2018-06-08 até 2019-09-19	De 2018-06-15 até 2019-01-11	-		45	

COORDENAÇÃO-GERAL DE COOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS

CGCP 2022003 OnuHabitat

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Etapa 0 - Plano de Trabalho	Plano de Trabalho	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-jan-21	30-set-21			22-set-21	22-out-21			
Produto 1.1. - Estratégia de Comunicação e Advocacy	Estratégia de Comunicação e Advocacy	OnuHabitat/CGCP	Em Andamento	1-out-21	31-dez-21			1-out-21	31-dez-21	50		
Produto 1.2. - Oficina de Intercâmbio	Oficina de Intercâmbio	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-jan-22	28-fev-22			1-jan-22	22-fev-22	100		
Produto 2.1 - Avaliação das necessidades de capacitação	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	OnuHabitat/CGCP	Atrasado	1-jan-22	28-fev-22						Foram solicitados em 21/03/2022 ajustes nos Produtos 1.2 e 1.1 o que atrasou a execução deste Produto e, por consequência, a execução do 2.2 também sofreu atraso.	
Produto 2.2 - Módulos de treinamento	Módulos de treinamento para o desenvolvimento de capacidades	OnuHabitat/CGCP	Atrasado	1-mar-22	31-mar-22						0	
Produto 3.1 - Realização do Desafio de Inovação	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	OnuHabitat/CGCP	A Iniciar	1-abr-22	30-mai-22						0	
Produto 3.2 - Evento virtual/Assinatura de carta de adesão	Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	OnuHabitat/CGCP	A Iniciar	30-mai-22	30-jun-22						0	
Resumo Projeto			Atrasado			309.985,00			52.435,00			
				De 2021-01-01 até 2022-05-30	De 2021-09-30 até 2022-06-30	309.985,00	De 2021-09-22 até 2022-01-01	De 2021-10-22 até 2022-02-22	52.435,00	25		

CGCP 2022002 - Diretrizes e Prioridades FDNE 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-set-22	30-set-22	-						
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-set-22	30-set-22	-						
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-out-22	15-out-22	-						
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	15-out-22	12-nov-22	-						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGFD	A Iniciar	12-nov-22	15-nov-22	-						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	15-nov-22	17-nov-22	-						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	17-nov-22	24-nov-22	-						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	24-nov-22	24-nov-22	-						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	24-nov-22	30-nov-22	-						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	30-nov-22	15-dez-22	-						
Resumo Projeto			A Iniciar									
				De 2022-09-01 até 2022-11-30	De 2022-09-30 até 2022-12-15	-			-	#DIV/0!		

CGCP 2022001 Diretrizes e Prioridades FNE 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-jun-22	30-jun-22	-						
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-jun-22	30-jun-22	-						
Consulta a atores de referência	Consulta a atores de referência	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	30-jun-22	15-jul-22	-						
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	30-jun-22	15-jul-22	-						
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Parecer Técnico conjunto CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	1-jul-22	15-jul-22	-						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGFD	A Iniciar	15-jul-22	16-jul-22	-						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	19-jul-22	28-jul-22	-						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGGI	A Iniciar	28-jul-22	1-ago-22	-						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	1-ago-22	4-ago-22	-						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGGI	A Iniciar	5-ago-22	10-ago-22	-						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	10-ago-22	11-ago-22	-						
Resumo Projeto			A Iniciar									
				De 2022-06-01 até 2022-08-10	De 2022-06-30 até 2022-08-11	-			-	#DIV/0!		

CGCP 2021005 Bacias - RHA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboração de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	8-mai-20	1-set-20	-	8-mai-20	1-set-20	-	100	Nota Técnica 187 (0173494), Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) CGCP 0183823	
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	2-set-20	28-set-20	-	2-set-20	28-set-20	-	100		
Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	6-out-20	9-nov-20	-	6-out-20	4-dez-20	-	100		
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira), Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	4-dez-20	5-mar-21	-	4-dez-20	5-mar-21	-	100	Portaria 80 (0200601), Processo 59336.000244/2021-86, Nota Técnica 4 (0217167) ,	
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	RHA	Concluído	15-abr-21	15-abr-21	-	15-abr-21	15-abr-21	-	100	CONTRATO - PNUD-RHA (0237685)	
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabelecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Em Andamento	15-abr-21	10-abr-22	-	15-abr-21		-	100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA- VERTRAG	Concluído	15-abr-21	5-mai-21	424.945,23	15-abr-21	5-mai-21	22.345,23	100	Aprovado mediante Nota Técnica 104/2021 de 17/05/2021.	

Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	5-jun-21	18-ago-21	178.761,83	5-jun-21	29-set-21	178.761,83	100		
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	5-jul-21	17-set-21	245.797,51	5-jul-21	13-dez-21	245.797,51	100	Aprovado mediante Nota Técnica 509/2021 (SEI 3056000).	
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Atrasado	18-jun-21	16-out-21	44.690,46	18-jun-21			20	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Atrasado	18-jun-21	16-out-21	44.690,46	18-jun-21			20	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Atrasado		2-out-21	5-dez-21	178.761,83			0	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Atrasado	1-nov-21	3-jan-22	178.761,81				0	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
Encerramento do Projeto	Relatório Final de Encerramento do Projeto	Consórcio RHA-VERTRAG	Atrasado	3-jan-22	4-mar-22	-				0	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
Elaboração de Relatório Final Resumo Projeto	Análise e elaboração de parecer final de Projeto	Sudene/PNUD	Atrasado	4-mar-22	19-mar-22	-				0	Houve necessidade de repactuação do cronograma em virtude da contratada necessitar elaborar novas versões do Produto 3, até sua aprovação final, ocorrida em 13/12/2021 (SEI 3056000).	Está em processo de aprovação na JOF/PNUD a celebração do aditivo contratual com ajuste de cronograma.
				De 2020-05-08 até 2022-03-04	De 2020-09-01 até 2022-04-10	893.809,13	De 2020-05-08 até 2021-07-05	De 2020-09-01 até 2021-12-13	446.904,57	62,66666667		

CGCP 2021004 CINEP

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	-	21-out-20	11-nov-20	-	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	-	30-nov-20	31-dez-20	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	-	31-dez-20	31-dez-20	-	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	-	31-dez-20	5-jan-21	-	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convênio, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	30-jun-21	-	23-dez-20	30-jun-21	-	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e Nota Técnica 24 (0224241)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
Ajustes no Plano de Trabalho	Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	30-jun-21	31-jul-21	-	30-jun-21	9-ago-21	-	100		
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	30-jun-21	31-ago-21	-				0	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022. A conveniente comunicou informalmente que o processo licitatório não houve concorrentes, no entanto não formalizou o resultado na Plataforma Mais Brasil. Foram encaminhadas solicitações de esclarecimento referente ao resultado do Processo licitatório em 3 ocasiões (18/10/2021, 31/01 e 07/03/2022) bem como encaminhado Ofício solicitando esclarecimentos (Ofício 439/2022 de 14/02/2022) que não foram respondidos.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma.
Acelte do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	31-ago-21	5-set-21	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Atrasado	5-set-21	5-set-21	750.000,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 1	Preparatória: Detalhamento Metodológico	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	5-set-21	5-out-21	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 2	Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraiba	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	5-set-21	4-nov-21	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 3	Priorização do Eixo Estratégico e seu dignóstico detalhado: Por mesorregião	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	4-nov-21	4-dez-21	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 4	Cenarização e carteira estratégica do eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	4-dez-21	2-fev-22	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 5	Planos táticos para o eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	2-fev-22	2-jul-22	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convênente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Acompanhamento e Fiscalização	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Em Andamento	30-jun-21	2-jul-22	-	30-jun-21			10		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica da CINEP	A Iniciar	2-jul-22	1-ago-22	-				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	1-ago-22	16-ago-22	-				0		
Análise da prestação de contas financeiras Resumo Projeto	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2-jul-22	1-mar-22	-				0		

				De 2020-10-21 até 2022-08-01	De 2020-11-11 até 2022-08-16	750.000,00	De 2020-10-21 até 2021-06-30	De 2020-11-11 até 2021-08-09	-	40,5		
CGCP 2021003 Guarabira												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	-	21-out-20	11-nov-20	-	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	-	30-nov-20	31-dez-20	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	-	31-dez-20	31-dez-20	-	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	-	31-dez-20	5-jan-21	-	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica do Município de Guarabira e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	29-jun-21	-	23-dez-20	29-jun-21	-	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 164 (0254046)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	29-jun-21	27-set-21	-	29-jun-21			50	A licitação realizada em Setembro/2021 foi cancelada pela prefeitura em razão da inadequação da empresa habilitada ao processo. Em contato com a Prefeitura, a equipe técnica foi informada que a data prevista para nova licitação será no dia 16/03/2022."	Será indicada nova data para procedimento licitatório.
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	27-set-21	2-out-21	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Atrasado	1-mar-22	1-mar-22	483.189,57				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapas 1	ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	1-mar-22	21-mar-22	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapas 2	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	21-mar-22	10-abr-22	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Acompanhamento e Fiscalização Etapas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	1-mar-22	10-abr-22	-				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapas 3	DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PROPOSIÇÕES	Equipe Técnica do Município de Guarabira	A Iniciar	10-abr-22	10-mai-22	-				0		
Etapas 4	ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA	Equipe Técnica do Município de Guarabira	A Iniciar	10-mai-22	31-dez-22	-				0		
Acompanhamento e Fiscalização Etapas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	A Iniciar	10-abr-22	31-dez-22	-				0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica do Município de Guarabira	A Iniciar	31-dez-22	30-jan-23	-				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	30-jan-23	14-fev-23	-				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	31-dez-22	1-mar-22	-				0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-10-21 até 2023-01-30	De 2020-11-11 até 2023-02-14	483.189,57	De 2020-10-21 até 2021-06-29	De 2020-11-11 até 2021-06-29	-	39,47368421		
CGCP 2021002 Codanorte												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	-	21-out-20	11-nov-20	-	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Seleção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas)	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	-	30-nov-20	31-dez-20	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração da minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	-	24-dez-20	31-dez-20	-	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	-	31-dez-20	31-dez-20	-	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	-	31-dez-20	5-jan-21	-	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do conveniente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	27-mai-21	-	23-dez-20	27-mai-21	-	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	27-mai-21	25-ago-21	-	27-mai-21	10-set-21	-	100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	25-ago-21	30-ago-21	-	10-set-21	1-out-21	-	100	Parecer Técnico 319 (278927)	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Concluído	30-ago-21	30-ago-21	725.810,00	1-out-21	1-out-21	725.810,00	100	SEI 281376	
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapas 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30-ago-21	28-dez-21	-	20-dez-21	27-jan-22	-	100	Parecer Técnico 13 (0320587)	
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapas 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Em Andamento	28-dez-21	27-abr-22	-				0		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Em Andamento	30-ago-21	27-abr-22	-				0		

META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos.Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	A Iniciar	27-abr-22	27-mai-22	-					0	
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	CODANORTE	A Iniciar	27-mai-22	30-jun-22	-					0	
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4		Equipe Técnica CGCP	A Iniciar	27-abr-22	30-jun-22	-					0	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	A Iniciar	30-jun-22	30-jul-22	-					0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	30-jul-22	14-ago-22	-					0	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	30-jun-22	29-ago-22	-					0	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-10-21 até 2022-07-30	De 2020-11-11 até 2022-08-29	725.810,00	De 2020-10-21 até 2021-12-20	De 2020-11-11 até 2022-01-27	725.810,00	57,89473684		

CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15-nov-20	2-dez-20	-	15-nov-20	2-dez-20	-	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	3-dez-20	10-dez-20	-	3-dez-20	10-dez-20	-	100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11-dez-20	20-dez-20	-	11-dez-20	20-dez-20	-	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21-dez-20	24-dez-20	-	21-dez-20	24-dez-20	-	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28-dez-20	30-dez-20	-	28-dez-20	30-dez-20	-	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	-	31-dez-20	31-dez-20	-	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	1-jan-21	30-jun-21	-	1-jan-21	30-jun-21	-	100	Acelte dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	1-mar-21	30-nov-21	-	1-mar-21	25-nov-21		100	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021).	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	1-fev-21	31-out-21	-	1-fev-21	5-nov-21		100	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente Interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
Meta 4: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	1-mar-21	30-nov-21	-	1-mar-21	25-nov-21		100	A data prevista para início desta etapa foi antecipada.	
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Em Andamento	1-ago-21	31-dez-22	-	15-set-21			0		
Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Em Andamento	1-jan-22	31-dez-22	-	1-mar-22			0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	-				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	1-fev-23	28-fev-23	-				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	1-mar-23	30-mar-23	-				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-11-15 até 2023-03-01	De 2020-12-02 até 2023-03-30	1.998.021,94	De 2020-11-15 até 2022-03-01	De 2020-12-02 até 2021-11-25	1.998.021,94	68,75		

CGCP 2020002- ACTs

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	Concluído	1-out-19	30-out-19	-	30-out-19	27-nov-19	-	100		
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30-out-19	30-nov-19	-	27-nov-19	28-nov-19	-	100	Parecer Técnico nº 329/2019	
Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30-out-19	30-jan-20	-	17-jan-20	13-jul-20	-	100	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Alta de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	Concluído	30-out-19	30-jan-20	-	19-dez-19	19-dez-19	-	100		
Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Em Andamento	1-fev-20	12-dez-22	-	6-jan-20			60	Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	Em 30/12/2021 foi assinado novo aditivo a Carta de Acordo em que o P4 (Fichas de Projetos) é retirado. A retirada do P4 foi solicitada pela contratada que não conseguiu atender ao previsto no instrumento.
Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30-out-19	30-jan-20	-	17-jan-20	13-jul-20	-	100		
Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Alta de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	Concluído	30-out-19	30-jan-20	-	19-dez-19	19-dez-19	-	100		
Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Em Andamento	1-fev-20	12-dez-22	-	6-jan-20			60	Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	Com a nova contratação para o município de Feira de Santana (Processo: 59336.000817/2021-71) será possível ter um conjunto de projetos detalhados como subsídio para continuidade das atividades do ACT.
Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-jun-22	30-jul-22	-				0		
Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-dez-22	12-dez-22	-				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									

			De 2019-10-01 até 2022-12-01	De 2019-10-30 até 2022-12-12	-	De 2019-10-30 até 2020-01-17	De 2019-11-27 até 2020-07-13	-	65,71428571		
--	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------	--	--

COORDENAÇÃO-GERAL DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE

CGDS2022009 - Pescado - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	10-dez-21	23-dez-21		10-dez-21	23-dez-21		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	21-dez-21	21-dez-21		21-dez-21	21-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	20-dez-21	23-dez-21		20-dez-21	23-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	20-dez-21	23-dez-21		20-dez-21	23-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído							100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/ CGAF/DAD/GAB	Concluído	30-dez-21	30-dez-21	831.600,00	30-dez-21	30-dez-21	831.600,00	100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiário.	INSA	Atrasado	31-dez-20	30-jun-21					0	Consta nas Disposições Finais do TED Nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Atrasado	31-dez-20	28-fev-21	20.000,00				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Atrasado	28-fev-21	30-jun-21	36.000,00				0		
META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Atrasado	31-jan-21	30-jun-22					0		
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Atrasado	31-jan-21	31-mar-21	60.000,00				0		
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Atrasado	30-jun-21	30-jun-22	326.000,00				0		
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Atrasado	31-out-21	31-dez-22					0		
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Atrasado	31-out-21	31-dez-22	249.000,00				0		
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Atrasado	31-jan-22	31-dez-22					0		
Etapa 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	Atrasado	31-jul-22	31-dez-22	26.000,00				0		
Etapa 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Atrasado	31-jan-22	31-dez-22	15.000,00				0		
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo à produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	A Iniciar	31-jul-22	31-dez-22					0		
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	A Iniciar	31-jul-22	31-dez-22	24.000,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2-jan-24	2-jan-25					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-12-31 até 2024-01-02	De 2021-02-28 até 2025-01-02	1.587.600,00	De 2021-12-10 até 2021-12-30	De 2021-12-21 até 2021-12-30	831.600,00	30		

CGDS2022007- SECTI Bahia - IA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	9-dez-20	24-dez-20		9-dez-20	24-dez-20				
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28-dez-20	30-dez-20		28-dez-20	29-dez-20		100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	COCIC/CGDS	Concluído	24-dez-20	31-dez-20		24-dez-20	31-dez-20		100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete SECTI-BA	Concluído	31-dez-20	5-jan-21		31-dez-20	5-jan-21		100		
Liberação - 1ª parcela	Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-mar-21	30-abr-21	615.000,00					Vide linha 8 (meta 2). Parcela reprogramada para ser paga no primeiro semestre de 2022, após conclusão do processo seletivo relativo às bolsas.	Vide linha 8 (meta 2)
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Atrasado	1-nov-21	30-nov-21	184.680,00	1-fev-21		-	20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes

[illegible]

Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-dez-23	11.500,00					0	
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-dez-23	11.500,00					0	
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-abr-22	1-jan-24	70.350,00					0	
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-abr-22	1-jun-23	12.000,00					0	
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-jan-24	42.600,00					0	
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandiocultura para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-abr-22	1-jan-24	15.150,00					0	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2-jan-24	2-jan-25						0	
Resumo Projeto			Atrasado									Observação: Estamos no aguarda de informações mais recentes por parte da Embrapa Semiárido. Assim que as informações forem enviadas, o sistema será novamente alimentado.
				De 2021-11-30 até 2024-01-02	De 2021-12-17 até 2025-01-02	189.000,00	De 2021-11-30 até 2021-12-31	De 2021-12-17 até 2021-12-31		-	42,85714286	

CGDS2022004 - Pescado IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	6-dez-21	30-dez-21			6-dez-21	27-dez-21	100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28-dez-21	28-dez-21			28-dez-21	28-dez-21	100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	27-dez-21	31-dez-21		27-dez-21	30-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	29-dez-21	31-dez-21		29-dez-21	30-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/ASCOM	Concluído	29-dez-21	31-dez-21		29-dez-21	30-dez-21		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/C GAF/DAD	Atrasado	30-dez-21	30-jan-22					0	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro.
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Atrasado	1-jan-22	1-fev-23	673.599,92				0	Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	
Meta 2	Qualificação dos Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	A Iniciar	1-abr-22	1-fev-23	175.900,00				0		
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	1-jan-23	29-mar-23	10.500,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	30-mar-23	29-mar-24					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-12-06 até 2023-03-30	De 2021-12-28 até 2024-03-29	859.999,92	De 2021-12-06 até 2021-12-29	De 2021-12-27 até 2021-12-30		-	50	

CGDS2022003- Solar - IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	3-dez-21	17-dez-21		3-dez-21	15-dez-21		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	18-dez-21	30-dez-21		16-dez-21	20-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	17-dez-21	23-dez-21		10-dez-21	23-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	16-dez-21	30-dez-21		17-dez-21	27-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	23-dez-21	30-dez-21		27-dez-21	27-dez-21		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	27-dez-21	30-dez-21		28-dez-21	30-dez-21	230.000,00	100		
Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Em Andamento	2-jan-22	30-jun-22	148.650,00	10-jan-22			30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos
Meta 2	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	A Iniciar	1-jul-22	30-dez-22	81.350,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	3-mar-23	2-mar-24					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2021-12-03 até 2023-03-03	De 2021-12-17 até 2024-03-02	230.000,00	De 2021-12-03 até 2022-01-10	De 2021-12-15 até 2021-12-30	230.000,00	70		

CGDS2022002 - Transferência Voluntária

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	ata de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Acompanhamento da indicação dos beneficiários no SIOP	Verificação das indicações dos beneficiários das emendas parlamentares, indicados por Deputados Federais e/ou Senadores, no SIOP	COCIC	A Iniciar	1-fev-22	15-mai-22							
Disponibilização dos Programas na Plataforma +Brasil (P+B)	Preenchimento das informações técnicas e jurídicas, em acordo com os programas e ações orçamentárias indicadas pelos Parlamentares, de forma a nortear o envio das propostas e planos de trabalho.	CGDS	A Iniciar	1-mai-22	25-mai-22							
Acompanhamento das propostas/planos de trabalhos enviados na Plataforma +Brasil	Verificação periódica do envio das propostas/planos de trabalho pelos beneficiários indicados, em acordo com o cronograma de envio disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	COCIC	A Iniciar	25-mai-22	10-jun-22							
Análise das propostas/planos de trabalho encaminhadas na Plataforma +Brasil	Análise das propostas/planos de trabalho, encaminhadas na Plataforma +Brasil, com emissão de pareceres técnicos e realização dos comandos necessários na P+B.	CIC/NÚCLEO DE EMEN	A Iniciar	10-jun-22	25-jun-22							

Acompanhamento das complementação das Propostas e Plano de Trabalho	Verificação periódica do envio das complementações pelos proponentes, em acordo com o cronograma disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	COCIC	A Iniciar	25-jun-22	15-jul-22										
Reanálise das propostas/planos de trabalho complementadas	Análise das complementações às propostas/planos de trabalho enviadas pelos proponentes na Plataforma +Brasil, com emissão de pareceres técnicos e realização dos comandos necessários na P+B.	CIC/NÚCLEO DE EMEN	A Iniciar	15-jul-22	25-ago-22										
Aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho	Elaboração de despachos e realização de comandos de aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho na Plataforma +Brasil.	CGDS	A Iniciar	25-ago-22	30-ago-22										
Registro de impedimentos técnicos no SIOP	Indicação no SIOP dos impedimentos técnicos referentes às propostas/planos de trabalho rejeitadas, em acordo com o cronograma disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	CIC/NÚCLEO DE EMEN	A Iniciar	1-set-22	10-set-22										
Comunicação do resultado das análises aos proponentes	Comunicação aos proponentes da aprovação e/ou rejeição das propostas/planos de trabalhos encaminhadas, via Plataforma +Brasil ou e-mail cadastrado.	COCIC	A Iniciar	25-ago-22	10-set-22										
Resumo Projeto			A Iniciar												
				De 2022-02-01 até 2022-09-01	De 2022-05-15 até 2022-09-10										
CGDS 2022001 - Webinares - Meta Institucional 2021-2022															
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas			
Planejamento do Projeto - Meta Institucional 11, ciclo 2021/2022	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, metodologia, definição dos eventos, temas/focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	Em Andamento	17-jan-22	31-ago-22		10-mar-22			0					
Definição do modus operandi, Plataforma, para realização dos eventos On line	Reunião, contatos junto a Ascom e CGTI, para definição de ferramenta para realização dos eventos on line que permita participação do público e gravação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	Em Andamento	1-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			0					
Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-mar-22	31-ago-22		31-mar-22			0					
Plano de divulgação dos eventos do Projeto: incluindo os quatro webinars	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	1-abr-22	31-ago-22					0					
Evento On Line 1	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-mar-22	30-abr-22		31-mar-22			0					
Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-mar-22	14-abr-22		10-mar-22			0					
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			0					
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações	CODEM/CGDS	Em Andamento	16-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			0					
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	Em Andamento	16-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			0					
Realização do 1º evento on line	O evento será gravado para fins de disponibilização no you tube da SUDENE	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	1-abr-22	30-abr-22					0					
Evento On Line 2	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-abr-22	31-mai-22					0					
Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-abr-22	17-mai-22					0					
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-abr-22	17-mai-22					0					
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	20-abr-22	17-mai-22					0					
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	A Iniciar	20-abr-22	17-mai-22					0					
Realização do 2º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	2-mai-22	31-mai-22					0					
Evento On Line 3	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jun-22	30-jul-22					0					
Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jun-22	15-jul-22					0					
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jun-22	15-jul-22					0					
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	20-jun-22	20-jul-22					0					
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	A Iniciar	20-jun-22	20-jul-22					0					
Realização do 3º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	1-jul-22	30-jul-22					0					
Realização do 4º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	1-ago-22	31-ago-22					0					
Programação do evento	Definição do tema, da data e horário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jul-22	17-ago-22					0					
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jul-22	17-ago-22					0					
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	A Iniciar	20-jul-22	17-ago-22					0					
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	A Iniciar	20-jul-22	17-ago-22					0					
Evento On Line 4	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jul-22	31-ago-22					0					
Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 4 eventos.	A Meta Institucional 11 do ciclo 2021/2022 será concluída com um relatório que contemple os quatro eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-set-22	30-set-22					0					
Resumo Projeto			Em Andamento												
				De 2022-01-17 até 2022-09-01	De 2022-04-14 até 2022-09-30	-	De 2022-03-10 até 2022-03-31		-	0					

Página 53 de 82

53 de 82

CGDS 2020013 - Empreendedorismo - INSA												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	15-out-20	24-nov-20		15-out-20	24-nov-20		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	19-nov-20	19-nov-20		19-nov-20	19-nov-20		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	GABINETE / INSA	Concluído	26-nov-20	26-nov-20		26-nov-20	26-nov-20		100		
Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE	Concluído	26-nov-20	26-nov-20		26-nov-20	26-nov-20		100		
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	30-nov-20	30-nov-20		30-nov-20	30-nov-20		100		
Descentralização dos créditos	Transferencia de créditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30-nov-20	30-nov-20	465.839,00	30-nov-20	2-out-21	465.839,00	100	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	
	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa;										Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o período informado foi maio-junho/2021.	
	Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado;											
Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semiáriodo brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os grupos das quatro Unidades Multiplicadoras.	INSA	Concluído	1-dez-20	31-dez-21		2-out-21	30-jun-21		100		
Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração. Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semiáriodo, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semiáriodo que fazem parte dos estados participantes do programa;										De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaqTc PB . Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021, Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos as comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.	
	Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção;											
	Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.	INSA	Concluído	1-fev-21	31-mar-21		22-mar-21	30-abr-21		100		
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semiáriodo contemplados no programa.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	Concluído	1-mar-21	31-mar-21		26-mai-21	30-jun-21		100	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a fmatutura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.	
	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas;											
	Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado);											
Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa. Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.	INSA	Em Andamento	1-dez-20	30-nov-22		1-jun-21			20	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.	
	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa;										Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiáriodo do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram tres delas: 1.Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados);	De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).
	Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.	INSA	Atrasado	1-dez-20	31-jan-22		1-jul-21			50	2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021);	
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiáriodo participantes do Programa de Aceleração. Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	Atrasado	1-fev-21	31-jan-22					0	3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021);	
	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados											
	Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos;	INSA	Atrasado	1-mar-21	30-nov-22					0		
Prestação de Contas Resumo Projeto	Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.											
	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	Em Andamento	1-dez-20	30-nov-22		10-fev-21			50		
	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED,.	CGDS	Atrasado	1-fev-22	30-abr-22					0		
				De 2020-10-15 até 2022-02-01	De 2020-11-19 até 2022-11-30	465.839,00	De 2020-10-15 até 2021-10-02	De 2020-11-19 até 2021-10-02	465.839,00	68		
CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	19-mai-20	31-jul-20	465.839,00	19-mai-20	22-jun-20		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	1-jul-20	30-set-20		1-jul-20	2-set-20		100		

Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	Concluído	29-jun-20	29-jul-20			29-jun-20	23-jul-20		100	
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	19-mai-20	30-out-20			5-set-20	20-out-20		100	
		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE										
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		Concluído	1-dez-20	31-dez-20	426,47		25-nov-20	30-dez-20	426,47	100	
META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuipe-BA, e do Cariri Paraíba, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Atrasado	1-nov-20	30-jun-21			5-fev-20			10	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.
META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiáriospara melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuipe-BA, e do Cariri Paraíba, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Atrasado	1-jul-21	30-ago-21						0	
Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	Atrasado	30-nov-20	30-set-22						0	
Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados gerados	Embrapa e Sudene	Atrasado	30-nov-20	30-abr-21						0	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		A Iniciar	1-out-22	30-out-22						0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	1-nov-22	15-nov-22						0	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	16-nov-22	30-nov-22						0	
Resumo Projeto			Atrasado									Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas.
				De 2020-05-19 até 2022-11-16	De 2020-07-29 até 2022-11-30	426,47		De 2020-02-05 até 2020-11-25	De 2020-06-22 até 2020-12-30	426,47	42,5	

CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.											
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	CGDS	Concluído	1-dez-20	30-dez-20		1-dez-20	30-dez-20		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	PROCURADORIA	Concluído	21-dez-20	29-dez-20		21-dez-20	29-dez-20		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-20	30-dez-20		26-dez-20	30-dez-20		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-20	30-dez-20		30-dez-20	30-dez-20		100		
		GABINETE	Concluído	2-jan-20	17-jan-20		2-jan-20	17-jan-20		100		
		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE										
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		Atrasado	1-dez-20	31-dez-21	505.872,00	30-dez-21			80		Análise de ofício enviado pela UPE para ajustes no cronograma e valor das parcelas. Ajustado. Convênio em duas parcelas
Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilizacao de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicacao da metodologia NE 4.0	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e inicio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	Atrasado	1-fev-21	30-jul-21		1-fev-21			70	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com o coordenador geral do programa,	Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais montada. Identificação de empresas participantes em andamento e em processo de realização da adesão ao programa. Ajustes no termo de referencia, diante da continuidade da pandemia e no processo de adesão ao programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em setembro/outubro. Aulas programadas para novembro/dezembro 2021.
Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, aulas à distância e presenciais (quando as condições da pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Em Andamento	1-out-21	30-jun-22		1-out-21			20	Grade finalizada. Início das construção do edital de seleção dos alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para início em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado para final de 2022.	Edital de seleção pronto. Abertura prevista para 4 de janeiro de 2022, edital de seleção dos professores, a ser lançado dia 11 de janeiro. Aulas a iniciar na segunda quinzena de fevereiro.
		UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto										
Meta 3: Elaboração de planos de ação	Realização dos projetos/planos de ação em industria 4.0, como resultado da Residencia, em cada uma das 40 empresas parcipantes		Atrasado	1-jan-22	30-ago-22					0		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-jan-22	28-fev-22					0		
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Atrasado	30-jan-22	30-mar-22					0		
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Atrasado	1-mar-22	30-mai-22	762.808,00				0		
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE e Sudene	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.	UPE	A Iniciar	1-out-22	15-out-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	16-out-22	30-out-22					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	1-nov-22	30-nov-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-01-02 até 2022-11-01	De 2020-01-17 até 2022-11-30	1.268.680,00	De 2020-01-02 até 2021-12-30	De 2020-01-17 até 2020-12-30	-	41,875		

CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19	Página 55 de 82	1-set-19	28-abr-20		100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Manguê Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica nº 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	55 de 82

		Nutes/UFPE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		1-set-19	28-abr-20		100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimento das Adm. Locais (8917).	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	CODS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		2-jun-20	12-jun-20		100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Análise da proposta	Análise da proposta											
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		12-jun-20	27-Jul-20		100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		27-jul-20	18-agosto-20		100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
Aprovação do parecer técnico Formalização do TED	Aprovaao do parecer técnico (gestor) Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE CGDS/SUDENE	Concluído Concluído	1-set-19 1-set-19	31-dez-19 31-dez-19		19-agosto-20 20-agosto-20	21-agosto-20 16-nov-20		100 100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária. Extrato publicado em 17/11/2020.	
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	1-nov-20	30-nov-20	969,57	18-nov-20	15-dez-20	969,57	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	1-dez-20	31-dez-20		16-nov-20	31-dez-20		100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor prepo ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	1-fev-21	15-mar-21		2-fev-21	3-mar-21		100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRONE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on-line.	
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	1-mar-21	31-mar-21		3-mar-21	12-mai-21		100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magda para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Atrasado	1-Jan-21	30-abr-21		1-Mar-21			80	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Atrasado	1-Jan-21	31-Mai-21		1-Mar-21			60	A identificação dos núcleos de tele-saúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapas 1.3: Modernizar a plataforma de educação INDIU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Em Andamento	1-Mar-21	30-Jun-22		1-Mar-21			80	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanhamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Concluído				1-Jun-21	30-set-21		70	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/11/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDIU com tutoria por 3 (três) meses após realiação do curso.	Etapas 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realiação do curso.	Nutes/UFPE	Em Andamento	1-May-21	31-Dec-22		6-dez-21			20	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022.	
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDIU com tutoria por 3 (três) meses após realiação do curso.	Etapas 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar e estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Atrasado	1-Apr-21	13-May-23					0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestações de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	13-May-23	13-May-24					0		
Acompanhamento Técnico Resumo Projeto	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar Atrasado							0		De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
				De 2019-09-01 até 2023-05-13	De 2019-12-31 até 2024-05-13	969,57	De 2019-09-01 até 2021-12-06	De 2020-04-28 até 2021-09-30	969,57	74,21052632		
CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato												

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Inicio	Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastromento e divulgação	Cadastromento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CADS	Concluido				3-jun-20	25-jun-20		100		

Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB- SUDENE	Concluído					1-ago-20	13-ago-20		100		
Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas		Concluído					12-ago-20	28-dez-20		100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-mar-21	30-mai-21			24-ago-21			20	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, ofício analisado, formato definido. Em 24/8/21, conveniente informa que o edital para chamamento público foi publicado.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Próxima reunião de acompanhamento técnico agendada para 20/1/22.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapas previstas nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	Atrasado	4-mai-21	30-ago-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	Atrasado								0		
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-fev-21							0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	Atrasado	28-dez-20	1-fev-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Acompanhamento da Meta 1	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-fev-21	1-abr-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Acompanhamento da Meta 2	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-abr-21	1-jun-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-jun-21	1-jun-22						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-jun-21	1-dez-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado								0		
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	A Iniciar	1-jun-22	26-jul-22						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	25-set-22	25-nov-22						0		
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatório parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar								0		
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2020-12-28 até 2022-09-25	De 2021-02-01 até 2022-11-25			De 2020-06-03 até 2021-08-24	De 2020-06-25 até 2020-12-28		-	22,60869565	
CGDS 2020008 - Biogás - INSA													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.												
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira		CGDS	Concluído	15-dez-20	23-dez-20		15-dez-20	23-dez-20		100			
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21-dez-20	25-dez-20		21-dez-20	25-dez-20		100			
		INSA e COCIC/ SUDENE											
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED		Concluído	17-dez-20	21-dez-22		17-dez-20	21-dez-20		100			
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	Concluído	23-dez-20	23-dez-23		23-dez-20	23-dez-20		100			
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	28-dez-20	28-dez-20		28-dez-20	28-dez-20		100			
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	28-dez-20	28-dez-20	550.000,00	28-dez-20	26-fev-21	550.000,00	100	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021.		
META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapas 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	Parado	1-jan-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
												Aguardando entrega do relatório e ofício do parceiro indicando o responsável técnico. A previsão era de que fosse entregue 15 dias após a 1ª reunião de acompanhamento. Até o presente momento não foi recebido nenhum documento pela equipe técnica SUDENE.	
META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definidos pelo INSA	Etapas 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB	INSA	Parado	1-jan-21	31-dez-22					1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 27/05/2021		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definidos pelo INSA	ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	Parado	1-abr-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapas 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE	INSA	Parado	1-set-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.	
Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	Atrasado	1-jan-22	22-dez-22					0			
Resumo Projeto			Parado										
				De 2020-12-15 até 2022-01-01	De 2020-12-23 até 2023-12-23	550.000,00	De 2020-12-15 até 2020-12-28	De 2020-12-21 até 2021-02-26	550.000,00	54,54545455			
CGDS 2020007 - Plataforma Digital - UPE													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11-dez-19	27-dez-19			11-dez-19	27-dez-19		100	
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26-dez-19	27-dez-19			26-dez-19	27-dez-19		100	
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-19	30-dez-19			26-dez-19	30-dez-19		100	
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-19	30-dez-19			30-dez-19	30-dez-19		100	
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17-jan-19	17-jan-19			17-jan-19	17-jan-19		100	
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-dez-19	28-fev-22	649.777,57					0	
META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	Em Andamento	30-dez-19	30-jun-22			5-fev-20			40	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio
META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	Em Andamento	1-jul-21	30-set-22			5-fev-20			50	Diversas reuniões foram realizadas, sendo ultima reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência. Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-mar-22	30-abr-22						0	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado	1-out-21	30-out-21						0	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	1-nov-21	30-nov-21						0	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	1-dez-21	15-dez-21						0	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2019-01-17 até 2022-03-01	De 2019-01-17 até 2022-09-30	649.777,57		De 2019-01-17 até 2020-02-05	De 2019-01-17 até 2019-12-30	-	49,16666667	
CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	12-nov-19	27-dez-19		12-nov-19			100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		27-dez-19					100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		30-dez-19			30-dez-19		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		30-dez-19					100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído		17-jan-19					100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	3-jan-21	30-mar-21	241.376,80			241.376,80	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.
Meta 1: Mobilizacao de empresas e aplicacao da metodologia PE 4.0	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e inicio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE	Concluído	30-set-20	30-mai-20		2-mai-20			100	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Atrasado	30-set-20	30-ago-21		30-set-20			90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnostico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021.	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	4-jan-21	31-jul-21		5-mai-21			60	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	6-jan-21	28-fev-22	98.623,20				0	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado	9-jan-21	30-mar-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado	10-jan-21	30-out-21					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	11-jan-21	30-nov-21					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	12-jan-21	15-dez-21					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2019-11-12 até 2021-01-12	De 2019-01-17 até 2022-03-30	340.000,00	De 2019-11-12 até 2021-05-05	2019-12-30	241.376,80	60,71428571		
CGDS 2020005 - Nuvem UPE												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11-dez-19	27-dez-19		11-dez-19			100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26-dez-19	27-dez-19					100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-19	30-dez-19			30-dez-19		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-19	30-dez-19					100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17-jan-19	17-jan-19		17-jan-19			100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-abr-21	30-abr-21	319.360,49	20-mai-21		319.360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados

Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Manguê Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo manguê Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Atrasado	1-mai-21	30-nov-21			5-fev-20			50	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de caocitação que pode ser iniciada à distância. Necessidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das JOrnadas, adiaram este CÔnvenio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto.
Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Manguê Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Atrasado	1-abr-21	30-out-21			28-ago-20			60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distancia, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequência e da perspectiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-abr-21	30-jan-22			30-set-21			30		
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Atrasado	1-jul-20	30-set-21			7-jan-21			90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-jul-21	28-fev-21	105.639,51					20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado	1-out-21	10-nov-21						0		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado.
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela conveniente.		Atrasado	16-nov-21	30-nov-21			1-dez-21			0		No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	1-dez-21	15-dez-21			6-dez-21			0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	16-dez-21	30-dez-21			6-dez-21			0		
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2019-01-17 até 2021-12-16	De 2019-01-17 até 2022-01-30	425.000,00	De 2019-01-17 até 2021-12-06	2019-12-30		319.360,49	56.66666667		
CGDS 2020002 - Palma - EPAMIG 2020													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDE NE	Concluído				4-fev-20	25-mai-20		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.		
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído				5-jun-20	5-jul-20		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil		
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído				6-jul-20	9-set-20		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.		
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído				10-set-20	11-dez-20		100	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDEN E	Concluído				#####	5-jan-21		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.		
Realização de proc. Licitatório Contrapartida	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG EPAMIG/MG	Atrasado Atrasado	1-fev-20 2-jan-20	31-jan-22 31-mai-20		4-abr-21			10 0	Processo licitatório em elaboração.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-dez-20	31-dez-20	200.000,00				0	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condicionada a realização do processo licitatório pela conveniente e ao aceite do concedente (Pl 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização não foram identificados avanços nestes processos.	
Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaiba - CEJA; 1.2) aquisição de mudas; 1.3) implantação do sistema de irrigação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0			
Meta 2 -Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0			
Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às propriedades selecionadas; 3.4) análise dos solos; 3.5) distribuição das mudas aos agricultores.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0			
Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0			
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0			
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	31-dez-23	30-jun-24					0			
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2020-01-02 até 2023-12-31	De 2020-05-31 até 2024-06-30	201.000,00	De 0200-11-12 até 2021-04-04	De 2020-05-25 até 2021-01-05	-	36,42857143			
CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN													

Página 59 de 82

59 de 82

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	6-abr-20	25-mai-20		6-abr-20	25-mai-20		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	5-jun-20	5-jul-20		5-jun-20	5-jul-20		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	6-jul-20	30-nov-20		6-jul-20	3-nov-20		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	6-jul-20	31-dez-20		10-set-20	23-dez-20		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído	6-jul-20	31-dez-20		6-jul-20	31-dez-20		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 4/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Atrasado	1-jan-21	31-jan-21					15	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitatório, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Parado	1-fev-21	28-fev-21	19.961,00				0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Parado	1-fev-21	28-fev-21	100,00				0	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos.	
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	9,44				0		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	8,20				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-set-21	30-set-21	99,41						
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochinilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	150,83				0		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochinilha do carmin por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochinilha do carmin - ampliação	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	31,14						
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo conveniente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	A Iniciar	31-dez-23	30-jun-24					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	1-jan-24	31-dez-24					0		
Resumo Projeto			Parado									
				De 2020-04-06 até 2024-01-01	De 2020-05-25 até 2024-12-31	20.360,02	De 2020-04-06 até 2020-09-10	De 2020-05-25 até 2020-12-31	-	32,1875		

CGDS 2019001 - Palma - EPAMIG 2019

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	6-dez-19	11-dez-19		6-dez-19	11-dez-19		100		
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	6-dez-19	11-dez-19		6-dez-19	11-dez-19		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		13-dez-19	31-dez-19		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		13-dez-19	31-dez-19		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		30-dez-19	30-dez-19		100		
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		31-dez-19	31-dez-19		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		31-dez-19	31-dez-19		100		
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Atrasado	1-fev-20	31-jan-22		4-abr-21			10	A Conveniente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Atrasado	2-jan-20	31-mai-20	163.000,00				0		
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-dez-20	31-dez-20	43.730,00				0		
Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	102.180,63				0		
Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	56.453,84				0		
Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	33.160,29				0		
Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	15.940,51				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	A Iniciar	2-mar-23	1-mai-23					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2019-12-06 até 2023-03-02	De 2019-12-11 até 2023-05-01	414.465,27	De 2019-12-06 até 2021-04-04	De 2019-12-11 até 2019-12-31	-	44,375		

CGDS 2018005 - Reuso - Embrapa Semiárido

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	27-mai-18	17-jun-18		27-mai-18	17-jun-18		100	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	

Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	15-out-18	31-out-18		15-out-18	31-out-18		100	
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	Concluído	1-nov-18	15-nov-18		9-nov-18	4-dez-18		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	Concluído	15-nov-18	31-dez-18		6-dez-18	6-dez-18		100	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	15-nov-18	31-dez-18		7-dez-18	26-fev-19		100	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		Concluído	7-dez-18	31-dez-18	90.000,00	7-dez-18	13-fev-19	90.000,00	100	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	Concluído	1-nov-18	31-dez-18	8.800,00	19-fev-19	18-abr-19		100	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida
Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.	Embrapa	Atrasado	1-jan-19	30-jun-21	20.275,00	13-fev-19		1.200,00	70	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a caracterização ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a confecção de mapas e imagens de drones.
Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	Atrasado	1-mar-19	30-jun-21	19.410,00	13-fev-19		19.410,00	20	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a viabilidade econômica do sistema quanto ao uso de energia solar e elétrica será realizada, os dados estão sendo coletados para essa avaliação e será apresentado no próximo relatório.
Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	Atrasado	1-jan-19	30-jun-21	4.973,00	1-set-20			50	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório parcial datado de 10/6/21.
Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	Atrasado	1-fev-19	30-jun-21	188.081,86	13-fev-19		62.190,00	75	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aitum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto trará informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade Sítio Coelho.
Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	Concluído	1-mar-19	30-jun-21	19.000,00	1-out-19	31-mai-21	7.200,00	100	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há informações sobre os outros cursos realizados.
Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	Concluído	1-mai-19	30-jun-21	33.139,14	1-out-19	31-mai-21		100	O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz informações de avaliação da qualidade da água e do solo.
Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	Atrasado	1-jan-19	30-jun-21	1.196,00	4-jan-21			50	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração com a galinha caprina está sendo realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.
Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reúso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	Atrasado	1-abr-19	30-jun-21	31.592,00	4-jan-21			50	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	1-jan-19	28-fev-19		2-mai-19	6-jun-19		100	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-mai-19	30-jun-19	212.767,00	5-jun-19	21-jun-19	212.767,00	100	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	1-out-19	30-nov-19		15-dez-19	19-mai-20		100	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de atividades do projeto referente ao período de dezembro de 2020 a maio de 2021.
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-mar-20	1-abr-20	23.700,00	14-mar-20	9-set-20	36.750,00	100	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	Em Andamento	30-jun-21	30-jun-22		1-mai-21				Esta linha deve ser retrada, pois não há necessidade da análise da prestação de contas parcial dessa parcela porque é a última.
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	Em Andamento	1-jan-22	31-dez-22		3-jan-22			0	Então, deve-se apresentar a Prestação de Contas Final

Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22					0		Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Embrapa Semiárido, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22					0			
Resumo Projeto			Atrasado										
				De 2018-05-27 até 2022-01-01	De 2018-06-17 até 2022-12-31	652.934,00	De 2018-05-27 até 2022-01-03	De 2018-06-17 até 2021-05-31	429.517,00	70,2173913			
CGDS 2018004 - Reuso - Caraúbas													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Acções Corretivas	
Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	Concluído	15-out-18	21-dez-18		8-out-18	31-dez-18		100	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reuso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.		
Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	Concluído	31-dez-18	31-mar-19		1-jan-19			100			
											O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PPF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	Concluído	31-mar-19	1-jul-19		31-mar-19	21-ago-20		100	342/2019.		
Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	Concluído	1-jul-19	19-jul-19		31-ago-20	19-out-20		100	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.		
											Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Conveniente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R\$		
Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	Concluído	1-out-20	30-nov-20		29-out-20	3-fev-21		100	99.673,80 para R\$ 102.896,80.		
Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do conveniente	Caraúbas	Atrasado	1-jan-21	30-set-21	20.000,00	27-jan-21			33	1ª parcela no valor de R\$ 1.387,00 paga pelo conveniente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.		
												Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 19/10/21, o conveniente continua impedido de receber recursos por registro no CAUC. Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.	
Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	Parado	1-fev-21	28-fev-21	102.896,80	1-fev-21			0			
Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	Parado	1-fev-21	28-fev-21					0	Aguardando liberação da 1ª parcela.		
Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	Parado	1-fev-21	31-mar-21					0	Aguardando liberação da 1ª parcela.		
Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	Atrasado	1-abr-21	30-nov-21					0			
Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A Iniciar								O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da		
1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	Atrasado	1-out-19	31-out-19					0	instalação dos sistemas de reúso.		
Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	Atrasado	1-set-21	30-set-21	444.472,52				0			
Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	Atrasado	1-set-21	31-jul-22					0			
	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	A Iniciar	1-ago-22	31-ago-22					0			
Articulação com controle social e avaliação do projeto	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A Iniciar							0			
2ª Visita técnica	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	A Iniciar	1-set-22	31-dez-22					0			
2ª Prestação de contas parciais	Envio da prestação de contas pelo conveniente	Caraúbas	A Iniciar	1-jan-23	28-fev-23					0			
Prestação de contas final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	A Iniciar	1-jan-23	30-jun-23					0			
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	A Iniciar	1-jul-23	31-dez-23					0			
Análise da prestação de contas financeiras			Parado										
Resumo Projeto				De 2018-10-15 até 2023-07-01	De 2018-12-21 até 2023-12-31	567.369,32	De 2018-10-08 até 2021-02-01	De 2018-12-31 até 2021-02-03	-	26,65			
CGDS 2018003 - Palma - EPAMIG 2018													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Acções Corretivas	
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	10-abr-18	15-mai-19		10-abr-18	15-mai-19		100			
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	16-mai-18	7-jun-18		16-mai-18	7-jun-18		100			
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	16-jun-18	16-jun-18		16-jun-18	16-jun-18		100			
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	17-jun-18	12-dez-18		17-jun-18	12-dez-18		100			
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-18	13-dez-18		13-dez-18	13-dez-18		100			
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	14-dez-18	26-dez-18		14-dez-18	26-dez-18		100			
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	27-dez-18	11-jan-19		27-dez-18	11-jan-19		100			
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Atrasado	31-dez-18	24-dez-21		17-dez-19			10	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório (processos em elaboração).	

[illegible]

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		20	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
Reuniões Externas			Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		100	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
Reuniões Internas (CGDS)			Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		100	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
Articulações com Parceiros.		CGDS/DPLAN	Concluído							40	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
Articulação com a Embrapa.	Contato por telefone.		Concluído	19-mar-18	17-jul-18		19-mar-18	17-jul-18		100	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	
Articulação com a FAO.			Concluído	20-ago-18	28-set-18			3-set-18		100	Foi identificada a publicação "Ecologia del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.	
Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos		Concluído	28-ago-18	28-set-18		28-ago-18	28-set-18		100	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos advindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF		Concluído	3-set-18	3-set-18		3-set-18	3-set-18		100	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	

													Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação. Aguardando definição da gestão quanto ao encaminhamento a ser dado a este projeto.
Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações		CGDS/DPLAN	Parado								2	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
Parceria com Embrapa			Cancelado									Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	
Parceria com a FAO. Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	Parado	3-set-18	31-out-18			20-set-18			10	FAO.	
			Parado	3-set-18	30-mar-18			3-set-18			4	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução. Resumo Projeto			Parado	1-ago-18	30-mar-18			3-set-18			20	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralisada.	
			Parado										
				De 2017-09-04 até 2018-09-03	De 2018-03-16 até 2018-10-31	-		De 2017-09-04 até 2018-09-20	De 2018-03-16 até 2018-09-28	-	58		
CGDS 2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	26-fev-14	17-abr-14		26-fev-14	17-abr-14		100			
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	26-fev-14	17-abr-14		26-fev-14	17-abr-14		100			
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15-abr-14	15-out-14		15-abr-14	15-out-14		100			
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15-out-14	17-out-14		15-out-14	17-out-14		100			
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	17-out-14	18-dez-14		17-out-14	18-dez-14		100			
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	18-dez-14	23-dez-14		18-dez-14	23-dez-14		100			
Formalização do Convênio Liberação 1ª parcela	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGC/SUDENE CGDS/SUDENE	Concluído Concluído	31-dez-14 1-dez-14	8-jan-15 31-dez-14	206.151,42	31-dez-14 8-abr-15	8-jan-15 22-abr-15	206.151,42	100 100	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).		
Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapla 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	3-ago-15	30-nov-16		3-out-15	3-mai-16		100	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.		
Confecção de 50 blocos multinutricionais	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapla 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	21-set-15	30-nov-16		4-nov-15	5-nov-16		100			
Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapla 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	Parado	21-set-15	22-mar-20		24-out-15			96	Foram distribuídos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.	
Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapla 02 - Meta 02) 36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapla 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	Parado	13-out-15	22-mar-20		3-dez-15			80	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.	
36 Visitas técnicas para acompanhamento		EMPAER-PB	Concluído	21-set-15	22-dez-19		14-set-15	4-jan-19		100	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento		
Realização de 36 cursos de capacitação Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03) Realização de visita técnica para acompanhamento	EMPAER-PB CGDS/SUDENE	Atrasado Concluído	5-out-15 1-ago-16	22-mar-20 5-ago-16		27-nov-15 10-ago-16			65 100	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia. *A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, em particular, as capacitações. No período até 30/06/21, como encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a retomada das ações pendentes, quando possível.	*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e análise preliminar da proposta de ajuste do plano de trabalho. Recebimento de solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividade do projeto. A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto. Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste projeto.	
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	1-ago-16	31-ago-16	137.434,28	23-mar-18	23-mar-18	137.434,28	100	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A Iniciar										
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. Resumo Projeto	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Atrasado	26-dez-21	26-dez-22					0	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer informou que concluiu o módulo restante.	A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto. Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Convenente, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.	
			Parado										
				De 2014-02-26 até 2021-12-26	De 2014-04-17 até 2022-12-26	343.585,70	De 2014-02-26 até 2018-03-23	De 2014-04-15 até 2019-01-04	343.585,70	85,61111111			
CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-12	11-mai-12	20-mar-12	11-mai-12	11-mai-12		100			
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-12	19-abr-12		20-mar-12	19-abr-12		100			

3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	20-abr-12	9-mai-12			20-abr-12	9-mai-12		100	
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	11-mai-12	11-mai-12			11-mai-12	11-mai-12		100	
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	24-abr-12	8-jun-12			24-abr-12	8-jun-12		100	
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	9-jun-12	14-dez-12			9-jun-12	14-dez-12		100	
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	28-dez-12	28-dez-12			28-dez-12	28-dez-12		100	
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	3-jan-13	3-jan-13			3-jan-13	3-jan-13		100	
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	1-ago-13	31-ago-13	265.241,25		15-ago-13	15-ago-13	265.241,25	100	
10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	Concluído	1-set-13	24-jun-20			15-nov-14	6-dez-19		100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R\$ 356.560,00 META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	1-jul-14	24-jun-20			8-dez-14			100	
12. Realizar 61 encontros	Visita técnica de acompanhamento	SEMAS/PE	Concluído	8-dez-14	29-jun-16			8-dez-14	29-jun-16		100	
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	10-dez-14	11-dez-14			10-dez-14	11-dez-14		100	
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	8-jan-18	31-ago-18	265.241,25		20-ago-18	20-ago-18	265.241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	9-jul-18	24-jun-20			9-jul-18	30-jul-19		100	
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	Atrasado	5-nov-18	24-jun-20						40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Conveniente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	1-mai-14	24-jun-20			1-mai-14	4-mar-21		100	
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	1-mai-14	15-jun-17			1-mai-15	31-out-17		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	1-nov-18	24-jun-20			17-fev-20	4-mar-21		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-19	11-jul-19			20-mar-19	11-jul-19		100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22						0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2012-03-20 até 2022-01-01	De 2012-04-19 até 2022-12-31	530.482,50		De 2012-03-20 até 2020-02-17	De 2012-04-19 até 2021-03-04	530.482,50	92,38095238	

COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES																
Emendas Parlamentares																
Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Inicição	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status	
COCIC/2016001	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	250.000,00	274.321,90	250.000,00	100					Não se Aplica	Concluído	Concluído	22-mar-19	Concluído	
COCIC/2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	250.000,00	262.869,00	250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24-ago-22	Em Andamento	
COCIC/2016003	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	500.000,00	514.509,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24-ago-22	Em Andamento	
COCIC/2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1.000.000,00	1.020.000,00	813.633,00	81	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1.172.497,00	1.234.958,00	926.955,00	79	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	18-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	600.000,00	611.925,00	559.953,00	93	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	23-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	500.000,00	503.902,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2016009	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	500.000,00	526.971,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	6-set-19	Concluído	
COCIC/2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	500.000,00	501.000,00	400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-jul-24	Em Andamento	
COCIC/2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	1.000.000,00	1.001.500,00	500.000,00	50	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2017003	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	500.000,00	500.800,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	28-fev-21	Atrasado	
COCIC/2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	385.000,00	436.300,00	385.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2017005	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	500.000,00	500.800,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	23-dez-20	Atrasado	
COCIC/2017008	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1.000.000,00	1.274.003,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	21-jan-22	Atrasado	
COCIC/2017009	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1.989.238,00	1.991.738,00	1.989.238,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	30-ago-22	Em Andamento	
COCIC/2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1.500.000,00	1.548.119,00	1.500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	1-mar-22	Atrasado	
COCIC/2017011	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	500.000,00	501.000,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	9-nov-21	Concluído	
COCIC/2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	500.000,00	520.000,00	400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-mai-24	Em Andamento	
COCIC/2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	700.855,00	705.855,00	490.599,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2017014	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	250.000,00	250.500,00	250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24-ago-22	Concluído	
COCIC/2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	250.000,00	274.181,00	44.382,00	18	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-nov-24	Em Andamento	
COCIC/2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	250.000,00	274.342,00	50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	264.608,00	266.608,00	52.922,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-abr-24	Em Andamento	
COCIC/2017021	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	390.020,00	433.931,00	390.020,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28-mai-23	Em Andamento	
COCIC/2017022	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	350.000,00	357.000,00	350.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	17-ago-21	Concluído	
COCIC/2017024	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	250.493,00	260.930,00	210.000,00	84	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	21-set-22	Em Andamento	
COCIC/2017025	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	1.000.000,00	1.025.964,00	700.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-23	Em Andamento	
COCIC/2018001	Pavimentação - Município de Uruçuca	BA	1.000.000,00	1.002.500,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	250.000,00	252.500,00	200.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28-jul-23	Em Andamento	
COCIC/2018003	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	586.135,00	633.026,00	586.135,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-23	Em Andamento	
COCIC/2018004	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	250.000,00	251.000,00	175.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19-mai-22	Em Andamento	
COCIC/2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	250.000,00	251.628,00	50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2018006	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1.000.000,00	1.025.000,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento	
COCIC/2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1.500.000,00	1.673.298,00	1.500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24-jan-23	Em Andamento	
COCIC/2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	250.000,00	252.500,00	50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-out-24	Em Andamento	
COCIC/2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1.755.787,00	1.773.345,00	1.298.524,73	73,96	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	27-set-23	Em Andamento	
COCIC/2018010	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	BA	150.000,00	167.500,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento	
COCIC/2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	400.000,00	416.000,00	400.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-22	Em Andamento	
COCIC/2018012	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	300.000,00	451.240,00	-	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			19-fev-23	Parado	
COCIC/2018013	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	250.000,00	251.000,00	250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	21-fev-23	Em Andamento	

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Org./ Fin.	Inicição	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	700.000,00	703.500,00	490.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018015	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1.000.000,00	1.001.100,00	995.819,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018016	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	250.000,00	258.607,00	250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24-fev-23	Concluído
COCIC/2018017	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	100.000,00	104.000,00	100.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24-fev-22	Concluído
COCIC/2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	250.000,00	250.744,00	46.629,00	19	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	500.000,00	501.000,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	250.000,00	255.000,00	5.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	250.000,00	259.298,00	200.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	4-nov-23	Em Andamento
COCIC/2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	250.000,00	258.524,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	8-ago-24	Em Andamento
COCIC/2018023	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	802.937,00	811.047,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	300.000,00	303.000,00	300.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Morro do Mangue/RN.	RN	150.000,00	151.000,00	150.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24-jul-23	Em Andamento
COCIC/2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	250.000,00	253.000,00	175.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	500.000,00	512.500,00	350.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-23	Em Andamento
COCIC/2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	250.000,00	251.031,00	115.000,00	46	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018029	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	500.000,00	505.000,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-22	Em Andamento
COCIC/2018030	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	500.000,00	505.000,00	-	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			28-fev-22	Parado
COCIC/2018031	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajuá em Maxaranguape/RN.	RN	250.000,00	253.241,00	183.485,84	73	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-nov-23	Em Andamento
COCIC/2018032	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	3.000.000,00	3.425.197,00	3.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018033	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	380.000,00	381.000,00	380.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	23-jun-23	Concluído
COCIC/2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	600.000,00	602.000,00	600.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-23	Em Andamento
COCIC/2018035	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	260.000,00	267.527,00	159.709,00	61	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar	17-fev-23	Em Andamento
COCIC/2018036	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1.000.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19-fev-23	Em Andamento
COCIC/2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	2.000.000,00	2.004.800,00	2.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	100.000,00	101.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018039	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	250.000,00	256.187,00	250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Atrasado	Atrasado	28-fev-22	Atrasado
COCIC/2018040	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	500.000,00	505.000,00	350.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-nov-23	Em Andamento
COCIC/2018041	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	500.000,00	505.000,00	350.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-nov-23	Em Andamento
COCIC/2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1.438.556,00	1.440.477,00	1.187.711,00	83	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018043	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	500.000,00	501.000,00	350.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28-out-23	Em Andamento
COCIC/2018044	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1.050.000,00	1.060.500,00			Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			26-out-22	Parado

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orc./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2018045	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	500.000,00	500.980,00	500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10-set-23	Em Andamento
COCIC/2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	250.000,00	252.637,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-out-23	Em Andamento
COCIC/2018047	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	300.000,00	300.400,00	300.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018048	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1.000.000,00	1.005.000,00	500.000,00	50	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	28-jun-24	Em Andamento
COCIC/2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	300.000,00	301.000,00	150.000,00	50	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	9-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018050	Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraubas/RN.	RN	250.000,00	332.853,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-jun-23	Em Andamento
COCIC/2018051	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos- Texeira de Freitas	BA	150.000,00	156.000,00	150.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	17-ago-21	Concluído
COCIC/2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	800.000,00	832.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018053	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barroão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24-fev-23	Em Andamento
COCIC/2018054	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	3.000.000,00	3.065.662,00	2.810.590,00	94	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24-ago-22	Concluído
COCIC/2018055	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	500.000,00	501.000,00	400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-ago-23	Em Andamento
COCIC/2018056	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	350.000,00	350.500,00	70.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27-nov-24	Em Andamento
COCIC/2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	500.000,00	500.501,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2018058	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	BA	389.158,00	389.158,00	-	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	250.000,00	255.996,00	162.500,00	65	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019002	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	RN	300.000,00	312.836,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19-jan-25	Em Andamento
COCIC/2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	250.000,00	254.837,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-jun-23	Em Andamento
COCIC/2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	250.000,00	257.705,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-dez-24	Em Andamento
COCIC/2019005	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	250.000,00	260.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019006	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	850.000,00	855.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	9-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019007	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	320.000,00	393.325,00	320.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	28-mai-23	Em Andamento
COCIC/2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	291.831,00	292.431,00	180.000,00	62	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-ago-23	Em Andamento
COCIC/2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	900.000,00	1.064.313,00	900.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	8-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	300.000,00	301.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	7-set-23	Em Andamento
COCIC/2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1.700.000,00	1.707.445,00	340.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-fev-25	Em Andamento
COCIC/2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	500.000,00	607.329,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	300.000,00	301.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	6-dez-23	Em Andamento
COCIC/2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	250.000,00	254.864,00	50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	9-jun-24	Em Andamento
COCIC/2019015	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	260.000,00	265.000,00	220.087,00	85	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27-jul-23	Em Andamento
COCIC/2019016	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	9-fev-24	Concluído
COCIC/2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	700.000,00	703.867,00	280.000,00	40	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-fev-25	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orc./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2019018	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	300.000,00	305.115,00	60.000,00	20	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-ago-23	Em Andamento
COCIC/2019019	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	300.000,00	306.000,00	300.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10-dez-23	Em Andamento
COCIC/2019020	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	2.410.387,00	3.237.722,00	2.086.232,00	87	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	2.000.000,00	2.237.065,00	1.447.000,00	72	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	250.000,00	251.000,00	50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10-ago-23	Em Andamento
COCIC/2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1.700.000,00	1.723.118,00	340.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	250.000,00	251.757,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019025	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	779.525,00	810.705,00	779.525,47	87	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1.000.000,00	1.015.647,00	736.111,00	83	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	1-mar-24	Em Andamento
COCIC/2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipangaçu/RN.	RN	250.000,00	259.999,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18-dez-23	Em Andamento
COCIC/2019028	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1.000.000,00	1.027.826,00	1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	2.000.000,00	2.216.520,00	2.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1.000.000,00	1.005.000,00	700.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	300.000,00	310.000,00	60.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28-jan-24	Em Andamento
COCIC/2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUIQUE/PE	PE	600.000,00	602.868,00	240.000,00	40	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	700.000,00	770.735,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	300.000,00	310.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1.000.000,00	1.010.000,00	846.588,72	85	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	350.000,00	378.000,00	70.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-fev-24	Em Andamento
COCIC/2019037	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	800.000,00	801.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-fev-24	Em Andamento
COCIC/2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	500.000,00	500.501,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-set-24	Em Andamento
COCIC/2020002	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	250.000,00	259.040,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-set-24	Em Andamento
COCIC/2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	150.000,00	152.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-set-23	Em Andamento
COCIC/2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	450.227,00	460.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25-out-23	Em Andamento
COCIC/2020005	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	150.000,00	154.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-out-23	Em Andamento
COCIC/2020006	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	1.000.000,00	1.010.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-fev-24	Em Andamento
COCIC/2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	250.000,00	251.669,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16-fev-24	Em Andamento
COCIC/2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	250.000,00	266.403,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17-jun-23	Em Andamento
COCIC/2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	150.000,00	185.459,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24-jul-23	Em Andamento
COCIC/2020010	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	250.000,00	252.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31-mar-24	Em Andamento
COCIC/2020011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	300.000,00	350.168,00	60.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-jan-25	Em Andamento

Name	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC/2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL.	BA	1.000.000,00	1.005.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	500.000,00	501.040,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20-nov-25	Em Andamento
COCIC/2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	500.000,00	502.942,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-nov-24	Em Andamento
COCIC/2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	500.000,00	557.054,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-mai-24	Em Andamento
COCIC/2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	500.000,00	545.826,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20-nov-24	Em Andamento
COCIC/2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAIRAS - CE	CE	500.000,00	534.344,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21-nov-25	Em Andamento
COCIC/2021006	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SERRITA/PE.	PE	307.230,00	371.976,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021007	aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sítio Varzinha dos Grossos	PE	389.158,00	389.158,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-mai-26	Em Andamento
COCIC/2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	502.465,00	500.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22-dez-24	Em Andamento
COCIC/2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	184.338,00	184.338,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13-fev-24	Em Andamento
COCIC/2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	3.150.000,00	2.984.100,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15-fev-24	Em Andamento
COCIC/2021011	Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	389.158,00	389.158,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	1.021.208,00	1.000.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14-dez-24	Em Andamento
COCIC/2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	368.676,00	368.676,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021014	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associação de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	PE	389.158,00	389.158,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empicarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	1.005.808,00	1.000.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	9-dez-25	Em Andamento
COCIC/2021016	Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	PE	307.230,00	390.000,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021017	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	368.676,00	372.376,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29-jan-24	Em Andamento
COCIC/2021018	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Município de João Alfredo/PE.	PE	530.750,00	606.234,77	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021019	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	1.116.533,34	1.078.135,24	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	1-ago-25	Em Andamento
COCIC/2021020	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	434.250,00	449.276,71	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18-fev-25	Em Andamento
COCIC/2021021	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	PE	368.676,00	368.676,00	-	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18-fev-25	Em Andamento

COORDENAÇÃO-GERAL DE FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO

CGDF 20220007 - MEZ 2

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	1-set-21	1-out-21		1-set-21	24-set-21			Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 630/2021	
Análise do Projeto		BB	Concluído	23-dez-21	22-mai-22		13-out-21	28-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28-dez-21	27-jan-22		28-dez-21	19-jan-22		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Em Andamento	24-jan-22	25-mar-22		24-jan-22	25-mar-22		95		
Contratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Em Andamento	25-mar-22	30-abr-22		25-mar-22					
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-mai-22	1-mai-22	3.450.691,00						
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-22	1-jun-22	1.403.137,00						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-set-22	1-set-22	8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	1-dez-22	10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-mar-23	1-mar-23	1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jun-23	1.792.449,00						
											RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-09-01 até 2023-06-01	De 2021-10-01 até 2023-06-01	27.935.000,00	De 2021-09-01 até 2022-03-25	De 2021-09-24 até 2022-03-25		-	Status do Projeto	
										-	98,3	

CGDF 2022006 - Programação FNE - 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Envio, para análise, de proposta dos programas de financiamento.	BNB	Concluído	30-set-21	30-set-21	-	30-set-21	30-set-21				
Análise sobre as propostas de programas e plano de aplicação	Análise e articulação com o BNB e MDR sobre as propostas de programas e plano de aplicação do FNE.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	13-out-21	29-nov-21	-	13-out-21	29-nov-21				
Plano de aplicação	Envio, para análise, de proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de financiamento.	BNB	Concluído	29-out-21	29-out-21	-	29-out-21	29-out-21				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação da Programação FNE, contemplando as propostas de programas e plano de aplicação.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	1-nov-21	29-nov-21	-	11-jan-21	29-nov-21				
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação do Parecer Técnico Conjunto que recomenda ao Condel quanto à aprovação da Programação FNE.	DFIN	Concluído	23-nov-21	25-nov-21	-	23-nov-21	25-nov-21				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	30-nov-21	30-nov-21	-	30-nov-21	30-nov-21				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29-nov-21	29-nov-21	-	29-nov-21	29-nov-21				
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	2-dez-21	9-dez-21	-	2-dez-21	9-dez-21				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29-nov-21	29-nov-21	-	29-nov-21	29-nov-21				
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	13-dez-21	13-dez-21	-	13-dez-21	13-dez-21				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10-fev-22	10-fev-22	-	10-fev-22	10-fev-22				
	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.											
Reprogramação		BNB	Concluído	30-mar-22	30-mar-22	-	30-mar-22	30-mar-22				
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30-set-22	30-set-22	-						
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2021-09-30 até 2022-09-30	De 2021-09-30 até 2022-09-30		De 2021-01-11 até 2022-03-30	De 2021-09-30 até 2022-03-30		-	#DIV/0!	Status do Projeto

CGDF 2022005 - Contrapartidas Sociais

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Minutas de Medidas Provisórias	Elaboração de minutas de medidas provisórias com fins de incluir a matéria na MP nº 2.156-5/2001 e na Lei nº 7.827/1989, junto à exposição de motivos.	CONF/CGDF	Concluído	23-fev-22	14-mar-22	-	23-fev-22	11-mar-22				
Consulta à Procuradoria	Análise de conformidade jurídica do pleito	PF/SUDENE	Concluído	15-mar-22	29-mar-22	-	11-mar-22	23-mar-22				
Análise e Ajustes da Minuta	Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do Parecer da Procuradoria	CONF/CGDF	Concluído	30-mar-22	6-abr-22	-	24-mar-22	29-mar-22				
Conformidade	Conformidade documental dos atos de Gestão	CGGI	A Iniciar	6-abr-22	12-abr-22	-						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	13-abr-22	19-abr-22	-						
Envio de proposta ao MDR	Envio de proposta ao MDR, via Ofício.	DFIN	A Iniciar	11-abr-22	11-abr-22	-						
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2022-02-23 até 2022-04-13	De 2022-03-14 até 2022-04-19		De 2022-02-23 até 2022-03-24	De 2022-03-11 até 2022-03-29		-	#DIV/0!	Status do Projeto

CGDF 2022004 - Taxa efetiva de juros dos Fundos de Desenvolvimento (TFD)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Articulação entre as superintendências de desenvolvimento	Articulação entre as superintendências de desenvolvimento para a elaboração de proposta para metodologia de cálculo de encargos financeiros na modalidade pré-fixada a incidir sobre os financiamentos de operações de crédito com recursos do Fundos de Desenvolvimento (TFD-pré).	CGDF	Concluído	14-mar-22	21-mar-22	-	14-mar-22	22-mar-22				
Proposta para TFD-pré	Elaboração de proposta para TFD-pré, com exposição de motivos	CGDF	Em Andamento	23-mar-22	24-abr-22	-	23-mar-22					
Consulta à Procuradoria	Análise de conformidade jurídica	PF/SUDENE	A Iniciar	25-abr-22	10-mai-22							
Análise e Ajustes da Minuta	Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do Parecer da Procuradoria	CGDF	A Iniciar	11-mai-22	18-mai-22							
Conformidade	Conformidade documental dos atos de Gestão	CGGI	A Iniciar	19-mai-22	25-mai-22							

Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	26-mai-22	3-jun-22	-							
Envio de proposta ao MDR	Envio de proposta ao MDR, via Ofício.	DFIN	A Iniciar	3-jun-22	8-jun-22	-							
Resumo Projeto			Em Andamento									Status do Projeto	
				De 2022-03-14 até 2022-06-03	De 2022-03-21 até 2022-06-08	-	De 2022-03-14 até 2022-03-23	2022-03-22	-	#DIV/0!			
CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	5-jan-22	14-jan-22	-	5-jan-22	14-jan-22					
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17-jan-22	17-jan-22	-	17-jan-22	17-jan-22					
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	A Iniciar	29-abr-22	6-mai-22	-							
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	A Iniciar	6-mai-22	10-jun-22	-							
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	A Iniciar	13-jun-22	20-jun-22	-							
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	A Iniciar	21-jun-22	30-jun-22	-							
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	A Iniciar	1-jul-22	8-jul-22	-							
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	A Iniciar	4-agosto-22	4-agosto-22	-							
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	A Iniciar	5-agosto-22	10-agosto-22	-							
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	11-agosto-22	11-agosto-22	-							
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	A Iniciar	12-agosto-22	5-dez-22	-							
Resumo Projeto			Em Andamento									Status do Projeto	
				De 2022-01-05 até 2022-08-12	De 2022-01-14 até 2022-12-05	-	De 2022-01-05 até 2022-01-17	De 2022-01-14 até 2022-01-17	-	#DIV/0!			
CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	A Iniciar	30-set-22	28-out-22	-							
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	A Iniciar	30-out-22	4-nov-22	-							
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	A Iniciar	1-nov-22	9-nov-22	-							
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Apreciação da CGDF. Apreciação da DFIN.	CGDF/DFIN	A Iniciar	10-nov-22	14-nov-22	-							
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	15-nov-22	18-nov-22	-							
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	A Iniciar	22-nov-22	25-nov-22	-							
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	A Iniciar	28-nov-22	28-nov-22	-							
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	A Iniciar	29-nov-22	2-dez-22	-							
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	5-dez-22	5-dez-22	-							
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	A Iniciar	10-fev-23	10-fev-23	-							
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	A Iniciar	30-mar-23	30-mar-23	-							
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30-set-23	30-set-23	-							
Resumo Projeto				De 2022-09-30 até 2023-09-30	De 2022-10-28 até 2024-09-30	-						Status do Projeto	
CGDF 2022001 - FDNE LIASA													
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26-agosto-21	25-set-21		26-agosto-21	24-set-21			Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021		
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23-dez-21	22-mai-22		23-dez-21	18-fev-22		100			
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18-fev-22	20-mar-22		18-fev-22	25-fev-22		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022		
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Em Andamento	4-mar-22	3-mai-22		4-mar-22	17-mar-22		50			
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Em Andamento	18-mar-22	18-abr-22		18-mar-22						
Liberção 1		SUDENE/BDMG	A Iniciar	1-mai-22	1-mai-22	48.000.000,00							
Liberção 2		SUDENE/BDMG	A Iniciar	1-fev-23	1-fev-23	24.000.000,00							
Liberção 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	1-fev-24	1-fev-24	23.890.000,00							
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.		
Empty			Em Andamento			95.890.000,00				-		Status do Projeto	
				De 2021-08-26 até 2024-02-01	De 2021-09-25 até 2024-02-01	191.780.000,00	De 2021-08-26 até 2022-03-18	De 2021-09-24 até 2022-03-17	-	87,5			
CGDF 2021015 Assuruá III													

Previsão												
Data de Conclusão												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-22	1-jul-22	13.682.253,05				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	21.485.985,41				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	96.836.792,83				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-23	31-dez-23	2.800.455,43				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-12-09 até 2023-12-01	De 2021-01-08 até 2023-12-31	134.805.486,72	De 2020-12-09 até 2021-12-22	De 2021-01-07 até 2021-12-27	-	44,44444444		
CGDF 2021014 Assuruá II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-22	1-jul-22	14.916.428,49				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	21.634.580,46				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	90.753.756,72				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	127.304.765,67	De 2020-12-09 até 2021-12-22	De 2021-01-07 até 2021-12-27	-	50		
CGDF 2021013 Assuruá I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-22	1-jul-22	15.280.590,06				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	32.762.657,47				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	88.656.757,44				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-12-09 até 2023-06-01	De 2021-01-08 até 2023-07-01	136.700.004,97	De 2020-12-09 até 2021-12-22	De 2021-01-07 até 2021-12-27	-	50		
CGDF 2021012 Milagres V												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	301.288.421,32				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	30-jun-22	32.509.261,49				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22	12.249.128,89				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	2.921.768,94				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2022-10-01	De 2021-03-04 até 2022-12-31	348.968.580,64	De 2021-02-02 até 2021-10-19	De 2021-02-25 até 2021-11-19	-	44,44444444		
CGDF 2021011 Milagres IV												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	49.606.847,71				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	30-jun-22	42.346.634,19				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22	15.955.741,74				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	3.805.902,53				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-02-02 até 2022-10-01	De 2021-03-04 até 2022-12-31	111.715.126,17	De 2021-02-02 até 2021-10-19	De 2021-02-25 até 2021-11-19	-	44,44444444		
CGDF 2021010 Milagres III												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	30.128.421,32				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	30-jun-22	32.509.261,49				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22	12.249.128,89				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	2.921.768,94				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									

				De 2021-02-02 até 2022-10-01	De 2021-03-04 até 2022-12-31	77.808.580,64	De 2021-02-02 até 2021-10-19	De 2021-02-25 até 2021-11-19	-	44,44444444		
CGDF 2021009 Milagres II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	30.128.421,32				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	30-jun-22	32.509.261,49				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22	12.249.128,89				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	2.921.768,94				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-02-02 até 2022-10-01	De 2021-03-04 até 2022-12-31	77.808.580,64	De 2021-02-02 até 2021-10-19	De 2021-02-25 até 2021-11-19	-	44,44444444		
CGDF 2021008 Milagres I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	30.128.421,32				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	1-jun-22	32.509.261,49				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22	12.249.128,89				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	2.921.768,94				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado	De 2021-02-02 até 2022-10-01	De 2021-03-04 até 2022-12-31	77.808.580,64	De 2021-02-02 até 2021-10-19	De 2021-02-25 até 2021-11-19	-	44,44444444		
CGDF 2021007 Parnaíba II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29-dez-20	28-jan-21		29-dez-20	28-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	8-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18-jan-22	17-fev-22		9-nov-21	26-nov-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	109.298.073,20				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	164.881.889,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-12-29 até 2023-10-01	De 2021-01-28 até 2023-12-31	274.179.962,20	De 2020-12-29 até 2021-11-09	De 2021-01-28 até 2021-11-26	-	44,44444444		
CGDF 2021006 Catanduba II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	4-dez-20	3-jan-21		4-dez-20	21-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23-jul-21	20-dez-21		23-jul-21	23-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-dez-21	20-jan-22		24-nov-21	16-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20-jan-22	21-mar-22		2-dez-21	17-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	1.127.760,36				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-24	31-jan-24	127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento	De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-01-31	140.841.810,36	De 2020-12-04 até 2021-12-02	De 2020-12-21 até 2021-12-17	-	50		
CGDF 2021005 Catanduba I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	4-dez-20	3-jan-21		4-dez-20	21-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23-jul-21	20-dez-21		23-jul-21	23-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-dez-21	20-jan-22		24-nov-21	16-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		16-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	1.127.760,36				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-24	31-dez-24	127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									

				De 2020-12-04 até 2024-10-01	De 2021-01-03 até 2024-12-31	140.841,810,36	De 2020-12-04 até 2021-12-16	De 2020-12-21 até 2021-12-27	-	50		
CGDF 2021004 Borborema												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25-nov-20	25-dez-20		25-nov-20	23-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	17-mai-21	14-out-21		17-mai-21	5-ago-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14-out-21	13-nov-21		5-ago-21	2-set-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2-set-21	1-nov-21		2-set-21	8-set-21		100	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	15-nov-21	15-dez-21	60.000.000,00				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2020-11-25 até 2021-11-15	De 2020-12-25 até 2021-12-15	60.000.000,00	De 2020-11-25 até 2021-09-02	De 2020-12-23 até 2021-09-08	-	66,66666667		
CGDF 2021003 Canudos III												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24-ago-20	23-set-20		24-ago-20	23-set-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	4-fev-21	4-jul-21		4-fev-21	8-fev-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	8-fev-21	10-mar-21		8-fev-21	25-fev-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-abr-21	1-mai-21	36.829.244,50	16-jul-21	3-ago-21	28.947.510,76	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-jul-21	31-jul-21	128.804.144,44	4-nov-21	12-nov-21	15.092.448,98	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-22	31-jan-22	17.728.549,22	15-out-21	11-nov-21	19.120.976,86	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				10-dez-21	23-dez-21	29.933.005,47	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26-jan-22	5-mar-22	28.495.798,45	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Em Andamento				16-mar-22		23.230.286,24	80	Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante	
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
											RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2022-03-16	De 2020-09-23 até 2022-03-05	144.820.026,76	81,66666667		
CGDF 2021002 - Canudos II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24-ago-20	23-set-20		24-ago-20	23-set-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	3-fev-21	3-jul-21		3-fev-21	8-fev-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	8-fev-21	10-mar-21		8-fev-21	3-mar-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-abr-21	1-mai-21	36.829.244,50	16-jul-21	3-ago-21	35.444.673,28	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-jul-21	31-jul-21	128.804.144,44	4-nov-21	12-nov-21	36.136.600,99	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-22	31-jan-22	17.728.549,22	1-dez-21	23-dez-21	16.468.567,32	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0	A empresa ainda não solicitou a liberação do recurso.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2020-08-24 até 2022-01-01	De 2020-09-23 até 2022-01-31	183.361.938,16	De 2020-08-24 até 2021-12-01	De 2020-09-23 até 2021-12-23	88.049.841,59	77,77777778		
CGDF 2021001 Ap rec FNE 2021												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-abr-21	25-abr-21		1-abr-21	26-abr-21		100	Os dados foram enviados com informações incompletas	
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-abr-21	6-mai-21		26-abr-21	7-jun-21		100	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados referentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	7-mai-21	7-mai-21		2-jul-21	15-jul-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-jun-21	25-jun-21		1-jun-21	29-jul-21		100	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados referentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-jun-21	6-jul-21		29-jul-21	27-ago-21		100		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	7-jul-21	7-jul-21		31-ago-21	2-set-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-out-21	25-out-21		1-out-21	22-out-21		100		
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-out-21	5-nov-21		22-out-21	3-dez-21		100		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	6-nov-21	6-nov-21		22-dez-21	22-dez-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-jan-22	25-jan-22		10-fev-22	10-fev-22		0		
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-jan-22	5-fev-22		11-fev-22	5-mar-22		0		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Atrasado	6-fev-22						0	Os dados foram enviados pelo BNB com atraso	
Resumo Projeto			Atrasado									
				De 2021-04-01 até 2022-02-06	De 2021-04-25 até 2022-02-05	Página 75 de 82	-	De 2021-04-01 até 2022-02-11	De 2021-04-26 até 2022-03-05	-	75	

CGDF 2020007 Vila AL II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada Contratação do banco operador	Anita Riquelme BB	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	26-dez-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Análise de Projeto			Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	15-out-20		100		
		SUDENE	Concluído	15-out-20	14-nov-20		15-out-20	11-dez-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	15.891.285,35	19-mar-21	5-abr-21	15.891.285,35	100		
Liberação 1	Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	23.937.650,00	2-jul-21	19-jul-21	26.437.744,05	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 55.786.889,22	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído									
		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	15.957.953,87	29-out-21	12-nov-21	10.687.741,05	100		
		SUDENE/BB	Em Andamento	1-dez-21	31-out-22	2.770.118,77	15-mar-22		2.770.118,77	80		
Liberação 4	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21						RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
			Em Andamento	1-dez-21	31-out-22							
		BB	A Iniciar									
			Em Andamento									
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	58.557.007,99	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-26 até 2021-11-12	55.786.889,22	86,66666667		
CGDF 2020006 Vila ES II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada Contratação do banco operador	Anita Riquelme BB	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	20-dez-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Análise de Projeto			Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	15-out-20		100		
		SUDENE	Concluído	19-out-20	18-nov-20		19-out-20	17-nov-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	19.807.254,22	19-mar-21	6-abr-21	19.807.254,22	100		
Liberação 1	Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	43.167.800,00	2-jul-21	19-jul-21	47.021.856,73	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R\$ 90.858.400,56	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído									
		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	27.883.346,34	29-out-21	12-nov-21	19.923.445,78	100		
		SUDENE/BB	Em Andamento	1-dez-21	31-out-22	4.105.843,83	15-mar-22		4.105.843,83	80		
Liberação 4	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21						RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
			Em Andamento	1-dez-21	31-out-22							
		BB	A Iniciar									
			Em Andamento									
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	94.964.244,39	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-20 até 2021-11-12	90.858.400,56	86,66666667		
CGDF 2020005 Vila ES I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada Contratação do banco operador	Diego Veras BB	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	29-dez-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Análise de Projeto			Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	19-out-20		100		
		SUDENE	Concluído	19-out-20	18-nov-20		19-out-20	17-nov-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	70.157.041,59	19-mar-21	6-abr-21	70.157.041,59	100		
Liberação 1	Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	25.425.490,00	2-jul-21	19-jul-21	19.746.649,89	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R\$ 103.459.637,40	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído									
		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	7.877.105,81	29-out-21	12-nov-21	9.328.702,82	100		
		SUDENE/BB	Em Andamento	1-dez-21	31-out-22	4.227.243,10	15-mar-22		4.227.243,10	80		
Fiscalizações	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	A Iniciar							0		
		BB	A Iniciar							0		
			Em Andamento									
				De 2019-11-29 até 2021-12-01	De 2019-12-29 até 2022-10-31	107.686.880,50	De 2019-11-29 até 2022-03-15	De 2019-12-29 até 2021-11-12	103.459.637,40	78		
CGDF 2020004 Boqueirão II												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada Contratação do banco operador	Anita Riquelme BB	Concluído	11-dez-19	10-jan-20		11-dez-19	26-dez-19		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Análise de Projeto			Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	18-set-20		100		
		SUDENE	Concluído	19-set-20	19-out-20		19-set-20	19-out-20		100		
		SUDENE/BB	Concluído	19-out-20	18-dez-20		19-out-20	4-dez-20		100		
Liberação 1	Liberação 3	SUDENE/BB	Concluído	1-jan-21	2-mar-21	12.451.000,00	23-dez-21	3-jan-22	32.968.329,74	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R\$ 32.968.329,74, valor superior aos R\$ 32.687.000,00 previstos para as 3primeiras parcelas	
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-mar-21	30-abr-21	3.601.000,00	23-dez-21	3-jan-22		100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-jul-21	30-ago-21	16.635.000,00	23-dez-21	3-jan-22		100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	1-out-21	30-nov-21	6.634.000,00				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	Atrasado	1-jan-22	2-mar-22	31.769.000,00				0		
Liberação 6	Liberação 7	SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-22	31-mai-22	21.210.000,00				0		
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-22	30-ago-22	9.055.000,00				0		
Liberação 8		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	30-nov-22	757.000,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	Resumo Projeto	BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
			Atrasado									
				De 2019-12-11 até 2022-10-01	De 2020-01-10 até 2022-11-30	102.312.000,00	De 2019-12-11 até 2021-12-23	De 2019-12-26 até 2022-01-03	32.968.329,74	53,84615385		
CGDF 2020003 Boqueirão I												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11-nov-11	10-jan-12			11-nov-11	19-dez-11		100		
Análise de Projeto		BNB (a definir) BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	29-dez-11	10-fev-13			29-dez-11			100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
Análise de Projeto - novos prazos			Concluído	24-dez-12	24-mar-13			24-dez-12	25-mar-13		100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25-mar-13	24-abr-13			25-mar-13	22-mai-13		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22-mai-13	31-mai-13			22-mai-13	24-mai-13		100		
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	1-jan-14	31-jan-14	53.635.943,87		1-jan-14	24-jan-14	53.635.943,87	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	1-mai-14	31-mai-14	1.264.056,13		12-jan-16	15-fev-16	1.264.056,13	100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento	17-dez-18	15-fev-19			30-mar-22			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2018-12-17	De 2011-09-11 até 2019-02-15	54.900.000,00		De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2016-02-15	54.900.000,00	88,88888889		

CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas	
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13-jul-11	11-set-11			13-jul-11	28-jul-11	100			
Pré-análise		Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	Concluído	11-nov-11	10-jan-12			11-nov-11	22-dez-11	100			
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29-dez-11	10-fev-13			29-dez-11		100	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.	
Análise de Projeto - novos prazos		BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	Concluído	24-dez-12	24-mar-13			24-dez-12	25-mar-13	100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25-mar-13	24-abr-13			25-mar-13	22-mai-13	100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.		
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22-mai-13	31-mai-13			22-mai-13	24-mai-13	100			
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18-fev-14	20-mar-14	42.723.785,57		18-fev-14	12-mar-14	42.723.785,57	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	1-jul-14	31-jul-14	16.976.214,43		26-dez-14	2-fev-15	16.976.214,43	100	Liberações concluídas.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento	17-dez-18	15-fev-19			30-mar-22			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento										
				De 2011-07-13 até 2018-12-17	De 2011-09-11 até 2019-02-15	59.700.000,00	De 2011-07-13 até 2022-03-30	De 2011-07-28 até 2015-02-02	59.700.000,00	88,88888889			
CGDE 2008002 Candelas													

CGDF 2008002 Candelas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	Concluído	24-jul-08	23-ago-08		24-jul-08	25-ago-08		100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
Pré-análise		Mauro Povoa (SUDENE/DGFI)	Concluído	6-jan-09	6-fev-09		10-set-08	15-out-08		100	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
Análise de Projeto		Francisco (CENAP/BNB)	Concluído	15-out-08	12-fev-09		15-out-08	1-ago-11		100	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	1-ago-11	31-ago-11		1-ago-11	15-ago-11		100	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Liberação (parcela única)		SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	Concluído	21-mar-12	20-abr-12	61.728.156,00	21-mar-12	1-jun-12	61.728.156,00	100	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento	17-dez-18	15-fev-19		30-mar-22				O BNB emitiu CCE com erro na legislação do Fundo, se referindo ao decreto 7838 ao invés do 6952. Foi solicitada alteração em março de 2020, mas o banco não enviou o documento.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
				De 2008-07-24 até 2018-12-17	De 2008-08-23 até 2019-02-15	61.728.156,00	De 2008-07-24 até 2022-03-30	De 2008-08-25 até 2012-06-01	61.728.156,00	83,33333333		

CGDF 2008001 Transnordestina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	8-ago-08	7-set-08			8-ago-08	8-set-08	100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23-set-08	23-out-08			23-set-08	9-out-08	100	A análise na SUDENE antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	9-out-08	6-fev-09			9-out-08	28-out-08	100	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29-out-08	28-nov-08			29-out-08	24-nov-08	100	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008. Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12-jan-10	11-fev-10	336.647.184,00		12-jan-10	12-jan-10	100	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29-nov-10	29-dez-10	350.270.386,00		29-nov-10	29-nov-10	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-dez-10	31-dez-10	338.035.512,00		1-dez-10	2-dez-10	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27-set-11	27-out-11	468.293.037,00		27-set-11	6-out-11	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29-ago-12	28-set-12	121.859.549,00		29-ago-12	20-set-12	100	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	1-set-12	1-out-12	-		1-set-12	21-set-12	100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	

Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	6-fev-13	8-mar-13	-	6-fev-13	27-fev-12		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-fev-13	3-mar-13	650.000.000,00	1-fev-13	24-jun-13	650.000.000,00	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE. Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15-out-12	13-abr-13	-	15-out-12	3-jul-14		100		
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-nov-13	1-dez-13	800.000.000,00	23-jul-14	11-ago-14	800.000.000,00	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Parado	1-nov-14	1-dez-14	500.000.000,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 0 67/2017).	
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Parado	1-mai-15	31-mai-15	311.386.032,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 0 67/2017).	
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar									
Resumo Projeto			Parado									
				De 2008-08-08 até 2015-05-01	De 2008-09-07 até 2015-05-31	3.876.491.700,00	De 2008-08-08 até 2014-07-23	De 2008-09-08 até 2014-08-11	3.065.105.668,00	82,35294118		
Novo grupo												
Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

COORDENAÇÃO-GERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS

Pleitos Incentivos Fiscais

Name	Número do Processo	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Início	Devolução	Pré Análise: Continuação	Pré Análise Conclusão	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Início	Análise Técnica: Conclusão	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Data	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	59336.000715/2022-37	6.250.000,00	Henrique Pires	11-mar-22	11-mar-22			16-mar-22	Concluído	16/03/2022		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento		
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA.	59336.000509/2022-27	194.349,00	Fernando Luiz de Lima Queiroz	21-fev-22	11-ago-21	16-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	59336.000623/2022-57	49.358.242,00	Nireide Tavares	3-mar-22		15-mar-22	15-mar-22		Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	59336.000636/2022-26	106.964.068,76	Fernando Luiz de Lima Queiroz	4-mar-22	3-abr-22	22-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000688/2022-01	41.955.529,12	Fernando Luiz de Lima Queiroz	10-mar-22					Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A	59336.000691/2022-16	27.000.000,00	Nireide Tavares	10-mar-22				16-mar-22	Concluído			Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento		
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	59336.000696/2022-49	2.328.314,37	Henrique Pires	11-mar-22	3-nov-22	21-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
PERNAMBUCO QUIMICA S A	59336.000707/2022-91	4.000.000,00	Gilvete Sobral	11-mar-22	3-nov-22	16-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.000711/2022-59	4.169.646,61	Flávio Cavalcanti	11-mar-22	3-nov-22	21-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	59336.000719/2022-15	84.726,00	Fernando Luiz de Lima Queiroz	14-mar-22		15-mar-22	23-mar-22		Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	59336.000722/2022-39	3.299.665,67	Jorge Montarroyos	14-mar-22		23-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	59336.000733/2022-19	1.437.000,00	Cláudia Regina	14-mar-22	9-out-21			16-mar-22	Concluído			Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento		
INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA	59336.000734/2022-63	2.319.019,00	Thaísa Piscoya	14-mar-22		16-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	59336.000736/2022-52	6.277.232,00	Jorge Montarroyos	14-mar-22		24-mar-22			Em Andamento			A Iniciar		A Iniciar		Em Andamento		
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A	59336.003997/2021-43	32.936.452,58	Rodrigo Sena e Marco Agudo	22-dez-21				7-jan-22	Concluído	2022-01-07		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
MOINHO NORDESTE DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	59336.000027/2022-77	3.000.000,00	Rodrigo Sena e Marco Agudo	4-jan-22	1-abr-22			14-jan-22	Concluído	2022-01-14		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA	59336.000100/2022-19	200.000,00	Rodrigo Sena e Marco Agudo	12-jan-22	1-dez-22			18-jan-22	Concluído	2022-01-18		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	59336.000229/2022-19	15.886.301,76	Jorge Montarroyos	24-jan-22				31-jan-22	Concluído	2022-01-31		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	59336.000270/2022-95	350.000,00	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	27-jan-22				1-fev-22	Concluído	2022-02-01		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
SP ACOS BRASIL LTDA	59336.000308/2022-20	810.411,10	Rodrigo Sena e Marco Agudo	31-jan-22				1-fev-22	Concluído	2022-02-01		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A	59336.000319/2022-18	8.197.053,90	Jorge Montarroyos	1-fev-22				10-fev-22	Concluído	2022-02-10		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	59336.000417/2022-47	154.433,07	Flávio Cavalcanti e Petrus Andrade	9-fev-22	7-mai-21	16-mar-22		16-fev-22	Concluído	2022-02-16		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	documentação encaminhada	
SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA EM ERP LTDA.	59336.000458/2022-33	225.219,28	Leonardo Galindo e Rodrigo Sena	15-fev-22	9-jun-21			16-fev-22	Concluído	2022-02-16		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	documentação encaminhada	
JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	59336.000459/2022-88	978.196.950,14	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	15-fev-22				23-fev-22	Concluído	2022-02-23		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA	59336.000484/2022-61	4.385.447,37	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	17-fev-22		25-mar-22		7-mar-22	Concluído	2022-03-07		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.	59336.000533/2022-66	33.422.750,59	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	22-fev-22	12-jan-21			2-mar-22	Concluído	2022-03-02		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AMORES S/A	59336.000540/2022-68	6.785.675,62	Flávio Cavalcanti e Petrus Andrade	22-fev-22	11-mar-21			7-mar-22	Concluído	2022-03-07		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000566/2022-14	428.671,93	Rodrigo Sena e Marco Agudo	24-fev-22				24-fev-22	Concluído	2022-02-24	2022-03-17	Concluído		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
OASIS ALIMENTOS LTDA	59336.000565/2022-61	15.242.656,14	Petrus Andrade e Carlos Teixeira	24-fev-22	2-fev-22			25-fev-22	Concluído	2022-02-25		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	

Name	Número do Processo	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Início	Devolução	Pré Análise: Continuação	Pré Análise: Conclusão	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Início	Análise Técnica: Conclusão	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Data	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	59336.000574/2022-52	442.979,84	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	24-fev-22	2-set-22			2-mar-22	Concluído	2022-03-02		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	59336.000578/2022-31	4.189.913,00	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	24-fev-22				2-mar-22	Concluído	2022-03-02		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA.	59336.000629/2022-24	3.000.000,00	Petrus Andrade e Carlos Teixeira	4-mar-22	3-abr-22			8-mar-22	Concluído	2022-03-08		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	59336.000638/2022-15	1.500.000,00	Marília Dália e Cláudia Regina	4-mar-22	3-abr-22			9-mar-22	Concluído	2022-03-09		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
KNAUF DO BRASIL LTDA	59336.000657/2022-41	75.052.619,12	Leonardo Galindo e Rodrigo Sena	7-mar-22				15-mar-22	Concluído	2022-03-15		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame	
ECOFOR AMBIENTAL S/A	59336.000673/2022-34	22.129.496,33	Carlos Teixeira e Petrus Andrade	9-mar-22				11-mar-22	Concluído	2022-03-11		Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento		
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	59336.000739/2022-96	-	Rodrigo Sena	15-mar-22					Em Andamento							Em Andamento	transferência	
REFINARIA DE MATARIFE S.A.	59336.000776/2022-02	-	Jorge Montarroyos	17-mar-22					Em Andamento							Em Andamento	transferência	
I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	59336.000794/2022-86	-	Nireide Tavares	21-mar-22					Em Andamento							Em Andamento	retificação	
PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59336.000823/2022-18	128.168,96	Flávio Cavalcanti	23-mar-22					Em Andamento							Em Andamento		
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	59336.000820/2022-76	458.748,77	Henrique Pires	23-mar-22					Em Andamento							Em Andamento		
PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA	59336.000827/2022-98	-	Jorge Montarroyos	23-mar-22					Em Andamento							Em Andamento	transferência	
DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAC...	59336.000828/2022-32	20.000.000,00	Petrus Andrade	23-mar-22	12-set-21				Em Andamento							Em Andamento		
CMP DE FARIAS LTDA	59336.000833/2022-45	272.558,83	Flávio Cavalcanti	24-mar-22					Em Andamento							Em Andamento		
BETANIA LACTEOS S.A.	59336.003950/2021-80	-	Rodrigo Sena e Marco Agudo	20-dez-21				17-jan-22	Concluído							Em Andamento	transferência	
TECON SALVADOR S/A	59336.004024/2021-21	947.226.992,39	Rodrigo Sena e Marco Agudo	19-dez-21				3-jan-22	Concluído							Em Andamento		
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	59336.004152/2021-75	21.264.823,20	Rodrigo Sena e Marco Agudo	29-dez-21				29-dez-21	Concluído							Em Andamento		
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	59336.000229/2022-19	15.886.301,76	Jorge Montarroyos	24-jan-22				31-jan-22	Concluído							Em Andamento		
RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	59336.000730/2022-85	690.000,00	Thaís Piscoya e Cláudia Regina	14-mar-22	3-set-22			15-mar-22	Concluído							Em Andamento		
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	59336.000740/2022-11	-	Jorge Montarroyos	15-mar-22		24-mar-22			Em Andamento							Em Andamento	transferência	
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	59336.000741/2022-65	-	Jorge Montarroyos	15-mar-22		24-mar-22			Em Andamento							Em Andamento	transferência	
POLIMIX CONCRETO LTDA	59336.000749/2022-21	208.651.895,79	Thaís Piscoya e Nireide Tavares	15-mar-22	3-nov-22			16-mar-22	Concluído							Em Andamento		
ARA TEXTIL LTDA	59336.000654/2022-16	347.200,00	Marco Agudo e Henrique Pires	7-mar-22				9-mar-22	Concluído	2022-03-09	2022-03-16	Concluído				Em Andamento		
CLARO S.A.	59336.000421/2022-13	96.489.757,99	Carlos Teixeira e Petrus Andrade	9-fev-22				14-fev-22	Concluído	2022-02-14	2022-03-21	Concluído				Em Andamento		
ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	59336.000157/2022-18	1.485.287,31	Rodrigo Sena e Marco Agudo	18-jan-22				18-jan-22	Concluído	2022-01-18	2022-03-14	Concluído				Em Andamento		
JRS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	59336.004128/2021-36	3.257.003,78	Rodrigo Sena e Marco Agudo	29-dez-21				4-jan-22	Concluído	2022-01-04	2022-03-17	Concluído				Em Andamento		
LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	59336.003917/2021-50	9.616.435,89	Rodrigo Sena e Marco Agudo	17-dez-21				18-dez-21	Concluído	2021-12-18	2022-03-14	Concluído				Em Andamento		
MESSER GASES LTDA.	59336.000768/2022-58	5.634.850,44	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	16-mar-22				16-mar-22	Concluído	2022-03-16	2022-03-18	Concluído				Em Andamento		
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59336.000566/2022-14	428.671,93	Rodrigo Sena e Marco Agudo	22-fev-22				24-fev-22	Concluído	2022-03-17	2022-03-17	Concluído				Em Andamento		

Name	Número do Processo	Valor do Investimento	Analistas Responsáveis	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Início	Devolução	Pré Análise: Continuação	Pré Análise Conclusão	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Início	Análise Técnica: Conclusão	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Data	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas	Ações Corretivas
ALTENBURG NORDESTE LTDA	59336.000648/2022-51	-	Thaísa Piscoya e Nireide Tavares	7-mar-22	3-jul-22			8-mar-22	Concluído	2022-03-08	2022-03-08	Concluído	2022-03-14	Em Andamento		Em Andamento	retificação	
ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA	59336.000166/2022-09	10.745.010,76	Leonardo Galindo e Rodrigo Sena	18-jan-22	15-jan-21			20-jan-22	Concluído	2022-01-20	2022-03-14	Concluído	2022-03-15	Em Andamento		Em Andamento		
CLARO S.A.	59336.000617/2022-08	18.758.104,08	Nireide Tavares e Cláudia Regina	3-mar-22				4-mar-22	Concluído	2022-03-04	2022-03-07	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
CMPO IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ...	59336.000601/2022-97	5.184.568,00	Thaísa Piscoya e Nireide Tavares	28-fev-22				2-mar-22	Concluído	2022-03-02	2022-03-07	Concluído	2022-03-14	Em Andamento		Em Andamento		
EVC INDUSTRIAL LTDA	59336.000063/2022-31	1.593.251,43	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	10-jan-22				13-jan-22	Concluído	2022-01-13	2022-03-08	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
INTERCEMENT BRASIL S.A.	59336.000311/2022-43	-	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	1-fev-22	2-jan-22			8-fev-22	Concluído	2022-02-08	2022-03-07	Concluído	2022-03-14	Em Andamento		Em Andamento	transferência	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	59336.000226/2022-85	38.364.830,00	Rodrigo Sena e Marco Agudo	24-jan-22				26-jan-22	Concluído	2022-01-26	2022-03-08	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
LATICINIOS VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	59336.000293/2022-08	3.000.000,00	Rodrigo Sena e Marco Agudo	28-jan-22				28-jan-22	Concluído	2022-01-28	2022-03-08	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A.	59336.000298/2022-22	297.024.503,75	Rodrigo Sena e Marco Agudo	31-jan-22				6-fev-22	Concluído	2022-02-06	2022-03-08	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA.	59336.003857/2021-75	429.791.999,96	Rodrigo Sena e Marco Agudo	15-dez-21	12-fev-21			15-dez-21	Concluído	2021-12-15	2022-03-10	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
PONTES & LANDIM HOTELARIA E ALUGUEIS LTDA	59336.000615/2022-19	7.229.503,96	Jorge Montarroyos e Henrique Pires	17-jan-22				2-mar-22	Concluído	2022-03-02	2022-03-07	Concluído	2022-03-13	Em Andamento		Em Andamento		
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	59336.000553/2022-37	932.481,00	Thaísa Piscoya e Nireide Tavares	23-fev-22				10-mar-22	Concluído	2022-03-10	2022-03-14	Concluído	2022-03-15	Em Andamento		Em Andamento		
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	59336.000783/2022-04	219.294.920,41	Carlos Teixeira	21-mar-22		24-mar-22			Em Andamento							Em Andamento		
IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA	59336.000800/2022-03	6.950.000,00	Fernando Luiz de Lima Queiroz	21-mar-22				24-mar-22	Concluído	2022-03-24		Em Andamento				Em Andamento		
FRIGORIFICO LESTE LTDA	59336.000834/2022-90	18.748.800,96	Rodrigo Sena e Marco Agudo	24-mar-22	2-mar-22			24-mar-22	Concluído	2022-03-24		Em Andamento				Em Andamento		
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59336.000836/2022-89	1.481.040,74	Leonardo Galindo	24-mar-22		25-mar-22			Em Andamento							Em Andamento		

Anexo III - Execução Financeira e Orçamentária
(posição em 31/03/2022)

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2021 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/CANCEL AMENTOS/BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	10.934.024,00	44,92	0,00	10.934.024,00	2.083.667,47	100,00	1.178.936,18	8.850.356,53
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	10.537.799,00	43,29	0,00	10.537.799,00	2.013.975,32	96,66	1.146.497,36	8.523.823,68
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	204.000,00	0,84	0,00	204.000,00	24.770,00	1,19	3.540,00	179.230,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	192.225,00	0,79	0,00	192.225,00	44.922,15	2,16	28.898,82	147.302,85
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	6.835.948,00	28,08	0,00	6.835.948,00	0,00	0,00	0,00	6.835.948,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001	2.491.496,00	10,24	0,00	2.491.496,00	0,00	0,00	0,00	2.491.496,00
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	1.491.496,00		0,00	1.491.496,00	0,00		0,00	1.491.496,00
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001	2.344.452,00	9,63	0,00	2.344.452,00	0,00	0,00	0,00	2.344.452,00
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	1.344.452,00		0,00	1.344.452,00	0,00		0,00	1.344.452,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	1.000.000,00	4,11	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001	500.000,00	2,05	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001	500.000,00	2,05	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	6.570.891,00	27,00	0,00	6.570.891,00	0,00	0,00	0,00	6.570.891,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	6.570.891,00	27,00	0,00	6.570.891,00	0,00	0,00	0,00	6.570.891,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212048) - Aquisição de Máquina (RP 7)	4.386.891,00		0,00	4.386.891,00	0,00		0,00	4.386.891,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212049) - Aquisição de Máquina (RP 7)	2.184.000,00		0,00	2.184.000,00	0,00		0,00	2.184.000,00
TOTAL	24.340.863,00	100,00	0,00	24.340.863,00	2.083.667,47	100,0	1.178.936,18	22.257.195,53

PO = Plano Orçamentário

Anexo IV - Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

#	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2022	Apuração 1º trimestre de 2022	Observações
1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	60%	0%	No que tange aos ACTs com entidades de amparo à pesquisa, os editais ainda não foram lançados por elas para desembolso do orçamento de 2022 na forma de subvenção econômica. Quanto aos desembolsos referentes aos orçamentos de 2021 e 2022, os recursos serão aportados para o edital de bioinsumos e as propostas de projetos ainda estão sendo apresentadas e o prazo vai até meados de abril/2022, para posterior seleção.
		Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,14%	5,15%	-
		Percentual de recursos do FNE para empresas PMEs	53%	57%	-
2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de Contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo CONDEL (FDNE)	75,00%	100%	-
		Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	0	O Plano de Ação Estratégica para o desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba, São Francisco e área de influência do PISF está em elaboração.
		Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	0	Como o PRDNE até o momento não foi aprovado pelo Congresso Nacional, não houve requisição legal para sua revisão.
		Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades	57	60	Parcerias firmadas: articuladas: 52 municípios do G52; e 8 instituições (BNB, SEBRAE, MAPA, MDR, ABDI, ONU HABITAT, PNUD, Codanorte).
3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de Avaliações realizadas no ano	11	0	Houve repactuação do calendário de análises das avaliações. Neste trimestre, foram concluídas as análises apenas sobre os relatórios parciais.
		Média da avaliação de satisfação dos usuários da Sudene	100%	89,96%	A taxa de satisfação dos usuários foi calculada pela média da avaliação dos seguintes serviços:

					Dados Abertos, Convênios, FDNE e Incentivos Fiscais.
		Número de pesquisa de satisfação realizadas	2	1	No primeiro trimestre de 2022 foi realizada 1 (uma) pesquisa de satisfação relativa aos serviços prestados pela Sudene referente ao exercício de 2021.
4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Percentual das metas do PRDNE monitoradas	40%	0%	O PRDNE, não sendo um Plano aprovado, não é monitorado e nem tem Relatório de Monitoramento de suas Metas.
		Número de consultas públicas realizadas com atores regionais para atualização do PRDNE	1	0	Foram realizadas duas consultas públicas em 2021, motivo pelo qual não será necessária a realização de consulta pública neste ano de 2022 para a atualização do PRDNE.
		Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	1	O município polo de Montes Claros/MG está sendo beneficiado pelo Convênio firmado entre SUDENE e o Codanorte, com o objetivo de elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Codanorte.
		Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	0	2 estudos, um relacionado ao polo têxtil e outro ao polo calçadista, estão em fase de contratação no momento.
5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	254	As capacitações em saúde digital foram iniciadas em dezembro/2021.
		Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	0	O projeto teve a sua execução iniciada em 2021, encontrando-se com um percentual de execução de, aproximadamente, 68%.
6	Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	50%	0%	Ainda não foi realizada reunião do Condel no exercício de 2022, apesar dos esforços da Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê Técnico em 24/03/2022, que decidiu por deliberar a pauta programada para a reunião do Condel de forma ad referendum.
		Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	1	1	Reunião do Comitê de Acompanhamento do FNE realizada em 02/02/2022.
		Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	66,67%	0%	Ainda não foi realizada reunião do Condel no exercício de 2022, apesar dos esforços da Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê Técnico em 24/03/2022, que decidiu por

					deliberar a pauta programada para a reunião do Condell de forma ad referendum.
		Número de reuniões de nível estratégico da Governança Interna no âmbito da Resolução DC/Sudene nº 539/2019	2	0	-
7	Aprimorar a gestão de processos	Taxa de Processos Críticos Mapeados	8,7%	0%	Foram levantados os processos críticos e iniciadas as tratativas para mapeamento de processos. Proposição de alteração das metas de 2022 e 2023 de 8,7% e 21,7% para 5,7% e 14,3%, respectivamente.
		Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE	352	198	-
		Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	57	67	Apesar da média de dias ter extrapolado a meta fixada, 31 dos 62 pleitos aprovados tiveram seus exames concluídos em menos de 57 dias. Há que se observar que, historicamente, o primeiro trimestre de cada ano sempre apresenta prazos mais dilatados em função do período de férias dos servidores da Coordenação-Geral.
8	Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	48%	-	Resultado do IGG TCU ainda não foi divulgado.
9	Monitorar índices socioeconômicos da região	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%	Dados observados e apurados em 31/03/2022. Tais indicadores são de periodicidade anual, portanto, manterão a mesma atualização até nova divulgação.
10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	4%	-
		Percentual de servidores capacitados	Realizar 01 avaliação de lacunas de competência	-	Ações para realizar a avaliação de lacunas de competência previstas para iniciar.
		Taxa de Satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	100%	-
11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Elaborar 01 Programa de QVT	-	Ações para elaborar o programa de qualidade de vida no trabalho estão previstas para iniciar.

		Índice de qualidade de vida no trabalho	Elaborar e executar 01 Pesquisa de QVT	-	Ações para elaborar e executar a pesquisa de qualidade de vida no trabalho estão previstas para iniciar.
		Índice de clima organizacional	Elaborar e executar 01 Pesquisa de Clima Organizacional	-	Ações para elaborar e executar a pesquisa de clima organizacional estão previstas para iniciar.
12	Modernizar e integrar os sistemas de informação	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	41,7%	Considerando os 23 projetos previstos no PDTIC aprovado para o biênio 2022-2023, elegemos 12 projetos mais críticos como meta para serem executados ainda em 2022. Desses 12 projetos escolhidos, 5 deles já foram executados, resultando em 5 soluções de TIC implantadas.
13	Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	Taxa de Recursos Adicionais	10%	27%	-
		Taxa de Execução de Recursos Adicionais	100%	0%	-
14	Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Taxa de Alocação do Orçamento Estratégico	50%	55,08%	-
		Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas	100%	0%	-

Anexo V - Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

#	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2022	Apuração 1º trimestre de 2022	Observações
1	Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP)	100%	100%	-
		Produtividade da Análise de Consultas-Prévias do FDNE (PACP)	quanto maior, melhor	6 análises por técnico	-
		Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA)	quanto menor, melhor	67%	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco do Nordeste do Brasil (TAP-BNB)	≤ 1	0	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco do Brasil (TAP-BB)	≤ 1	0,5	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pela Caixa Econômica Federal (TAP-CEF)	≤ 1	0	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (TAP-BDMG)	≤ 1	0,22	-
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco do Nordeste do Brasil (IPA-BNB)	quanto menor, melhor	0%	-
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco do Brasil (IPA-BB)	quanto menor, melhor	0%	-
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados à Caixa Econômica Federal (IPA-CEF)	quanto menor, melhor	0%	-
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (IPA-BDMG)	quanto menor, melhor	0%	-
		Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)	100%	0%	-
		Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)	100%	3,03%	Os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício.


		Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)	< 1 (quanto menor, melhor)	0,77	-
		Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)	≤ 240 (quanto menor, melhor)	80,75	-
		Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE)	1 (quanto mais próximo de 1, melhor)	1	-
2	Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros	Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)	quanto menor, melhor	75,7 dias	O presente período de avaliação (janeiro a março de 2022) ainda continua com as vistorias sendo feitas de forma remota para fins do exame dos pleitos em carteira, dada a impossibilidade de presença física por parte dos técnicos. O prazo médio de 75,7 dias para a vistoria poderia ter sido menor, não fosse a demora de 32 dias, em média, para que as empresas encaminhassem os vídeos e a documentação solicitada. Mesmo assim, das 37 vistorias 7 foram feitas com prazo inferior a 30 dias.
		Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)	quanto menor, melhor	0%	-
		Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)	quanto maior, melhor	71,3%	-
		Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)	quanto menor, melhor	66,6 dias	Apesar da média de dias ter extrapolado a meta fixada, 31 dos 62 pleitos aprovados tiveram seus exames concluídos em menos de 57 dias. Há que se observar que, historicamente, o primeiro trimestre de cada ano sempre apresenta prazos mais dilatados em função do período de férias dos servidores da Coordenação-Geral.
		Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)	quanto maior, melhor	4,4 análises por técnico	-
		Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)	quanto maior, melhor	5,3 vistorias por equipe	Cada equipe é constituída por 2 técnicos. O resultado observado no início de cada ano é sempre inferior ao observado nos demais

					períodos por força das férias regulamentares e da quantidade de novos pleitos que as empresas encaminham neste período.
3	Indicadores de Gestão de Convênios	Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)	100%	0%	Não foram ingressados pleitos de Convênios e Termos de Cooperação no primeiro trimestre de 2022.
		Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)	100%	0%	Não foram ingressados pleitos de Convênios e Termos de Cooperação no primeiro trimestre de 2022.
		Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)	0%	0%	Não foram ingressados pleitos de Convênios e Termos de Cooperação no primeiro trimestre de 2022.
		Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)	100%	16%	Das 25 visitas previstas para o exercício de 2022, 4 foram realizadas no primeiro trimestre.
		Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv	quanto menor, melhor	0	Não foram ingressados pleitos para fins de celebração de Convênios no primeiro trimestre de 2022.
		Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)	quanto menor, melhor	0	Não foram ingressados pleitos para fins de celebração de Termos de Cooperação no primeiro trimestre de 2022.
4	Indicadores de Gestão de Pessoas	Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)	100%	3,63%	-
		Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)	100%	4%	-
		Nível de Investimento em Capacitação (NIC)	100%	1,77%	-
5	Indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)	-	7.280	Desde a migração para o portal Gov.br, foi percebido um novo comportamento do usuário, com menos acessos ao site institucional. Durante o ciclo, a equipe manteve o site como principal plataforma de detalhamento de conteúdo, priorizando a divulgação de links diretos para o portal, a exemplo do que era feito antes da adoção obrigatória do Gov.br. As análises sobre este novo perfil de interação com o site poderão ser feitas a partir dos índices dos próximos ciclos.
		Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)	-	2'03"	-


Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)	não apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior	64,79%	Ligeiro crescimento, mas dentro da margem tolerável.
Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)	aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene no Facebook	2.788	Apesar de um novo padrão de consumo de informação do usuário, com preferência para o Instagram, houve um crescimento de aproximadamente 0,5% na quantidade de curtidas na página da Sudene no Facebook.
Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)	aumento de 4% no número de seguidores no Twitter da Sudene	1.297	Apesar de um novo padrão de consumo de informação do usuário, com preferência para o Instagram, houve um crescimento de aproximadamente 1,88% no número de seguidores no Twitter.
Seguidores no Instagram da Sudene	aumento de 3% no número de seguidores no Instagram da Sudene	3.075	Houve um acréscimo de 10,65% no número de seguidores no Instagram da Sudene, seguindo a tendência global de aumento de engajamento no Instagram em detrimento das outras redes sociais.
Matérias publicadas (MP - JOR)	30 matérias por ciclo	50	-
Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)	12 sugestões de pauta por ciclo	20	-
Peças audiovisuais (A&V - JOR)	10 produções em áudio ou vídeo	27	-
Jobs de publicidade e design (JOBS)	-	120	Produção acima da média.

Anexo VI - Acompanhamento da série histórica dos Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação


Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

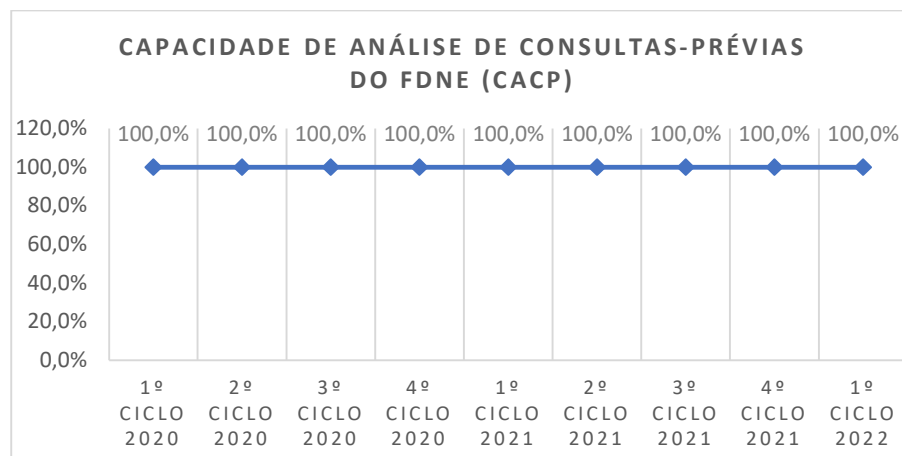


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

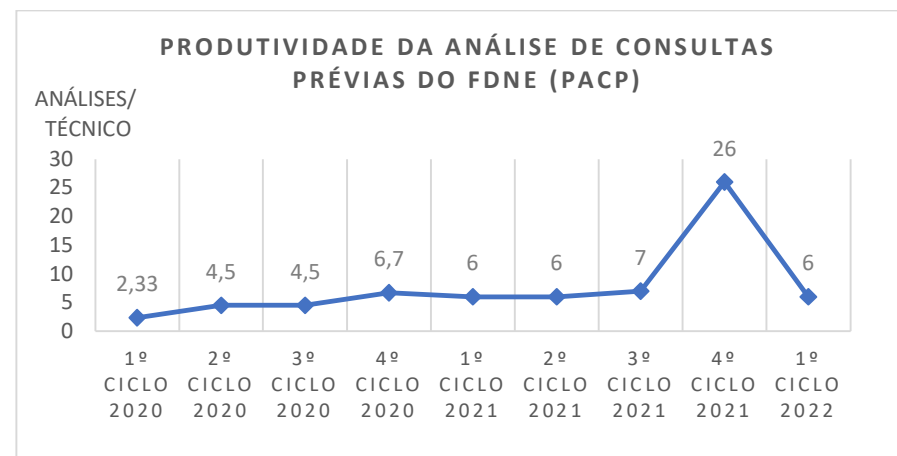


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

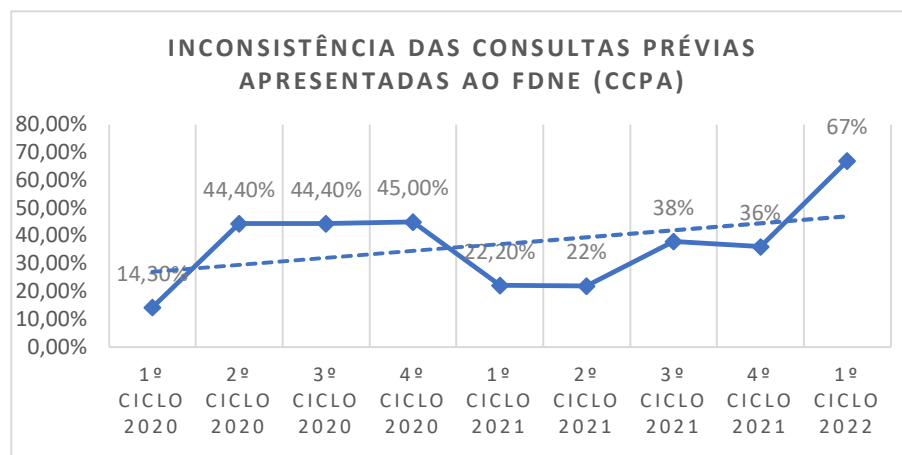


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

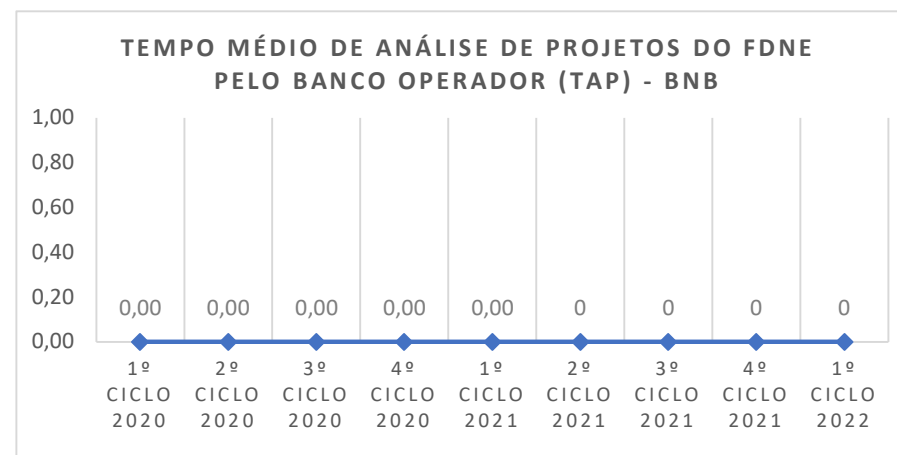


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

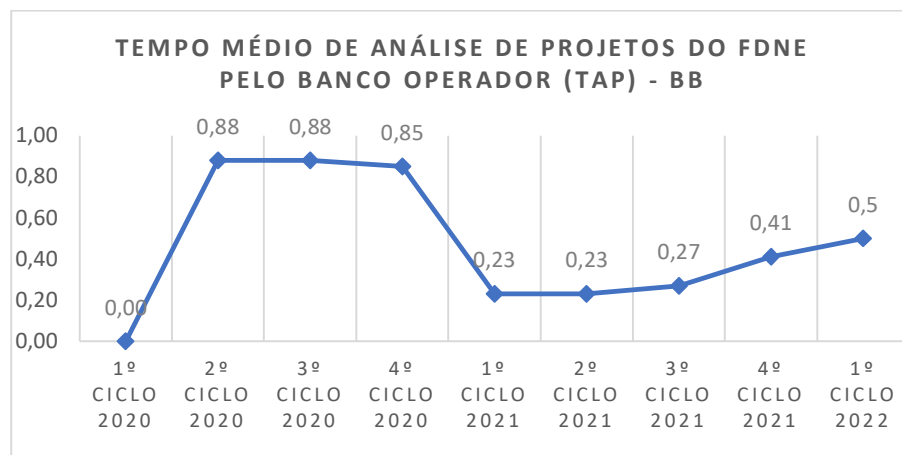


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

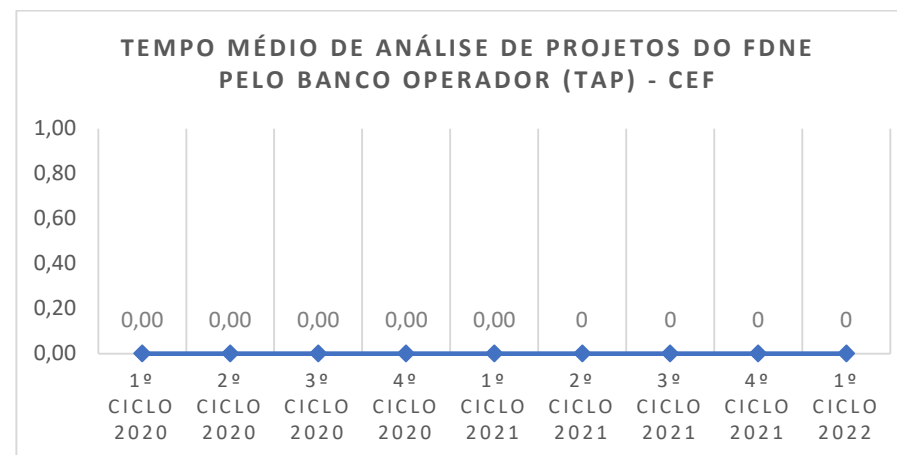

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

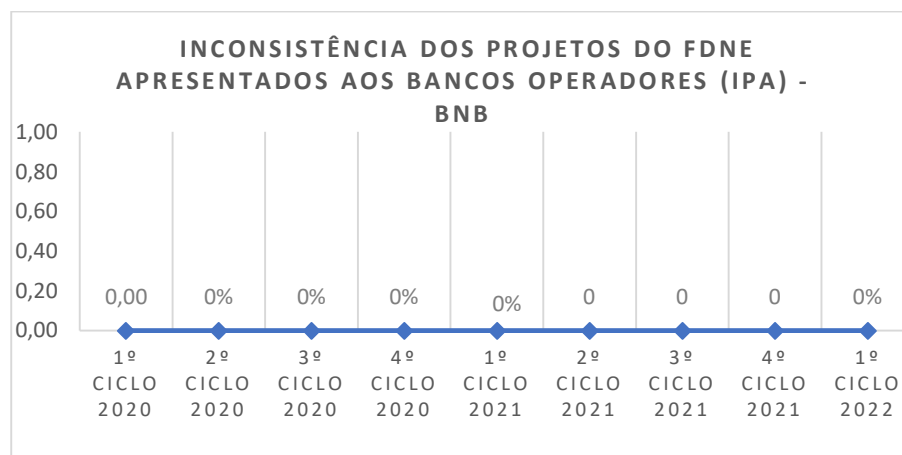


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

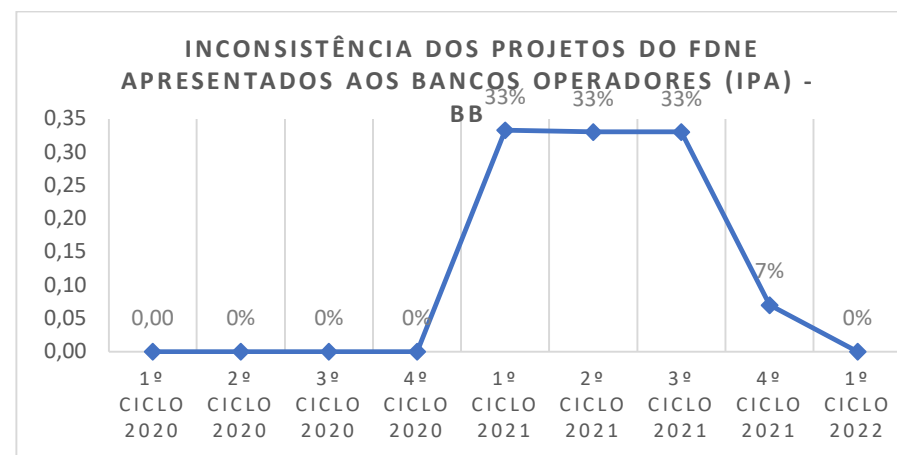


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

INCONSISTÊNCIA DOS PROJETOS DO FDNE APRESENTADOS AOS BANCOS OPERADORES (IPA) - CEF




Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FDNE (EORÇ-FDNE)

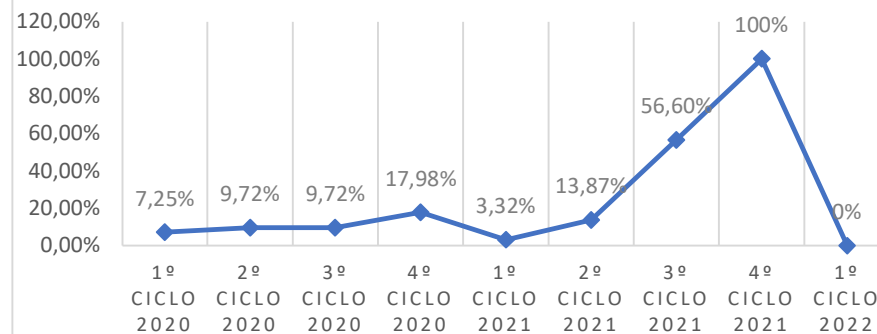


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FDNE (EFIN-FDNE)

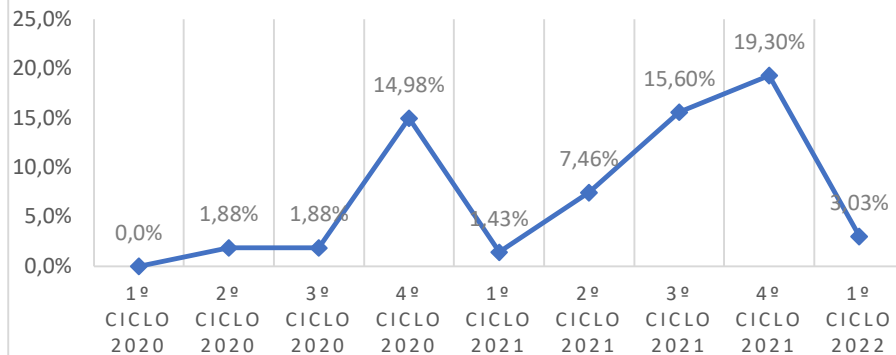


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento


TEMPO MÉDIO PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DO FDNE PELA DIRETORIA COLEGIADA APÓS APROVAÇÃO PELOS BANCOS OPERADORES (TDDC-FDNE)



Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

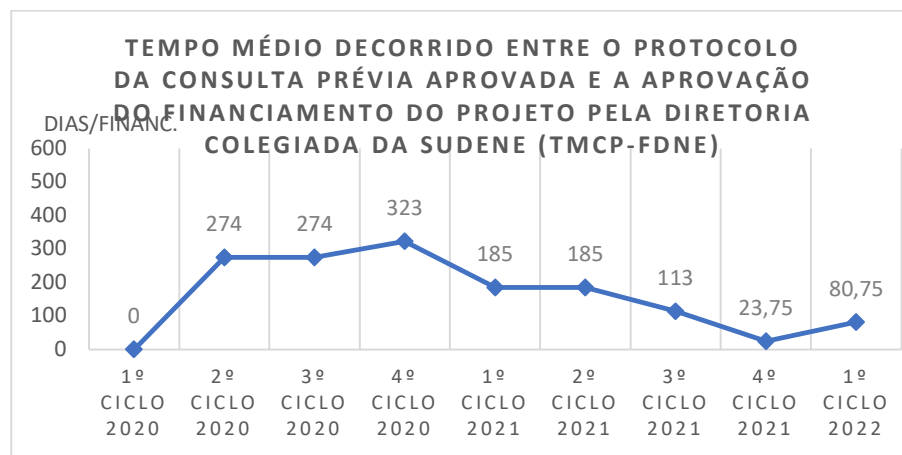


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

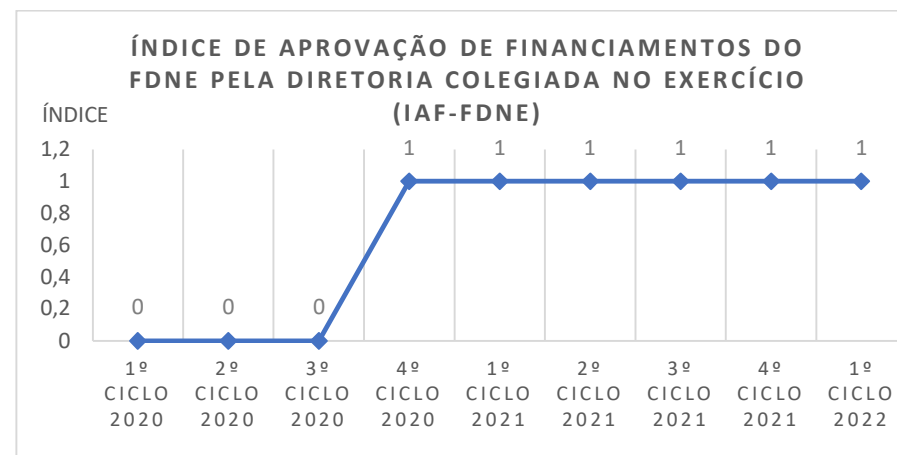


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

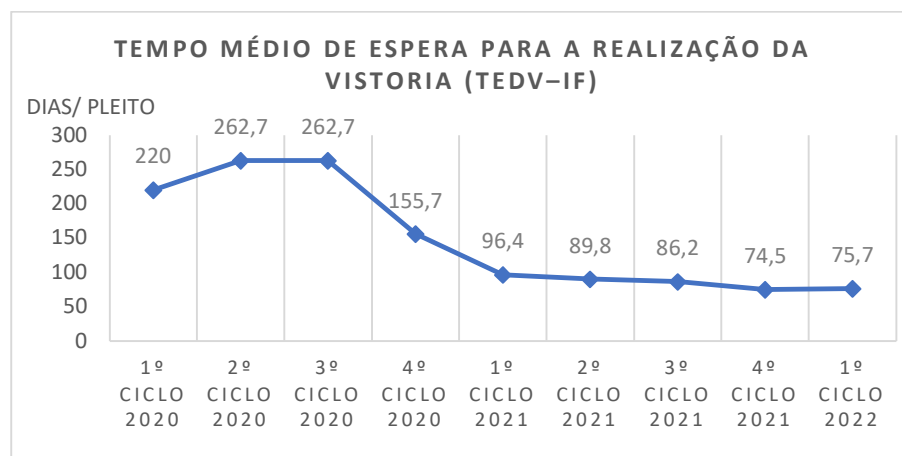


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

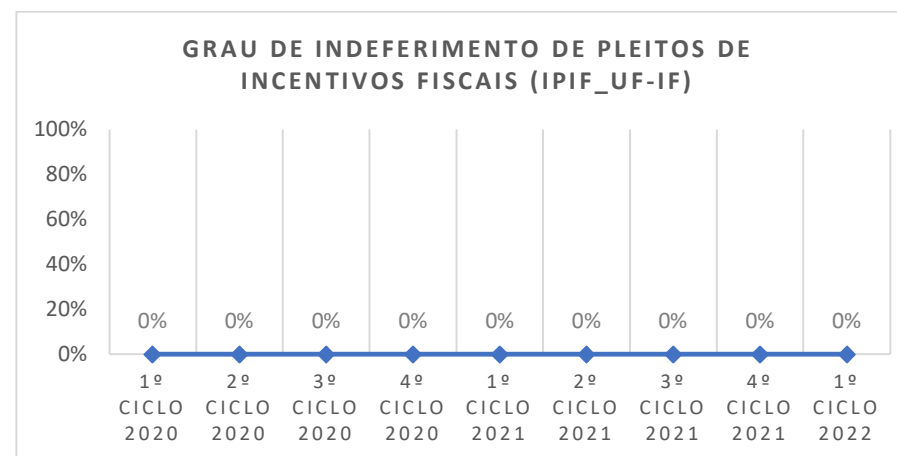


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

DESEMPENHO DA ANÁLISE DE PLEITOS DE INCENTIVOS FISCAIS (APIF-IF)

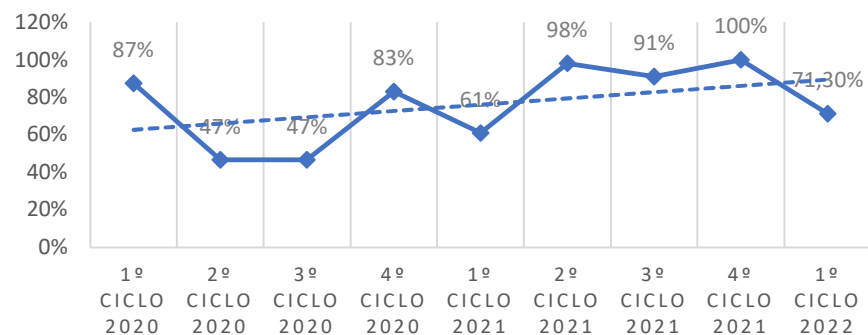


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA A CONCLUSÃO DA ANÁLISE DOS PLEITOS DE INCENTIVOS FISCAIS (TMEA-IF)

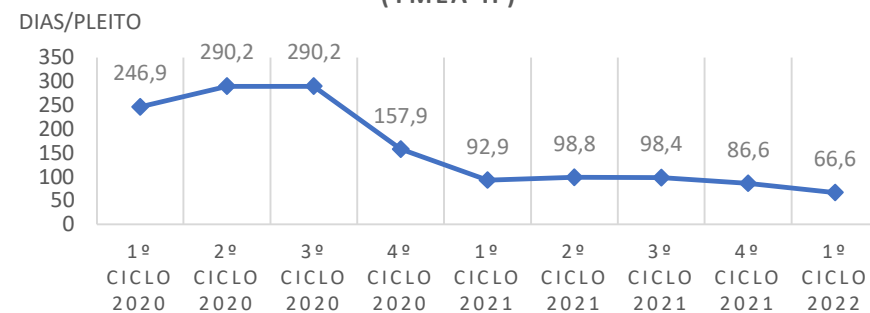


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

PRODUTIVIDADE DA ANÁLISE DE PLEITOS DE INCENTIVOS FISCAIS NO EXERCÍCIO (PAPI-IF)

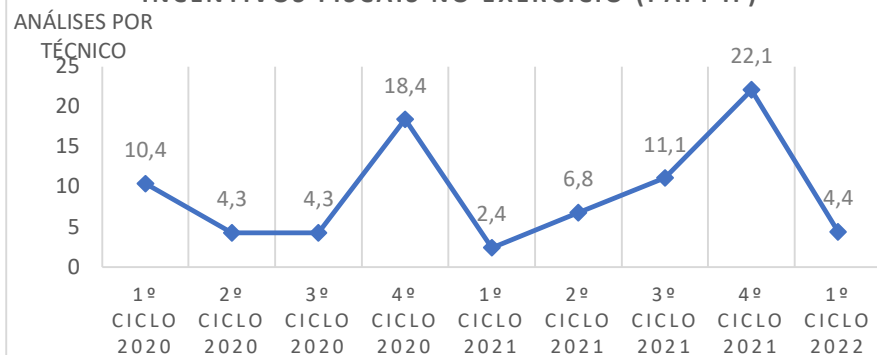


Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

PRODUTIVIDADE DAS FISCALIZAÇÕES DE PLEITOS DE INCENTIVOS FISCAIS (PFPI-IF)




Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros


Gestão de Convênios

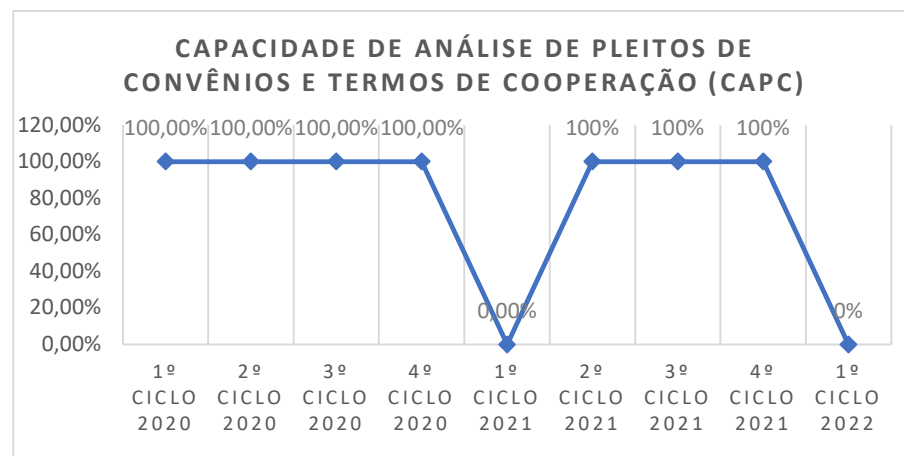


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

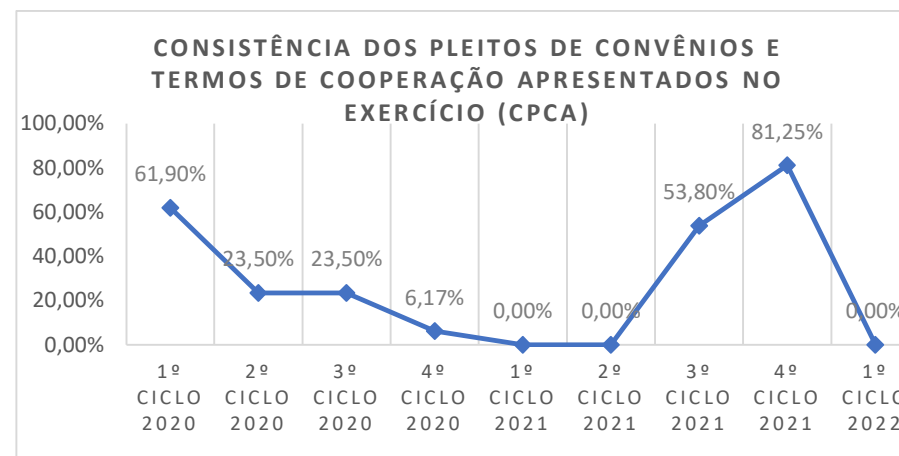

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

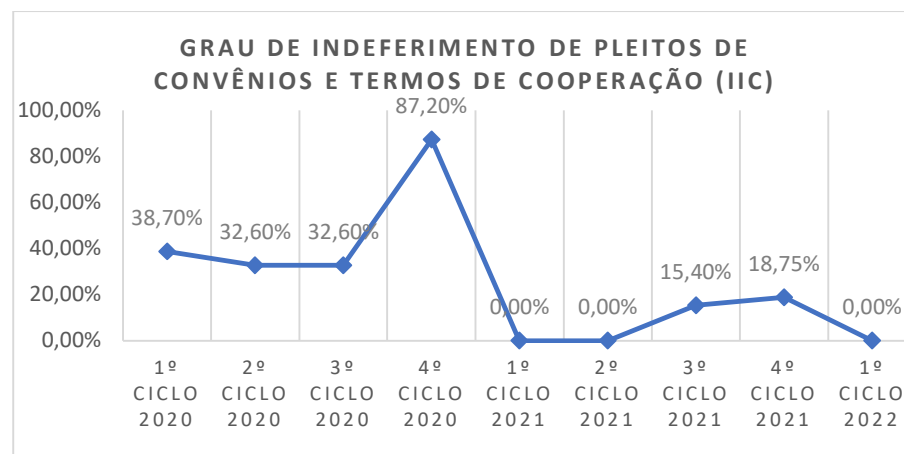


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

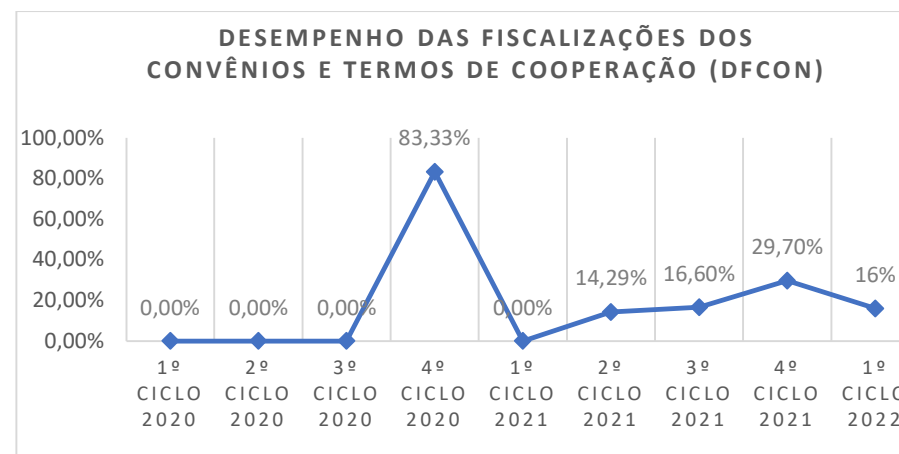

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

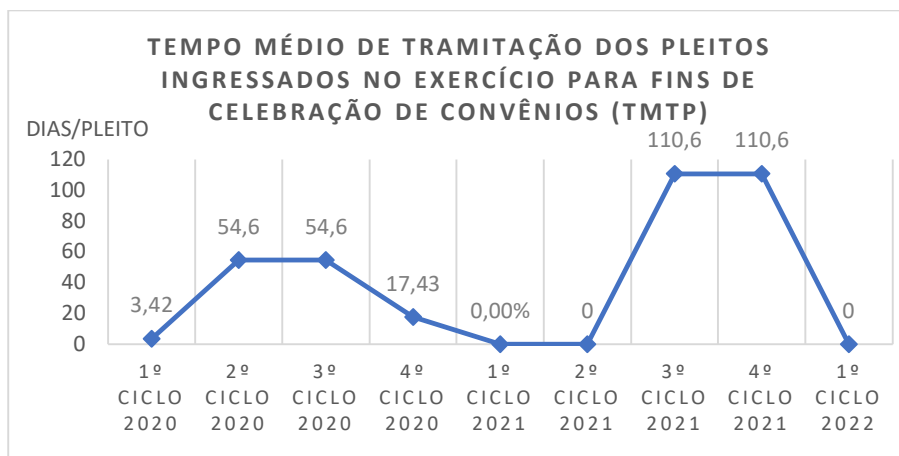


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

(1) É considerado o tempo da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

(2) A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício, não considerando os pleitos rejeitados no período.

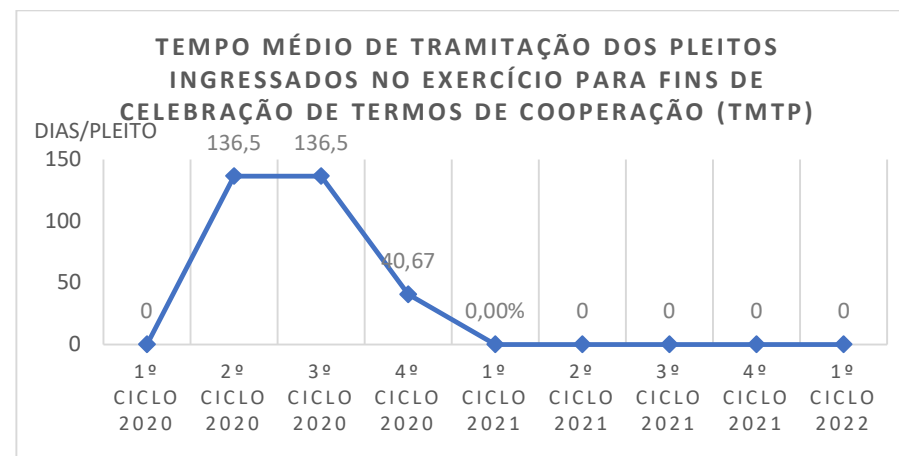


Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

(1) É considerado o tempo da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).


(2) A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício, não considerando os pleitos rejeitados no período.

Gestão de Pessoas

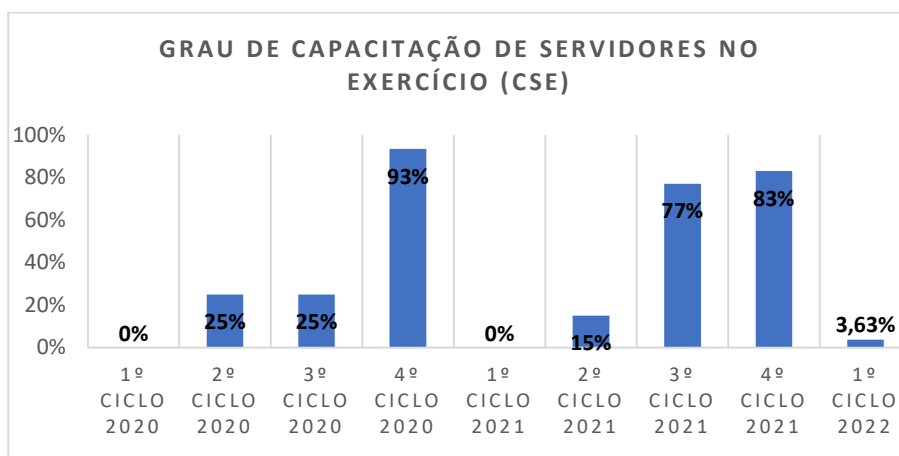


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: os dados iniciais são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

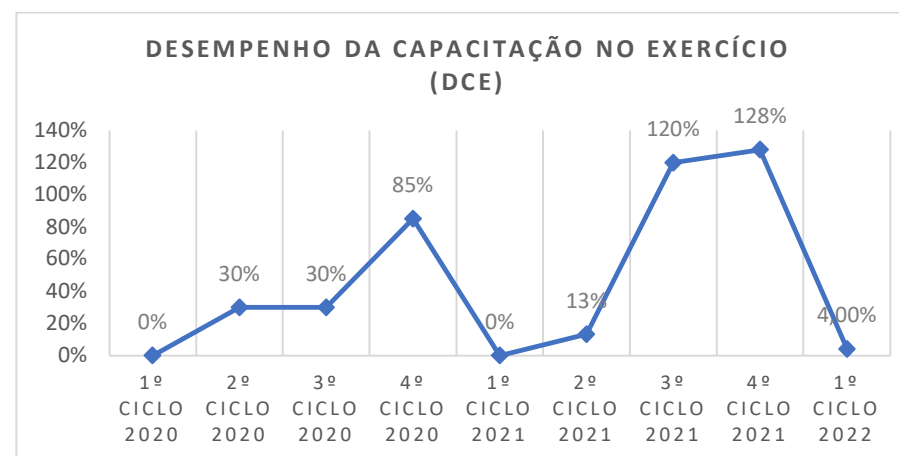

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas


Nota: os dados iniciais são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

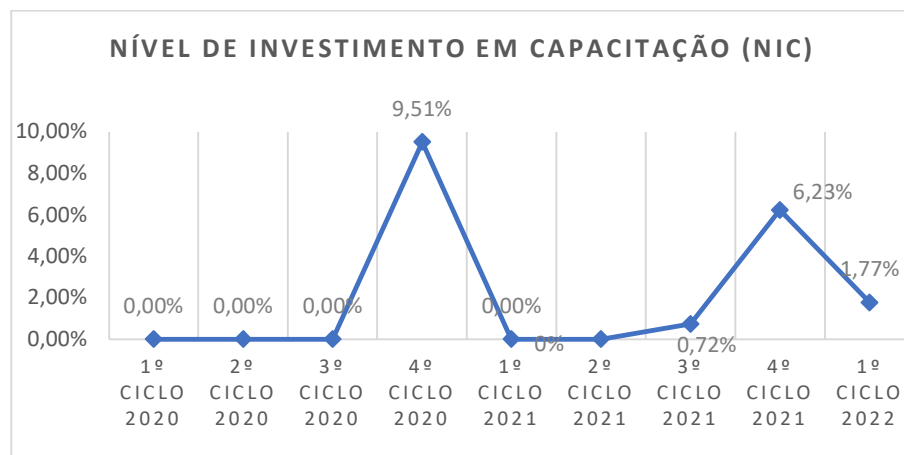


Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: os dados iniciais são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

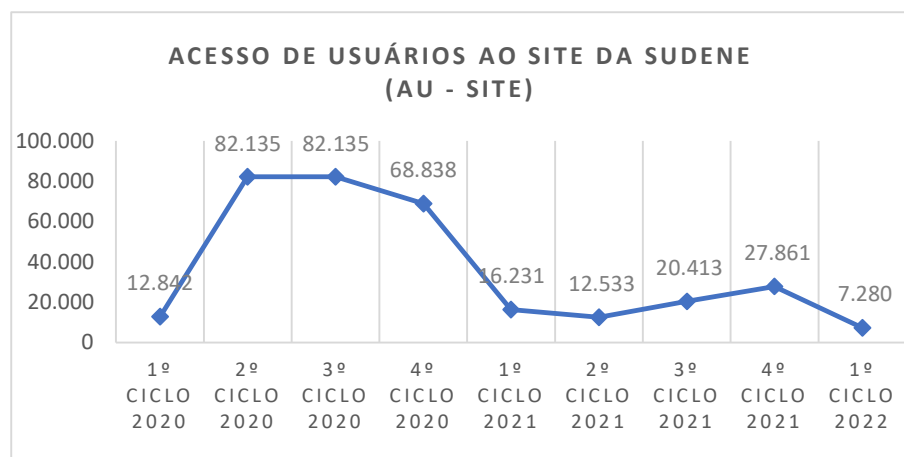


Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

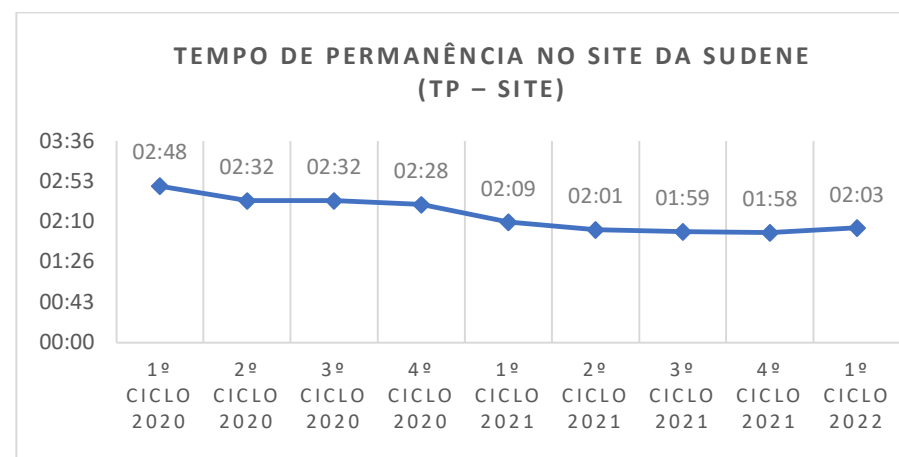

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


TAXA DE REJEIÇÃO AO SITE DA SUDENE (TR – SITE)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


CURTIDAS NA PÁGINA DA SUDENE NO FACEBOOK (FBL – RS)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


SEGUIDORES DO TWITTER DA SUDENE (TWT – RS)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


TAXA DE ENGAJAMENTO DO INSTAGRAM DA SUDENE (INSTA – RS)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

MATÉRIAS PUBLICADAS (MP - JOR)




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

SUGESTÕES DE PAUTA ENVIADAS À IMPRENSA (IMP - JOR)




Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

PEÇAS AUDIOVISUAIS (A&V - JOR)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

JOBS DE PUBLICIDADE E DESIGN (JOBS)



Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

**Anexo VII – Resultado parcial das metas de desempenho institucional
(período de 1º de outubro de 2021 a 31 de março de 2022)**

#	Perspectiva Estratégica da Sudene	Objetivo Estratégico da Sudene	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto	Unidade Responsável
1	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Nota Técnica	2 (100%)	50%	40	Projeto: Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste PRDNE PO CGCP/2020001 Obs: Meta será repactuada.	CGCP/DPLAN
2	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Nota Técnica	1 (100%)	0	0	Projeto: Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE. PO CGCP/2020003 Obs: Meta será retificada.	CGCP/DPLAN
3	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	5 (100%)	20% (1 Parecer)	16	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. PO CGCP 2021006.	CGCP/DPLAN CGEP/DPLAN
4	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	8 (100%)	0%	0	Projeto: Fortalecer uma rede policêntrica de 52 cidades polo das regiões intermediárias da área de atuação da Sudene de forma a contribuir para implementar o Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). PO CGCP 2022003.	CGCP/DPLAN
5	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	0%	0	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para 2022. PO CGCP 2022002.	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN

6	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual do Projeto	50%	100%	80	Projeto: Atualizar a delimitação do Semiárido. PO CGEP/2021001.	CGEP/DPLAN
7	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	0%	0	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para 2023. PO CGCP 2022001.	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN
8	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado	6	16,5% (1 parecer)	13	Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. PO CGEP 2021002.	CGEP/DPLAN
9	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades para a promoção do desenvolvimento regional	Celebração efetivada	1	100%	80	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. Meta institucional - Celebração de Avença para contratação da avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. PO CGEP 2020008.	CGEP/DPLAN
10	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual do Projeto	100%	0%	0	Projeto: Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias por meio de Emendas Parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene. PO CGDS 2022002.	CGDS/DPLAN
11	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Evento/ Webinário	4	0%	0	Realização de eventos de articulação de parceiros e difusão tecnológica: webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/DPLAN. PO CGDS 2022001.	CGDS/DPLAN

12	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual	10% (100%)	0%	0	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de Desenvolvimento de ações para a recomposição da Força de Trabalho. PO CGGP 2021001.	CGGP/DAD
13	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual do Projeto.	20% (100%)	50% (Foi realizado 10% da meta fixada)	40	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho PO CGGP/2018001	CGGP/DAD
14	4. Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Percentual do Projeto.	35%	100%	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de elaboração de indicadores de Gestão de Pessoas. PO CGGP/2020001	CGGP/DAD
15	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Relatórios	4	1	20	Atividade: Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	CGDF/DFIN
16	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual	100%	100% (22 Pleitos)	80	Atividade: Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	CGDF/DFIN
17	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual	100%	100% (02 pleitos)	80	Atividade: Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	CGDF/DFIN
18	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Pleitos Aprovados	320	62,2% (199 pleitos)	50	Atividade: Aprovação de Pleitos de incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene.	CGIF/DFIN
TOTAL ALCANÇADO (média aritmética)						32		

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.
