



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL**

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da SUDENE

4º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2017



**Recife
20 de dezembro de 2017**

Sumário

	Pág.
Introdução	3
1 – Resultados do monitoramento	6
2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	13
3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais	27
4 – Indicadores de Gestão de Convênios	34
5 – Indicadores de Gestão de Pessoas	55
6 - Indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional	58
7 - Metas de Desempenho Institucional para o período out/2017-set/2018	68
8 – Observações e Deliberações em plenária de 20/12/2017	72
9 – Conclusão	74
Anexo I – Planos Operativos do monitoramento	77
Anexo II – Gestão orçamentária e financeira 2017 (posição até agosto)	210
Anexo III – Planos Operativos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE	212
Anexo IV – Planos Operativos tabulados segundo a programação do PPA	219
Anexo V - Planos Operativos tabulados segundo unidades administrativas da SUDENE	226
Anexo VI - Planos Operativos prioritários, relacionados pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE	234

Introdução

Realizou-se no dia 20 de dezembro o quarto e último encontro de monitoramento e avaliação do Plano de Ação de 2017. Conhecidos como reuniões do ciclo de monitoramento da SUDENE, por que são realizados quadrimestralmente, esses encontros objetivam uma análise crítica de alguns projetos selecionados por indicação das autoridades máximas das diferentes diretorias da Autarquia, além das novas metas institucionais, que neste ciclo, computadas até o mês de novembro, ainda não tinham sido, em alguns casos, iniciadas, e mais aqueles projetos classificados como prioritários pela Resolução nº 281, de 13 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada, abaixo relacionados:

- I – A Formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (CGCP/DPLAN);
- II – A Formulação do Plano de Desenvolvimento Integrado de Feira de Santana (CGCP/DPLAN);
- III – O acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus planos de trabalho (CGDF/DFIN);
- IV – A estruturação do Observatório do Desenvolvimento do Nordeste (CGEP/DPLAN);
- V – O acompanhamento das atividades sobre a delimitação do Semiárido, inclusive as decorrentes da Proposição da Nova Delimitação do Semiárido a ser incluída na próxima reunião do CONDEL (CGEP/DPLAN);
- VI – A estruturação da Rede Palma, bem como o acompanhamento e a execução das atividades dela decorrentes (CGDS/DPLAN);
- VII - Capacitação de Gestores municipais para uso do SICONV (CGDS/DPLAN);
- VIII – O acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como ao apoio técnico à articulação de novas emendas (CGDS/DPLAN).

Neste ciclo foram computados 89 planos operativos no total, dos quais 35 da CGDS/DPLAN, 11 da CGEP/DPLAN, 3 da CGCP/DPLAN, 34 da CGDF/DFIN, 2 da CGGI/SUP, 2 da CGGP/DAD e 2 da CCONT/DAD que serão tipificados nos anexos. Essas siglas poderão ser entendidas no Siglário da SUDENE, disponível no endereço eletrônico: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf. Destes, 24 foram selecionados para apresentação na reunião.

Os 24 planos operativos priorizados na apresentação foram: a formulação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE); a formulação do Plano de Desenvolvimento Integrado de Feira de Santana; o acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil e com a CNI, bem como a execução de seus Planos de Trabalho; a estruturação do Observatório do Desenvolvimento do Nordeste (ODNE); A capacitação de gestores municipais da Bahia e de Pernambuco para uso do SICONV; o acompanhamento das atividades sobre a delimitação do Semiárido; a estruturação da Rede Palma, bem como o acompanhamento e a execução das atividades dela decorrentes; e o acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, num total de 15.

Os outros 65 POs também foram acompanhados e eletronicamente disponibilizados para a alta administração com antecedência, catalogados segundo unidades administrativas, e foram assim distribuídos: CGDS (17), CGEP (9), CGCP (1), CGDF (32), CGGI (2), CCONT (2), CGGP (2).

Neste evento, tal como aconteceu nos ciclos anteriores, a predominância foi de projetos concluídos e em andamento, que somaram 76 (85 %), contra 13 (15%) de projetos em atraso, cancelados ou paralisados. Todos, descritos nos anexos deste relatório.

Os referenciais estratégicos que lastrearam esses projetos, particularmente os finalísticos, são os mesmos mostrados no mapa estratégico que se encontra disponível no endereço eletrônico: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Mapa_Estrategico_Sudene.pdf.

A reunião contou com a presença do Superintendente Marcelo José Almeida das Neves e dos Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas, Alexandre Gusmão, e de Administração, Antônio Ribeiro. O Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, Sérgio Wanderley, encontrava-se em missão institucional fora do estado de Pernambuco.

A reunião, realizada na Sala JK, 14º andar do novo prédio, foi aberta pelo Superintendente, que imediatamente repassou a palavra ao Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, para início dos trabalhos.



Foto 1: abertura dos trabalhos do 4º ciclo de monitoramento 2017.



Foto 2: Momento em que o Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Alexandre Gusmão, tecia comentários sobre o processo de contratação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

O destaque da reunião foram as explicações sobre o início dos trabalhos para elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que segundo Marcelo Neves, será a consolidação do papel da SUDENE na Região, e a redenção para o Nordeste, mesmo sabendo que provavelmente não esteja à frente da Autarquia quando da sua conclusão. Nesse sentido, teceram comentários a respeito, além do próprio Superintendente, José Farias, Coordenador-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas, responsável pela gestão da elaboração do plano e o Diretor de Planejamento, Alexandre Gusmão. Trata-se de um plano que será contratado pelo PNUD, com o acompanhamento da SUDENE, ao custo de R\$ 1,14 milhão com previsão de conclusão em maio/2019.

Na reunião também foram destaques as ações conjuntas da SUDENE com a APEX e com a CNI, que possibilitou, ao longo do ano, a realização de eventos promocionais sobre os fundos de desenvolvimento regionais, os incentivos fiscais e sobre as potencialidades da região na pauta de exportações.

O Superintendente também destacou a visita do Presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, e as possibilidades de trabalhos conjuntos, que vão contribuir para consolidar o papel da SUDENE em sua área de atuação.

Igual destaque deu às Emendas Parlamentares, que contribuem para complementar a infraestrutura econômica em muitos municípios pobres do Nordeste. E nesse sentido destacou a importância dos 15 projetos em discussão naquele momento, e outros 43 que estavam para ser celebrados, frutos do mesmo mecanismo.



Foto 3: Momento em que o Superintendente Marcelo Neves tecia considerações sobre a importância das Emendas Parlamentares para a SUDENE.



Foto 4: Momento em que o Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, tendo a sua Esquerda, o Diretor de Administração, Antônio Ribeiro, e à sua direita, a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Carla Macedo, debatava os projetos de cooperação técnica da SUDENE com a Apex Brasil e com a CNI.



Foto 5: Momento em que eram mostrados os resultados, por unidade administrativa, dos quatro ciclos de 2017, e os seus status quanto ao andamento.



Foto 6: Momento em que o técnico Ademir Pedro Vilaça Júnior, da CGDF/DFIN, apresentava os resultados dos acordos de cooperação técnica com a APEX Brasil e com a CNI.

Mereceram atenção especial também, o PO da CGGI sobre o trabalho de elaboração da Carta de Serviço ao Usuário em sua versão eletrônica, em cumprimento ao Decreto nº 9.094/2017, já entregue à ASCOM para implantação no site da Autarquia, e o PO referente à sistematização do fluxo de convênios, em vias de conclusão. Também mereceram atenção os projetos da CGEP, particularmente o Observatório de Desenvolvimento do Nordeste (ODNE), que de acordo com o Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Alexandre Gusmão, deverá receber modificações para torná-lo uma fonte de consulta amigável para composição de dados, e a Rede Palma, da CGDS, que também receberá ajustes de forma a melhorar a dinâmica da interação entre o setor empresarial, a academia, e os agricultores, cuja página no site da Autarquia, ainda é pouco consultada. Por fim, os dois projetos da CGGP, referentes ao “Desenvolvimento por Competências” e “Avaliação de Competências”, essenciais na definição de uma política de gestão de pessoas.

1- Resultados do monitoramento

1.1 – Resultados Gerenciais do 4º Ciclo de Monitoramento 2017

O quadro adiante sintetiza a distribuição dos POs por unidades administrativas da SUDENE, segundo o andamento.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 4º ciclo 2017, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
A Iniciar								-
Concluído	4	6		20*				30
Em Andamento	27	1	3	9	2	2	2	46
Atrasado	2	4		4				10
Cancelado	2							2
Paralisado				1				1
TOTAL	35	11	3	34	2	2	2	89

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Projetos com pendência de emissão de certificado do empreendimento implantado.

Nota: As análises de convênios para emissão de parecer financeiro e as tomadas de conta especial foram trabalhadas, para fins de monitoramento, como planos operativos da Comissão Permanente de Convênios, Congêneres e Tomada de Contas Especial (CCONT/DAD)

O Gráfico 1, adiante, mostra a situação de todos os ciclos de 2017, particularmente, dos 89 projetos segundo seus status neste quarto ciclo.

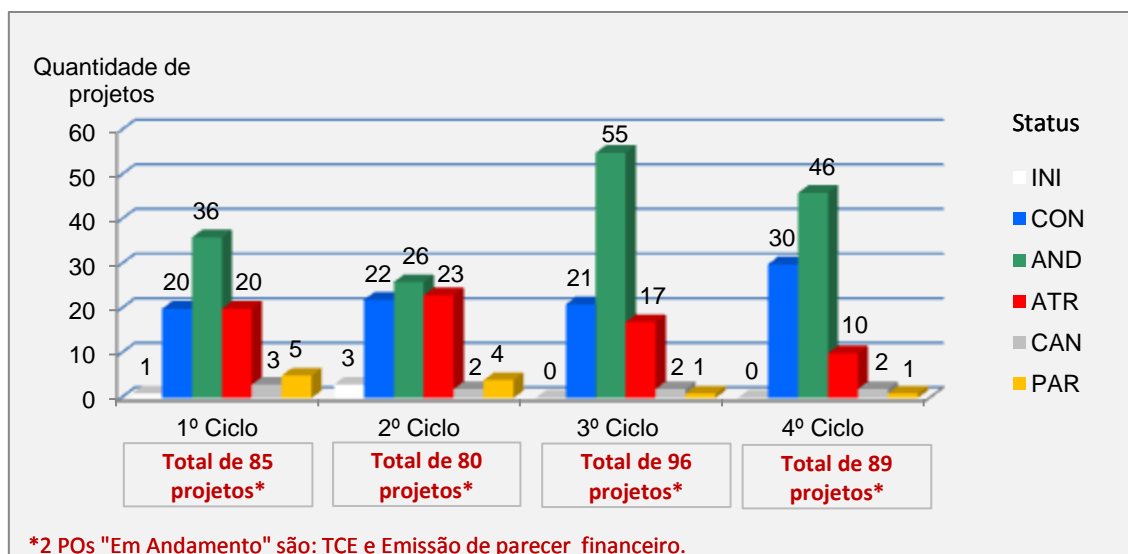


Gráfico 1 – Situação Geral dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2017, inclusive os prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

**Quadro 2 - Situação Geral dos Planos Operativos do 4º ciclo 2017,
por Diretoria e unidade vinculada, segundo o ano de início do projeto, incluindo
os classificados como prioritários pela Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE**

ANO	DPLAN			DFIN	Sup.	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	CGDF	CGGI	CGGP	CCONT	-
2008				3				3
2011				5				5
2012	2			16				18
2013	4		1	1				6
2014	5			1				6
2015	3	1		1				5
2016	15	8		3				26
2017	6	2	2	4	2	2	2	20
TOTAL	35	11	3	34	2	2	2	89

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	Status ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	46	8.581.612,63	6.701.007,76		22	16	7		1	46
	1.4	8	0,00	0,00		5		3			8
	1.5	1	234,11	234,11			1				1
Sub-Total		55	8.581.846,74	6.701.241,87	0	27	17	10	0	1	55
2	2.2	1	43.290,00	17.238,00			1				1
	2.3	2	989,48	724,24			2				2
Sub-Total		3	44.279,48	17.962,24	0	0	3	0	0	0	3
3	3.1	6	400,00	170,98			6				6
Sub-Total		6	400,00	170,98	0	0	6	0	0	0	6
4	4.2	1	0,00	0,00		1					1
Sub-Total		1	400,00	170,98	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL		65	8.626.526,22	6.719.375,08	0	28	26	10	0	1	65

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos**; **2.2**- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**; **3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; e **4-Fortalecer a imagem da SUDENE**; **4.2** - Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional .

²Os denominados “Projetos Enquadrados” quantificados na terceira coluna, incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴ Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos, exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enquadra- dos ² (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados ³ (R\$ 1 mil)	STATUS ⁴						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	32	8.575.474,50	6.695.419,70		20	6	5		1	32
	20N7	2	1.114,59	977,15			2				2
	20WQ	9	749,00	749,00		5	1	3			9
	4640	1	1.069,87	764,87			1				1
	8689	2	989,48	724,24			2				2
	8902	8	3.231,23	3.223,79			6	2			8
	8917	1	207,54	107,35			1				1
Sub-Total		55	8.582.836,22	6.701.966,11	0	25	19	10	0	1	55
2111	2000	4	400,00	170,98			4				4
Sub-Total		4	400,00	170,98	0	0	4	0	0	0	4
2069	-	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		1	43.290,00	17.238,00	0	0	1	0	0	0	1
Ações Internas		5	0,00	0,00		3	2				5
Sub-Total		5	0,00	0,00	0	3	2	0	0	0	5
TOTAL		65	8.626.526,22	6.719.375,08	0	28	26	10	0	1	65

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; 20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 7K66-Emenda Parlamentar). **Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres** (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação 2000 – Administração da Unidade); Programa 2069- Segurança Alimentar e Nutricional; **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Os denominados “Projetos Enquadrados” incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

³Os dados sobre “Recursos Liberados” consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

⁴Sigla para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

**Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos,
exclusive os da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo
Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017**

Unidade superior	Sub-unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	17	6.612,72	5.797,41		3	12	2			17
	CGEP	9	749,00	749,00		5	1	3			9
	CGCP	1	43.290,00	17.238,00			1				1
Sub-Total		27	50.651,72	23.784,41	0	8	14	5	0	0	27
DFIN	CGDF/ FDNE	32	8.575.474,50	6.695.419,70		20	6	5 ³		1	32
Sub-Total		32	8.575.474,50	6.695.419,69	0	20	6	5	0	1	32
SUP.	CGGI	2	0,00	0,00			2				2
Sub-Total		2	0,00	0,00	0	0	2	0	0	0	2
DAD	CCONT	2	0,00	0,00			2 ⁴				2
	CGGP	2	400,00	17098			2				2
Sub-Total		4	400,00	170,98	0	0	4	0	0	0	4
TOTAL		65	8.626.526,22	6.719.375,08	0	28	26	10	0	1	65

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.


² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

³Projetos do FDNE na condição de espera para receber o Certificado de Empreendimento Implantado.

⁴TCE e Emissão de parecer financeiro.

⁵ Os projetos prioritários não foram contabilizados nesta tabela. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

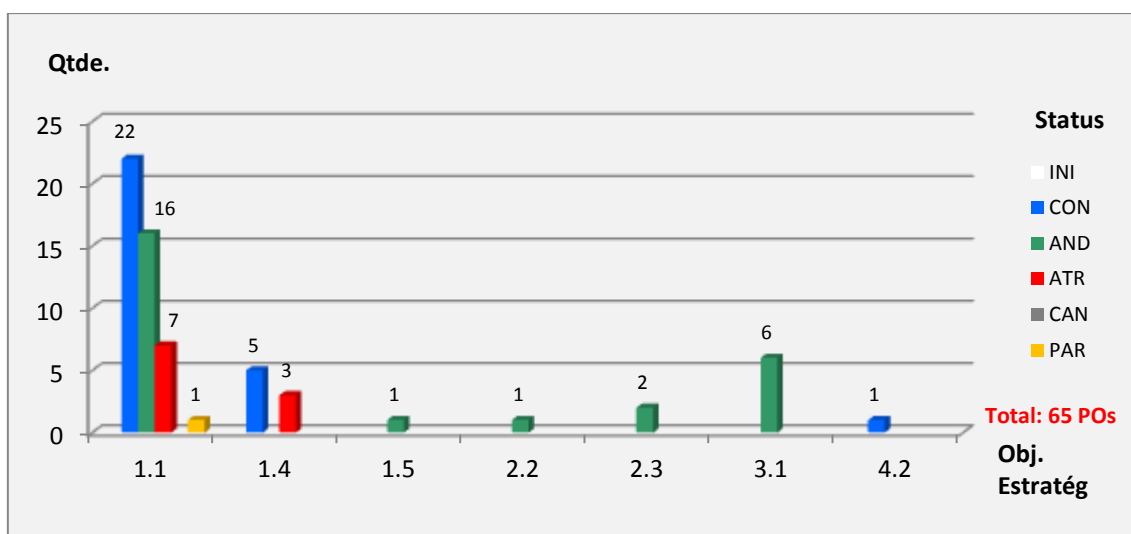


Fonte: Coordenação Geral de Gestão Institucional

Observação: As convenções utilizadas para **identificar diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste;** 1.1 – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; 1.4-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; 1.5 – Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos;** 2.2- Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido; 2.3-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE;** 3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências; e **4-Fortalecer a imagem da SUDENE;** 4.2 - Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º Ciclo – 2017), exclusive os Projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

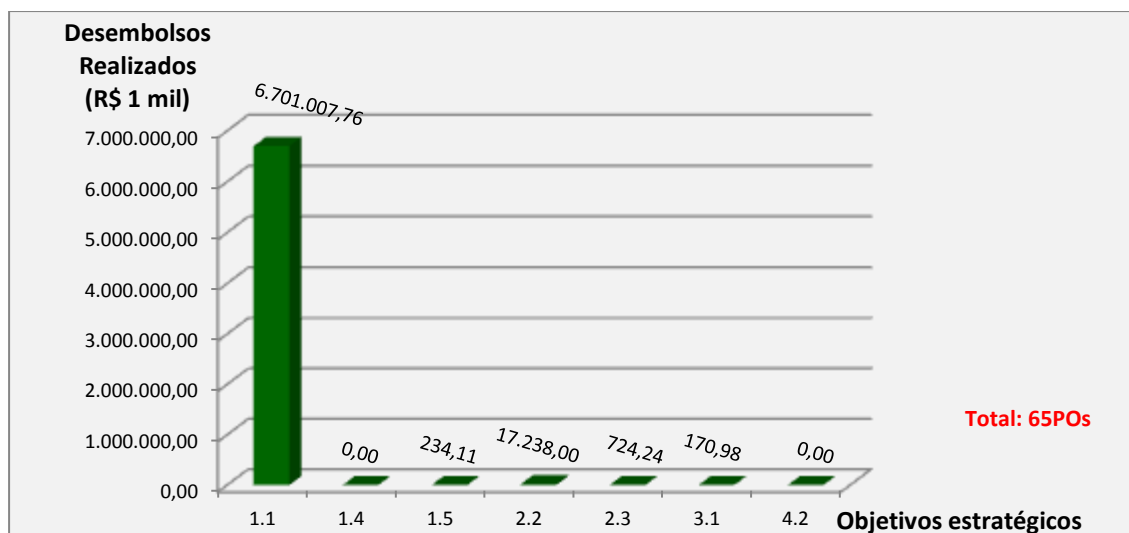

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

* Os projetos prioritários não foram contabilizados neste gráfico. Os dados referentes a estes projetos se encontram no anexo.

Gráfico 3 – Liberações realizadas segundo os Objetivos Estratégicos da SUDENE (4º ciclo - 2017), exclusive os projetos prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada da SUDENE

Tabela 4 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	Status ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	19	8.381,26	2.727,44		1	17	1			19
	1.3	2	0,00	0,00			2				2
	1.4	1	0,00	0,00		1					1
	1.5	2	95,88	0,00					2		2
TOTAL		24	8.477,13	2.727,44	0	2	19	1	2	0	24

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As convenções utilizadas para identificar **diretrizes e objetivos estratégicos** são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste**; **1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido; **1.5** – Fortalecer as administrações públicas.

² Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

Tabela 5 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017

Programa do PPA ¹ (Código)	Ação do PPA ¹ (Código)	Projetos enqua-drados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	20 WQ (PO 0000)	2	0,00	0,00		1		1			2
	20WQ (PO 0004)	2	1.849,76	0,00			2				2
	8917	2	95,88	0,00					2		2
	7K66	15	6.531,50	2.727,44		1	14				15
Sub-Total		21	8.477,14	2.727,44	0	2	16	1	2	0	21
Não se Aplica		3	0,00	0,00		0	3				3
Sub-Total		3	0,00	0,00	0	0	3	0	0	0	3
TOTAL		24	8.477,13	2.727,44	0	2	19	1	2	0	24

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Notas:

¹Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2016-2019: **Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial** (Ações: 20WQ -Plano Orçamentário 0000 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial; 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais ;7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Emenda Parlamentar). **Não se aplica** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.

²Siglário para status: INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

Tabela 6 - Distribuição Quantitativa dos Projetos da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada, segundo Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 4º Ciclo de Monitoramento de 2017

Diretoria	Unidade Adm. ¹	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R\$ 1 mil)	Recursos liberados (R\$ 1 mil)	STATUS ²						Total
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	
DPLAN	CGDS	18	6.627,37	2.727,44		1	15		2		18
	CGEP	2	0,00	0,00		1		1			2
	CGCP	2	1.849,76	0,00			2				2
Sub-Total		22	8.477,13	2.727,44	0	2	17	1	2	0	22
DFIN	CGDF/ FDNE	2	0,00	0,00			2				2
Sub-Total		2	0,00	0,00	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL		24	8.477,13	2.727,44	0	2	19	1	2	0	24

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE

Notas:

¹As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

² Siglário do Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Referência: 30/11/2017 (4º Ciclo de monitoramento-2017)

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas} \times 100}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}} = \frac{64 \times 100}{64} = 100,00 \%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica

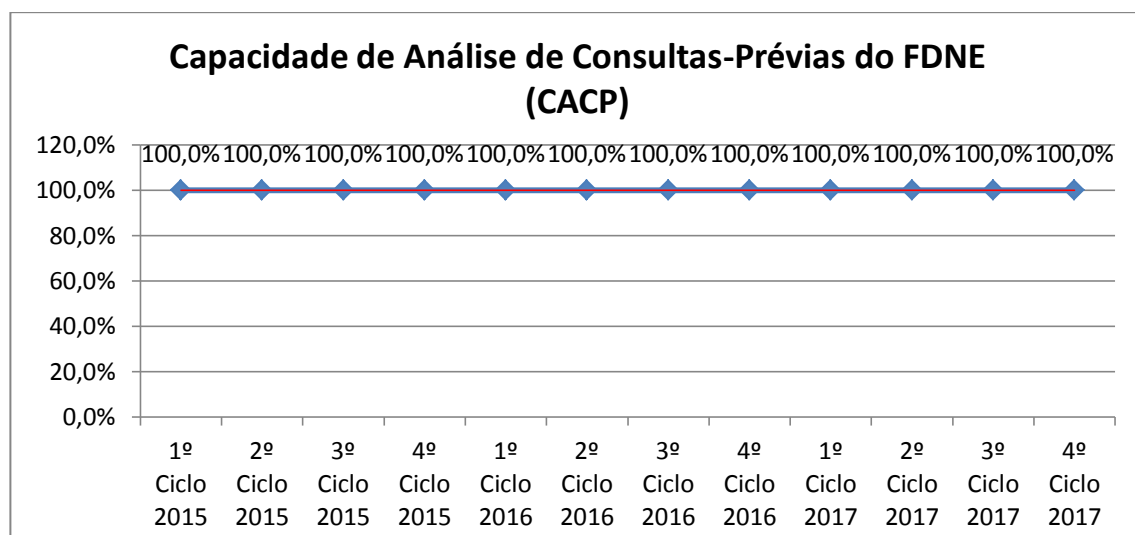

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:¹ até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{64}{6} = 10,67$ análises/técnico

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	3,57 análises/técnico	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,43 análises/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	1,67 análises/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	4,5 análises/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	5,7 análises/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,33 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,5 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	3 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	3 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	7,13 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	6,56 análises/técnico	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

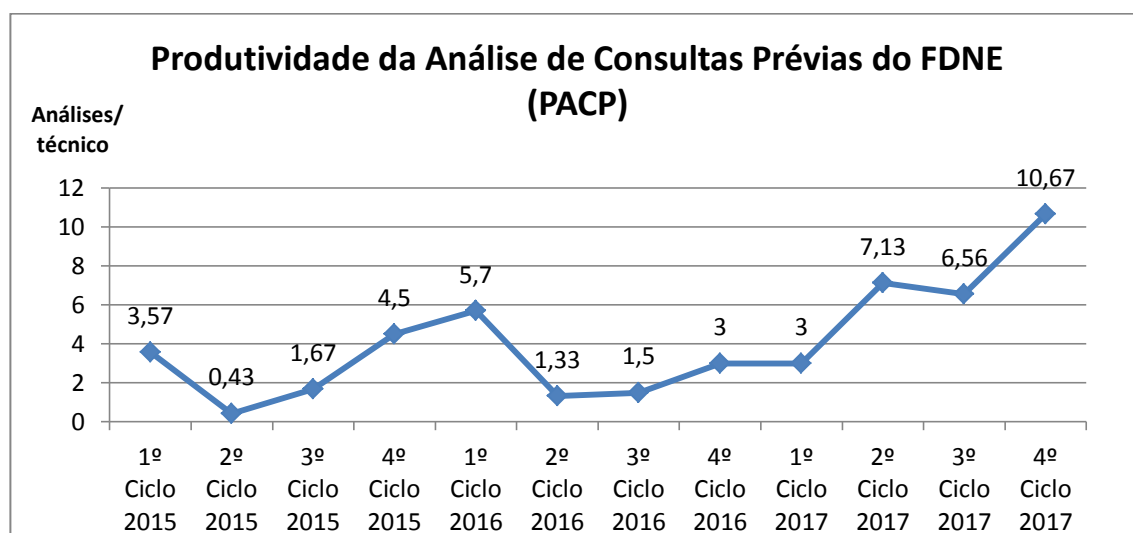

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

A melhoria da produtividade na análise de consultas-prévias é consequência não apenas do aumento do número de técnicos no setor, em que pese o papel exercido pelo agente bancário operador nesse processo, mas também da redução da demanda em determinados períodos, consequência, em parte, do recuo da classe empresarial diante da retração da economia que ainda se manteve em 2017, da perda de poder aquisitivo da população que freou o consumo e consequentemente a produção, e do encarecimento do custo do crédito. Portanto, nesse momento, é um resultado que precisa ser considerado com cuidado.


2.3 - Inconsistência das Consultas Prévia Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévia Devolvidas} \times 100}{\text{Consultas Prévia Protocoladas}} = \frac{50 \times 100}{64} = 78,1\%$

- b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2017
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2014	40%	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	63%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	55,9%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	62,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	55,5%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	50%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	50%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	78,9%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	79,7%	3º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

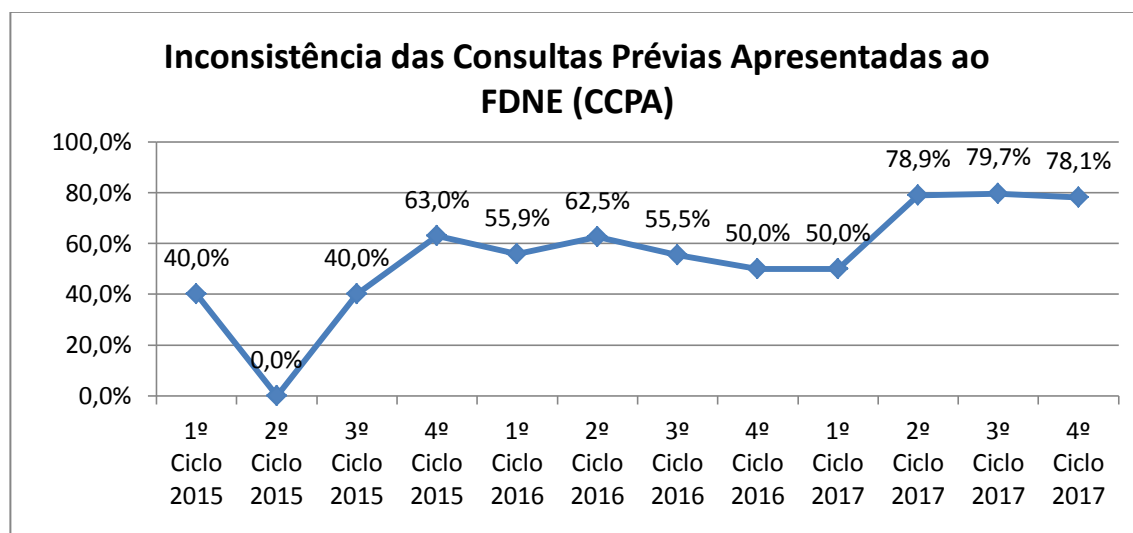

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Nota:

¹ Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{125 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 1,39$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$


a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

$$\text{a) Fórmula: } \frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{90 \text{ dias}} = \frac{0,0 \text{ dias}}{90 \text{ dias}} = 0,00$$

- b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal (índice): (igual ou menor que 1 (um))
- e) Periodicidade: Jan-nov/2017
- f) Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foi apresentado projeto ao BB. A CEF não concluiu nenhuma análise de projeto no período observado.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0,00; BB 0,00; CEF 0,00	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0,00; BB 1,36; CEF 0,00	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0,00; BB 1,22; CEF 0,00	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0,00; BB 1,48; CEF 0,00	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0,00; BB 1,46; CEF 0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 1,39; BB 1,46; CEF 0,00	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

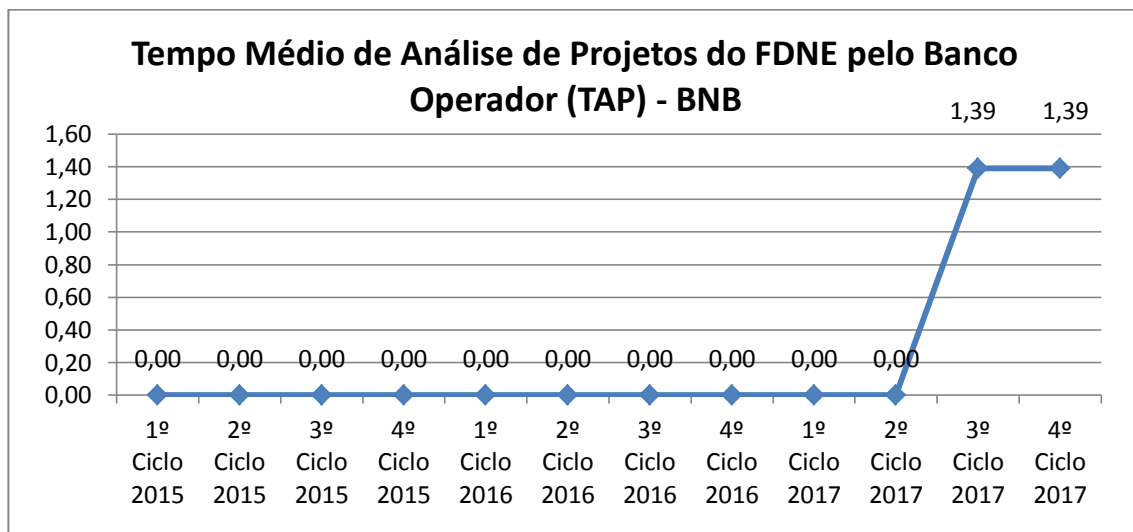


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

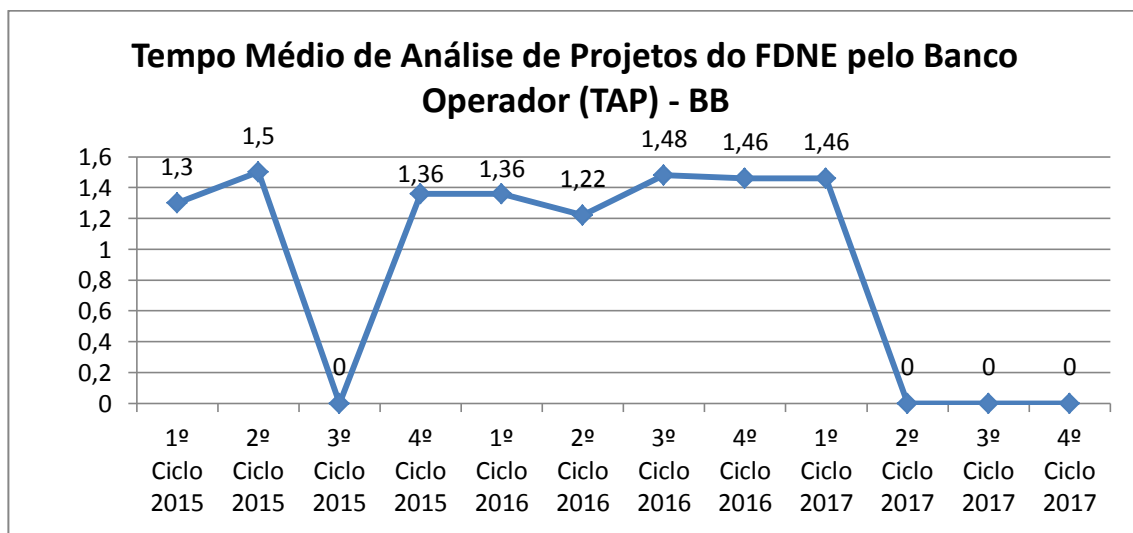

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

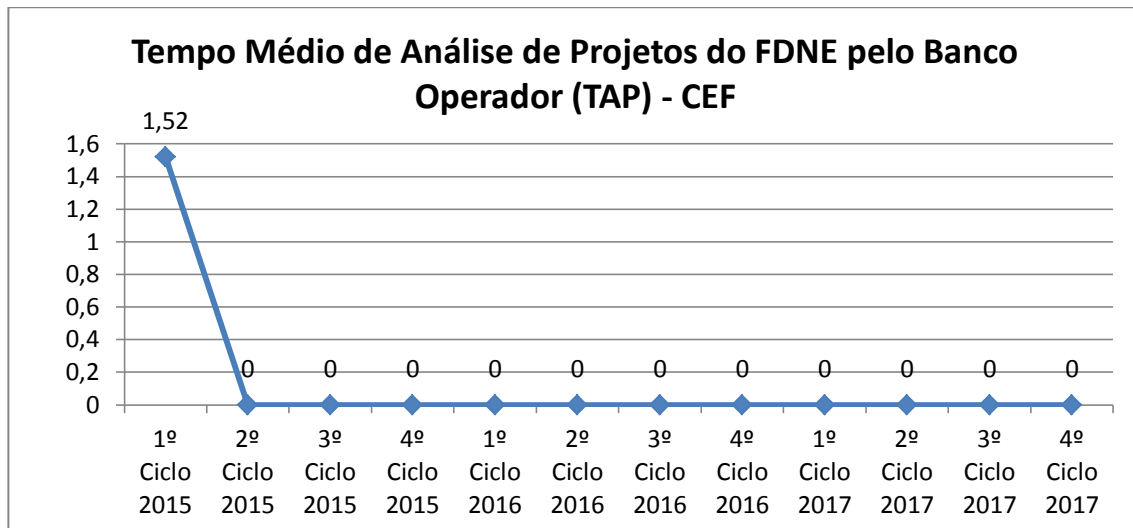

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{2} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0\%$$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados} \times 100}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \times 100}{2} = 0\%$$


b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

- d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2017
- f) Comentários: Foram apresentados 02 (dois) projetos ao BNB e 02 (dois) à CEF no período observado. Apenas o BNB concluiu a análise dos projetos apresentados.
- g) Resultados anteriores:


Jan a dez/2014	BNB 100%; BB 66,7%; CEF 33,3%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	BNB 0%; BB 50%; CEF 0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	BNB 0%; BB 100%; CEF 0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	BNB 0%; BB 43%; CEF 0%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	BNB 0%; BB 0,00%; CEF 0%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	BNB 0%; BB 40%; CEF 0%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	BNB 0%; BB 0%; CEF 0%	3º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

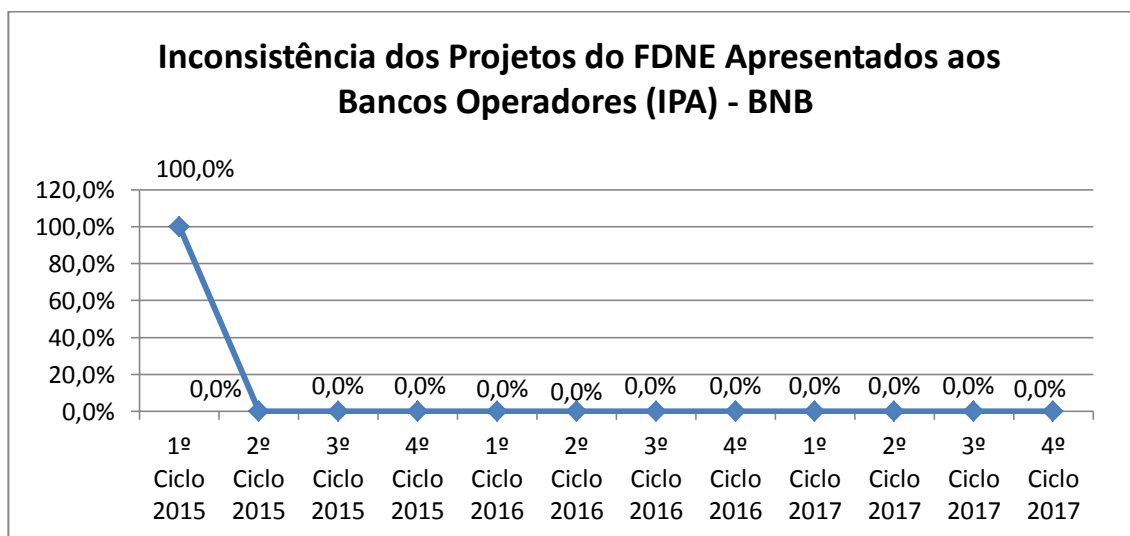


Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

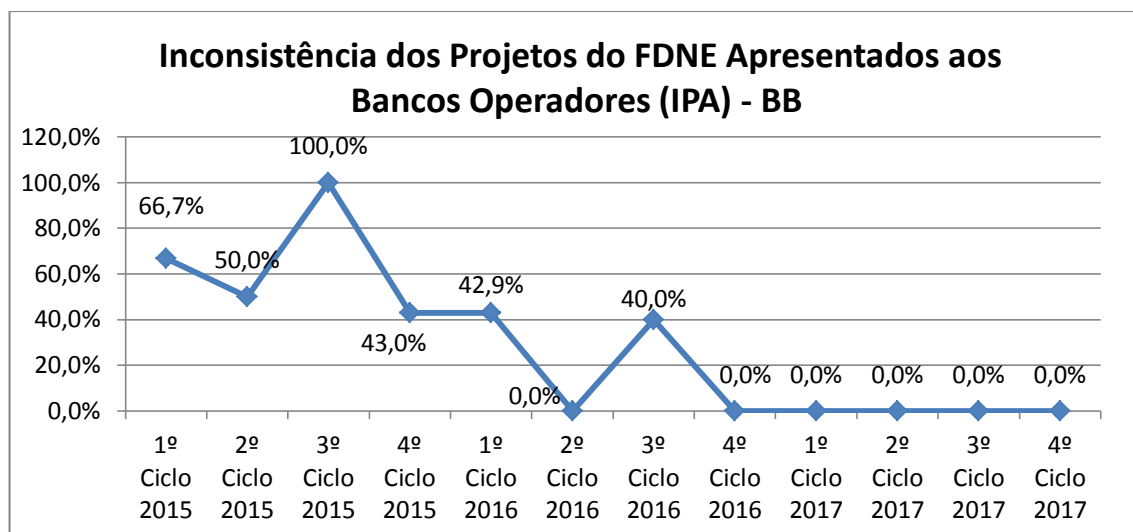

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

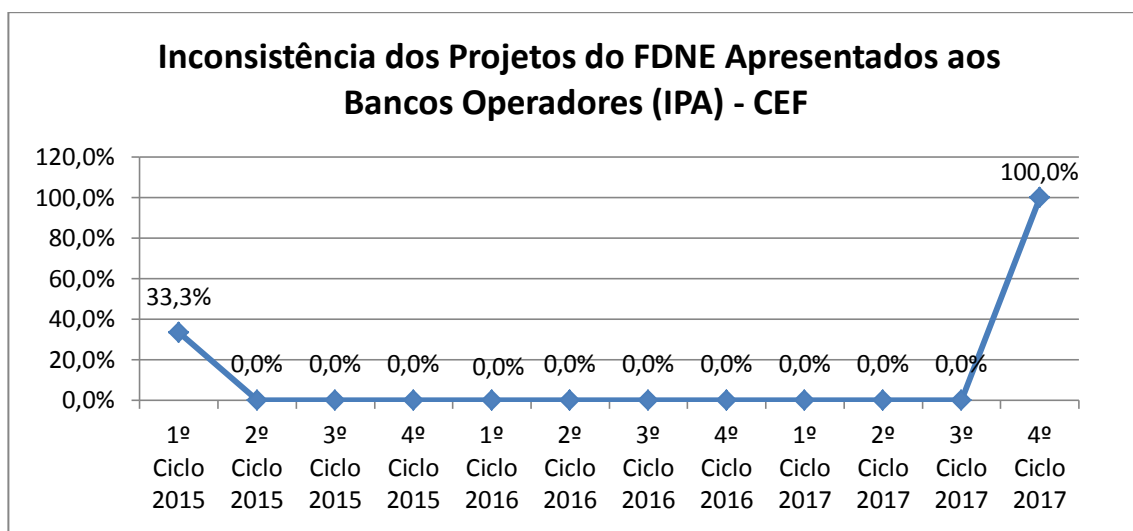

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Valor empenhado LOA 2017} \times 100}{\text{Dotação LOA 2017}} = \frac{21.965.302,00}{1.497.686.861,00} \times 100 = 1,47\%$$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	12,7%	2º ciclo 2015
Jan a Ago/2015	12,7%	3º ciclo 2015
Jan a Nov/2015	19,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,47	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

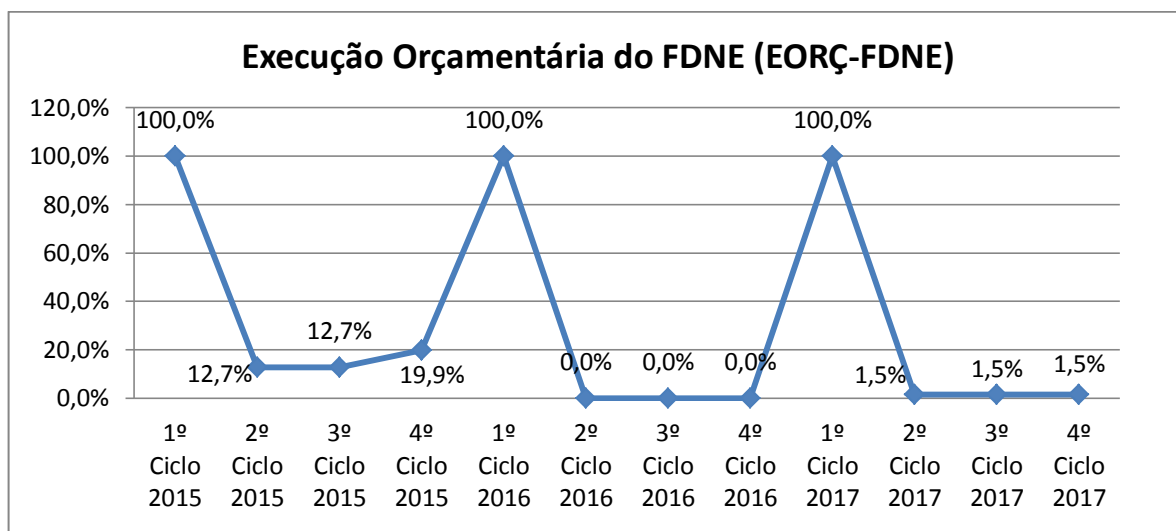

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib.} \times 100}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{162.571.681,49 \times 100}{1.909.953.510,03} = 8,51\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 100,00 %


e) Referência da aferição: Jan-nov/2017

f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	40,1 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,37%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	13,44%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	17,74%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	13,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	5,70%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	10,9%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	11,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	7,6%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	2,57%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	2,57%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

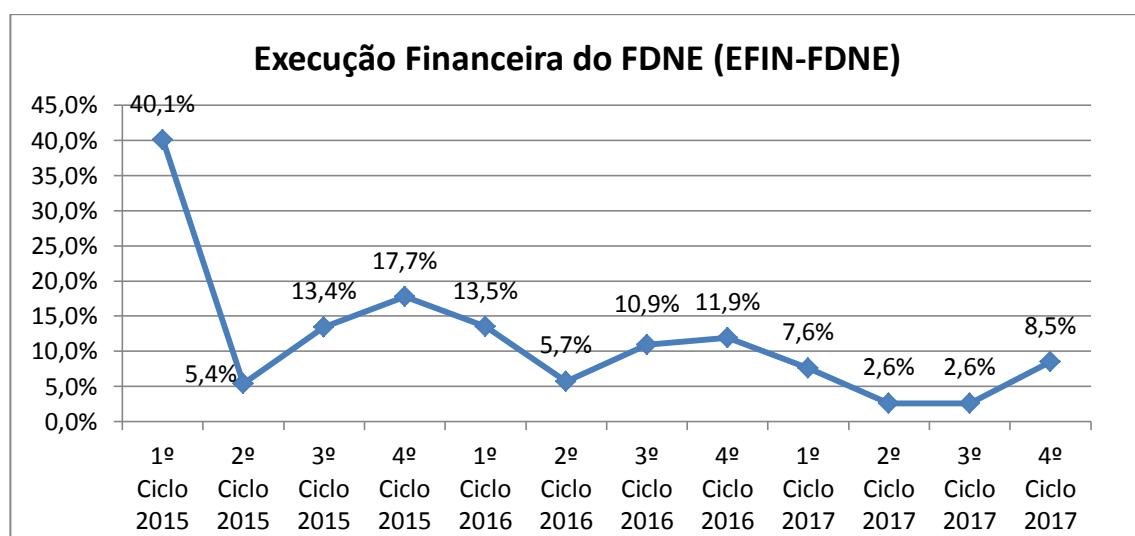

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_l}{30 \text{ dias}} = \frac{15}{30} = 0,5$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Reduziu-se 15 dias do intervalo de tempo entre as datas de protocolo e da aprovação dos projetos, devido à publicação da Portaria nº 119 de 27 de setembro de 2017 que suspendeu os prazos dos processos administrativos entre 15 e 30/07/2017.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0,58	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,58	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,9	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,9	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,78	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,00	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

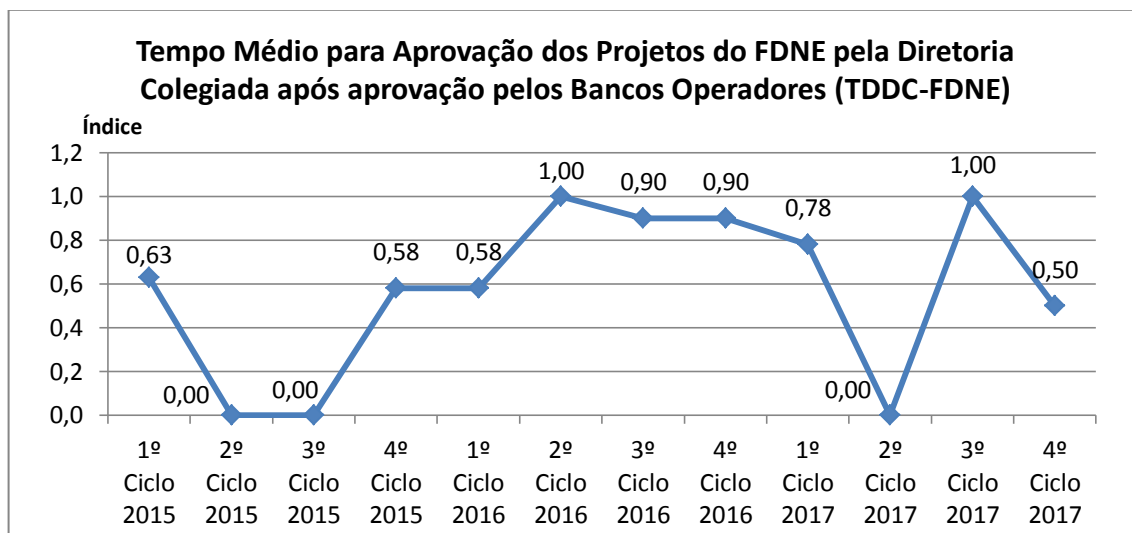

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M₁ – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:


¹ 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

- a) Fórmula: $T_m = \frac{T}{N} = \frac{504 \text{ dias}}{2 \text{ financiamentos aprovados}} = 252 \text{ dias/financiamento aprovado}$
- b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.
- c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento
- d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)
- e) Periodicidade: Jan-nov/2017
- f) Comentários: O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.
- g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	295,34 dias	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	295,34 dias	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	373 dias	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	321,8 dias	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	315,2 dias	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	315,2 dias	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0 dias	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	252 dias	3º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

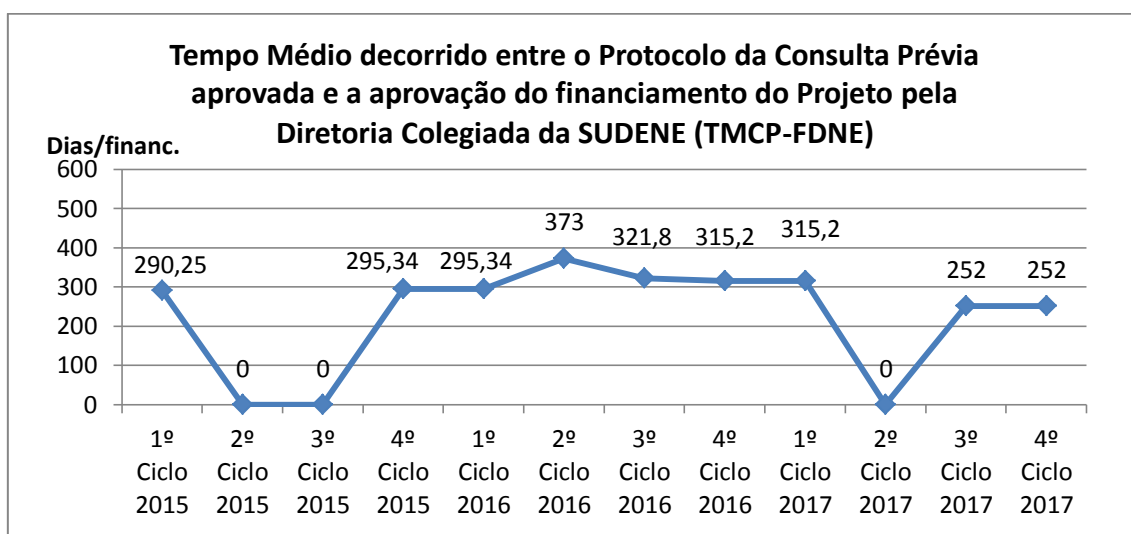

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{2}{2} = 1,00$$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a maio/2015	0,0	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,0	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	1,0	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	1,0	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,0	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	1,0	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	1,0	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	1,0	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,0	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	1,0	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

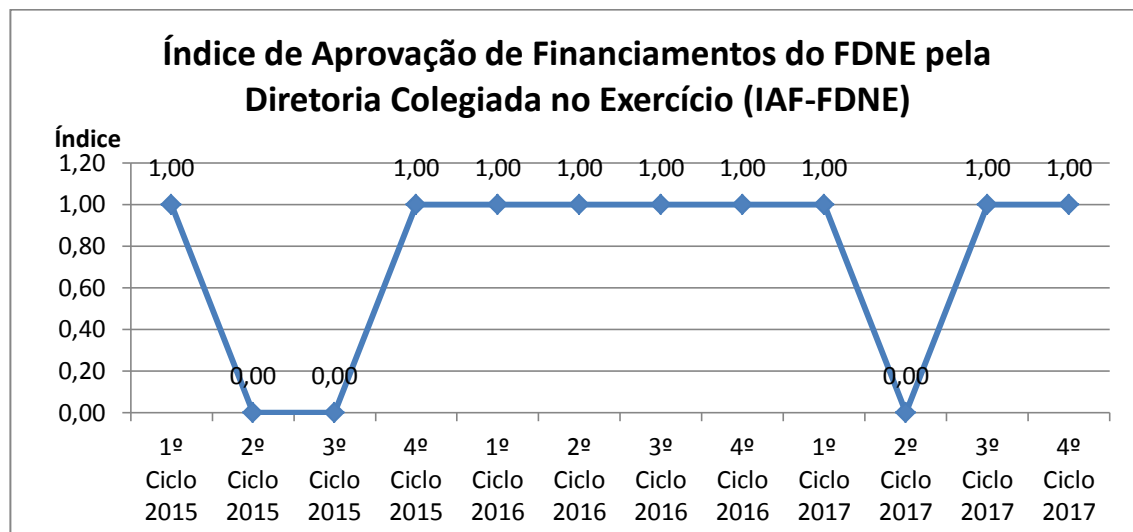

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise “invadam” o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV-IF)

- Fórmula:
$$T_1 = \frac{9.925 \text{ dias dias}}{N \quad 150 \text{ processos}} = 66,16 \text{ dias/processo}$$
- Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.
- Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.
- Periodicidade: Jan-nov/2017
- Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2017 e encerrado em 30 de novembro, foram **vistoriados 150 estabelecimentos dos interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 66,16 dias**. Em relação ao ano de 2017, o melhor resultado aconteceu na medição do 2º ciclo 2017, constituindo-se este, inclusive, no melhor resultado da história das medições.

Convenções:


T1 = Média aritmética do Σ do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	74,9 dias/ processo	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/ processo	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	72,9 dias/ processo	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	73,7 dias/ processo	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	92,30 dias/ processo	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	78,5 dias/ processo	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	76,4 dias/ processo	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80,70 dias/processo	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	71,32 dias/processos	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,4 dias/processos	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	62,3 dias/processos	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

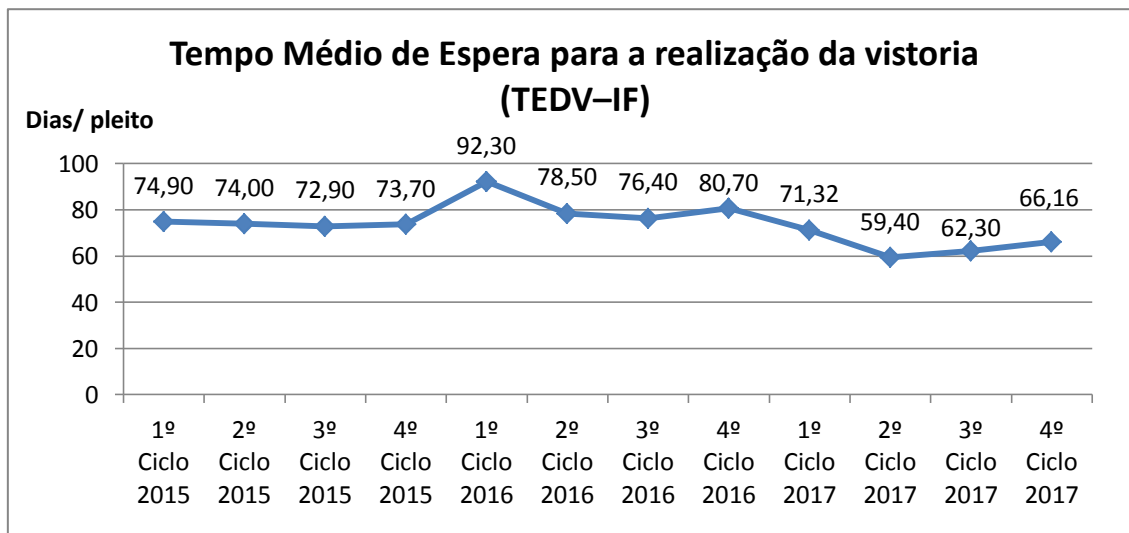

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{0 \times 100}{292} = 0 \%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os

resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0,00%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0,00%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	0,00%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0,00%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0,00%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0,00%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

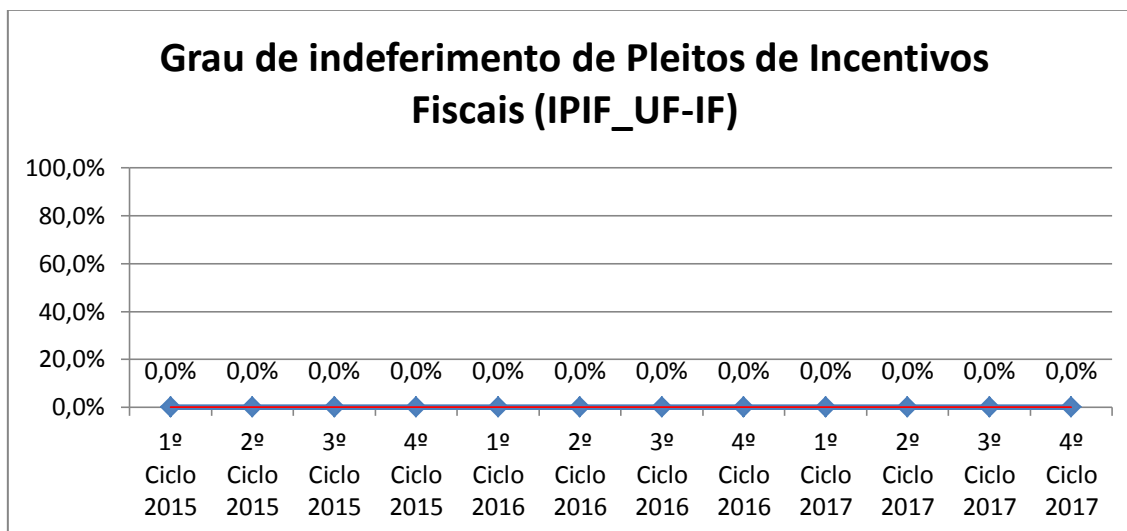

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.

(4) o número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado até novembro 2017 (222 processos), acrescido do número de processos em exame, na referida data (70 processos).

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período} \times 100}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} =$

$$= \frac{222 \times 100}{292} = 76 \%$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: no período, foram concluídas 222 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 76,0 % dos pleitos ingressados.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	74,8%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	60,9%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	90,8%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	55,9%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	71,2%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	91%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	59,5%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	84,4%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

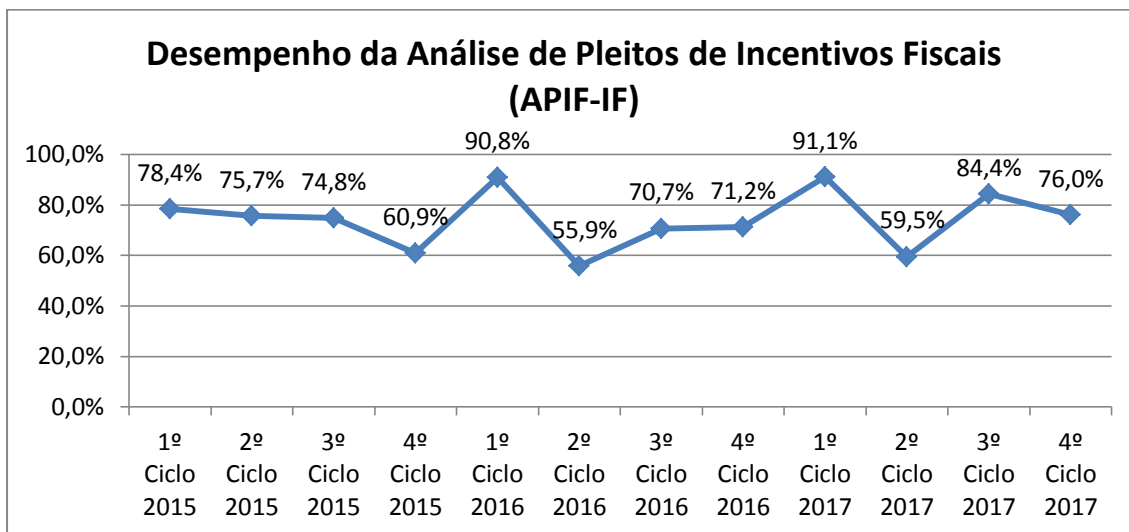

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

- a) Fórmula:
$$\frac{T1}{N} = \frac{24.203 \text{ dias}}{199 \text{ pleitos}} = 121,6 \text{ dias/pleito}$$
- b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.
- c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais
- d) Resultado ideal (índice): (quanto menor melhor).
- e) Periodicidade: Jan-nov/2017
- f) Comentários: o prazo médio observado, de **121,6 dias/pleito** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros onze meses de 2017.


Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto **com os 23 processos de transferência** de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados, aprovados e computados anteriormente, quando do pedido inicial, sendo que, além do mais, a eventual demora não depende da Coordenação de Incentivos Especiais (CIE/DFIN).

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	96,1 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	94,05 dias/pleito	4º ciclo 2015

Jan a dez/2015	103,8 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	99,5 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	93,3 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	118,5 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	107,7 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	110,8 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	115,1 dias/pleito	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

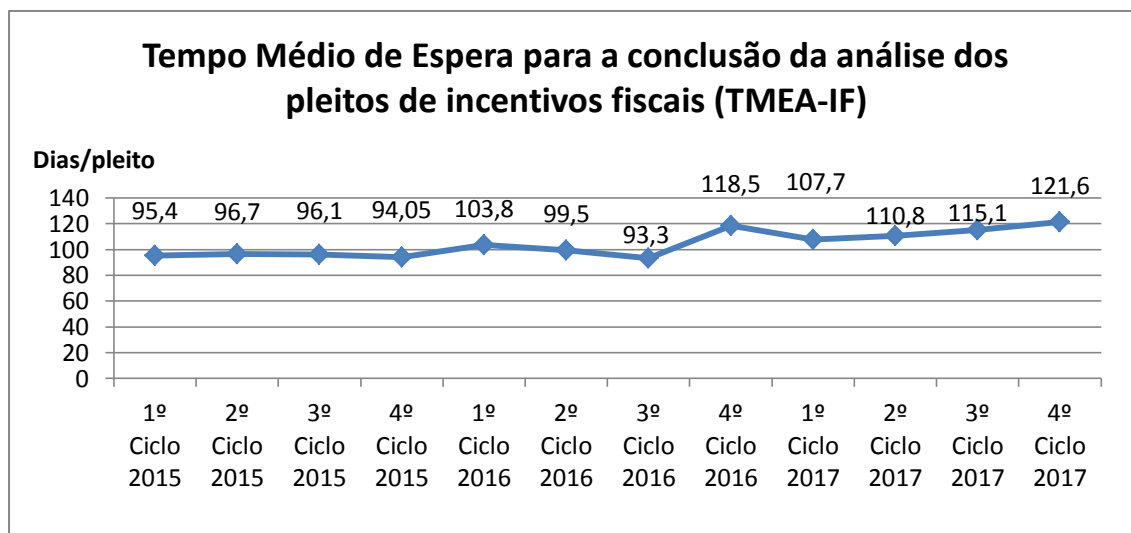

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:

T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.

N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{222}{19} = 11,7$ análises/técnico

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	8,3 análise/técnico	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	9,9 análise/técnico	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	16,5 análise/técnico	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	3,4 análises/técnico	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	6,3 análises/técnico	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	10,8 análises/técnico	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	15,5 análises/técnico	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 análises/técnico	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	7,8 análises/técnico	3º ciclo 2017
		4º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

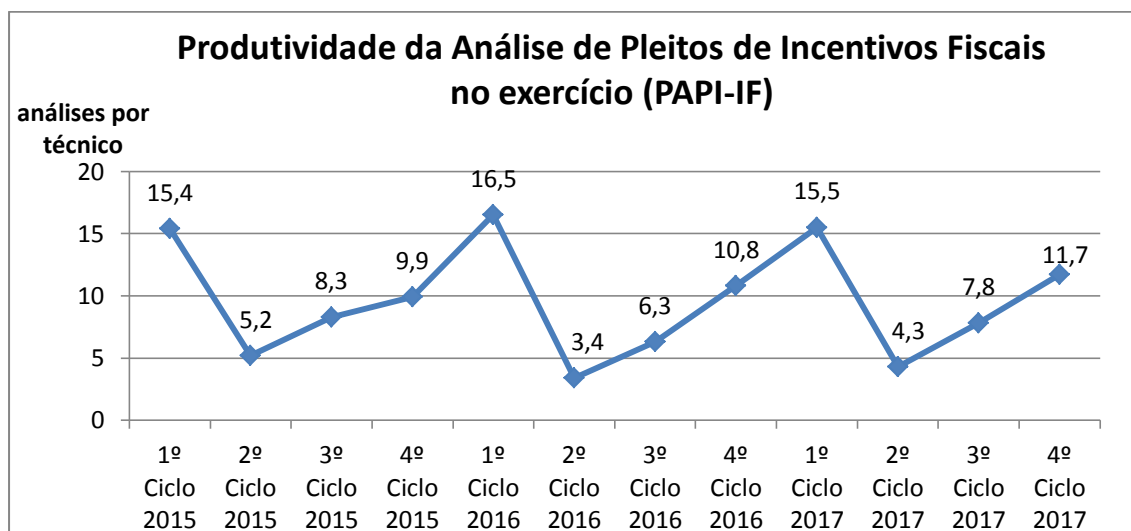

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$

$$= \frac{150}{9} = 16,7 \text{ vistorias/equipe}$$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice):(quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	19,3 vitorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vitorias/equipe	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	7,5 vitorias/equipe	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	8,3 vitorias/equipe	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	20,1 vitorias/equipe	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	4 vitorias/equipe	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	9,5 vitorias/equipe	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	15,4 vitorias/equipe	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	24,5 vitorias/equipe	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,3 vitorias/equipe	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	9,7 vitorias/equipe	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

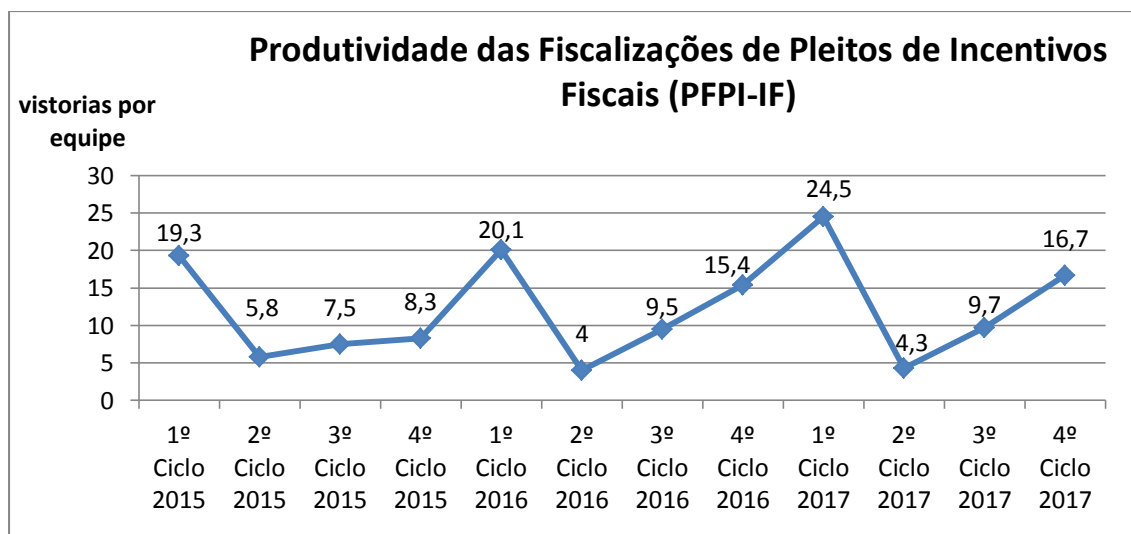

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula:
$$\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício} \times 100}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{53 \times 100}{73} = 72,6\%$$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período de aferição: Jan-nov/2017.

f) Comentários: Houve o recebimento de 73 propostas, das quais 53 foram analisadas até a data do presente relatório. Todas as propostas recebidas são convênios. Cabe observar que, das 73 propostas protocoladas, seis foram canceladas e uma foi apenas cadastrada.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	93,75%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	93,75%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	91,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	58,2%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	65,3%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

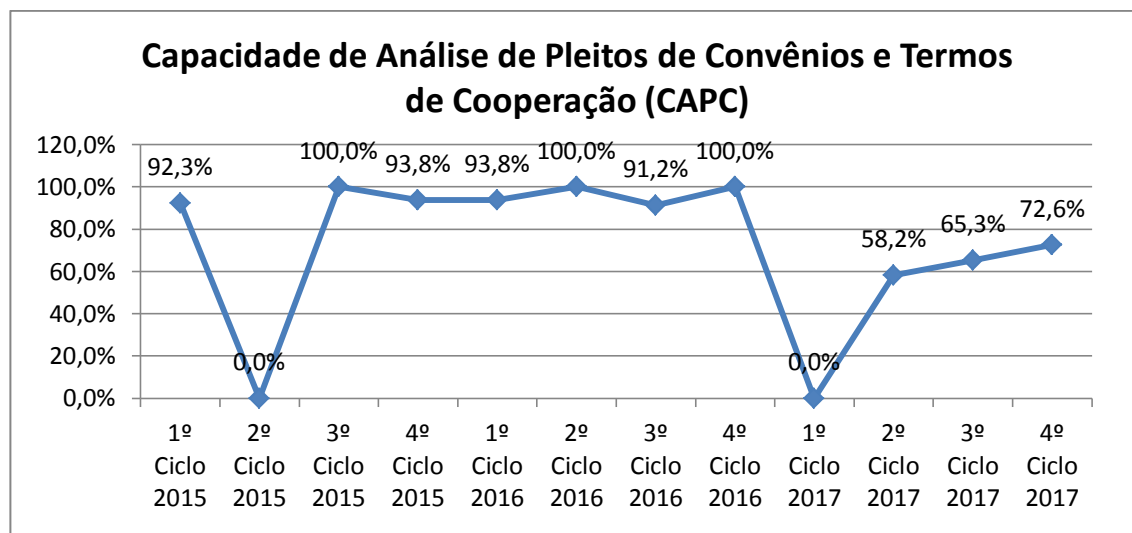

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados} \times 100}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{34 \times 100}{53} = 64,2\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-nov/2017

f) Comentários: Foram analisadas 53 propostas, das quais 34 foram aprovadas, dezessete foram rejeitadas e duas estão em complementação. Catorze propostas ou planos de trabalho estavam em análise até o fechamento deste relatório.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	0%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	40%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	54%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	67,7%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	27,66%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	57,4%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

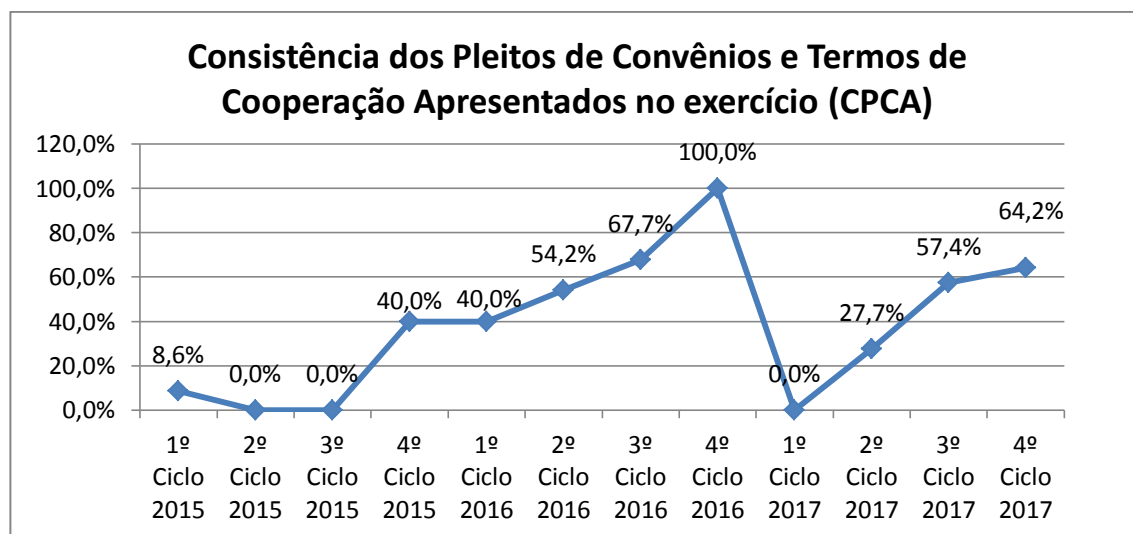

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc.} \times 100}{\text{Pleitos protocolados no exercício}}$

$$= \frac{17 \times 100}{73} = 23,3\%$$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)


e) Período da aferição: Jan-nov/2017

f) Comentários: Foram recebidas 73 propostas, das quais 17 foram rejeitadas.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	56,25%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	56,25%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	25%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	20,6%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0,00%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	32,72%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	23,6%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

- (1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.
- (2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc.} \times 100}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{0 \times 100}{0} = 0,00\%$

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d) Resultado Ideal (%): 100 %


e) Período da aferição: Jan-nov/2017

f) Comentários: No período de aferição indicado acima não foram realizadas fiscalizações sob a responsabilidade desta Coordenação-Geral, uma vez que não havia previsão para tal atividade.

g) Resultados Anteriores:

Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	100%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	47,22%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	47,22%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	80%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	-	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0,00%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0,00%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

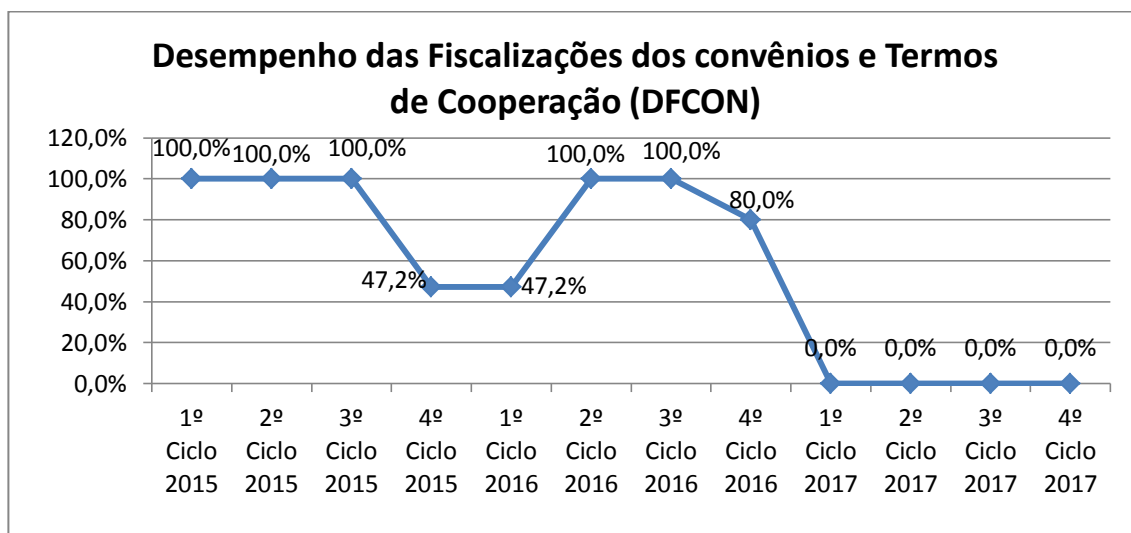

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios, Termos de Cooperação e Termos de Execução Descentralizada, de janeiro a agosto de 2017. Também descreve demais atividades internas e externas, afetas às atribuições da Coordenação, desempenhadas no mesmo período.

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participação na I Conferência Nacional da Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	25 a 26.01.17	Brasília -DF	Vera Lúcia, Marcelo Saiki
Reunião SUDENE e EMEPA-PB, para tratar sobre ações do convênio 813986-14 Projeto “Qualificação do arranjo produtivo local da caprinocultura leiteira no semiárido PB”	06.02.17	SUDENE/CGDS	Vera Lúcia, Marcelo Viana, Victor Uchôa, Marcelo Saiki,
Reunião CONDEPE/FIDEM, sobre andamento dos convênios Bom Conselho/PE, Salgueiro/PE e Goiana/PE – CV 794329/2013.	07.02.17	SUDENE/CGDS	Vera Lúcia, Maria Helena, Victor Uchôa, Teresa Oliveira, Juliana Borges, Renato Vaz
Reunião no INSA para discussão dos resultados Projeto TED/SUDENE/UFPE- Parceria REDESFITO, a convite da UFPE	14.02.17	Campina Grande- PB	Renato Vaz e Teresa Oliveira
Reunião Técnica: Acompanhamento dos TEDs 4/2015 e 05/2016.	16.02.17	UFPE - Centro de Energias Renováveis	Maria Helena e Isis Moreira
Reunião de acompanhamento do Convênio 794329/2013 com o CONDEPE/FIDEM.	23.02.17	SUDENE/CGDS	Teresa Oliveira, Victor Uchôa, Vera Lúcia, Carlos Almiro
Participar de oficina sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	05 a 11.03.17	Juazeiro-BA / Petrolina-PE	Marcelo Viana
Visita preliminar às metas previstas no convênio SICONV nº 828298/2016, celebrado com o município de Tibau do Sul-RN.	07 a 08.03.17	Tibau do Sul-RN	Agrimon Marcos
Reunião para apresentação do projeto “O Sertão vai virar mar” do professor Ranilson Bezerra, do Departamento de Bioquímica da UFPE.	08.03.17	SUDENE/CGDS	Carlos Almiro, Victor Uchôa, Teresa Oliveira, Macira Régia , Renato Vaz, Marcelo Saiki
Café com sustentabilidade: Parcerias da Sudene para o Desenvolvimento Tecnológico das Energias Renováveis.	09.03.17	SUDENE/JK	Equipe CGDS

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Assessorar o Superintendente no Seminário Convivência Produtiva com a Seca: Soluções Tecnológicas e Estratégias de Ação.	13 a 14.03.17	Petrolina-PE	José Aildo
Acompanhamento técnico da execução do TED Inventário das Plantas da Caatinga (Meta 4).	13 e 14.03.17	Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista - PE	Tersa Oliveira e Renato Vaz
Participar de reuniões sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	14 a 17.03.17	Monteiro-PB	Marcelo Saiki
Participar de reuniões sobre a Rota do Cordeiro, a convite do Ministério da Integração Nacional.	14 a 17.03.17	Floresta-PE	Marcelo Viana
Participar do seminário e de um encontro de atores estratégicos que tiveram por finalidade contribuir para a execução do Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco(BHSF).	14 a 15.03.17	Brasília-DF	Victor Uchôa
Café com sustentabilidade: “Estratégias para o desenvolvimento sustentável: inovação em produtos da biodiversidade da caatinga”.	30.03.17	SUDENE/JK	Equipe CGDS
Reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA	31.03-17	CONSEMA-PE	Victor Uchôa
Reunião na Empresa Hebron para apresentação dos seus produtos na linha de fitomedicamentos	31.03.17	Recife-PE	Renato Vaz
Participar do Workshop Energia Renováveis e Inovações Interconectadas Mercados Sustentáveis do Século XXI.	04 a 06.04.17	Auditório do Paço Alfândega Recife-PE	Isis Moreira e Maria Helena
Reunião no IBAMA, para comemoração do Dia Nacional da Caatinga.	27.04.17	IBAMA-PE	Victor Uchôa, José Aildo

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar do ciclo de debates: Desafios do Saneamento Ambiental – Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental	08.05.17	Escola Politécnica de Pernambuco Recife-PE	Isis Moreira e Teresa Oliveira
Apresentação da colheitadeira da palma forrageira prof. Ítalo Ataíde Notaro (UFRPE)	10.05.17	UFRPE	José Aildo
Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, para acompanhamento do Convênio 770859/2012 Zoneamento Ambiental das Áreas Vulneráveis a Desertificação no Estado de Pernambuco.	11.05.17	SUDENE/DPLAN	Alexandre Gusmão, Mauricio Maia, Maria Helena, Victor Uchôa, Renato Vaz, Maria do Socorro.
Reunião sobre protótipo de colheitadeira da palma CASALE.	12.05.17	IPA-PE	Jose Aildo
Reunião de acompanhamento da execução e entrega de relatórios do TED Inventário das Plantas da Caatinga.	12.05.2017	SUDENE/DPLAN	Vera Lúcia, Renato Vaz, Alexandre Silva, Márcia Vanusa, Miguel Vieira e Maurício Maia.
Reunião sobre Delimitação do Semiárido SUDENE/Consórcio de Municípios Paraibanos.	22.05.17	SUDENE/CGDS	Maurício Maia, Marcelo Viana, Victor Uchôa
Capacitação em Controle Interno, gestão de risco e governança, ofertado pela CGU.	22 a 23.05.17	UFRPE	Vera Lúcia, Maria do Socorro, Isis Moreira, Renato Vaz, José Amauri, Teresa Oliveira, Juliana Borges, José Aildo, Givanildo Ramos
Apresentação sobre as ações da SUDENE em Encontro com a Associação dos Municípios da área Mineira da SUDENE-AMAMS e Empresários da Região.	24 a 25.05.17	Belo Horizonte-MG	Isis Moreira
Reunião com Prof. Paulo Cavalcanti Filho (UFPB) para apresentação do Plano de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável para os Arranjos Produtivos Locais da Paraíba (Plades), a fim de solicitar apoio da Sudene.	26.05.17	Sudene/JK	Renato Vaz, José Amauri, Victor Uchôa, Maria do Socorro, Vera Lúcia

EVENTO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Reunião de articulação com a CENTRESAF-PE para projeto em capacitação de municípios - SICONV	06.07.17	SUDENE/DPLAN	Vera Lúcia, Maria do Socorro, Isis Moreira, Teresa Oliveira
Reunião de acompanhamento técnico sobre a entrega de produtos a execução e o calendário do Convênio 794329/2013, com a Agência Condepe/Fidem.	04.08.17	SUDENE/CGDS	Teresa Oliveira, Vera Assunção, Maurício Maia, Gliedson Silva, Paulo da Fonte, Daniella Santos e Cláudia Melo.
Reunião de ACOMPANHAMENTO com a Agência CONDEPE/FIDEM – convênios: PDS Salgueiro, PDS Bom Conselho	23.08.17	SUDENE/CGDS	Maria Helena, Isis Moreira, Renato Vaz e Juliana Borges

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN/SUDENE)

PROPOSTAS RECEBIDAS – JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

De 1º de janeiro a 31 de novembro de 2017, a Coordenação recebeu, via SICONV, 73 propostas, todas relacionadas ao programa “Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029)”. Destas, 07 estão vinculadas à Ação 214S, 07 à Ação 8902, 04 à Ação 8340 e 55 à Ação 7K66, sendo esta última referente a Emendas Parlamentares.

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)Conv

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{330}{2} = 165 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: entre janeiro e novembro/2017, a SUDENE recebeu 72 propostas de convênios, 5 foram canceladas, 67 deles já possuem parecer técnico e 39 propostas foram convertidas em pré-convênio. Apenas 2 convênios foram celebrados. A tabela abaixo ilustra a posição:

Propostas encaminhadas à SUDENE entre 01/01 e 30/11/2017	UF										
Possui Parecer?/Situação	AL	BA	CE	ES	MA	MG	PB	PE	RN	SE	Total Geral
Sim	5	29	4	1	1	2	1	2	20	2	67
Proposta/Plano de Trabalho Aprovados		24	4					1	16		45
Proposta/Plano de Trabalho complementado enviada para Análise		1							1		2
Proposta/Plano de Trabalho em Análise						1				1	2
Proposta/Plano de Trabalho em Complementação		1									1
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados	5			1	1	1	1	1	1	1	12
Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico		3							2		5
Total Geral	5	29	4	1	1	2	1	2	20	2	67

Fonte: SICONV

Os convênios que foram celebrados estão a seguir listados:


		Tempo (em dias)					
SICONV	Conveniente	UF	na CCONT	na CGDS	na COCF	na PRD	Total
847990/2017	Jandaíra	RN	53	137	20	63	273
847991/2017	Jandaíra	RN	53	137	20	63	273
médias			53	137	20	63	273

Fonte: SICONV, NETDOC e controles da CCONT

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	0 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	37 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	22,8 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	22,8 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

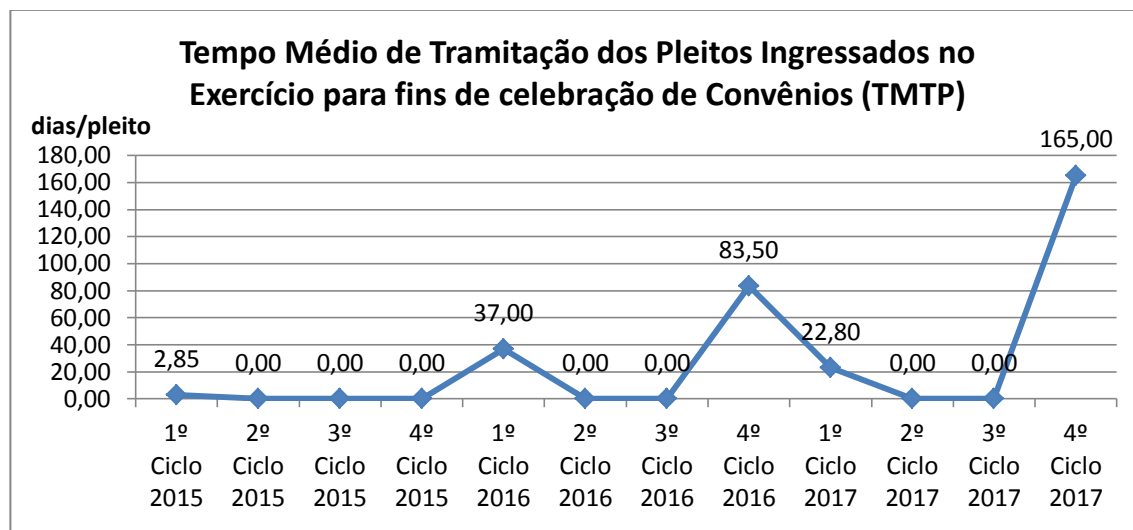

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE ([em condições de conformidade](#)) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula:
$$\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = 0 \text{ dias/pleito}$$

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: **Entre Janeiro e novembro/2017 não houve celebração de TED.**

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	0 dias/pleito	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	39,25 dias/pleito	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	4,4 dias/pleito	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	0 dias/pleito	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	0 dias/pleito	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	0 dias/pleito	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	0 dias/pleito	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	0 dias/pleito	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	0 dias/pleito	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

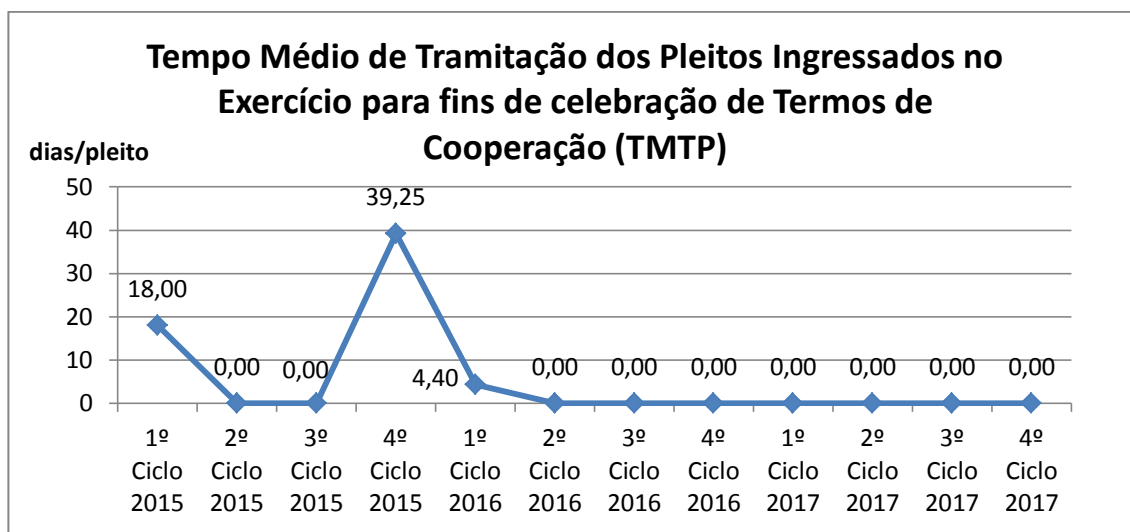

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA(\%) = 100 \times \frac{\text{Convênios}_{a_Aprovar_{FINAL}}}{\text{Convênios}_{a_Aprovar_{INICIAL}}}$$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%) = 100 \times \frac{23}{30} = 76,7\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial (CCONT)

d) Resultado Ideal (%) :% (Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: A posição dos convênios na condição “**A Aprovar**” no SIAFI em Nov/2017 é:

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENIENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1993	069547	SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	6.044.165,46		Localizado na Auditoria 4 volumes
1995	135783	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	10.800.000,00		TCE concluída em 17/12/2015
1996	312117	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS	5.700.000,00		Em conciliação da CJU/PE
1996	317428	FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE	65.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1996	317554	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2.000.000,00		Convênio encerrado em 12/04/2016 por recolhimento do débito.
1997	337849	INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL – CENTRO	250.000,00		Em conciliação na CJU/RN
1997	338364	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE

Continua

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1997	338425	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	512.500,00		TCE concluída em 12/12/2016
1997	338444	ESTADO DE MINAS GERAIS	395.964,79	I.SU 310	TCE concluída em 22/08/2014
1997	338456	ASSOCIACAO CEARENSE DE ESTUDOS E PE	90.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1997	338464	ESTADO DA PARAIBA	219.800,00		Aguardando instrução de TCE
1997	338496	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		TCE concluída em 12/06/2015.
1997	338502	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	2.000.000,00		TCE em instrução
1998	339202	ESTADO DE PERNAMBUCO	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	348985	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	150.000,00		Aguardando instrução de TCE
1998	363977	ESTADO DE MINAS GERAIS	884.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368374	MUNICIPIO DE ASSARE	1.521,02		Aguardando instrução de TCE
1998	368485	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO	52.066,80	I.SU 306	Aguardando instrução de TCE
1998	368496	CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLÓGICO	124.802,00		Em conciliação. Autos foram remetidos para MI
1998	368525	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTE	139.000,00		Está na DPLAN/CGDS para emissão de Laudo Técnico

Continua

ANO	SIAFI	NOME DO CONVENENTE	VALOR	SIT. MOT	POSIÇÃO
1998	368547	FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVE	150.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
1998	368692	MUNICIPIO DE CHA DE ALEGRIA	24.000,00		DESAPARECIDO
1999	374633	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA	20.000,00		Convênio estava desaparecido. Em cobrança administrativa
1999	383671	ESTADO DO PIAUI	300.000,00		TCE concluída em 27/02/2015.
2000	399481	ASSEMP-ASSOC DAS EMP DE PLAN E CONS	30.000,00		Prestação de contas aguardando análise
2000	402702	FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRADO	132.500,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406357	ASSOCIACAO ALFASOL	3.000.000,00		TCE concluída em 21/11/2014
2000	406376	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO EST	46.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE
2000	406570	SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA	952.000,00		TCE em instrução
2000	407086	INSTITUTO ANTHROPOS	156.000,00		Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE

Fonte: SIAFI e NETDOC

Totalizando a posição dos convênios supra por posição resumida, tem-se a seguinte situação:


Posição Resumida	Quant Convênios	Soma Val. Concedente(R\$)
Aguardando definição do procedimento de dispensa de TCE	8	1.673.500,00
Aguardando instrução de TCE	5	573.387,82
Convênio encerrado	1	2.000.000,00
DESAPARECIDO (*)	1	24.000,00
Em cobrança administrativa	1	20.000,00
Em conciliação	3	6.074.802,00
Localizado na Auditoria 4 volumes	1	6.044.165,46
Na DPLAN/CGDS para emissão Laudo Técnico	1	139.000,00
Prestação de contas aguardando análise	1	30.000,00
TCE concluída	6	17.008.464,79
TCE em instrução	2	2.952.000,00
Total Geral	30	36.539.320,07

(*) Na ata da 281ª Reunião da Diretoria colegiada foi autorizada a recomposição do processo

f) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100 %	2º Ciclo 2015
Jan a ago/2015	93,93%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	100%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	100%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	100%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	100%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	100%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	100%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	76,67%	3º ciclo 2017

g) Representação gráfica:

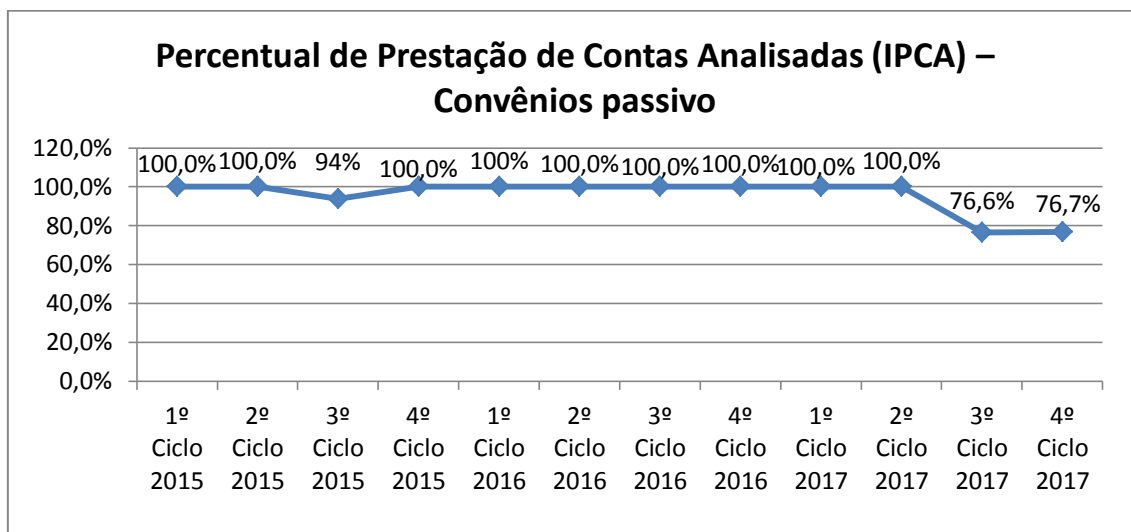

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres e de Tomada de Contas Especial, e SIAFI.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{Convênios_a_Aprovar_{FINAL}}{Convênios_a_Aprovar_{INICIAL}}$

Valor do índice no ciclo: $IPCA(\%)_{SICONV} = 100 \times \frac{26}{26} = 100\%$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%): %(Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: De um total de 41 convênios em 01/01/2017, 20 continuam em plena em execução e 15 estão em fase de prestação de contas em 31/05/2017, conforme posições adiante indicadas:

Posição dos Convênios SICONV em 01/01/2017

Status do Convênio	Quantidade
Em Execução (sendo 15 novos)	26
PTC Atrasada	15
Total Geral	41

Posição dos Convênios SICONV em 30/11/2017

Status do Convênio	Contagem de SICONV
Cancelado	1
Em Execução	20
PTC Atrasada	19
Aprovado	1
Total Geral	41

A grande quantidade de convênios com Prestação de Contas Atrasadas mostra a necessidade de providências urgentes da CCONT e CGDS no sentido de iniciar uma cobrança administrativa consistente, visando evitar a necessidade de TCE. Nesse sentido, a CCONT tem feito gestão junto à CGDS para efetivar a cobrança das prestações de contas em atraso. O quadro abaixo detalha a posição de cada um dos 41 convênios:

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2017	Status em 31/05/2017
627487/2008	LAGOA DE PEDRAS PREFEITURA (*)	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
707430/2009	RIACHUELO PREFEITURA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
710365/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DA PESCA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
718521/2009	ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada

Continua

SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2017	Status em 31/05/2017
736175/2010	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
737121/2010	GRUPO GESTAO – PESQUISA, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO SOCIAL	PE	PTC Atrasada	PTC Atrasada
744654/2010	MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
768007/2011	MUNICIPIO DE ASSU	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
769473/2012	ESTADO DE SERGIPE – ADMINISTRACAO DIRETA	SE	PTC Atrasada	Aprovado
769782/2012	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	PTC Atrasada
770741/2012	ESTADO DA PARAIBA	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada
770859/2012	SEMAS	PE	Em Execução	PTC Atrasada
770860/2012	RUY BARBOSA PREFEITURA	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
789013/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	CE	PTC Atrasada	PTC Atrasada
789015/2013	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	RN	PTC Atrasada	PTC Atrasada
792551/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
794329/2013	CONDEPE/FIDEM	PE	Em Execução	Em Execução
794997/2013	IDENE	MG	PTC Atrasada	PTC Atrasada
802144/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	RN	Em Execução	Em Execução
802415/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS	RN	Em Execução	Em Execução
812155/2014	Sec. Des. Agrário	CE	Em Execução	Em Execução
813604/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	PB	PTC Atrasada	PTC Atrasada
813665/2014	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDARIA	AL	Em Execução	Em Execução

Continua


SICONV	Conveniente	UF	Status em 01/01/2017	Status em 31/05/2017
813695/2014	SERHMACT	PB	Em Execução	PTC Atrasada
813986/2014	EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA DA PARAIBA S A	PB	Em Execução	Em Execução
822608/2015	SEMAS	PE	PTC Atrasada	Cancelado
827249/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Execução
827250/2016	PASSA E FICA	RN	Em Execução	Em Execução
827251/2016	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	RN	Em Execução	PTC Atrasada
827676/2016	TANGARA	RN	Em Execução	Em Execução
828295/2016	LAGOA D'ANTA	RN	Em Execução	Em Execução
828296/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
828297/2016	JUCURUTU	RN	Em Execução	Em Execução
828298/2016	TIBAU DO SUL	RN	Em Execução	Em Execução
828299/2016	PARELHAS	RN	Em Execução	Em Execução
828300/2016	CAMPO REDONDO	RN	Em Execução	Em Execução
828301/2016	NATAL	RN	Em Execução	Em Execução
836181/2016	LUCRÉCIA	RN	Em Execução	Em Execução
836220/2016	PARAZINHO	RN	Em Execução	Em Execução
838038/2016	SÃO GONÇALO DO AMARANTE	RN	Em Execução	Em Execução
839953/2016	UPANEMA	RN	Em Execução	Em Execução

Fonte: SICONV e NETDOC

g) Resultados anteriores:

Jan a dez/2014	100 %	1º ciclo 2015
Jan a ago/2015	84,61%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	87,5%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	87,5%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	60%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	70%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	65%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	65%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	100%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	100%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

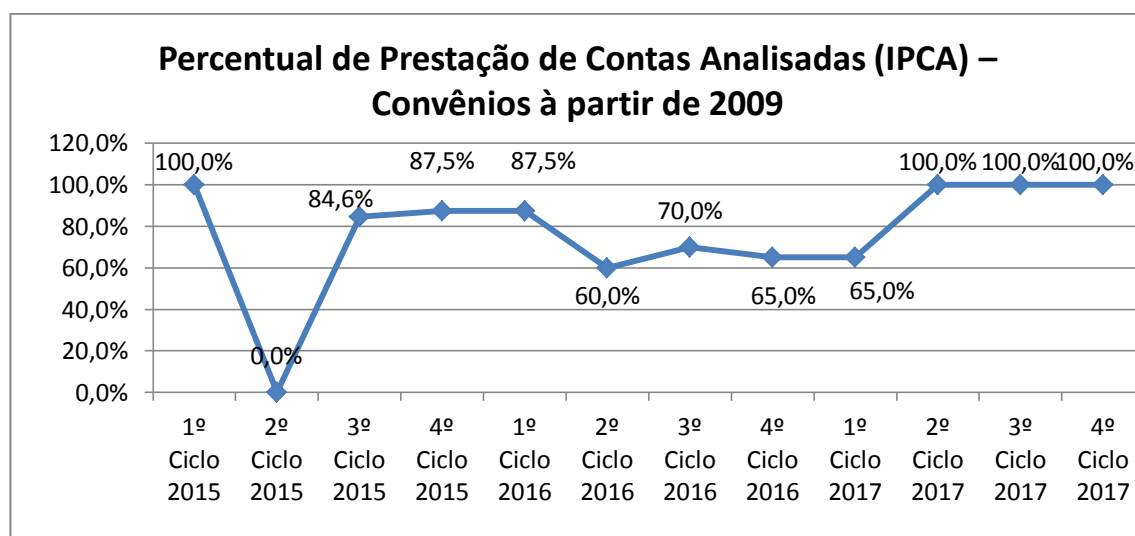

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

5 - Indicadores de Gestão de Pessoas


5.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

- Fórmula:
$$\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{126 \times 100}{200} = 63\%$$
- Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.
- Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- Resultado Ideal (%): 100 %
- Período da aferição: Jan-nov/2017

- f) Comentários: A meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores, até o momento, foi parcialmente atingida em 63%, alcançando 126 (cento e vinte e seis) servidores. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 377 (trezentos e setenta e sete) inscrições efetivamente realizadas.
- g) Resultados Anteriores (CSE):

Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	21,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	48%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	69%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	69%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	43,5%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	65%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	72%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	72,5%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	35%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	38%	3º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:



Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

- a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício} \times 100}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{51 \times 100}{50} = 102\%$
- b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).
- c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
- d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)


e) Período da aferição: Jan-nov/2017

f) Comentários: Foram realizados 51 (cinquenta e um) eventos de capacitação, priorizando os cursos na cidade do Recife.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	280%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	62%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	102%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	180%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	192%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	44%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	84%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	134%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	162%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	12%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	40%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

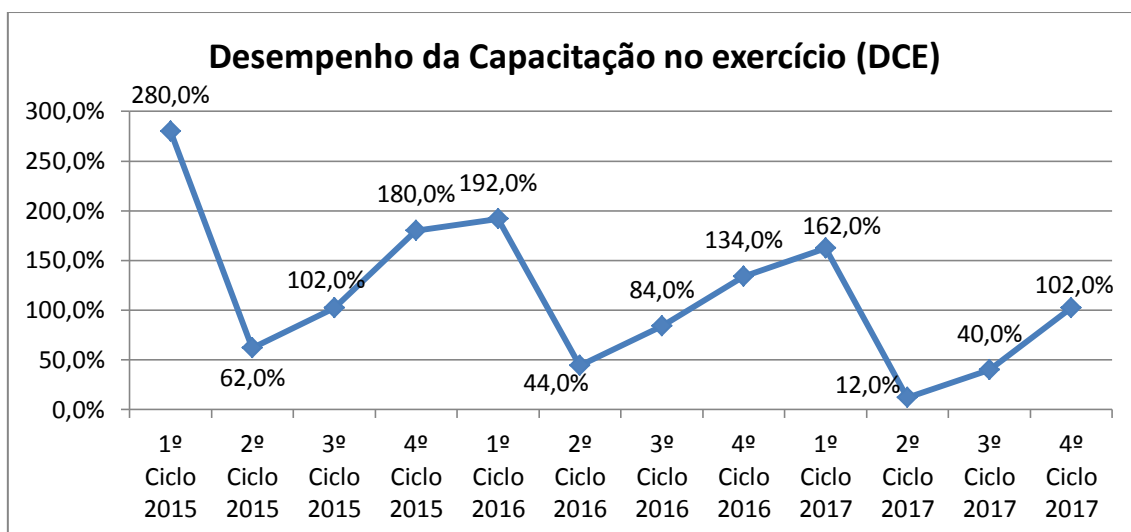

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc.} \times 100}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{150.970,12 \times 100}{400.000,00} = 37,7\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)


e) Periodicidade: Jan-nov/2017

f) Comentários: Do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos no valor de R\$ 100.511,46 (cem mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos) e R\$50.458,66 (cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) com diárias e passagens, representando 37,74 %.

g) Resultados Anteriores:

Jan a dez/2014	84%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	25,5%	2º ciclo 2015
Jan a ago/2015	40,66%	3º ciclo 2015
Jan a nov/2015	40,85%	4º ciclo 2015
Jan a dez/2015	42,95%	1º ciclo 2016
Jan a mai/2016	1,97%	2º ciclo 2016
Jan a ago/2016	18,2%	3º ciclo 2016
Jan a nov/2016	32,9%	4º ciclo 2016
Jan a dez/2016	32,9%	1º ciclo 2017
Jan a maio/2017	4,31%	2º ciclo 2017
Jan a ago/2017	12,2%	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

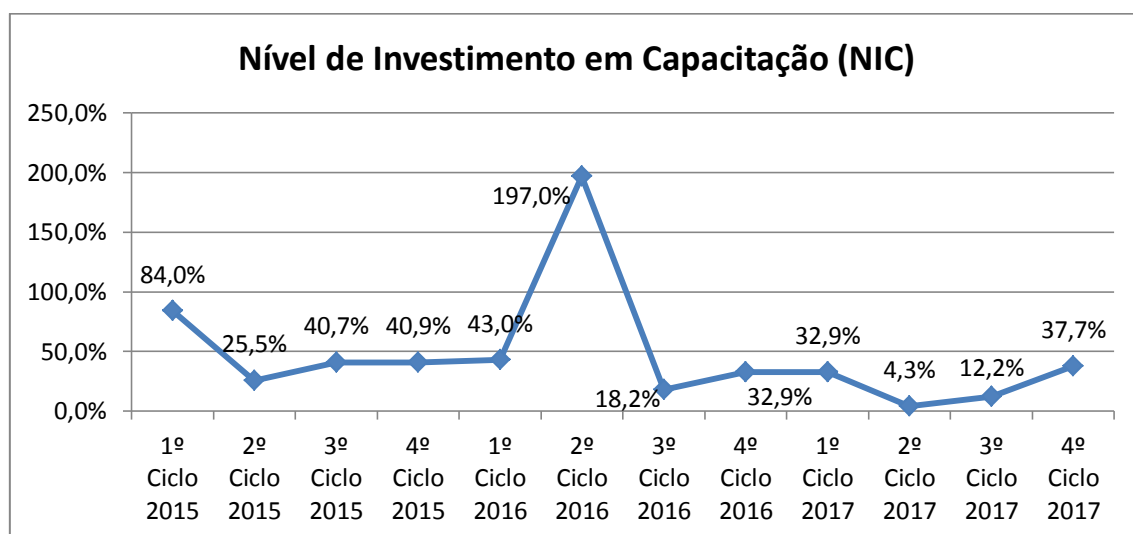

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6 - Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

6.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

a) Fórmula: Média de acessos = 22.053 acessos
(Google Analytics)

b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

- d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. Ao analisar os números obtidos pelo site da Sudene em 2017 (ver item 1.1.7), obteve-se uma média de 18.441 acessos por mês.

Como não há investimentos em publicidade na internet e, considerando fatores como tamanho da equipe, multidisciplinaridade de tarefas e infraestrutura tecnológica, a Ascom buscará, em 2018, um crescimento de 3% no acesso dos cidadãos ao site, tendo em vista que a reestruturação de conteúdo das páginas ainda está acontecendo.


- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: o aumento do número de usuários pode ser atribuído ao aumento de referências ao site a partir das publicações de conteúdo nos canais oficiais da Sudene. Sempre que possível, a Ascom insere o endereço SUDENE.gov.br nas peças das redes sociais e nos vídeos produzidos.

- g) Resultados Anteriores (AU - site):

01/11/2016 a 01/02/2017	18.221	-
02/02/2017 a 02/05/2017	12.747	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	20.525	3º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 04/12/2017.

- h) Representação gráfica:

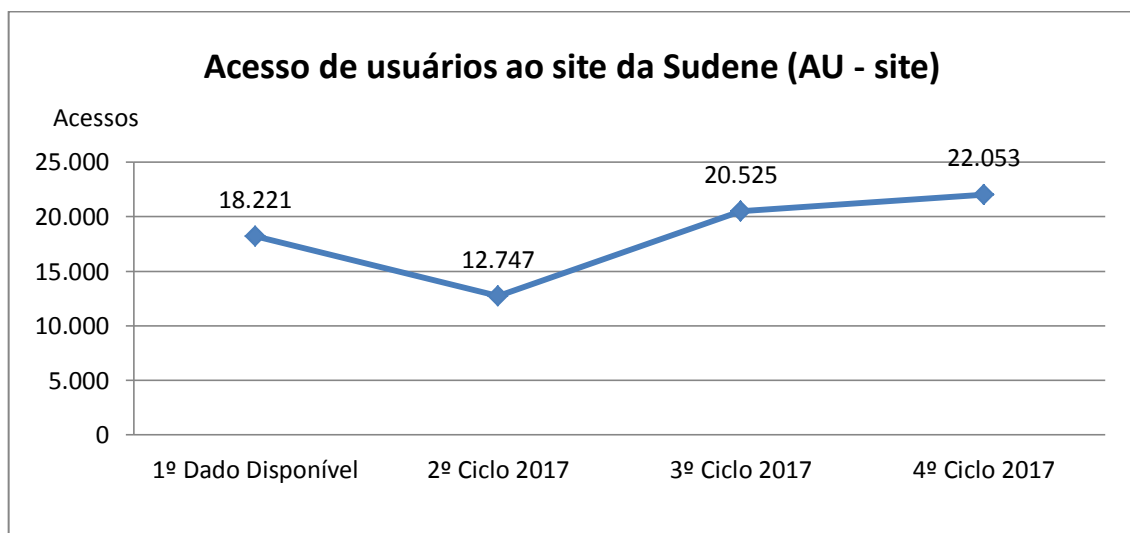

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)


- a) Fórmula: Tempo de permanência = 2'55''
(Google Analytics)
- b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.

- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, [conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo](#), e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: -
- g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	2'40''	-
02/02/2017 a 02/05/2017	3'28''	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	2'56''	3º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 06/09/2017.

- h) Representação gráfica:

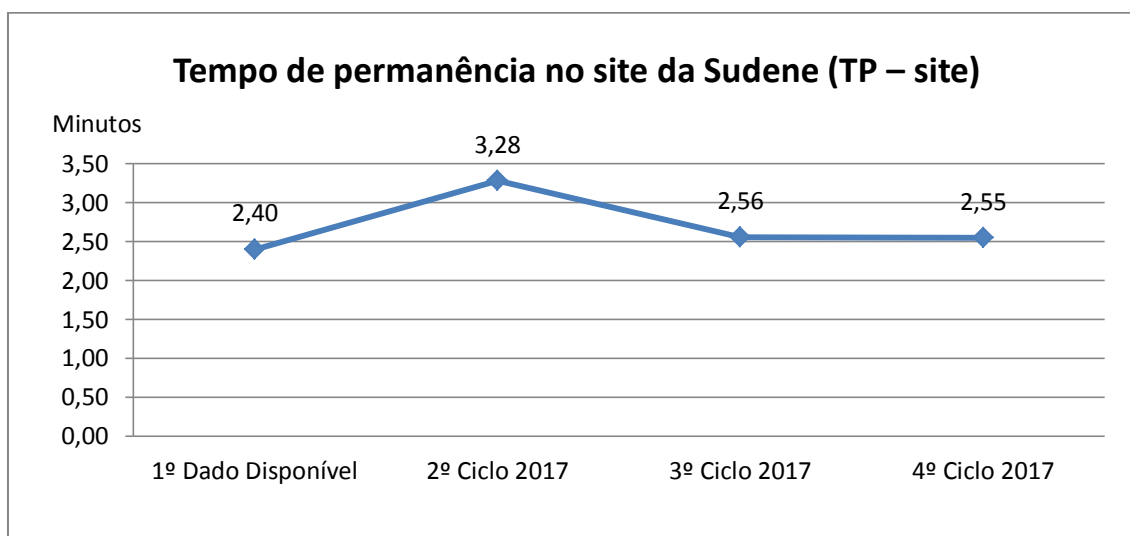

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

- a) Fórmula: Taxa de Rejeição = 54,53%
(Google Analytics)
- b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.

Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes.

De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.


f) Comentários: a taxa de rejeição pode ter aumentado pelo fato de páginas que ainda não passaram por revisão de conteúdo e design terem sido consultadas.

g) Resultados Anteriores:

01/11/2016 a 01/02/2017	56,09%	-
02/02/2017 a 02/05/2017	48,65%	2º ciclo 2017
03/05/2017 a 31/08/2017	53,68%	3º ciclo 2017

Fonte: Google Analytics. Acesso em 04/12/2017.

h) Representação gráfica:

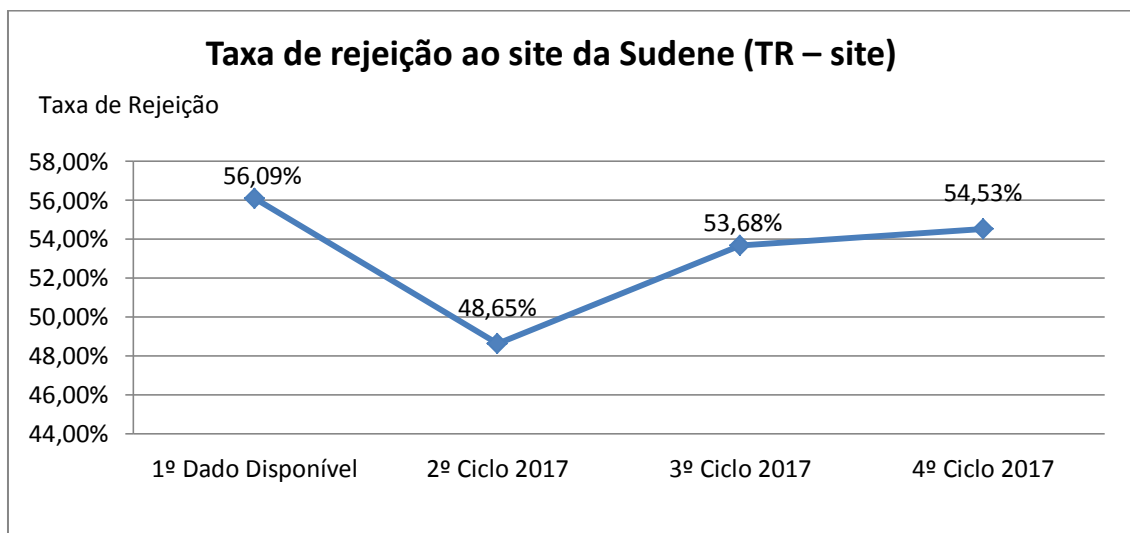

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)


a) Fórmula: Qtde de Curtidas = 2.504
(Facebook)

- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: recentes mudanças no algoritmo do Facebook têm reduzido o alcance de conteúdos orgânicos (não-pagos). Isso significa que a tendência é que haja diminuição da quantidade de pessoas que visualizam as postagens da página da Sudene. Fontes: [Mdesign \(blog\)](#), [artigo \(Universidade da Columbia\)](#).
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017	2.259	-
08/06/2017	2.339	2º ciclo 2017
06/09/2017	2.413	3º ciclo 2017

Fonte: Facebook Analytics, acesso em 04/12/2017.

- h) Representação gráfica:

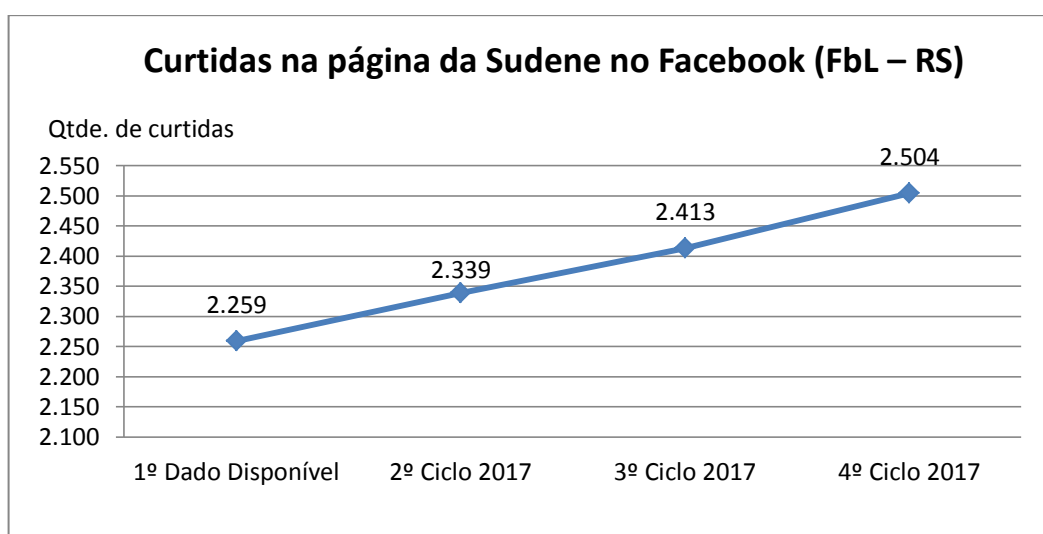

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado


6.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

- a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 664
(Twitter)
- b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados Anteriores:

08/04/2017	467	-
08/06/2017	599	2º ciclo 2017
06/09/2017	623	3º ciclo 2017

Fonte: Tweetcount.com, acesso em 04/12/2017.

- h) Representação gráfica:

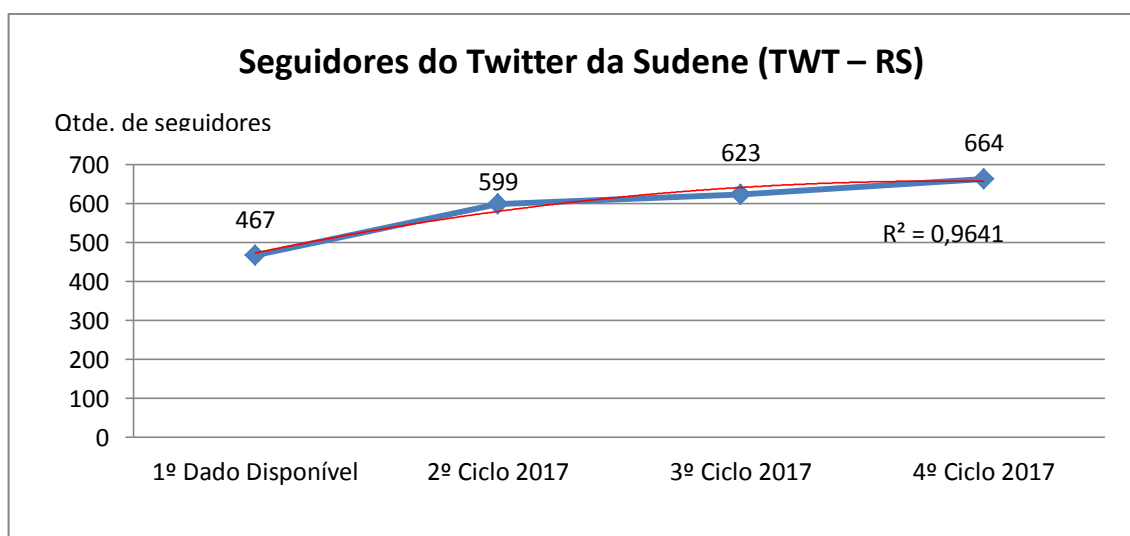

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


6.6 - Taxa de engajamento do Instagram da Sudene (INSTA – RS)

- Fórmula: $\frac{\text{Qtde de Curtidas}}{\text{Qtde de Seguidores}} = \frac{31}{338} = 9,2\%$
- Objetivo: avaliar o engajamento dos seguidores do Instagram da Sudene com relação ao conteúdo publicado nesta rede social.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da taxa de engajamento no Instagram. Para fins de cálculo, e considerando o desempenho em 2017, a Ascom adotará como meta para 2018 a manutenção das taxas de engajamento entre 9% e 10%, já que não estão previstas ações de publicidade pagas nesta rede social.
- Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- Comentários: a taxa de engajamento caiu em virtude do aumento de seguidores.
- Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	10%	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	9,6%	3º ciclo 2017

Fonte: Gabstats.com, acesso em 04/12/2017.

- Representação gráfica:

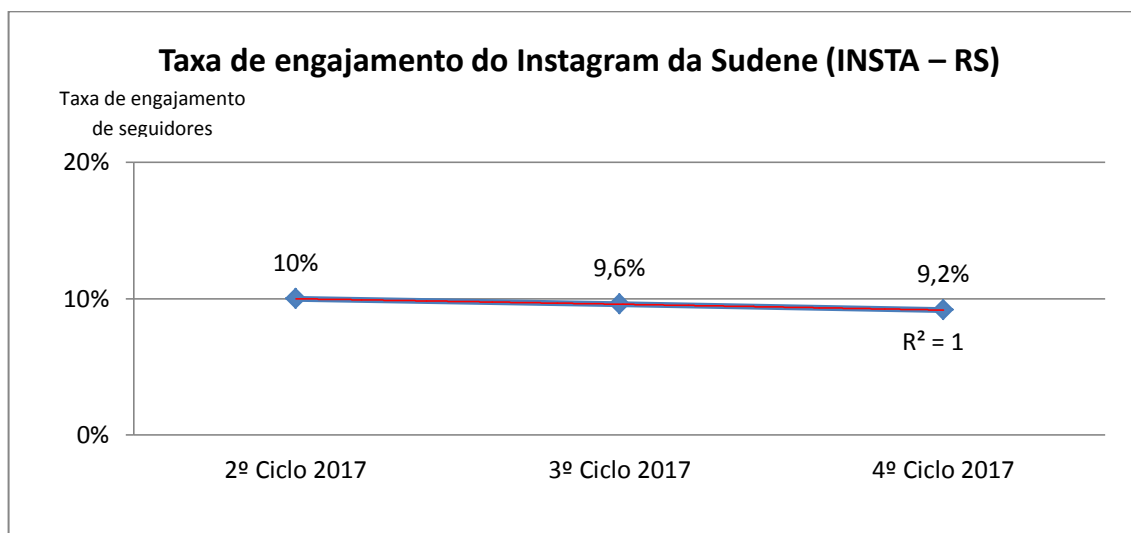

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.


6.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

- Fórmula: $\sum \text{Matérias Publicadas} = 35 + 21 = 56 \text{ matérias}$
(Internet + Intranet)

- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: Não informado.
- g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	39	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	54	3º ciclo 2017

- h) Representação gráfica:

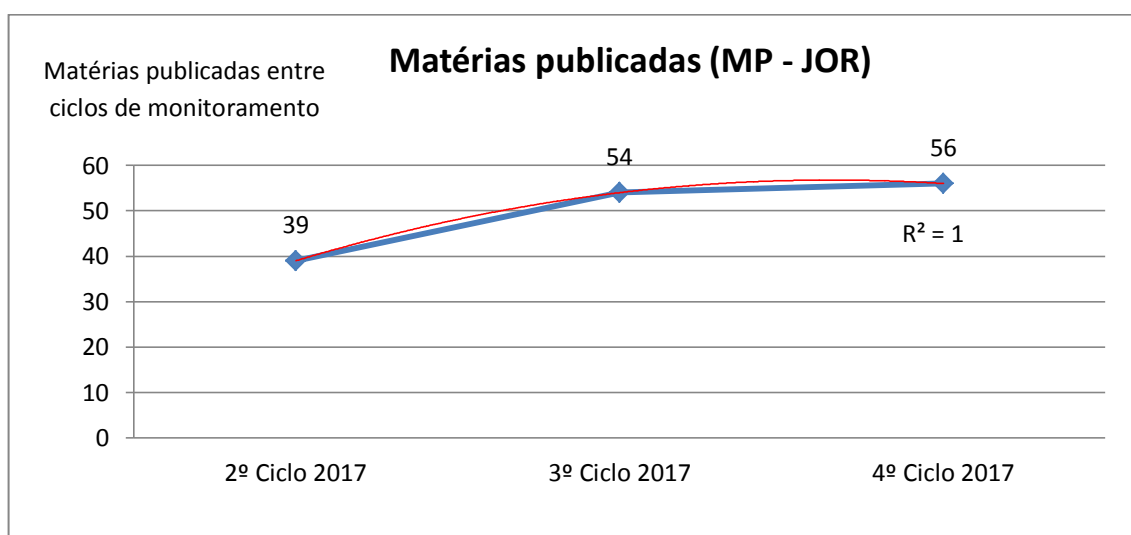

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos


6.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

- a) Fórmula: \sum Sugestões de Pauta Publicadas = 14
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: a meta foi revisada em virtude da média alcançada em 2017.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	8	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	12	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

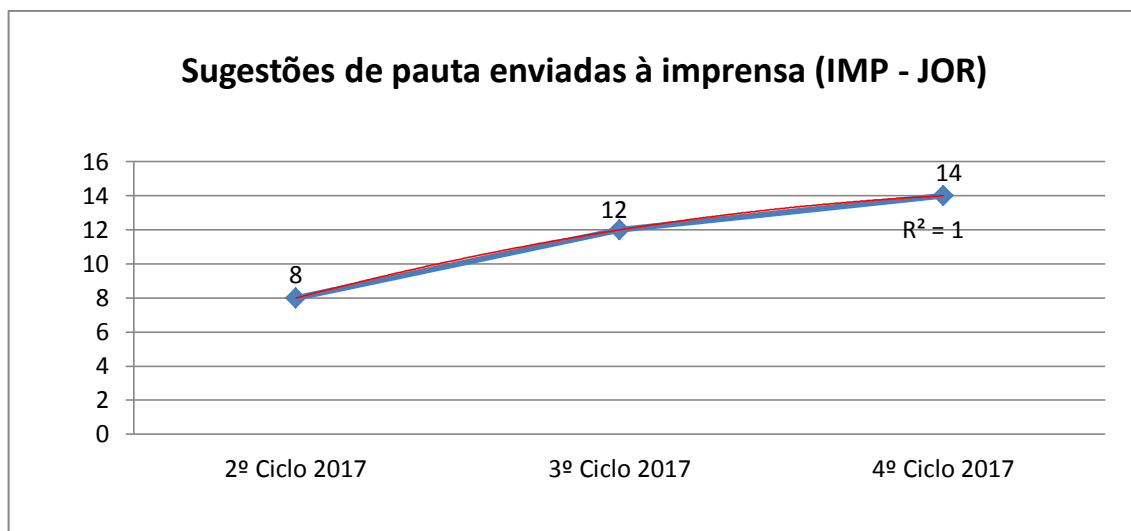

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional


Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

- Fórmula: $\sum \text{Produções em Vídeo e Áudio} = 11 \text{ áudios} + 1 \text{ vídeos} = 14 \text{ produções}$
- Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.
- Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.
- Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- Comentários: Não informado.
- Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	10	2º ciclo 2017
09/06/2017 a 31/08/2017	13	2º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

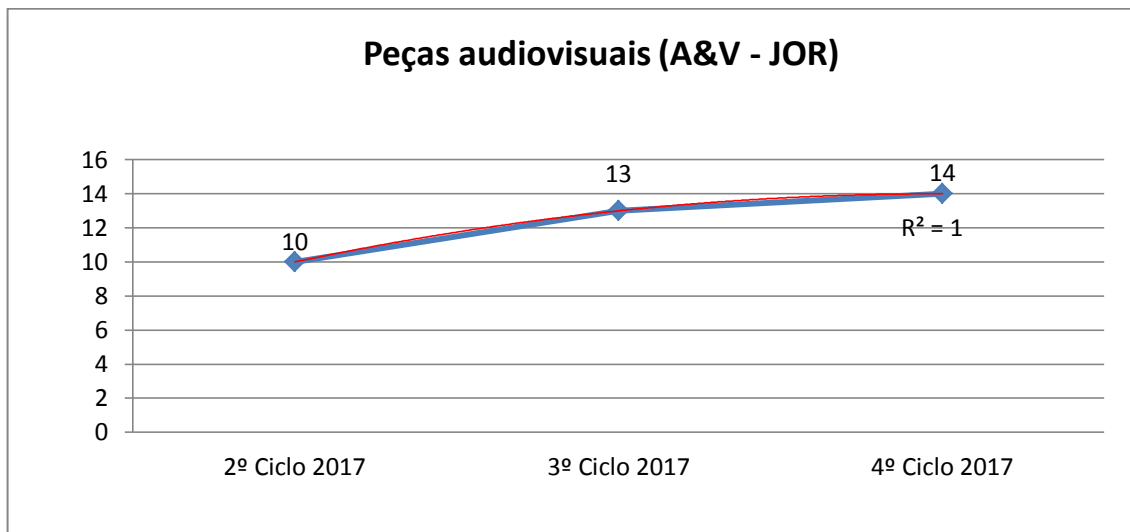

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

6.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)


- a) Fórmula: $\sum \text{Produções em Ações de Publicidade e Design} = 64 + 56 + 25 = 146$
(Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)
- b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.
- c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
- d) Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:
 - Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
 - Produções para jornalismo;
 - Produções para demandas internas;
 - Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
 - Peças digitais / impressos.
- e) Período da aferição: 01/09/2017 a 30/11/2017.
- f) Comentários: este índice ratifica o caráter plural da atuação da Assessoria de Comunicação Social da Sudene. Mais do que a produção jornalística, os projetos desenvolvidos pela unidade assumem uma perspectiva das agências contemporâneas de comunicação, por envolver atividades das áreas de Jornalismo, Publicidade e Design.

Neste 4º ciclo, é possível notar aumento no total de trabalhos, sobretudo peças para veiculação nas redes sociais.

g) Resultados Anteriores:

30/03/2017 a 08/06/2017	68	2º ciclo 2017
29/06/2017 a 31/08/2017	129	3º ciclo 2017

h) Representação gráfica:

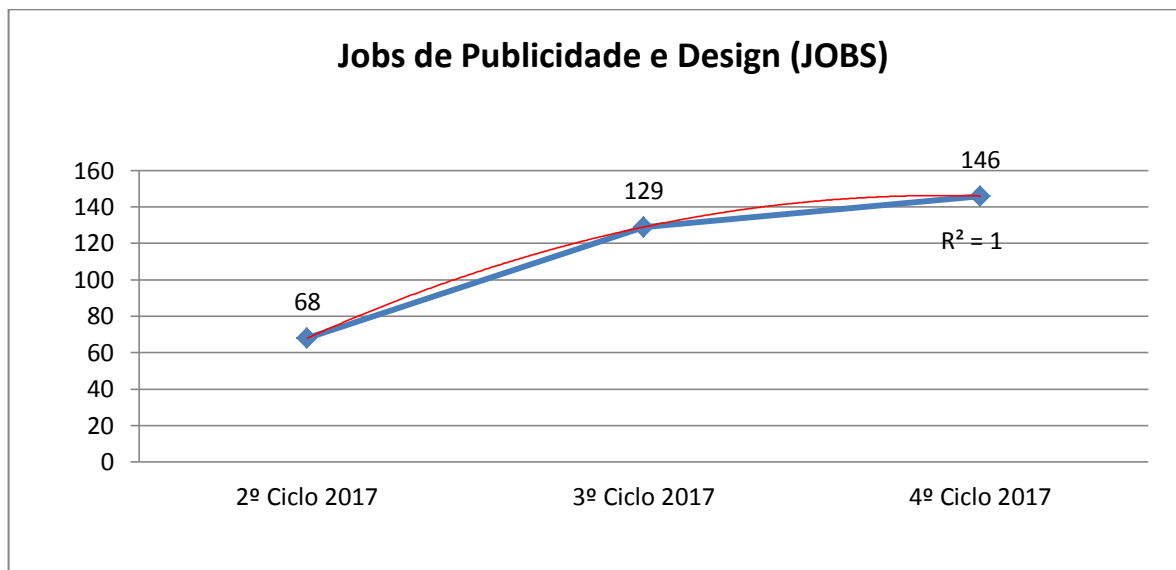

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos

7 – Metas de desempenho institucional para o período out/2017 - set/2018

O quadro que se segue relaciona as metas de desempenho aprovadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE na 288ª reunião, realizada em 19 de dezembro para o período out/2017 - set/2018, do qual participam todas as Diretorias e foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 167, de 20 de dezembro de 2017, disponível no site da Autarquia, no endereço eletrônico http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Portaria_SUDENE_n%C2%BA_167_2017_completaassinada.pdf.

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Metas para o período out/2017-set/2018 com base na Portaria nº 167, de 20 de dezembro de 2017

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
1	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Superior)

Continuar

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Educação Infantil)
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Boletim Temático Social - Habitação)
4	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Boletim Temático Econômico - PIB)
5	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Boletim elaborado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Boletim Temático Ambiental - Resíduos Sólidos)
6	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Mapa digital	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Será elaborado um conjunto de mapas sobre produtos agrícolas de maior produtividade no Nordeste)
7	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	O 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Texto para discussão	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGEP (Será elaborado um texto para discussão aberta, sobre a saúde materna e infantil)
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2111 - Gestão e manutenção do MI	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 2000 - Administração da unidade	Evento	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Evento para fortalecimento da articulação e difusão da Rede Palma)
9	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Estudo	1 (30%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Estudo sobre a cultura da Palma: elaboração de protocolos de cultivo)

Continuar

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
10	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1- Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 8340 - Rede Regional de Inovação	Publicação	2 (50%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (1 publicação para atualização da literatura acadêmica e outra para acesso popular)
11	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.5- Fortalecer as administrações públicas, e Ação PPA 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Celebração de avanços	3 (70%)	-	-	PO em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (celebração de 3 avanços (convênios ou TEDs) para capacitação de servidores municipais no uso do SICONV)
12	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, bem como a que se volta para a inclusão da cadeia produtiva e Ação PPA 7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Local Sustentável; e, 8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Análises realizadas	100 %	-	-	POs em processo de elaboração pela DPLAN/CGDS (Análise de 100 % das propostas /projetos de emendas parlamentares recebidas no prazo legal)
13	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Consultas prévias analisadas	100 %	-	-	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de pleitos em tramitação e analisados, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
14	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores, e Ação PPA 0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Propostas de Financiamentos analisados	100 %	-	-	Lista sob controle da CGDF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base na relação de propostas de financiamento analisadas, para comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
15	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Laudos e portarias aprovadas	365	-	-	Lista sob controle da CGIF/DFIN. O resultado percentual será apurado com base em relação de pleitos aprovados no período, para comparação entre o realizado e o previsto, na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
16	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	-	-	PO do Plano regional de Desenvolvimento do Nordeste em processo de elaboração pela DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
17	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste e Programa PPA 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	O 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores e Ação PPA 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial.	Plano realizado	1 (40%)	-	-	PO do Plano de Desenvolvimento da cidade de Feira de Santana/BA em processo de elaboração pela DPLAN/CGCP. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional.
18	D3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	O 3.1- Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Comitê implantado	1 (100%)	-	-	PO em processo de elaboração pela CGGI/Superintendência. O resultado percentual será apurado com base em constatação de Portaria ou instrumento equivalente, aprovado pela Diretoria Colegiada)
19	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 1 realizado (Avaliação por competência)	1 (50%)	-	-	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 50% para o Sub-Projeto 1. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)
20			Sub-projeto 2 realizado (Planejamento da Força de Trabalho)	1 (20%)	-	-	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 20% para o Sub-Projeto 2. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)

Continua

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)
21	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão e Programa do PPA 2111 - Gestão e Manutenção do MI	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores e Ação do PPA 4575 - Capacitação de servidores públicos federais -Plano orçamentário 0001	Sub-projeto 3 implantado (Política de desenvolvimento de pessoal)	1 (30%)	-	-	PO sob responsabilidade da CGGP/DAD. 30% para o Sub-Projeto 3. O resultado percentual será apurado com base em Plano Operativo, a partir da comparação entre o realizado e o previsto na data da avaliação do ciclo de desempenho institucional)
TOTAL					-	-	-

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN); Diretoria de Administração (DAD); e, Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI)

Observação: para identificação das siglas, acessar o endereço eletrônico: http://www.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/V4-Siglas_23-02-17-FINAL.pdf.

8 – Observações e Deliberações em plenária de 20/12/2017

O Superintendente Marcelo Neves abriu a reunião discorrendo sobre a importância do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e a participação de todos os servidores nesse projeto, sendo ele uma das grandes vitrines e realizações para a Sudene. Lembrou também, a concretização das emendas parlamentares pela instituição, e da grande procura à Sudene, pela classe parlamentar, para envio de emendas tendo em vista seu alto grande sucesso na implantação.

• PROJETOS PRIORITÁRIOS

PO 01 PRDNE - Entre julho e agosto foram conduzidas tratativas para a realização de um Acordo com o PNUD. Em 20/11 o Acordo de Cooperação foi celebrado em feira de Santana e a partir do seminário do dia 21/12 com o quadro da SUDENE, considerar-se-á iniciada a construção do Plano que contará com o apoio de uma consultoria especializada. No primeiro trimestre de 2018 será feita a organização, no segundo será feito diagnóstico, no terceiro internamente discutido, para no quarto trimestre ser feita a minuta inicial e no primeiro de 2019 a articulação do plano e compatibilização com o PPA.

O Diretor Alexandre expôs que serão criados dois núcleos para deliberações das ações realização do projeto, sendo um formado por servidores e outro por gestores da casa, sendo que o Coordenador-Geral em exercício da CGCP/DPLAN, José Farias, será o ordenador das despesas e o Diretor de Planejamento, será o gerente do projeto. Dentro do Projeto, segundo o Diretor da DPLAN, Alexandre Gusmão e o Coordenador-Geral em exercício, José Farias, serão realizados planos sub-regionais e locais de desenvolvimentos, integrados ao PRDNE, sendo um destes o plano de Feira de Santana.

PO 02 - Feira de Santana: será feito nos moldes do de Campina Grande, já foi assinado e elaborado o diagnóstico. Conforme observou o Diretor Alexandre, serão realizados outros planos dentro da área de atuação da Sudene, e os já realizados serão direcionados para a CGCP. Informou também que todos terão por base o PRDNE.

PO 3.1 APEX - O projeto, um dos prioritários da Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada, segundo o coordenador Geral Roberto Cavalcanti e o servidor Ademir Vilaça tem como objetivos a realização de investimentos, exportações e internacionalização de empresas da região. Nesse projeto foi realizada a parceria com a CNI e as federações estaduais da indústria. Na parte de investimentos está sendo articulado com os estados um plano de atração de investimentos. Lembrou Ademir que esta se buscando também um estreitamento das relações com o BNB e as agências locais, agindo em conjunto aos empresários da região para um programa de investimentos. Roberto lembrou a importância de envolver o agronegócio no projeto e lembrou Ademir que a CNA já foi contactada para sua participação, e expôs que estas ações estavam sendo realizadas em um panorama de ações ainda sem o vislumbre do PRDNE e que a partir da sua realização estas ações deveriam ser integradas ao plano.

PO 04 ODNE - Outro projeto prioritário. Segundo Albertina não houve recursos para contratar a empresa que iria disponibilizar os dados de acordo e no formato da política de dados abertos. Assim, tendo em vista essa impossibilidade a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN) está pensando em inseri-lo dentro do projeto do PRDNE. O trabalho esta sendo, por enquanto, realizado dentro da CGEP, e as informações sendo armazenadas nos meios disponíveis.

PO 6 Rede Palma - Esse projeto, também classificado como prioritário, está sendo conduzido pela CGDS. Após o último evento realizado no CONDEL em 27 de julho, houve avanços na construção do projeto, sendo discutido os pontos focais internos e externos e a forma de atuação do órgão. Desta forma serão realizados ajustes com supressão e reformulação de etapas. Dentre as ações propostas esta a criação de um protocolo de cultivo de palma e a atualização de publicações de outras entidades referentes ao tema. Lembrou o diretor Alexandre que o projeto não teve uma colaboração mais efetiva das entidades na disponibilização de estudos sobre a palma o que também prejudicou o projeto, tornando poucos os acessos às informações na internet. Porém, acredita-se que com a elaboração e disponibilização do protocolo pela Sudene haja uma maior colaboração e interesse dos participantes.

Emendas parlamentares CGDS - O Coordenador Geral Mauricio Maia fez um panorama geral dos projetos realizados via emendas parlamentares pela Sudene, enfatizou e assim também o fez o superintendente, que a Sudene esta realizando de forma exitosa as emendas direcionadas ao órgão, evitando o desperdício de recursos públicos, tendo ate mesmo evitado receber mais recursos desta via em função da falta de estrutura para sua realização efetiva como acontece atualmente.

Lembrou o Coordenador-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Mauricio, que no ano de 2016 foram realizadas 11 emendas e que em 2017 eram 15 só pelo Cidra, e que para 2018 das 46 analisadas 41 tinham sido aprovados pela sua Coordenação-Geral até aquele momento.

O Diretor da DPLAN, Alexandre Gusmão, também salientou que em função do contingenciamento de despesas da Sudene neste ano os recursos das emendas parlamentares se constituíram um importante trabalho feito pela Sudene em face deste cenário. Segundo ele o trabalho foi de tamanho vulto e importância que se poderia incluir tal tarefa nas metas institucionais do órgão. As servidoras Maria Helena e Vera Lucia deram a ideia de colocar como meta a análise das emendas pelo setor.

Em relação às emendas propriamente ditas, o diretor Mauricio explicou que em relação ao projeto da cidade de Parelhas os recursos da primeira liberação foram entregues e se estava no aguardo da comprovação da realização das obras pelo município para a liberação da segunda etapa.

O Diretor de Administração, Antônio Ribeiro, expôs os riscos da não realização das emendas em função da pequena estrutura de algumas unidades, principalmente a Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e Tomada de Contas Especial (CCONT) a ele vinculada.

- **PO'S SELECIONADOS**

PO 05 - Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Esta na fase de prestação de contas e falta só o laudo para a entrega do relatório final.

PO's 12 - Anteprojeto da Área de Ensaio do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída e 13- Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil - projetos realizados em parceria com a UFPE e que segundo a coordenadora Maria Helena já estão finalizados. A nota deve-se ao fato de que até a data do travamento esses dois projetos estavam em andamento conforme pode-se verificar nos citados POs, contudo, entre 30/11 e 20/12 seu status evoluiu para uma nova situação.

PO 08 - Projeto construindo com Mulheres - Esse projeto, segundo Vera Lúcia, foi finalizado em evento realizado em alagoas com a participação do Diretor da DPLAN, Alexandre Gusmão. Acrescentou que quando o mesmo tomou posse fez uma análise de quais projetos estavam a mais tempo parados no setor, sendo este um dos que estavam para serem finalizados.

PO's 64- Desenvolvimento por Competências e 65- Avaliação de Competências - Em relação aos projetos da CGGP a Coordenadora-Geral, Carla Paes, destacou que a contratação tinha sido estimada em um valor e depois foi readequado. Informou ela e também o Diretor Antônio Ribeiro que praticamente todo o recurso para capacitação foi realizado. Em 2018 espera que os cursos sejam retomados a partir do mês de março. Lembrou a Coordenadora-Geral o programa de multiplicadores que planeja implantar na Sudene. Também informou que será incluído plano anual de capacitação sobre gestão de riscos e governança, este ultimo se dividindo em liderança e gestão de pessoas.

9 – Conclusão

O destaque do monitoramento vai para as providências encaminhadas pela Superintendência no sentido de viabilizar a elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, aguardado desde a criação da SUDENE, É bem verdade que entre os anos de 2008 e 2011 a Autarquia elaborou proposta que chegou a ter minuta de projeto de lei aprovada pelo Conselho Deliberativo em 2011, mas que foi abortada pelo Ministério da Integração Nacional em razão do projeto à época, de atualizar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Várias conferências estaduais, regionais e até nacional, realizada em Salvador/BA, chegaram a ser feitas, culminando com o envio à Casa Civil da Presidência da República, de uma nova proposta intitulada PNDR II, contudo a então Presidente Dilma a abortou. Contribuindo isso para mais atraso na definição de um plano regional para o Nordeste.

Agora, as atenções se voltam novamente para o PRDNE. Nesse sentido, em novembro foi celebrado acordo de cooperação com o PNUD para o início dos trabalhos visando a contratação de consultoria para o efetivo início dos trabalhos. Nesse sentido, no dia 21 de dezembro a SUDENE, por intermédio da Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas (CGCP), da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), promoveu em suas instalações, a apresentação para os seus servidores e para o TCU/PE como convidado, do projeto com o PNUD e uma discussão com especialistas sobre os principais problemas que afetam a Região, além de um ensaio prospectivo sobre as oportunidades para a Região.

Não menos importante neste ciclo, foi também, o destaque dado para as emendas parlamentares, obras que em sua maioria são de infraestrutura municipal, mas de grande impacto para a economia local. Desde que foi criada, nunca foram tantas as obras de apoio ao desenvolvimento local. Essas obras estão sob acompanhamento e responsabilidade da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio-Ambiente, unidade também vinculada à DPLAN.

Usando da Palavra, o Superintendente também destacou os acordos de cooperação técnica com a APEX Brasil e com a CNI, que vêm dando projeção à SUDENE na sua área de atuação por meio de road-shows realizados em diversos estados como o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e Minas Gerais, mostrando os instrumentos de fomento ao desenvolvimento como o FDNE, os incentivos fiscais e o FNE, e as potencialidades da Região.

Sobre outro tema do momento que está relacionado com a melhoria dos controles internos, especificamente sobre a gestão de riscos e controles internos, a CGGI objetivando oferecer mais segurança à alta administração em cenário de incerteza, encaminhou a todos os membros da Diretoria Colegiada, aproveitando a 288ª reunião realizada em 19/12/2017, a proposta de criação do Comitê de Gestão de Riscos, Governança e Controles Internos, que virá a se constituir instância preventiva, a ser criada, para mitigar os riscos de insucessos em projetos da Autarquia. Esse projeto encontra-se no momento, em análise na Procuradoria da SUDENE, para posterior apresentação formal, aprovação e implantação. Orientado pela Instrução Normativa Conjunta MPDG/CGU nº 1, de 10/05/2016 e pelo Decreto nº 9.203, de 22/11/2017, ele deverá ser constituído pelo Superintendente, os três Diretores, além de representante do controle interno e da Gestão Institucional.

Ainda sobre o tema risco, mereceu atenção na reunião do 4º ciclo, a observação do Diretor de Administração, Antônio Ribeiro, sobre a quantidade de emendas parlamentares para acompanhamento pela CGDS e pela Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e TCE (CCONT) face à pequena quantidade de técnicos existentes nas unidades citadas, o que pode vir a comprometer a qualidade e até o alcance dos objetivos previstos nesses projetos municipais. Sobre o assunto, o Superintendente Marcelo Neves concordou com a colocação, informando na oportunidade, que teve que recusar diversos projetos de parlamentares, e encaminhar outros para as vinculadas DNOCS e CODEVASF preocupado com essa limitação interna.

Sobre o processo de monitoramento entende a CGGI, coordenadora deste trabalho, que o objetivo deste exercício foi parcialmente alcançado pois as unidades ainda não estabeleceram medidas claras de mitigação de riscos como se observa, particularmente, em alguns projetos em atraso ou que apresentam etapas nessa situação. Também se considera como parcial o êxito, pelo fato de que as unidades que trabalham com indicadores desde dez/2012, ainda não ousaram, apesar de tantos pedidos da CGGI ao

longo dos anos, previamente estabelecer metas para os indicadores de capacidade e de produtividade, atendo-se sempre, a apenas medir o ocorrido, o que ficou para trás.

Por outro lado, apesar de acionada por diferentes anos pela CGGI, conforme atestam os memos CGGI nº 49, de 21/10/2011, nº 02, de 12/01/2012 e nº 014, de 30/09/2015, para proceder auditoria no processo de monitoramento, como forma de aperfeiçoamento dos procedimentos e melhoria da eficácia dos controles, a Auditoria interna ainda não pode atender tal pedido justificando insuficiência de quadro para o tamanho do desafio.

Sobre a programação de eventos, o quadro adiante mostra as datas para o exercício de 2018, destacando que no 3º ciclo, procurou-se conciliar a data da apuração com a consolidação dos resultados do desempenho institucional, cujo ciclo de um ano termina em setembro, quando após então, começa um novo ciclo de apuração de desempenho.

Quanto à compreensão sobre a sequência numérica adotada para os Planos Operativos, o leitor deve ter observado que entre ciclos normalmente há uma diferença em alguns haja vista que uns saem por conclusão, paralisação ou cancelamento e outros entram por serem novos, para se preservar o agrupamento de POs que é feito por unidade. Por isso, a numeração sequencial precisa ser sempre ajustada. Assim, para facilitar ao leitor a identificação dos POs mais antigos, adotamos ao lado do número que agora o identifica, e caso seja essa a situação, a numeração no ciclo anterior. Assim, por exemplo, um Plano Operativo que agora é o 64 e no ciclo anterior, era 61, o batizamos como PO 64 (ex PO 61). Esta situação não se aplica aos POs prioritários da Resolução nº 281/2017, da Diretoria Colegiada.

Outro ponto merecedor de observação é que em alguns dos 65 POs o leitor encontrará um selo no formato de um disco posicionado no meio do quadro, intitulado “Meta Institucional”. Esta menção refere-se a POs do ciclo de desempenho institucional out 2016/set 2017 que estão sendo agora informados por uma questão de oportunidade, pois isso não foi possível no ciclo anterior dada a época do travamento das informações para a avaliação de desempenho institucional, que ocorreu em 30 de setembro, posterior ao do travamento para o 3º ciclo de monitoramento.

A agenda proposta para 2018 é a seguinte:

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2017	16/02/2018	15/03/2018
2º	31/05/2018	15/06/2018	29/06/2018
3º	31/09/2018	5/10/2018	18/10/2018
4º	30/11/2018	7/12/2018	20/12/2018

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I

Planos Operativos do Monitoramento



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	01
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas.	Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 234.105,49
mai/15	139.865,15	7.361,32	147.226,47	A realizar no exercício	R\$ -
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	234.105,49	12.321,33	246.426,82	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 234.105,49

Previsão de Conclusão:	30/07/2018	CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência: 18/12/12 a 30/06/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira, Juliana de Melo Borges e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
5	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/ SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R\$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R\$ 139.865,15	100,0%	Concluído		
8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	Concluído	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	28/6/2016		1/12/2013	30/6/2017		100,0%	Concluído		
9.1	Proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/7/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	Concluído	O conveniente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	

9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	Concluído		
9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	28/9/2015		14/3/2014	27/5/2015		100,0%	Concluído	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		05/03/2015	5/3/2015		100,0%	Concluído	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	20/3/2016	20/3/2016	R\$ 94.240,34	25/11/2016	25/11/2016	94.240,34	100,0%	Concluído	No ciclo anterior, foi recomendada a prorrogação da vigência do convênio e que aguardássemos a liberação da 2ª parcela que aconteceu em 25/11/2016	
9.6	Diretrizes, Estratégias e Proposições	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/5/2015	26/2/2016		28/5/2015	21/01/2016		100,0%	Concluído	Realização da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições, referente à Etapa III em Bom Conselho em 11/11/2015. Equipe Técnica da SUDENE impossibilitada de participar em razão da restrição orçamentária. Produto entregue no dia 21/01/2016. Vigência prorrogada e cronograma de execução e desembolso repactuados.	Reunião para apresentação dos resultados da Oficina de Validação das Diretrizes, Estratégias e Proposições: Etapa III, com equipe técnica SUDENE/CONDEPE em 18/11/2015.
9.7	Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento	Etapa IV: Consolidação do Plano da Área de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	29/2/2016	28/6/2016		22/1/2016	30/6/2017		100,0%	Concluído	Realizada reunião em 05/04/2017 com equipe técnica da Agência para tratar da fase final do convênio. Relatório Técnico Final entregue a Sudene em 27/04/17.	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	6/6/2016	7/6/2016		6/6/2016	7/6/2016		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								10,0%	Em Andamento		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	30/08/2017	30/07/2018		27/06/2017			50,0%	Em Andamento	Relatórios de Execução Fisica do SICONV aprovados em 21/08/17; Relatórios de Execução Financeiro do SICONV aprovados em 20/10/17; Prestação de Contas enviada para análise pelo conveniente em 01/11/17; Processo enviado para CGDS emitir laudo técnico em 24/11/17. Laudo em elaboração.	
				Valor Previsto:		R\$ 234.105,49	Valor realizado:		R\$ 234.105,49	90%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião técnica de acompanhamento entre os técnicos da CGDS e os técnicos do CONDEP/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Conveniente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio prorrogado para a data de 28/06/2016. Plano de trabalho atualizado para a nova vigência, datas das etapas III e IV alteradas. Visita técnica realizada em oficina de validação dos resultados em Bom Conselho no dia 07/06/2016. Como desdobramento da oficina encaminhou-se a realização de reuniões em cada município para apresentação e validação do produto final. Liberação da segunda parcela paralisada diante da ausencia de recursos no Ministerio da Integração, não há previsão para a data de liberação, motivo pelo qual solicitou-se a prorrogação de ofício. Liberação da segunda parcela realizada, no entanto devido ao atraso na liberação solicitou-se a prorrogação de ofício.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos			Número do Projeto:	PO
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental			Ano:	2012
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.				
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 265.241,25
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75	A realizar no exercício	R\$ 265.241,25
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	530.482,50	58.942,50	589.425,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 265.241,25
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 265.241,25

Previsão de Conclusão:	01/03/2018	CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONS 013341/2012)
Data Atualização:	30/11/2017	
		Vigência: 28/12/2012 a 30/03/2018

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Conveniente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
1.1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	Concluído		
1.2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	Concluído		
1.3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	Concluído		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	Concluído		
3	Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,8%	Atrasado		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R\$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R\$ 265.241,25	100,0%	Concluído		

6	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R\$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	30/10/2016		15/11/2014	--	--	80,0%	Atrasado	Segundo informações dadas pela conveniente o processo licitatório para contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1, foi realizado e homologado no dia 07/10/2015, aguardando o repasse da segunda parcela para execução. Resta a contratação dos serviços para a realização do Seminário final.	O Plano de Trabalho não está com suas datas previstas atualizadas devido a não ter sido possível à Conveniente realizar os ajustes necessários a nova vigência (30/03/2018) em virtude da tramitação das análises dos Relatórios de Execução, que impede este procedimento. Este fato tem repercussão negativa nos "status" das Metas/Etapas apresentados neste PO. Foi concluída a análise da parte física, entretanto, ainda persistem pendências relativas aos Relatórios de Execução da parte financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio, o que impossibilita a solicitação da liberação da segunda (última) parcela de recursos. Em 14/09/2017 foi realizada uma reunião com a conveniente para tratar das soluções às pendências apontadas pela CCONT, bem como das medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Aguarda-se os ajustes.
7	Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco-Valor: R\$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	30/06/2017		08/12/2014	--	--	40,0%	Atrasado		
7.1	Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R\$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	30/12/2015		08/12/2014	30/12/2015	--	100,0%	Concluído	Etapa concluída após a retomada da realização dos Encontros com a contratação de uma nova empresa.	
**	Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	Concluído	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/11/2016	30/11/2016	R\$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	Atrasado	A liberação da segunda parcela está condicionada à aprovação dos relatórios de execução pela equipe técnica do Concedente. A Concedente vem tentando solicitar esta pendência, inclusive registrando solicitação de esclarecimento no SICONV, junto ao SERPRO.	
7.2	Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R\$ 176.960,00	SEMAS/PE	04/07/2016	31/05/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado	O processo licitatório para a execução da Etapa 2 já foi realizado e homologado. No momento, aguardam o repasse da segunda parcela de recursos para realizar os 14 workshops previstos.	
7.3	Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R\$ 33.200,00	SEMAS/PE	03/10/2016	30/06/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado		
8	Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R\$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	30/06/2017		01/05/2014	--	--	45,0%	Atrasado		
8.1	Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal, clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R\$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017		01/05/2015	--	--	90,0%	Atrasado	A conveniente informou a realização de diversas atividades, indicando o estado avançado desta Etapa, entretanto, sem concluí-la.	
8.2	Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R\$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2016	30/06/2017		--	--	--	0,0%	Atrasado		
***	Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)									0,0%	A Iniciar		

9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/10/2017	01/02/2018		--	--	--	0,0%	A Iniciar	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R\$ 530.482,50	Valor realizado:		R\$ 265.241,25	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Conveniente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Conveniente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Aguarda-se realização de ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a conveniente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	03
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR>IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3 (3330.41)	30	R\$ 485.874,65	R\$ 511.447,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 255.723,17	R\$ 25.572,35	01/02/2014	R\$ 281.295,52	A realizar no exercício	R\$
R\$ 230.151,48		01/05/2014	R\$ 230.151,48	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$
485.874,65	25.572,35	-	511.447,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$
				Valor liberado no Exercício	R\$
				Saldo a liberar	R\$
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$
				Total Liberado até o exercício	R\$

Previsão de Conclusão:	10/07/2017	CONVÊNIO Nº 794997/2013
Data Atualização:	30/11/2017	
		Vigência: 31/12/13 a 14/05/16

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Juliana de Melo Borges, Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Davidson Barbosa Dantas - IDENE (Telefone: (31) 3915-5153/5258/5255)
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				26/09/2013	17/01/2014		20,0%	Concluído		
1	Lançamento da Proposta	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100%	Concluído		
3	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100%	Concluído		
4	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100%	Concluído		
5	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		60,0%	Concluído		
6	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R\$ 255.723,17	100%	Concluído	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído		
8	Elaboração do PESI-NN	Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014	11/09/2015		100%	Concluído	Conveniente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100%	Concluído	Assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Elaboração de Relatório de situação	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100%	Concluído	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Elaboração de Relatório de análise de investimentos	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100%	Concluído	Produto 2 entregue a SUDENE.	

	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100%	Concluído	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R\$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015	R\$ 230.151,48	100%	Concluído		
8.4	Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100%	Concluído	Produto 3 entregue a SUDENE.	
8.5	Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100%	Concluído	Produto 4 entregue a SUDENE.	
8.6	Publicação do PESI-NNE	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Com o Recurso de Aplicação foi autorizada a ampliação do nº de exemplares.	
9	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	Evento de Divulgação e Entrega do PESI-NNE	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Evento de divulgação realizado dia 11 de setembro de 2015 em Montes Claros/MG	
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015	11/09/2015		100%	Concluído	Visita realizada na data de divulgação do evento pela Coordenadora: Maria Helena de Castro Lima	
		ENCERRAMENTO (Peso 20 %)								18,0%	Atrasado	De acordo com o art. 10, § 8º, do Decreto n.º 6170/2007, o concedente tem o prazo de um ano para finalizar a análise da prestação de contas.	
11	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	25/05/2017	10/07/2017		23/05/2017			90%	Atrasado	Relatórios de Execução Físico e Financeiro Aprovados. Prestação de contas apresentada pelo conveniente em 23/05/17. Laudo Técnico em fase de finalização.	
				Valor Previsto:		R\$ 485.874,65	Valor realizado:		R\$ 485.874,65	98,0%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE													
Observações:													
Etapa 8.6 repactuada													
A legislação prevê o prazo de um ano para o concedente finalizar a prestação de contas, por isso, a data de conclusão do convênio refere-se a um ano após a entrega da prestação de contas, o que corresponde a 23/05/18.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	04
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Previsão de Conclusão:	26/01/2018	CONVÊNIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013) Previsão de conclusão: 26/01/2018
Data Atualização:	30/11/2017	

Cronograma de Desemboio (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 107.354,71
NOV/2015	107.354,71	5.650,24	113.004,95	A realizar no exercício (RAP 2013)	R\$ 100.187,91
AGO/2017	100.187,91	5.273,04	105.460,95	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
TOTAL	207.542,62	10.923,28	218.465,90	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar (2015)	R\$ 100.187,91
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 107.354,71

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015); Gileldson Alves.
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Recebimento de propostas	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	Concluído		
3	Análise/seleção de propostas	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								50,8%	Atrasado		
8	Liberação da 1ª parcela	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	27/10/2014	27/10/2014	R\$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R\$ 107.354,71	100,0%	Concluído		
9	Realização do processo de licitação e contratação	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	—	—		11/09/2015	24/09/2015	--	100,0%	Concluído		
10	Realizar 01 seminário	Meta 1 - Realizar 01 seminário de lançamento do Programa de Capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	28/11/2016	--	25/11/2015	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.1	Reuniões Técnicas	Etapa 1.1: Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios Impactados	CONDEPE/FIDEM	25/11/2015	21/07/2016	--	25/11/2016	15/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.2	Diagnóstico e Levantamento de Dados	Etapa 1.2: Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	30/11/2015	28/12/2015	--	30/11/2016	20/04/2016	--	100,0%	Concluído		
10.3	Seminário de Lançamento do Programa de capacitação Fortalecimento Institucional	Etapa 1.3: Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	28/03/2016	28/11/2016	--	28/03/2017	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		

11	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/04/2016	28/04/2016		28/04/2016	28/04/2016	--	100,0%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	29/02/2016	29/02/2016	R\$ 100.187,91	--	--	--	0,0%	Atrasado	No período de referência, a equipe técnica recebeu a complementação dos produtos comprobatórios da Meta 1 e concluiu a análise dos relatórios de execução parcial (Meta 1), recomendando a aprovação e liberação da segunda/última parcela dos recursos. A conveniente apresentou justificativa ao início da execução da Meta 2, mesmo não havendo a liberação da segunda parcela. Os relatórios de acompanhamento técnico também foram inseridos no Siconv. Por fim, foi solicitado novo aditamento de prazo de 120 dias (até 26/janeiro/2017), para que seja possível a liberação da 2ª parcela dos recursos e conclusão da execução da meta 2 (em particular, entrega de certificados, diagnóstico e mapas ao municípios).	Foi realizada reunião técnica com a conveniente, julho/2017, e pactuada agenda de cumprimento das atividades para conclusão do convênio no exercício de 2017. Foi concedido aditivo de prazo (6ª TA), prorrogando até 26/01/2018. Entretanto, o Plano de Trabalho não está com suas datas previstas atualizadas devido a não ter sido possível à Conveniente realizar os ajustes necessários a sua nova vigência em virtude da tramitação das análises dos Relatórios de Execução da parte financeira, que impede este procedimento. Este fato tem repercussão negativa nos "status" das Metas/Etapas apresentados neste PO. Foi concluída a análise dos Relatórios de Execução da parte física, entretanto, ainda persistem pendências nos Relatórios da parte financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio, o que impossibilita a solicitação da liberação da segunda (última) parcela de recursos. Agendada reunião no dia 01/12/2017.
13	Oficinas de Capacitação / Monitoramento	Meta 2: Realizar 6 oficinas de Capacitação / Monitoramento	CONDEPE/FIDEM	29/04/2016	28/09/2017		29/04/2016		--	93,0%	Atrasado		
13.1	Oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano	Etapas 2.1: Realizar 02 oficinas de Capacitação em Planejamento e Controle Urbano.	CONDEPE/FIDEM	04/07/2016	14/02/2017	--	04/07/2016	14/02/2017	--	100,0%	Concluído		
13.2	Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional	Etapas 2.2: Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão administrativa/Operacional.	CONDEPE/FIDEM	25/07/2016	07/03/2017	--	25/07/2016	07/03/2017	--	100,0%	Concluído		
13.3	Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social	Etapas 2.3: Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e Criação/Fortalecimento de Espaços de Controle Social.	CONDEPE/FIDEM	09/08/2016	28/09/2017	--	09/08/2016	--	--	85,0%	Atrasado		
14	Visita técnica de acompanhamento	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/ SUDENE	28/07/2016	11/08/2016	--	28/07/2016	11/08/2016	--	100,0%	Concluído		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/DPLAN/ SUDENE	27/11/2017	27/11/2018	--	--	--	--	0,0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 207.542,62	Valor realizado:		R\$ 107.354,71	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
AGENCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)													
Observações:													
4º Ciclo 2017 - Situação atual "Em execução", após 6º TA; retomada a análise financeira pela CCONT, relativa a 1ª parcela, com vistas a liberação da 2ª parcela (a análise apontou necessidade de ajustes/complementações). Solicitada pelo CONDEPE reunião de esclarecimento. Reunião realizada em 19/12/2017, pela manhã, na CGDS, com CGDS, CCONT e AG. Condepe/FIDEM.													
4º Ciclo 2015 - Situação atual: Aguardando novo ajuste do Plano de Trabalho considerando 2º Termo Aditivo e conclusão do processo licitatório.													
3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.													
2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.													
1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.													
4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida, em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberação da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	05
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Cronograma de Desemboço (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
ago/15	221.267,56	11.645,66	232.913,22	Pago até o ano anterior	R\$ 221.267,56
nov/16	138.415,08	7.285,00	145.700,08	A realizar no exercício	R\$ 138.415,08
TOTAL	359.682,64	18.930,66	378.613,30	Orçamento (LOA+Crédito) no ex	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 138.415,08
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 359.682,64

Previsão de Conclusão:	13/11/2018	CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência: 13/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Isis Moreira, Juliana de Melo Borges - SUDENE/ Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/2013	04/06/2013		100,0%	Concluído		
2	Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	Concluído		
3	Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	Concluído		
4	Ajustes do projeto	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	Concluído		
5	Etapas de formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	Concluído		
6	Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	Concluído		
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
	Liberção da 1ª parcela	Liberção da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	Não Informado	Não Informado	R\$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R\$ 221.267,56	100,0%	Concluído		

8	Processo licitatório	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	Concluído		
9	e Desenvolvimento Regional Sustentável	Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2013	22/08/2017		28/08/2015	13/11/2017		100,0%	Concluído		
	Realização do Fórum	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		100,0%	Concluído	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	28/08/2015	30/12/2015		28/08/2015	30/12/2015		100,0%	Concluído		
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir		18/11/2015	18/11/2015		100,0%	Concluído	Reunião de acompanhamento em 18/11/2015 na SUDENE com equipe técnica SUDENE e CONDEPE/FIDEM.	
9.3	Caracterização / Diagnóstico Situacional	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	31/12/2015	25/03/2016		31/12/2015	05/08/2016		100,0%	Concluído	O diagnóstico preliminar foi validado junto aos participantes dos municípios no dia 02/06/2016. Foi anexado, no dia 05/ 08/2016, ao siconv na ABA - PLANO DE TRABALHO - ANEXOS - LISTAR ANEXOS EXECUÇÃO, o produto da etapa 2 - Diagnóstico Situacional	
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	02/06/2015	02/06/2015		02/06/2015	02/06/2015		100,0%	Concluído	Foi realizado no dia 02/06/2016 a oficina de discussão do diagnóstico do Plano de Desenvolvimento Sustentável, em Salgueiro. As Servidoras Maria Helena de Castro Lima, Vera Lúcia Assunção e Isis Moreira compareceram a oficina como visita de acompanhamento do convênio.	
9.5	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/ SUDENE	01/04/2016	30/11/2016	R\$ 138.415,08	23/02/2017	25/04/2017	R\$ 138.415,08	100,0%	Concluído		

9.6	Diretrizes Gerais e Propostas	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	21/07/2016	10/05/2017		21/07/2016	31/05/2017		100,0%	Concluído	Os técnicos Vera Lúcia Assunção e Victor Uchôa realizaram visita técnica de acompanhamento da Oficina para validação das diretrizes gerais e propostas em Salgueiro-PE ocorrida entre os dias 17/08/2016 e 19/08/2016. Produto da etapa 3 entregue em 31/05/17.	
9.7	Consolidação do Plano	Etapa IV: Consolidação do Plano	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	11/05/2017	13/11/2017		22/08/2017	13/11/2017		100,0%	Concluído	Oficina técnica realizada em 08/11/17. Livro-resumo do Plano divulgado na Oficina. Relatório IV finalizado em 13/11/17 e entregue a Sudene.	
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	08/11/2017	08/11/2017		08/11/2017	08/11/2017		100,0%	Concluído	Visita técnica realizada pelas servidoras da CGDS: Maria Helena, Isis e Juliana para acompanhamento da Oficina de entrega do livreto do Plano realizada em Salgueiro.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								5,0%	Em Andamento		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	13/11/2017	13/11/2018		13/11/2017			25,0%	Em Andamento	Relatórios de execução físico do SICONV aprovados pela CGDS em 13/11/17; relatórios de execução financeira em análise pelo setor de convênios.	
				Valor Previsto:	R\$ 359.682,64	Valor realizado:	R\$ 359.682,64	85%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

De acordo com o art. 10, § 8º, do Decreto n.º 6170/2007, o concedente tem o prazo de um ano para finalizar a análise da prestação de contas.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	06
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporação de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	R\$ 343.585,70	R\$ 361.725,70

Cronograma de Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 206.151,42
dez/14	R\$ 206.151,42	R\$ 10.884,00	R\$ 217.035,42	A realizar no exercício RAP	R\$ 137.434,28
nov/15	R\$ 137.434,28	R\$ 7.256,00	R\$ 144.690,28	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
	R\$ 343.585,70	R\$ 18.140,00	R\$ 361.725,70	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 137.434,28
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 206.151,42

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	CONVÊNIO Nº 813986/2014
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência até: 31/12/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo Saiki Braga/ Victor Uchôa Silva/ Marcelo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	Concluído	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								39,6%	Atrasado	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto.	

8	Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R\$ 206.151,42	100%	Concluído	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso. Realizada prorrogação de ofício do convênio para 21/04/2016, devido atraso na liberação da 1ª parcela
9	Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	Concluído	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	Confeção de 50 blocos multinutricionais	Confeção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	Concluído		
11	Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	24/10/2015		-	75%	Atrasado	Foram distribuídos 36 reprodutores caprinos de leite. A previsão é que todos os animais sejam entregues até o final do ano.	
12	Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	30/06/2017	-	03/12/2015		-	55%	Atrasado	Já foram coletadas 600 doses de sêmen e inseminadas 276 cabras de 4 associações.	
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	30/06/2017	-	14/09/2015		-	70%	Atrasado		
14	Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	30/06/2017	-	27/11/2015		-	60%	Atrasado	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Módulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético.	
15	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	Concluído		
16	Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 137.434,28				0%	Atrasado	A conveniente anexou os relatórios parciais de execução em 22/08/2017, que foram analisados e aprovados tecnicamente em 06/09/17. O processo foi encaminhado para CCONT para análise dos relatórios financeiros.	CCONT elaborou nota técnica solicitando à conveniente esclarecimento de pendências relativas a documentos financeiros e aguarda retorno.
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	01/05/2017	31/05/2017	-			-	0%	Atrasado	A 2ª visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das demais atividades, que estão dependendo da 2ª liberação de recursos.	No aguardo da resolução das pendências e retomada das atividades restantes para reprogramação da visita
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0,0%	A iniciar		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018	-			-	0%	A iniciar		
Valor Previsto:						R\$ 343.585,70	Valor realizado:		R\$ 206.151,42	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados, em sua maior parte, por procedimentos administrativos e burocráticos, tanto por parte da Emepa quanto da Sudene, a conveniente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 31/10/2017, a qual foi acatada em 30/11/17. A nova data de vigência proposta pela conveniente para encerramento do convênio é **30/06/2018**.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	07
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Objetivo estratégico (MI)	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares, gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Previsão de Conclusão:	22/03/2018	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	30/11/2017	

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
nov/14	211.000,00	57.777,00	218.777,00	Pago até o ano anterior	R\$ 211.000,00
mar/15	560.000,00	161.000,00	771.000,00	A realizar no exercício	R\$ 560.000,00
TOTAL	771.000,00	218.777,00	989.777,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 560.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 771.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	Concluído	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)	
2	Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	Concluído		
3	Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	Concluído		
4	Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	Concluído		
5	Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	Concluído		
6	Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	Concluído		
7	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	Concluído		
		Execução (Peso 60%)								52,2%	Atrasado	A conventente solicitou prorrogação de prazo de vigência para 30.12.2017, para realizar o cumprimento das metas programadas no Projeto. O processo se encontra na CGCONT para elaboração do Termo Aditivo.	
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COFC/ SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R\$ 211.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R\$ 211.000,00	100,0%	Concluído		

9	Contratação	Contratação de 03 Técnicos	SDA/CE	01/07/2016	15/07/2016		19/07/2016	21/07/2016		100,0%	Concluído		
10	Seminários de divulgação	Realizar 03 seminários de divulgação	SDA/CE	28/06/2016	30/06/2016		20/06/2016	21/06/2016		100,0%	Concluído		
11	Cursos de capacitação	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	08/08/2016	22/11/2016		13/08/2016	26/10/2017		100,0%	Concluído	Os cursos foram realizados na sua totalidade.	
12	Realizar 09 dias de campo	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	13/09/2016	08/12/2016		28/10/2016			33,0%	Atrasado	Os 03 Dias de Campo foram realizados no município de Quixeramobim. - 29/10/2016	
13	Intercâmbios interestaduais	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	26/09/2016	25/11/2016		07/11/2016			50,0%	Atrasado	O intercâmbio foi realizado na Estação Experimental de Pendências no município de Soledade no Estado da Paraíba. - 11/11/2016	
14	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	15/08/2016	19/08/2016		12/09/2016	15/09/2016		100,0%	Concluído	A viagem teve por objetivo avaliar o andamento do projeto e verificar a possibilidade de liberar a segunda parcela dos recursos financeiros.	
15	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/09/2016	15/09/2016	R\$ 560.000,00	10.08.2017	10.08.2017	R\$ 560.000,00	100,0%	Concluído	A conveniente solicitou prorrogação de vigência do convênio, a qual foi analisada e aprovada, ficando o seu término de vigência para 27.12.2017	
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	01/11/2016	20/11/2016		12/05/2017	03/07/2017		100,0%	Concluído	Foram distribuídos aos beneficiários do Projeto 790 animais, nos municípios de Jaguaretama e Piquet Carneiro. A entrega do restante está prevista para o mês de dezembro de 2017.	
		Encerramento - 20%								0,0%			
17	Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	06/02/2017	10/02/2017					0,0%	Atrasado		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2018					0,0%	A iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 771.000,00	Valor realizado:		R\$ 771.000,00	72%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO	08
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.		
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.				
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia		
Problema (causa):	Crescimento na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .				
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014				
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100/250	GND 3	30	R\$ 1.069.868,00	R\$ 1.090.800,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL (R\$)	Pago até o ano anterior	R\$
mar/15	326.618,00	R\$ 20.932,00	R\$ 347.550,00	A realizar no exercício (RAP)	R\$ 305.000,00
dez/16	438.250,00		438.250,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
set/17	305.000,00		305.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
TOTAL	1.069.868,00		1.090.800,00	Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 764.868,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Macira Sotero e Juliana Borges (SUDENE/CGDS)
	Conveniente	Paulo Marinho (coordenador)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)							20,0%	Concluído		
1	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
2	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100%	Concluído	
3	Apresentação formal do Projeto	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100%	Concluído	
4	Formalização do Convênio	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE			-				100%	Concluído	
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100%	Concluído	
7	Publicação do convênio	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100%	Concluído	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)							46,6%	Em Andamento		
8	Depósito da contrapartida	Depósito da contrapartida	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015	-	23/03/2015	23/03/2015	-	100%	Concluído	Contrapartida no valor de R\$ 20.932,00
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	R\$ 326.618,00	24/03/2015	24/03/2015	R\$ 326.618,00	100%	Concluído	
10	Visita técnica	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100%	Concluído	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao conveniente sobre o processo de convênio.
11	Processo licitatório	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	-	01/01/2015	30/01/2016		100%	Concluído	
12	Mobilização e divulgação	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	31/03/2015	31/05/2015		100%	Concluído	
13	Contratação de entidade	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		Não informado	Não informado		100%	Concluído	Contratada ONG Casa dos Amarelinhos - O Consolador/AL

14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	15/04/2015	30/05/2016	-	Não informado	Não informado		100%	Concluído		
15	Aquisição de equipamentos e materiais	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos.	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	R\$ 305.800,00	01/03/2015			40%	Concluído		
16	Elaboração do Material Didático	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		20/04/2016	22/06/2016		100%	Concluído		
17	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	14/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído	Visita em 14 e 15.04.2016.1. Socializar as informações sobre o projeto no que tange aos aspectos operacionais e legais para o novo gestor do convênio.	
18	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	30/09/2016	R\$ 438.250,00	29/12/2016	29/12/2016	R\$ 438.250,00	100%	Concluído		
19	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras, auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 371.625,00	SEMTABES	16/06/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/06/2016		100%	Concluído	Foram capacitadas 192 mulheres nos cursos de auxiliar de gerenciamento de obras, pintora de paredes e aplicadora de gesso de Abril a Junho/2016 e 198 mulheres de Março a Junho/2017	
20	Visita técnica	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	06/07/2017	07/07/2017	-	29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído		
21	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2017	30/09/2017	R\$ 305.000,00				0%	Atrasado	Esta parcela encontra-se com o cronograma de desembolso em atraso por parte do concedente.	
22	Capacitação de 300 profissionais	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras e aplicadora de gesso. Valor R\$ 305.000,00	SEMTABES	02/05/2017	07/07/2017		16/10/2017			80%	Atrasado	Estao sendo capacitadas em aulas práticas 200 mulheres no curso de aplicadora de cerâmica nos turnos da manhã, tarde e noite. As aulas teóricas foram dadas junto com a turma do curso anterior (pintora de obras).	
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/03/2018	30/12/2018	-				0%	A Iniciar		
24	Visita técnica	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2017	30/12/2017	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/2018	30/06/2018	-				0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.069.868,00	Valor realizado:		R\$ 764.868,00	67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES - Município de Maceió/Estado de Alagoas.

Observações:

3º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do convênio para encerramento em 30/12/2017 foi assinado em 30/06/17.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2013
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Saboeiro/CE.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100	GND 3	30	R\$ 852.088,92	R\$ 905.088,92	R\$ 400.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 423.000,00	Pago até o ano anterior	R\$ 852.088,92
						R\$ 300.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 315.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
						R\$ 152.088,92	R\$ 15.000,00		R\$ 167.088,92	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 852.088,92	R\$ 53.000,00		R\$ 905.088,92	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
										Valor liberado no Exercício	R\$ -
										Saldo a liberar	R\$ -
										Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
										Total Liberado até o exercício	R\$ 852.088,92

Previsão de Conclusão:	15/11/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		30/09/13	14/01/14	-	30/09/13	09/01/15	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/13	02/10/13	-	03/04/14	03/04/14		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/13	12/12/13	-	30/09/13	12/12/13		100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	-		100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/13	26/12/13	-	23/12/14	23/12/14		100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/14	14/01/14	-	09/01/15	09/01/15		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		30/12/13	14/12/16		05/02/14			60%	Concluído		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 23.000,00	Município de Saboeiro	01/02/14	28/02/14		05/02/14	05/02/14		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/14	28/02/14	R\$ 400.000,00	13/02/14	13/02/14	R\$ 400.000,00	100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/03/15	30/03/15		07/04/15	07/04/15		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/15	30/11/15	R\$ 300.000,00	18/11/15	18/11/15	R\$ 300.000,00	100%	Concluído		
12	Depósito da 3ª parcela da contrapartida	Depósito da 3ª parcela da contrapartida. Valor da etapa: R\$ 15.000,00.	Município de Saboeiro	01/12/15	30/12/15		27/05/16	27/05/16		100%	Concluído		
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/16	30/08/16	R\$ 152.088,92	05/08/16	15/08/16	R\$ 152.088,92	100%	Concluído	Ver Observação (2)	
14	Reforma do Mercado Público	Meta 1 - Reforma do Mercado Público. Valor total da etapa R\$ 1.053.000,00.	Município de Saboeiro	30/12/13	16/09/16		28/02/14	14/11/16		100%	Concluído	Ver Observação (1)	

15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/10/16	14/12/16	-	07/12/16	09/12/16	-	100%	Concluído	O município concluiu o Objeto, mas não energizou o mercado pois o transformador da rua não suporta a nova demanda. A concessionária de energia deu uma previsão distante para solucionar o problema.	O município solicitou à concessionária de energia a substituição do transformador e está aguardando a solução.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		15/11/16	15/11/17	-				0%	Atrasado		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	15/11/16	15/11/17					0%	Atrasado	Prestação de Contas Final ainda não foi encaminhada; Ver Observações (3) e (4)	Nova solicitação de envio da Prestação de Contas Final, em 07/nov/2017, cf. Ofício nº 285/2017-DPLAN/SUDENE.
						R\$ 852.088,92	Valor realizado:	R\$ 852.088,92	80%	Atrasado	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Saboeiro/CE													
Observações:													
(1) O convênio 789013/2013 teve a sua vigência prorrogada até 16/09/2016; além disto, após revisão das medições, verificou-se que, para a execução do Projeto, o município precisaria, na verdade, de R\$ 905.088,92.													
(2) A obra foi concluída, não havendo necessidade do uso do saldo remanescente de R\$ 147.911,08. Assim sendo, o valor não utilizado será devolvido.													
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.													
(4) Em virtude do Aditamento da Vigência, as datas para envio e análise da prestação de contas, bem como da previsão de conclusão do convênio foram dilatadas.													
(6) Visita de Recebimento do Objeto em 07.12.2016 e Relatório de Visita de Recebimento do Objeto elaborado em 16.08.2017 e inserido no SICONV em 05.09.2017.													
(7) Ofício Nº 285/2017-DPLAN/SUDENE, de 07.11..2017, solicita providências relativas a apresentação da PTC e outras.													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 400.000,00	R\$ 420.540,15

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 210.000,00	A realizar no exercício	R\$ 200.000,00
R\$ 200.000,00	R\$ 10.540,15		R\$ 210.540,15	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 400.000,00	R\$ 20.540,15		R\$ 420.540,15	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 200.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 400.000,00

Previsão de Conclusão:	04/06/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		24/02/2014	15/01/2015	-	24/02/2014	09/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	05/04/2018		02/02/2015			46%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.000,00.	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF / CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 210.000,00	Município de Jardim de Piranhas	23/12/2014	15/07/2016		15/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor da etapa R\$ 10.540,15	Município de Jardim de Piranhas	16/07/2016	31/07/2016		13/07/2016	13/07/2016		100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF / CGAF / DAD	16/07/2016	17/07/2016	R\$ 200.000,00	10/12/2016	03/10/2017	R\$ 200.000,00	100%	Concluído		

13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 210.540,15	Município de Jardim de Piranhas	20/07/2016	21/03/2018		04/10/2017			34%	Em Andamento		
14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/03/2018	05/04/2018	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		04/06/2018	04/06/2019	-				0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/06/2018	04/06/2019	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 400.000,00	Valor realizado:	R\$ 400.000,00	66%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Jardim de Piranhas/RN

Observações:

- (1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta nº 020551/2014
- (2) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.
- (3) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.
- (4) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
- (5) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 180 dias, do dia 09/11/2015 para o dia 07/05/2016.
- (6) Foi efetuada prorrogação da vigência do convênio por mais 120 dias, do dia 07/05/2016 para o dia 04/09/2016.
- (7) A vigência foi prorrogada para 21/03/2018

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2014
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Objetivo estratégico (MI):	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu funcionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	GND 3	30	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00

Previsão de Conclusão:	27/11/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 292.558,79
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 155.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
R\$ 300.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 310.000,00	Total Liberado até o exercício	R\$ 292.558,79

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN.
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/03/2014	15/01/2015	-	06/03/2014	08/01/2015	-	20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014	-	04/04/2014	04/04/2014	-	100%	Concluído		
2	Recebimento e análise da proposta	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	06/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
3	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014	-	100%	Concluído		
4	Emissão de Pareceres	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014	-	18/03/2014	25/08/2014	-	100%	Concluído		
5	Outros procedimentos formais - legais	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014	-	26/08/2014	04/12/2014	-	100%	Concluído		
6	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	05/12/2014	05/12/2014	-	100%	Concluído		
7	Publicação	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2014	28/09/2017		04/02/2015			51%	Em Andamento		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100%	Concluído		
9	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R\$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
10	Reforma do Mercado Público - Parte 1	Meta 1 - Reforma do Mercado Público - Parte 1. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	05/12/2014	17/08/2016		28/07/2015	25/05/2016		100%	Concluído		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida. Valor R\$ 5.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/09/2015	30/09/2015		15/04/2016	15/04/2016		100%	Concluído		
12	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/2016	31/08/2016	R\$ 150.000,00	05/06/2016	12/09/2016	R\$ 142.558,79	100%	Concluído	Foi realizado ajuste que reduziu a segunda parcela para R\$ 142.558,79	O saldo remanescente de R\$ 7.441,21 somente será liberado caso haja ampliação no projeto
13	Reforma do Mercado Público - Parte 2	Meta 2 - Reforma do Mercado Público - Parte 2. Valor R\$ 155.000,00	Município de Messias Targino/RN	01/07/2016	28/09/2017		19/10/2016	04/12/2017		100%	Concluído		

14	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	14/12/2017	19/12/2017	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/09/2017	28/09/2018					0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/11/2017	27/11/2018					0%	A Iniciar	Ver Observação (7)	
				Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 292.558,79	71%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Messias Targino/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R\$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta nº 024010/2014												
(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015												
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.												
(4) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.												
(5) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.												
(6) Os recursos financeiro da segunda parcela, no valor de R\$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste de trabalho												
(7) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para o encaminhamento da prestação de contas e 1 ano para emissão do laudo técnico final.												
(8) Foi efetuado <u>Aditamento de Vigência</u> , alterando a data de vigência do convênio para o dia 30/06/2017; algumas datas de previsão foram atualizadas, em virtude deste ajuste no SICONV												
(9) Solicitado o Aditamento da Vigência para 26/01/2018												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída		
Objetivo do projeto:	Realizar um anteprojeto de uma área de ensaios do CER-UFPE para aerogeradores de pequena e média potência visando à geração distribuída, baseando-se na avaliação de características de aerogeradores de interesse para o mercado brasileiro e na avaliação de ensaios que possibilitem a adaptação dos aerogeradores às condições de operação no Brasil (com ênfase no Nordeste)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58

Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED 05/2015
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência: 25/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	dez/15	R\$ 277.371,58	Pago até o ano anterior	R\$ 277.371,58
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 277.371,58	R\$ 0,00	-	R\$ 277.371,58	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 277.371,58

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Prof. Alexandre Costa (Telefone: 2126-7326/ 99706-9585)
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	28/10/2015		20/10/2015	28/10/2015		100%	Concluído	Nota técnica 26/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 124/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 32/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	27/11/2015		27/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
9	Liberação dos recursos	Liberação dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 277.371,58	100%	Concluído		
10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	8/3/2016	8/3/2016		20/6/2016	22/6/2016		100%	Concluído	A Coordenadora de Infraestrutura e Meio Ambiente realizou uma visita técnica ao Laboratório de Energias Renováveis – NREL dos Estados Unidos, que faz parte da etapa 1 do Plano de Trabalho aprovado	
11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições (Etapa 1.0)	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/5/2017		3/12/2015	31/05/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER entregou o relatório correspondente a essa etapa.	

12	Definir a atuação da área de ensaios (Etapa 1.1)	Definir a atuação da área de ensaios da CER-UFPE	CER-UFPE	3/12/2015	30/03/2017		3/12/2015	4/5/2017		100%	Concluído	A partir dos intercâmbios realizados foram demandados alguns encaminhamentos. O mais importante deles é um acordo entre as partes para implantar uma área de ensaios de energias renováveis no Nordeste que influenciará no projeto em andamento, especificamente na etapa 1.1; Em 4/5/2017 a equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório da etapa correspondente	A universidade solicitou aditivo de prazo e de recursos, que foi acatado pela equipe técnica e está aguardando parecer das demais áreas competentes. Em 28/02/2017: Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
14	Definir a configuração da área de ensaios (Etapa 1.2)	Definir a configuração da área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/5/2016	30/4/2017		1/5/2016	30/10/2017		100%	Concluído	O TED teve nova prorrogação de vigência e as datas das etapas serão repactuadas.	
15	Dimensionar a área de ensaios (Etapa 1.3)	Dimensionar a área de ensaios do CER-UFPE	CER-UFPE	1/8/2016	30/5/2017		1/8/2016	19/11/2017		100%	Concluído	Os relatórios das etapas 1.2 a 1.3 foram entregues por meio eletrônico antes do fim da vigência .	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	Não informado	Não informado		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final (Etapa 1.4)	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/10/2016	30/5/2017		1/10/2016	20/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A iniciar		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1 ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18					0%	A iniciar	A UFPE-CER irá encaminhar o relatório de cumprimento do objeto em até 30 dias após o término da vigência	A Sudene encaminhou um ofício para o Reitor da UFPE com orientações para a prestação de contas.
				Valor Previsto:		R\$ 277.371,58	Valor realizado:		R\$ 277.371,58	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
UFPE - Centro de Energias Renováveis
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto: PO	13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves		
Problema (causa):	Necessidade de produção de informações e tecnologias adaptadas ao território para energias renováveis no Nordeste		
Projeto:	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil		
Objetivo do projeto:	Identificar, analisar e propor configurações para utilização de células solares orgânicas com tecnologia nacional de baixo custo para ser aplicada na geração de energia elétrica no NE do Brasil		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	GND 3	30	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74

Previsão de Conclusão:	25/11/2018	TED
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência: 25/11/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 322.110,74
R\$ 322.110,74			R\$ 322.110,74	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 322.110,74	R\$ 0,00	-	R\$ 322.110,74	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 322.110,74

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Isis Guimarães Moreira / Olga de Castro Vilela (Telefones: 2126-7326 / 99975-5062)
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Apreciação na DC	Apreciação na Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	29/06/2015	Não informado		29/06/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 201ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o ACT entre MI/UFPE/SUDENE para operacionalizar o orçamento 2015 da ação 8902;	
2	Elaboração do projeto	Elaboração do projeto	CER-UFPE	01/09/2015	01/10/2015		01/09/2015	01/10/2015		100%	Concluído		
3	Análise do Projeto	Análise do Projeto	CGDS/DPLAN	20/10/2015	03/11/2015		20/10/2015	03/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 27/2015/CGDS/DPLAN	
4	Aprovação da DC	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGDS/DIRETORIA	12/11/2015	Não informado		12/11/2015	Não informado		100%	Concluído	ATA da 212ª reunião da Diretoria Colegiada aprovando o TED	
5	Apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PGF/SUDENE	06/11/2015	17/11/2015		06/11/2015	17/11/2015		100%	Concluído	Parecer Nº 125/2015/PF-SUDENE/PGF/AGU	
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGDS/DPLAN	18/11/2015	24/11/2015		18/11/2015	24/11/2015		100%	Concluído	Nota técnica 33/2015/CGDS/DPLAN	
7	Assinatura do Termo de Descentralização	Assinatura do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN/UFPE	27/11/2015	Não informado		27/11/2015	Não informado		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação do Termo de Descentralização	CGDS/DPLAN	02/12/2015	Não informado		02/12/2015	Não informado		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
9	Liberção dos recursos	Liberção dos recursos	COCF/CGAF/Sudene	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	3/12/2015	3/12/2015	R\$ 322.110,74	100%	Concluído		

10	1ª reunião de acompanhamento	Reunião de início do Projeto (1ª reunião de acompanhamento)	CGDS/CER-UFPE	14/6/2016	14/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia da visita de acompanhamento foi constatado que o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo".	
11	Intercâmbio entre UFPE e outras instituições	Realizar intercâmbio entre UFPE e outras instituições	CER-UFPE	3/12/2015	31/3/2017		3/12/2015	19/4/2017		100%	Concluído	A equipe técnica da UFPE-CER encaminhou o relatório referente a etapa	
12	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas	Estudo do estado da arte do desenvolvimento das células orgânicas no mundo e no Brasil	CER-UFPE	3/12/2015	20/9/2017		20/9/2017	2/10/2017		100%	Concluído	A UFPE e o CSEM formalizaram o Acordo de Cooperação Técnica em outubro.	
13	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/6/2016	1/6/2016		14/6/2016	14/6/2016		100%	Concluído	No dia 14 de junho foi realizada uma visita técnica de acompanhamento no Centro de Energias Renováveis. Foi constatado que, embora enfrentando dificuldades iniciais para a realização da parceria com o CSEM, o projeto se encontra em andamento de acordo com o plano de trabalho, principalmente no que se refere a etapa 2 do projeto " estudo e proposta de diferentes configurações, dimensões, ligações série-paralelo	
14	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	Desenvolvimento e caracterização indoor de células e módulos fabricados no Brasil	CER-UFPE	1/1/2016	9/10/2017		9/10/2017	22/11/2017		100%	Concluído	Devido o atraso da formalização do ACT entre UFPE e CSEM, bem como a percepção de ampliar os testes necessários para realizar o projeto em tela, a UFPE solicitou aditivo de prazo e recursos, o qual foi acatada pela equipe técnica e está aguardando o posicionamento das demais áreas competentes	Após o parecer jurídico, apenas foi concedido o aditivo de prazos, as datas serão repactuadas.
15	Caracterização outdoor de células e módulos	Caracterização outdoor de células e módulos	CER-UFPE	1/4/2016	23/10/2017		23/10/2017	19/11/2017		100%	Concluído	O CER/UFPE solicitou novo aditivo de prazo, acatado pela Unidade Técnica e enviado para as demais providências junto as demais Unidades.	
16	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGDS/CER-UFPE	1/9/2016	Não informado		16/2/2017	16/2/2017		100%	Concluído	No dia 16/2, a equipe técnica realizou uma reunião de acompanhamento, na qual foram apontados questionamentos sobre o andamento do projeto e foi acertada uma apresentação do projeto e dos produtos parciais para a direção da Sudene. Essa apresentação será realizada no dia 9/3/2017	
17	Realizar Workshop e elaborar relatório final	Realizar Workshop e elaborar relatório final	CER-UFPE	1/9/2016	17/11/2017		20/11/2017	22/11/2017		100%	Concluído		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
18	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final. (1ano)	CGDS/DPLAN	22/11/17	22/11/18					0%	A Iniciar	A UFPE-CER irá encaminhar o relatório de cumprimento do objeto em até 30 dias após o término da vigência	A Sudene encaminhou um ofício para o Reitor da UFPE com orientações para a prestação de contas.
				Valor Previsto:		R\$ 322.110,74	Valor realizado:		R\$ 322.110,74	80%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
UFPE - Centro de Energias Renováveis
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos		Número do Projeto: PO	14
Objetivo estratégico:	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental		Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria	
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.	
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território			
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS	
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia	
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.			
Projeto:	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.			
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R\$ 459.000,00	R\$ 824.276,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
SUDENE	MMA	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 459.000,00
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	A realizar no exercício	R\$ -
			R\$ 0,00	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
R\$ 459.000,00	R\$ 365.276,25	nov/15	R\$ 824.276,25	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 459.000,00

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015
Data Atualização:	30/11/2017	Vigência: 31/03/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDS / SUDENE	Carlos Almiro Moreira Pinto / Victor Uchôa Silva / José Aildo Sabino
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Envio de Ofício À SUDENE	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	Concluído		
2	Posicionamento da SUDENE a favor	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	Concluído		
3	Envio do TR e do TED	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	Concluído		
4	Análise e elaboração de Nota Técnica	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	Concluído		
6	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	Concluído		
7	Parecer técnico final	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	Concluído		
8	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	Concluído		
9	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	Concluído		
10	Liberção da única parcela	Liberção da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R\$ 459.000,00	100%	Concluído		

11	Mobilização e Planejamento	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	Não informado		100%	Concluído		
12	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	Concluído	A SUDENE participou do Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos indicado acima como partícipe do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	Concluído		
13.1	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	Concluído	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico	Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional	Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.4	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
14	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído		
14.1	Sistematização, estruturação e documentação do BDG	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	

15	Sistematização e divulgação dos resultados	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	Não informado		100%	Concluído	
15.1	Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	Concluído	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.
15.2	Apresentação dos resultados alcançados	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.
16	Visita técnica de acompanhamento	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	Concluído	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										6,0%	Em Andamento	
17	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017			30%	Em Andamento	Foram apresentados os produtos e as respectivas Notas Técnicas aprovando-os por parte do Ministério do Meio Ambiente, bem como, a Nota Técnica final referente aos aspectos físicos desta iniciativa. Todo este material encontra-se em processo de análise para elaboração do parecer técnico final.
				Valor Previsto:		R\$ 459.000,00	Valor realizado:		R\$ 459.000,00	86%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa do PPA:	Não se aplica	Eixo temático (MI):	não se aplica		
Ação do PPA:	Não se aplica	Objetivo estratégico (MI):	não se aplica		
Objetivo da ação:	Metas Institucionais 2016-2017				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas		Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT, COIM/CGDS	
Diretor:	Alexandre Gusmão		Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia, Maria Helena	
Problema (causa):	Escassez/restrrição hídrica, reforçando a busca e utilização de alternativas, a exemplo da utilização de águas residuárias como medida estratégica de convivência com o semiárido				
Projeto:	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido" - Meta Institucional 2 (Evento 3).				
Objetivo do projeto:	Aprofundar as discussões regionais sobre recursos hídricos e utilização de águas residuárias.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	29/09/2017
Data Atualização:	30/11/2017



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena, Vera Lucia, José Aildo, Marcelo Viana, Marcelo Saiki, Victor Uchoa, Amauri, Isis, Renato
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Pré-evento: Planejamento do "Café com Sustentabilidade"	-		15/12/16	11/08/17		15/12/16	11/08/17		10,0%	Concluído		
1.1	Definição do tema, abrangência (público alvo), proposta de programação	-	CGDS/DPLAN	15/12/2016	30/01/2016		15/12/2016	30/01/2016		100%	Concluído		
1.2	Elaboração de Nota Técnica (NT Nº 11/2017), para apreciação e deliberação da direção (DPLAN)	-	CGDS/DPLAN	30/01/2017	16/02/2017		30/01/2017	16/02/2017		100%	Concluído		
1.3	Definição / divisão de tarefas com vistas a preparação do evento	-	CGDS/DPLAN	27/07/2017	11/08/2017		27/07/2017	11/08/2017		100%	Concluído		
2	Preparação do evento "Café"	-		02/01/17	30/08/17		02/01/17	30/08/17		10,0%	Concluído		
2.1	Contatos com convidados-palestrantes, para convite e confirmação	-	CGDS/DPLAN	02/01/2017	18/08/2017		02/01/2017	18/08/2017		100%	Concluído		
2.2	Reuniões/Solicitações ref. organização do local; material; equipamentos; alimentação/lanche	-	CGDS/DPLAN - ASCOM	12/08/2017	14/08/2017		12/08/2017	14/08/2017		100%	Concluído		
2.3	Definição/Confecção de Convite, Programação, Folder, Banner	-	CGDS/DPLAN, ASCOM, CGAF/DAD	18/08/2017	23/08/2017		18/08/2017	23/08/2017		100%	Concluído		
2.4	Divulgação	-	CGDS/DPLAN; ASCOM	23/08/2017	30/08/2017		23/08/2017	30/08/2017		100%	Concluído		
3	Realização do "Café"	-	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/09/2017	01/09/2017		01/09/2017	01/09/2017		70,0%	Concluído		
4	Pós-evento	-		02/09/17	29/09/17		02/09/2017	29/09/2017		10,0%	Concluído		

4.1	Consolidação da documentação - relatório, lista de presença, notícia, registro fotográfico.	-	CGDS/DPLAN	02/09/2017	29/09/2017		02/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100,0%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
No "Café" Reúso de água, contamos com o apoio e parceria do INSA, da UFRPE, da SDA-CE e da Compesa, mediante a participação de representantes como convidados-palestrantes trazendo suas experiências/atuações no tema.													
Observações:													
Trata-se de mais uma edição do "Café com Sustentabilidade", um dos tres eventos previstos como Meta Institucional 2016/2017 (Meta 2), realizado no 1º de setembro de 2017, no auditório panorâmico da SUDENE, em Boa Viagem. Programação: 8h30 às 12h30, incluindo: Credenciamento/inscrição; Abertura; Palestras (4); Debate; Encerramento.													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	Fortalecer a imagem da SUDENE	Número do Projeto:	PO 16
Objetivo estratégico:	Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Ano:	2017
Programa do PPA:	Não se aplica	Eixo temático (MI):	não se aplica
Ação do PPA:	Não se aplica	Objetivo estratégico (MI):	não se aplica
Objetivo da ação:	Metas Institucionais 2016-2017		
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - COIM/CGDS
Diretor:	Alexandre Gusmão	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Maria Helena
Problema (causa):			
Projeto:	"Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido" - Evento Temático - Meta Institucional 2016/2017		
Objetivo do projeto:			

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	30/11/2017



Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Victor Uchôa Silva, Teresa Oliveira, Marcelo Viana, José Amauri, Isis Moreira.
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento	Reunião com o Diretor de Planejamento para definição do tema do evento	CGDS/DPLAN	29/08/17	08/09/17	--	29/08/17	08/09/17	--	100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota técnica	Documento necessário à aprovação do projeto contendo informações sobre a importância e motivação da proposta	CGDS/DPLAN	05/09/17	08/09/17	--	05/09/17	08/09/17	--	100%	Concluído		
3	Articulações com os convidados/palestrantes	Realização de contatos e convites para os participantes	CGDS/DPLAN	11/09/17	12/09/17	--	11/09/17	12/09/17	--	100%	Concluído		
4	Planejamento da Oficina preparatória interna	Articulação com a ASCOM e a CGGP para viabilizar a participação do Servidor Francisco Cezar da FUNASA no evento	CGDS/DPLAN	11/09/17	13/09/17	--	11/09/17	13/09/17	--	100%	Concluído		
5	Evento - Tecnologias Inovadoras para Cisternas	Realização na sala JK.	CGDS/DPLAN	14/09/17	14/09/17	--	14/09/17	14/09/17	--	100%	Concluído		
6	Debate Interno - Considerações da Sudene	Realização de uma discussão entre os servidores participantes do evento para construção das considerações sobre as Cisternas e possíveis encaminhamentos para a SUDENE	DPLAN	20/09/17	29/09/17		20/09/17	29/09/17		100%	Concluído		
7	Pós-Evento e Encaminhamentos	Nesta fase final é realizado o relatório técnico, articulações posteriores, registro dos encaminhamentos.	CGDS/DPLAN	29/09/17	29/09/17	--	29/09/17	29/09/17		100%	Concluído		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Funasa Rio Grande do Norte
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 17
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social		
Objetivo da ação:	Articular e dialogar (Reconhecer, Conhecer, Cooperar) com as intuições que atuam com a cultura da palma				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção		
Problema (causa):	Baixa interação e diálogo entre as várias instituições/atores e os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.				
Projeto:	Evento Temático / Meta Institucional (1): 1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA				
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	29/09/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, José Aildo, Marcelo Viana, Marcelo Saiki, Víctor Uchoa
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento e organização do evento	Definição de atividades e papéis dos técnicos da cgds	CGDS	25/08/2017	25/08/2017		25/08/2017	25/08/2017		10%	Concluído		
1.1	Elaboração da nota técnica	-	CGDS	28/08/2017	29/08/2017		28/08/2017	28/08/2017		100%	Concluído		
1.2	Aprovação da nota técnica	-	DPLAN	30/08/2017	30/08/2017		01/09/2017	01/09/2017		100%	Concluído		
2	Preparação do evento "1ª Reunião Técnica"			06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		10%	Concluído		
2.1	Contatos com convidados-palestrantes, para convite e confirmação		CGDS	06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
2.2	Reuniões/Solicitações ref. organização do local; material; equipamentos; alimentação/lanche		CGDS, ASCOM, CGAF, CGTI	06/09/2017	22/09/2017		06/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
2.3	Definição/Confecção de Convite, Programação, Folder, Banner		GABINETE, ASCOM, CGDS,	06/09/2017	25/09/2017		06/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
2.4	Divulgação		GABINETE, ASCOM, CGDS	14/09/2017	25/09/2017		14/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
3	Realização da Reunião	-	SUDENE	26/09/2017	26/09/2017		26/09/2017	26/09/2017		70%	Concluído		
4	Pós-evento	-	CGDS	27/09/2017	29/09/2017		27/09/2017	29/09/2017		10%	Concluído		
4.1	Consolidação da documentação - relatório, lista de presença, registro fotográfico, outros.	-	CGDS	27/09/2017	29/09/2017		27/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 18 (ex PO 20)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2015
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo e
Finalidade da ação:	Viabilização da gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e capacitações, elaboração de planos e estudos, monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial.				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidades responsáveis:	CGEP e CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestores das subunidades:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti e Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos, considerando os saberes populares das localidades na área de estudo.				
Projeto:	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.				
Objetivo do projeto:	Elaborar inventários com as plantas medicinais nativas de duas unidades de conservação no Semiárido pernambucano associadas ao conhecimento tradicional, bem como a investigação do potencial terapêutico, assegurando a correta identificação taxonômica das plantas utilizadas pelas comunidades tradicionais e realizar oficina devolutiva para as mesmas.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250 e 280	Custeio (3)	Descentralização	749.000,00	749.000,00

Previsão de Conclusão:	26/02/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Crono Desembolso				Valores Orçamentários/ Financeiros	
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 749.000,00
749.000,00	0,00	Dezembro/2015	749.000,00	A realizar no exercício	R\$ -
-	0,00	-	-	Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ -
749.000,00	0,00	-	749.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	-
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	-
				Total Liberado até o exercício	R\$ 749.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Concedente	Albertina Pereira - CGEP/DPLAN ; Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção (CGDS/DPLAN)
	Conveniente	Marcia Vanusa da Silva (UFPE)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20,0%	Concluído		
1	Reuniões preparatórias e de alinhamento	Reuniões preparatórias e de alinhamento	CGEP e CGDS	13/07/2015	12/08/2015		13/07/2015	12/08/2015		100%	Concluído		
2	Envio da proposta	Envio da proposta	UFPE	12/08/2015	01/09/2015		22/09/2015	22/09/2015		100%	Concluído		
3	Parecer técnico	Parecer técnico	CGEP e CGDS	22/09/2015	13/10/2015		13/10/2015	13/10/2015		100%	Concluído		
4	Aprovação na DC	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	21/10/2015	21/10/2015		21/10/2015	21/10/2015		100%	Concluído		
5	Parecer jurídico da Procuradoria	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	PF/SUDENE	12/11/2015	28/11/2015		12/11/2015	19/11/2015		100%	Concluído		
6	Parecer final técnico	Parecer final técnico	CGEP e CGDS	23/11/2015	27/11/2015		25/11/2015	27/11/2015		100%	Concluído		
7	Celebração do TED	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e UFPE	01/12/2015	01/12/2015		01/12/2015	01/12/2015		100%	Concluído		
8	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015		02/12/2015	02/12/2015		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								40,8%	Em Andamento		
9	Liberação da parcela única	Liberação da parcela única para aquisição de material de consumo e para a contratação de bolsistas.	CGAF/COCF/SUDENE	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	02/12/2015	02/12/2015	R\$ 749.000,00	100%	Concluído		

10	Meta 1: Levantamento etnobotânico	Meta 1: Levantamento etnobotânico	UFPE	10/12/2015	26/02/2018	R\$ 76.800,00	10/03/2016	18/10/2016	R\$ 76.800,00	100%	Concluído	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
10.1	1ª Reunião de acompanhamento	1ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/03/2016	10/03/2016		10/03/2016	10/03/2016		100%	Concluído		
10.2	Visita técnica	Visita técnica (apresentação de proposta para as comunidades)	CGEP e CGDS	16/05/2016	20/05/2016		23/05/2016	25/05/2016		100%	Concluído	A visita técnica foi adiada, mas cumprida entre os dias 23 e 25 de maio de 2016	Relatório enviado em 23/08/2016.
10.3	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	23/05/2016	10/11/2016		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	Foi encaminhado o Ofício ao reitor da UFPE cobrando providências para complementação do relatório.
10.4	Relatório de conclusão da Meta 1	Relatório de conclusão da Meta 1	UFPE	23/05/2016	26/01/2018		10/10/2016	18/10/2016		100%	Concluído	Foi acordado que as pendências deste relatório seriam incluídas no próximo relatório.	
11	Meta 2: Banco de dados de e sequenciamento de genes de interesse	Meta 2: Banco de dados de imagens e sequenciamento de genes de interesse taxonômico	UFPE	10/12/2015	26/02/2018	R\$ 138.000,00	18/01/2016		R\$ 138.000,00	66,7%	Em Andamento	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
11.1	2ª Reunião de acompanhamento	2ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/06/2016	10/06/2016		05/09/2016	06/09/2016		100%	Concluído		2ª reunião reagendada para o dia 05 e 06 de setembro de 2016.
11.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	13/06/2016	10/11/2016		10/10/2016			50%	Em Andamento	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	
11.3	Relatório de conclusão da Meta 2	Relatório de conclusão da Meta 2	UFPE	13/06/2016	26/01/2018		10/10/2016			50%	Em Andamento	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordado em reunião realizada no dia 01/12/2017	
12	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	Meta 3: Comprovação de indicação de uso terapêutico popular	UFPE	10/12/2015	26/02/2018	R\$ 373.400,00	18/01/2016		R\$ 373.400,00	66,7%	Em Andamento	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
12.1	3ª Reunião de acompanhamento	3ª Reunião de acompanhamento	CGEP e CGDS	10/09/2016	10/09/2016		08/11/2016	09/11/2016		100%	Concluído		
12.2	Relatório de Acompanhamento	Relatório de Acompanhamento	UFPE	12/09/2016	10/11/2016		10/10/2016			50%	Em Andamento	Relatório enviado (pela unidade descentralizada), porém com informações insuficientes.	A unidade descentralizada solicitou prorrogação da vigência do TED por 90 dias. O parecer técnico CGDS/DPLAN foi favorável e enviado ao setor de convênios, portanto as datas serão repactuadas.
12.3	Relatório de conclusão da Meta 3	Relatório de conclusão da Meta 3	UFPE	12/09/2016	26/01/2018		10/10/2016			50%	Em Andamento	Relatório será complementado pela UFPE conforme acordado em reunião realizada no dia 01/12/2017	
13	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	Meta 4: Devolutiva à comunidade e divulgação do produto final	UFPE	13/03/2017	26/02/2018	R\$ 160.800,00			Não se aplica	75,0%	Em Andamento	Data de término repactuada após extensão de prazo do TED.	
13.1	Visita técnica	Visita técnica (oficinas devolutivas)		13/03/2017	17/03/2017		13/03/2017	15/03/2017		100%	Concluído		
13.2	Relatório de conclusão da Meta 4	Relatório de conclusão da Meta 4	UFPE	20/03/2017	24/10/2017		20/03/2017			50%	Em Andamento		
14	Apresentação de relatório final	Apresentação de relatório final	UFPE	27/10/2017	26/01/2018					0%	A Iniciar		
ENCERRAMENTO (Peso 20%)										0,0%	A Iniciar		
15	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGEP e CGDS	28/11/2017	26/02/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 749.000,00	Valor realizado:		R\$ 749.000,00	60,8%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 19 (ex PO 22)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial			Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial			Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País
Finalidade da ação:	Fase preparatória interna para projeto de Regionalização da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
Diretoria responsável:	DPLAN			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações de forma que permita um recorte regional e uma visão voltada para a identificação de desigualdades inter-regionais e intrarregionais.				
Projeto:	Produto 1 - Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal				
Objetivo do projeto:	Realizar um estudo preliminar da Política de Dados Abertos do Governo Federal, a fim de subsidiar o projeto posterior de pesquisa da melhor solução para sistematizar informações de modo a subsidiar os processos de formulação, monitoramento e avaliação de planos e programas que promovam o desenvolvimento incluyente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-



Previsão de Conclusão:	31/08/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Joyce Queiroz e Silva
-------------------------------------------------	-----------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal	Joyce Queiroz e Silva	08/11/16	31/08/17	-	08/11/16	13/09/17	-	100%	Concluído		
1.1	Estudo através dos Cursos oferecidos pela ENAP Virtual	Estudo da Política de Dados Abertos do Governo Federal através dos Cursos oferecidos pela ENAP Virtual	Joyce Queiroz e Silva	08/11/16	28/11/16	-	08/11/16	28/11/16	-	100%	Concluído		
1.2	Reunião com o Cin para analisar viabilidade de proposta de parceria	Reunião de articulação com o Cin para analisar viabilidade de proposta de parceria	Joyce Queiroz e Silva/Albertina Pereira	17/11/16	17/11/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		
1.3	Apresentação interna dos resultados	Apresentação interna dos resultados das etapas anteriores	Joyce Queiroz e Silva	29/11/16	16/12/16	-	07/12/16	07/12/16	-	100%	Concluído	A professora Bernadette Lôscio, do Centro de Informática da UFPE, foi convidada para apresentar a Política de Dados Abertos do Governo Federal e um diagnóstico preliminar das publicações da SUDENE. Esta apresentação foi realizada no dia 07/12/2016	
1.4	Planejamento para apresentação do tema	Planejamento para apresentação do tema, aberta para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	02/01/17	31/01/17	-	02/01/17	03/03/17	-	100%	Concluído		

1.5	Apresentação do tema aberta para a SUDENE	Apresentação do tema aberto para a SUDENE	Joyce Queiroz e Silva	01/07/17	31/07/17	-	12/09/17	12/09/17	-	100%	Concluído	Apresentação realizada na sala do Diretor de Planejamento.	
1.6	Entrega do Relatório da Apresentação	Entrega do Relatório da Apresentação para chefia imediata	Joyce Queiroz e Silva	01/08/17	31/08/17	-	13/09/17	13/09/17	-	100%	Concluído		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Observações: Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.													
1.1 - Os cursos oferecidos pela ENAP sobre o tema foram Turma 1/2016 - Elaboração de Plano de Dados Abertos e Turma 4/2016 - Introdução à Interoperabilidade													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 20 (ex PO 24)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo III - redução das taxas de mortalidade materno-infantil, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	16/12/2016
Data Atualização:	30/11/2017



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
-------------------------------------------------	-------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Tássia	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Tássia	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Tássia	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Tássia	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Tássia	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Tássia	17/10/16	31/10/16	-	17/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Tássia	17/10/16	25/10/16	-	17/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Tássia	25/10/16	31/10/16	-	25/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de saúde materno infantil	Produto 3 - Boletim de saúde materno infantil	Tássia	01/11/16	16/12/16	-	01/11/16	21/09/17	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Tássia	01/11/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Tássia	11/11/16	18/11/16	-	11/11/16	18/11/16	-	100%	Concluído		

3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	21/11/16	25/11/16	-	21/11/16	25/11/16	-	100%	Concluído			
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Tássia	28/11/16	01/12/16	-	06/12/16	09/12/16	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/16	09/12/16	-	09/06/17	28/08/17	-	100%	Concluído	Marca finalizada em 16/12/2016.		
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/16	16/12/16	-	20/09/17	20/09/17	-	100%	Concluído	Justificativa para atraso: 1-confecção da marca e 2-layout para padronização dos boletins e elaboração do briefing para publicação.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações: Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 21 (ex PO 26)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores sobre saneamento básico, referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VI - universalização do saneamento básico, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	16/12/2016
Data Atualização:	30/11/2017



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Crê)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira
-------------------------------------------------	-------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Marina / Robson	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Marina / Robson	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Marina / Robson	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Marina / Robson	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Marina / Robson	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Marina	17/10/16	31/10/16	-	17/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Marina	17/10/16	25/10/16	-	17/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Marina	25/10/16	31/10/16	-	25/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de saneamento	Produto 3 - Boletim de saneamento	Marina	01/11/16	16/12/16	-	01/11/16	25/09/17	-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Marina	01/11/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Marina	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	25/01/17	-	100%	Concluído		

3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Marina	28/11/16	01/12/16	-	25/01/17	17/08/17	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/16	09/12/16	-	05/09/17	15/09/17	-	100%	Concluído			
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/16	16/12/16	-	25/09/17	25/09/17	-	100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 22 (ex PO 27)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste no período 2000-2010, considerando que este tema se correlaciona fortemente com os objetivo do PRDNE, estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/09/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina de Souza Leão Pereira
-------------------------------------------------	---------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Maria do Carmo	03/10/16	17/10/16	-	03/10/16	17/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Maria do Carmo	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Maria do Carmo	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Maria do Carmo	10/10/16	14/10/16	-	10/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Maria do Carmo	17/10/16	17/10/16	-	17/10/16	17/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	Maria do Carmo	18/10/16	22/11/16	-	18/10/16	17/01/17	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Maria do Carmo	18/10/16	31/10/16	-	18/10/16	31/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Maria do Carmo	01/11/16	22/11/16	-	05/12/16	17/01/17	-	100%	Concluído	Foram identificados outros subsídios/informações para ampliação da análise, por este motivo, os prazos anteriormente planejados foram repactuados.	
3	Produto 3 - Boletim de Migração	Produto 3 - Boletim de Migração	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	21/08/17	25/09/17	-	21/08/17	21/09/17	-	100%	Concluído	Mudança da equipe	

3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	21/08/17	11/09/17	-	21/08/17	11/09/17	-	100%	Concluído			
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Ludmilla Calado e Gabriela Isabel	21/08/17	11/09/17	-	21/08/17	11/09/17	-	100%	Concluído			
3.3	Validação final	Validação final	Albertina/ Fred	12/09/17	13/09/17	-	12/09/17	13/09/17	-	100%	Concluído			
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Albertina/Estagiário	14/09/17	15/09/17	-	14/09/17	14/09/17	-	100%	Concluído			
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	15/09/17	22/09/17	-	15/09/17	20/09/17	-	100%	Concluído			
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	25/09/17	25/09/17	-	21/09/17	21/09/17	-	100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações: Meta Institucional													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 23 (ex PO 28)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
-------------------------------------------------	--------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Emprego	Produto 3 - Boletim de Emprego	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016		-	83%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/12/2016	09/12/2016	-	21/03/2017	30/10/2017	-	100%	Concluído	Briefing concluído. Foi dada prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.	

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	12/12/2016	22/12/2016	-	30/10/2017		-	0%	Atrasado		
		Valor Previsto:			R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	94%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
*Boletim relativo ao PIB e PIB per capita da área de atuação da SUDENE.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 24 (ex PO 29)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José luiz/Lautemyr Canel
-------------------------------------------------	--------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/2016	14/10/2016	-	03/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/2016	06/10/2016	-	03/10/2016	06/10/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/2016	07/10/2016	-	07/10/2016	07/10/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/2016	11/10/2016	-	10/10/2016	11/10/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/2016	14/10/2016	-	11/10/2016	14/10/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/2016	28/10/2016	-	17/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/2016	21/10/2016	-	17/10/2016	21/10/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/2016	28/10/2016	-	24/10/2016	28/10/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim de Rendimento	Produto 3 - Boletim de Rendimento	José Luiz	31/10/2016	22/12/2016	-	01/11/2016		-	68%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/2016	10/11/2016	-	01/11/2016	10/11/2016	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/2016	16/11/2016	-	11/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/2016	25/11/2016	-	16/11/2016	16/11/2016	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/2016	01/12/2016	-	17/11/2016	17/11/2016	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCON	02/12/2016	09/12/2016	-	20/03/2017		-	10%	Atrasado	Briefing concluído. Foi dado prioridade aos boletins que fazem parte das metas institucionais.	
3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCON	12/12/2016	22/12/2016	-			-	0%	Atrasado		
Valor Previsto:						R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	89%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

*Boletim relativo ao PIB e PIB per capita da área de atuação da SUDENE.

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Plano de Ação 2017		Número do Projeto:		PO 25 (ex PO 30)	
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Ano:	2016
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	23/02/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira/Gabriela Isabel
-------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	Gabriela Isabel	16/11/2016	30/11/2016	-	16/11/2016	28/11/2016	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	Gabriela Isabel	16/11/2016	21/11/2016	-	16/11/2016	21/11/2016	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	Gabriela Isabel	21/11/2016	22/11/2016	-	21/11/2016	22/11/2016	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	Gabriela Isabel	22/11/2016	25/11/2016	-	22/11/2016	25/11/2016	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	Gabriela Isabel	25/11/2016	30/11/2016	-	25/11/2016	28/11/2016	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos Indicadores selecionados	Gabriela Isabel	01/12/2016	15/12/2016	-	29/11/2016	14/12/2016	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	Gabriela Isabel	01/12/2016	08/12/2016	-	29/11/2016	07/12/2016	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	Gabriela Isabel	08/12/2017	15/12/2016	-	07/12/2016	14/12/2016	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Boletim sobre Universalização da Educação Básica	Produto 3 - Boletim sobre Universalização da Educação Básica	Gabriela Isabel	01/11/2016	23/02/2016	-	14/12/2016		-	100%	Concluído		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	Gabriela Isabel	16/12/2016	21/01/2017	-	14/12/2016	19/01/2017	-	100%	Concluído	Servidora de férias no período 26/12/2016 a 13/01/2017.	
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	Gabriela Isabel	21/01/2017	25/01/2017	-	19/01/2017	09/02/2017	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Albertina / Fred	25/01/2017	02/02/2017	-	09/02/2017	18/04/2017	-	100%	Concluído	Enviado para validação da Coordenação em 09/02/2017.	
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	Gabriela Isabel	02/02/2017	09/02/2017	-	18/04/2017	16/05/2017	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	09/02/2017	16/02/2017	-	10/08/2017	20/11/2017	-	100%	Concluído		

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	16/02/2017	23/02/2017	-	21/11/2017	23/11/2017	-	100%	Concluído				
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:															
Observações:															

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 26 (ex PO 32)
Objetivo estratégico:	1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido			Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do País		
Finalidade da ação:	Elaborar um painel de indicadores das Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) de modo a verificar as maiores discrepâncias em relação ao benchmarking nacional de forma a subsidiar a diferenciação regional das políticas federais, visando universalizar o acesso aos ativos estratégicos.				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti		
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido				
Projeto:	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Diferenças Regionais				
Objetivo do projeto:	Elaborar um painel de indicadores referentes ao objetivo II - Emprego e renda estabelecidos no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	14/10/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luiz/Lautemyr Canel
-------------------------------------------------	--------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Quadro com metadados dos indicadores	Produto 1 - Elaborar quadro com metadados dos indicadores selecionados	José Luiz	03/10/16	14/10/16	-	03/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
1.1	Selecionar indicadores	Selecionar indicadores	José Luiz	03/10/16	06/10/16	-	03/10/16	06/10/16	-	100%	Concluído		
1.2	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação	José Luiz	07/10/16	07/10/16	-	07/10/16	07/10/16	-	100%	Concluído		
1.3	Elaborar metadados	Elaborar metadados (montar o quadro)	José Luiz	10/10/16	11/10/16	-	10/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
1.4	Apresentar, discutir e validar	Apresentar, discutir e validar junto à Coordenação Geral	José Luiz	11/10/16	14/10/16	-	11/10/16	14/10/16	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Série histórica dos indicadores	Produto 2 - Elaborar série histórica dos indicadores selecionados	José Luiz	17/10/16	28/10/16	-	17/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
2.1	Obtenção dos Dados	Obtenção dos Dados	José Luiz	17/10/16	21/10/16	-	17/10/16	21/10/16	-	100%	Concluído		
2.2	Organização e Tabulação da base de dados	Organização e Tabulação da base de dados	José Luiz	24/10/16	28/10/16	-	24/10/16	28/10/16	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Texto para Discussão - Diferenças Regionais	Produto 3 - Texto para Discussão - Diferenças Regionais	José Luiz	31/10/16	14/10/17	-	01/11/16		-	67%	Atrasado		
3.1	Análise dos indicadores	Análise dos indicadores	José Luiz	31/10/16	10/11/16	-	01/11/16	10/11/16	-	100%	Concluído		
3.2	Redação do texto	Redação do texto (padrão 4 laudas)	José Luiz	11/11/16	16/11/16	-	11/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.3	Validação final	Validação final	Lautemyr / Fred	16/11/16	25/11/16	-	16/11/16	16/11/16	-	100%	Concluído		
3.4	Ajustes no documento	Ajustes no documento	José Luiz	28/11/16	01/12/16	-	17/11/16	17/11/16	-	100%	Concluído		
3.5	Diagramação do Boletim	Diagramação do Boletim	ASCOM	02/10/17	13/10/17	-			-	0%	A Iniciar	Foi recomendado pela coordenação CGEP que o produto fosse reestruturado no formato de textos para discussão. Por isso os prazos foram repactuados.	

3.6	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	Publicação do Boletim no sítio e apresentação à SUDENE	ASCOM	14/10/17	14/10/17	-			-	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	89%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:												
Observações:												
*Boletim relativo à compreensão das diferenças regionais.												

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	2- Universalizar o Acesso a Ativos Estratégicos			Número do Projeto:	PO 27 (ex PO 33)
Objetivo estratégico:	2.2-Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido			Ano:	2013
Programa do PPA:	SDR/MI - 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PLANO DE AÇÃO			Eixo temático (MI):	Garantir Segurança Hídrica
Ação do PPA:				Objetivo estratégico (MI):	Universalizar a oferta de água para diversos usos.
Objetivo da ação:	0614 - Garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade equantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas			Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves			Gestor da subunidade:	-
Problema (causa):	Dificuldade de acesso à água para comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade social				
Projeto:	Programa Água para Todos				
Objetivo do projeto:	Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e para a produção agrícola e alimentar				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	44	40.42	R\$ -	R\$ 43.290.000,00

Previsão de Conclusão:	01/05/2018
Data Atualização:	04/09/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vinicius Medeiros da Silveira / Comissão de Força Tarefa Programa Água para Todos
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 17.238.000,00
A realizar no exercício	R\$ 15.600.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 17.238.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Celebração do Termo de Cooperação	Celebração do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito nº 35	MI - Sudene	01/09/13	26/09/13		01/09/13	02/09/13		100%	Concluído		
2	Celebração do Termo de Compromisso	Celebração do Termo de Compromisso	Sudene - Prefeitura	27/09/13	02/10/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído		
3	Abertura e Ingresso dos Processos	Abertura e Ingresso dos Processos	GTAPT	01/09/13	09/09/13		01/09/13	30/10/13		100%	Concluído		
4	Recebimento de documentação - 1ª Parcela	Recebimento de documentação referente a liberação da primeira parcela	Secretaria/ GTAPT	05/10/13	23/12/13		01/10/13	01/10/13		100%	Concluído		
5	Análise de documentação - 1ª Parcela	Análise de documentação para liberação da primeira parcela	Analistas/ GTAPT	05/01/14	30/01/14		01/11/13	01/12/13		100%	Concluído		
6	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 1ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da primeira parcela	CGPPE/SDR/MI	25/04/14	30/05/14		01/04/14	01/05/14		100%	Concluído	Nove municípios não se habilitaram a efetivação do Termo de Compromisso.	
7	Empenho da 1ª Parcela	Empenho da 1ª Parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14		02/04/14	02/05/14		100%	Concluído	Do total de 111 municípios apenas 102 obtiveram sucesso para empenho.	Nove municípios não foram habilitados para efetivar o Termo de Compromisso.
8	Liberação da 1ª Parcela	Liberação da primeira parcela	Coordenação GTAPT	25/04/14	30/05/14	R\$ 8.658.000,00	01/04/14	01/05/14	R\$ 7.878.000,00	100%	Concluído	Foram emitidas 101 ordens bancárias distribuídas nos três estados da seguinte forma: 49 Piauí, 11 Pernambuco e 41 Paraíba.	Um município do estado do Piauí foi empenhado, mas não se habilitou para o recebimento da primeira parcela.
9	Recebimento de documentação - 2ª parcela	Recebimento de documentação e Projetos referentes a liberação da segunda parcela	Secretaria/ FTAPT	01/03/15	31/07/15		01/03/15	31/07/15		100%	Concluído	A Comissão de Força Tarefa obteve 93 respostas as solicitações de Ofícios.	Os municípios que não responderam ao comunicado oficial foram encaminhados para rescisão unilateral.

10	Análise dos Projetos Básicos	Análise dos Projetos Básicos	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15			100%	Concluído	A quantidade de engenheiros alocados na Comissão de Força Tarefa não é suficiente para analisar todos os projetos básicos em cronograma adequado.	Memorandos enviados ao Gabinete solicitando engenheiros e contador. Memorando DPLAN/FT-PAPT n° 001/2015. Relatório Propositivo de Agosto de 2015. Memorando CGCP n° 01/2016.
11	Análise do Trabalho Social	Análise do Trabalho Social	Analistas Engenharia/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	27/05/16		100%	Concluído	A Força tarefa não dispõem de cientistas sociais ou assistentes sociais para desenvolver a análise junto a SDR/MI do Programa. A fase 6 da meta 1 do trabalho social está ficando sem correspondência para a SDR/MI, que trata do SPS - Sistemas de Programas Sociais.	Os engenheiros estão acumulando a análise do trabalho social. Porém não estão sendo respassados a SDR/MI os dados para alimentar o SPS. Devido a falta de recursos humanos.
12	Análise da Prestação de Contas - 1ª Parcela	Análise da Prestação de Contas da primeira parcela	Analistas Financeiro/ FTAPT	01/08/15	30/11/15		01/08/15	01/02/16		100%	Concluído		
13	Descentralização do limite orçamentário e financeiro 2ª parcela	Descentralização do limite orçamentário e financeiro da segunda parcela	CGPPE/SDR/MI	02/12/15	03/12/15		01/12/15	02/12/15		100%	Concluído	A CGPPE/SDR/MI descentralizou o limite orçamentário na data de 07/12/2015. 50 municípios se encontram empenhados e liquidados. Conforme Portaria MI 173/2015.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito.
14	Empenho da 2ª Parcela	Empenho dos entes beneficiários da 2ª Parcela	CGAF/COC	03/12/15	04/12/15		03/12/15	03/12/15		100%	Concluído	A SUDENE empenhou 50 municípios.	A Comissão de Força Tarefa notificou todos os 102 municípios para retificar suas pendências, porém apenas 50 obtiveram êxito. A SUDENE rescindiu 61 TC's.
15	Liberação da 2ª Parcela	Liberação da segunda parcela	Coordenação da FT/PAPT/NE	01/12/15	01/05/16	R\$ 34.632.000,00	01/12/15		R\$ 9.360.000,00	60%	Atrasado	A previsão de acordo com o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação N° 35/2013 é atender 50 municípios, até a data de hoje com os recursos financeiros descentralizados para a SUDENE, a Comissão de Força Tarefa efetuou a liberação de 30 municípios até o momento.	A SUDENE continua com 17 municípios em Restos a Pagar. Infelizmente, a SUDENE não tem prioridade de gestão para com o Programa Água Para Todos. Logo, o quantitativo de recursos humanos alocados na Comissão de Força Tarefa é insuficiente para toda a demanda de trabalho. O que gerou atraso e poderá ocorrer a não liberação da segunda parcela aos entes beneficiários. Tal situação já foi relatada em relatório gerencial de 2015 e atualmente no relatório de 2017.
16	Execução das Obras	Execução das Obras	Ente Beneficiário	01/02/16	30/09/17		01/02/16			70%	Atrasado	Os municípios que receberam recursos de forma integral (30 municipalidades), em média possuem 70% das obras executadas. Estes municípios tiveram seus TC's prorrogados.	

17	Fiscalização das obras	Fiscalização das obras pela Sudene	Analistas Engenharia/ FTAPT	10/12/15	30/05/17		10/12/15			64%	Atrasado	A Comissão fiscalizou as obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Porém resta a SUDENE fiscalizar 36% dos recursos financeiros liberados na primeira parcela, e voltar a fiscalizar aqueles que ainda não haviam licitado. Logo, a SUDENE deve fiscalizar um montante de R\$2.262.000,00 em aproximadamente 29 municípios, liberados ainda em 2013. Não há engenheiros suficientes que possa fiscalizar com eficiência todas as municipalidades que receberam recursos financeiros da Autarquia, principalmente o recurso financeiro descentralizado as municipalidades para a primeira parcela ainda no ano de 2013 e 2014.	Existem dezoito municípios, que possuem compromisso vigente e receberam a primeira parcela estão também empenhados, faltando fiscalização da 1ª parcela. A Comissão de Força Tarefa, através do Memorando nº 0050/2016-FT_PAPT/NE informou ao Gabinete da SUDENE e a Diretoria de Planejamento. Acompanhou este menorando os dez roteiros de fiscalização necessários para a ação nas municipalidades que possuem seu compromisso vigente com a Autarquia, ou seja, apenas 47 municípios. Infelizmente, não há previsão para a fiscalização dos recursos liberados em 2013 e 2014, nas outras 64 municipalidades, devido a falta de prioridade de gestão da SUDENE para com o Programa Água Para Todos.
18	Recebimento de documentação - Final	Recebimento de documentação para prestação de contas final	Secretaria/ FTAPT	31/03/17	01/05/18		01/03/17			10%	Em Andamento	A SUDENE efetuou a liberação total dos recursos financeiros para 30 municipalidades. Destas recebeu-se atualmente 5 prestações de contas final para análise.	
19	Análise da Prestação de Contas final	Análise da Prestação de Contas final	Analistas Financeiro/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		01/03/17			3%	Em Andamento		
20	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Vistoria para emissão de Laudo Técnico	Analistas Engenharia/ FTAPT	30/05/17	01/05/18		03/04/17			10%	Em Andamento	A Comissão fiscalizou 10% das obras dos 30 municípios que receberam os recursos de forma integral. Com a finalidade para o recebimento de objeto.	
21	Encerramento do PAPT	Encerramento do PAPT	FTAPT	30/07/17	01/05/18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	R\$ 43.290.000,00	Valor realizado:	R\$ 17.238.000,00	77%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:

O Programa Água Para Todos no âmbito desta autarquia encontra-se vinculado a Secretária de Desenvolvimento Regional do MI através da Coordenação Geral de Progrmas e Projetos Especiais, vinculada ao Departamento de Gestão de Progrmas e Desenvolvimento Regional e municípios beneficiados.

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 28 (ex PO 34)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).				
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLISA				
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R\$ 811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 3.065.105.668,00

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira
------------------------------------------------	--------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE, antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leone (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			08/08/08	28/11/08	0,00	08/08/08	24/11/08	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R\$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	Concluído	Aditado no valor de R\$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	Concluído	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	Paralisado	Liberações suspensas por determinação do TCU (Acórdão 67/2017).	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	Paralisado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/01/10	31/05/15	3.876.491.700,00	12/01/10	-	3.065.105.668,00	83%	Paralisado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Paralisado		

17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		3.876.491.700,00				3.065.105.668,00	77,78%	Paralisado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	------------------	--	--	--	------------------	--------	------------	-------------------

Parceiros Institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)./ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).												
Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.												
Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.												
Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.												
Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R\$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.												
Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.												
Obs8: Alteração de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.												
Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.												
Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.												
Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.												
Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto												
Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto												
Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Acórdão 67/2017).												
Obs.15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.												
Obs.15: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	29 (ex PO 35)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2013	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)					
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	29/06/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

29/06/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 1.838.252.335,00
A realizar no exercício	R\$ 120.747.665,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 120.747.665,00
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 1.959.000.000,00

Responsável(él)eis técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
---------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			18/12/12	31/05/13	0,00	18/12/12	24/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Liberção 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R\$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído		
7	Liberção 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R\$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído		
8	Liberção 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R\$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberção 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R\$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído		
10	Liberção 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	145.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R\$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído		
11	Liberção 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	102.080.596,10	31/08/15	28/09/15	R\$ 102.080.596,10	100,00%	Concluído		
12	Liberção 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	33.227.036,00	15/09/15	28/12/15	R\$ 33.227.036,00	100,00%	Concluído		
13	Liberção 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	206.991.566,24	23/12/15	25/01/16	R\$ 206.991.566,24	100,00%	Concluído		
14	Liberção 9	SUDENE/BB	01/06/16	01/07/16	38.027.748,51	14/07/16	21/07/16	R\$ 38.027.748,51	100,00%	Concluído		
15	Liberção 10	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	120.747.665,00	02/12/16	19/01/17	R\$ 120.747.665,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/09/13	31/12/16	1.959.000.000,00	24/10/13	19/01/17	1.959.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

16	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Concluído	
17	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, este encontra-se em análise na SUDENE.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar	

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	R\$ 1.959.000.000,00	Valor realizado:	R\$ 1.959.000.000,00	88,24%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3:	Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4:	Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5:	O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.
Obs.6:	A Auditoria Geral encontrou algumas irregularidades durante os trabalos de auditoria do projeto. A SUDENE questionou a empresa e o agente operador sobre essas situações, já foram tomadas algumas providências, enquanto aguardamos outras respostas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	30 (ex PO 36)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)					
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoeletrica - 290 MW - Candeias/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão:	01/03/2010
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.728.156,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R\$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R\$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Atividades da Unidade (SUDENE)			24/07/08	31/08/11	0,00	24/07/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	Atrasado	O BNB emitiu o certificado, este foi analisado pela SUDENE que encontrou pendências e solicitou a correção.	
Encerramento (Banco)			17/06/14	Não informado	0,00	17/06/14	-	0,00	50%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	61.728.156,00	Valor realizado:	61.728.156,00	85,71%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros Institucionais:									
Observações:									
Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.									

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	31 (ex PO 37)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2008	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR					
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.576.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	30/11/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 42.477.417,63
A realizar no exercício (RAP)	R\$ 11.099.063,37
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 11.099.063,37
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 42.477.417,63

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R\$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R\$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/01/08	05/01/09	0,00	21/01/08	15/08/11	0,00	100%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BNB	13/10/15	12/11/15	42.477.417,63	13/10/15	06/11/15	42.477.417,63	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
6	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/2017	31/05/2017	11.099.063,37	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			01/05/17	31/05/17	53.576.481,00	13/10/15	-	42.477.417,63	50%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Atrasado		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 53.576.481,00			Valor realizado: 42.477.417,63			57,14%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB está pro
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	32 (ex PO 38)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25.2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.700.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/07/14	59.700.000,00	22/05/13	02/02/15	59.700.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		

Resultado Geral do Projeto		Valor Previsto:	59.700.000,00	Valor realizado:	59.700.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:								
Observações:								
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.							
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.							
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.							
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.							
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.							
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.							

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	33 (ex PO 39)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	13/08/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 54.900.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
Liberções e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	31/05/14	54.900.000,00	22/05/13	15/02/16	54.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco										100%	Concluído	
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		54.900.000,00	Valor realizado:		54.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias, concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Antegente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	34 (ex PO 40)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faixa I Geração e Comercialização de Energia Ltda					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Previsão de Conclusão:	20/03/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 63.942.862,59
A realizar no exercício	R\$ 496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 496.137,41
Valor liberado (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ (0,00)
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.439.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído		
8	Liberação2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	496.137,41	10/03/17	20/09/17	496.137,41	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	64.439.000,00	15/05/13	20/09/17	64.439.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.439.000,00	Valor realizado:		64.439.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.											
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	35 (ex PO 41)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faixa II Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	20/03/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 59.435.321,28
A realizar no exercício	R\$ 428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 428.678,72
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ (0,00)
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 59.864.000,00

Responsável(vel) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	428.678,72	10/03/17	20/09/17	428.678,72	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	59.864.000,00	15/05/13	20/09/17	59.864.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		59.864.000,00	Valor realizado:		59.864.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

PLANO DE AÇÃO 2017						
Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	36 (ex PO 42)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faisa III Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25.2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	13/03/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.278.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 429.090,12
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ (0,00)
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 55.707.090,12

Responsáv(e)l(e)s técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	429.090,12	10/03/17	13/09/17	429.090,12	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.278.000,00	15/05/13	13/09/17	55.278.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		

Encerramento (Banco)	Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	55.278.000,00	Valor realizado:	55.278.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto			

Parceiros institucionais:									
Observações:									
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.								
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.								
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.								
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.								
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº								
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.								

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	37 (ex PO 43)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	13/03/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 55.273.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 1.056.552,40
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 56.329.552,40

Responsável(él)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-----------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/17	31/03/17	1.056.552,40	10/03/17	13/09/17	1.056.552,40	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/03/17	55.273.000,00	15/05/13	13/09/17	55.273.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Em Andamento		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		55.273.000,00	Valor realizado:		55.273.000,00	80,00%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	38 (ex PO 44)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA					
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27.3 MW - Trairi/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	11/03/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 64.455.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 64.455.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	05/06/13	0,00	13/07/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberção 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído		
8	Liberção 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	11/09/15	7.133.393,16	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	31/07/14	64.455.000,00	15/05/13	11/09/15	64.455.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		64.455.000,00	Valor realizado:		64.455.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	39 (ex PO 45)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	02/08/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 28.688.696,90
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ 5.211.303,10
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	24/04/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	33.900.000,00	26/12/13	02/02/15	33.900.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		33.900.000,00	Valor realizado:		33.900.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.											
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.											
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CCGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	40 (ex PO 46)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão:	15/08/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/E miliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			13/07/11	07/06/13	0,00	13/07/11	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	01/05/14	50.000.000,00	22/05/13	15/02/16	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	Atrasado	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.
Encerramento (Banco)			-	-	0,00			0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		50.000.000,00	Valor realizado:		50.000.000,00	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.										
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.										
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	41 (ex PO 47)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A				
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Previsão de Conclusão:	12/02/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 49.687.713,17
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 49.687.713,17

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Joema/J. Emerson/A .F. Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	Concluído	O BNB informou que o valor não comprovado (R\$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	49.690.000,03	15/05/13	12/08/14	49.687.713,17	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado	
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		49.690.000,03	Valor realizado:		49.687.713,17	80,00%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.											
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	42 (ex PO 48)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	40.845.410,40	74.945.707,31

Previsão de Conclusão:	01/06/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 40.845.410,40
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 40.845.410,40

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31//05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	5.858.547,44	06/11/15	01/12/15	5.858.547,44	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	14/06/13	40.845.410,40	15/05/13	01/12/15	40.845.410,40	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	

Encerramento (Banco)		Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		40.845.410,40	Valor realizado:		40.845.410,40	80,00%	Atrasado	Status do Projeto
Parceiros institucionais:											
Observações:											
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.										
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.										
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.										
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.										
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.										

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	43 (ex PO 49)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	20/05/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(es) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 29.040.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe: Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	29.040.000,00	15/05/13	20/11/14	29.040.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado mas durante a análise a SUDENE detectou pendências e solicitou a sua correção. Novo certificado foi emitido e novamente foram encontradas pendências e foi solicitada a retificação.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		29.040.000,00	Valor realizado:		29.040.000,00	95,00%	Atrasado	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	--	---------------	------------------	--	---------------	--------	----------	-------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	44 (ex PO 50)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Previsão de Conclusão:	20/05/2015
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 53.959.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Valor liberado no Exercício (LOA)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 53.959.000,00

Responsável(él)eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
----------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			01/09/11	24/04/13	0,00	01/09/11	15/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/02/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			15/05/13	01/05/14	53.959.000,00	15/05/13	20/11/14	53.959.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		

10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		02/09/16	-		50,00%	Em Andamento	O BNB emitiu o certificado mas durante a análise a SUDENE detectou pendências e solicitou a sua correção. Novo certificado foi emitido e novamente foram encontradas pendências e foi solicitada a retificação.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		53.959.000,00	Valor realizado:		53.959.000,00	95,00%	Atrasado	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.												
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.												
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	45 (ex PO 51)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2011	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A					
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	96.407.194,96	174.770.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 96.407.194,96
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 96.407.194,96

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB- Equipe:Daniel/Claudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			23/08/10	07/06/13	0,00	23/08/10	22/05/13	0,00	100%	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	-	-	-	-	-	-		Cancelado	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projeto passou a ser de R\$ 96.407.194,96.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			22/05/13	-	96.407.194,96	22/05/13	-	96.407.194,96	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:	96.407.194,96	Valor realizado:	96.407.194,96	77,78%	Em Andamento	Status do Projeto
----------------------------	--	--	-----------------	---------------	------------------	---------------	--------	--------------	-------------------

Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.											
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.											
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.											
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.											
Obs5:	Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.											
Obs6:	A empresa abriu mão da última parcela do financiamento a que teria direito, BNB e SUDENE aprovaram a solicitação. A participação do FDNE no projetou passou a ser de R\$ 96.407.194,96.											

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	46 (ex PO 52)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP					
Objetivo do projeto:	Implantação de fábrica de Cimento					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 299.869.740,06
A realizar no exercício	R\$ 3.130.259,94
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 3.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 299.869.740,06

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/12/12	21/04/13	0,00	21/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.000.000,00	16/06/16	23/09/16	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/16	31/10/16	3.130.259,94	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	31/10/16	303.000.000,00	19/04/13	-	299.869.740,06	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Atrasado		

9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		303.000.000,00	Valor realizado:		299.869.740,06	72,73%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	47 (ex PO 53)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)					
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 30.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ 206.292.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	11/05/13	0,00	14/12/12	19/04/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/16	30/12/16	13.852.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			19/04/13	30/09/18	270.582.240,00	19/04/13	-	30.000.000,00	12%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Em Andamento		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		

22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		270.582.240,00	Valor realizado:		30.000.000,00	22,73%	Em Andamento	Status do Projeto	
Parceiros institucionais:												
Observações:												
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.												
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.												

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	48 (ex PO 54)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.					
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.					
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	31/12/2016
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 19.539.983,88
A realizar no exercício	R\$ 4.315.058,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação da publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			06/09/12	16/08/13	0,00	06/09/12	20/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	-	-	4.037.814,18	-	-	-	0,00%	A Iniciar	Ver Observação 4.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	-	-	277.243,94	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/06/13	-	23.855.042,00	20/06/13	-	19.539.983,88	60%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									80%	Atrasado		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend.	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		23.855.042,00	Valor realizado:		19.539.983,88	60,00%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Obs4: A SUDENE liberou o montante de R\$ 4.037.814,18 para o Banco do Brasil, conforme pedido de liberação, entretanto o recursos foi devolvido pelo agente operador devido à impossibilidade de liberação à empresa devido à descumprimento de cláusula contratual. Novo pedido de liberação de recursos será realizado, ainda sem data definida. (Posição em 31/05/2016)

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	49 (ex PO 55)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Deten Química S.A.					
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	28/12/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 15.447.600,00
A realizar no exercício	R\$ 15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 15.447.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			05/02/13	26/10/13	0,00	05/02/13	10/09/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberção 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberção 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	-	-	50,00%	Atrasado	Análise da proposta de liberação em andamento. Aguardando manifestação do agente operador sobre as alterações realizadas no projeto.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			10/09/13	01/07/17	31.256.000,00	10/09/13	-	15.447.600,00	83%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									92%	Em Andamento		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		31.256.000,00	Valor realizado:		15.447.600,00	68,75%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	50 (ex PO 56)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.					
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	23/12/2014
Data Atualização:	30/11/2017

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 61.867.350,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/04/13	19/12/13	0,00	26/04/13	27/11/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			27/11/13	01/10/14	61.867.350,00	27/11/13	-	61.867.350,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	Concluído		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, este se encontra em análise na SUDENE.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		61.867.350,00	Valor realizado:		61.867.350,00	83,33%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO	51 (ex PO 57)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social	
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):						
Projeto:	Cone Multicenter Ltda					
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/08/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 177.367.554,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			14/12/12	27/08/13	0,00	14/12/12	28/06/13	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Ver Observação 3.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/06/13	03/03/17	191.238.424,00	02/06/13	-	0,00	11%	Atrasado		
Competência da SUDENE /Banco									56%	Atrasado		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 191.238.424,00			Valor realizado: 0,00			28,57%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: O agente operador sinalizou que o projeto seria reanalisado.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	52 (ex PO 58)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2012	
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):					
Projeto:	Braskem S.A.				
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão:	18/02/2015	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	30/11/2017	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 50.000.000,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício (RAP)	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 50.000.000,00

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/09/13	08/06/14	0,00	03/09/13	12/05/14	0,00	100%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14	-	16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/05/14	31/08/14	50.000.000,00	16/05/14	22/08/14	50.000.000,00	100%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	O BB emitiu o certificado, durante a análise a SUDENE encontrou pendências e solicitou as devidas correções.	
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	75%	Em Andamento		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto: 50.000.000,00			Valor realizado: 50.000.000,00			92,86%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto: PO 53 (ex PO 59)	
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano: 2014	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE			Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).			Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos			Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):					
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)				
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão:	29/06/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 246.506.342,73
A realizar no exercício	R\$ 162.686.329,01
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 169.076.219,79
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 246.506.342,73

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Atividades da Unidade (SUDENE)			03/05/13	20/03/14	0,00	03/05/13	21/02/14	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14	-	21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	88.469.188,84	05/12/16	-	-	75,00%	Atrasado	Aguardando a liberação de recursos por parte do MI.	
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	2.450.627,61	-	-	-	0,00%	Atrasado		
12	Liberação 8	SUDENE/CEF	01/06/17	01/07/17	57.749.083,67	-	-	-	0,00%	Atrasado		
13	Liberação 9	SUDENE/CEF	01/12/17	31/12/17	14.017.428,89	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/CEF	01/12/18	31/12/18	6.389.890,79	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			21/02/14	31/12/18	415.582.562,53	21/02/14	-	246.506.342,73	57,50%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									79%	Em Andamento		
15	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 415.582.562,53	Valor realizado:		R\$ 246.506.342,73	58%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs3:	A empresa solicitou uma alteração de reestruturação societária. A CEF aprovou. A SUDENE está analisando.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	54 (ex PO 61)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2015	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões		
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):					
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.				
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão:	01/11/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ 39.800.940,00
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			29/06/15	03/12/15	0,00	29/06/15	12/11/15	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			16/11/15	31/12/15	39.800.940,00	-	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Atrasado	A SUDENE questionou novamente o BNB em 10/11/2017 quanto à emissão do Certificado de Conclusão do Empreendimento, sob a luz da Resolução da Diretoria Colegiada 285/2017, de 04/10/2017.	
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Atrasado		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Atrasado		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 39.800.940,00	Valor realizado:		R\$ 39.800.940,00	71%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 55 (ex PO 62)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Suzano Papel e Celulose S/A		
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	260.189.953,00	520.379.907,00

Previsão de Conclusão:	27/12/2024
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 223.997.049,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ 260.189.953,00
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 260.189.953,00
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ 260.189.953,00
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Breno (SUDENE/DFIN)	21/10/15	20/11/15	-	21/10/15	18/11/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/02/16	23/06/16	-	23/02/16	22/06/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	27/06/16	27/07/16	-	27/06/16	20/07/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			21/10/15	27/07/16	0,00	21/10/15	20/07/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/07/16	17/11/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	18/11/16	31/12/16	223.997.049,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/17	31/12/17	22.835.614,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/18	31/12/18	13.357.290,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			20/07/16	31/12/18	260.189.953,00	-	-	0,00	25,00%	A Iniciar		
Competência da SUDENE /Banco										63%	Em Andamento	
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 260.189.953,00	Valor realizado:		R\$ -	31%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:	PO	56 (ex PO 63)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:	2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria	
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de	
Objetivo da ação:					
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF	
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler	
Problema (causa):					
Projeto:	Brametal S.A				
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão:	25/03/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Responsáv(e)l(is) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
--------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 4.095.556,81
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 4.095.556,81
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 4.095.556,81

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN)	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			27/08/15	20/08/16	0,00	27/08/15	01/08/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído	Proposta de liberação em análise.	
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			12/08/16	30/09/16	4.095.556,81	-	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	Concluído		
Competência da SUDENE /Banco									100%	Concluído		

6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	Em Andamento		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	Em Andamento		

Resultado Geral do Projeto	Valor Previsto:	R\$ 4.095.556,81	Valor realizado:	R\$ 4.095.556,81	50%	Em Andamento	Status do Projeto
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	--------------------------

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.	

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto:		PO	57 (ex PO 64)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores		Ano:		2016	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE		Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria		
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).		Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de		
Objetivo da ação:						
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos		Subunidade responsável:	DFIN/CGDF		
Diretor:	Sergio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler		
Problema (causa):						
Projeto:	Placas do Brasil S/A					
Objetivo do projeto:	Implantação de uma unidade de fabricação de painéis de madeira reconstituídos (MDF)					

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	162.843.330,73	379.676.211,51

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 32.232.625,39
Saldo a liberar	R\$ 162.843.330,73
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 32.232.625,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia (SUDENE/DFIN)	15/02/16	16/03/16	-	15/02/16	02/03/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/16	09/12/16	-	12/07/16	08/11/16	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	08/11/16	08/12/16	-	08/11/16	23/11/16	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			15/02/16	08/12/16	0,00	15/02/16	23/11/16	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/11/16	27/01/17	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/16	31/12/16	32.232.625,39	05/06/17	10/11/17	32.232.625,39	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/01/18	31/01/18	87.554.736,29	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/18	01/05/18	43.055.969,05	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			28/11/16	01/05/18	162.843.330,73	-	-	32.232.625,39	50,00%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									75%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado	-	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 162.843.330,73	Valor realizado:		R\$ 32.232.625,39	38%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O BB enviou à SUDENE o pedido de liberação, mas este foi negado pois foram encontradas falhas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 58 (ex PO 65)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Pedra Cheirosa I Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	21.526.754,88	148.879.173,69
	280	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 19.478.856,23
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 21.526.754,88
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-	100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento	Contratos SUDENE/BNB e BNB/Empresa em fase de formalização.	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	09/08/17	08/09/17	9.155.604,44	-	-	-	0,00%	Atrasado		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	2.408.536,96	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	5.512.912,37	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.612.903,16	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	788.899,30	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	675.437,49	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	899.694,43	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	472.766,73	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	21.526.754,88	-	-	0,00	5,56%	Em Andamento		
Competência da SUDENE /Banco									53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar		
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 21.526.754,88	Valor realizado:		R\$ -	26%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	PO 59 (ex PO 66)
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial - FDNE	Eixo temático (MI):	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Objetivo estratégico (MI):	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	Subunidade responsável:	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	Gestor da subunidade:	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Pedra Cheirosa II Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Implantação de Parque Eólico de 25,2 MW em Itarema-CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	5	90	17.526.603,45	136.472.576,24
	144	5	90		

Previsão de Conclusão:	30/07/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
-------------------------------------------------	-----------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 16.016.162,83
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ 21.965.302,00
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ 17.526.603,45
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor					
1	Consulta prévia	Raul (SUDENE/DFIN)	26/12/16	25/01/17	-	26/12/16	29/12/16	-		100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BNB	15/02/17	15/07/17	-	15/02/17	20/06/17	-		100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria	SUDENE	10/07/17	09/08/17	-	10/07/17	09/08/17	-		100,00%	Concluído		
Atividades da Unidade (SUDENE)			26/12/16	09/08/17	0,00	26/12/16	09/08/17	0,00	100,00%	Concluído			
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	09/08/17	08/10/17	-	-	-	-	50,00%	Em Andamento		Contratos SUDENE/BNB e BNB/Empresa em fase de formalização.	
1	Liberação 1	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	8.129.804,65	-	-	-	0,00%	Atrasado			
5	Liberação 2	SUDENE/BB	31/07/17	30/08/17	113.892,12	-	-	-	0,00%	Atrasado			
6	Liberação 3	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	1.902.234,82	-	-	-	0,00%	Atrasado			
7	Liberação 4	SUDENE/BB	30/09/17	30/10/17	4.032.350,45	-	-	-	0,00%	Atrasado			
8	Liberação 5	SUDENE/BB	31/10/17	30/11/17	1.217.507,54	-	-	-	0,00%	Atrasado			
9	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	620.373,25	-	-	-	0,00%	Atrasado			
10	Liberação 7	SUDENE/BB	31/12/17	30/01/18	495.565,26	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
11	Liberação 8	SUDENE/BB	31/01/18	02/03/18	618.539,92	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
12	Liberação 9	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	396.335,44	-	-	-	0,00%	A Iniciar			
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			09/08/17	30/03/18	17.526.603,45	-	-	0,00	5,00%	Em Andamento			
Competência da SUDENE /Banco										53%	Em Andamento		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar			
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar			
Encerramento (Banco)			Não informado	Não informado	0,00	-	-	0,00	0,00%	A Iniciar			
Resultado Geral do Projeto			Valor Previsto:		R\$ 17.526.603,45	Valor realizado:		R\$ -	26%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 60 (Ex PO 67)
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de orientações padronizadas e atualizadas para celebração de convênios.		
Projeto:	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)		
Objetivo do projeto:	Padronizar e formalizar os procedimentos para a celebração de Convênios (Checklist)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	21/12/2017
Data Atualização:	05/12/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto
-------------------------------------------------	--------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião Prévia 1 (nívelamento conceitual)	Reunião de compartilhamento de conhecimento entre os servidores que fizeram o curso do SICONV	DPLAN	07/04/2017	07/04/2017		07/04/2017	07/04/2017		100%	Concluído		
2	Formatação de curso de capacitação sobre convênios	Reunião para discussão de formatação de capacitação para convênios.	Carmen-CGGI / DPLAN	10/04/2017	10/04/2017		10/04/2017	10/04/2017		100%	Concluído		
3	Exploração de questões legais atuais e impactos na reformulação das regras adotadas pela SUDENE	Reunião com a PRD sobre adequação de procedimentos internos para convênios e TED	Carmen-CGGI/DPLAN/PRD	18/04/2017	18/04/2017		18/04/2017	18/04/2017		100%	Concluído		
4	Pesquisa e estudo da legislação atual	Estudo e pesquisas da nova legislação para fins de atualização dos procedimentos para convênios e TED	Carmen-CGGI	09/06/2017	10/08/2017		09/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
5	Elaboração de minuta preliminar de Checklist (lista de verificação)	Elaboração da primeira minuta da lista de verificação (checklist) para convênios (balizamento das discussões preliminares)	Carmen-Carmen-CGGI	12/06/2017	10/08/2017		12/06/2017	10/08/2017		100%	Concluído		
6	Análise de consistência e coleta de sugestões para a proposta de lista de verificação pelas áreas técnicas	Análise e coleta de sugestões para a primeira minuta da lista de verificação, com a participação da DPLAN, e elaboração da primeira minuta.	Carmen-CGGI	23/08/2017	13/09/2017		23/08/2017	13/09/2017		100%	Concluído		
7	Elaboração da proposta de Resolução da DC que regulamentará os novos procedimentos para convênios	Atualização da Portaria SUDENE nº 69/2013 que trata dos procedimentos para fiscalização e acompanhamento, e prestação de contas de convênios.	Carmen-CGGI	14/09/2017	28/09/2017		14/09/2017			60%	Atrasado	Demanda da atualização sugerida na reunião para discussão de propostas para o check-list.	
8	Tratativas com a CCONT/DAD	Apresentação da lista de verificações à CCONT/DAD, para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	20/09/2017	20/09/2017		20/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído		

9	Tratativas com a CGAF/DAD	Apresentação à CGAF/COCF/DAD para análise da lista de verificação e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
10	Envio de check list, às áreas envolvidas	Minuta atualizada da lista de verificação (checklist)	Carmen-CGGI	22/09/2017	22/09/2017		22/09/2017	22/09/2017		100%	Concluído		
11	Tratativas com a PRD	Apresentação da lista de verificação à PRD para análise e coleta de sugestões	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
12	Discussão com a AUD	Apresentação da lista de verificação à AUD para análise e coleta de sugestões.	Carmen-CGGI	25/09/2017	25/09/2017		25/09/2017	25/09/2017		100%	Concluído		
13	Envio da minuta de Resolução às áreas envolvidas	Minuta atualizada da Resolução a ser submetida às áreas envolvidas no processo de trabalho.	Carmen-CGGI	29/09/2017	29/09/2017		29/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído		
14	Reunião para apresentação dos resultados, ajustes finais	Fechamento da Lista de verificação e da resolução que substituirá a portaria nº69/2013, e reunião com as unidades finalísticas da DPLAN, bem como a CCONT e a CGAF/DAD	Carmen-CGGI	06/10/2010	06/10/2010		06/10/2010	06/10/2010		100%	Concluído	Sala, data e horário a confirmar.	
15	Análise pela Procuradoria da SUDENE	Envio das minutas para a análise da Procuradoria da Sudene (RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Coordenador-Geral CGGI	09/10/2017	23/10/2017		20/10/2017	27/11/2017		100%	Concluído	Passou mais de um mês para a análise ser concluída pela Procuradoria	
16	Reuniões de discussão do fluxograma simplificado de convênios	atualização do fluxograma vigente (2013)	Carmen-CGGI	29/11/2017	30/11/2017		29/11/2017	30/11/2017		100%	Concluído	Nessa reunião, foi solicitado ajustes (inclusão de todas as fases do processo de transferência voluntária por meio de convênios) e o envio à Dplan para verificação e sugestão	
17	Resolução ajustada	Inclusão de novos artigos que contemple as fases iniciais do trabalho de convênios	Carmen-CGGI	29/11/2017	04/12/2017		29/11/2017	04/12/2017		100%	Concluído		
18	envio à DPLAN da minuta de Resolução	Envio das minutas para a (re)análise da DPLAN RESOLUÇÃO E ANEXOS (Checklist e formulários de análise financeira, de prestação de contas e de Laudo Técnico)).	Carmen-CGGI	04/12/2017	06/12/2017		04/12/2017			50%	Em Andamento		
19	Conclusão do fluxograma	Fluxograma atualizado após sugestões nas reuniões.	Carmen-CGGI	01/12/2017	05/12/2017		01/12/2017	05/12/2017		100%	Concluído		
20	Reanálise pela Procuradoria da SUDENE	Envio da minuta de Resolução com os novos ajustes, em função da solicitação da área técnica (DPLAN)	Coordenador-Geral CGGI	07/12/2017	15/12/2017		07/12/2017			0%	A Iniciar		
21	Apresentação prévia aos Diretores e superintendente, da proposta de Checklist e minuta de Resolução	Apresentação, para fins de conhecimento e futura deliberação na reunião da Diretoria Colegiada, da lista de verificação e da minuta de Resolução .	Coordenador-Geral CGGI	13/12/2017	14/12/2017		13/12/2017			0%	A Iniciar	A Resolução é a atualização da Portaria nº69/2013, baseada na portaria interministerial 424/2016, Juntamente com a Resolução, será aprovado o check list	
22	Aprovação da Resolução e anexos do Checklist, fluxograma na Reunião da Diretoria Colegiada	Aprovação formal em reunião da DC	Superintendente; Diretores; Coordenador-Geral CGGI	17/12/2017	19/12/2017		17/12/2017			0%	A Iniciar	Publicização da Resolução no site da SUDENE e no Boletim Interno de Pessoal	

23	Capacitação	Capacitação promovida pela CGGI, com o apoio da CGGP, junto às unidades que integram o fluxo operacional, para absorção e aplicação dos novos procedimentos.	Coordenador-Geral CGGI	19/12/2017	21/12/2017		19/12/2017			0%	A Iniciar	(CGGI, CGGP/DAD, CCONT/DAD e DPLAN)	
				Valor Previsto:	R\$	-	Valor realizado:	R\$	-	78,7%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
CGDS, CCONT
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 61
Objetivo estratégico:	3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.2 – Modernizar a Gestão.		
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	Fortalecer a Gestão Institucional
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	Desenvolver a Gestão da informação, recursos logístico, orçamentário e financeiro.
Objetivo da ação:	-		
Unidade sup. responsável:	Superintendência da SUDENE	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Resp. pela Unidade Superior:	Marcelo José Almeida das Neves	Gestor da subunidade:	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Inexistência de orientações na forma de "Carta de Serviço ao Usuário" para melhoria do acesso a serviços padronizáveis da SUDENE.		
Projeto:	Elaboração da Carta de Serviços da SUDENE em meio eletrônico.		
Objetivo do projeto:	Elaborar proposta, para o site da SUDENE, de lay-out eletrônico da Carta de Serviço ao Usuário conforme dispõe o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	14/12/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Leonardo Galindo Cavalcanti
-------------------------------------------------	-----------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Reunião para alinhamento conceitual, de providências e desdobramentos	Reunião destinada a calibrar as posições técnicas da CGGI com a ASCOM e CGTI. Nessa reunião será possível discutir desdobramentos em curso, por conta da participação da CGTI nas reuniões técnicas conduzidas pela Casa Civil da Presidência no que concerne à implantação da Plataforma de Cidadania Digital, e da ASCOM, por conta de seu trabalho na reformulação do site da SUDENE até o final de 2017.	Equipes técnicas da CGGI-CGTI e ASCOM	15/09/2017	15/09/2017		25/09/17	25/09/2017		100%	Concluído		
2	Pesquisa de modelos de Cartas de Serviços.	A pesquisa ajuda no refinamento do escopo do trabalho e na escolha do modelo de lay-out.	CGGI	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017	29/09/2017		100%	Concluído	A pesquisa incluiu consultas junto à Escola Nacional de Administração Pública, que estava realizando levantamento, para fins de cadastro, e seleção, de serviços prestados por órgãos da Administração Pública Federal.	
3	Tratativas junto às unidades da OUV, DPLAN e DFIN para coleta de informações.	Nessa fase, após a coleta da contribuição, fazia-se a crítica, o ajuste e a volta à unidade para validação da proposta da carta de serviço da unidade.	CGGI	04/10/2017	23/11/2017		04/10/2017	24/11/2017		100%	Concluído		
4	Elaboração e apresentação interna da proposta eletrônica, com os layouts.	Elaboração da Carta de serviço eletrônica e apresentação, em reunião da CGGI, dos resultados do trabalho para possíveis ajustes.	CGGI e ASCOM	27/11/2017	27/11/2017		27/11/2017	27/11/2017		100%	Concluído		
5	Encaminhamento da proposta à Diretoria Colegiada para apreciação.	Encaminhamento da proposta de lay-out eletrônico da carta de serviço ao usuário para apreciação da Diretoria Colegiada	CGGI	27/11/2017	27/11/2017		27/11/2017	27/11/2017		100%	Concluído		
6	Apresentação em reunião com os Diretores.	-	CGGI e Diretores da DPLAN, DFIN e DAD.	30/11/2017	30/11/2017		12/12/2017	12/12/2017		100%	Concluído	Reunião realizada na sala JK, 14h, dia 12/12/2017, com a presença dos 3 diretores. O Diretor de Administração, Antônio Ribeiro, sugeriu a inclusão da Biblioteca.	Criação do layout da Carta de Serviço eletrônica para a Biblioteca da SUDENE em andamento
7	Alteração da proposta	Alteração da proposta da carta de serviço com as sugestões dadas na reunião da Diretoria Colegiada	CGGI	12/12/2017	18/12/2017		12/12/2017			50%	Em Andamento		

8	Apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada para inserção no Site	Apreciação e deliberação da Diretoria Colegiada ao pedido da CGGI para implantação do lay-out eletrônico da Carta de Serviço ao Usuário, da SUDENE, no site.	Diretoria Colegiada da SUDENE	14/12/2017	19/12/2017		14/12/2017			60%	A Iniciar	Pedido da CGGI encaminhado para a pauta em 27/11/2017.			
9	Entrega dos layouts eletrônicos da Carta de serviço para adequação do site da SUDENE	Entrega dos layouts eletrônicos das Cartas de serviço das unidades Ouvidoria, DEFIN e DPLAN à ASCOM para adequação e inserção no site da SUDENE	ASCOM	19/12/2017	22/12/2017					0%	A Iniciar		A ASCOM irá implantar os lay-outs juntamente com outras modificações previstas para o site.		
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	79%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:														
OUV, DPLAN/CGEP, DFIN/CGDF, DFIN/CGIF, Diretores de Planejamento e Articulação de Políticas, de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e de Administração.														
Observações:														

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 62 (ex PO 74)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI			Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade			Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração			Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro			Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(él) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
------------------------------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo n.º 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/12/2016	30/12/2016	ñ se aplica	15/12/2016	05/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
2	Processo n.º 59335.000469/14-13 (SIAFI n.º 812155), 2ª Análise Financeira complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	12/01/2017	27/01/2017	ñ se aplica	12/01/2017	03/02/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
3	Processo n.º 59335.000357/2013-81 (SIAFI n.º 792551), 2ª Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2017	17/01/2017	ñ se aplica	02/01/2017	16/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo n.º 59335.000357/2013-81 (SIAFI n.º 792551), 3ª Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	17/01/2017	01/02/2017	ñ se aplica	17/01/2017	01/02/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo n.º 59335.000543/14-00 (SIAFI n.º 813986), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/04/2017	16/04/2017	ñ se aplica	01/04/2017	26/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo n.º 59333.000214/04-07 (SIAFI n.º 517207), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	02/01/2017	17/01/2017	ñ se aplica	02/01/2017	24/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
7	Processo n.º 59335.000575/13-16 (SIAFI n.º 794997), Análise Financeira	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/12/2016	04/01/2017	ñ se aplica	20/12/2016	09/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	15/01/2017	30/01/2017	ñ se aplica	15/01/2017	31/01/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo n.º 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/03/2017	04/04/2017	ñ se aplica	20/03/2017	07/04/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
10	Processo n.º 03054.000003/99-74, SIAFI n.º 374633, Análise Financeira	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	19/05/2017	03/06/2017	ñ se aplica	19/05/2017	03/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	23/05/2017	07/06/2017	ñ se aplica	23/05/2017	27/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo n.º 59335.000172/2010-24, SIAFI n.º 737121, Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/06/2017	16/06/2017	ñ se aplica	01/06/2017	21/06/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		

13	Processo n.º 59335.000175/12-20, SIAFI n.º 769473, Análise Financeira Complementar	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/06/2017	16/06/2017	ñ se aplica	01/06/2017	12/07/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo n.º 59335.000094/2014-91 (SIAFI n.º 802415), Análise Financeira Complementar	William Silva (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	01/07/2017	16/07/2017	ñ se aplica	01/07/2017	07/07/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
15	Processo n.º 59335.000533-2014-66 (SIAFI n.º 813665), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	20/09/2017	05/10/2017	ñ se aplica	20/09/2017	20/10/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
16	Processo n.º 59335.000056/2016-09 (SIAFI n.º 828296), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	21/09/2017	06/10/2017	ñ se aplica	21/09/2017	10/10/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
17	Processo n.º 59335.000066/2016-36 (SIAFI n.º 827249), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	26/09/2017	11/10/2017	ñ se aplica	26/09/2017	07/11/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
18	Processo n.º 59335.000116/2012-51 (SIAFI n.º 769782), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	11/10/2017	26/10/2017	ñ se aplica	11/10/2017	20/10/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
19	Processo n.º 59335.000119/2012-95 (SIAFI n.º 770859), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	24/10/2017	08/11/2017	ñ se aplica	24/10/2017		ñ se aplica	60%	em andamento		
25	Processo n.º 59335.000373/2013-74 (SIAFI n.º 794329), Análise Rel Execução	Heber Nunes (CCONT)	25/10/2017	09/11/2017	ñ se aplica	25/10/2017	17/11/2017	ñ se aplica	100%	Concluído		
21	Processo n.º 59335.000543/2014-00 (SIAFI n.º 813986), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/10/2017	09/11/2017	ñ se aplica	25/10/2017		ñ se aplica	50%	paralisado	Análise interrompida, pois foi necessário enviar o processo à Procuradoria para análise de termo aditivo	
22	Processo n.º 59335.000052/2016-12 (SIAFI n.º 827250), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	25/10/2017	09/11/2017	ñ se aplica	25/10/2017		ñ se aplica	50%	paralisado	Análise interrompida, pois foi necessário enviar o processo à Procuradoria para análise de termo aditivo	
23	Processo n.º 59335.000242/2016-30 (SIAFI n.º 838038), Análise Rel Execução	Clovis Emidio (Unidade de Gestão de Conv. e TCE)	13/11/2017	28/11/2017	ñ se aplica	13/11/2017		ñ se aplica	50%	paralisado	Análise interrompida, pois foi necessário enviar o processo à Procuradoria para análise de termo aditivo	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	Valor realizado:		ñ se aplica	-	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais: Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.												
Observações:												
4º ciclo 2017 - Jan/2017 a Nov/2017												

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto:	PO 63 (ex PO 75)
Sub-Obj. estratégico:	3.1.2. Modernizar a gestão			Ano:	2017
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI		Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva	
Ação:	2000 - Administração de Unidade		Objetivo estratégico (MI):	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão	
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração		Subunidade responsável:	CCONT - Comissão Permanente de Convênios e TCE	
Diretor:	Antônio Silva Magalhães Ribeiro		Gestor da subunidade:	William Augusto de Souza	
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.				
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.				
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	ñ se aplica
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(éis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes
-------------------------------------------------	---------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE n.º 59335.000036/2011-15 , Ref. Conv. SIAFI n.º 365625 (Processo n.º 03050.000044/98-38) - Emissão de Relatório de TCE nº 006/2016 (Concluído)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	15/07/2016	11/01/2017	N/A	15/07/2016	17/01/2017	N/A	100%	Concluído		
2	Processo TCE n.º 59335.000708/2010-0, Ref. Conv. SIAFI n.º 368125 (Processo n.º 03055.000074/98-40) - Emissão de Relatório de TCE nº 001 /2017 (Concluído)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	15/02/2017	14/08/2017	N/A	15/02/2017	31/03/2017	N/A	100%	Concluído		
3	Processo TCE n.º 59335.000397/2009-47, Ref. Conv. SIAFI n.º 311214 (Processo n.º 06270.000001/96-94) - Emissão de Relatório de TCE nº 002 /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	01/02/2017	31/07/2017	n/A	01/02/2017	21/11/2017	N/A	100%	Concluído		
4	Processo TCE n.º 59335.000717/2010-00, Ref. Conv. SIAFI n.º 335319 (Processo n.º 03057.000010/97-01) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/07/2015	31/03/2018	N/A	06/07/2015		N/A	66%	Em Andamento	Tce teve de ser reagendada pois é necessário emitir nova análise financeira	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
5	Processo TCE n.º 59335.000209/2011-03 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406570 (Processo n.º 59313.000112/2000-98) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	06/04/2016	31/03/2018	N/A	06/04/2016		N/A	66%	Em Andamento	TCE foi reagendada pois potencial responsável solicitou mais prazo	Próximo P.O. as pendências deverão estar saneadas
6	Processo TCE n.º 59335.000358/2010-83, Ref. Conv. SIAFI n.º 383709 (Processo n.º 03045.000058/99-75) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/02/2017	19/08/2017	N/A	20/02/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
7	Processo TCE n.º 59335.000411/2010-46 , Ref. Conv. SIAFI n.º 135790 (Processo n.º 06270.000009/95-15) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	20/03/2017	16/09/2017	N/A	20/03/2017		N/A	66%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
8	Processo TCE n.º 59335.000019/2011-88 , Ref. Conv. SIAFI n.º 406567 (Processo n.º 59313.000123/00-78) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	24/03/2017	20/09/2017	N/A	24/03/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
9	Processo TCE n.º 59335.000160/2011-80, Ref. Conv. SIAFI n.º 338502 (Processo n.º 03055.000046/97-23) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	30/09/2017	N/A	03/04/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	

10	Processo TCE n.º 59335.000419/2009-79, Ref. Conv. SIAFI n.º 368683 (Processo n.º 03055000093/98-96) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Rivaldo Souza, Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2017	30/09/2017	N/A	03/04/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de notificação dos potenciais responsáveis	
11	Processo TCE n.º 59335.000220/2012-46, Ref. Conv. SIAFI n.º 348977 (Processo n.º 03055.0000018/98-79) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/05/2017	14/11/2017	N/A	18/05/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
12	Processo TCE n.º 59335.000114/2008-86, Ref. Conv. SIAFI n.º 384176 (Processo n.º 03045.000094/99-39) - Emissão de Relatório de TCE nº /2017 (em elaboração)	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	18/08/2017	14/02/2018	N/A	18/08/2017		N/A	33%	Em Andamento	TCE em fase de elaboração preliminar, visando notificação	
			Valor Previsto:	ñ se aplica	Valor realizado:	ñ se aplica	-	Em Andamento	Status do Projeto			

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Plano de Ação 2017			
Diretriz estratégica: 3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE			Número do Projeto: PO 64 (ex PO 76)
Objetivo estratégico: 3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências			Ano: 2017
Sub-objetivo: 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.			
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de desenvolver competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Desenvolvimento por Competências		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências organizacionais e individuais, como parte do Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		R\$ 300.000,00

Previsão de Conclusão:	29/12/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Marina Braga
-------------------------------------------------	---------------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 300.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 163.326,40
Saldo a liberar	R\$ 136.673,60
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ 163.326,40

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Revisão do Plano	Revisão do Plano "Desenvolvimento por Competências"	CGGP e Facilitador	16/01/17	31/03/17		16/01/17	30/03/17		100%	Concluído		
2	Adequação do Plano	Reajustes do Plano às necessidades das Unidades Administrativas	CGGP e Unidades Administrativas	03/04/17	20/04/17		03/04/17	18/04/17		100%	Concluído		
3	Validação	Apresentação e validação do Plano pelo Comitê de Gestão de Pessoas	CGGP e Comitê	24/04/17	05/05/17		24/04/17	09/05/17		100%	Concluído		
4	Projetos Básicos	Elaboração de Projetos Básicos referentes às capacitações	CGGP	08/05/17	31/05/17		09/05/17	29/05/17		100%	Concluído		
5	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para realização das ações de capacitação constantes no Plano e casos excepcionais	CGGP	13/03/17	05/12/17	R\$ 241.611,66	13/03/17		R\$ 104.938,06	70%	Em Andamento	Datas Repactuadas	
6	TED CENTRESAF/PE	Programa de Capacitação dos Servidores da SUDENE em Diversos Cursos na Modalidade "In Company", de acordo com o Plano de Trabalho constante do processo nº 59335.000107/2017-15	CGGP	26/09/17	31/12/17	R\$ 58.388,34	26/09/17		R\$ 58.388,34	100%	Em Andamento		
7	Realização de capacitações	Realização de ações de capacitações nas diversas modalidades	CGGP e parceiros	20/03/17	29/12/17		20/03/17			70%	Em Andamento		
				Valor Previsto:		R\$ 300.000,00	Valor realizado:		R\$ 163.326,40	91%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

CENTRESAF/PE -ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Observações:

ASSINATURA DE TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS ENTRE A SUDENE E A CENTRESAF/PE - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. PUBLICADO EM DOU DE 28/09/2017

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Número do Projeto:	PO 65 (ex PO 77)
Objetivo estratégico:	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Ano:	2017
Sub-objetivo:	3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.		
Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	Eixo temático (MI):	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	Objetivo estratégico (MI):	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	Antonio Silva Magalhães Ribeiro	Gestor da subunidade:	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Avaliação de Competências		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00		100.000,00

Previsão de Conclusão:	28/12/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Marlene Franklin e Marina Braga
-------------------------------------------------	---------------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 100.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ 7.650,00
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R\$ 7.650,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Estudos sobre avaliação de competências	Estudos sobre o tema e Participação em eventos de capacitação sobre avaliação de competências	CGGP	01/06/17	31/01/18	R\$ 10.000,00	01/06/17		R\$ 7.650,00	50%	Em Andamento	Participação no 20º CRIARH - Criatividade e Gestão com Pessoas	Datas repactuadas
2	Projeto Básico	Elaboração de Projeto Básico para contratação de facilitador	CGGP	11/09/17	30/09/17		08/06/17	24/08/17		100%	Concluído		
3	Formação e Capacitação de Grupos de Trabalho	Capacitação dos membros do Grupo no tema Avaliação de desempenho por competências. Socialização e discussão do tema	CGGP e Unidades Administrativas	05/02/18	23/03/18	R\$ 20.000,00				0%	A Iniciar		
4	Contratação	Contratação de empresas/facilitadores para elaboração de instrumento de avaliação	CGGP	02/04/18	20/06/18	R\$ 70.000,00				0%	A Iniciar		
5	Elaboração de instrumentos avaliativos	Elaboração de instrumentos de avaliação de competências	CGGP/ Unidades Administrativas e facilitador	09/07/18	28/12/18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 100.000,00	Valor realizado:		R\$ 7.650,00	30%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	CENTRESAF/PE - Escola de Administração Fazendária
Observações:	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO 20º CRIARH EM SETEMBRO/2017 - ETAPA 1

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira
Exercício 2017
(Posição até novembro)

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2017

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS (a)	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2018	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	15.255.994,00	10.357.187,00	9.345.064,00	67,89	90,23	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	400.000,00	250.000,00	230.000,00	62,50	92,00	Servidor capacitado	199		0,00		
04	122	2111	216H/0020	A	1	140.204,00	140.204,00	100.630,00	100,00	71,77						
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	452.696,00	373.607,62	373.607,62	82,53	100,00	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001		1	56.052,00	46.240,05	46.240,05	82,49	100,00	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	169.112,00	150.138,86	150.138,86	88,78	100,00	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.240.056,00	1.131.758,72	1.131.758,72	91,27	100,00	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	22.044,00	2.569,07	2.569,07	11,65	100,00	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	4.430.535,00	3.697.546,40	3.697.546,40	83,46	100,00	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	30.388.646,00	27.400.830,00	27.400.830,00	90,17	100,00	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI						Total	52.555.339,00	43.550.081,72	42.478.384,72	82,87	97,54	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.966.312,00	2.694.785,00	2.694.785,00	1.002.090,00	100,00	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União						Total	2.966.312,00	2.694.785,00	2.694.785,00	90,85	100,00	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	707.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	319.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	608	2029	214S/0001	A	1	18.166.853,00	18.166.853,00	18.166.853,00	100,00	100,00	Iniciativa apoiada					
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1				0,00	não inf.	Avaliação Realizada			não inf.	-	
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	1.357.889,00	709.382,00	709.382,00	52,24	100,00	Plano Elaborado			não inf.		
04	127	2029	20WQ/PO006	A	1	500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/0023	A	1	39.826.351,00	8.974.354,79	6.448.855,00	22,53	71,86	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0024	A	1						Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/0029	A	1						Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/2089	A	1						Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/7216	A	1						Arranjo produtivo local apoiado					
04	608	2029	214S/0001	A	1	600.000,00			0,00	não inf.	Iniciativa apoiada					
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária						Total	63.197.006,00	28.150.589,79	25.625.090,00	44,54	0,00					
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres						Total	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	não inf.	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Posição: 30/11/2017 - SIAFI

Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III

Planos Operativos tabulados segundo

Diretrizes e Objetivos Estratégicos da

SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitaria no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
12	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Reúso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
15	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLISA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
16	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
17	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
18	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
19	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
20	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
21	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
22	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
23	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
24	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
25	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faixa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
26	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
27	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
28	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
29	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
30	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
31	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
32	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
33	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
34	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
35	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
36	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
37	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
38	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
39	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
40	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
41	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
42	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
43	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
44	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 32.232.625,39	20%
45	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
46	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
Total do Objetivo 1.1								8.581.612.629,67	6.701.007.760,48	78%
47	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
48	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste 2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
51	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
52	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Diferenças Regionais	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total do Objetivo 1.4								R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
55	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
Total do Objetivo 1.5								234.105,49	234.105,49	100%
TOTAL DA DIRETRIZ 1								8.581.846.735,16	6.701.241.865,97	78%
56	27	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
Total do Objetivo 2.2								43.290.000,00	17.238.000,00	40%
57	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
58	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
Total do Objetivo 2.3								989.482,50	724.241,25	73%
TOTAL DA DIRETRIZ 2								44.279.482,50	17.962.241,25	41%
59	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
60	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração da Carta de Serviços da SUDENE em meio eletrônico.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
62	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 163.326,40	54%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
64	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 7.650,00	8%
		Total do Objetivo 3.1						400.000,00	170.976,40	43%
		TOTAL DA DIRETRIZ 3						400.000,00	170.976,40	43%
65	16	4. Fortalecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Total do Objetivo 4.2						0,00	0,00	0%
		TOTAL DA DIRETRIZ 4						0,00	0,00	0%
		TOTAL GERAL						8.626.526.217,66	6.719.375.083,62	77,9%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 4º Ciclo 2017

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2017

ANEXO IV
Planos Operativos tabulados segundo a
Programação do PPA

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
2	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
3	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
4	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
5	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
6	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
7	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
8	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
9	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
10	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%
11	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
12	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
13	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
14	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
15	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
16	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicattec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
17	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
18	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
19	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
20	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%
21	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
22	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
23	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
24	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
25	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
26	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
27	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
28	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
29	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%
30	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 32.232.625,39	20%
31	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
32	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
P 2029 - Ação 0355								8.575.474.504,82	6.695.419.699,03	78%
33	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
34	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
P 2029 - Ação 20N7								1.114.585,70	977.151,42	88%
35	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
P 2029 - Ação 4640								1.069.868,00	764.868,00	71%
36	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
37	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
P 2029 - Ação 8689								989.482,50	724.241,25	73%
38	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
39	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
40	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
41	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%
42	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
43	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
44	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
45	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investidores estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
P 2029 - Ação 8902								3.231.234,02	3.223.792,81	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
46	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
P 2029 - Ação 8917								207.542,62	107.354,71	52%
47	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%
48	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
49	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
50	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
51	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
52	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Emprego	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
53	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Rendimento	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
54	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
55	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007 - Diferenças Regionais	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
P 2029 - Ação 20WQ								749.000,00	749.000,00	100%
Total do Programa 2029								8.582.836.217,66	6.701.966.107,22	78%
56	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
57	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
58	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 163.326,40	54%
59	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 7.650,00	8%
P 2111 - Ação 2000								400.000,00	170.976,40	43%
Total do Programa 2111								400.000,00	170.976,40	43%
60	27	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
Total do Programa 2069								43.290.000,00	17.238.000,00	40%
61	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Réuso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
62	16	4. Fortalecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido regional	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
63	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
64	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
65	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração da Carta de Serviços da SUDENE em meio eletrônico.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total das Ações Internas/ Não se aplicam								0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL								8.626.526.217,66	6.719.375.083,62	77,9%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Referência dos dados: 4º Ciclo 2017

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2017

ANEXO V

Planos Operativos tabulados segundo

Unidades Administrativas da SUDENE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 234.105,49	R\$ 234.105,49	100%
2	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 530.482,50	R\$ 265.241,25	50%
3	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 485.874,65	R\$ 485.874,65	100%
4	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R\$ 207.542,62	R\$ 107.354,71	52%
5	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 359.682,64	R\$ 359.682,64	100%
6	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R\$ 343.585,70	R\$ 206.151,42	60%
7	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais	Em Andamento	R\$ 771.000,00	R\$ 771.000,00	100%
8	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres* - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R\$ 1.069.868,00	R\$ 764.868,00	71%
9	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R\$ 852.088,92	R\$ 852.088,92	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
10	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	100%
11	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 292.558,79	98%
12	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Anteprojeto da Área de Ensaios do CER-UFPE para Aerogeradores de Pequena e Média Potência Visando a Geração Distribuída	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 277.371,58	R\$ 277.371,58	100%
13	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estudo das Características de Geração de Células Orgânicas e Módulos Fabricados no Brasil	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R\$ 322.110,74	R\$ 322.110,74	100%
14	14	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R\$ 459.000,00	R\$ 459.000,00	100%
15	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	"Café com Sustentabilidade" : "Reuso de água como estratégia de convivência com o Semiárido"	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
16	16	4. Fortalecer a Imagem da Sudene	4.2 Elevar os colegiados da Sudene a um patamar de forum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional	Estudo comparativo das Cisternas de Captação de água para Consumo Humano no Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
17	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª REUNIÃO TÉCNICA DE ARTICULAÇÃO DA REDE PALMA	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGDS								6.612.712,84	5.797.408,19	88%
18	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Inventário das plantas medicinais e seus usos pelas comunidades do entorno do PARNA do Catimbau e Refúgio Tatu Bola, em Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Em Andamento	R\$ 749.000,00	R\$ 749.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Produto 1 - estudo da política de Dados Abertos do Governo federal	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
20	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo III estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
21	21	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VI estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
22	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente aos fluxos migratórios no Nordeste -2000-2010	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
23	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
24	24	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo II, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
25	25	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo VII - Universalização dos níveis de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
26	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Painel de indicadores referente ao objetivo I, estabelecido no § 1º do Art. 14 da Lei Complementar 125 de 03/01/2007	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Atrasado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGEP								749.000,00	749.000,00	100%
27	27	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o semiárido	Programa Água para Todos	2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	Em Andamento	R\$ 43.290.000,00	R\$ 17.238.000,00	40%
TOTAL CGCP								43.290.000,00	17.238.000,00	
TOTAL DPLAN								50.651.712,84	23.784.408,19	47%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
28	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R\$ 3.876.491.700,00	R\$ 3.065.105.668,00	79%
29	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 1.959.000.000,00	R\$ 1.959.000.000,00	100%
30	30	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.728.156,00	R\$ 61.728.156,00	100%
31	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 53.576.481,00	R\$ 42.477.417,63	79%
32	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.700.000,00	R\$ 59.700.000,00	100%
33	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 54.900.000,00	R\$ 54.900.000,00	100%
34	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.439.000,00	R\$ 64.439.000,00	100%
35	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 59.864.000,00	R\$ 59.864.000,00	100%
36	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.278.000,00	R\$ 55.278.000,00	100%
37	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísas IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 55.273.000,00	R\$ 55.273.000,00	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
38	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísia V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 64.455.000,00	R\$ 64.455.000,00	100%
39	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icarai Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 33.900.000,00	R\$ 33.900.000,00	100%
40	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
41	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 49.690.000,03	R\$ 49.687.713,17	99,995%
42	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 40.845.410,40	R\$ 40.845.410,40	100%
43	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 29.040.000,00	R\$ 29.040.000,00	100%
44	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 53.959.000,00	R\$ 53.959.000,00	100%
45	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 99.970.000,00	R\$ 96.407.194,96	96%
46	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 303.000.000,00	R\$ 299.869.740,06	99%
47	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 270.582.240,00	R\$ 30.000.000,00	11%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
48	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 23.855.042,00	R\$ 19.539.983,88	82%
49	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 31.256.000,00	R\$ 15.447.600,00	49%
50	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 61.867.350,00	R\$ 61.867.350,00	100%
51	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R\$ 191.238.424,00	R\$ 0,00	0%
52	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	100%
53	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 415.582.562,52	R\$ 246.506.342,73	59%
54	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotiva PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 39.800.940,00	R\$ 39.800.940,00	100%
55	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Suzano Papel e Celulose S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 260.189.953,00	R\$ 0,00	0%
56	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R\$ 4.095.556,81	R\$ 4.095.556,81	100%

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 4º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2017, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
57	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Placas do Brasil S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 162.843.330,73	R\$ 32.232.625,39	20%
58	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa I Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 21.526.754,88	R\$ 0,00	0%
59	59	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os investimentos estruturadores	Pedra Cheirosa II Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional e Territorial	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R\$ 17.526.603,45	R\$ 0,00	0%
TOTAL DFIN								8.575.474.504,82	6.695.419.699,03	78%
60	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização dos procedimentos internos para repasses de recursos (Checklist de procedimentos)	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
61	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Elaboração da Carta de Serviços da SUDENE em meio eletrônico.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CGGI								0,00	0,00	
62	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
63	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
TOTAL CCONT								0,00	0,00	0%
64	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 300.000,00	R\$ 163.326,40	54%
65	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Avaliação por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R\$ 100.000,00	R\$ 7.650,00	8%
TOTAL CGGP								400.000,00	170.976,40	43%
TOTAL DAD								400.000,00	170.976,40	43%
TOTAL GERAL								8.626.526.217,66	6.719.375.083,62	77,9%

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 4º Ciclo 2017

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: 30/11/2017

ANEXO VI
Planos Operativos prioritários,
relacionados na Resolução nº 281/2017, da
Diretoria Colegiada da SUDENE

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

1 – Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores			Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria		
Ação:	Ação 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.		
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste				
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas		
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	José Farias Gomes Filho		
Problema (causa):	Elevado número de focos de extrema pobreza e degradação ambiental, falta de competitividade de amplas porções da área de atuação da Sudene, baixos índices de educação e saúde e a falta de estrutura do setor público para as demandas das demandas dos cidadãos.				
Projeto:	Elaboração do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (área de atuação da SUDENE)				
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações da área de Atuação da SUDENE				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 1.140.376,40	

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Outros atores		TOTAL		
R\$ 1.140.376,40	0,00		R\$ 1.140.376,40	Pago até o ano anterior	R\$ -
				A realizar no exercício	R\$ -
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 300.000,00
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 300.000,00
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 300.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	31/05/2019
Data Atualização:	05/12/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Termo de Referência para realização do PRDNE	Elaboração de Termo de Referência para realização do PRDNE	SUDENE/DPLAN/C GCP	19/06/2017	31/07/2017		19/06/2017	31/07/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o PNUD	Elaboração de acordo de cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, intitulado "Desenvolvimento Regional na área de atuação da SUDENE", que inclui diversas atividades, entre elas apoio à elaboração do PRDNE.	SUDENE DPLAN/CGCP	01/08/2017	29/09/2017		01/08/2017	15/09/2017		100%	Concluído		
3	Aprovação do ACT pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, do Ministério da Relações Exteriores	Submissão do ACT (denominado de Prodoc - 017/2019) a ABC ; Envio do ACT preliminar para a Procuradoria da SUDENE	SUDENE DPLAN/CGCP	11/09/2017	29/09/2017		11/09/2017	20/09/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de assinatura do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Ajustes finais para celebração	Articulação PNUD, ABC e Procuradoria SUDENE. Realização (análise) dos ajustes sugeridos pela ABC e do Parecer da Procuradoria da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	18/09/2017	22/09/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Procedendo os ajustes referendados pelas instituições participantes	

5	Assinatura do ACT pela ABC	Assinatura e evento para firmar Acordo de cooperação Técnica (ACT) SUDENE e PNUD	SUDENE DPLAN/CGCP	20/10/2017	20/11/2017		20/10/2017	20/11/2017		100%	Concluído	Acordo aprovado e assinado	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência	Elaboração de documento com detalhamento e especificação dos produtos esperados, e sua orçamentação, visando a contratação dos serviços de consultoria de apoio à elaboração do PRDNE	SUDENE/GAB, SUDENE/CGCP e PNUD	21/11/2017	12/01/2018		20/11/2017			20%	Em Andamento	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Aguardando processo de liberação de recursos para o PNUD.	
7	Realização do processo licitatório	Objetivo é a contratação de empresa com ênfase em mobilização de lideranças (incluindo comunidades), definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	15/01/2018	28/02/2018					0%	A Iniciar		
8	Contração de serviços de Apoio à realização do Plano	Contratação de serviço de apoio às atividade do plano como os de logística, organização de evento e de infraestrutura física (audio, estrutura e espaço físico).	SUDENE e PNUD	01/03/2018	22/03/2018					0%	A Iniciar		
9	Constituição do Comitê Técnico de Acompanhamento da realização do PRDNE	Eleaboração de documento com atribuições do Comitê. Realização da primeira reunião deste Comitê.	SUDENE/GAB. SUDENE/DPLAN/C GCP	05/02/2018	28/02/2018					0%	A Iniciar		
10	Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma	1 Reunião do Comitê Regional de Apoio ao PRDNE (CRNE)	SUDENE, PNUD, Consultoria Contratada	01/03/2018	13/04/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
11	Aprovação do Projeto tecnico	Confecção do Plano de trabalho, metodologia e diretrizes do plano	SUDENE/DPLAN/C GCP	16/04/2018	30/04/2018	R\$ 85.528,23				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE.	
12	Realização da primeira etapa do PRDNE	Produto 1: Diagnóstico e análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e interligações com a área de atuação da SUDENE. Análise e absorção das principais linhas estratégicas dos Planos Estaduais e Municipais existentes. Compatibilização com as diretrizes para o Desenvolvimento Regionoal. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/05/2018	30/06/2018	R\$ 199.565,87				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
13	Realização da segunda etapa do PRDNE	Produto 2: Visão Geral do desenvolvimento regional à partir da construção das Agendas para o Desenvolvimento Regional. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	28/09/2018	R\$ 285.094,10				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
14	Realização da terceira etapa do PRDNE	Produto 3: PRDNE em versão preliminar discutido e aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano, com orçamentação das ações consubstanciadas nas Agendas do Desenvolvimento Regional (ADRs). Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela .	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/10/2018	30/11/2018	R\$ 342.112,92				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	
15	Realização da quarta etapa do PRDNE	Produto 4: PRDNE em versão final aprovado pelos parceiros. Estruturação de projeto de Lei para encaminhamento ao Congresso Nacional. Autorização da SUDENE para Liberação da 5ª parcela.	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	03/12/2018	30/01/2019	R\$ 228.075,28				0%	A Iniciar	Acompanhamento das atividades do Plano em conjunto com o Comitê Técnico Regional de Apoio ao PRDNE	

15	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer Final de Acompanhamento - PFA envolvendo todas as etapas do processo. Aprovação do PRDNE e sua proposta de Lei pelo CONDEL	SUDENE/GAB, SUDENE/DPLAN/C GCP	31/01/2019	28/02/2019					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
16	Constituição do Comitê de Acompanhamento da execução do PRDNE	Constituição em conjunto com os Estados e demais atores sociais da área de atuação da SUDENE	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	11/03/2019	31/05/2019					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.140.376,40	Valor realizado:		R\$ 0,00	31%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.												
Observações:												
(1) conforme nota de empenho n. 2017NE000549 de 20/11/2017 (pag. 38; Processo CGCP N. 59335000240/2017-21 - Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE)												
Fonte: DPLAN/CGCP												

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

2 – Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Feira de Santana



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	Ação 20WQ - Plano Orçamentário 004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	José Farias Gomes Filho
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana		
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	280	Custeio		R\$ 709.382,21	

Cronograma de Desembolso (1)				Valores Orçamentários/ Financeiros	
SUDENE	Feira de Santana		TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 709.382,21	R\$ 0,00		R\$ 709.382,21	A realizar no exercício	
				Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R\$ 709.382,21
				Valor Empenhado no Exercício (1)	R\$ 709.382,21
				Valor liberado no Exercício	
				Saldo a liberar	R\$ 709.382,21
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Previsão de Conclusão:	30/08/2018
Data Atualização:	05/12/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Protocolo de Intenções	Comunicação Oficial da Prefeitura de Feira de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de intenções para elaboração do plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA e Municípios do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017			02/02/2017	09/02/2017		100%	Concluído		

3	Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolvimento de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutura urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, além de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017		100%	Concluído	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD.	
4	Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017		100%	Concluído		
5	Pré Diagnóstico Básico Municipal	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017		100%	Concluído	Em análise	
6	Elaboração e aprovação do Termo de referência.	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsídio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017		20%	Em Andamento	Aguardando procedimentos e tratativas de aprovação do acordo de cooperação SUDENE/PNUD. Acordo aprovado e assinado em 20/11/2017	
7	Realização do processo licitatório	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realização de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	18/12/2017	26/01/2018					0%	A Iniciar	Processo ainda não iniciado devido à dependência de atividades anteriores	
8	Contratação de serviços especializados para elaboração do Plano	Objeto contratação de serviço de apoio às atividades do plano.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/02/2018					0%	A Iniciar	Montagem do Comitê Local de Acompanhamento do Plano (CLA)	
9	Apresentação do projeto técnico da Consultoria e ajuste do cronograma	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	05/02/2018	20/02/2018					0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
10	Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP	21/02/2018	23/02/2018	R\$ 141.876,44				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
11	Realização da primeira do PDE de Feira de Santana	Produto 1: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	26/02/2018	26/03/2018	R\$ 141.876,44				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	

12	Realização da segunda do PDE de Feira de Santana	Produto 2: PDE de Feira de Santana - BA construído em 1ª versão, em conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	27/03/2018	29/06/2018	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
13	Realização da terceira do PDE de Feira de Santana	Produto 3: PDE aprovado pelos parceiros. Versão final do Plano Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/C GCP, PNUD e Consultoria Contratada	01/07/2018	31/07/2018	R\$ 212.814,66				0%	A Iniciar	Acompanhamento do Plano em conjunto com o Comitê Local	
14	Parecer final de aprovação do Plano	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/C GCP	01/08/2018	20/08/2018					0%	A Iniciar	Documento com participação de todos integrantes da equipe CGCP	
15	Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada, com apoio da SUDENE/CGCP. Comitê local do Plano	21/08/2018	30/08/2018					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 709.382,21	Valor realizado:		R\$ 0,00	35%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:	
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.	
Observações:	
(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)	
(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.	
(3) Nesta data a CGCP ainda não esta estruturada para a recepção dos trabalhos de planos e de articulação vinculados aos Planos sub e meso regionais. Esta atribuição, em anos anteriores, (inclusive com articulações diversas) foi cumprida pelas CGDS e CGEP.	
(4) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo.	

Fonte: DPLAN/CGCP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

**3 – Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil
e com a CNI, bem como a execução de seus planos de trabalho**



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

PLANO DE AÇÃO 2017					
Diretriz estratégica:	1.Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	3.1
Objetivo estratégico:	1.3.Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A			Eixo temático (MI):	N/A
Ação do PPA:	N/A			Objetivo estratégico (MI):	N/A
Objetivo da ação:	N/A				
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento			Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva			Gestor da subunidade:	Antônio Roberto Cavalcanti
Problema (causa):	N/A				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a APEX-Brasil				
Objetivo do projeto:	Promover a atração de Investimento Estrangeiros Diretos, a promoção de exportações e a internacionalização de empresas na Região Nordeste				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	01/12/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior
-------------------------------------------------	----------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/16	30/04/17	R\$ -	01/08/17	30/04/17	-	100%	Concluído		
2	Assinatura	Assinatura	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/05/17	30/05/17	R\$ -	02/05/17	30/05/17	-	100%	Concluído		
3	Comunicação	Elaboração de material institucional bilíngue para divulgação	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/08/17	01/11/17	R\$ -	01/10/17		-	90%	Atrasado	Falta validar com a APEX o material	Tendo em vista que o material será utilizado para no âmbito da ação 5, o cronograma foi revisado.
4	Articulação Institucional	Divulgação da Apex-BR no Nordeste e dos Instrumentos ofertados pela Sudene nos Estados	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/07/17	01/12/17	R\$ -	14/07/17	17/11/17	-	100%	Concluído		
5	Inteligência de Mercado	Mapeamento/Identificação de empresas interessadas em investir/expandir investimentos no Nordeste	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/12/18	R\$ -	01/11/17		-	20%	Em Andamento	As empresas serão acionadas após a conclusão do plano regional de atração de investimentos	
6	Promoção de exportações	Mapeamento/Identificação de empresas com potencial exportador	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/10/17	01/06/18	R\$ -	01/11/17		-	30%	Em Andamento	Lista de empresas incentivadas pela Sudene foi encaminhada em outubro. O próximo passo é articular no âmbito das instituições parceiras do Roadshow (Federações e BNB)	
7	Ofertas Customizadas	Promoção direcionadas de setores estratégicos e formulação de prioridades setoriais de financiamento	Ademir Vilaça e Claudia Silva	01/09/17	01/12/18	R\$ -	01/10/17		-	30%	Em Andamento	As secretarias estaduais foram contactadas. O próximo passo é sistematizar as prioridades e formar um plano regional de atração de investimentos	
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	67%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

APEX-BR

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste			Número do Projeto:	PO 3.2
Objetivo estratégico:	1.3. Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes			Ano:	2017
Programa do PPA:	N/A		Eixo temático (MI):	N/A	
Ação do PPA:	N/A		Objetivo estratégico (MI):	N/A	
Objetivo da ação:	N/A				
Diretoria responsável:	Diretoria de Fundos de Financiamento		Subunidade responsável:	Coordenação Geral de Fundos de Desenvolvimento e financiamento	
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva		Gestor da subunidade:	Antônio Roberto Cavalcati	
Problema (causa):	N/A				
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com a Confederação Nacional da Indústria				
Objetivo do projeto:	Promoção do acesso das empresas, em especial as micro, pequenas e médias empresas - MPME, aos instrumentos de ação da Sudene.				

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Previsão de Conclusão:	dez-18
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ademir Pedro Vilaça Júnior,
-------------------------------------------------	-----------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Tratativas para assinatura do Acordo	Articulação institucional	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jan-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído		
2	Assinatura do Acordo	Assinatura	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mai-17	mai-17		Não informado	Não informado		100%	Concluído		
3	Divulgação instrumentos da Sudene	Identificar agenda de eventos da CNI para divulgação dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	set-17		14/07/17	17/11/17		100%	Concluído		
4	Treinamento dos funcionários da CNI	Capacitação de funcionários da CNI para serem agentes multiplicadores dos instrumentos da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	mar-18	ago-18					0%	A Iniciar	A ação foi adiada para após a realização do roadshow	
5	Comunicação	Divulgação ações no âmbito do Acordo de Cooperação para as Federações da Indústria na área de atuação da Sudene	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	jul-17	dez-18		14/07/17			75%	Em Andamento	As ações serão divulgadas na medida em que foram realizadas	
6	Discussão sobre programas de financiamento no âmbito do FNE	Discussão sobre programas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas no âmbito do FNE. Encaminhamento de sugestões da CNI ao BNB para aprimorar a concessão de crédito para MPES	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	out-17	mai-18					0%	A Iniciar		
7	Discussão sobre as diretrizes e prioridades de aplicação dos Fundos de apoio da Sudene	Incorporar a CNI na formulação das diretrizes e prioridades do FDNE e do FNE	Ademir Vilaça e Artur Sedycias	fev-18	jun-18					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	54%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Confederação Nacional da Indústria

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

4 – Estruturação do Observatório do Desenvolvimento do Nordeste



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	I.I Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de
Objetivo da ação:	Elaborar projeto para construção do Observatório de Desenvolvimento do Nordeste		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGEP
Diretor:	Alexandre Gusmão	Gestor da subunidade:	Frederico Cavalcanti
Problema (causa):	Informações sobre o Nordeste e Área de Atuação da Sudene não estão agrupadas ou não existem		
Projeto:	Estruturação do Plano de Projeto para o ODNE		
Objetivo do projeto:	Possibilitar a construção de um centro de informação sobre a Área de Atuação da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/10/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Frederico Cavalcanti
-------------------------------------------------	----------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1	Autorização para a elaboração do projeto			01/06/17	13/06/17	-	01/06/2017	13/06/2017		20%	Concluído		
1.1	Reuniões internas	Reuniões internas para elaboração de justificativas para o projeto	Frederico Cavalcanti	01/06/17	10/06/17	R\$ -	01/06/2017	09/06/2017		100%	Concluído		
1.2	Encaminhamento para a DIRCOL	Encaminhamento para a DIRCOL	Frederico Cavalcanti	10/06/17	10/06/17	R\$ -	09/06/2017	12/06/20217		100%	Concluído		
1.3	Publicação da Resolução	Publicação da Resolução de autorização	Frederico Cavalcanti	13/06/17	13/06/17	R\$ -	13/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído		
2	Elaboração do Projeto			18/06/17	15/10/17		14/06/2017			71%	Atrasado		
2.1	Definição do Escopo do projeto	-	Frederico Cavalcanti	18/06/17	30/06/17	R\$ -	14/06/2017	30/06/2017		100%	Concluído		
2.2	Elaboração do TAP	-	Frederico Cavalcanti	03/07/17	21/07/17	R\$ -	03/07/2017	21/07/2017		100%	Concluído		
2.3	Elaboração da EAP do projeto	-	Frederico Cavalcanti	24/07/17	31/08/17	R\$ -	24/07/2017	31/08/2017		100%	Concluído		
2.4	Aprovação do TAP e da EAP	-	Frederico Cavalcanti	01/09/17	15/09/17	R\$ -	01/09/2017	02/10/2017		100%	Concluído		
2.5	Planejamento das atividades do projeto	-	Frederico Cavalcanti	16/09/17	30/09/17	R\$ -	02/10/2017	06/10/2017		100%	Concluído		
2.6	Elaboração da sequenciação das atividades	-	Frederico Cavalcanti	02/10/17	04/10/17	R\$ -	09/10/2017	20/10/2017		100%	Concluído		
2.7	Definição dos recursos necessários	-	Frederico Cavalcanti	04/10/17	06/10/17	R\$ -	23/10/2017	23/10/2017		100%	Concluído		
2.8	Definição dos prazos e custos	-	Frederico Cavalcanti	04/10/17	13/10/17	R\$ -	23/10/2017	23/10/2017		100%	Concluído		
2.9	Aprovação do Plano de Projeto	-	Frederico Cavalcanti	15/10/17	15/10/17	R\$ -				0%	Atrasado		
				Valor Previsto:		R\$ -	Valor realizado:		R\$ -	91%	Atrasado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

5 – Acompanhamento da participação da SUDENE no trabalho de delimitação do Semiárido



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica: 1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Número do Projeto: 5	
Objetivo estratégico: 1.4 . Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		Ano: 2017	
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	Objetivo estratégico (MI):	Elevar a PNDR à condição de política de Estado, de forma coordenada e articulada com a agenda de desenvolvimento do
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de sistematização de informações que subsidiem a diferenciação regional das políticas federais, visando inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido		
Projeto:	Acompanhamento da participação da Sudene na nova delimitação do Semiárido brasileiro.		
Objetivo do projeto:	Subsidiar a elaboração dos painéis de indicadores referentes às Quatro Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (Social, Econômico, Ambiental e Institucional) através da elaboração de mapas		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	26/09/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ludmilla Calado
-------------------------------------------------	-----------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Produto 1 - Acompanhamento de Videoconferências	Produto 1 - Acompanhamento, por videoconferência, da discussão técnica do Grupo de Trabalho (GT) sobre a elaboração do relatório técnico	Ludmilla Calado	12/04/17	19/06/17	-	12/04/17	19/06/17	-	100%	Concluído		
1.1	Videoconferencia 1	Discussões gerais propostas pelo GT Interministerial para o relatório técnico de delimitação do semiárido	Ludmilla Calado	12/04/17	12/04/17	-	12/04/17	12/04/17	-	100%	Concluído		
1.2	Videoconferencia 2	Análise do conteúdo proposto pelo GT para o relatório técnico de delimitação do semiárido, assim como para as minutas das Resoluções	Ludmilla Calado	10/05/17	10/05/17	-	10/05/17	10/05/17	-	100%	Concluído		
1.3	Videoconferencia 3	Alinhamento das conclusões do relatório técnico, assim como das minutas das Resoluções	Ludmilla Calado	06/06/17	06/06/17	-	06/06/17	06/06/17	-	100%	Concluído		
1.4	Videoconferencia 4	Ajustes e alterações finais do relatório técnico, assim como para as minutas das Resoluções, para posterior encaminhamento ao Condel	Ludmilla Calado	19/06/17	19/06/17	-	19/06/17	19/06/17	-	100%	Concluído		
2	Produto 2 - Treinamento	Produto 2 - Treinamento sobre o uso da metodologia utilizada pelo GT para a elaboração da delimitação do Semiárido.	Ludmilla Calado	19/06/17	30/06/17	-	19/06/17	30/06/17	-	100%	Concluído		
2.1	Articulação	Alinhamento com órgãos responsáveis pelo treinamento sobre data e conteúdo	Ludmilla Calado	19/06/17	23/06/17	-	19/06/17	23/06/17	-	100%	Concluído		
2.2	Treinamento	Capacitação técnica para transferência de metodologia utilizada pelo GT para a elaboração da delimitação do Semiárido	Ludmilla Calado	27/06/17	27/06/17	-	27/06/17	27/06/17	-	100%	Concluído		
2.3	Validação	Apresentação para Coordenador-Geral	Ludmilla Calado	30/06/17	30/06/17	-	30/06/17	30/06/17	-	100%	Concluído		
3	Produto 3 - Acompanhamento da aprovação pelo Condel	Produto 3 - Acompanhamento da aprovação da nova delimitação pelo Condel	Ludmilla Calado, Frederico Cavalcanti	10/07/17	27/07/17	-	10/07/17	27/07/17	-	100%	Concluído		
3.1	Validação	Revisão e validação, na Sudene, das minutas das Resoluções a serem aprovadas no Condel	Frederico Cavalcanti	10/07/17	21/07/17	-	10/07/17	21/07/17	-	100%	Concluído		

3.2	Aprovação	Acompanhamento da aprovação, pelo Condel, da nova delimitação do Semiárido brasileiro e suas respectivas Resoluções	Ludmilla Calado	27/07/17	27/07/17	-	27/07/17	27/07/17	-	100%	Concluído			
4	Produto 4 - Acompanhamento dos recursos dos Estados	Produto 4 - Acompanhamento dos recursos dos Estados	Ludmilla Calado	28/07/17	27/09/17	-	28/07/17	24/11/17	-	100%	Concluído			
4.1	Monitoramento	Monitoramento dos recursos dos Estados à delimitação proposta	Ludmilla Calado	28/07/17	25/09/17	-	28/07/17	24/09/17	-	100%	Concluído			
4.2	Articulação	Articulação com o GT sobre recursos dos Estados	Ludmilla Calado	28/07/17	25/09/17	-	28/07/17	20/11/17	-	100%	Concluído			
4.3	Encerramento	Encerramento do prazo e oficialização da nova delimitação do Semiárido brasileiro	Ludmilla Calado	26/09/17	26/09/17	-	26/09/17	23/11/17	-	100%	Concluído			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	100%	Concluído	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
Observações:													
Projeto executado com recursos técnicos internos, sem outros custos orçamentários. Nas colunas referentes a "valor", por orientação da CGGI, colocou-se traço onde a natureza da atividade não se aplica à valores.													

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

6 – Estruturação e acompanhamento das atividades relacionadas com a Rede Palma



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa do PPA:	-	Eixo temático (MI):	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	-	Objetivo estratégico (MI):	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões
Objetivo da ação:	Criação da Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira		
Diretoria responsável:	DPLAN	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Problema (causa):	Necessidade de maior interação e diálogo entre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma Forrageira.		
Projeto:	Rede de Apoio à Cultura da Palma Forrageira (Projeto Prioritário)		
Objetivo do projeto:	Fomentar o diálogo e a articulação entre instituições nacional e internacional, universidades, institutos de pesquisas e iniciativa privada, para propor ações e consolidar as potencialidades da palma no semiárido brasileiro.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)

Previsão de Conclusão:	01/06/2018
Data Atualização:	05/12/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ -
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lucia, José Aildo, Marcelo Saiki, Marcelo Viana, Victor Uchoa
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma	Apresentação da proposta de criação da Rede Palma no Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE		01/05/2017	05/06/2017		01/05/2017	05/06/2017		20,0%	Concluído		
1.1	Atividades preparatórias	reserva de sala, coffee, etc.	Ascon	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído		
1.2	Divulgação	Preparação dos email marketing, Cofecção de Folders	Ascon/CGDS	01/05/2017	01/06/2017		01/05/2017	01/06/2017		100%	Concluído		
1.3	Cofirmação de Presença	-	Gabinete	15/05/2017	29/05/2017		15/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído		
1.4	Contrução do Espaço no Site	-	Ascon	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído		
1.5	Elaboração da apresentação	-	CGDS	01/05/2017	29/05/2017		01/05/2017	29/05/2017		100%	Concluído		
1.6	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários	Reunião do Comitê de Articulação de Secretários do Setor Agropecuário da Área de Atuação da SUDENE	Sudene e parceiros	01/06/2017	01/06/2017		01/06/2017	01/06/2017		100%	Concluído		
1.7	Registro da reunião	Registro de presença e gravação com degravacão	Ascon	01/06/2017	05/06/2017		01/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído		
2	Divulgação			06/06/2017	28/12/2017		06/06/2017			10,0%	Concluído		
2.1	Apresentação Evento do Sebrae Serra Talhada		CGDS/Ascon	06/06/2017	08/06/2017		06/06/2017	08/06/2017		100%	Concluído		
2.2	Apresentação Conselho Deliberativo do Sebrae AL		CGDS/Ascon	22/06/2017	22/06/2017		22/06/2017	22/06/2017		100%	Concluído		
2.3	Apresentação Sebrae PE		CGDS/Ascon	20/08/2017	27/12/2017						Cancelado		
2.4	Apresentação no Conselho dos Secretários de Agricultura (CONSEAGRI)		CGDS/Ascon	21/08/2017	28/12/2017						Cancelado		

3	Preparar a monção para o Condel			05/06/2017	27/07/2017		05/06/2017	27/07/2017		10,0%	Concluído			
3.1	Elaboração da Ata e encaminhar para CGGI	Gabinete		05/06/2017	05/06/2017		05/06/2017	05/06/2017		100%	Concluído			
3.2	Elaboração de proposta de Moção de Apoio para o Condel	CCGI/Gabinete/CG DS		06/06/2017	15/07/2017		06/06/2017	15/07/2017		100%	Concluído			
3.3	Apresentação da Moção ao Comitê Técnico do Condel	CCGI/Gabinete		20/07/2017	20/07/2017		(*)	(*)			Cancelado	Cancelamento decorrente da mudança predial da Sede, impossibilitando a referida realização.		
3.4	Apresentação da Moção ao Condel	Superintendente		27/07/2017	27/07/2017		27/07/2017	27/07/2017		100%	Concluído			
4	Realização de Oficina para Formatação da Arquitetura da Rede Palma			01/08/2017	30/03/2018		01/09/2017			6,7%	Em Andamento			
4.1	Instituição de Grupo de Trabalho da Sudene	DPLAN		01/08/2017	04/08/2017					0%	Atrasado			
4.2	Reunião Técnica	Sudene e parceiros		01/09/2017	21/09/2017		01/09/2017	26/09/2017		100%	Concluído			
4.3	Proposta de Programação e Participantes	CGDS/DPLAN-Gabinete		01/10/2017	30/10/2017					0%	Atrasado			
4.4	Encaminhamento aos Parceiros para Conhecimento e Sugestões da Proposta	CGDS/DPLAN-Gabinete		01/11/2017	30/11/2017					0%	Atrasado			
4.5	Elaboração da Programação Final e Lista dos Participantes	Ascon/Gabinete		01/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar			
4.6	Convite dos Parceiros	Sudene e parceiros		02/01/2018	04/01/2018					0%	A Iniciar			
4.7	Realização de Oficina	CGDS/DPLAN-Gabinete		20/02/2018	20/02/2018					0%	A Iniciar			
4.8	Definição da Arquitetura da Rede	Sudene e parceiros		02/03/2018	02/03/2018					0%	A Iniciar			
4.9	Elaboração de Relatório	CGDS/DPLAN		05/03/2018	30/03/2018					0%	A Iniciar			
				Valor Previsto:		R\$	-	Valor realizado:		R\$	-	47%	Em Andamento	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

7 - Capacitação de Gestores municipais para uso do SICONV (PE, PB, AL, RN, BA)



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	7.1
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Alexandre Gusmão		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV		
Projeto:	Capacitação de servidores municipais dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.30.00.00		85.806,24	85.806,24

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 85.806,24
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Isis Moreira, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento, Renato Vaz
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/03/2017		01/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído		
2	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto	DPLAN / CGDS	06/07/2017	22/08/2017		06/07/2017	22/08/2017		100%	Concluído		
3	Formalização do Instrumento	A etapa refere-se a todo o procedimento instrução do processo, e trâmites administrativos para a formalização	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CONJUR-SUDENE	23/08/2017	30/09/2017		23/08/2017	-		-	Cancelado		
4	Assinatura do Termo de Descentralização	Após a análise da procuradoria, foi solicitada ao setor financeiro, através do memo12/2017, consulta sobre a disponibilidade de recursos, que até o fim do mês de novembro, não foi confirmada. Por esse motivo, o TED se tornou inexecutável e recomendou-se que compusesse o banco de projetos para 2018.	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/10/2017	06/10/2017		06/10/2017				Cancelado	A assinatura do instrumento não foi possível por conta da indisponibilidade financeira da SUDENE.	Processo encaminhado para confecção de ofício para Centresaf-PE para informação da indisponibilidade de recursos.
5	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	06/10/2017	10/10/2017	R\$ 85.806,24				0%	A Iniciar		
6	Mobilização e Divulgação dos Cursos		CGDS/DPLAN/AS COM	06/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar		
7	Realização do curso - Fase de proposição em RECIFE - PE		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar		

8	Realização do curso - Fase de proposição em JOÃO PESSOA - PB	CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar			
9	Realização do curso - Fase de proposição em NATAL -RN	CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar			
10	Realização do curso - Fase de proposição em MACEIÓ - AL	CENTRESAF-PE	30/10/2017	09/11/2017					0%	A Iniciar			
11	Laudo técnico Final	CGDS	02/12/2017	30/12/2017					0%	A Iniciar			
			Valor Previsto:		R\$	85.806,24	Valor realizado:		R\$	-	22%	Cancelado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:													
CENTRO REGIONAL DA ESAF EM PERNAMBUCO													
Observações:													
Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	7.2
Objetivo estratégico:	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Ano:	2017
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	
Ação do PPA:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Objetivo estratégico (MI):	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento
Objetivo da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão.	Subunidade responsável:	CGDS/DPLAN - CODT/CGDS
Diretoria responsável:	DPLAN	Gestor da subunidade:	Maurício José Maia - Vera Lúcia Assunção
Diretor:	Alexandre Gusmão		
Problema (causa):	Fragilidade na operacionalização do Sistema de Convênios do Governo Federal - SICONV		
Projeto:	Capacitação de servidores municipais do Estado da Bahia		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências em servidores municipais, dotando-os de conhecimento técnico, teórico e prático, para o planejamento, elaboração e gestão de projetos com ênfase no operacional SICONV.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	250	3.3.30.00.00		10.071,50	10.071,50

Previsão de Conclusão:	30/12/2017
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira, Teresa Oliveira, Amauri Nascimento, Renato Vaz
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R\$ -
A realizar no exercício	R\$ 10.071,50
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
Valor liberado no Exercício	R\$ -
Saldo a liberar	R\$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
Total Liberado até o exercício	R\$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor			
1	Determinação dos Projetos Prioritários 2017	Resolução nº 281/2017: Relaciona como atividades e projetos prioritários das unidades finalísticas da SUDENE a capacitação de gestores municipais para o uso do SICONV.	Diretoria Colegiada	01/01/2017	01/03/2017		01/06/2017	13/06/2017		100%	Concluído	
2	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Nesta fase são feitas reuniões de articulação para determinar a metodologia do projeto	DPLAN / CGDS	06/07/2017	22/08/2017		06/07/2017	22/08/2017		100%	Concluído	
3	Formalização do Instrumento	A etapa refere-se a todo o procedimento instrução do processo, e trâmites administrativos para a formalização	CGDS, DPLAN, DAD, CCONT, CONJUR-SUDENE	23/08/2017	02/10/2017		23/08/2017	-		50%	Cancelado	O quantitativo de horas foi recalculado e ajustado para a possibilidade de dedicação que o servidor dispunha.
4	Assinatura do Termo de Descentralização	Após a análise da procuradoria, foi solicitada ao setor financeiro, através do memo111/2017, consulta sobre a disponibilidade de recursos, que até o fim do mês de novembro, não foi confirmada. Por esse motivo, o TED se tornou inexecutável e recomendou-se que compusesse o banco de projetos para 2018.	Superintendente, Representante da Instituição Parceira	02/10/2017	06/10/2017		06/10/2017			0%	Cancelado	A assinatura do instrumento não foi possível por conta da indisponibilidade financeira da SUDENE. Processo encaminhado para confecção de ofício para Centresaf-BA para informação da indisponibilidade de recursos.
5	Descentralização dos Recursos		COCF/DAD	06/10/2017	10/10/2017	R\$ 10.071,50				0%	A Iniciar	
6	Mobilização e Divulgação dos Cursos		CGDS/DPLAN/ASC OM	06/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	
7	Realização do curso - Fase de proposição em Salvador - BA		CENTRESAF-PE	30/10/2017	01/12/2017					0%	A Iniciar	

8	Laudo técnico Final		CGDS	02/12/2017	30/12/2017				0%	A Iniciar					
				Valor Previsto:		R\$	10.071,50	Valor realizado:		R\$	-	31%	Cancelado	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
CENTRO REGIONAL DA ESAF NA BAHIA													
Observações:													
Trata-se da viabilização de Projeto prioritário, de responsabilidade da CGDS/DPLAN, conforme disposto na Resolução Sudene nº 281/2017, art. 1º, inciso VII - "Capacitação de gestores municipais para uso do SICONV", mediante utilização de recursos da ação 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais, a qual tem em vista a melhoria da gestão pública municipal, por meio da capacitação/melhoria das capacidades para o desenvolvimento. Neste primeiro momento (2017), espera-se alcançar servidores de municípios onde a Sudene tem ou teve atuação recente (seja na execução de projetos de emendas parlamentares ou outros apoiados com recursos da programação), em que se pode observar a baixa capacidade/dificuldade de captação de recursos via SICONV, por esse público, apesar da imensa necessidade para responder/atender aos anseios da população local. A meta/objetivo é contemplar municípios de todos os estados da área de atuação da SUDENE, começando, em 2017, por beneficiar servidores das administrações locais de cinco estados: AL(20 munic.X 2 servidores), BA(50 munic. x 2 serv.), CE (40 x 2), PE (40 munic. x 2 serv.), PB(40 munic. x 2 serv.), mediante articulação/negociação de proposta com a escola de governo ESAF, que dispõe de estrutura descentralizada em nossa área de atuação, Regional PE (ESAF/PE) , Regional BA (ESAF-BA) e Regional CE (ESAF-CE), que deverá resultar na oferta de cursos de SICONV para servidores de diversos municípios dos estados de AL, PE, PB, RN (com a ESAF-PE); BA (com a ESAF-BA); e CE (com a ESAF-CE), cujos projetos são apresentados separadamente, em tres PO's .													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

Resolução nº 281/2017 da Diretoria Colegiada

8 - Acompanhamento das atividades relativas à execução de emendas parlamentares, de bancada e de comissão, bem como, do apoio técnico à articulação de novas emendas.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.1
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Drenagem superficial e pavimentação de diversas ruas no município de Parelhas		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	252.692,18

Previsão de Conclusão:	27/03/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 102.692,18	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 2.692,18		R\$ 252.692,18	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena e Marcelo Saiki
-------------------------------------------------	------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		12/03/2016	01/03/2017	-	12/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	12/03/16	12/04/16	-	12/03/16	12/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/16	22/04/16	-	12/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	11/07/16	01/03/17	-	11/07/16	01/03/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/06/2016	01/03/2018	R\$ 250.000,00	13/06/2017		R\$ 100.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Parelhas	01/06/16	30/06/16		13/06/17	13/06/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	22/08/17	22/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Parelhas	16/08/17	30/09/17		23/08/17	-		95%	Atrasado	Cobrada celeridade na execução da 1ª etapa - R\$ 95.000,00	Município está em fase de conclusão das obras e prestação de contas da 1ª parcela

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/10/17	15/10/17	R\$ 150.000,00				0%	Atrasado	Só pode ser liberada após execução da 1ª etapa e prestação de contas aprovada	Cobrada celeridade na execução da 1ª etapa
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Parelhas	16/10/17	31/01/18					0%	A Iniciar	Só pode ser iniciada após o recebimento da 2ª parcela	Cobrada celeridade na execução da 1ª etapa
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/02/18	01/03/18	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/04/2018	27/03/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/04/18	27/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Parelhas/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828299/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.2
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de Passa e Fica/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	267.794,30

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 7.117,72		R\$ 107.117,72	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 10.676,58		R\$ 160.676,58	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 17.794,30		R\$ 267.794,30	Valor liberado no Exercício	R\$ 216.183,23
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 216.183,23

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		17/03/2016	11/06/2017	-	17/03/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	17/03/16	18/03/16	-	17/03/16	18/03/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	17/03/16	08/04/16	-	17/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	11/06/17	-	15/03/16	11/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/17	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	31/12/2017	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 216.183,23	40%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de Passa e Fica	01/04/17	15/04/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/04/17	15/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Passa e Fica	16/04/17	30/06/17		14/04/17	18/05/17		100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	01/05/17	15/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 150.000,00	03/07/17	03/07/17	R\$ 116.183,23	100%	Concluído	Valor da liberação foi reduzido em virtude da verificação <i>in loco</i> de que parte da obra já havia sido executada	Será cancelado o empenho do saldo em restos a pagar e devolvido o recurso.
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Passa e Fica	16/07/17	30/11/17		04/07/17	31/12/17		100%	Concluído	Valor R\$ 116.183,23	
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela (Restante da 2ª liberação)	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	30/11/17	R\$ 33.085,91				0%	Atrasado	Solicitado e aprovado uso do saldo, devendo ser devolvido R\$ 730,86; Falta visita de campo	Visita de Campo está programada e será realizada em Dezembro/2017
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 33.085,91	Município de Passa e Fica	01/12/17	15/12/17					0%	A Iniciar		
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	16/12/17	31/12/17	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 216.183,23	60%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Passa e Fica/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827250/2016 - Proposta nº 003674/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.3
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	274.321,90

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 9.728,76		R\$ 109.728,76	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 14.593,14		R\$ 164.593,14	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 24.321,90		R\$ 274.321,90	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	-
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	17/03/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		26/02/2016	19/12/2016	-	26/02/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	26/02/16	08/04/16	-	26/02/16	08/04/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	30/03/16	30/01/17	-	30/03/16	30/01/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	18/10/16	07/11/16	-	18/10/16	07/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	13/12/16	13/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	19/12/16	19/12/16	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		15/02/2017	22/02/2019	R\$ 250.000,00	15/02/2017		R\$ 250.000,00	43%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	15/02/17	15/02/17		15/02/17	15/02/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	13/04/17	13/04/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Passa e Fica	30/12/16	25/07/17		30/12/16	25/07/17		100%	Concluído		

10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Passa e Fica	19/05/17	19/05/17		19/05/17	19/05/17		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	31/07/17	R\$ 150.000,00	29/11/17	29/11/2017	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Passa e Fica	30/11/17	21/01/18					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	22/01/18	22/02/19	-			-	0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		22/03/2018	17/03/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	22/03/18	17/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	63%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de Passa e Fica/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado José Agripino/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827249/2016 - Proposta nº 003674/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017**

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.4
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	262.868,86

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 100.000,00	R\$ 7.721,32		R\$ 107.721,32	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 5.147,54		R\$ 155.147,54	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 12.868,86		R\$ 262.868,86	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	30/05/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/03/16	12/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/17	-	01/11/16	08/11/17	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	15/09/2017	R\$ 250.000,00	30/05/2017	30/11/2017	R\$ 100.000,00	19%	Em Andamento		
7	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de Tangará	01/05/17	15/05/17		30/05/17	30/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/06/17	15/06/17	R\$ 100.000,00	04/07/17	19/07/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Tangará	16/06/17	31/08/17		20/07/17		20%	Atrasado	Município não atendeu aos requisitos para recebimento da primeira parcela, o que acarretou no atraso da execução da obra; Não foi apresentado documentos da licitação no SICONV, nem registrado gastos. Utilizado (R\$ 20.000,00)	Solicitada a conclusão da licitação e inclusão dos documentos no SICONV; aguardando início da execução da obra;
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de Tangará	01/09/17	15/09/17				0%	Atrasado	Atraso na Execução	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 150.000,00			0%	Atrasado	Atraso na Execução	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Tangará	16/09/17	31/12/17				0%	Atrasado	Solicitado Aditamento de Vigência	Em processo de Aditamento
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	01/02/18	-			0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-			0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-			0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Jardim de Tangará/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827676/2016 - Proposta nº 015210/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.5
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2017
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no município de São José do Seridó/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	275.137,25

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ 100.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 10.054,90		R\$ 110.054,90	A realizar no exercício	R\$ -
R\$ 150.000,00	R\$ 15.082,35		R\$ 165.082,35	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 25.137,25		R\$ 275.137,25	Valor liberado no Exercício	R\$ 150.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	25/08/2018
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Édson Laranjeiras e Givanildo Ramos
-------------------------------------------------	-------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		11/03/2016	11/06/2017	-	11/03/2016	11/10/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/03/16	08/04/16	-	11/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/03/16	08/04/16	-	11/03/16	08/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	10/03/16	29/03/16	-	10/03/16	27/07/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	01/09/16	01/09/16	-	01/09/16	01/09/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	11/10/16	11/10/16	-	11/10/16	11/10/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2016	02/08/2017	R\$ 250.000,00	21/11/2016		R\$ 250.000,00	60%	Concluído		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Município de São José do Seridó	01/12/16	15/12/16		21/11/16	21/11/16		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/16	15/12/16	R\$ 100.000,00	26/12/16	26/12/16	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de São José do Seridó	16/12/16	30/04/17		27/12/16	23/05/17		100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito da 2ª parcela da contrapartida.	Município de São José do Seridó	01/05/17	15/05/17		22/12/16	22/12/16		100%	Concluído		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/05/17	15/05/17	R\$ 150.000,00	24/05/17	24/05/17	R\$ 150.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de São José do Seridó	16/05/17	01/07/17		25/05/17	01/07/17		100%	Concluído		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	02/07/17	02/08/17	-	10/10/2017	15/10/2017		100%	Concluído		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		30/08/2017	25/08/2018	-				20%	Concluído		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	30/08/17	25/08/18	-	18/10/2017	18/10/2017		100%	Concluído		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	100%	Concluído	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de São José do Seridó/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 827251/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.6
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN		
Objetivo do projeto:	Promoção de melhorias no acesso às comunidades, transportes/serviços públicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	520.935,70

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 61.299,90	R\$ 4.187,14		R\$ 65.487,04	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 219.000,00	R\$ 5.161,00		R\$ 224.161,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 219.700,10	R\$ 5.161,26		R\$ 224.861,36	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 14.509,40		R\$ 514.509,40	Valor liberado no Exercício	R\$ 61.299,00
				Saldo a liberar	R\$ 438.701,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 61.299,00

Previsão de Conclusão:	21/04/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Márcelo de Castro Viana
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	01/03/2017	-	15/03/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	19/04/16	-	15/03/16	19/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/03/16	15/08/16	-	15/03/16	15/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	25/10/16	25/10/16	-	25/10/16	25/10/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	26/10/16	26/10/16	-	26/10/16	26/10/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	28/03/2018	R\$ 500.000,00	09/08/2017		R\$ 61.299,00	16%	Em Andamento		
7	Depósito 1a Parcela contrapartida	Depósito 1a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/08/17	30/08/17		09/08/17	09/08/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COFC /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 61.299,90	02/10/17	02/10/17	R\$ 61.299,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 61.299,90	Município de Tibau do Sul	16/09/17	31/10/17		03/10/17			71%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa (Utilizado R\$ 43.273,14)	Cobrada celeridade ao município

10	Depósito 2a Parcela contrapartida	Depósito 2a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/11/17	30/11/17					0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/11/17	15/11/17	R\$ 219.000,00				0%	Atrasado	Aguardado conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 219.000,00	Município de Tibau do Sul	16/11/17	31/12/17					0%	A Iniciar		
13	Depósito 3a Parcela contrapartida	Depósito 3a Parcela contrapartida	Município de Tibau do Sul	01/01/18	31/01/18					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/18	15/01/18	R\$ 219.700,10				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 219.700,10	Município de Tibau do Sul	16/01/18	25/02/18					0%	A Iniciar		
16	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	26/02/18	28/03/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		26/04/2018	21/04/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	26/04/18	21/04/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:	R\$ 61.299,00	36%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:

Município de Tibau do Sul/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828298/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.7
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação e drenagem das ruas em estado de precariedade		
Projeto:	Implantação de calçamento de rua e rodovia estadual no Município de Parazinho/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida da comunidade em geral		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	259.000,00	259.971,60

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 100.000,00	R\$ 971,60		R\$ 100.971,60	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 159.000,00			R\$ 159.000,00	A realizar no exercício	R\$ 259.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 259.000,00	R\$ 971,60		R\$ 259.971,60	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 159.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	23/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		22/08/2016	13/01/2017	-	22/08/2016	19/12/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	22/08/16	29/08/16	-	22/08/16	29/08/16		100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	22/08/16	13/03/17	-	22/08/16	13/03/17		100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16		100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	13/12/16	13/12/16		100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	19/12/16	19/12/16		100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/03/2017	30/01/2018	R\$ 259.000,00	24/03/2017		R\$ 100.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito de parcela única de contrapartida	Depósito da parcela única da contrapartida.	Município de Parazinho	01/03/17	31/03/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	31/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Parazinho	16/08/17	30/08/17		22/08/17	10/10/17		100%	Concluído		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 159.000,00				0%	Atrasado	Gerados relatórios de Execução	Relatório de Execução em análise
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 159.000,00	Município de Parazinho	16/09/17	30/12/17					0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/12/17	30/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		28/02/2018	23/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	28/02/18	23/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 259.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Parazinho/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836220/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.8
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa do PPA:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	Eixo temático (MI):	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação do PPA:	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):			
Projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.		
Objetivo do projeto:	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN como meio de fomento e consolidação da agricultura urbana orgânica no município de Natal com vistas a beneficiar e potencializar o mercado de pequenos produtores de hortifrutis orgânicos das comunidades de Gramorezinho e Planalto, localidades inseridas na Mancha de Interesse Social e por conseguinte na Área Especial de Interesse Social 03 de Segurança Alimentar, definidas no macrozoneamento do Plano Diretor de Natal, Lei Complementar Nº 082, de 21 de junho de 2007.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 4 (4440.42)		1.000.000,00	1.020.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
MÊS	CONCEDENTE	CONVENIENTE	TOTAL		
DEZ/2016	523.012,50	20.000,00	543.012,50	Pago até o ano anterior	R\$ -
FEV/2017	446.112,50	--	446.112,50	A realizar no exercício	R\$ 1.000.000,00
ABR/2017	30.875,00	--	30.875,00	Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R\$ -
TOTAL	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ -
				Saldo a liberar	R\$ 1.000.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ -

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos, Maria Helena Lima, Victor Uchôa Silva, José Aildo Sabino - SUDENE; Karenine Dantas Monteiro - Prefeitura de Natal/RN.
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								20%	Concluído		
1	Abertura do processo	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	16/03/2016	16/03/2016	--	16/03/2016	16/03/2016	--	100%	Concluído		
2	Proposta/Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação Proposta/Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	12/03/2016	12/03/2016	--	12/03/2016	12/03/2016	--	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	01/03/2017	28/06/2017	--	01/03/2017	27/06/2017	--	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/2016	04/11/2016	--	03/11/2016	03/11/2016	--	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/2016	30/12/2016	--	30/12/2016	30/12/2016	--	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/2017	13/01/2017	--	13/01/2017	13/01/2017	--	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)				R\$ 1.000.000,00			R\$ 0,00	8%	Em Andamento		
7	Depósito de parcela única da contrapartida	Depósito de parcela única da contrapartida	Município de Natal/RN	01/12/2016	31/12/2016		28/11/2017	28/11/2017		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação pela Concedente da 1ª parcela de recursos	COFC /CGAF / DAD	01/12/2016	31/12/2016	R\$ 523.012,50				0%	Atrasado	Necessário ajustar Vigência e Plano de Trabalho a fim de manter o convênio ativo	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo
9	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira	Execução dos Espaços de cultivo e realização da feira - R\$ 523.012,50	Município de Natal/RN	30/12/2016	31/05/2017					0%	Atrasado	Aguardando finalização do Termo Aditivo e do ajuste do Plano de Trabalho	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo
10	Liberação da 2ª parcela	Liberação pela Concedente da 2ª parcela de recursos	COFC /CGAF / DAD	01/02/2017	28/02/2017	R\$ 446.112,50				0%	Atrasado	Aguardando finalização do Termo Aditivo e do ajuste do Plano de Trabalho	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo

11	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio	Execução do Bloco Administrativo e de Apoio - R\$ 446.112,50	Município de Natal/RN	31/05/2017	30/09/2017					0%	Atrasado	Aguardando finalização do Termo Aditivo e do ajuste do Plano de Trabalho	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo
12	Liberação da 3ª parcela	Liberação pela Concedente da 3ª parcela de recursos	COCF /CGAF / DAD	01/04/2017	30/04/2017	R\$ 30.875,00				0%	Atrasado	Aguardando finalização do Termo Aditivo e do ajuste do Plano de Trabalho	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo
13	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana)	Fornecimento de equipamentos de apoio ao cultivo (agricultura orgânica urbana) - R\$ 30.875,00	Município de Natal/RN	01/06/2017	31/12/2017					0%	Atrasado	Aguardando finalização do Termo Aditivo e do ajuste do Plano de Trabalho	Em processo de execução de Termo Aditivo de Prazo
14	Visita de técnica de recebimento do Objeto	Visita de técnica de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/2018	31/01/2018					0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								0%	A Iniciar		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	01/03/2018	24/02/2019	--	--	--	--	0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:		R\$ 1.000.000,00	Valor realizado:			27,5%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Natal/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828301/2016													

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.9
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.172.497,00	1.234.957,85

Previsão de Conclusão:	28/03/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 222.955,29	R\$ 6.819,30		R\$ 229.774,59	A realizar no exercício	R\$ 1.172.497,00
R\$ 352.000,00	R\$ 5.672,87		R\$ 357.672,87	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 352.000,00	R\$ 24.984,34		R\$ 376.984,34	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 245.541,71	R\$ 24.984,34		R\$ 270.526,05	Valor liberado no Exercício	R\$ 574.955,29
R\$ 1.172.497,00	R\$ 62.460,85		R\$ 1.234.957,85	Saldo a liberar	R\$ 597.541,71
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 574.955,29

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado		Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim					
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		08/03/2016	30/05/2017	-	08/03/2016	21/09/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	08/03/16	22/04/16	-	08/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/04/16	08/08/16	-	06/04/16	08/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	06/09/16	06/09/16	-	06/09/16	06/09/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	21/09/16	21/09/16	-	21/09/16	21/09/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2017	04/03/2018	R\$ 1.172.497,00	24/03/2017		R\$ 574.955,29	24%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/04/17	15/04/17		24/03/17	24/03/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/07/17	15/07/17	R\$ 222.955,29	13/07/17	13/07/17	R\$ 222.955,29	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 222.955,29	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/07/17	30/08/17		14/07/17	30/08/17		100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	15/05/17		22/05/17	22/05/17		100%	Concluído		

11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 352.000,00	30/11/17	30/11/2017	R\$ 352.000,00	100%	Concluído		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 352.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/11/17	15/12/17		30/11/2017			26%	Em Andamento		
13	Depósito da 3ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/12/17	15/12/17					0%	A Iniciar		
14	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/12/17	15/12/18	R\$ 352.000,00				0%	A Iniciar		
15	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 352.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/12/17	30/12/18					0%	A Iniciar		
16	Depósito da 4ª Parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/01/18	15/01/18					0%	A Iniciar		
17	Liberação da 4ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/01/18	30/01/18	R\$ 245.541,71				0%	A Iniciar		
18	Pavimentação das Vias (Parte 4)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 245.541,71	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/01/18	01/02/18					0%	A Iniciar		
19	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	02/02/18	04/03/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		02/04/2018	28/03/2019	-				0%	A Iniciar		
20	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	02/04/18	28/03/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 1.172.497,00	Valor realizado:		R\$ 574.955,29	44%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Município de São Gonçalo do Amarante/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828296/2016 - Proposta nº 007532/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.10
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)	Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
						CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
	100	GND 3	30	600.000,00	611.924,74					Pago até o ano anterior	R\$ -
						R\$ 100.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 106.000,00	A realizar no exercício	R\$ 600.000,00
						R\$ 300.000,00	R\$ 5.924,74		R\$ 305.924,74	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
						R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
						R\$ 600.000,00	R\$ 11.924,74		R\$ 611.924,74	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
										Saldo a liberar	R\$ 500.000,00
										Saldo a Empenhar no exercício	
										Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Previsão de Conclusão:	24/06/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino e Givanildo Ramos de Souza
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		06/09/2016	13/01/2017	-	06/09/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	06/09/16	04/11/16	-	06/09/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	06/09/16	25/11/16	-	06/09/16	25/11/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	06/09/16	07/02/17	-	06/09/16	07/02/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/02/2017	16/05/2018	R\$ 600.000,00	18/04/2017		R\$ 100.000,00	27%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª parcela da contrapartida	Depósito de 1ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/02/17	28/02/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	30/08/17	R\$ 100.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/09/17	30/09/17		24/08/17	14/09/17		100%	Concluído		
10	Depósito da 2ª parcela da contrapartida	Depósito de 2ª Parcela da contrapartida	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	01/05/17	30/05/17		18/04/17	18/04/17		100%	Concluído	O município depositou a segunda parcela da contrapartida em conjunto com a primeira	
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	15/12/17	R\$ 300.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 300.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/12/17	31/01/18					0%	A Iniciar		
13	Liberação da 3ª parcela	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/18	15/02/18	R\$ 200.000,00				0%	A Iniciar		
14	Pavimentação das Vias (Parte 3)	Pavimentação das Vias (Parte 3) - R\$ 200.000,00	Município de São Gonçalo do Amarante/RN	16/02/18	30/04/18					0%	A Iniciar		
15	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/05/18	16/05/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/06/2018	24/06/2019	-				0%	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/06/18	24/06/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 600.000,00	Valor realizado:		R\$ 100.000,00	47%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:

Município de São Gonçalo do Amarante/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 838038/2016 - Proposta nº 28265/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.11
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Vias urbanas apresentando manifestações patológicas (em péssimas condições de tráfego)		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lucrécia/RN		
Objetivo do projeto:	Melhorar condições os acessos às comunidades, promovendo a maior qualidade de vida à população, diminuindo o desgaste provocado pelas chuvas e reduzindo os gastos com manutenção de vias públicas facilitando também o acesso de transportes/serviços públicos;		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	251.000,00

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 125.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 126.000,00	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 125.000,00			R\$ 125.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 251.000,00	Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
				Valor liberado no Exercício	R\$ 125.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 125.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	
				Total Liberado até o exercício	R\$ 125.000,00

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e José Wilson Galdino
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		18/07/2016	13/01/2017	-	18/07/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	18/07/16	02/08/16	-	18/07/16	02/08/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	31/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	31/12/16	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/12/2016	31/01/2018	R\$ 250.000,00	17/07/2017		R\$ 125.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lucrécia/RN	01/12/16	31/12/17		17/07/17	17/07/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	31/12/17	17/07/17	R\$ 125.000,00	23/08/17	23/08/17	R\$ 125.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 125.000,00	Município de Lucrécia/RN	18/07/17	15/09/17		24/08/17			96%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
10	Liberção da 2ª parcela	Liberção da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	30/09/17	R\$ 125.000,00				0%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 125.000,00	Município de Lucrécia/RN	01/11/17	31/12/17					0%	A Iniciar	Necessário aditar vigência	Em Processo de Aditamento de Vigência
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/01/18	31/01/18	-				0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:		R\$ 125.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:												
Município de Lucrecia/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 836181/2016 - Proposta nº 026883/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.12
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Lagoa Danta/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	R\$ 253.654,75

Previsão de Conclusão:	24/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 100.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 103.654,75	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
R\$ 150.000,00			R\$ 150.000,00	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 3.654,75		R\$ 253.654,75	Valor liberado no Exercício	R\$ 100.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 150.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 100.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Marcelo Saiki Braga
-------------------------------------------------	------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		15/03/2016	30/05/2017	-	15/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	15/03/16	13/04/16	-	15/03/16	13/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	15/03/16	22/04/16	-	15/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	15/04/16	30/05/17	-	15/04/16	30/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	30/01/2018	R\$ 250.000,00	03/08/2017		R\$ 100.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela única contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Lagoa Danta	01/08/17	15/08/17		03/08/17	03/08/17		100%	Concluído		
8	Liberção da 1ª parcela	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 100.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 100.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 100.000,00	Município de Lagoa Danta	16/08/17	30/11/17		22/08/17			99%	Em Andamento		

10	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/17	15/12/17	R\$ 150.000,00				0%	A Iniciar		
11	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 150.000,00	Município de Lagoa Danta	16/12/17	31/12/17					0%	A Iniciar		
12	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	31/12/17	30/01/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		01/03/2018	24/02/2019	-				0%	A Iniciar		
13	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/03/18	24/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:	R\$ 100.000,00	50%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:													
Município de Lagoa Danta/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rafael Motta/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828295/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.13
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	503.901,97

Cronograma de Desemboço (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL		
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 1.950,98		R\$ 251.950,98	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 3.901,96		R\$ 503.901,96	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	13/08/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(ais) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e Victor Uchôa Ferreira da Silva
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		01/03/2016	30/11/2016	-	01/03/2016	30/11/2016	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	01/03/16	22/04/16	-	01/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	03/05/17	19/05/17	-	03/05/17	19/05/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	01/11/16	08/11/16	-	01/11/16	08/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	22/11/16	22/11/16	-	22/11/16	22/11/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	30/11/16	30/11/16	-	30/11/16	30/11/16	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/08/2017	19/08/2018	R\$ 500.000,00	10/08/2017		R\$ 250.000,00	19%	Em Andamento		
7	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/08/17	15/08/17		10/08/17	10/08/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	30/08/17	30/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		

9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 250.000,00	Município de Jucurutu	16/08/17	30/08/17		01/09/17			20%	Atrasado	O município não atendeu aos requisitos para liberação da 1ª parcela no prazo previsto, o que acarretou no atraso da execução; Não foi inserido documentos da licitação no Siconv e nenhum gasto foi registrado	Aguardando município concluir a execução da licitação e informar status da obra; comunicado ao município
10	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Depósito da 2ª Parcela da contrapartida	Município de Jucurutu	01/09/17	15/09/17					0%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/17	15/09/17	R\$ 250.000,00				0%	Atrasado	Aguardando conclusão da 1ª etapa	Cobrada celeridade ao município
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 250.000,00	Município de Jucurutu	16/09/17	19/06/18					0%	A Iniciar		
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	20/06/18	19/08/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		18/08/2018	13/08/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	18/08/18	13/08/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:		R\$ 250.000,00	39%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros Institucionais:

Município de Jucurutu/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828297/2016 - Proposta nº 004041/2016

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.14
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Deficiência na coleta de lixo do município		
Projeto:	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo em Campo Redondo/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores condições de vida e higiene à população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	250.000,00	258.333,33

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	A realizar no exercício	R\$ 250.000,00
				Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 250.000,00	R\$ 8.333,33		R\$ 258.333,33	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	R\$ -
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	20/02/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Givanildo Ramos de Souza e José Aildo Sabino de Oliveira Júnior
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		11/03/2016	13/01/2017	-	11/03/2016	13/01/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	11/03/16	11/04/16	-	11/03/16	11/04/16	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	11/03/16	22/04/16	-	11/03/16	22/04/16	-	100%	Concluído		
3	Termo de Referência	Recebimento, análise e aprovação do Termo de Referência	CGDS/SUDENE	05/04/16	12/07/16	-	05/04/16	12/07/16	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/05/2017	27/01/2018	R\$ 250.000,00	11/05/2017		R\$ 250.000,00	30%	Em Andamento		
7	Depósito da Parcela única da contrapartida	Depósito da 1ª Parcela da contrapartida	Município de Campo Redondo	01/05/17	15/05/17		11/05/17	11/05/17		100%	Concluído		
8	Liberção dos recursos	Liberção da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	21/08/17	21/08/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
9	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo	Aquisição de Caminhão Compactador e Coletor de Lixo - R\$ 250.000,00	Município de Campo Redondo	16/08/17	27/12/17					0%	A Iniciar	Solicitado Aditamento de Vigência	Em processo de Aditamento da Vigência
13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	28/12/17	27/01/18	-				0%	A Iniciar		

		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		25/02/2018	20/02/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	25/02/18	20/02/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 250.000,00	Valor realizado:			50%	Em Andamento	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:													
Município de Campo Redondo/RN													
Observações:													
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado Rogério Marinho/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 828300/2016 - Proposta nº 010961/2016													

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2017

Diretriz estratégica:	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Número do Projeto:	8.15
Objetivo estratégico:	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ano:	2016
Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	Eixo temático (MI):	Reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento nacional integrado
Ação:	Ação 7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Objetivo estratégico (MI):	Promover a estruturação de atividades produtivas, APLs e Rotas de Integração Nacional
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nos municípios localizados nas regiões estagnadas, proporcionando a dinamização das economias locais		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	Subunidade responsável:	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Alexandre Henrique de Gusmão Gonçalves	Gestor da subunidade:	Maurício José de Garcia Maia
Problema (causa):	Pavimentação das ruas com condições de trafegabilidade prejudicada		
Projeto:	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhores escoamento da produção e locomoção da população		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R\$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R\$ 1,00)
	100	GND 3	30	500.000,00	526.970,57

Cronograma de Desembolso (R\$ 1,00)				Valores Orçamentários/ Financeiros (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE	CONVENIENTE	MÊS	TOTAL	Pago até o ano anterior	R\$
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,29		R\$ 263.485,29	A realizar no exercício	R\$ 500.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 13.485,28		R\$ 263.485,28	Orçamento Autorizado no exercício	R\$ -
				Valor Empenhado no Exercício	R\$ -
R\$ 500.000,00	R\$ 26.970,57		R\$ 526.970,57	Valor liberado no Exercício	R\$ 250.000,00
				Saldo a liberar	R\$ 250.000,00
				Saldo a Empenhar no exercício	R\$ -
				Total Liberado até o exercício	R\$ 250.000,00

Previsão de Conclusão:	24/09/2019
Data Atualização:	30/11/2017

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Marcelo Saiki Braga
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)		28/07/2016	01/03/2017	-	28/07/2016	01/03/2017	-	20%	Concluído		
1	Proposta de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação da Proposta	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
2	Plano de Trabalho	Recebimento, análise e aprovação do Plano de Trabalho	CGDS/SUDENE	28/07/16	09/03/17	-	28/07/16	09/03/17	-	100%	Concluído		
3	Projeto Básico	Recebimento, análise e aprovação Projeto Básico	CGDS/SUDENE	28/07/16	16/06/17	-	28/07/16	16/06/17	-	100%	Concluído		
4	Visita técnica	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	31/10/16	04/11/16	-	31/10/16	04/11/16	-	100%	Concluído		
5	Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	30/12/16	30/12/16	-	30/12/16	30/12/16	-	100%	Concluído		
6	Publicação	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	13/01/17	13/01/17	-	13/01/17	13/01/17	-	100%	Concluído		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/07/2017	31/08/2018	R\$ 500.000,00	19/07/2017		R\$ 0,00	17%	Em Andamento		
7	Depósito de Parcela 1ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	01/07/17	15/07/17		19/07/17	19/07/17		100%	Concluído		
8	Liberação da 1ª parcela	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/08/17	15/08/17	R\$ 250.000,00	05/12/17	05/12/17	R\$ 250.000,00	100%	Concluído		
9	Pavimentação das Vias (Parte 1)	Pavimentação das Vias (Parte 1) - R\$ 250.000,00	Município de Upanema	16/08/17	15/02/18					0%	A Iniciar		
10	Depósito de Parcela 2ª parcela da contrapartida	Depósito de Parcela única contrapartida	Município de Upanema	16/02/18	28/02/18					0%	A Iniciar		
11	Liberação da 2ª parcela	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	16/02/18	28/02/18	R\$ 250.000,00				0%	A Iniciar		
12	Pavimentação das Vias (Parte 2)	Pavimentação das Vias (Parte 2) - R\$ 250.000,00	Município de Upanema	01/03/18	31/07/18					0%	A Iniciar		

13	Visita de recebimento do Objeto	Visita de recebimento do Objeto	CGDS/SUDENE	01/08/18	31/08/18	-				0%	A Iniciar		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)		29/09/2018	24/09/2019	-				0%	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	29/09/18	24/09/19	-				0%	A Iniciar		
						R\$ 500.000,00	Valor realizado:	R\$ 250.000,00	37%	Em Andamento	Status do Projeto		

Parceiros institucionais:												
Município de Upanema/RN												
Observações:												
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputada Zenaide Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 7K66, vinculada ao Programa 2029. Convênio nº 839953/2016												

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
