

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

REALIZAÇÃO



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



PATROCÍNIO-MASTER



PATROCÍNIO



APOIO



CO-REALIZAÇÃO



OBRASGOV.BR


2.0



Obras
gov.br

Giovanna Ferreira

CGIMO/DTPAR/SEGES

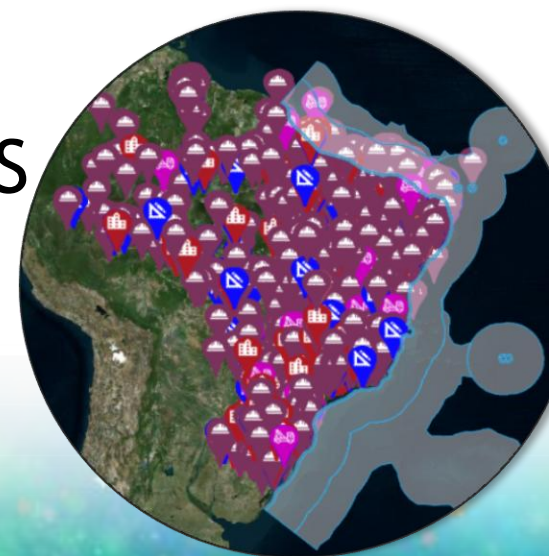



Obras
gov.br

Agenda

- Introdução
- OBRASGOV - Governança
- OBRASGOV - ESTADOS e MUNICÍPIOS
- OBRASGOV 2.0 - Faça Governança e Gestão.



Recurso bem aplicado ?



A cada dois empreendimentos contratados com recursos federais, **um encontra-se paralisado.**

Em 2024, o TCU identificou **11.941** obras **paralisadas** no país.

“O TCU fomenta o controle social, estimule o engajamento dos gestores na busca de soluções e assegure que o cidadão tenha ciência de como os recursos federais estão sendo aplicados”.



Obras
gov.br

Cenário anterior

**União
Antes de 2021**

01

Variação Normativa

02

Informações Inconsistentes

03

Fonte de Dados pulverizadas

04

Falta de Padronização

05

Baixa Transparência



**Obras
gov.br**



CRONOLOGIA

OBRASGOV: GOVERNANÇA EM OBRAS



**Obras
gov.br**

OBRASGOV: GOVERNANÇA EM OBRAS



Obras
gov.br


OBRASGOV: FUNCIONALIDADES





Obras
gov.br

A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DE UM INVESTIMENTO

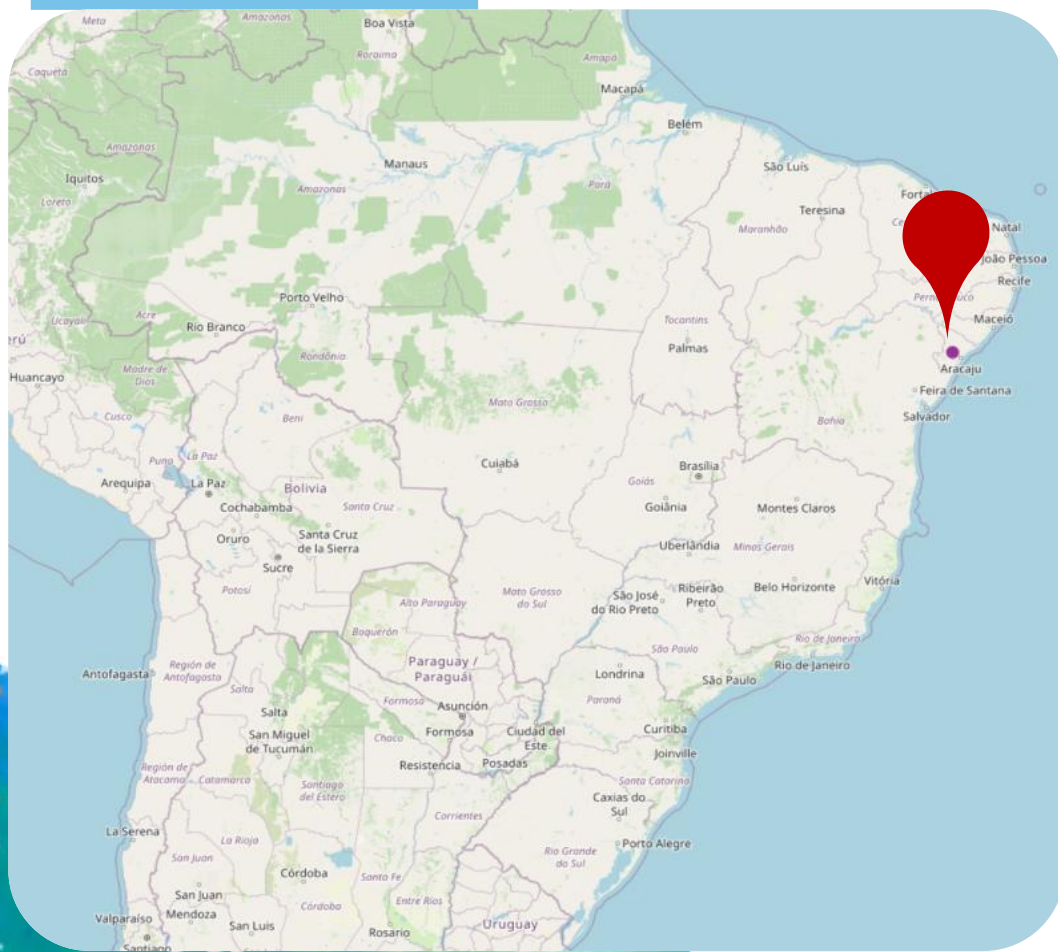

ID-OBRASGOV
34304.28-24

↑
Sequencial

↑
UF
IBGE

↑
Dígitos

MAPEAMENTO DE SOBREPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS




Obras
gov.br



Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
Obrasgov.br

Painel Obrasgov

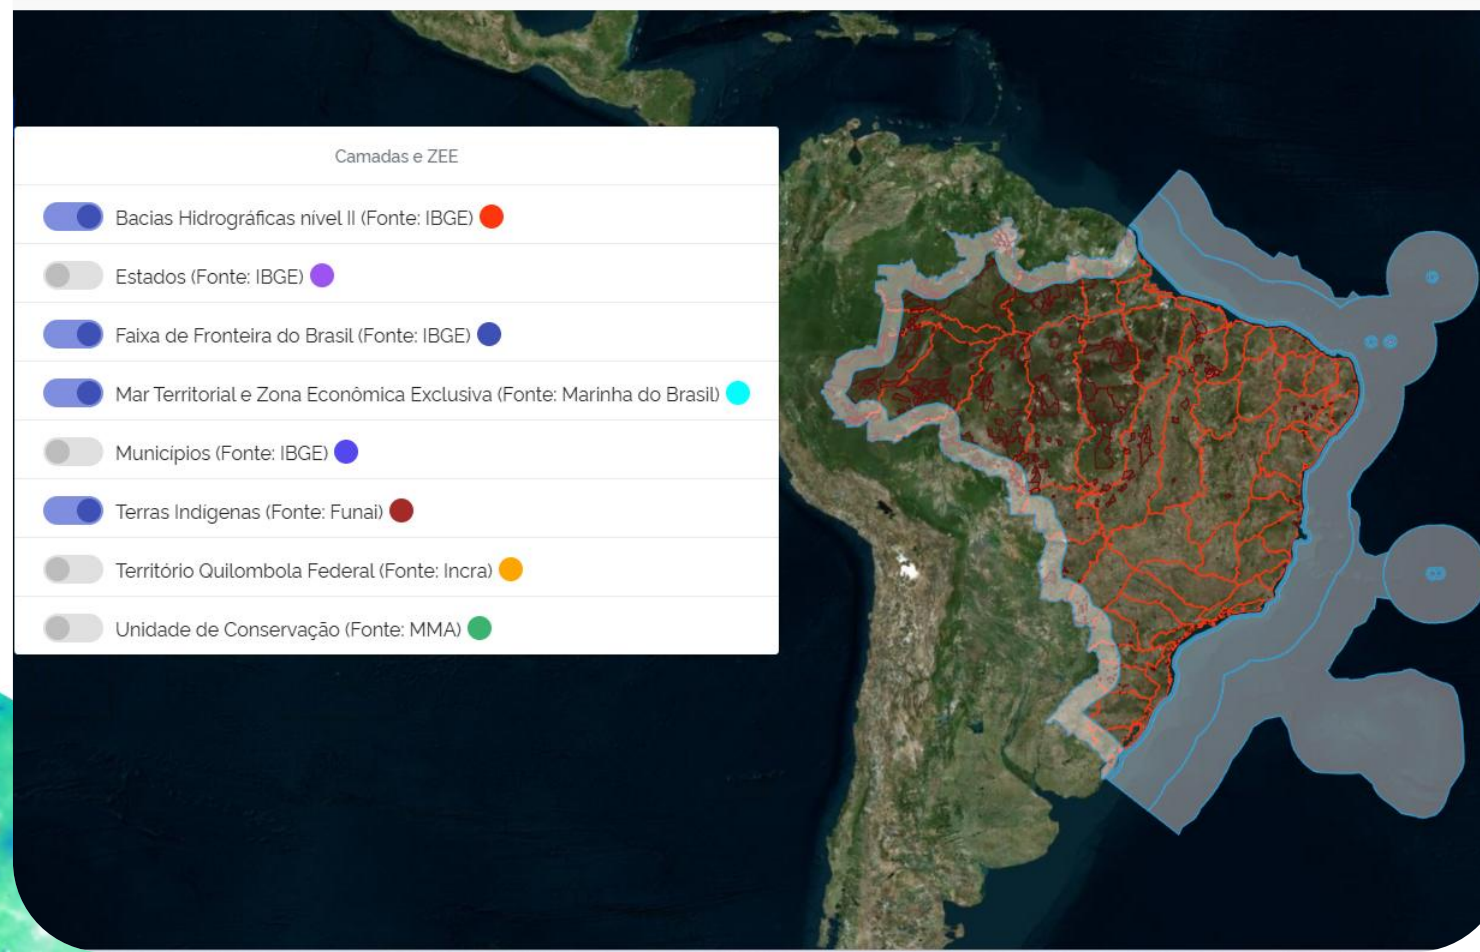


OBRASGOV : 14.133/2021



Obras
gov.br

gov.br

COMUNICA BR | ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO GOVERNO


x  Cadastro Integrado de Projetos de Investimento
Obrasgov.br

Painel Obrasgov | O que é o Obrasgov? | FalaBR e LAI | Entrar com GOV.BR

Visão Geral do Projeto de Investimento

Visualize os dados consolidados de um Projeto de Investimento em Infraestrutura

Identificador Único

Sistema de Origem

OBRASGOV

Dados Gerais | Licitação/Contrato | Execução Financeira | **Execução Física**





Acompanhamento Físico | Responsabilidade Técnica | **Relatório Fotográfico/Videos**

Fotos e Videos da Intervenção


Pesquise fotos/videos por tags

Pesquisar **Limpar**

Fotos/Videos do Executor




SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

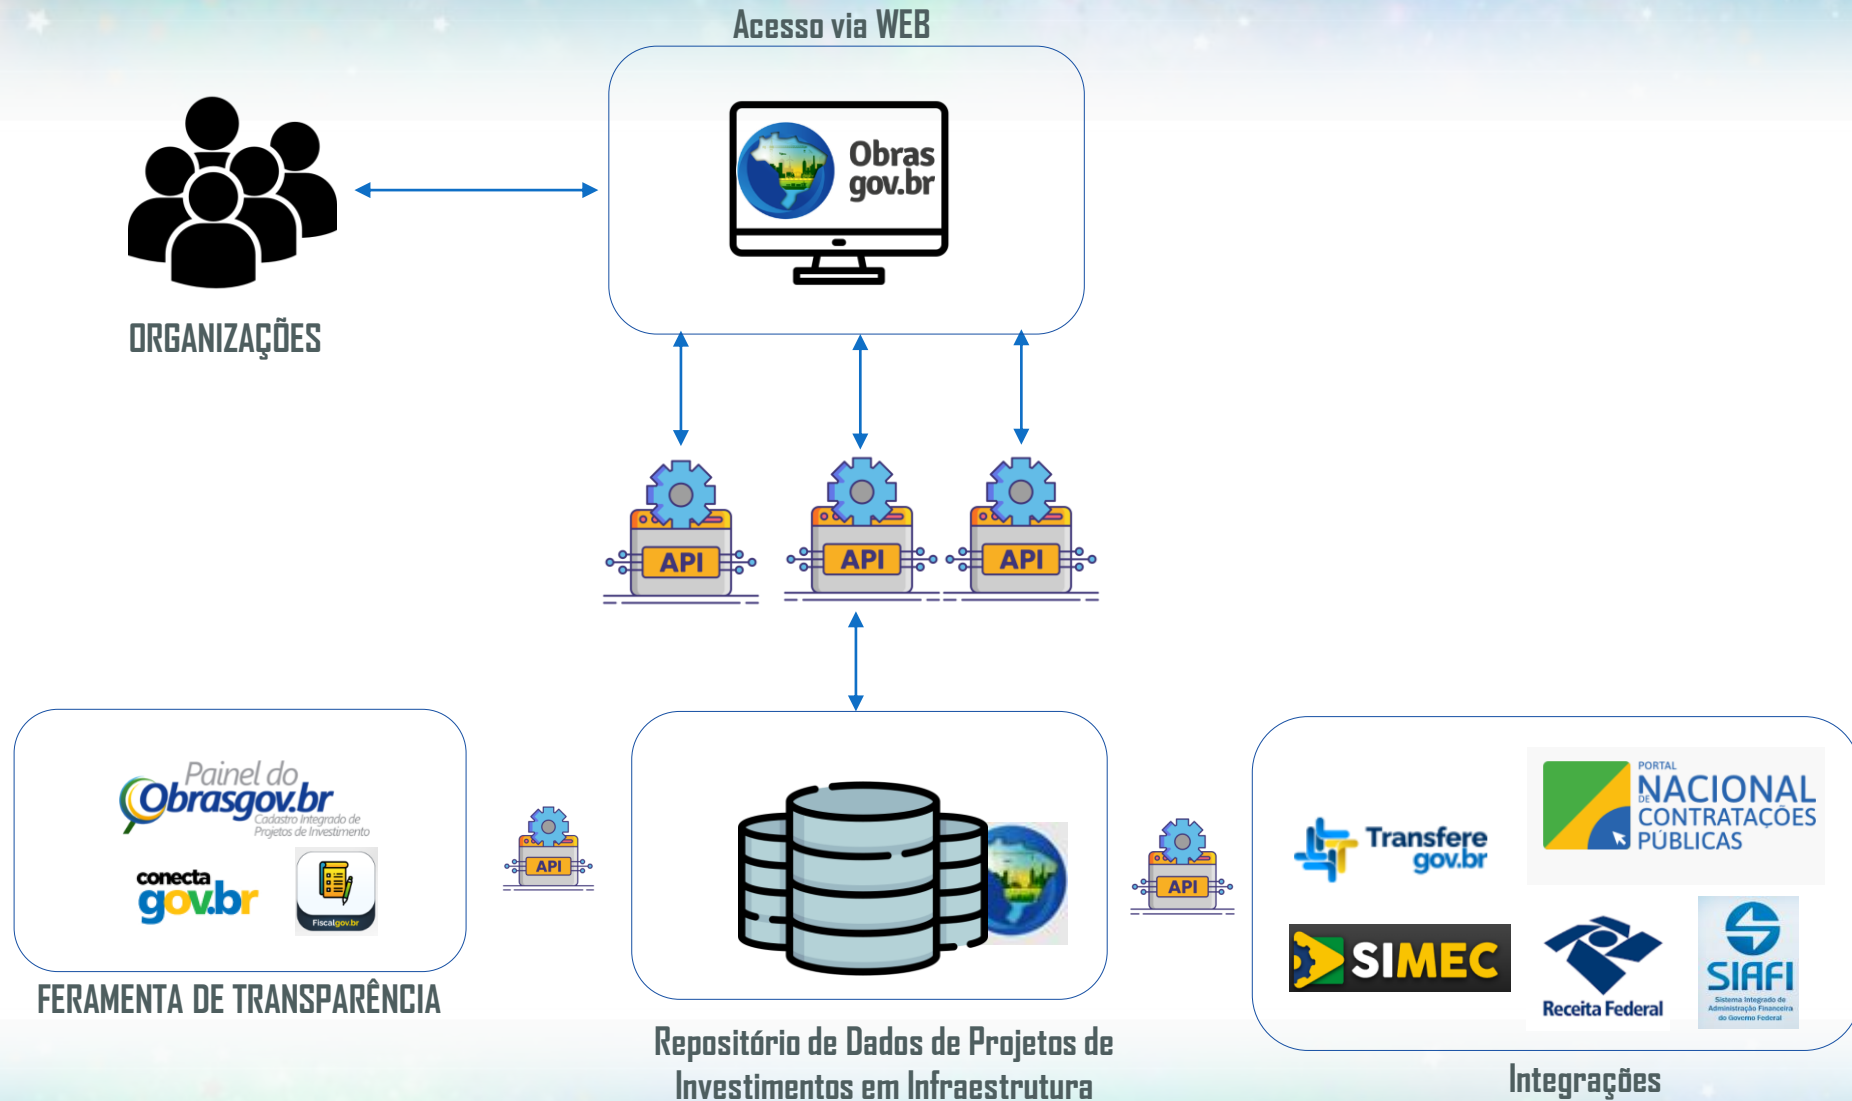

OBRASGOV: REPOSITÓRIO CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS




Obras
gov.br



ADESÃO ao OBRASGOV


REPOSITÓRIO CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS

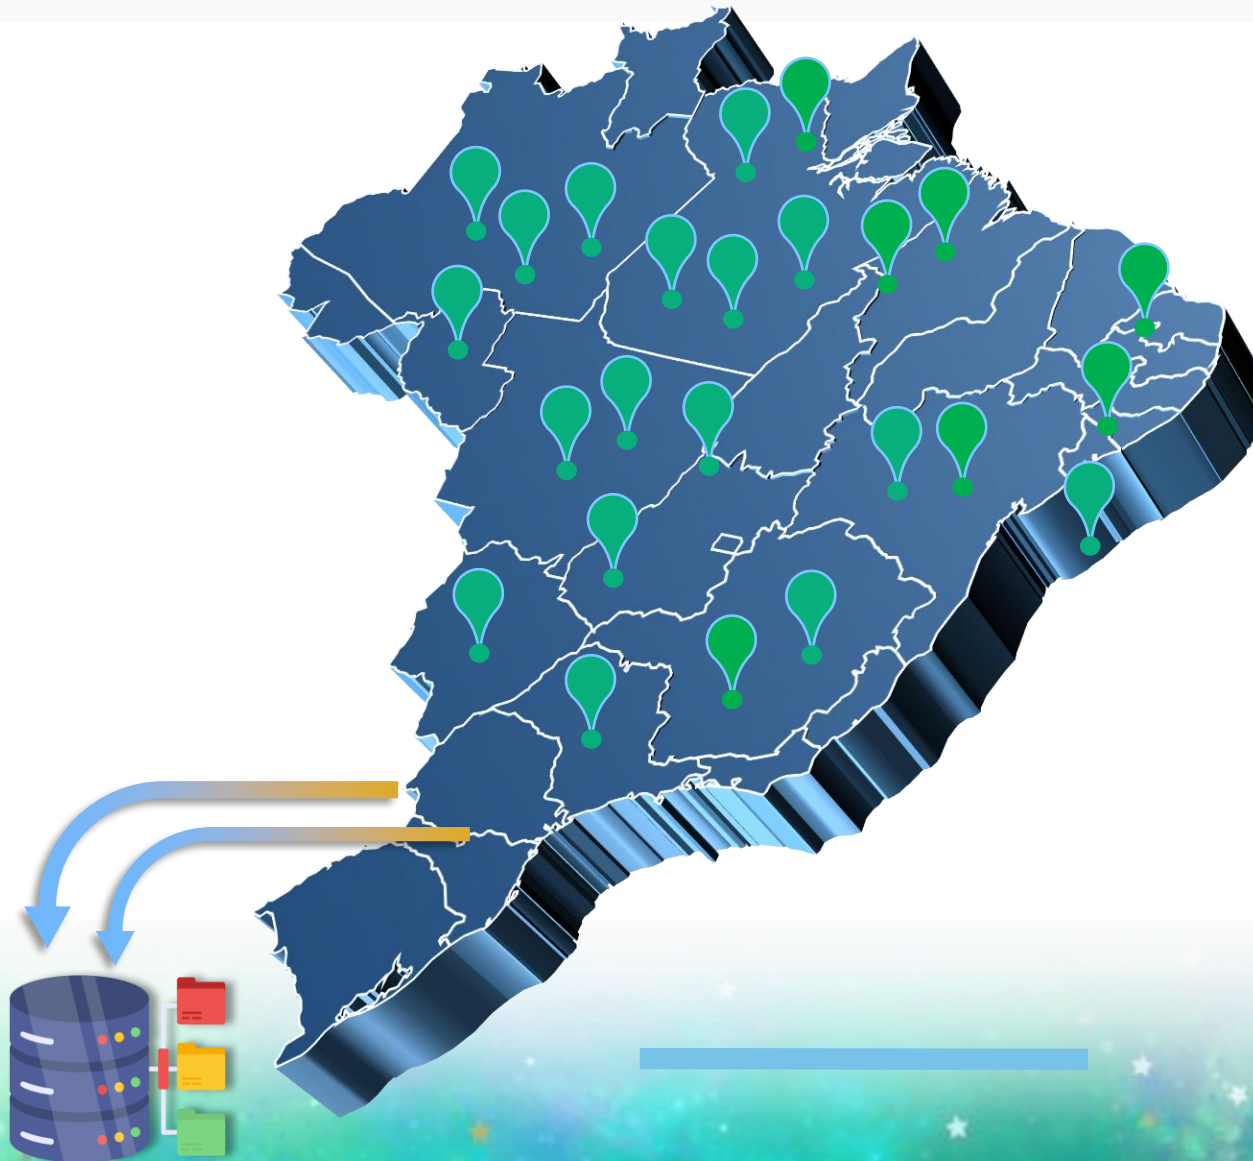

DADOS
CENTRALIZADOS



Obras
gov.br



FAÇA GOVERNANÇA E GESTÃO DE SUAS OBRAS.



OBRASGOV.BR 2.0

GOVERNANÇA E **GESTÃO** DA OBRA



BIM

Obras
gov.br

> Consulta de Obras

Sucesso. Seus documentos foram enviados com sucesso!

Gestão de Obras

26

Total de Obras

3

Obras Concluídas

3

Obras em Análise

8

Obras em Licitação

10

Obras Iniciadas

2

Obras Paralisadas

Lista de Obras



Identificador	Fase	Situação	Tipologia	Nome	Pendências	Ações
30958.31-62	Planejamento	Aguardando Análise	Pavimentação	Recapeamento Asfáltico das ruas 6, 6A e 9 no Bairro Emboabas	Documentos Aguardando Análise	
68497.95-59	Em Execução	Aguardando Emissão AIO	Barragem	Barragem Xingó	Autorização Ambiental	
69842.31-70	Prestação de Contas	Aguardando Aprovação	Creche	Creche Santa Terezinha	Em Reprogramação	
6546541.34-09	Planejamento	Em Análise	Pavimentação	Recapeamento Asfáltico das ruas 6, 6A e 9 no	Documentos Aguardando	

ObrasGov 2.0

Controle de Gestão de Obras

O que você procura?

Obras
gov.br

> Consulta de Obras

Analisar Documentos

Identificador da Obra

30958.31-62

Instrumento

1123.000/2025

Recebedor

MUNICIPIO DE IGARASSU

Data do Envio

13/03/2025

Situação

Planejamento - Enviado para Análise

[Dados](#)[Documentos](#)[Histórico](#)

Pesquisar

ART/RRT

☐ ART.pdf☐ RRT.pdf


Declarações



Projetos e Orçamentos

☐ Composição de preços.pdf☒ ESCOLA.IFC

ESCOLA.IFC

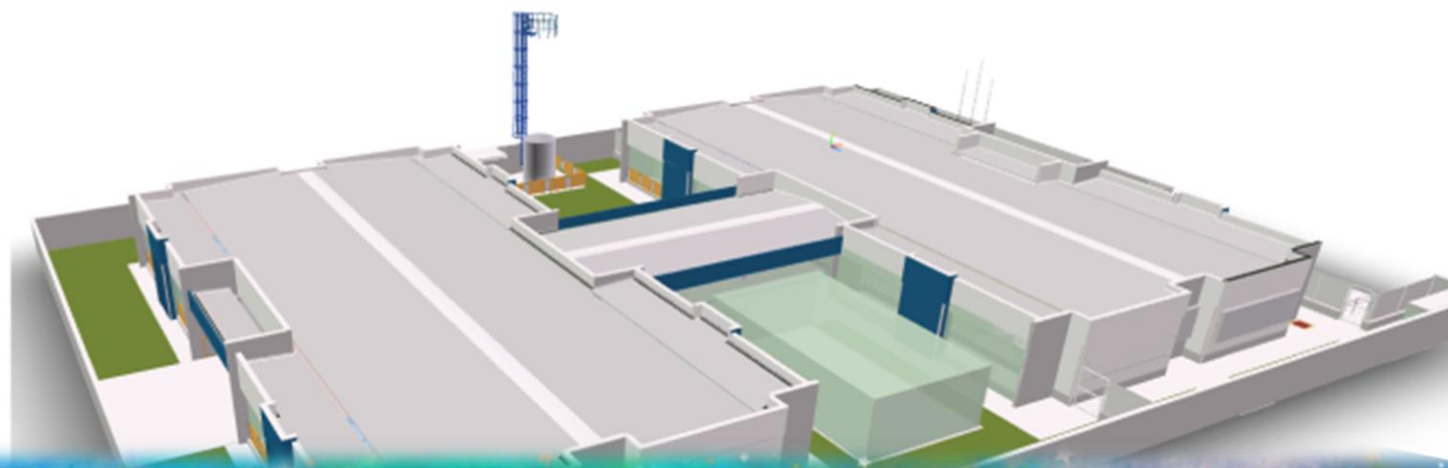[Histórico de Versões](#)



Obras
gov.br

☒ ACESSIBILIDADE I.pdf

Licenças Ambientais

☐ Rua Henrique Dias.pdf

☐ Rua Iúbia..pdf

 Baixar Selecionados

 Solicitar Documento

 Gerar PDF

Escreva suas observações

Declaração sem assinatura, favor enviar documento assinado



Comentários

 Rejeitar Documento

 Aprovar Documento

Versão 3



Laercio Dassunção Feltosa

Escola corrigida, versão final.

14/07/2024

Versão 2



Laercio Dassunção Feltosa

Escola com pendência sanada.

14/07/2024

Versão 1



Laercio Dassunção Feltosa

Escola redimensionado.

14/07/2024

 ObrasGov 2.0

Controle de Gestão de Obras

O que você procura?

 > Consulta de Obras

Envio de Documentos

Identificador da Obra

30958.31-62

Instrumento

1123.000/2025

Recebedor

MUNICIPIO DE IGARASSU

Data do Envio

13/03/2025

Situação

Enviado para Análise

Dados

Planilha Orçamentária

Documentos

Histórico

Planilha Orçamentária

Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Ações
1	Instalação da Obra				36.979,91	
11	Placa de Obra				823,91	
111	Placa de obra em chapa galvanizada adesivada, dimensões 2,40 x 1,20, padrão CEF	2,88	M2	286,08	823,91	
1.2	Tubo perfurado SUPRABLOC 100x100				36.153,00	

ObrasGov 2.0

Controle de Gestão de Obras

O que você procura?



> Gestão da Obra

Envio de Documentos

Identificador da Obra	Instrumento	Recebedor	Data do Envio	Situação
30958.31-62	1123.000/2025	MUNICIPIO DE IGARASSU	13/03/2025	Planejamento - Em Elaboração

Dados

Documentos

Histórico

Repassa

308799 - MIDR - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Recebedor

83.102.285/0001-07 Município de Balneário Camboriú

Identificador da Obra

30958.31-62

Nome da Obra

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 6, 6A, 9 E
RUA PEDESTRE NO BAIRRO EMBOABAS

Tipo de Execução

Execução Indireta

Natureza da Intervenção

2 - Obra

Espécie da Intervenção

1 - Construção

Localização do Projeto



- Acompanhamento (Gestão e Fiscalização) de Contratos vinculados às Obras;
- Utilização de ferramentas *BIM*;
- Ferramentas para gestão integrada de Escopo, Custos, Prazos, Riscos;
- Integração com demais sistemas para apoio à tomada de decisão (Governança Pública) - PPA/ LDO / LOA;

OBRASGOV.BR 2.0

GOVERNANÇA E **GESTÃO** DA OBRA

Obrigado

GIOVANNA FERREIRA

CGIMO/DTPAR/SEGES

CGIMO.DTPAR@GESTAO.GOV.BR

X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO-MASTER



PATROCÍNIO



APOIO



CO-REALIZAÇÃO

