Eletrobras

Aplicação dos Recursos Decorrentes da Lei 14.182/21

Fundos Regionais



Estrutura Analítica dos Projetos - EAP

Controle da Situação da Carteira

- 1-Análise Preliminar
- 2-Elaboração de TR
- 3- Elaboração de RC
- 4-Contratação
- 1-Planejamento Emissão de OS
- 6-Execução
- 7-Concluído

EDT	Nome da tarefa
0	Modelo Fundos Regionais
1	ETAPA 01 - Modelo Fundos Regionais
1.1	INICIAÇÃO
1.1.1	TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
1.1.2	LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1.3	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
1.1.3.1	Elaboração do Termo de referência (TR)
1.1.3.2	Gestão de Fornecedores
1.1.3.3	Processo de Suprimento
1.2	DESENVOLVIMENTO
1.2.1	PLANEJAMENTO
1.2.1.1	Plano de Gerenciamento do Projeto
1.2.2	EXECUÇÃO
1.2.2.1	Implantação do Projeto
1.3	MONITORAMENTO E CONTROLE
1.3.1	Monitoramento Avanço e Mudanças do Projeto
1.4	ENCERRAMENTO
1.4.1	Encerramento do Projeto

Context-Based Reverse SLA

Eletrobras

Eletrobras

Relatório de Prazos de Contratação – Fundos Regionais

Projeto: EF.026 SES Canarana-BA
Objeto da contratação: Implantação
Data do ofício: 20/08/2025
Data de envio do TR: 30/08/2025


esumo por Fase			
ase	Dias úteis	Data fim	Dias corridos
ecebimento e início da gestão do projeto	26	06/10/2025	37
ecebimento e início da contratação	6	14/10/2025	8
esenvolvimento da estratégia de compra	3	17/10/2025	3
mplementação da estratégia de compra	26	24/11/2025	38
nálise, negociação e seleção do proponente	37	14/01/2026	51
razo para Assinatura	98	14/01/2026	137

Formulário - Cálculo de Prazos

Selecione o projeto:
Objeto da contratação:
Data do ofício (dd/mm/aaaa):
Data de envio do TR (dd/mm/aaaa):
Tipo:
Valor:
Complexidade:
Regime de contratação:
Há fornecedores cadastrados?

Gerar Cronograma

Estrutura Analítica dos Projetos - EAP

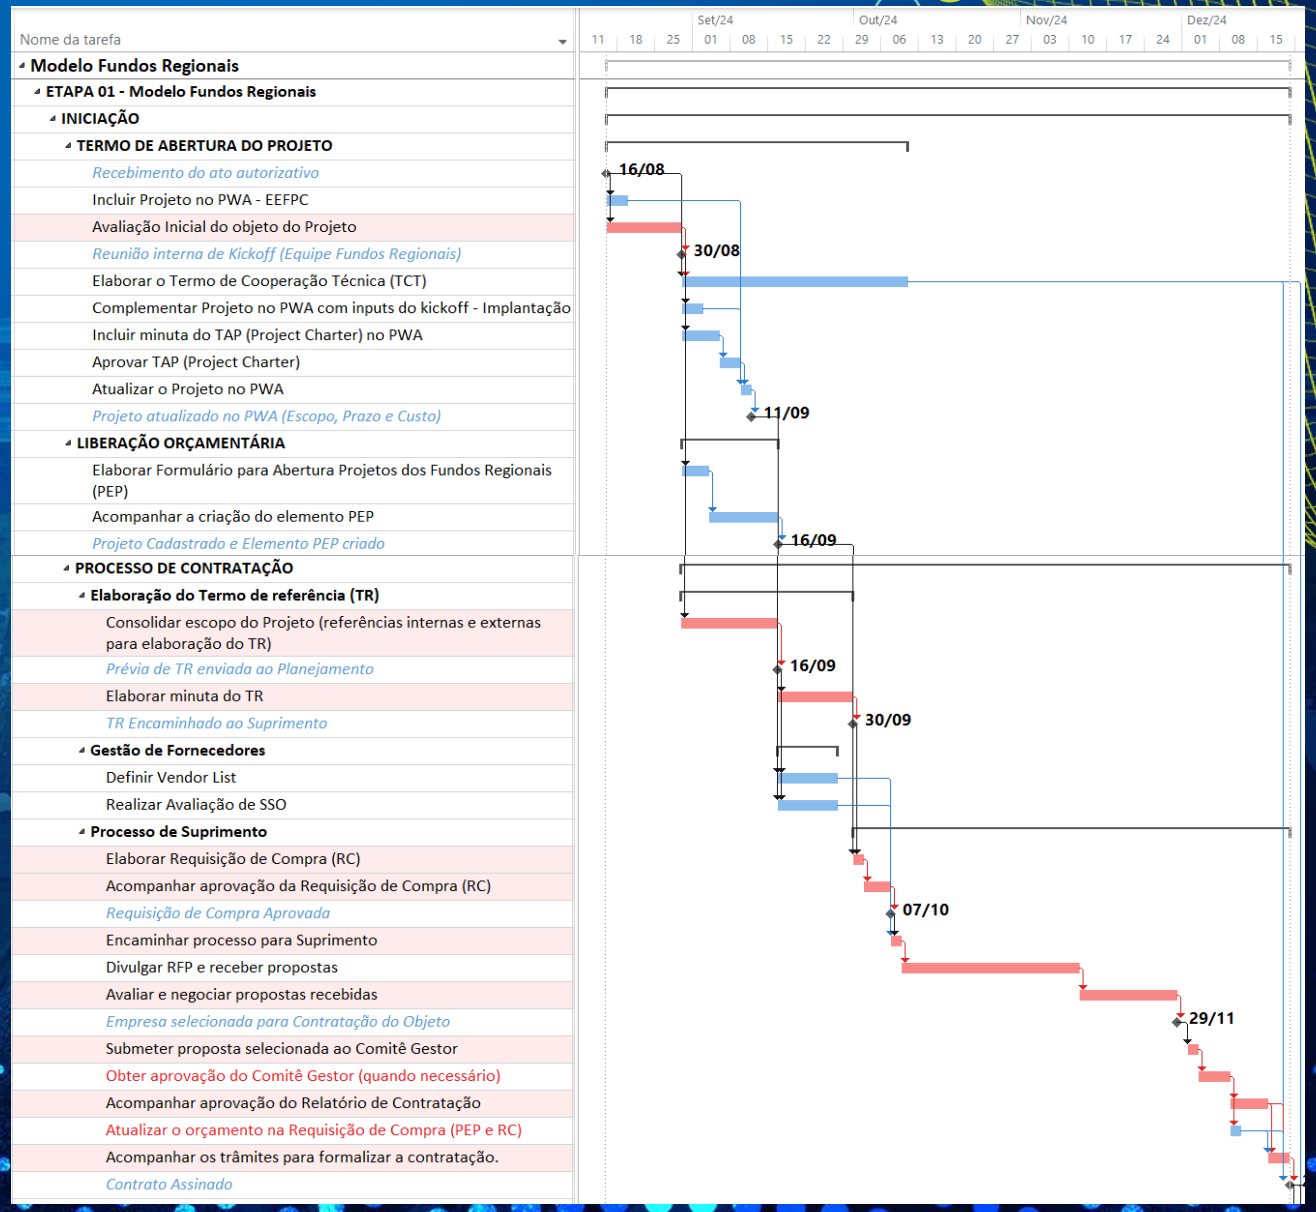

Estrutura Analítica dos Projetos - EAP

EDT	Nome da tarefa
0	**Lab de Analise de Contaminantes - Furnas**
1	**ETAPA 01 - Modelo Fundos Regionais**
1.1	**INICIAÇÃO**
1.1.1	**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**
1.1.1.1	*Recebimento do ato autorizativo*
1.1.1.2	Incluir Projeto no PWA - EEFPC
1.1.1.3	Avaliação Inicial do objeto do Projeto
1.1.1.4	*Reunião interna de Kickoff (Equipe Fundos Regio*
1.1.1.5	Elaborar o Termo de Cooperação Técnica (TCT)
1.1.1.6	Complementar Projeto no PWA com inputs do k
1.1.1.7	Incluir minuta do TAP (Project Charter) no PWA
1.1.1.8	Aprovar TAP (Project Charter)
1.1.1.9	Atualizar o Projeto no PWA
1.1.1.10	*Projeto atualizado no PWA (Escopo, Prazo e Cust*
1.1.2	**LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
1.1.2.1	Elaborar Formulário para Abertura Projetos dos (PEP)
1.1.2.2	Acompanhar a criação do elemento PEP
1.1.2.3	*Projeto Cadastrado e Elemento PEP criado*

EDT	Nome da tarefa
1.1.3	**PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**
1.1.3.1	**Elaboração do Termo de referência (TR)**
1.1.3.1.1	Consolidar escopo do Projeto (referências in para elaboração do TR)
1.1.3.1.2	*Prévia de TR enviada ao Planejamento*
1.1.3.1.3	Elaborar minuta do TR
1.1.3.1.4	*TR Encaminhado ao Suprimento*
1.1.3.2	**Gestão de Fornecedores**
1.1.3.2.1	Definir Vendor List
1.1.3.2.2	Realizar Avaliação de SSO
1.1.3.3	**Processo de Suprimento**
1.1.3.3.1	Elaborar Requisição de Compra (RC)
1.1.3.3.2	Acompanhar aprovação da Requisição de Co
1.1.3.3.3	*Requisição de Compra Aprovada*
1.1.3.3.4	Encaminhar processo para Suprimento
1.1.3.3.5	Divulgar RFP e receber propostas
1.1.3.3.6	Avaliar e negociar propostas recebidas
1.1.3.3.7	*Empresa selecionada para Contratação do Ob*
1.1.3.3.8	Submeter proposta selecionada ao Comitê G
1.1.3.3.9	Obter aprovação do Comitê Gestor (quando
1.1.3.3.10	Acompanhar aprovação do Relatório de Con
1.1.3.3.11	Atualizar o orçamento na Requisição de Com
1.1.3.3.12	Acompanhar os trâmites para formalizar a co
1.1.3.3.13	*Contrato Assinado*

1.2	**DESENVOLVIMENTO**
1.2.1	**PLANEJAMENTO**
1.2.1.1	**Plano de Gerenciamento do Projeto**
1.2.1.1.1	Mobilização para emissão da Ordem de Início dos Serviços
1.2.1.1.2	*Emissão da Ordem de Serviço (OS)*
1.2.1.1.3	Elaborar a Matriz de Responsabilidades do Projeto (RACI)
1.2.1.1.4	Elaborar a Matriz de Comunicação
1.2.1.1.5	Elaborar o Plano de Gerenciamento dos Riscos
1.2.1.1.6	*Plano de Gerenciamento do Projeto Publicado*
1.2.2	**EXECUÇÃO**
1.2.2.1	**Implantação do Projeto**
1.2.2.1.1	Realizar Kickoff com Steakholders (Gerente do Projeto)
1.2.2.1.2	Estudos de viabilidade/preliminares
1.2.2.1.3	Projeto Básico
1.2.2.1.4	Projeto Executivo
1.2.2.1.5	Programas Socioambientais
1.2.2.1.6	Terrenos e Servidões (Fundiário)
1.2.2.1.7	**Implantação (Material e Serviços)**
1.2.2.1.7.	Entrega Meta 01
1.2.2.1.7.	Entrega Meta 02
1.2.2.1.7.	Entrega Meta 03
1.2.2.1.7.	Entrega Meta 04

BPO - Business Process Outsourcing

Eletrobras

BPO de Compras

BPO de Engenharia Consultiva

BPO de Fiscalização

Aumento da Produtividade frente a pluralidade de objetos

Redução de custos, sobretudo o de pessoal

BPO

Business Process Outsourcing

Eletrobras

Aumento na Qualidade e desempenho dos processos

Otimização de tempo

Carteira de Projetos Aprovados


Programas de Revitalização e Pró-Amazônia Legal

164
Projetos Aprovados

R$3,4 BI
Investimentos nas Regiões
N, NE, SE, CO e S

19 + DF
Estados Impactados

1.747
Municípios diretamente
beneficiados

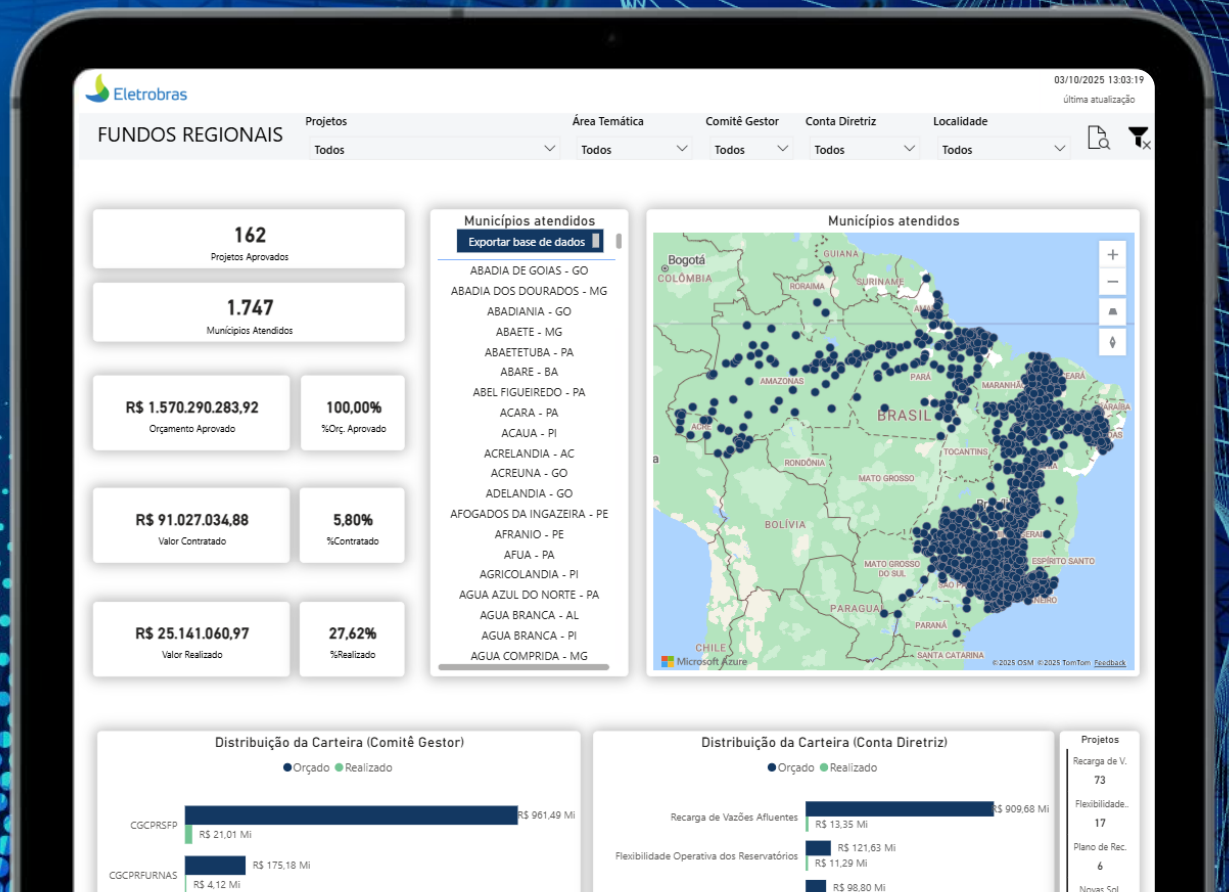

Eletrobras

OBRIGADO!

