SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Indicadores do Monitoramento e Controle da Programação

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

–

3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2015

Recife
25 de setembro de 2015

Sumário

Pág.

Introdução 3

1 – Resultados do Monitoramento 9

2 – Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) 13

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais 27

4 – Indicadores de Gestão de Convênios 34

5 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos 46

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e seus Anexos 49

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) com base nas metas definidas pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014 52

8 – Observações, Deliberações e Encaminhamentos da plenária de 25/09/2015 54

9 – Conclusão 57

Anexo I – Quadros do monitoramento 59

Anexo II – Gestão orçamentária e financeira em 2014 188

Anexo III – Projetos tabulados segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE 190

Anexo IV – Projetos tabulados segundo a programação do PPA 2012-2015 195

Introdução

A reunião do 3º ciclo de 2015, realizada em 25 de setembro, na sala Presidente Juscelino Kubitschek (13º andar da Ala Norte), foi a primeira na gestão do Superintendente João Paulo Lima e Silva e obedeceu ao cronograma previamente aprovado no final de 2014. Conduzida pela Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), vinculada à Superintendência, contou com a participação, além do dirigente máximo, também do novo Diretor de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos (DFIN), Ricardo Barros, recém empossado, e 31 outros servidores, entre Coordenadores-Gerais, Coordenadores e técnicos representantes da Auditoria (AUD), das Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS); de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), ambas da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN); das Coordenações-Gerais de Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF) e de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGDF), da Diretoria de Gestão de Fundos e de Atração de Investimentos (DFIN); e das Coordenações-Gerais de Logística, Administração e Finanças (CGAF); de Tecnologia da Informação (CGTI); de Gestão de Pessoas (CGGP), além da Coordenação de Gestão de Convênios (CGC), todas vinculadas à Diretoria de Administração (DAD). Tanto o Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Sérgio Alencar, como o de Administração, também recém empossado, Eugênio Pacelli Remigio Araújo, estavam em missão externa no momento do evento.

Foto 1 – Abertura da reunião do 3º Ciclo de Monitoramento de 2015, da SUDENE no dia 25/09/2015, pelo Superintendente João Paulo Lima e Silva.

Este ciclo contou com um total de 71 (setenta e um) projetos ou planos operativos (POs), e atendendo orientação da CGGI, 18 (dezoito) foram selecionados pelas próprias unidades para serem apresentados como destaque, observados um dos seguintes critérios: a)os mais representativos para a missão da SUDENE; b) sinalizarem potencial para replicagem na Região, ou, c) demandarem encaminhamentos para sua execução que estavam a exigir posição da administração superior.

Foto 2 – O Coordenador-Geral de Gestão Institucional, Manoel Barreiros, apresenta detalhes da metodologia de apresentação do Ciclo de Monitoramento.

Do total de 71 (setenta e um) projetos registrados no monitoramento, 25 (vinte e cinco) foram da CGDS/DPLAN, dos quais 4 (quatro) foram selecionados para a apresentação, 5 (cinco) foram da CGEP/DPLAN, todos selecionados, 28 (vinte e oito) do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, gerenciados pela CGDF/DFIN, dos quais 5 (cinco) foram selecionados, 3 (três) da CGGI, com um selecionado, 3 (três) da área de engenharia da DAD, onde 1 (um) foi selecionado, 3 (três) projetos e 1 (um) indicador da CGGP, sendo escolhido o indicador de capacitação para ser apresentado, 2 (dois) foram da CGTI, com 1 (um) selecionado. Somaram-se ao portfólio 2 (dois) projetos do PROCONDEL, mas sem destaques a pedido da própria equipe do projeto. Por sua vez, devido à reorganização interna do "Programa Água para Todos" e justificativa apresentada pela equipe, não foi possível a elaboração, a tempo, de informações para esse ciclo de monitoramento, circunstância, segundo eles, superável até o próximo encontro.

Essa mudança na metodologia de seleção dos projetos para apresentação na reunião visou atender expectativa do Superintendente, recém chegado, desejoso de conhecer os principais projetos em curso na Autarquia.

Foto 3 – O Superintendente da SUDENE, João Paulo, e Assessores debatem sobre os projetos prioritários apresentados pelas unidades durante reunião do 3º Ciclo de 2015, da SUDENE.

Toda a análise crítica e ajustes que precederam à reunião, foram realizados em conjunto com as equipes técnicas das unidades e o material de exposição encaminhado com antecedência aos gestores e responsáveis, por meio eletrônico para acompanhamento durante a reunião. Além disso, O Superintendente, o Diretor da DFIN e a equipe de assessores de João Paulo, receberam impressos, os planos operativos e a apresentação para facilitar a primeira participação.

A data de referência para a apuração dos dados foi fixada em 28 de agosto de 2015. A entrega das informações foi estabelecida para 04 de setembro e o relatório, espécie de ata detalhada dos resultados, sempre preparado pela CGGI, será encaminhado nas primeiras semanas de outubro, inclusive para publicização no site da Autarquia. Nele consta todos os planos operativos atualizados, com quadros e gráficos que mostram a performance segundo diretrizes, objetivos estratégicos, programas e ações do PPA.

As fotos adiante (4 e 5) mostram, respectivamente, os titulares da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Carlos Almiro, e da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Frederico Cavalcanti, ambos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, apresentando seus principais projetos e problemas de execução em decorrência da escassez de diárias e passagens para a vistoria e encerramento dos convênios. A foto 6 mostra o responsável pela área de Engenharia, da Diretoria de Administração, José Wilson Galdino, expondo, a pedido do Superintendente João Paulo, a situação dos projetos relacionados com a recuperação estrutural das fundações, a recuperação do Anexo Nilo Coelho e o andamento dos trabalhos da subestação, destacando as medidas que exigem posição da administração superior da Autarquia. Nesse contexto o Superintendente destacou sua preocupação com o baixo ritmo dos acordos com o Ministério da Saúde e do IBGE, condôminos do prédio, que deveriam estar em outro patamar de realização e não estão, particularmente pelo prazo dado pela Justiça Federal para o encaminhamento de solução aos principais problemas que afetam a estrutura física do prédio.

Foto 4 – Explanação do Coordenador-Geral da CGDS, Carlos Almiro, sobre os projetos de sua unidade, os desdobramentos para o futuro, e medidas necessárias para a retomada das vistorias de convênios.

Foto 5- Debate entre a Assessora do Superintendente, Lygia Falcão, e o Coordenador-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Frederico Cavalcanti, da DPLAN, sobre o projeto de Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE

Foto 6 – Explanação do Engenheiro José Wilson Galdino, da CGAF/Engenharia, sobre a posição das obras do prédio da SUDENE.

Em âmbito geral, ainda são muitos os projetos com etapas em atraso ou com status geral de atraso, mas segundo a Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS) e a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), ambas da Diretoria de Planejamento, isso se deve a problemas de planejamento do executor ou de acompanhamento do próprio convenente. Outros casos, porém, são originados da própria SUDENE, em razão dos atrasos devido à espera de recursos para vistoria (diárias e passagens). Nesse sentido, a proposta é que os Diretores de cada área busquem medidas que possam levar à superação desses obstáculos, transmitindo à Superintendência apenas os casos que exijam um tratamento político ou decisão em um nível mais elevado em razão da complexidade do problema.

Quanto à metodologia, os procedimentos de verificação da consistência por parte da CGGI se mantiveram os mesmos de outros ciclos, lembrando que projetos que apresentaram etapas na situação de "Atraso", desde que o prazo geral de execução não esteja vencido na data do "travamento das informações" foram considerados "Em Andamento" conforme definido em ciclos anteriores.

Relembra-se, também, foi apropriado do Plano Plurianual do Governo Federal o conceito de "Medida Institucional Normativa (MIN)", que é aquela que, de acordo com o PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.

Por sua vez, os referenciais para o enquadramento dos projetos na programação estratégica continuam os mesmos aprovados pela Diretoria Colegiada em sua 132ª reunião, realizada em 27/02/2013:

- Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste

Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.
Objetivo 1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva;
Objetivo 1.3 – Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;
Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido;
Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas.

- Diretriz 2 – Universalizar o acesso a ativos estratégicos

Objetivo 2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis;
Objetivo 2.2 - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido;
Objetivo 2.3 - Promover a sustentabilidade ambiental;
Objetivo 2.4 – Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil.

- Diretriz 3 – Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE

Objetivo 3.1 - Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências;
Sub-objetivo 3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras;
Sub-objetivo 3.1.2 – Modernizar a gestão;
Sub-objetivo 3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores;
Objetivo 3.2 - Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação;
Objetivo 3.3 – Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho.
Nota:
- Objetivo 3.1: a modernização da gestão compreende como pressupostos: a adequação da estrutura de pessoal da SUDENE às diretrizes estratégicas da SUDENE; a implantação de processos correspondentes a essas diretrizes e atribuições; e, a adoção de tecnologias adequadas às suas atribuições (sistemas, softwares, hardware, segurança da informação).

- Diretriz 4 – Fortalecer a imagem da SUDENE

Objetivo 4.1 - Fortalecer a comunicação interna e externa, bem como as articulações institucionais (parcerias, sinergias, formação de redes);
Objetivo 4.2 – Elevar os colegiados da SUDENE a um patamar de fórum para discussão de temas estratégicos sobre desenvolvimento regional.

Notas:
- Objetivo 4.1: a dinamização da comunicação interna e externa compreende: a disponibilização de informações geradas pelas unidades internas no contexto de suas atribuições, como insumo à decisão, seja ela de natureza política, estratégica ou administrativa.
- Objetivo 4.2: a utilização dos colegiados da SUDENE como instrumentos estratégicos e táticos de fortalecimento institucional decorre de que o Conselho Deliberativo, por ser instância de decisões políticas da SUDENE e reunir governadores e ministros de estado, deve se debruçar sobre pautas realmente estratégicas e sensíveis para o desenvolvimento regional, e seus comitês,

sobre questões técnicas que exijam consenso para a harmonia social, econômica e até litigiosa, a exemplo das posições divergentes entre os poderes judiciário federal e executivo dos estados do Nordeste, na questão dos incentivos fiscais como instrumento de atração de investimentos.

Encontra-se em andamento, em razão de problemas de natureza orçamentária e das restrições econômicas que afetam a economia brasileira e a administração pública neste momento, estudos destinados a promover a primeira alteração da Portaria nº 193 aprovada em 17/12/2014, que fixou as metas de desempenho institucional, tendo em vista que não se cumpriram, por parte do Governo Federal, e após 30 de junho deste ano, as expectativas de retomada da normalidade na execução da LOA 2015.

Também cabe relembrar registro do relatório anterior, de que ajustes promovidos em junho deste ano, com a substituição de projetos, não alteraram a configuração do anexo da Portaria nº 193/2014, diferentemente do que agora se faz necessário.

As observações, deliberações e encaminhamentos da alta administração surgidas na plenária de 25/09/2015 constam de capítulo específico deste relatório.

1- Resultados do monitoramento

1.1– Resultados do 3º Ciclo de Monitoramento 2015

O Gráfico 1, adiante, visa mostrar o comportamento dos projetos quanto ao seu andamento entre o 1º e o 3º ciclo de monitoramento.

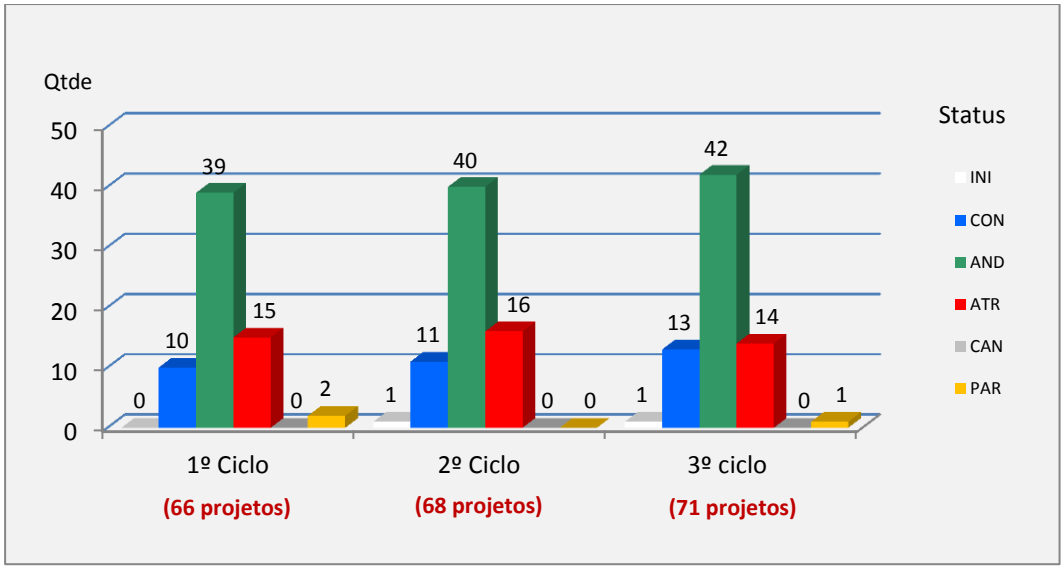

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Gráfico 1 – Situação dos Planos Operativos segundo cada Ciclo de 2015

A Tabela 1, adiante, detalha a distribuição dos projetos segundo diretrizes e objetivos estratégicos da SUDENE, os recursos previstos e liberados e o status desses projetos segundo a programação estratégica vigente.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2015

Diretriz Estratégica[1]	Objetivo Estratégico[1]	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R$ 1 mil)	Recursos liberados (R$ 1 mil)	Status[2]						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	47	9.294.854,78	5.858.730,21	1	10	25	11	-	-	47
	1.2	1	0,00	0,00	-	-	1	-	-	-	1
	1.4	1	0,00	0,00	-	-	1	-	-	-	1
	1.5	3	234,11	139,87	-	1	2	-	-	-	3
2	2.3	3	1.366,31	265,24	-	-	3	-	-	-	3
	2.4	2	579,78	518,98	-	1	-	1	-	-	2
3	3.1	5	61,60	6,60	-	-	4	1	-	-	5
	3.2	4	3.563,96	1.358,30	-	-	3	1	-	-	4
	3.3	3	21.890,21	9.188,73	-	-	2	-	-	1	3
	MIN	2	0,00	0,00	-	1	1	-	-	-	2
TOTAL		**71**	**9.322.550,73**	**5.870.207,92**	**1**	**13**	**42**	**14**	**0**	**1**	**71**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional/SUDENE
Convenções:
1 - As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.
2 - INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.
Observações:
a) Os denominados "Projetos Enquadrados" quantificados na terceira coluna, incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.
b) Os dados sobre "Recursos Liberados" consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.
Referência: 28/08/2015 (3º Ciclo de monitoramento-2015)

A Tabela 2, por sua vez, detalha a distribuição dos 71 projetos segundo programas e ações do PPA 2012-2015, mostrando ainda, os recursos previstos, liberados e o andamento de cada projeto segundo cada ação do PPA.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2015

Programa do PPA (Código)[1]	Ação do PPA (Código)[1]	Projetos enqua-drados (qtde)	Recursos previstos (R$ 1 mil)	Recursos liberados (R$ 1 mil)	Status[2]						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029	0355	28	9.274.269,59	5.849.504,66	-	8	10	10	-	-	28
	4640	2	2.252,99	1.509,74	-	-	2	-	-	-	2
	8340	2	2.857,02	2.857,02	-	-	2	-	-	-	2
	8689	2	1.366,31	265,24	-	-	2	-	-	-	2
	8902	8	13.032,50	3.519,70	-	1	6	1	-	-	8
	8917	2	617,75	107,35	-	-	2	-	-	-	2
	8918	2	1.465,46	915,46	-	-	2	-	-	-	2
	20N7	1	343,59	206,15	-	-	1	-	-	-	1
	7K66	1	250,00	250,00	-	-	1	-	-	-	1
2040	8172	2	579,78	518,98	-	1	-	1	-	-	2
2111	2000	12	25.515,77	10.553,63	-	-	9	2	-	1	**12**
-	MIN	9	0,00	0,00	1	3	5	-	-	-	**9**
TOTAL		**71**	**9.322.550,73**	**5.870.207,92**	**1**	**13**	**42**	**14**	**0**	**1**	**71**

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Convenções:

(1) – Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2012-2015: Programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (Ações: 0355 – Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; 4640 – Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; 8689 – Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; 8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica; 8917- Fortalecimento das Administrações Locais; 8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas;; 20N7 – Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria); Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (Ação 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil). Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional (Ação 2000 – Administração da Unidade); Ações internas - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e quando relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional continuam como internas, e quando destinam-se a fornecer insumo para a melhoria da qualidade da gestão são chamadas de MIN – Medida Institucional Normativa.

(2) INI - A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Observações:

a) Os denominados "Projetos Enquadrados" incluem os projetos apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.

b) Os dados sobre "Recursos Liberados" consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Referência: 28/08/2015 (3º Ciclo de monitoramento 2015)

O gráfico 2, adiante, foi elaborado com base nos dados da tabela 1.

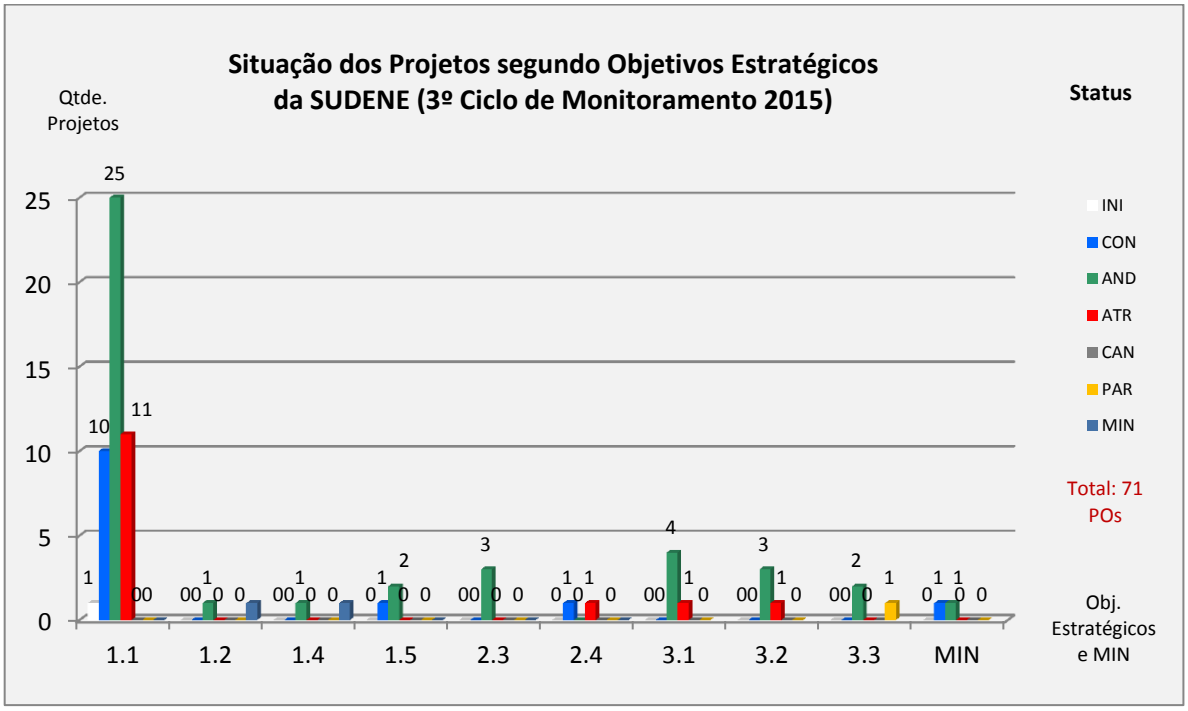

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

Gráfico 2 – Situação dos projetos quanto ao andamento, segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2015)

O gráfico 3, a seguir, mostra os desembolsos de recursos segundo objetivos da programação estratégica da SUDENE, contabilizados até o 3º ciclo de monitoramento.

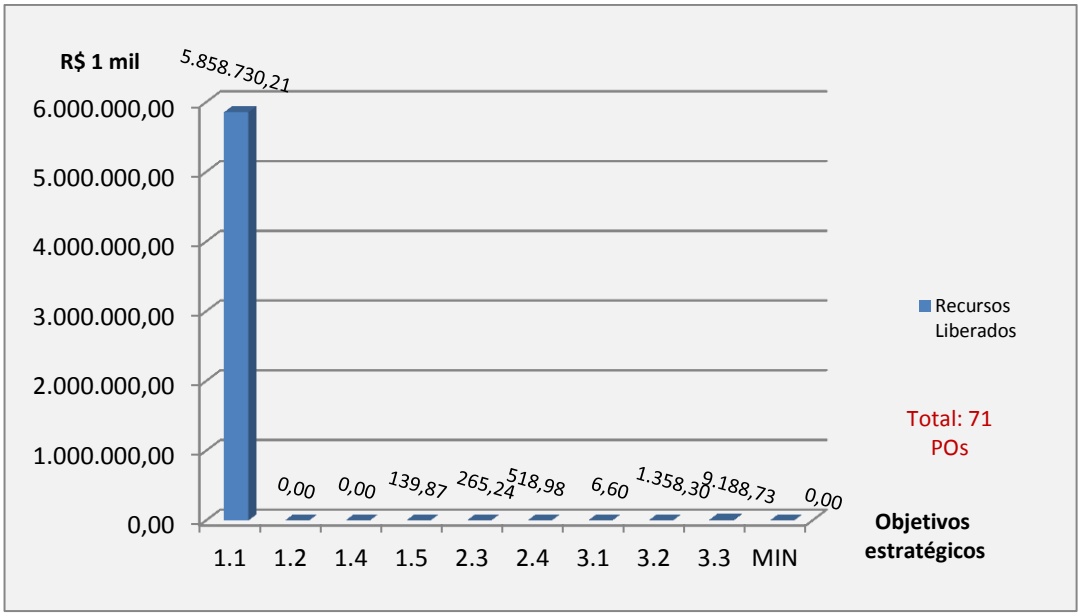

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Nota: As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos estão detalhadas na introdução e **MIN** – Medida Institucional Normativa são aquelas que fornecerão insumos para a melhoria da gestão no contexto dos trabalhos da unidade.

Gráfico 3 – Recursos liberados segundo Objetivos Estratégicos da SUDENE (3º Ciclo – 2015)

À luz da estrutura regimental estabelecida pelo Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014, os 71 Planos Operativos estão assim distribuídos:

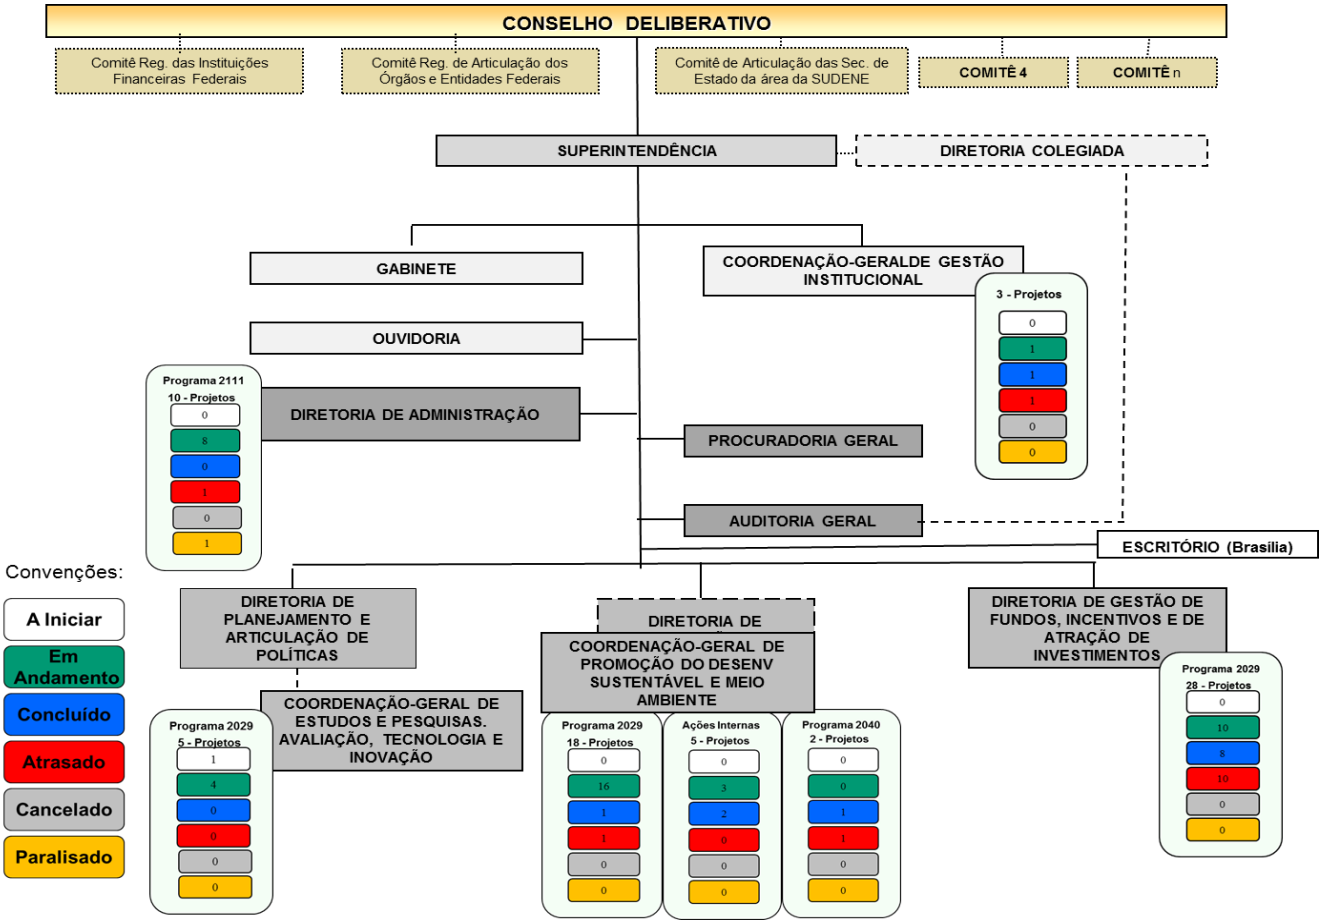

2 - Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

2.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC))

a)Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas x 100}}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}}$ [1] $= \frac{10 \times 100}{10} = 100{,}00\ \%$

b)Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários: Não foi informado

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	98,6 %	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	57,14%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	100%	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica

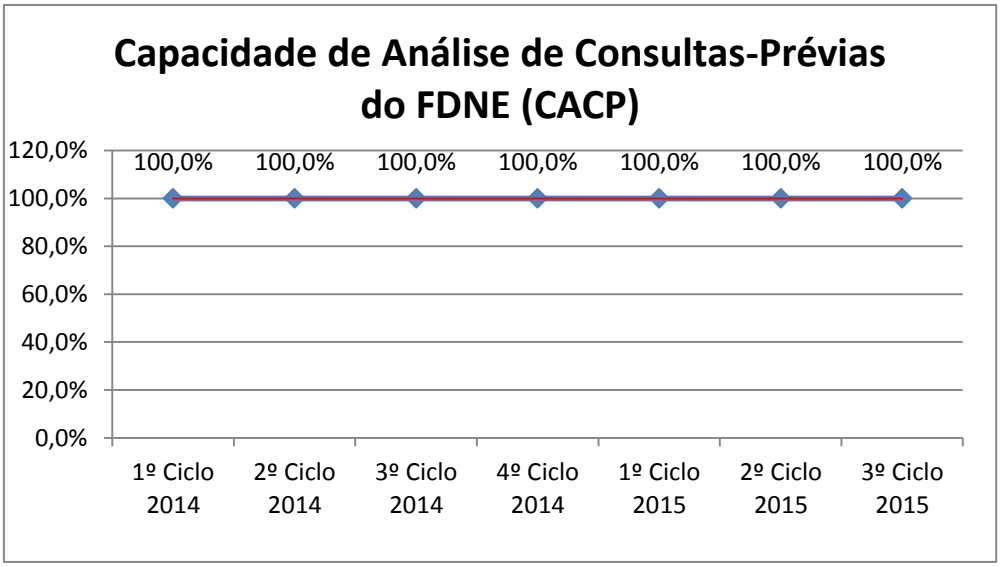

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:

[1] até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

2.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a)Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Analisadas}}{\text{Nº de Técnicos}} = \frac{10}{6} = 1{,}67$ análises/técnico

b)Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (índice): ...(quanto maior melhor)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários: O menor resultado deve-se à demanda, que diminuiu.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	2,05 análises/técnico	-
Jan a Nov/2012	0,67 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	2,67 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	6,00 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	6,50 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	11,67 análises/técnico	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	11,67 análises/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	3,50 análises/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	3,57 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,43 análise/técnico	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

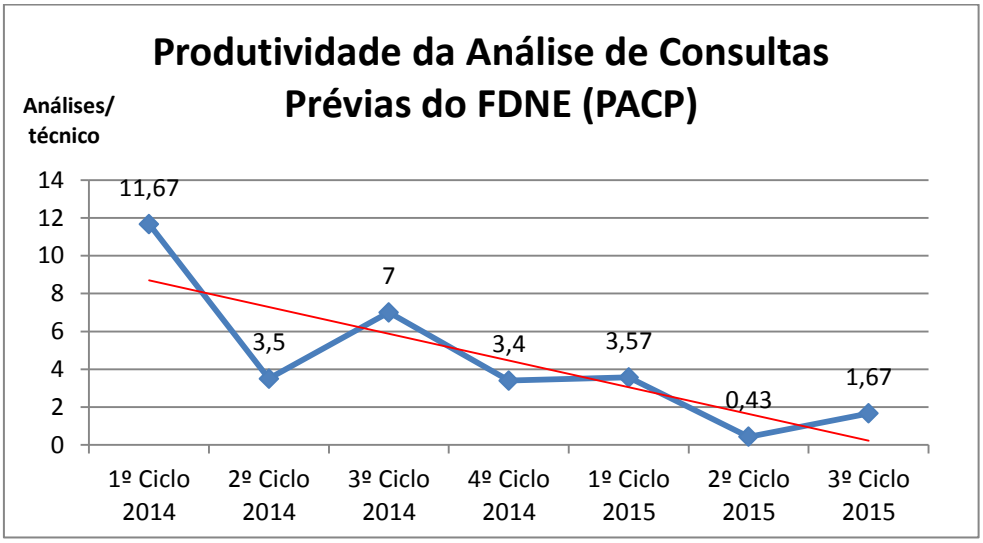

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.3 - Consistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Consultas Prévias Devolvidas x 100}}{\text{Consultas Prévias Protocoladas}}$ [1] $= \frac{4 \times 100}{10} = 40\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDENE).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários: -

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	40,80 %	-
Jan a Nov/2012	100,00 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	50,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	46,15 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	40,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	40,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	71,43%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	71,43%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	62,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,00%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,00%	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

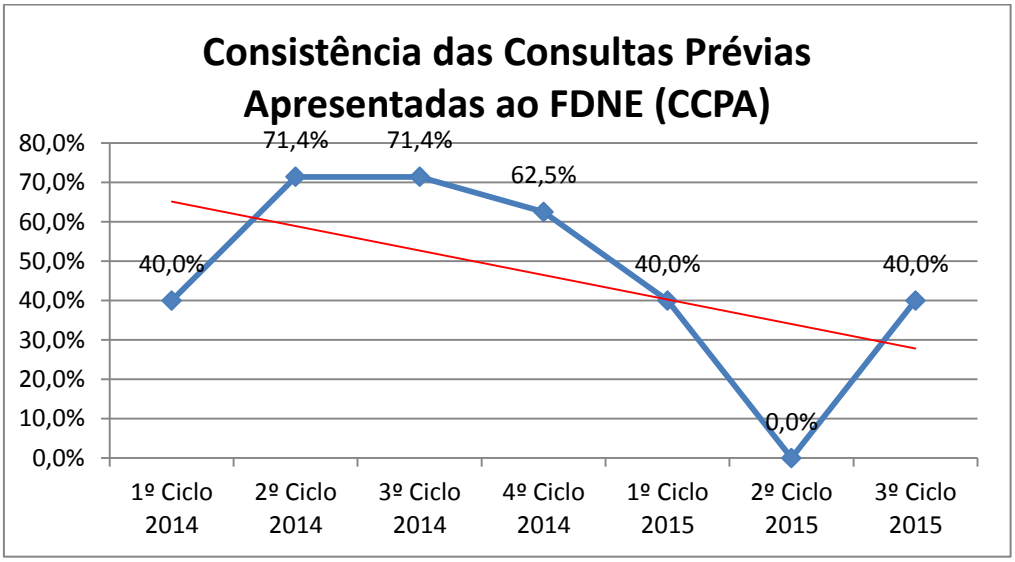

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota:
[1] Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

2.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{\text{90 dias}} = \frac{\text{0,0 dias}}{\text{90 dias}} = 0{,}00$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{\text{90 dias}} = \frac{\text{0,0 dias}}{\text{90 dias}} = 0{,}00$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (CEF)}}{\text{90 dias}} = \frac{\text{0,0 dias}}{\text{90 dias}} = 0{,}00$

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (índice): ..... (igual ou menor que 1 (um))

e) Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários: O prazo considerado exclui as prorrogações legais previstas. Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. O BNB e a CEF não concluíram nenhuma análise de projeto no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 1,35; BB 0,70; CEF 1,63	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 1,35; BB 0,82; CEF 1,63	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 1,35; BB 0,94; CEF 1,63	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00; BB 1,66; CEF 1,67	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00; BB 1,82; CEF 3,56	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 0,00; BB 1,30; CEF 1,52	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	BNB 0,00; BB 1,50; CEF 0,00	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

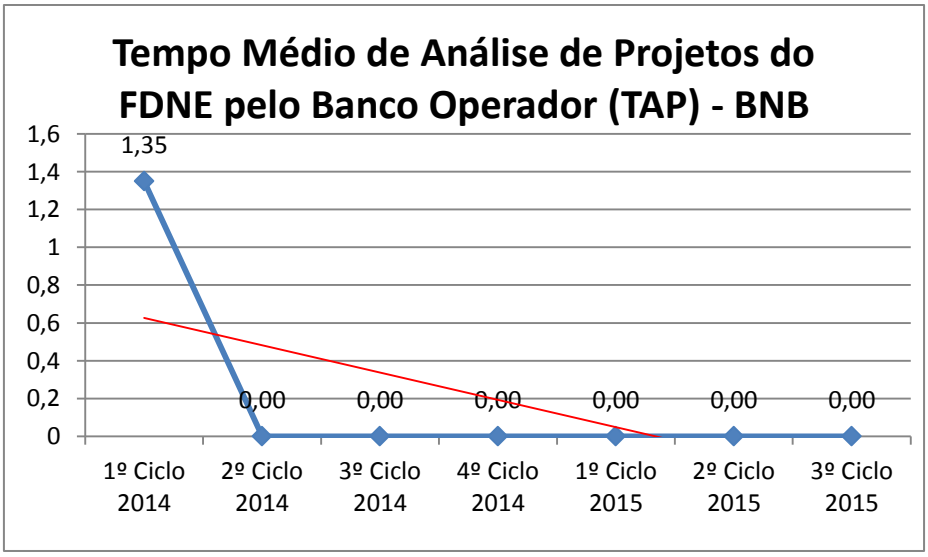

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

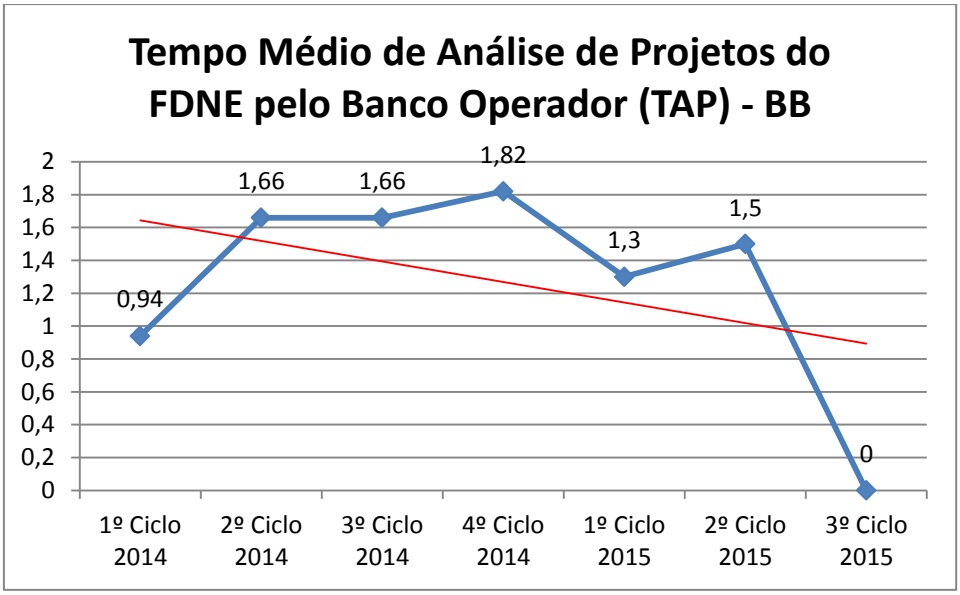

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

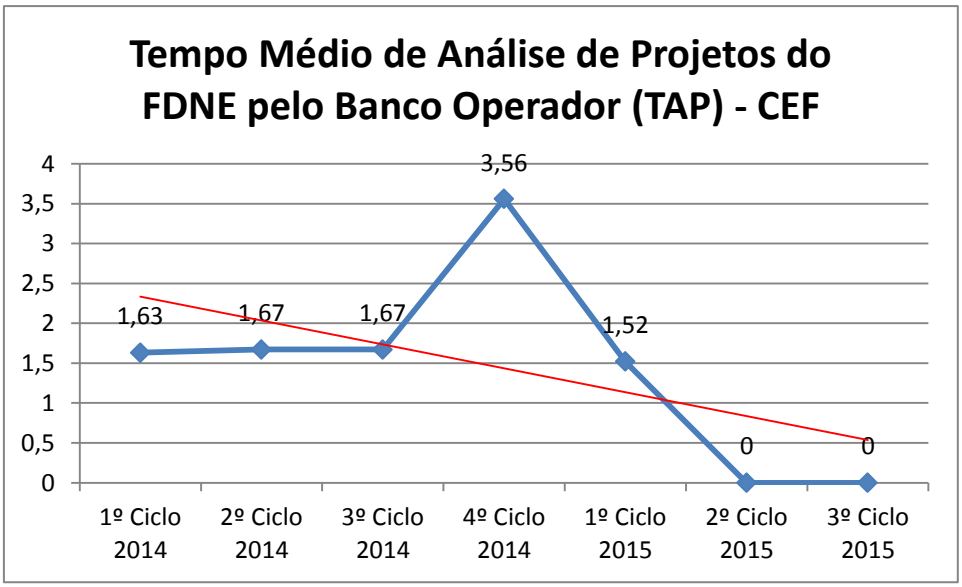

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos dispendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

2.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

$$\text{Fórmula: } \frac{\text{Projetos Arquivados x 100}}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \text{ x } 100}{0} = 0\%$$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Projetos Arquivados x 100}}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{2 \text{ x } 100}{2} = 100\%$

Observação: um dos projetos arquivados pelo Banco do Brasil foi apresentado em 2014.

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

Fórmula: $\frac{\text{Projetos Arquivados x 100}}{\text{Projetos Apresentados}} = \frac{0 \text{ x } 100}{0} = 0\%$

b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2015

f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00 % (incluía até então, apenas o BNB).	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	BNB 0,00 %; BB 0,00 %; CEF 0,00 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	BNB 0,00%; BB 0,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	BNB 0,00%; BB 0,00% ; CEF 0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	BNB 0,00%; BB 100,00%; CEF 0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	BNB 0,00%; BB 40,00%; CEF 0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	BNB 100%; BB 66,70%; CEF 33,30%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	BNB 0,00%; BB 50,00%; CEF 0,00%	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

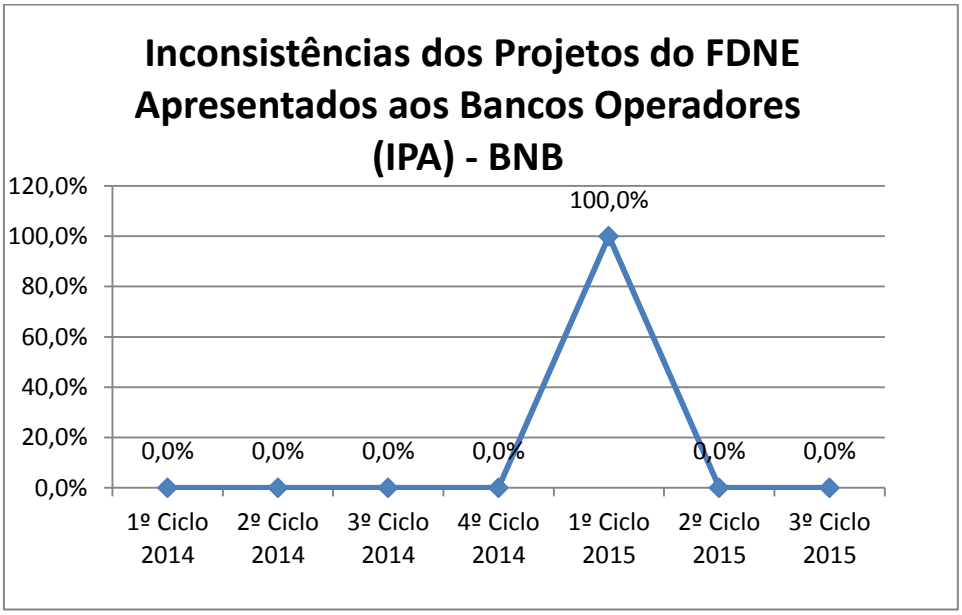

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

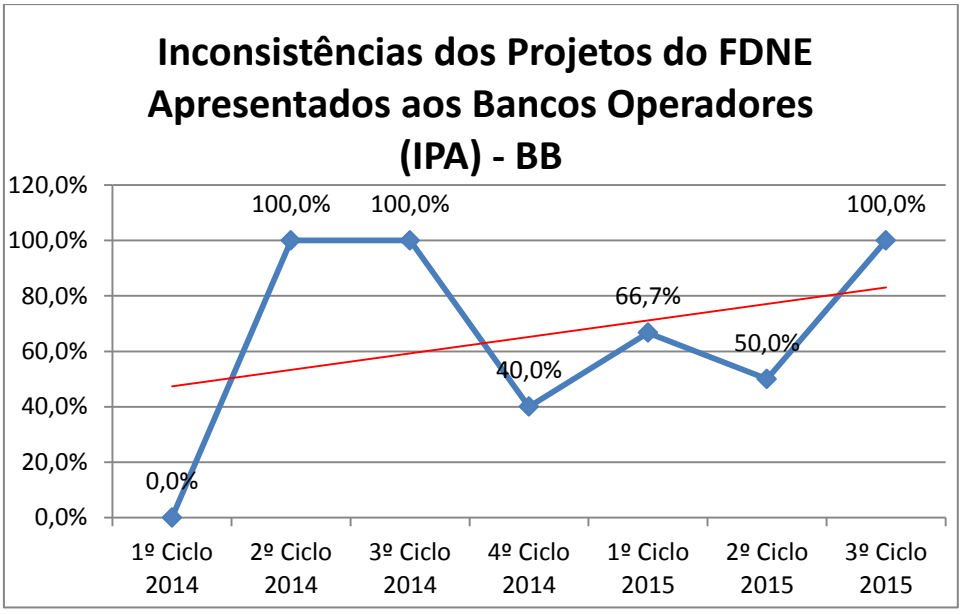

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

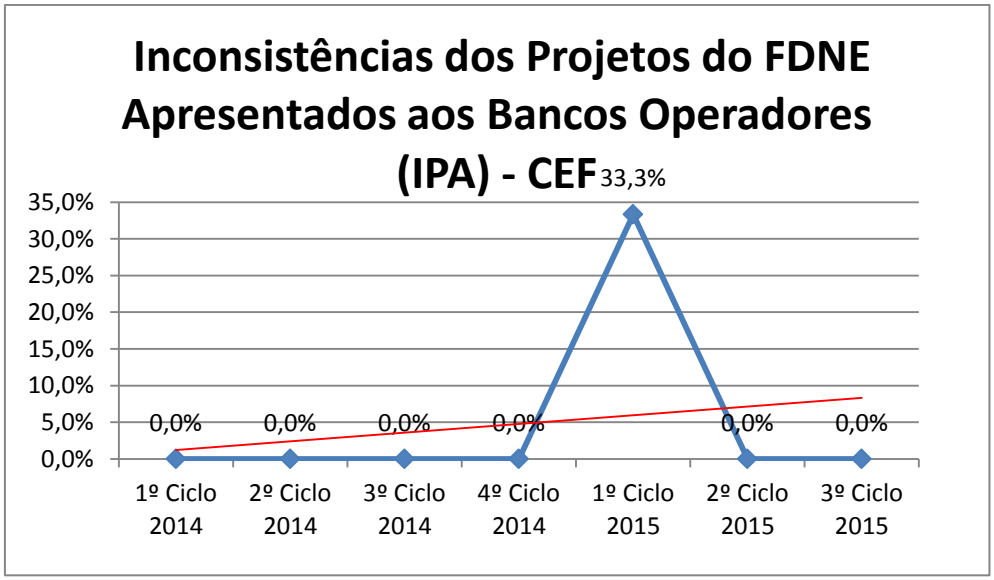

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado LOA 2015 x 100}}{\text{Dotação LOA 2015}} = \frac{257.145.223,88 \text{ x } 100}{2.022.481.635,00} = 12,71\%$

b)Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f) Comentários: Não informado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	100,0 %	-
Jan a Nov/2012	0,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	99,14 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	61,24 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,24 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,26%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	2,52%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	93,3%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100,%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	12,7%	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

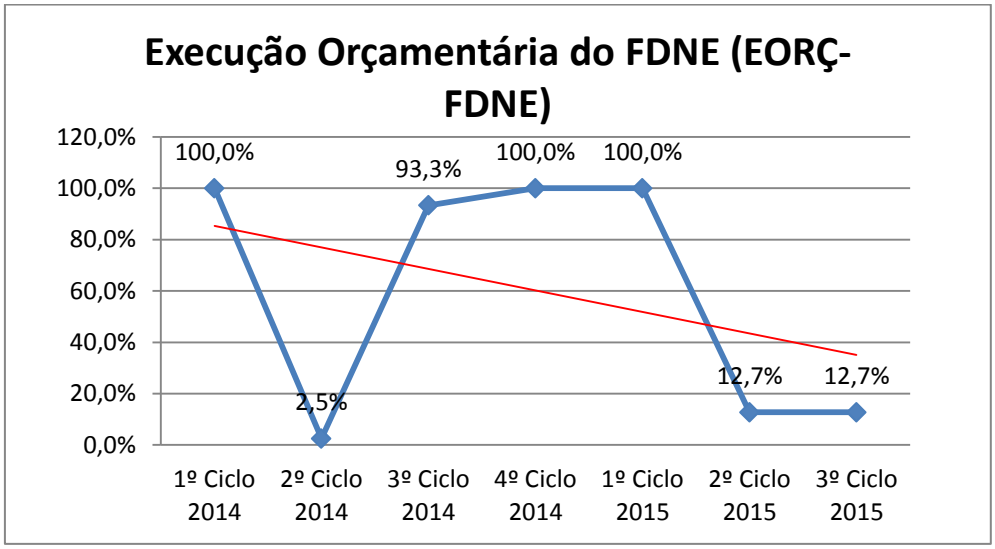

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Liberados} \times 100}{\text{Total de Recursos Empenhados}} = \frac{473.530.514,17 \times 100}{3.523.735.583,93} = 13,44\%$

Atenção: No ciclo anterior, por equivoco, foram informados todos os recursos liberados e o total dos empenhos realizados desde o primeiro projeto aprovado. Neste ciclo a relação matemática voltou a ser corretamente aplicada conforme descrito no item "b", como também, refeito o resultado informado no 2º ciclo (ver o item "g").

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

d) Resultado ideal (%): 100,00 % (quanto maior melhor)

e) Referência da aferição: jan-ago/2015

f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	14,20 %	-
Jan a Nov/2012	0,00 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	3,25 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	11,70 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	11,70 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,43%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	18,43%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,46%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,68%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	36,50%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	40,10 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	5,37%	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

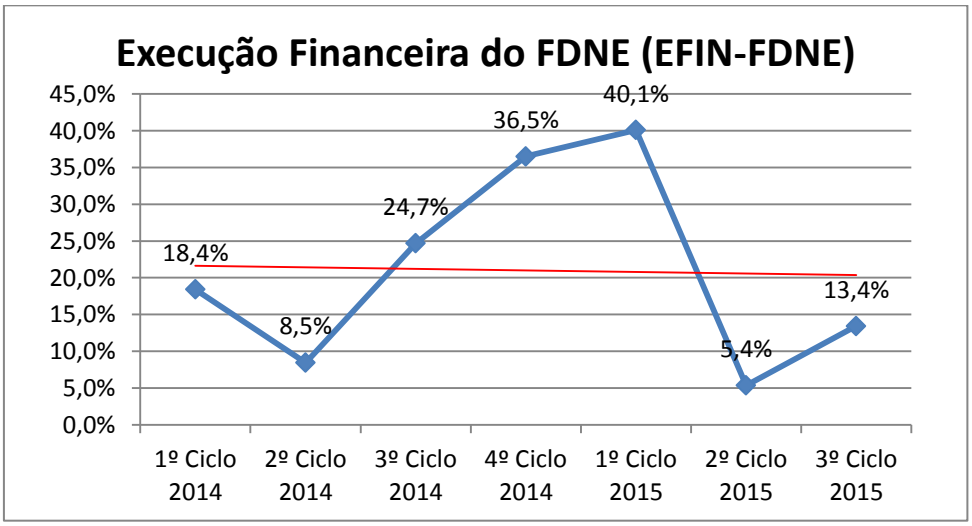

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

2.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a)Fórmula: $\frac{M_1}{30 \text{ dias}^1} = \frac{0}{30} = 0,0$

b)Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,37	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,37	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,35	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,35	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,10	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,27	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,65	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,63	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

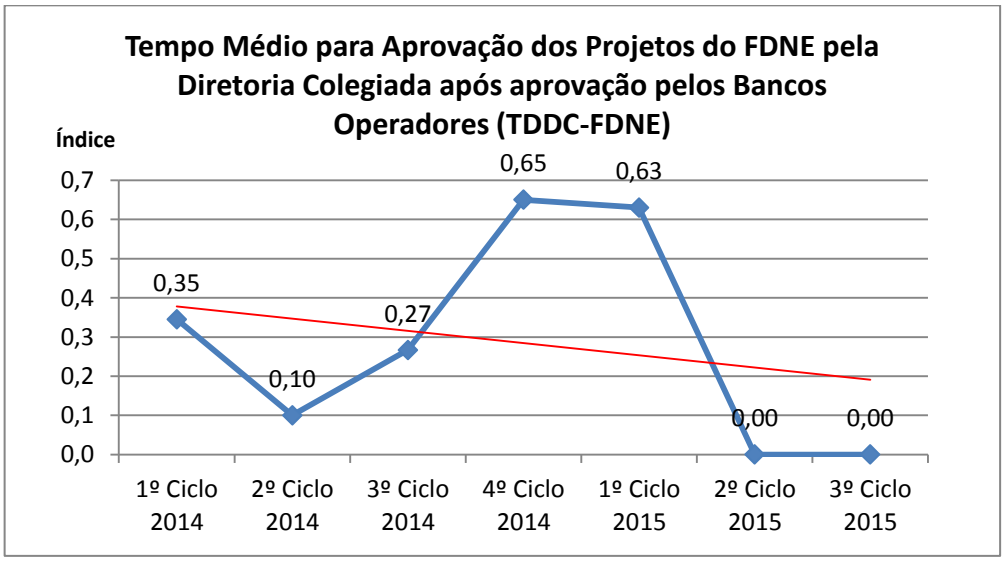

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:
M_1 – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:
[1] 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

2.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a)Fórmula: $Tm = \frac{T}{N} = \frac{0}{0} = 0$ dias/financiamento aprovado

b)Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários**:** Não houve aprovação de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	138,4 dias	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	138,4 dias	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	501 dias	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	501 dias	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	260,5 dias	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	264,67 dias	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	291,75 dias	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	290,25 dias	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0 dias	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

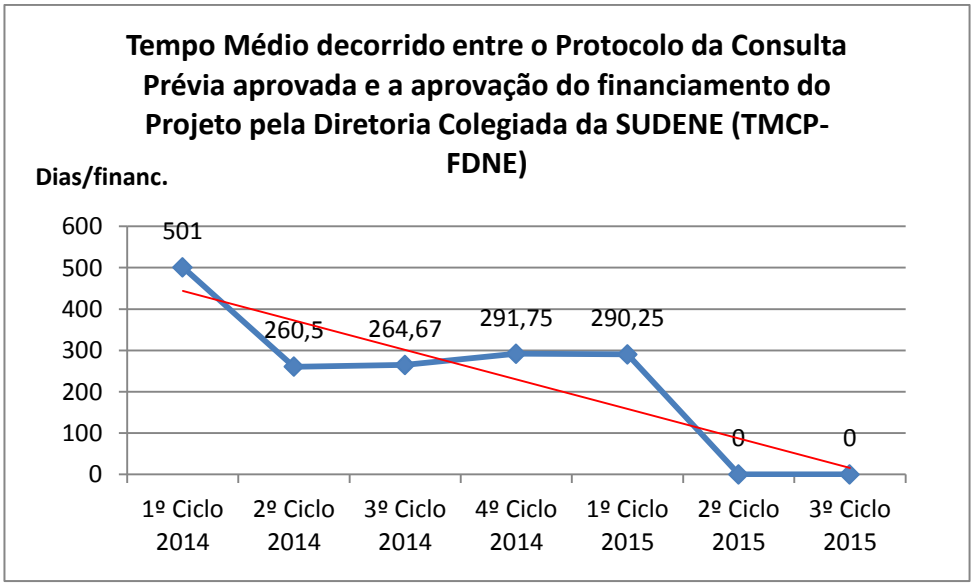

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:
- **Tm** (Tempo médio) corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.
- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.
- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

2.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a)Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{0}{0} = 0{,}00$

b)Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento

d)Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor)

e)Periodicidade: Jan-ago/2015

f)Comentários: Não houve aprovação de financiamento de projeto pela Diretoria Colegiada no período observado.

g)Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	cálculo prejudicado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	cálculo prejudicado	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	1,0	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	1,0	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	1,0	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	1,0	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	1,0	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	1,0	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	1,0	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	1,0	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	0,0	2° ciclo 2015

h) Representação gráfica:

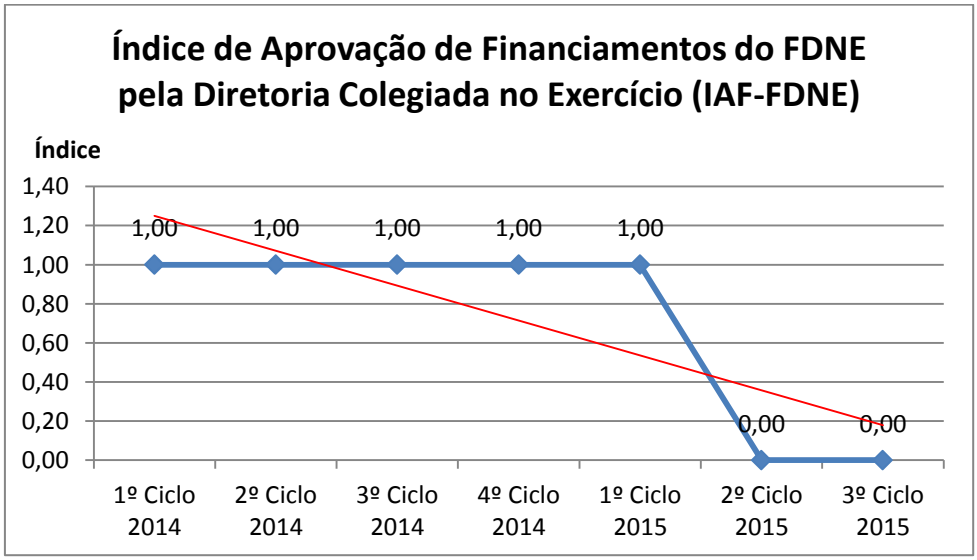

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

3 – Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

3.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV–IF)

a) Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{5.467 \text{ dias}}{75 \text{ pleitos}} = 72{,}9$ dias/pleito

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado Ideal: Quanto menor, melhor.

e) Periodicidade: jan-ago/2015.

f) Comentários: no período iniciado em 1º de janeiro de 2015 e encerrado em 31 de agosto de 2015, foram **vistoriados 75 estabelecimentos dos 95 interessados no benefício de redução de 75% do imposto de renda que tiveram seus processos formalizados no período**. Pelo número de dias acumulados entre as datas das formalizações e as datas das vistorias, o **Tempo Médio de Espera atingiu 72,9 dias**.

O prazo máximo gasto entre a data da formalização e a vistoria realizada foi de 147 dias (Northern Star do Brasil Ltda.). O prazo mínimo, de 18 dias, foi observado no processo de interesse da empresa Bomar Maricultura Ltda.
O maior número de vistorias (23) situou-se entre 61 e 90 dias de espera. Também foi significativo o número de vistorias realizadas entre 91 e 120 dias (22 vistorias) da data da protocolização.

Prazo em dias	Número de vistorias
Até 30 dias	10
De 31 a 60 dias	16
De 61 a 90 dias	23
De 91 a 120 dias	22
De 121 a 150 dias	4
De 151 dias a 180 dias	0
De 181 a 210 dias	0
Acima de 210 dias	0

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	64,60 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	30,10 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	76,00 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	64,40 dias/pleito	3º ciclo 2013

Jan a nov/2013	68,50 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	69,20 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	83,00 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	89,70 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	90 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	74,9 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	74 dias/pleito	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

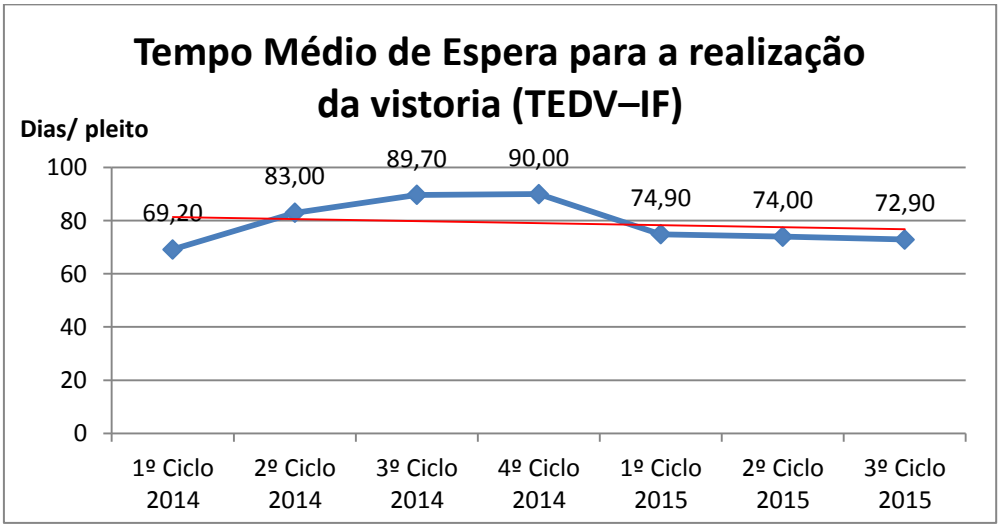

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:
T_1 = Σ do número de dias observados entre o ingresso do pleito (data da formalização) (soma dos dias de todos os processos) e a data da realização da vistoria desses pleitos no período examinado.
N = Número de pleitos vistoriados no período examinado

3.2 - Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos de Incentivos de (UF) rejeitados no período x 100}}{\text{Pleitos protocolados no período}}$ =

$= \frac{0}{175} = 0$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: Jan-ago/2015

f) Comentários: Não informado pela unidade.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	2,36 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	0,00%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,00%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0,00%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0,00%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	0,00%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	0,00%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	0,00%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	0,00%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	0,00%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,00%	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

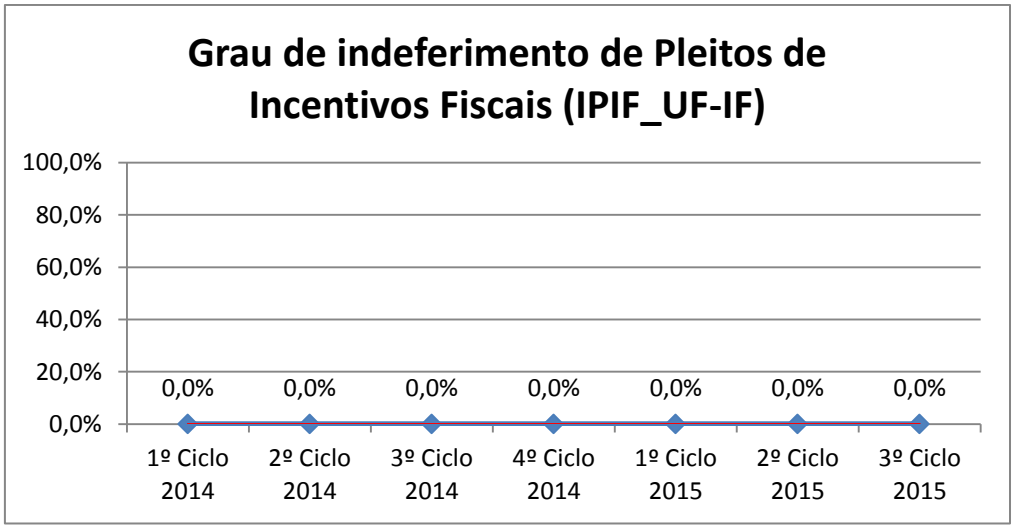

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial.

(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos.

3.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período x 100}}{\text{nº de pleitos protocolados no período}}$ =

$\frac{175 \times 100}{234}$ = 74,8 %

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (%): ..... % (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: no período, foram concluídas 175 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 74,8% dos pleitos ingressados.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	77,16 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	90%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	100%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,4%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	62,9%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	67,3%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	66,4%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	63,7%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	87,3%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	78,4%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	75,7%	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

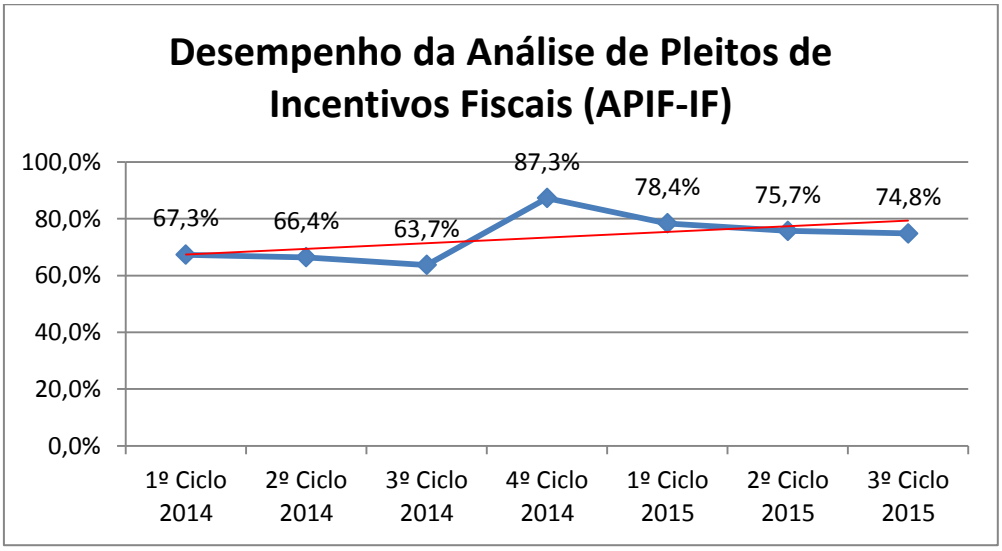

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)

a) Fórmula: $\frac{T1}{N} = \frac{14.903}{155} = 96,1$ dias/pleito

b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (prazo médio): Quanto menor melhor.

e) Periodicidade: jan-ago/2015

i) Comentários: o prazo médio observado, de **96,1 dias** decorre do somatório dos prazos observados nos diversos tipos de processos cujos exames foram concluídos nos primeiros oito meses de 2015 (155). Individualmente, o número de dias que se levou entre a data da formalização e a aprovação dos pleitos de Redução de 75% do Imposto de Renda foi de 119,58 dias, sendo de 53,72 dias para os processos de isenção do AFRMM e de 102,56 dias para os processos de reinvestimento.

Não foi considerado no cálculo do prazo o tempo médio gasto com os processos de transferência de titularidade uma vez que esses processos já foram examinados e aprovados anteriormente, quando do pedido inicial.

f) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	53,86 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	52,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	67,7 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	62,2 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	70,2 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	76,7 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	113,3 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	105,6 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	86,9 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	95,4 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	96,7 dias/pleito	2º ciclo 2015

g) Representação gráfica:

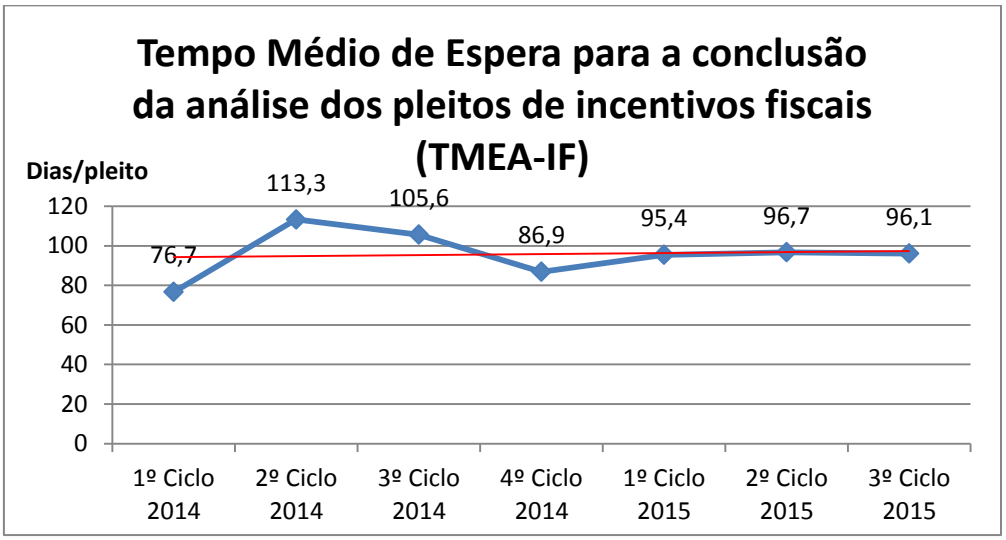

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenção:
T1 = Σ do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.
N = número de processos protocolados no período examinado.

3.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{175}{21} = 8{,}3$ análises/técnico

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise ou a (re)organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

d) Resultado ideal (índice): ... (quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: o número observado, de 8,33 análises por técnico, é a nosso ver mais que satisfatório se levarmos em conta que, além do período de férias de janeiro, desde maio de 2015 que, em razão do contingenciamento orçamentário, as vistorias tem se limitado àqueles pleitos de empresas localizadas na Região Metropolitana do Recife.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,7 análises/técnico	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	14,4 análises/técnico	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	9,6 análises/técnico	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	15 análises/técnico	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	21,6 análises/técnico	4º ciclo 2013

Jan a dez/2013	29,8 análise/técnico	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	8,5 análise/técnico	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	15,1 análise/técnico	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,4 análise/técnico	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	15,4 análise/técnico	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,2 análise/técnico	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

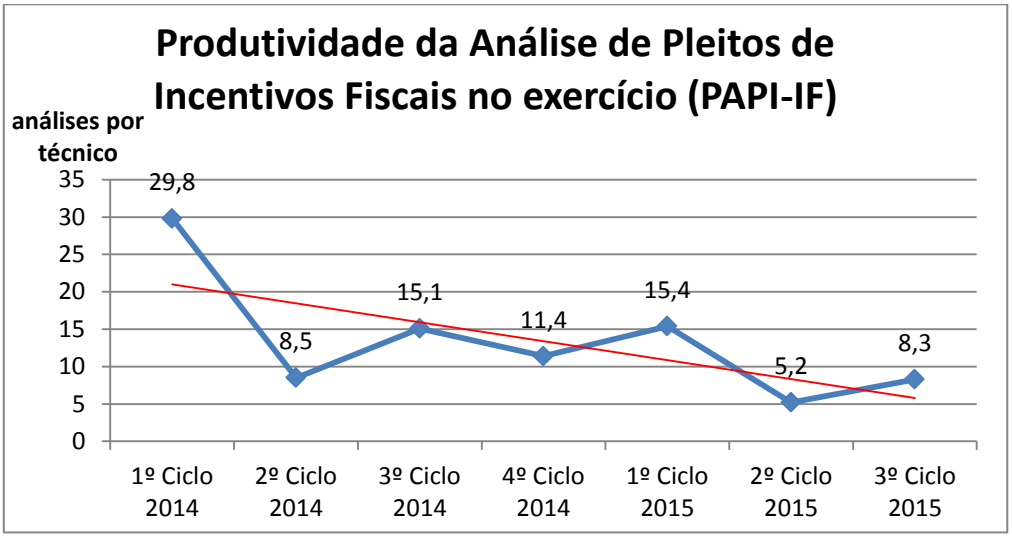

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

3.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}}$ =

$= \frac{75}{10} = 7{,}5$ vistorias/equipe

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais

d) Resultado ideal (índice): .....(quanto maior melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: o resultado alcançado foi positivo, uma vez que os números não refletem as distâncias percorridas por cada técnico ao realizar uma vistoria. Foram realizadas 75 vistorias/equipe, de pleitos de redução de 75% do imposto de renda.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	12,4 vistorias/equipe	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	18,2 vistorias/equipe	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	12,4 vistorias/equipe	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	18,6 vistorias/equipe	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	32,4 vistorias/equipe	1º ciclo 2014

Jan a mai/2014	8 vistorias/equipe	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	14,6 vistorias/equipe	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	12,3 vistorias/equipe	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	19,3 vistorias/equipe	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	5,8 vistorias/equipe	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

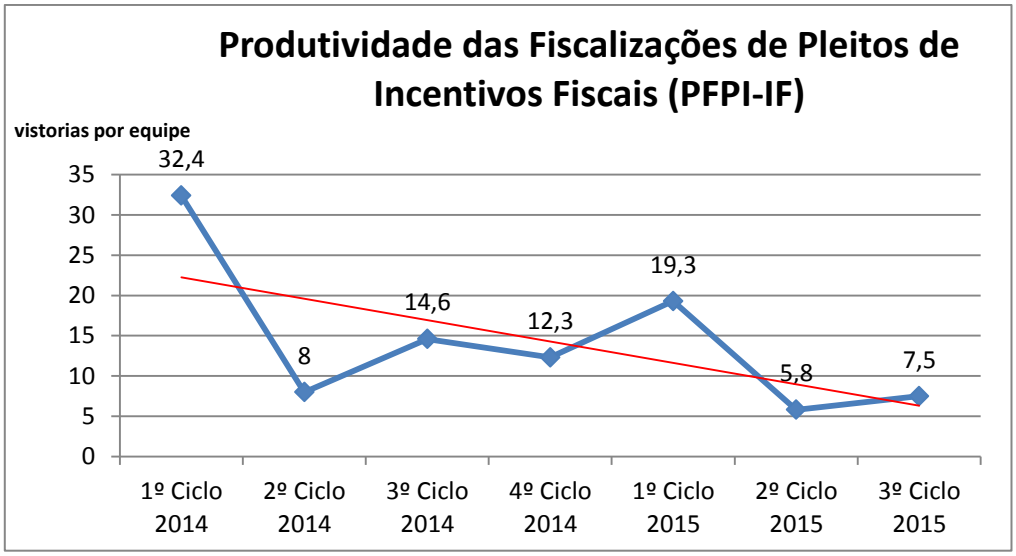

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos.

4 - Indicadores de Gestão de Convênios

4.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Analisados no exercício x 100}}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{3 \times 100}{3} = 100\ \%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período de aferição: jan-ago/2015.

f) Comentários: Houve o recebimento de três propostas no SICONV, todas foram analisadas pelos técnicos da Coordenação.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	100,0%	-
Jan a Nov/2012	100,0 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0%	2º ciclo 2013

Jan a ago/2013	100,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	86,79 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	92,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	73,33%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	54,17 %	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	71,13 %	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	92,3 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0%	2º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

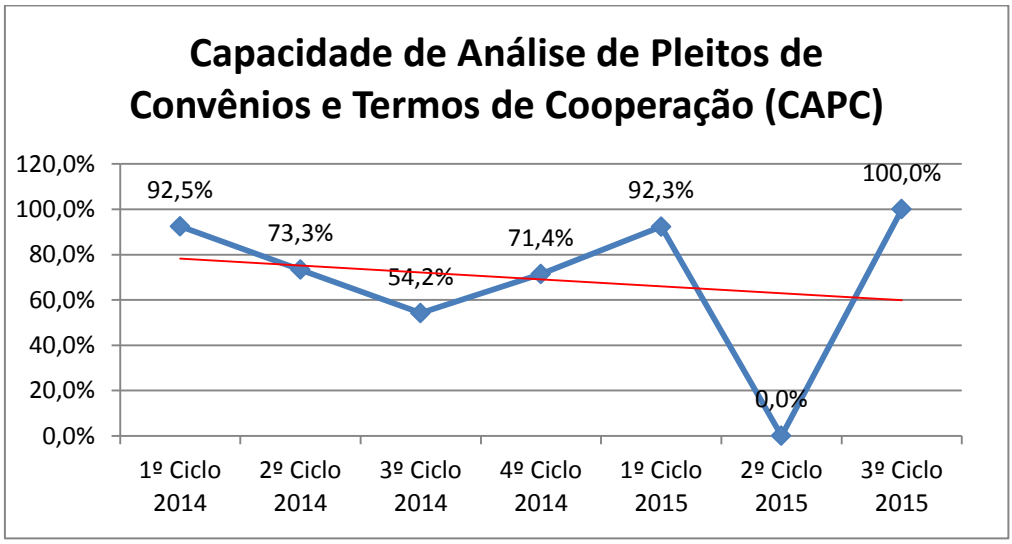

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Coordenação de Gestão de Convênios.
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.2 - Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados x 100}}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{0 \times 100}{3} = 0\ \%$

b)Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d)Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor)

e) Período da aferição: jan-ago/2015.

f)Comentários: As três propostas recebidas no SICONV foram analisadas e rejeitadas pelos critérios técnicos.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	14,6 %	-
Jan a Nov/2012	21,74 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	38,6 %	1º ciclo 2013

Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	25,0%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	23,91 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	22,45%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	18,18%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	7,69%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	3,75%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	8,6 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0%	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

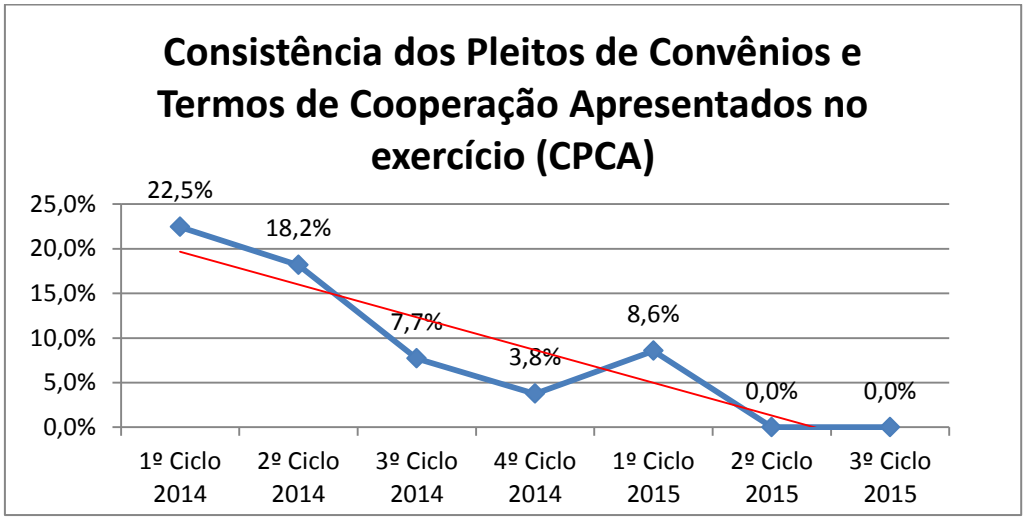

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.3 – Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a)Fórmula: Pleitos de Conv e Termos de Coop. rejeitados no exerc. x 100 =
Pleitos protocolados no exercício

$$= \frac{3 \times 100}{3} = 100\ \%$$

b)Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c)Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d)Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor)

e) Período da aferição: jan-ago/2015.

f)Comentários: As três propostas recebidas no SICONV foram analisadas e rejeitadas pelos critérios técnicos.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,04 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	74,6 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	75,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	56,6 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	62,26%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	60,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	16,67%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	11,61%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	81,2 %	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0,0%	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

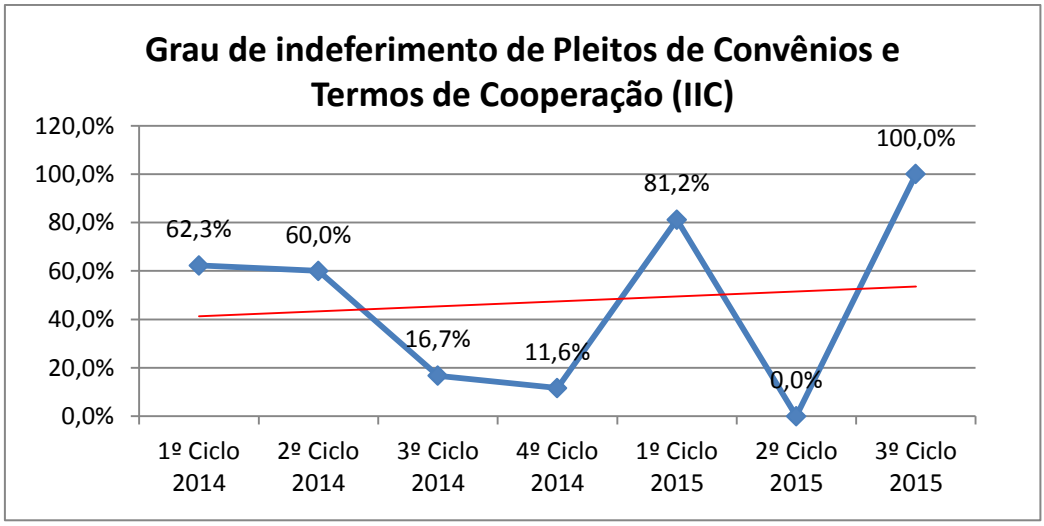

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Notas:
(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no exercício.
(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

4.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc. x 100}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{13 \times 100}{13} = 100\ \%$

b)Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela SUDENE.

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (CGDS/DPLAN).

d)Resultado Ideal (%): 100 % (quanto mais próximo de 100% melhor)

e)Período da aferição: jan-ago/2015.

f)Comentários: No período de aferição indicado acima foram realizadas 7 viagens de acompanhamento dos convênios sob a responsabilidade desta Coordenação Geral e 6 reuniões para o acompanhamento.

g) Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não informado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100%	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	100%	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	100%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	100%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	100%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	100%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	100%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100%	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	100%	2º ciclo 2015

h) Representação gráfica:

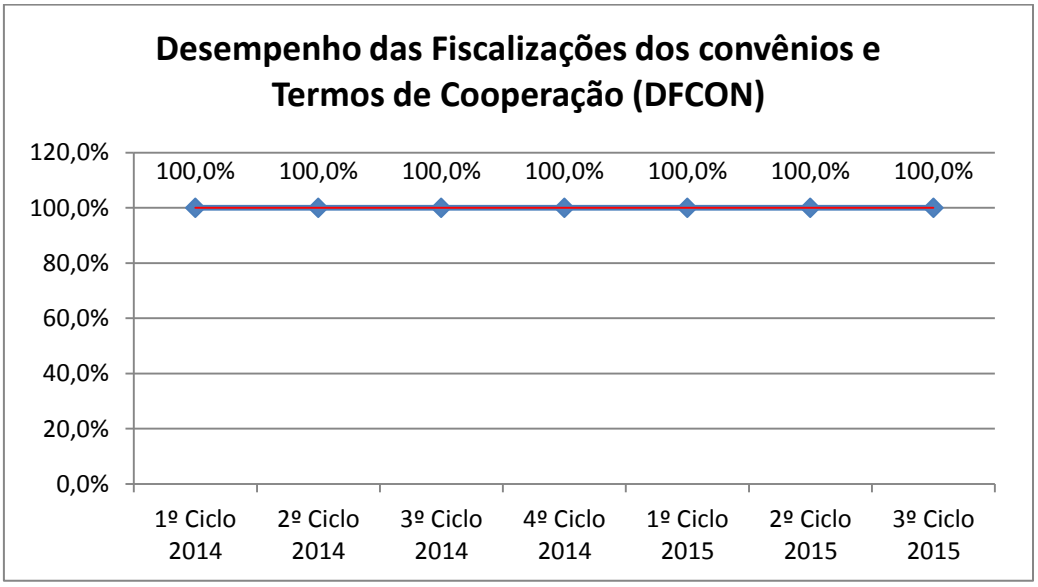

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

O quadro adiante detalha o acompanhamento, pela Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN), da execução dos convênios entre janeiro e agosto de 2015.

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE JANEIRO A AGOSTO 2015

CONVÊNIO	PERÍODO	LOCAL	PARTICIPANTES
Participar de reunião na EMEPA (Convênio 813986/2014-AL da caprinocultura) e Governo da Paraíba (Convênio 770741/2012 – Capacitação em Defesa Civil)	30.01.2015	João Pessoa PB	Carlos Almiro
Reunião com EMEPA-PB (Discussão sobre Termo de Referência do Convênio nº 813986/2014.	06.02.2015	SUDENE CGDS	Marcelo Saiki, Victor Uchoa Carlos Almiro, Marcelo de Castro
Reunião sobre o convênio ZEE-Borborema na SEIRHMACT	27.02.2015	João Pessoa PB	Isis Moreira Renato Vaz
Reunião CONDEPE/FIDEM sobre participação da SUDENE na Oficina para o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Bom Conselho	02.03.2015	SUDENE CGDS	Teresa Barbosa, Macira Régia, Vinícius Medeiros, Maria do Socorro, Renato Arruda e Maria Helena
Participar da Oficina de Validação da Caracterização e Diagnóstico Situacional do Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho-PE produto do convênio realizado entre a SUDENE e o CONDEPE/FIDEM nº 769782/2012.	04 a 05.03.2015	Bom Conselho PE	Macira Sotero, Renato Vaz, Vera Lúcia, Maria Helena Socorro Vilar
Reunião com a SEIRHMACT/PB PARA TRATAR DO Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema na Paraíba.	13.03.2015	SUDENE CGDS	Maria Helena, Victor Uchoa, Renato Vaz e Isis Guimarães
Realizar visita de acompanhamento do convênio nº 794987/2013- Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais-PESI/NNE e visita técnica ao CSEM Brasil.	18 a 20.03.2015	Belo Horizonte MG	Maria Helena, Isis Guimarães
Entrevistar alunos que participaram da 1ª etapa de capacitação nos campus de Monteiro e João Pessoa e acompanhar o início das capacitações em 03 campus dos 04 previstos: Monteiro, João Pessoa e Pedra de Fogo, objeto do convênio 59335.000033/2014-24	24 a 27.03.2015	João Pessoa PB	Macira Régia Givanildo Ramos

SUDENE/IFPB			
Participar do Seminário do Agreste Setentrional, onde situa-se a "Bacia Leiteira" onde se encontra o município de Bom Conselho SUDENE/CONDEPE/FIDEM, convênio 59.335.000116/2012-51 – Plano de Desenvolvimento Sustentável da Área de Influência de Bom Conselho "	09 a 10.04.2015	Garanhuns PE	Maria Helena Vera Lúcia Batista
Realizar visita técnica para alinhamento de idéias e orientações a respeito da execução do convênio Construindo com Mulheres 59.335.000533/2014-66	16 a 17.04.15	Maceió AL	Macira Sotero Givanildo Ramos
Reunião técnica com Agência CONDEPE/FIDEM sobre convênios em execução.	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Mª do Socorro, Vera Lucia, Teresa Barbosa, Renato Vaz, Victor Uchoa, Isis Moreira e Carlos Almiro
Reunião com representante da Prefeitura Municipal de Saboeiro sobre reforma e urbanização do mercado (Convênio).	17.06.2015	SUDEDE CGDS	Edson, Agrimon,Givanildo
Reunião com a Agência CONDEPE/FIDEM sobre a e situação dos convênios em execução.	08.07.2015	SUDENE CGDS	Carlos Almiro, Maria Helena, Caio Rodrigues, Victor Uchoa, Renato Arruda e Socorro Vilar

PROPOSTAS INSERIDAS NO SICONV - JANEIRO A AGOSTO / 2015

Entre janeiro e agosto de 2015, a coordenação recebeu via SICONV duas propostas no âmbito do programa "Capacitação de recursos humanos para a competitividade (4640)" e uma proposta para o programa "Fortalecimento das Administrações Locais (8917)". As propostas foram analisadas e rejeitadas pelos critérios técnicos.

4.5 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}}$ = 0 dias/pleito

b)Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c)Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d)Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor)

e)Periodicidade: jan-ago/2015

f)Comentários: Ainda não foram celebrados convênios em 2015, daí o "zero" como resultado.

g)Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	13,8 dias/pleito	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	13,7 dias/pleito	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	0 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	0 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	16,27 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	59,66 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	2,66 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	2,60 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	2,85 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015

h) Representação gráfica:

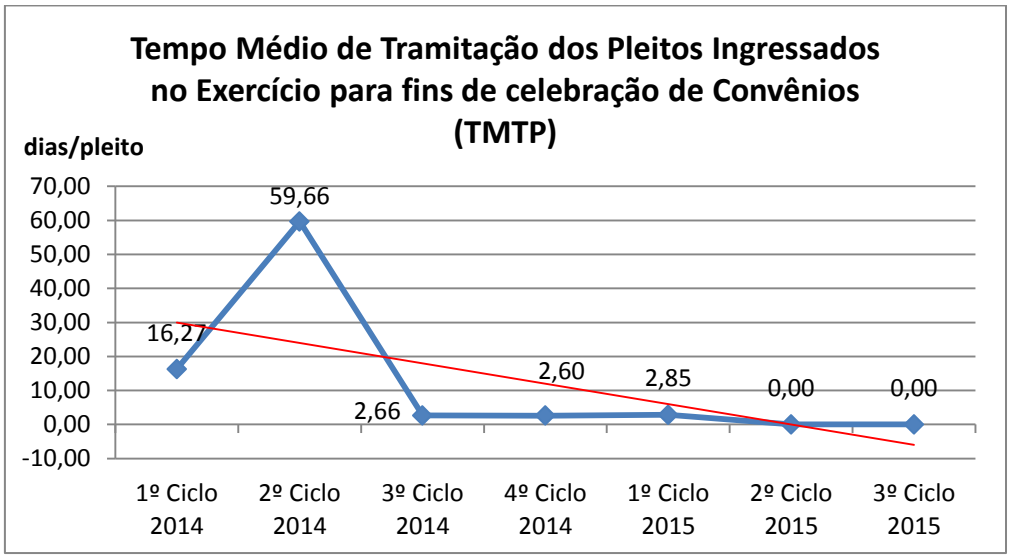

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:
T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:
- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.6 –Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a)Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}}$ = 0 dias/pleito.

b)Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c)Responsabilidade da aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d)Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: Ainda não foram celebrados convênios em 2015, daí o "zero" como resultado.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não existia o indicador	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	Não existia o indicador	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	0 dias/pleito	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	5 dias/pleito	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	5 dias/pleito	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	5 dias/pleito	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	5 dias/pleito	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	12 dias/pleito	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	18 dias/pleito	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	18 dias/pleito	1º ciclo 2015
Jan a mai/2015	0 dias/pleito	2º Ciclo 2015

h) Representação gráfica:

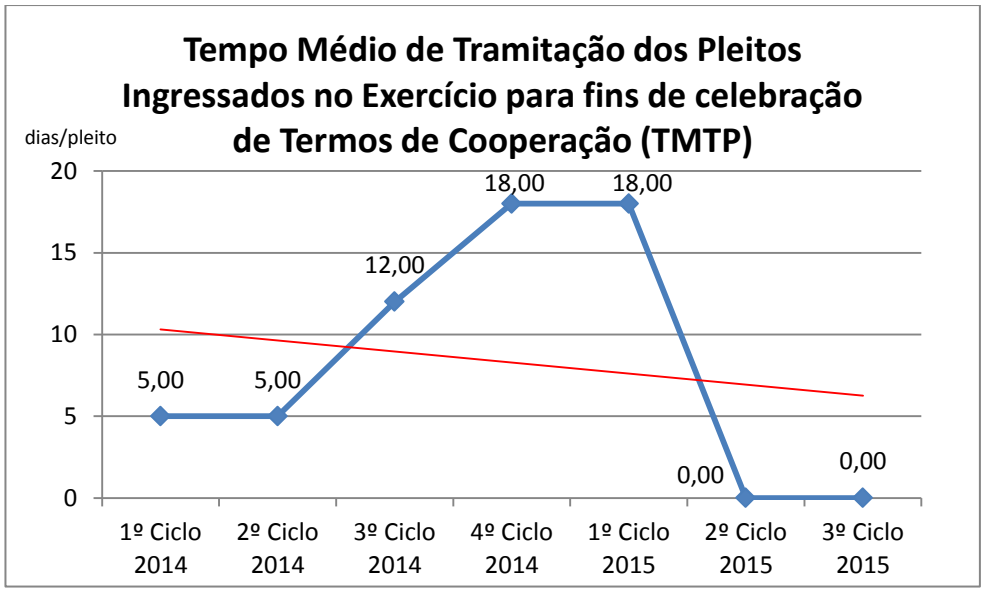

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE.
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:
- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;
- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

4.7 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios passivo

a) Fórmula:

$$IPCA_{PASSIVO}\ (\%) = \frac{\text{Convênios a aprovar}_{FINAL} \times 100}{\text{Convênios a aprovar}_{INICIAL}} = \frac{31 \times 100}{33} = 93{,}93\%$$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial.

d) Resultado Ideal (%) : .....% (Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: entre janeiro e agosto deste ano apenas dois convênios saíram da posição "A APROVAR" no siafi, mas por motivos diversos da análise financeira. Na verdade, a monitoração da análise da prestação de contas com base meramente na mudança de status no SIAFI não reflete a realidade de trabalho dessa Assessoria, pois a análise da prestação de contas pode ter 3 desmembramentos:
    - 1º desmembramento: o convênio é analisado e aprovado. Neste caso, há impacto no status no SIAFI.
    - 2º desmembramento: o convênio é analisado, mas há pendências passíveis de saneamento. Nessa situação, o convênio vai para cobrança administrativa, não repercutindo em mudança de status, enquanto durar a cobrança administrativa.
    - 3º desmembramento: o convênio, após várias cobranças, é finalmente tido como passível de TCE. Nessa situação, há mudança de status (de "A APROVAR" para "INADIMPLÊNCIA EFETIVA").

    Na realidade, há mais convênios na situação "A APROVAR" do que deveriam, mas isso ocorreu sobretudo por decisões judiciais, principalmente relacionadas aos convênios do passivo da SUDENE celebrados com o Piauí e Alagoas. Nas referidas decisões, impunha-se à SUDENE a obrigação de abster de inscrever a inadimplência. A Procuradoria da SUDENE foi consultada e instruiu-se a SUDENE a obedecer as liminares tal qual elas foram redigidas. Assim, dos 31 convênios com status "A APROVAR "no SIAFI:
    - 14 estão em tomada de contas especial;
    - 13 estão em cobrança administrativa, de fato;

- 1 encontra-se na CGEP para emissão de Laudo Técnico;
- 2 ainda encontram-se desaparecidos.

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	Não foi apurado	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,4 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	95,1 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	92,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	87,8%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	87,8%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	87,8%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	94,4%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	97,1%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100,0 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	100,0 %	2º Ciclo 2015

h) Representação gráfica:

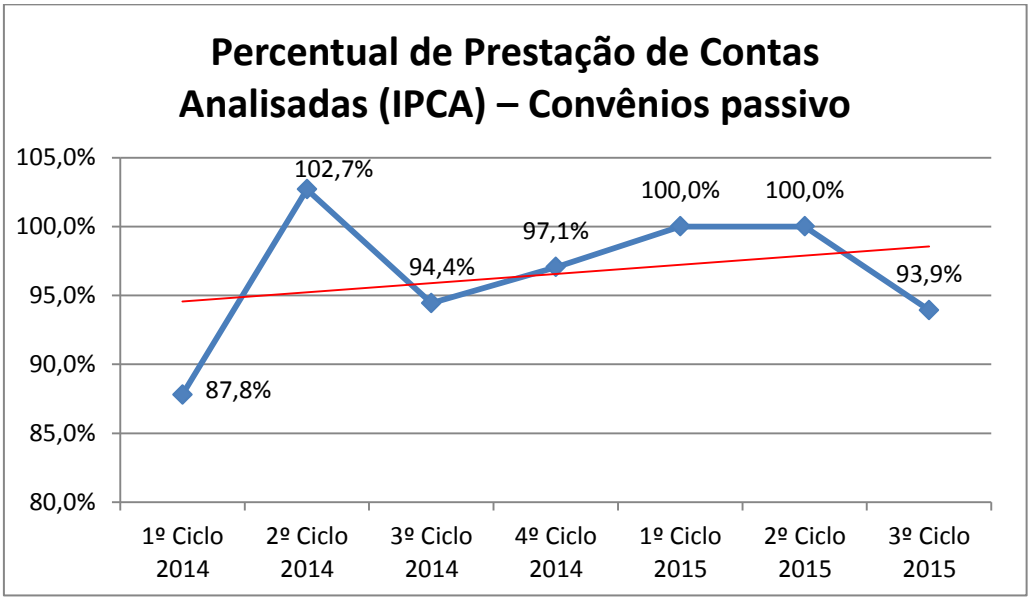

Fonte: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e TCE e SIAFI.
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

4.8 – Percentual de Prestação de Contas Analisadas (IPCA) – Convênios a partir de 2009 (SICONV)

a) Fórmula:

$$IPCA_{SICONV}\ (\%) = \frac{\text{Convênios a aprovar}_{FINAL} \times 100}{\text{Convênios a aprovar}_{INICIAL}} = \frac{11 \times 100}{13} = 84{,}61\%$$

b) Objetivo: Mostrar o desempenho da análise de prestações de contas no período referenciado, no caso foi escolhido o semestre.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria Técnica de Gestão de Convênios e Tomada de Contas Especial

d) Resultado Ideal (%): ..... %(Quanto menor melhor)

e) Periodicidade: jan-ago/2015

f) Comentários: Novamente, a monitoração da análise da prestação de contas com base meramente na mudança de status no SICONV não reflete a realidade de trabalho dessa Assessoria, pois a análise da prestação de contas pode ter 3 desmembramentos:

- 1º desmembramento: o convênio é analisado e aprovado. Neste caso, há impacto no status no SICONV
- 2º desmembramento: o convênio é analisado, mas há pendências passíveis de saneamento. Nessa situação, o convênio vai para cobrança administrativa, não repercutindo em mudança de status, enquanto durar a cobrança administrativa.
- 3º desmembramento: o convênio, após várias cobranças, é finalmente tido como passível de TCE. Nessa situação, há mudança de status (de "A APROVAR" para "INADIMPLENTE").

A tabela a seguir mostra a Quantidade de Análises Financeiras realizadas pela unidade por SIAFI (Jan-Ago/2015):

Contagem de SIAFI	
Nº SIAFI	Total
337849	1
402702	1
517207	1
538618	1
542944	1
707430	2
710365	3
744427	2
744654	1
746462	2
769783	1
769784	2
770355	1
Total Global	19

g) Resultados anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	92,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	75,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	71,4%	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	57,1 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	57,1%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	57,1%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	200,0%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	125,0%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	130,0%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	100,0 %	1º ciclo 2015
Jan a Mai/2015	0,00	2º Ciclo 2015

h) Representação gráfica:

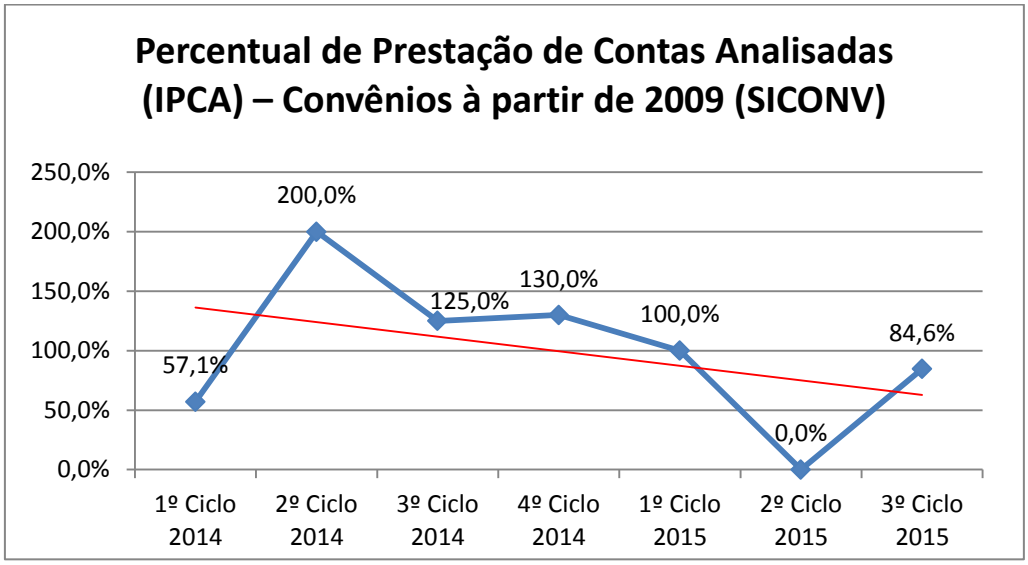

Fonte: Coordenação de Gestão de Convênios.
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5 - Indicadores de Gestão de Recursos Humanos

5.1 - Grau de Capacitação de servidores no exercício (CSE)

a)Fórmula: $\frac{\text{Nº de servidores capacitados no exercício x 100}}{\text{Nº previsto de serv. capacit. para o exercício}} = \frac{96 \times 100}{200} = 48\%$

b)Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e)Período da aferição: jan-ago/2015

f)Comentários: A unidade centrou o plano de capacitação na promoção de eventos *in company*, de forma a contemplar um maior número de servidores e otimizar a aplicação dos recursos. Até o momento, a meta prevista para capacitar 200 (duzentos) servidores, foi parcialmente atingida, alcançando 96 (noventa e seis) servidores, representando 48%. Considerando que a participação de servidores ocorreu em mais de um evento de capacitação, registram-se 175 (cento e setenta e cinco) inscrições efetivamente realizadas.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	71,6 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	65,65 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	18,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	38,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	45,4 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	47,0%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	60,0%	3º ciclo 2014

Jan a Nov/2014	85,43%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	86,9%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	21,5%	2º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

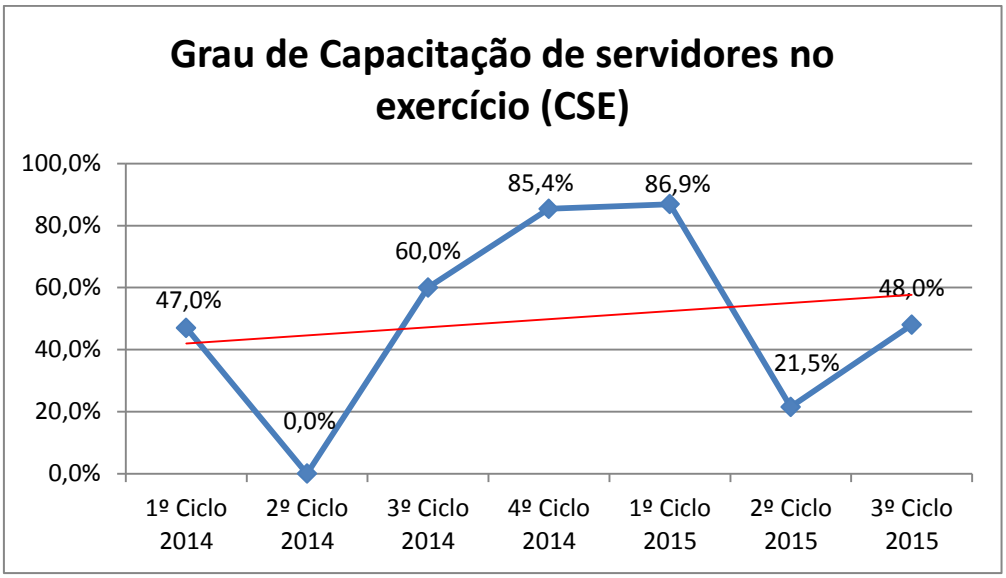

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo.

5.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a)Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício x 100}}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{51 \times 100}{50} = 102\%$

b)Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e)Período da aferição: jan-ago/2015

f)Comentários: De janeiro a agosto (2015), foram realizados 51 (cinquenta e um) eventos de capacitação, já ultrapassando a meta prevista de 50 (cinquenta) eventos de capacitação para o período de out/2014 a set/2015.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	66,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	80,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	17,0 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	60,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	157,0 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	174,0%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014

Jan a ago/2014	90,0%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	247,5%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	280,0%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	62,0%	2º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

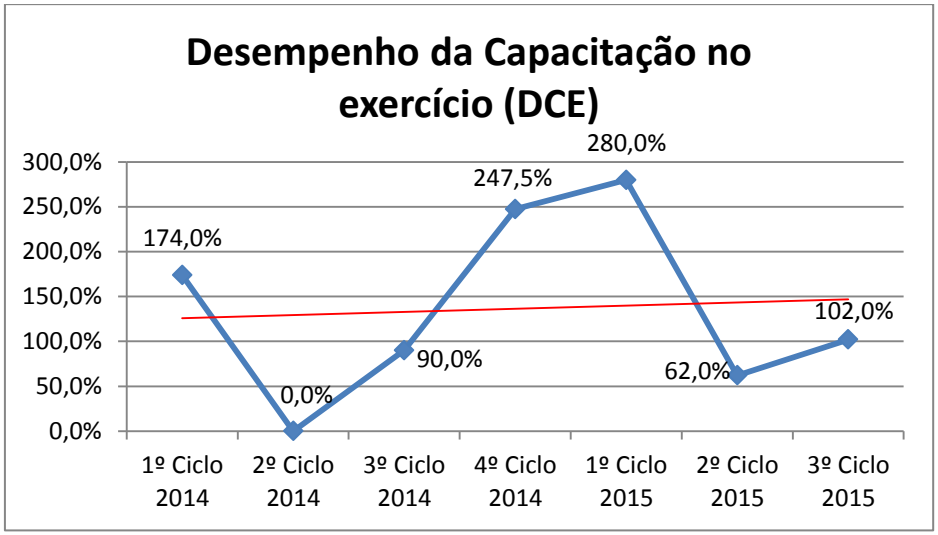

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

5.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a)Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc. x 100}}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{162.633,33 \times 100}{400.000,00} = 40,66\%$

b)Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c)Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

d)Resultado Ideal (%): 100% (Quanto maior melhor)

e)Periodicidade: jan-ago/2015

f)Comentários: A Sudene arcou com o pagamento de inscrições em eventos de capacitações, no valor de R$ 75.937,50 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Some-se a isso os custos com passagens e diárias no montante de R$ 86.695,83 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), perfazendo assim, o total de R$ 162.633,33 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), representando 40,66% do valor previsto para o investimento em capacitação.

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	27,8 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	100,0 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	8,49 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	29,0 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	37,0%	4º ciclo 2013

Jan a dez/2013	38,25%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	Não informado	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	24,56%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	74,54%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	84,0%	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	25,5%	2º ciclo 2015

h)Representação gráfica:

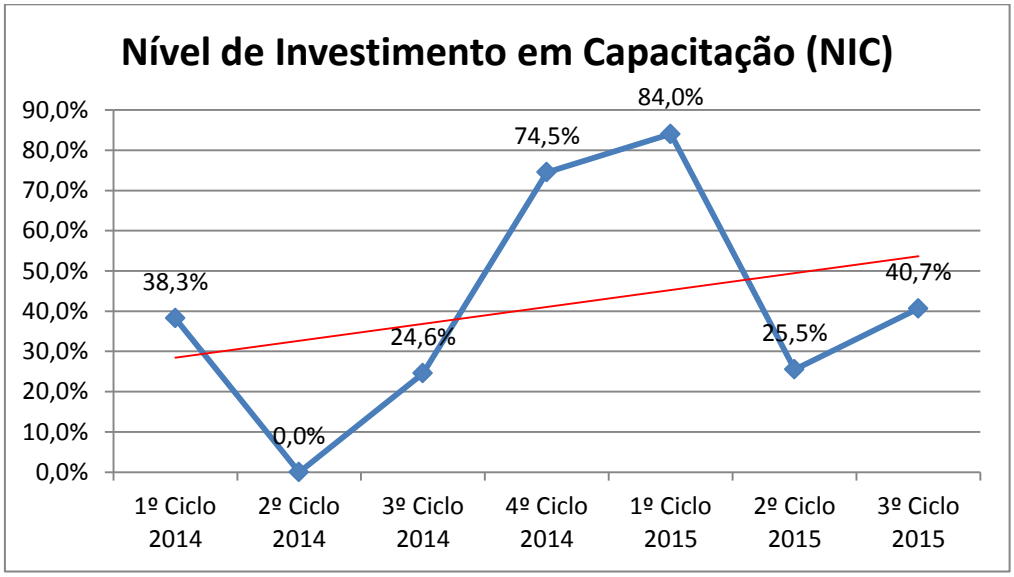

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

6 – Indicadores de Gestão dos Projetos de Recuperação/Modernização do Prédio da SUDENE e seus Anexos

6.1 –Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (RMI-SDN)

a)Fórmula: Média Aritmética dos perc.de execução dos projetos[1] =

$$\frac{60\% + 90\% + 26\%}{3} = 58{,}7\%$$

b)Objetivo: Aferir o avanço da execução física do conjunto dos projetos relacionados com a modernização/recuperação/melhoria da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores.

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Serviços Gerais (CSG/CGAF).

d)Resultado Ideal (%): 100 % (Quanto maior melhor)

e)Data da aferição: 28/08/2015

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo da média aritmética são dos três projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (60%); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (90%); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (26,09%). Esses projetos se utilizam dos recursos

previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), do Programa 2111 – Gestão e Manutenção do MI.

g) Resultados Anteriores (RMI-SDN):

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	42,6%	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	33,9 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	43,67 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	61,7 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	38,55%	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	41,63%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	43,99%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	45,64%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	46,8%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	47,6 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	47,6	2º ciclo 2015

i)Representação gráfica

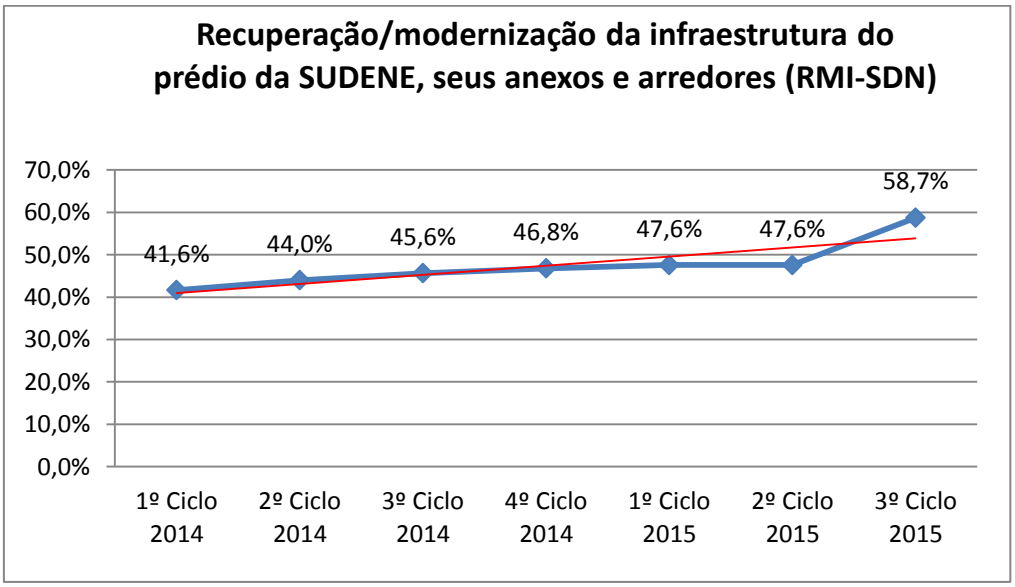

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

Nota:
O percentual de execução de cada projeto foi obtido do respectivo Plano Operativo interno.

6.2 – Desempenho do Orçamento Executado na Recuperação/modernização da infraestrutura do prédio da SUDENE, seus anexos e arredores (ORMI-SDN)

a)Fórmula: $\frac{\Sigma \text{ dos montantes aplicados nos Projetos } \times 100}{\Sigma \text{ dos limites autorizados para os Projetos}} =$

$$\frac{(2.630.114,65+6.458.613,62+100.000,00) \times 100}{3.185.975,65+8.670.544,86+148.000,00} = 76,54\ \%$$

b)Objetivo: Aferir o desempenho do orçamento executado (montante aplicado) em relação ao limite autorizado para o conjunto dos projetos relacionados com a recuperação da

infraestrutura física (recuperação estrutural do Anexo Nilo Coelho, recuperação das fundações do prédio sede e modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE).

c)Responsabilidade de Aferição: Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças (COCF) e área de engenharia da CGAF.

d)Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor)

e)Data da aferição: 28/ago/2015

f) Comentários: Os resultados utilizados no cálculo do orçamento executado são dos quatro projetos em andamento pela Diretoria de Administração: f.1) recuperação do anexo Nilo Coelho (aplicado acumulado de R$ 2.630.114,65 e limite autorizado acumulado=R$ 3.185.975,65); f.2) recuperação das fundações do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R$ 6.458.613,62 e limite autorizado acumulado de R$ 8.670.544,86); f.3) modernização das subestações elétricas do Edf. SUDENE (aplicado acumulado de R$ 100.000,00 e limite autorizado acumulado de R$ 148.000,00). Esses projetos se utilizam dos recursos previstos na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2111 (Gestão e Manutenção do MI).

g)Resultados Anteriores:

Dez/2011	Não existia o indicador	-
Jan a Nov/2012	60,7 %	1º e único ciclo 2012
Jan a Dez/2012	48,5 %	1º ciclo 2013
Jan a mai/2013	60,4 %	2º ciclo 2013
Jan a ago/2013	42,6 %	3º ciclo 2013
Jan a nov/2013	73,92 %	4º ciclo 2013
Jan a dez/2013	53,56%	1º ciclo 2014
Jan a mai/2014	67,37%	2º ciclo 2014
Jan a ago/2014	67,37%	3º ciclo 2014
Jan a Nov/2014	68,2%	4º ciclo 2014
Jan a Dez/2014	71,2 %	1º ciclo 2015
Jan a Maio/2015	72,6 %	2º ciclo 2015

Nota:
1-os percentuais encontrados podem aumentar ou diminuir a cada ciclo, pois os cálculos são afetados pelo limite autorizado, que na fórmula é o denominador da fração.

h)Representação gráfica:

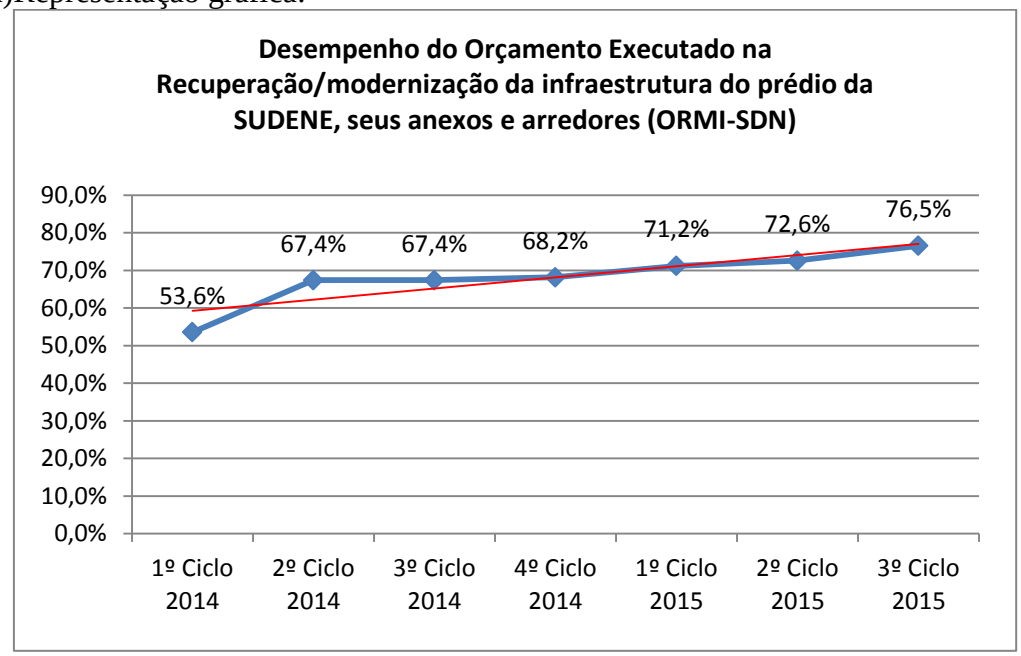

Fonte: Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

7 – Indicador de Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) dos projetos definidos pela Portaria SUDENE nº 193, de 17/12/2014

a)Fórmula: Média Aritmética dos perc. executados das metas e dos projetos[1] =

$$\frac{100\%+100\%+9\%+100\%+75{,}6\%+70\%+97\%+100\%+39\%+94\%+96\%+82\%+40\%}{13} = 77{,}1\%$$

Metas de Desempenho Institucional
(Apuração do período out/2014 a ago/2015)

Programa PPA e/ou Diretriz Estratégica SUDENE	Ação PPA e/ou Objetivo Estratégico SUDENE	Unidade de Medida	Meta Física Prevista	Percentual Atingido (%)	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Projetos (Todos terão que apresentar seus POs)
2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	4572-Capacitação de Servidores Públicos Federais	Capacitação realizada*	50	100%	80	DAD/CGGP-Auto-explicável. Entre out/14 e ago/15 foram realizadas 109 capacitações, correspondendo a 218% da meta.
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	90C6- Incentivos e Benefícios Fiscais	Pleitos aprovados	296	100%	80	DFIN/Incent Fiscais -Pleitos aprovados efetivamente pela Diretoria Colegiada. Foram aprovados 300 pleitos entre set/2014 e 31/ago/2015 (101,4%).
	0355-Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)	Financiamento aprovado	R$ 1.820.000.000	9%	7	DFIN/FDNE-Cálculo computado após aprovação do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE. Acréscimos a projetos em execução, desde que aprovados pelo mesmo colegiado, poderão ser computados no cálculo da meta física. Até ago/15 os financiamentos aprovados somaram R$ 157.288.653,03, sendo R$ 123.186.471,03 da CONE S/A e R$ 34.102.182,00 da IRAETA BRASIL S/A. Meta em processo de revisão devido à crise econômica que afetou a demanda pelo FDNE e encareceu o custo do crédito tomado a bancos, uma das fontes obrigatórias para a composição dos recursos e o acesso ao Fundo.

Continua

D1- Promover a competitivi-dade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O 1.1-Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatórios elaborados	50%	100%	80	DPLAN/CGEP - (1) - Diretrizes para regionalização da política industrial-PO 27 [total=60,9%]. (2) - Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE. (Avaliação UAB) –PO 28 [total=99,2%]- (execução de 50 % de cada PO até a data da apuração. Aplicada a média aritmética dos resultados dos projetos).
		Plano elaborado	1	75,60%	60	DPLAN/CGDS-Elaboração de plano de fomento à capacitação de gestão de projetos de desenvolvimento sub-regional (PO 20= 75,6%)
		Eventos realizados	2	70%	56	DPLAN/CGDS - Organização de eventos de difusão de conhecimentos sobre as potencialidades da região (Fórum SUDENE de energia-PO 19 =40,9%)e Seminário SUDENE APLs no semiárido-Programa "otas da Integração Nacional"-Oficina Macrorregional Nordeste (PO 23=100%)
		Projeto apoiado	2	97%	78	DPLAN/CGDS - Apoio à implementação de projetos para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, com prioridade para o semiárido. Foram celebrados os projetos de apoio à caprinocultura na Paraíba e no Ceará. PO 10 (94,4%)e PO 11 (100%).
		Oficina realizada	1	100%	80	DPLAN/CGDS-Promoção de evento de articulação de parceiros do desenvolvimento local com atuação na região com vistas ao diagnóstico e identificação de demandas de fortalecimento institucional (PO 22 = 100%).
		Fórum realizado	2	39%	31	DPLAN/CGDS-Organização de fóruns do meio ambiente com objetivo de troca de experiência de programas e projetos voltados a conservação, preservação e recuperação do meio ambiente e uso sustentável (PO 21= 77,8%). Meta em processo de revisão devido à impossibilidade de realização de um fórum de desenvolvimento do território no Norte de MG por falta de recursos para a organização, diárias e passagens.
D3- Promover a excelência técnica e a qualidade da Gestão na SUDENE	O3.1-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Projeto implementado	3	94%	75	DAD/CGGP-(1) Projeto de Desenvolvimento de lideranças-PO 62=92%; (2) Projeto de gestão por competências-PO 63=100%; (3) Projeto "Investindo nos Sonhos"-PO 64= 89%.
		Projeto implementado	2	96%	77	CGGI - (1) Mapeamento de processos-PO 60=92% ou outro; (2) Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA-(PO 61=100%).;
		Projeto elaborado	1	82%	66	DAD/CGAF-Recuperação do Anexo Nilo Coelho (PO 65 = 82%).
		Sistema disponibilizado	2	40%	32	DAD/CGTI-(1) Sistema Incentivos Fiscais (módulo de acesso público) (O acesso já existe e o projeto visaria a melhoria das condições de acesso, mas será revisado para incorporação ao Projeto de modernização de infraestrutura de rede) e (2) Modernização da Infraestrutura da Rede Local (PO71 = 80%). Meta a ser revisada.
MÉDIA ARITMÉTICA				77,1%	62	

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE

Observações:

* Capacitação realizada significa o evento efetivamente autorizado e realizado.

Notas:

a)Foi estabelecido como percentual máximo de execução, 100%, mesmo que a meta tenha sido ultrapassada.

b) Na situação ideal, 100% de todos os projetos correspondem ao limite de 80 pontos para fins de avaliação de desempenho institucional.

c) O presente cálculo refere-se ao 6º Ciclo de avaliação GDPGPE e 3º Ciclo de avaliação GDACE, cuja contagem começou em 01 de outubro de 2014 e irá até 30 de setembro de 2015 conforme preceitua o Decreto nº 7.133/2010, com as alterações do §9º, art. 22 da Lei nº 12.277/2010 e do Decreto nº 7.849/2012.

Posição: ago/2015.

b)Representação gráfica:

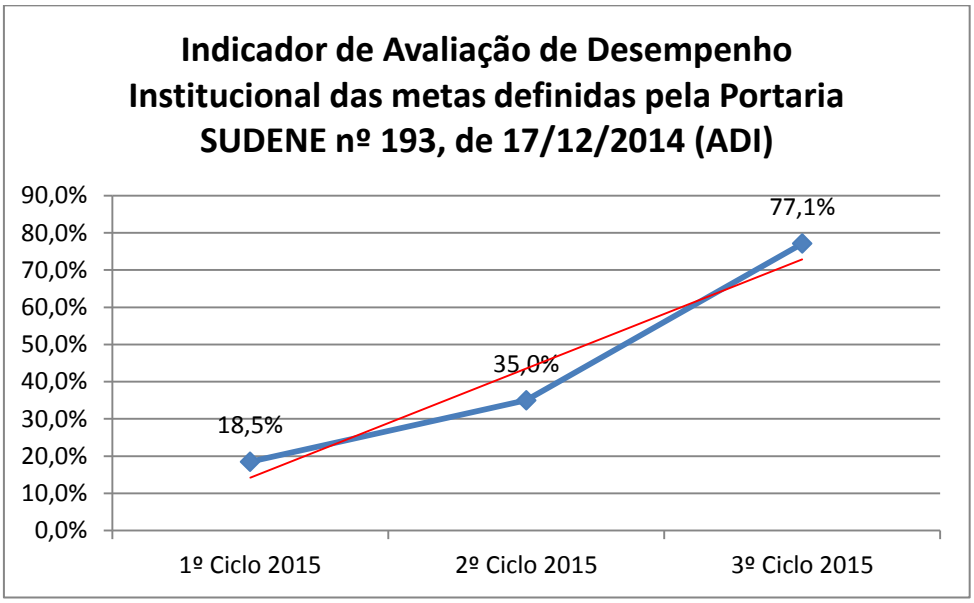

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Nota: A linha vermelha representa a tendência do indicador no tempo

8 – Observações, Deliberações e Encaminhamentos da plenária de 25/09/2015

Os registros de deliberações ou encaminhamentos foram postos na ordem de seu surgimento na reunião do dia 25/set/15.

Carlos Almiro (Coordenador-Geral da CGDS/DPLAN): Sobre os seus quatro projetos selecionados (**POs 02 - Zoneamento em áreas de desertificação em PE; 03 - Capacitação de produtores na caprinocultura e apicultura no estado de Pernambuco; 06 - Mulheres na Construção – Descentralização; e 17 - Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no município – Currais Novos/RN**) expôs um problema comum: a dificuldade de acompanhamento da execução e da conclusão do pleito devido à falta de diárias e passagens para as vistorias e em decorrência, o atraso na emissão de laudos técnicos. Os citados POs já estão com as prestações de contas apresentadas, mas não há como fazer a vistoria.

Frederico Cavalcanti (Coordenador-Geral da CGEP/DPLAN): Tratando do **PO 26 (Centro Vocacional Tecnológico de Tobias Barreto)** enfatizou o mesmo problema da CGDS: a necessidade de visita para certificar o que foi realizado. Salientou que o convenente teve dificuldade para realizar licitações, levando o projeto a ter o fim adiado várias vezes. Aliás, dificuldades para licitar é o que tem levado muitos convênios a terem prazos aditados. E por falta do termo aditivo, parte do recurso será devolvido. Sobre o **PO 27 (Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal)** enfatizou que o momento recomenda uma discussão com os estados, cuja articulação encontra-se prejudicada pela falta de diárias e passagens, mas que foram realizadas pesquisas junto a eles sobre o que tinham relativo a politica industrial, e o documento está sendo elaborado para ser apresentado às federações da indústria e secretários estaduais. A proposta é convocar os secretários de Indústria e Comércio ou pasta correlata, dos estados, para uma reunião na sede da SUDENE. Quanto ao **PO 28 (Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE)** o projeto será finalizado em outubro e a partir desse outros dois projetos serão iniciados, sendo que um dos objetivos é expandi-lo para o interior. Lembrou também, que foram solicitados a realização de aditivos ao plano inicial, entretanto em função da falta de orçamento se decidiu finaliza-lo e deixar os demais

desdobramentos para os projetos vindouros. Por sua vez, a insuficiência de técnicos está dificultando a elaboração do **PO 29 (Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE**). O documento produto do **PO 30 (Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE**) está concluído e em fase de revisão, devendo ser encaminhado nas próximas semanas para a diretoria colegiada.

João Paulo (Superintendente): Explicou suas tratativas com o Ministério da Integração (MI) e pediu compreensão e paciência "o que pode ser feito estou fazendo". Está aguardando o retorno do MI, mas adiantou que os Diretores deverão definir as prioridades para os gastos com diárias e passagens com base em uma "linha consistente de argumentação" para mostrar como serão utilizados. Nesse contexto, sugeriu às unidades "construir uma linha de argumentação com posições consistentes e claras para o MI". Também sugeriu a formação de uma pequena equipe para discutir as estratégias e diretrizes importantes para o desenvolvimento regional industrial. No que tange ao **PO 27** o superintendente aconselhou uma maior discussão e articulação para o tema. Sobre o **PO 28** (Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE), conveniado com a UFPE, acatou a proposta do Coordenador-Geral da CGEP para conhecer o relatório do trabalho e aguarda reunião.

Sabrina Oliveira (Coordenadora-Geral da CGDF/DFIN): Explicou as razões dos atrasos de 10 dos 28 projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) em execução, ressaltando que são atrasos que não dependem da SUDENE, particularmente o do **PO 31 - Transnordestina Logística S/A**, com atraso no cronograma de liberação pois a empresa e o Banco do Nordeste não chegaram a um acordo sobre os relatórios dos projetos, levando a uma interrupção das liberações de recursos. Quanto ao **PO 32 (TCA-FIAT)** a liberação que estava em atraso já foi encaminhada para a diretoria colegiada e poderá ser autorizada nos próximos dias. Sobre o PO **34 (Companhia Energética do Maranhão):** Sabrina informou que os recursos estão em restos a pagar, e que tendo em vista os problemas ocasionados por mudanças na legislação do FDNE, que afetaram a empresa, foi inviabilizado o seu prosseguimento normal, porém tal problema já foi solucionado e o projeto será retomado. Quanto ao projeto do **PO 54 (Cone Multicenter),** ele está contratado desde o ano de 2013, sendo que o agente operador, no caso a Caixa Econômica Federal, solicitou documentação à empresa, que não a apresentou no prazo, ocasionando o retorno do processo para avaliação pelo banco para então poderem ocorrer às liberações. Os recursos dessa empresa já estão empenhados. Sobre o projeto do **PO 56 – Companhia Siderúrgica Suape**, do Grupo Moura Dubeaux, Sabrina chamou a atenção para liberações realizadas em 2014, e providências da SUDENE que precisam ser encaminhadas. Os recursos já foram empenhados, entretanto o problema são as garantias dadas ao agente operador. A empresa informou que tal problema será resolvido e o projeto viabilizado.

João Paulo (Superintendente): pediu uma Nota Explicativa com detalhes do andamento do projeto da Transnordestina, particularmente sobre atrasos de execução, mudanças de rotas em alguns trechos e cronograma de liberações. Determinou que não houvessem mais liberações enquanto o cronograma físico não estivesse acompanhando o cronograma financeiro. Também propôs a elaboração de uma estratégia de abordagem com o Governo do Estado de Pernambuco, já que muitos dos atrasos estão sendo provocados por problemas de desapropriação, um assunto de competência do estado. Pediu para o Gabinete articular a criação de um grupo destinado a pensar estratégias e priorizar projetos, para, melhorando a articulação, tratar com mais fluidez, assuntos de interesse estratégico como o da Transnordestina e até de obras de saneamento, como o "Água para Todos", para gerar propostas que tensionem as instituições envolvidas a resolver problemas e evitar paralisações . Aproveitou para pedir reunião com Sra. Inalda Maria da Silva, Gerente da DGFI (Fones 2102.2140/2149, 12º andar, ala sul, do prédio da SUDENE) objetivando uma exposição sobre o FINOR em razão da sinalização do MI de transferir esse portfólio para a SUDENE. Sobre o projeto da **Companhia Siderúrgica Suape (PO 56**) o Superintendente pediu mais informações para tomar uma decisão clara e adiantou que isso vale para todos os projetos. Acrescentou que alguns temas devem ser tratados de forma diferenciados pela Diretoria Colegiada, em reuniões específicas, para os projetos que sejam considerados estratégicos para a SUDENE, levantando pontos e formulando estratégias.

Carmen Fonseca (Assistente Técnica da CGGI): Sobre o **PO 60 (Construção do Escritório de Processos (mapeamento de convênios)** a servidora da Coordenação-Geral de Gestão Institucional fez as explanações sobre o projeto de Mapeamento de processos, mostrando as ações realizadas, onde foi escolhida a área de convênios como piloto, sendo as informações solicitadas aos setores relacionados e já respondidas, para agora serem analisadas e realizadas as ações consequentes ao projeto.

Manoel Barreiros (Coordenador-Geral da CGGI): Apesar de não constar do rol de prioridades, comentou o atraso na apreciação do projeto do **novo regimento interno da SUDENE tratado pelo PO 59** e continua aguardando posição do Gabinete. Atendendo pedido do Superintendente, o Coordenador-Geral fez um breve relato do projeto de organização do PPA para o período 2016-2019, tratado no **PO 61 (Elaboração da proposta da Sudene para o novo PPA**), cujo trabalho começou em 21 de janeiro de 2015, com as unidades internas, seguindo-se articulações ministeriais, expedientes emitidos entre a Autarquia e os ministérios de interesse, definição de metodologia, seleção de propostas, tratativas internas e encaminhamentos externos, finalizando com a definição dos recursos orçamentários.

Ângela Lima (Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas): A unidade participou do monitoramento apresentando os resultados de seus indicadores de capacitação, e uma síntese dos resultados de seus três projetos: **PO 62 (Desenvolvimento de Lideranças), PO 63 (Gestão por Competências) e PO 64 (Investindo nos Sonhos).** Também fez uma explanação sobre as capacitações realizadas no exercício, evidenciando o alcance da meta mesmo sendo utilizado menos da metade dos recursos inicialmente orçados.

Josué Ribeiro (Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação)- ressaltou a importância do **PO 70 (modernização da infraestrutura de rede local)**, do esforço para essa melhoria e seus desdobramentos, particularmente, a proposta de lançamento oficial dos dois sistemas: Incentivos Fiscais (implantado desde 2010) e Fundos, em outubro de 2015, para acesso ampliado ao público, inclusive com uma programação de capacitação no uso dessas ferramentas.

João Paulo (Superintendente): pediu ao engenheiro Wilson que fizesse uma abordagem da situação de todas as obras em andamento, pois causou repercussão interna o atraso do IBGE que, contrariando o esperado, não fez contato com os Bombeiros para o início do projeto do sistema de combate a incêndios. Aproveitando a ocasião, pediu a Uyran Costa, seu Assessor, para marcar reunião entre os dias 28 e 29 de setembro com a SPU regional, e todos os condôminos para não se perder a oportunidade política e o apoio do Ministério da Saúde, que dispõe de R$ 3,5 milhões para esse projeto. Pediu ainda, para que estudos fossem feitos para se medir o impacto dos grandes projetos do FDNE e os investimentos propiciados pelos incentivos fiscais na região, de forma a se cobrar mais dos estados em termos de promoção pelos governadores "precisamos aprofundar as nossas articulações com os governadores e montar uma estratégia de promoção da SUDENE". Informou, nesse contexto, que no dia 16/10/15 estará fazendo uma visita à FIAT, que aliás, não colocou placa da SUDENE para os investimentos do FDNE, que somam cercam de R$ 2 bilhões. Também pediu que sejam pensados ciclos de debates e eventos tratando sobre os impactos gerados pelos grandes projetos no Nordeste.

José Wilson Galdino (DAD-Engenharia): Ateve-se ao **PO 67 (Modernização das subestações de energia do Edf. Sudene)** informando que a Autarquia irá contratar o serviços em breve, sendo que em relação a reforma da cobertura e das janelas a cargo do ministério da saúde será feito o rateio entre os condôminos. O superintende solicitou a realização de uma reunião com os condôminos no inicio da semana com o objetivo de definir as ações resguardando de possíveis modificações nos acordos tendo em vista possíveis mudanças na direção dos órgãos integrantes do condomínio.

Lygia Falcão (Assessora do Superintendente): sugeriu a realização de debates com stakeholders sobre os impactos gerados pelos grandes projetos, particularmente os do FDNE, no Nordeste.

Ricardo Barros (Diretor da DFIN): enalteceu a importância do monitoramento e sugeriu a Sílvio Carlos, como coordenador-geral em uma unidade que tem uma coordenação de atração de investimentos, um fórum de debates com as federações de indústrias para discutir os impactos dos incentivos na região. Também sugeriu alteração na portaria de diretrizes e orientações gerais do MI, para voltar a incluir o apoio ao financiamento de eólicas para geração. Ressaltou igualmente, a necessidade de marketing institucional e o fortalecimento da imagem.

9 – Conclusão

Entre o ciclo anterior, fechado em 18 de junho e este, o maior destaque foram as restrições orçamentárias, mais radicais que nos últimos anos, decorrentes da política econômica do governo federal, como forma de adequar os gastos às metas de formação de superávit primário no contexto da queda da produção e da arrecadação fiscal. Não se tratará aqui, das suas razões.

Nessa conjuntura, a dificuldade advinda da falta de recursos para diárias e passagens foi ponto reiterado pela maioria dos gestores como empecilho ao andamento normal dos processos, gerando atrasos e mesmo a impossibilidade da realização de novos projetos. Aliás, essas dificuldades foram ressaltadas pelos Coordenadores Gerais Carlos Almiro e Frederico Cavalcanti, titulares da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) e da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP), ambas, unidades da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) respectivamente. Assim, em função da natureza do órgão, de suas atribuições e de seus instrumentos de ação, é imprescindível a observações e o acompanhamento pessoal dos projetos pelos técnicos da Sudene, sendo esta uma atividade obrigatória que entretanto está sendo prejudicada pela contenção orçamentária do governo federal.

Com isso, pleitos de incentivos e convênios tiveram suas vistorias reprogramadas, afetando o prazo de conclusão de alguns projetos, como também, a significativa redução da demanda por novos financiamentos do FDNE. Contudo, isso não inibiu o esforço das unidades internas de adequarem suas programações explorando mais, a execução de atividades relacionadas com o processo de articulação, negociação e mobilização, a exemplo da realização, prevista para setembro, dos Fóruns de Energia, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e da 1ª Oficina de Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento, em adiantados estágios de organização, entre outros.

Ademais, pudemos observar uma melhora na situação geral dos projetos realizados pela Sudene. Mesmo com o aumento do numero geral de projetos, verificou-se um menor numero de situações de atraso e um maior de projetos em andamento e concluídos, refletindo o esforço da instituição e a maior eficiência do trabalho, mesmo em um cenário de adversidades externas e internas.

Essa situação pode ser mais bem visualizada, quando analisamos os montantes de recursos liberados ate o presente ciclo, (ver tabelas 1 e 2) e os compararmos com os valores do ciclo anterior. Em termos nominais observamos que foram liberados pouco mais de 252 milhões entre tais ciclos, representando um aumento de 4,5% do terceiro em relação ao segundo ciclo, sendo que tal valor representa apenas 2,7% do total de recursos previstos para serem liberados, seja no atual seja nos próximos exercícios, valor esse influenciado pela alta parcela prevista no cronograma de liberações do FDNE, que é plurianual e influi nessa leitura.

Em relação aos indicadores também observamos, em termos gerais, uma melhoria em seus resultados.

Outrossim, este foi um ciclo também de mudanças na estrutura de governança da Autarquia. Entre julho e setembro assumiram o Superintendente João Paulo Lima e Silva e os Diretores de Gestão de

Fundos, Incentivos, e de Atração de Investimentos, Ricardo Andrade Bezerra Barros; e de Administração, Eugênio Pacelli Remigio Araujo.

Setembro também é o mês em que termina o período de avaliação da parcela institucional da Avaliação de Desempenho, que começou em outubro do ano passado. Essa avaliação segue ciclo de 1 ano, começando em outubro e terminando em setembro do ano seguinte. Os resultados são acompanhados pelo monitoramento interno, que mostra, em cada relatório, a evolução alcançada até a chamada data de travamento das informações, podendo variar um pouco. Esse processo é diferenciado, pois segue normativo específico, e para o período em questão é a Portaria SUDENE nº 193, de 17 de dezembro de 2015, que, aliás, encontra-se em fase de ajuste seguindo o que ampara o § 2º, art. 5º do Decreto n 7.133/2010, hajam vistas os problemas decorrentes dos severos contingenciamentos orçamentários, que prejudicaram a execução de algumas metas. Nessa portaria encontram-se as metas apresentadas pelas unidades internas, responsáveis por sua execução. Tão logo termine o período, inicia-se a fase de apuração e de divulgação pública dos resultados, concomitante com a fase de estudos e proposição de nova portaria para a fixação de metas para o período seguinte, compreendendo out/2015 a set/2016.

Por sua vez, cumprindo rito interno previsto no processo de monitoramento da execução programática da SUDENE, a CGGI encaminhou à Auditoria Interna, neste mês de setembro, pedido formal para aplicação de procedimentos de auditagem no processo de acompanhamento praticado, como forma de promover a melhoria dos controles internos, aplicar os ajustes que se façam necessários e conferir maior credibilidade ao conjunto do trabalho.

Quanto aos próximos compromissos, os quadros a seguir mostram, respectivamente, a agenda para a última reunião do ano, onde constam a chamada “data de travamento dos dados” ou seja, a data até a qual devem estar as informações atualizadas, a data para a entrega desses dados à Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), responsável pela análise de consistência do conteúdo, e a data prevista para a próxima reunião. O segundo quadro mostra a agenda para 2016.

Agenda de Reuniões de Monitoramento de 2015

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
4º	27/11/15	04/12/15	17/12/15

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Agenda de Encaminhamentos dos Ciclos de Monitoramento da SUDENE para o Exercício de 2016

Ciclo	Data de Referência dos Dados	Data para Entrega à CGGI	Data da Reunião de Apresentação
1º	31/12/2015	26/02/2016	17/03/2016
2º	31/05/2016	07/06/2016	22/06/2016
3º	31/08/2015	09/09/2015	22/09/2015
4º	25/11/2016	02/12/2016	15/12/2016

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

ANEXO I
Quadros do Monitoramento

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 01 (ex PO 02)**
Objetivo estrátegico:	**1.5. Fortalecer as administrações públicas.**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos privados.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	234.105,49	246.426,82

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	**CONVÊNIO Nº 769782/2012 (Proposta SICONV 014881/2012)**
Data Atualização:	28/08/2015	**Vigência: 18/12/12 a 31/12/2015**

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
mai/12	139.865,15	7.361,32	147.226,47
jun/12	94.240,34	4.960,01	99.200,35
TOTAL	**234.105,49**	**12.321,33**	**246.426,82**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Pago até o ano anterior	R$	139.865,15
A realizar no exercício	R$	94.240,34
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	94.240,34
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	139.865,15

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Renato Arruda Vaz de Oliveira e Maria Helena de Castro Lima - SUDENE / Estevão Moura - CONDEPE/FIDEM

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	**Concluído**		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	**Concluído**		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	09/05/2012	11/05/2012		09/05/2012	11/05/2012		100,0%	**Concluído**		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	11/05/2012	08/06/2012		11/05/2012	08/06/2012		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	07/08/2012	14/12/2012		07/08/2012	14/12/2012		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	18/12/2012		18/12/2012	18/12/2012		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	18/12/2012	07/01/2013		18/12/2013	02/01/2013		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**50,0%**	**Em Andamento**		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/12/2012	31/12/2012	R$ 139.865,15	17/4/2013	1/8/2013	R$ 139.865,15	100,0%	**Concluído**		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	18/12/2012	14/10/2013		20/4/2013	14/10/2013		100,0%	**Concluído**	Empresa contratada, licitação e contrato registrado no SICONV.	
9	**Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho.**	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	6/2/2015		1/12/2013			50,0%	**Em Andamento**		
9.1	Etapa I: Proposta metodológica e mobilização social (R$ 42.879,89)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	1/12/2013	14/1/2014		1/12/2013	14/3/2014		100,0%	**Concluído**	O convenente atrasou o pagamento da empresa contratada por dificuldades com o sistema OBTV (nova ferramenta do SICONV). Após reunião na SUDENE com equipe da CGDS e de Convênios, o pagamento foi efetuado em 19/11/14.	
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	3/1/2014	31/1/2014		23/1/2014	23/1/2014		100,0%	**Concluído**		
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R$ 104.346,58)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	15/1/2014	30/9/2014		14/3/2014	5/3/2015		100,0%	**Concluído**	Esta etapa foi iniciada, no entanto, pelo atraso no pagamento do primeiro produto da empresa contratada, houve interrupção dos trabalhos. O reinício dos trabalhos da empresa está previsto para início de dezembro.	Foi solicitado ao convenente um novo planejamento das atividades junto à empresa, visando a repactuação de datas das etapas do projeto.
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	04/03/2015	5/3/2015		04/03/2015	5/3/2015		100,0%	**Concluído**	A visita técnica de acompanhamento da Oficina de participação social na Caracterização e Diagnóstico Situacional foi realizada no dia 05/03/2015.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	a definir	a definir	R$ 94.240,34				0,0%	**A Iniciar**	Relatórios de execução em fase de análise	
9.6	Etapa III: Diretrizes, Estratégias e Proposições (R$ 35.546,90)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**A Iniciar**		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano da Area de Desenvolvimento do Município de Bom Conselho (R$	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**A Iniciar**		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**A Iniciar**	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	

	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	17/06/2015	17/09/2015					0,0%	**A Iniciar**	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R$ 234.105,49	**Valor realizado:**		R$ 139.865,15	**70,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

3º Ciclo - 2015.

Histórico: Valor Total da contrapartida depositado em 28/02/13. Solicitado liberação da primeira parcela em 17/04/13, após conclusão do Termo de Referência e ajuste do PT. Liberação da primeira parcela re-encaminhada em 06/05/13. Limite orçamentário solicitado ao MI em 10/05/13, autorizado em 25/07/13 e 1ª parcela liberada em 01/08/13. Em 09/07/13, o convênio foi prorrogado "de ofício" por atraso na liberação da primeira parcela, em decorrência de atraso na autorização de limite pelo MI. Realizada reunião tecnica de acompanhamento entre os tecnicos da CGDS e os tecnicos do CONDEP/FIDEM no dia 28/01/2015. Terceiro termo aditivo, assinado em 04/02/2015, prorroga vigência para o dia 16/06/2015. Realizada visita técnica de acompanhamento do convênio no dia 05/03/2015 durante Oficina em Bom Conselho referente à etapa II. Convenente enviou produto da etapa II, aceito pela equipe técnica da SUDENE. Convênio teve vigência prorrogada para o dia 31/12/2015.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO 02 (ex PO 03)**
Objetivo estrátegico:	**2.3. Promover a sustentabilidade ambiental**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
DEZ/2012	265.241,25	58.942,50	324.183,75
MAIO/2013	265.241,25	--	265.241,25
TOTAL	**530.482,50**	**58.942,50**	**589.425,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	265.241,25
A realizar no exercício	R$	265.241,25
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	265.241,25
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	265.241,25

Previsão de Conclusão:	31/08/2015	**CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)**
Data Atualização:	28/08/2015	

esponsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Proje	Concedente:	Victor Uchôa Silva, Maria do Socorro Vilar e Renato Oliveira - SUDENE
	Convenente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

	Metas/ Etapas	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	**Concluído**		
1.1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	**Concluído**		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	**Concluído**		
1.3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	**Concluído**		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	**Concluído**		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	**Concluído**		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	**Concluído**		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**34,5%**	**Em Andamento**		
	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	R$ 265.241,25	15/08/2013	15/08/2013	R$ 265.241,25	100,0%	**Concluído**		
6	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEMAS/PE	Não informado	Não informado	--	Não informado		--	65,0%	**Em Andamento**	Encontra-se em conclusão o processo de contratação de empresa para substituição da que foi realizada o destrato. Além disso, continuam as providências para a contratação de empresa para a realização dos 14 Workshops, previstos na Etapa 2 de Meta 1.	
7	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/07/2014	31/08/2015	R$ 356.560,00	08/12/2014	--	--	**27,2%**	**Paralisado**	Não houve evolução em relação ao que foi realizado até maio/15 pois se continua aguardando a conclusão da contratação da empresa para retomada dos trabalhos.	Houve uma solicitação da convenente para prorrogação do prazo de vigência para repor o período paralizado, em virtude do destrato com a empresa responsável pela condução dos 61 encontros previstos. Tal solicitação foi acatada pela área técnica, tendo o prazo sido estendido para abril de 2016, restando assinatura do Termo Aditivo pelos gestores.
7.1	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano	SEMAS/PE	08/12/2014	30/06/2015	R$ 146.400,00	08/12/2014	--	--	36,0%	**Paralisado**	Não houve evolução em relação ao que foi realizado até maio/15: 22 eventos dos 61 previstos.	

**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/11/2014	11/12/2014	--	10/11/2014	11/12/2014	--	100,0%	**Concluído**	Foi realizada uma visita técnica de acompanhamento, na qual se pôde verificar a execução de dois Encontros, abrangendo quatro municípios.	
	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/06/2015	30/06/2015	R$ 265.241,25	--	--	--	0,0%	**Atrasado**		
7.2	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto	SEMAS/PE	01/07/2015	16/08/2015	R$ 176.960,00	--	--	--	0,0%	**Atrasado**		
7.3	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste	SEMAS/PE	17/08/2015	31/08/2015	R$ 33.200,00	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
8	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco	SEMAS/PE	01/05/2015	31/08/2015	R$ 232.865,00	01/05/2014	--	--	37,5%	**Em Andamento**		
8.1	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas.	SEMAS/PE	01/05/2015	31/08/2015	R$ 182.865,00	01/05/2015	--	--	75,0%	**Em Andamento**		
8.2	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas.	SEMAS/PE	01/07/2015	31/08/2015	R$ 50.000,00	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
***	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
9	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/10/2015	28/01/2016	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
			Valor Previsto:		R$ 0,00	**Valor realizado:**		R$ 265.241,25	**54,5%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015).

3º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 03 (ex PO 04)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	**Objetivo estrátegico (MI)**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Incrementar a competitividade de empreendimentos inovadores, promovendo o desenvolvimento local e regional por meio da criação de novas oportunidades de mercado (inserção nas economias local, regional, nacional e internacional) e de sistemas de comercialização para produtos e serviços.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Apicultura-informalidade, dificuldades de gestão, carência em tecnologias e de acesso aos mercados; Ovinocaprinocultura-problemas de sanidade, baixa qualidade genética, manejo inadequado, ausência e insuficiência da assistência técnica e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada.		
Projeto:	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Propiciar aos agricultores familiares, criadores de caprinos, ovinos e de abelhas, conhecimentos tecnológicos que possam contribuir de forma inovadora para aumento de produção e produtividade, tornando-os mais competitivos no mercado.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 4	30	694.459,19	771.621,32

Previsão de Conclusão:	30/09/2015	Convênio nº 769783/2012 (Proposta SICONV 015098/2012)
Data Atualização:	28/08/2015	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Marcélo de Castro Viana,Victor Uchôa Ferreira da Silva e Marcelo Saiki Braga - SARA/ José Ricardo Jucá Sampaio e Marcelo Cavalcanti Rabelo

PO 03 - PE

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/12	419.104,63	77.162,13	496.266,76
jan/13	137.677,28	--	137.677,28
abr/13	137.677,28	--	137.677,28
TOTAL	**694.459,19**	**77.162,13**	**771.621,32**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	556.781,91
A realizar no exercício	R$	137.677,28
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	137.677,28
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	694.459,19

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE							**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	**Concluído**		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	08/05/2012		23/04/2012	08/05/2012		100,0%	**Concluído**		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	23/04/2012	10/05/2012		23/04/2012	10/05/2012		100,0%	**Concluído**		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	10/05/2012	04/06/2012		10/05/2012	04/06/2012		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	08/06/2012	25/09/2012		08/06/2012	25/09/2012		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	18/10/2012	18/10/2012		18/10/2012	18/10/2012		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	26/10/2012	26/10/2012		26/10/2012	26/10/2012		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**60,0%**	**Concluído**		
8	Realização de processo licitatório para contratação de	SARA/PE	18/06/2013	02/07/2013		23/07/2013	28/08/2013		100,0%	**Concluído**		
	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	01/10/2012	11/10/2012	R$ 419.104,63	23/11/2012	12/12/2012	R$ 419.104,63	100,0%	**Concluído**		
9	Realizar 40 cursos de capacitação em	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		25/11/2013	15/09/2014		100,0%	**Concluído**		
10	Realizar 12 cursos de capacitação em Apicultura Básica	SARA/PE	18/12/2012	30/12/2014		13/01/2014	Não informado		100,0%	**Concluído**		
	*Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/01/2014	06/02/2014		28/01/2014	06/02/2014		100,0%	**Concluído**	(*)	
	*Liberação da 2ª parcela	CGDS/SUDENE	01/01/2013	17/06/2014	R$ 137.677,28	09/04/2104	19/05/2014	R$ 137.677,28	100,0%	**Concluído**		
11	Adquirir 540 colméias Langstroth.	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100,0%	**Concluído**		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	12/05/2014	**Não informado**		07/08/2014	22/08/2014		100,0%	**Concluído**	(**)	
	Liberação da 3ª parcela	SUDENE	01/04/2013	30/11/2014	R$ 137.677,28	16/01/2015	25/02/2015	R$ 137.677,28	100,0%	**Concluído**		
13	Adquirir 12 conjuntos de extração de mel, composto de	SARA/PE	18/12/2012	17/06/2014		08/08/2013	05/11/2013		100,0%	**Concluído**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/SUDENE	30/06/2015	30/09/2015					0,0%	**A Iniciar**	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios . Aguardando a Prestação de Contas Final para emissão do Laudo Técnico.	Inclui 60 dias para apresentação da PTC e 90 dias para análise pela SUDENE.
			Valor Previsto:		R$ 694.459,19	**Valor realizado:**		R$ 694.459,19	80,0%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco - SARA/PE

Observações:
Em 16/06/2014 foi assinado o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência do convênio para 30/12/2014
(*) A viagem de supervisão foi realizada no perído de 28 a 31/01/2014 e 04 a 06/02/2014, na área de atuação do Projeto
(**) A viagem de supervisão foi realizada no perído de 07 a 08/08/2014 e 20 a 22/08/2014, na área de atuação do Projeto
3º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 04 (ex PO 05)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Isolamento de uma parte da população do município no período de inverno.		
Projeto:	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN. Convênio nº 770860/2012 - Proposta n° 24955/12		
Objetivo do projeto:	Fazer a ligação da população do centro da cidade com a localidade de Santa Rosa no município de Ruy Barbosa/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	GND 3	30	800.000,00	825.379,68

Previsão de Conclusão:	10/03/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE (28/08/2014) - Juan Diego de Albuquerque Paulo/município de Ruy Barbosa/RN.

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
	280.000,00	8.400,00	288.400,00
	260.000,00	8.400,00	268.400,00
	260.000,00	8.579,68	268.400,00
	800.000,00	**25.379,68**	**825.379,68**

Valores Orçamentários/ Financeiros

Pago até o ano anterior	R$	800.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Autorizado no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	800.000,00

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2012	13/06/2012		13/06/2012	13/06/2012		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/06/2012	16/06/2012		15/06/2012	16/06/2012		100,0%	**Concluído**		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	20/06/2012	21/06/2012		20/06/2012	21/06/2012		100,0%	**Concluído**		
4	Emissão de Parecer	CGDS/SUDENE	21/06/2012	28/06/2012		22/06/2012	28/06/2012		100,0%	**Concluído**		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	28/06/2012	23/08/2012		29/06/2012	23/08/2012		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	23/08/2012	23/08/2012		23/08/2012	23/08/2012		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	24/08/2012	24/08/2012		24/08/2012	24/08/2012		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**60,0%**	**Concluído**		
8	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2012	01/09/2012	R$ 280.000,00	07/12/2012	07/12/2012	R$ 280.000,00	100,0%	**Concluído**	Houve atraso na liberação da 1ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi providenciada a Prorrogação de ofício pela SUDENE, por mais 36 dias, alterando a data de conclusão para 31/03/2014
9	**Meta 1**	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	30/09/2013		100,0%	**Concluído**	Houve atraso devido recurso judicial contra procedimento licitatório	O tribunal proferiu sentença favorável ao município. O processo licitatório foi concluído e homologado o licitante vencedor.
9.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100,0%	**Concluído**		
9.2	Serviços de movimento de terra: escavação manual, escavação mecânica, aterro apiloado.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/05/2013	31/05/2013		100,0%	**Concluído**		
9.3	Embasamento de pedra argamassada, concreto armado fck = 18 Mpa, preparo e lançamento para execução das fundações.	Município de Ruy Barbosa	01/09/2012	31/01/2013		01/08/2013	30/09/2013		100,0%	**Concluído**		
9.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/06/2013	03/07/2013		27/03/2013	30/03/2013		100,0%	**Concluído**		
10	**Meta 2**	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	28/02/2014		01/09/2013	30/09/2014		100,0%	**Concluído**		
10.1	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	30/09/2013	30/09/2013	R$ 260.000,00	14/11/2013	14/11/2013	R$ 260.000,00	100,0%	**Concluído**	Houve atraso na liberação da 2ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Solicitada prorrogação de ofício, por mais 73 dias, alterando a data de conclusão para 12/06/2014
10.2	Estrutura: execução de pilares de concreto armado, alvenaria de pedra argamassada para execução de muro de arrimo.	Município de Ruy Barbosa	01/02/2013	01/08/2013		01/09/2013	28/02/2014		100,0%	**Concluído**		

10.3	Concreto armado para longarinas, transversinas e laje de piso. Concreto armado para guarda rodas e muro de proteção nas laterais da ponte.	Município de Ruy Barbosa	09/12/2013	30/09/2014		01/12/2013	30/09/2014		100,0%	**Concluído**		
10.4	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	30/09/2013	02/10/2013		05/12/2013	08/12/2013		100,0%	**concluído**		
10.5	Liberação da 3ª parcela	COCF /CGAF / DAD	27/12/2013	27/12/2013	R$ 260.000,00	06/04/2014	06/04/2014	R$ 260.000,00	100,0%	**concluído**	Houve atraso na liberação da 3ª parcela, devido procedimentos administrativos da SUDENE e Ministério da Integração.	Foi solicitado termo aditivo ao convênio pelo covenente, por mais 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014
10.6	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/02/2014	17/02/2014		10/04/2014	17/04/2014		100,0%	**Concluído**		
11	**Meta 3**		01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100,0%	**Concluído**		
11.1	Instalações elétricas, piso cimentado rústico da laje da ponte, pinturas das estruturas de concreto armado e postes metálicos e urbanização do talude com grama batatais em placa.	Município de Ruy Barbosa	01/10/2014	12/10/2014		01/10/2014	11/10/2014		100,0%	**Concluído**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
12	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	10/01/2015	10/03/2015		Não informado	Não informado		100,0%	**Concluído**	Falta o Município complementar o relatório técnico de execução no Siconv.	Mesmo não tendo o Município complementado o relatório de execução, o laudo técnico foi inserido no Siconv.
			Valor Previsto:		R$ 800.000,00	**Valor realizado:**		R$ 800.000,00	**100,0%**	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Município de Ruy Barbosa/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (Sen Benedito Lira), consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R$ 50.000.000,00. Convênio nº 770860/2012 - Proposta n° 24955/12

Informações referentes à data de 19/04/2013:

(2) Obra atrasada devido a recurso judicial no processo licitatório. Este atraso inicial repercutiu em todo o processo, gerando retardo nas demais etapas.

(3) Foi concluído o processo licitatório e homologada e empresa vencedora da licitação. Conforme informação do engenheiro civil responsável pelos projetos e acompanhamento de fiscalização da obra de construção da ponte de concreto armado no município de Ruy Barbosa/RN, a empresa vencedora já está instalada no canteiro de obras para iniciar os serviços preliminares de construção da ponte. Estas informações estão atualizadas até 31/05/2013.

Informações referentes à data de 29/11/2013:

(4) 4° ciclo 2013: alterações na etapa 1 da meta 2

(5) 1º ciclo 2014: Falta liberar a 3ª parcela do convênio no valor de R$ 260.000,00, prevista para fevereiro/2014. Foi concluído a concretagem de pilares, longarinas e transversinas que compõem a estrutura de sustentação da ponte, restando a laje de concreto armado de piso, guarda-rodas e muro de proteção nas laterais da ponte. Foi concluído o muro de arrimo de proteção, constituindo-se de alvenaria de pedra argamassada, marroada, rejuntada com argamassa de cimento e areia grosa no traço 1:4

(6) 2º ciclo 2014: foi liberada a 3ª parcela do convênio no valor de R$ 260.000,00, em 06/04/2014.

(7) 3º ciclo 2014: Foi realizada uma vistoria de fiscalização em 10.04.2014; Foi concretada a laje de piso da ponte em concreto armado com concreto fck = 45 Mpa e espessura de 30 cm, de acordo com o projeto estrutural. Foi aprocado no SICONV o termo aditivo de 120 dias, alterando a data de conclusão para 12/10/2014.

(8) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em três parcelas, como segue: 1ª parcela: Out/2012 - 2ª parcela: Set/2013 - 3ª parcela: Abr/2014

(9) Em 28/08/2014, o Eng°Civil Givanildo Ramos de Souza foi incorporado ao processo como responsável técnico auxiliar.

(10) Em 11/12/2014, o convenente solicitou prorrogação de ofício está prevista uma visita técnica para recebimento da obra e emissão de laudo técnico.

(11) Em 01/10/2014 foi aprovado termo aditivo de 90 dias, alterando a data de término do convênio para 10/01/2015.

(12) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.

3º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 05 (ex PO 06)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2009**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica.	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Objetivo da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma base de dados/informações energéticas para contribuir para as diretrizes e formulação da política energética regional.		
Projeto:	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas		
Objetivo do projeto:	Articular e coordenar o planejamento energético regional.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250/280	Correntes	50 ou 90	9.452.840,00	9.452.840,00

Previsão de Conclusão:	30/06/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima e Manoel Jardim - SUDENE

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	1.352.840,00
A realizar no exercício	R$	3.100.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	3.100.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	1.352.840,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica com a EPE	DPLAN/CGDS/CDT	01/11/2009	03/05/2013		04/05/2011	30/12/2013		100,0%	Concluído	Em negociação ampliação do objeto do ACT .	Reunião com a EPE em 27/11/2013 para definir/ampliar o objeto do ACT
2	Convênio p/ Estruturação do Sistema de Informações Energéticas -	DPLAN/CGDS/CDT	13/01/2010	01/12/2012	R$ 352.840,00	13/01/2010	30/10/2012	R$ 352.840,00	100,0%	Concluído		
3	Elaboração de Relatórios com os resultados preliminares (Metas 1 e 2 do Convênio)	DPLAN/CGDS/CDT	01/08/2011			01/08/2011	03/05/2013		100,0%	Concluído		
4	Realização de oficina para apresentação do SIE	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	13/11/2012		28/09/2012	13/11/2012		100,0%	Concluído	Organizada pela SUDENE	
5	Apresentação de proposta de um Modelo de Governança para o SIE; criar um GT Regional de Planejamento Energético	DPLAN/CGDS/CDT	28/09/2012	01/02/2013	R$ 1.000.000,00	28/09/2012	01/02/2013	R$ 1.000.000,00	100,0%	Concluído	SUDENE e GT de Planejamento Energético	Oficina de Trabalho/Treinamento na SUDENE com a EPE e representantes dos Estados, janeiro de 2013.
6	Elab. Balanço Energético Regional 2013 ano base 2012(digital); Apoiar a execução dos Balanços Energéticos Estaduais; Participação em Oficina de Trabalho "Balanços Energéticos Estaduais" na EPE em 27 e 28/11/2013	DPLAN/CGDS/CDT	01/12/2012	30/04/2015	R$ 3.000.000,00	01/05/2013			60,0%	Atrasado	SUDENE e GT de Planejamento Energético.	Perenizar a elaboração do BE Regional e Estaduais maio/2014. Negociado/pactuado com a EPE a formalização de Termo de Utilização de dados para Balanço Energético. Aguardando agendamento de uma reunião com a EPE para dar prosseguimento.
7	Realização de estudos e diagnósticos setoriais: biomassa, solar, eólica, pchs etc.	DPLAN/CGDS/CDT	01/03/2013	30/04/2015		19/06/2013			90,0%	Paralisado	Informações para alimentar o SIE e identificar soluções mais adequadas para o suprimento de energia na Região	Redefinindo orçamento para 2015/2016. ACT assinado pela SUDENE, UFPE e aguardando assinatura do MI
8	Realização do I Seminário Regional de Planejamento Energético em novembro de 2013, com a SBPE e demais instituições do setor energético com prazo previsto para até 06/05/14; 2 - Oficina de trabalho do GT_Planejamento Energético para elaboração do Plano de Trabalho 2014/2015, com prazo previsto para até 05/05/14; 3 - Sessões Técncias para discussões relativas à questão energética regional/nacional/internacional	SUDENE	24/05/13	30/06/15	R$ 100.000,00	30/11/2014			80,0%	Atrasado	SBPE: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, CHESF, Federação das Industrias, Governos Estaduais, Centros de Pesquisa;	Reunir periodicamente o GT_Planejamento Energético; Realizar reuniões com o Fórum dos Secretários para assuntos de Energia/NE; Realizada Oficina para apresentação do quadro atual da energia solar no Brasil. Visita técnica ao CECSEM Brasil, células solar fotovoltaicas orgânicas em BH, março de 2015.

	Valor Previsto:	R$ 4.452.840,00	Valor realizado:	R$ 1.352.840,00	91,3%	Atrasado	Status do Projeto

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs.	3º Ciclo 2015 - Repactuada a atividade 8.
	Os recursos previstos nas Etapas 5, 6 e 7, são os oriundos do OGU/SUDENE na Ação 8902 que dependem dos limites liberados/disponibilizados anualmente.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 06 (ex PO 07)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimeto na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção .		
Projeto:	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	1.183.120,40	1.183.120,40

Previsão de Conclusão:	31/08/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
1ª parc. Maio	SUDENE	IFPB	714.000,40
2ª parc. Agosto	SUDENE	IFPB	469.120,00
			1.183.120,40

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Pago até o ano anterior	R$	1.183.120,40
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	1.183.120,40

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Convenente	Prof.ª Vânia Medeiros (Pró-Reitora de Extensão do IFPB) e professor Paulo Ditarso (IFPB).

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Elaboração do projeto	IFPB	11.02.2014	11.02.2014		2014			100,0%	**Concluído**		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	18.05.2014	18.05.2014		18.05.2014	18.05.2014		100,0%	**Concluído**		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	IFPB	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100,0%	**Concluído**		
4	Formalização do Termo de Execução Descentralizada	CGDS/SUDENE	11.02.2014	11.02.2014		11.02.2014	11.02.2014		100,0%	**Concluído**		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	11.03.2014	11.03.2014		11.03.2014	11.03.2014		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Termo de Cooperação	CGDS/SUDENE	22.04.2014	22.04.2014		22.04.2014	22.04.2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGDS/SUDENE	24.04.2014	24.04.2014		24.04.2014	24.04.2014		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**50,0%**	**Atrasado**		
	Liberação de Recursos	COCF/SUDENE	02/05/2014	02/07/2014		02/05/2014	25/08/2014	R$ 1.183.120,40	100,0%	**Concluído**		
8	Capacitação de 640 profissionais para a Construção Civil na Paraíba pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB: realização de 32 turmas de 20 alunas.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/03/2015		27/05/2014	20/08/2015		100,0%	**Concluído**	Até o presente momento, foram capacitadas 240 alunas das 640 previstas. Em virtude do Decreto n° 8.407/15, os recursos financeiros foram bloqueados, o que acarretou atrasos na execução das capacitações.	Recursos Financeiros desbloqueados. Foi solicitado Aditivo de Prazo, pelo IFPB, alterando a data de conclusão do projeto para 22/08/2015
8.1	Seleção das Equipes	IFPB	01/06/2013	31/07/2013		22/08/2013	Não informado		100,0%	**Concluído**		
8.2	Mobilização e divulgação	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		22/08/2013	Não informado		100,0%	**Concluído**		
8.3	Capacitação dos Monitores	IFPB	01/07/2013	31/07/2013		01/03/2014	Não informado		100,0%	**Concluído**		
8.4	Seleção dos Alunos/Aprendiz	IFPB	01/08/2014	01/08/2014		29/10/2013	Não informado		100,0%	**Concluído**		
8.5	Elaboração do Material Didático	IFPB	01/11/2013	30/12/2013					100,0%	**Concluído**		
8.6	Aquisição do Laboratório Móvel, equipamentos e material de consumo	IFPB	01/11/2013	13/12/2013		01/11/2013	23/03/2015		100,0%	**Concluído**		

8.7	Oferta dos cursos: Curso Aplicador de Revestimento Cerâmico;Curso de Pintura de Obras; CursoAuxiliar de Gerenciamento de Obras.	IFPB	Abril/Julho e Set/Nov/2014	01/12/2014		01/04/2014	20/08/2015		100,0%	**Concluído**	Em virtude do Decreto n° 8.407/15, que dispõe sobre regulamentação das despesas inscritas em restos a pagar não processados até o exercício de 2014, houve o bloqueio dos recursos financeiros, acarretando atrasos nas ações.	Os cursos nos *Campi* João Pessoa e Pedra de Fogo iniciaram se no dia 09/04/2015; no Campus Monteiro iniciaram-se no dia 27/04/2015; no Campus Cajazeiras iniciaram-se no dia 23/03/2015.
8.8	Inserção no Mercado de Trabalho	IFPB	04/08/2014	01/03/2015		01/11/2014			10,0%	**Atrasado**	O IFPB não estimou adequadamente as condições de absorção das alunas no mercado de trabalho.	Negociação com os sindicatos da construção civil (SINDUSCON) e SINE.
9	Acompanhamento e avaliação do Projeto	IFPB/SUDENE	01/04/2014	22/08/2015		24/11/2014			50,0%	**Atrasado**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
10	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	CGDS/SUDENE	22/06/2015	22/08/2015					0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		**R$ 1.183.120,40**	**Valor realizado:**		**R$ 1.183.120,40**	**70,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

IFPB

Observações:

(1) O IFPB solicitou à Sudene a continuidade do projeto em 2014 uma vez que não foi possível conclui-lo em 2013 e a ampliação no número de vagas de 320 para 640 alunas, com 32 turmas de 20 alunas. A Junta Diretora da Sudene aprovou a solicitação em Ata nº 165.

(2) Os recursos financeiros e orçamentários foram totalmente disponibilizados.

(3) A gestão do projeto referente ao IFPB sofreu alteração, mudando seus dirigentes (Reitor, Pró-Reitor e Diretor do Projeto). Para evitar que o projeto não tenha solução de continuidade foi marcada reunião para 08/09/2014 no IFPB para verificação dos prazos previstos na realização das metas.

(4) O encerramento do TED estava previsto para 22/05/2015, todavia devido a entraves observados na execução das ações e do decreto n° 8.407/15, foi enviado pelo IFPB o Ofício Nº 10/2015 - PROEXT/IFPB, de 27/05/2015, solicitando Aditivo de Prazo para 22/08/2015, sendo acatado pela SUDENE e publicado no DOU de 27/05/2015. Houve retificação do prazo de vigência no DOU de 12/06/2015 para a data de até 31/08/2015.

3º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 07 (Ex PO 08)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Regiões menos dinâmicas com necessidade de estímulos (financeiros, fiscais e técnicos) e instalação de infraestrutura para fomentar atividades econômicas alternativas que favoreça à atração de investimentos públicos e privados.		
Projeto:	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		
Objetivo do projeto:	Elaborar uma agenda programática de curto, médio e longo prazo para que o Sistema SEDINOR/IDENE seja capaz de organizar e integrar as ações dos diversos agentes de desenvolvimento presentes nas regiões do Norte e Nordeste de Minas Gerais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	GND 3 (3330.41)	30	485.874,65	511.447,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	**CONVÊNIO Nº 794997/2013**
Data Atualização:	28/08/2015	**Vigência: 31/12/13 a 30/12/14**

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
01/02/2014	255.723,17	25.572,35	281.295,52
01/05/2014	230.151,48		230.151,48
TOTAL	**485.874,65**	**25.572,35**	**511.447,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	255.723,17
A realizar no exercício	R$	230.151,48
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	230.151,48
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	255.723,17

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Guimarães Moreira, Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Tiago Cançado Diniz - IDENE

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)	CGDS/SUDENE				**26/09/2013**	17/01/2014		**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento da Proposta no SICONV	CGDS/SUDENE					26/09/2013		100,0%	**Concluído**		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE					11/12/2013		100,0%	**Concluído**		
3	Etapas de formalização do convênio	SUDENE				11/12/2013	31/12/2013		100,0%	**Concluído**		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE					31/12/2013		100,0%	**Concluído**		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE					17/01/2014		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)	IDENE/SUDENE	31/12/2013	31/07/2014			30/12/2014		**40,4%**	**Atrasado**		
6	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/2/2014	26/5/2014	R$ 255.723,17	1/2/2014	26/5/2014	R$ 255.723,17	100,0%	**Concluído**	Contrapartida depositada e liberada a primeira parcela em 26/05/2014.	
7	Processo licitatório	IDENE	1/3/2014	30/4/2014		14/8/2014	21/8/2014		100,0%	**Concluído**		
8	**Meta 01: Elaboração do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Minas Gerais**	IDENE/SUDENE	30/4/2014	30/12/2014		21/8/2014			96,3%	**Em Andamento**	Convenente solicitou prorrogação da vigência do convênio em 21/11/14. Prorrogação foi aprovada tecnicamente para 30/03/2015 e está sendo analisada por outros setores da SUDENE.	Atualizar com a data repactuada com o executor.
8.1	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	21/8/2014	21/8/2014		21/8/2014	21/8/2014		100,0%	**Concluído**	assinatura da ordem de serviço e reunião alinhamento com Equipe Técnica.	
8.2	Etapa 1.1: Elaboração de Relatório de situação do Norte e Nordeste de Minas Gerais	IDENE/SUDENE	1/5/2014	30/12/2014		22/08/14	20/11/14		100,0%	**Concluído**	Produto 1 entregue a SUDENE.	
8.3	Etapa 1.2: Elaboração de Relatório de análise de investimentos	IDENE/SUDENE	16/6/2014	30/12/2014		01/11/14	19/12/2014		100,0%	**Concluído**		
	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	1/12/2014	30/12/2014		22/12/14	19/03/2015		100,0%	**Concluído**	22/12/2014: Videoconferência; 19/03/2015: Visita de acompanhamento	
-	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	1/7/2014	31/7/2014	R$ 230.151,48	01/07/2015	19/07/2015		100,0%	**Concluído**		
8.4	Etapa 1.3: Elaboração de Relatório de análise de convergência de planos para o Norte e Nordeste	IDENE/SUDENE	1/8/2014	30/12/2014		05/01/2015	10/03/2015		100,0%	**Concluído**		
8.5	Etapa 1.4: Elaboração de Plano de Ação do Sistema SEDINOR/IDENE	IDENE/SUDENE	1/9/2014	30/12/2014		05/02/2015	14/05/2015		100,0%	**Concluído**		
8.6	Etapa 1.5: Publicação do PESI-NNE - Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	IDENE/SUDENE	5/10/2014	28/7/2015		Não informado			70,0%	**Atrasado**		Atualizar com a data repactuada com o executor.

9	Evento de Divulgação	IDENE/SUDENE	20/10/2014	28/7/2015		20/10/2014			40,0%	**Atrasado**		Atualizar com a data repactuada com o executor.
10	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	A definir.	A definir		11/09/2015			0,0%	**A Iniciar**		Atualizar com a data repactuada com o executor.
	ENCERRAMENTO (Peso 20 %)								**0,0%**	**A Iniciar**		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	27/11/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	Atualizar com a data repactuada com o executor.
			Valor Previsto:		R$ 485.874,65	**Valor realizado:**		R$ 255.723,17	**60,4%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE

Observações:

3º Ciclo 2015 - Segunda parcela liberada. Repactuada as etapas 8.6, 9 e 10. A data da visita técnica foi definida.

Fonte: CGDS/Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 08 (ex PO 09)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	**8917 - Fortalecimento das Administrações Locais**	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Intensificação dos investimentos em infraestrutura econômica em municípios que possuem precariedade ou inadequação da gestão territorial pelas administrações municipais, caracterizadas, principalmente, por: insuficiência ou inexistência de quadros próprios de técnicos e fiscais; carência de qualificação técnica para o exercício de um efetivo controle urbano e ambiental; legislação urbanística municipal inadequada ou inexistente; entre outros.		
Projeto:	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.		
Objetivo do projeto:	Melhorar a capacidade técnica e de gestão das administrações locais - Metropolitana Norte e Mata Norte de Pernambuco, por meio de capacitações aos servidores em planejamento territorial, controle urbano, fiscalização e gestão administrativa/operacional, dos 11 municípios impactados por grandes investimentos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	GND 3	30	207.542,62	218.465,90

Previsão de Conclusão:	01/11/2015	**CONVENIO Nº 794329/2013 (Proposta SICONV 042454/2013)**
Data Atualização:	28/08/2015	

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
FEV/2014	107.354,71	5.650,24	113.004,95
JUN/2014	100.187,91	5.273,04	105.460,95
TOTAL	**207.542,62**	**10.923,28**	**218.465,90**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	107.354,71
A realizar no exercício (RAP 2013)	R$	100.187,91
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar (2015)	R$	100.187,91
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	107.354,71

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção, Victor Ferreira da Silva, Teresa Oliveira - SUDENE / Danielli Cristini dos Santos - CONDEPE/FIDEM (em processo de substituição formal, cf. Of. de 28/05/2015)

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento/divulgação do Chamamento Público 002/2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	18/06/2013		04/06/2013	18/06/2013		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	19/06/2013	18/07/2013		19/06/2013	18/07/2013		100,0%	**Concluído**		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	19/07/2013	17/08/2013		19/07/2013	12/08/2013		100,0%	**Concluído**		
4	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS - ASCOM	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	--	--		27/08/2013	30/12/2013		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	--	--		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	--	--		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**10,3%**	**Atrasado**		
8	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	(a partir de) 27/10/2014		R$ 107.354,71	06/11/2014	06/11/2014	R$ 107.354,71	100,0%	**Concluído**		
9	** Realização do processo de licitação e contratação	CONDEPE/FIDEM	01/09/2014	-		01/09/2014	--	--	20,0%	**Atrasado**	*Em que pese a atualização do Plano de Trabalho, faz-se necessário nova atualização, em particular, quanto à etapa 1 da meta 1, e conclusão do processo licitatório e contratações previstas. **A Secretaria de Administração do Estado solicitou alteração do TR, o que demandou novos prazos.	*Dadas as pendências e atrasos verificados, a CGDS realizou reunião técnica com a equipe da agência CONDEPE-FIDEM, solicitando agilização e informações do andamento das atividades. ** Em razão do prazo da etapa 1 ter expirado sem que o efetivo início das atividades ocorresse, foi solicitado, em 11/08/2015, proceder nova atualização.
10	**Meta 1 -** Realizar 01 seminário de lançamento do	CONDEPE/FIDEM	01/07/2015	30/09/2015	--	--	--	--	**0,0%**	**Atrasado**		
10.1	**Etapa 1.1:** Realizar 11 Reuniões Técnicas nos Municípios	CONDEPE/FIDEM	01/07/2015	31/07/2015	--	--	--	--	**0,0%**	**Atrasado**		
10.2	**Etapa 1.2:** Diagnóstico e Levantamento de Dados	CONDEPE/FIDEM	01/08/2015	14/09/2015	--	--	--	--	**0,0%**	**A Iniciar**		
10.3	**Etapa 1.3:** Seminário de Lançamento do Programa de capacitação para Fortalecimento Institucional.	CONDEPE/FIDEM	15/09/2015	30/09/2015	--	--	--	--	**0,0%**	**A Iniciar**		
11	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
12	* Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	01/10/2015	30/10/2015	R$ 100.187,91	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
13	**Meta 2:** Realizar 6 oficinas de Capacitação /	CONDEPE/FIDEM	01/10/2015	01/11/2015		--	--	--	**0,0%**	**A Iniciar**		
13.1	**Etapa 2.1:** Realizar 02 oficinas de Capacitação em	CONDEPE/FIDEM	01/10/2015	10/10/2015	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
13.2	**Etapa 2.2:** Realizar 02 Oficinas em Fiscalização e Gestão	CONDEPE/FIDEM	11/10/2015	19/10/2015	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
13.3	**Etapa 2.3:** Realizar 02 Oficinas de Monitoramento e	CONDEPE/FIDEM	20/10/2015	01/11/2015	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
14	*** Visita técnica de acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de	CGDS/DPLAN/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ 207.542,62	**Valor realizado:**		R$ 107.354,71	**30,3%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISA DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM (CNPJ: 05.744.181/0001-84)

Observações:
3º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho quanto à etapa 1 da Meta 1, bem como a realização/conclusão do processo licitatório, para efetivo início das atividades.
2º Ciclo 2015 - Situação: Aguardando ajustes no plano de trabalho e conclusão do processo licitatório, para efeivo início das atividades.
1º Ciclo 2015 - Situação: aditamento de prazo formalizado (1º TA), nova vigência 01/03/2015 a 01/11/2015, que enseja os devidos ajustes no plano de trabalho, consequentemente, dos períodos de execução das metas e etapas do projeto.
4º Ciclo 2014 - Situação atual: formalizada a prorrogação de ofício, com a consequente repactuação dos prazos de execução das metas e etapas. Apesar da repactuação ocorrida ,em razão do impedimento legal, para liberação da primeira parcela dos recursos, o convênio se encontra aguardando o término do período eleitoral para item 10 e 10.1. É necessário fazer a compatibilização do início das atividades do projeto com a ocorrência da liberção da 1ª parcela. Isso deverá ocorrer por meio de ajustes no Plano de Trabalho do projeto.

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 09 (ex PO 10)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais por meio da elaboração de planos de desenvolvimento regional (ordenamento territorial) que identifique os efeitos positivos/negativos dos investimentos em relação aos aspectos institucionais, socioeconômicos e ambientais, com vistas a salvaguardar o bem estar das populações e perspectivas de desenvolvimento dos espaços de influência.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de um planejamento em base sustentável para a região impactada por investimentos de grande porte: Transnordestina, Plataforma Logística Multimodal de Salgueiro, Projeto de Integração do Rio São Francisco, Canal do Sertão e a Ponte do Ibó.		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno.		
Objetivo do projeto:	Elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável que avalie os impactos dos investimentos na área em análise (município de Salgueiro e seu entorno), visando compreender o atual quadro socioeconômico com o objetivo de apontar diretrizes e propostas que possibilitem um desenvolvimento planejado e integrado diante do cenário encontrado de oportunidades e desafios.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	GND 3 (3330.41)	30	359.682,64	378.613,30

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
jun/14	221.267,56	11.645,66	232.913,22
dez/14	138.415,08	7.285,00	145.700,08
TOTAL	**359.682,64**	**18.930,66**	**378.613,30**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	221.267,56
A realizar no exercício	R$	138.415,08
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	138.415,08
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	221.267,56

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	28/08/2015

CONVÊNIO Nº 792551/2013 (Processo 59335.000357/2013-81)
Vigência: 31/12/2015

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena de Castro Lima, Manoel Jardim - SUDENE / Cláudia Soares de Melo - CONDEPE/FIDEM

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	04/06/2013	04/06/2013		04/06/1013	04/06/2013		100,0%	**Concluído**		
2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	04/07/2013	02/08/2013		18/07/2013	19/08/2013		100,0%	**Concluído**		
3	Resultado do Chamamento Público 2013	CGDS/SUDENE	26/08/2013	26/08/2013		26/08/2013	26/08/2013		100,0%	**Concluído**		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	26/08/2013	21/11/2013		26/08/2013	21/11/2013		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	SUDENE	21/11/2013	30/12/2013		21/11/2013	30/12/2013		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2013	31/12/2013		31/12/2013	31/12/2013		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	17/01/2014	17/01/2014		17/01/2014	17/01/2014		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**48,0%**	**Atrasado**		
	Liberação da primeira parcela	CGDS/COF/SUDENE			R$ 221.267,56	11/06/2014	30/06/2014	R$ 221.267,56	100,0%	**Concluído**		
8	Processo licitatório	CONDEPE/FIDEM	Não Informado	Não Informado		11/06/2014	10/07/2015		100,0%	**Concluído**		
9	**Meta 1: Elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno**	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	30/12/2014					**20,0%**	**Atrasado**		
	Realização do Fórum: Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Município de Salgueiro e seu Entorno - Um Instrumento para o Desenvolvimento Regional. Data:16/12 e 17/12/2014. Local: Salgueiro/PE.	SUDENE	20/11/2014	17/12/2014		20/11/2014	17/12/2014		**100,0%**	**Concluído**	Evento organizado pela CGDS com participação do MI, Agência CONDEPE/FIDEM e municípios da região.	
9.1	Etapa I: Elaboração da proposta metodológica e mobilização social (R$ 45.973,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/12/2013	03/03/2014		10/07/2015			80,0%	**Em Andamento**		
9.2	Reunião Técnica de Acompanhamento do Convênio	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**Atrasado**	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.3	Etapa II: Caracterização / Diagnóstico Situacional (R$ 186.939,54)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	04/03/2014	06/06/2014					0,0%	**Atrasado**		
9.4	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**Atrasado**	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência.	
9.5	Liberação da segunda parcela	CGDS/COF/SUDENE	01/12/2014	30/12/2014	R$ 138.415,08				0,0%	**Atrasado**		

9.6	Etapa III: Diretrizes Gerais e Propostas (R$ 67.618,68)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	07/06/2014	07/09/2014					0,0%	**Atrasado**		
9.7	Etapa IV: Consolidação do Plano (R$ 78.081,40)	CONDEPE/FIDEM / SUDENE	08/09/2014	03/12/2014					0,0%	**Atrasado**		
9.8	Visita Técnica de Acompanhamento.	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**Atrasado**	As datas de reuniões e visitas técnicas serão acordadas com a Agência .	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
10	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**A Iniciar**	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios	
			Valor Previsto:		R$ 359.682,64	**Valor realizado:**		R$ 221.267,56	**68,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM

Observações:

a) Repactuada a atividade 9.1

b) O convenente solicitou reajuste do plano de trabalho, haja vista a prorrogação da vigência. A atualização adequará as datas, estabelecendo os prazos corretos para as atividades.

3º ciclo 2015.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 10 (ex PO 11)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	**Objetivo estrátegico (MI)**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporaçao de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	343.585,70	361.725,70

Previsão de Conclusão:	31/12/2015	Convênio Nº 813986/2014
Data Atualização:	28/08/2015	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Victor Uchôa Ferreira da Silva/ Marcelo Saiki Braga /Marcélo de Castro Viana - EMEPA - Wandrick Haus de Sousa

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
dez/14	206.151,42	10.884,00	217.035,42
nov/15	137.434,28	7.256,00	144.690,28
TOTAL	**343.585,70**	**18.140,00**	**361.725,70**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	343.585,70
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	206.151,42
Saldo a liberar	R$	137.434,28
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	206.151,42

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100,0%	**Concluído**		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100,0%	**Concluído**		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100,0%	**Concluído**		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100,0%	**Concluído**		
6	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100,0%	**Concluído**		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100,0%	**Concluído**	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**9,0%**	**Em Andamento**		
8	Liberação 1a parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R$ 206.151,42	100,0%	**Concluído**	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso.
9	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01/Meta 01)	EMEPA-PB	03/08/2015	31/12/2015		03/08/2015			50,0%	**Em Andamento**	Licitação foi iniciada; aguardando término para finalização da etapa	
10	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02/Meta 01)	EMEPA-PB	21/09/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
11	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01/Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
12	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02/Meta 02)	EMEPA-PB	21/09/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
13	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03/Meta 02)	EMEPA-PB	13/10/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
14	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
15	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	26/10/2015	30/10/2015					0,0%	**A Iniciar**		
16	Liberação 2a parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	31/11/2015	R$ 137.434,28				0,0%	**A Iniciar**	O convente solicitou ajustes no cronograma de desembolso.	Autorizada alteração no cronograma de desembolso.
17	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/12/2015	31/12/2015					0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
18	Emissão de parecer técnico final da execução	CGDS/SUDENE	01/01/2016	31/01/2016					0,0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 343.585,70		**Valor realizado:**	R$ 206.151,42	**29,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:
3º ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 11 (ex PO 12)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	**Objetivo estrátegico (MI)**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade vprodutiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixa qualidade genética, manejo inadequado, e carências nutricionais aliadas a alimentação inadequada dos rebanhos, além de pouco conhecimento e utilização de novas tecnologias dos produtores rurais.		
Projeto:	Fortalecimento da Caprinocultura do Estado do Ceará		
Objetivo do projeto:	Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da caprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável com a inclusão direta de agricultores familiares , gerando renda e fixação do homem ao campo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	GND 3 e 430	30	771.000,00	989.777,00

Previsão de Conclusão:	24/04/2106	Convênio Nº 812155/2014
Data Atualização:	28/08/2015	

ADL 14-15

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
nov/14	221.000,00	57.777,00	218.777,00
mar/15	550.000,00	161.000,00	771.000,00
TOTAL	**771.000,00**	**218.777,00**	**989.777,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	550.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	221.000,00
Saldo a liberar	R$	550.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	221.000,00

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Marcelo de Castro Viana/ Marcelo Saiki Braga / SDA - Antônio Nunes de Oliveira/ Francisco Antônio Marcelo da Costa Viana

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	Não informado		Não informado	Não informado		100,0%	**Concluído**	De acordo com o programado na Meta Institucional estava prevista a formalização do convênio, a qual foi cumprida em toda a sua totalidade (100%)	
2	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014		28/02/2014	28/02/2014		100,0%	**Concluído**		
3	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		28/02/2014	24/09/2014		100,0%	**Concluído**		
4	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		24/09/2014	04/11/2014		100,0%	**Concluído**		
5	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		04/11/2014	25/11/2014		100,0%	**Concluído**		
6	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado		Não informado	31/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Não informado	Não informado		31/12/2014	08/01/2015		100,0%	**Concluído**		
	Execução (Peso 60%)								**6,7%**	**Em Andamento**	Estão sendo analisadas as propostas encaminhadas pelos interessados em participar do projeto, para as metas 09,10,11,12 e 13.	
8	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/COCF/SUDENE	03/11/2014	30/11/2014	R$ 221.000,00	14/04/2015	22/04/2015	R$ 221.000,00	100,0%	**Concluído**		
9	Contrataçao de 03 Técnicos	SDA/CE	02/11/2015	22/04/2016					0,0%	**A iniciar**		
10	Realizar 03 seminários de divulgaçao	SDA/CE	12/11/2015	11/12/2015					0,0%	**A iniciar**		
11	Realizar 06 cursos de capacitação	SDA/CE	18/01/2016	26/02/2016					0,0%	**A iniciar**		
12	Realizar 09 dias de campo	SDA/CE	01/03/2016	11/03/2016					0,0%	**A iniciar**		
13	Realizar 02 intercâmbios interestaduais	SDA/CE	15/02/2016	25/03/2016					0,0%	**A iniciar**		
14	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	23/11/2015	27/11/2015					0,0%	**A iniciar**		
15	Liberaçao da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2015	16/11/2015	R$ 550.000,00				0,0%	**A iniciar**		
16	Aquisição de 900 matrizes e 90 reprodutores caprinos	SDA/CE	11/08/2015	29/02/2016					0,0%	**A Iniciar**	Iniciado o processo licitatório para a aquisição dos animais.	
	Encerramento - 20%								**0,0%**			
17	Realização de visita tecnica de acompanhamento para elaboração de Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	02/05/2016	07/05/2016					0,0%	**A iniciar**		
18	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	24/06/2016	24/09/2016					0,0%	**A iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ 771.000,00	**Valor realizado:**		R$ 221.000,00	27%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Observações:
3º ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 12 (ex PO 13)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Implantar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Contribuir para melhoria da capacidade de gestão do poder público local mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos Recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Alencar	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Atender ao desafio de moldar o perfil do agente público na concepção moderna da nova gestão pública ou gestão pública gerencial, com o desafio de incluir características que atendam a objetivos e missão institucionais, convergindo com os interesses da sociedade.		
Projeto:	CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICO-GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 10 MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO PARAIBANO		
Objetivo do projeto:	Capacitar e qualificar os servidores de 10 municípios do semiárido paraibano, visando o aprimoramento e o desenvolvimento de suas competências nas áreas técnico-gerenciais, administrativo-organizacionais, financeiro-fiscais, elaboração de projetos e captação de recursos com vistas à melhoria da capacidade de gestão pública local.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	GND 3	30	410.203,62	437.000,00

Previsão de Conclusão:	30/12/2015	**Convênio N° 813604/2014 (Proposta: 052390/2014)**
Data Atualização:	28/08/2015	

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/14	212.141,92	13.858,08	226.000,00
jun/15	198.061,70	12.938,30	211.000,00
TOTAL	**410.203,62**	**26.796,38**	**437.000,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	410.203,62
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	410.203,62
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáveis técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira e Vera Lúcia Assunção.

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento/divulgação do Programa	CGDS/SUDENE			R$ -		06/08/2015	R$ -	100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento de propostas (SICONV)	CGDS/SUDENE	30/10/2014	06/11/14	R$ -	30/10/2014	06/11/2014	R$ -	100,0%	**Concluído**		
3	Análise/seleção de propostas	CGDS/SUDENE	04/11/2014	19/12/14	R$ -	04/11/2014	19/12/2014	R$ -	100,0%	**Concluído**		
4	Etapas de formalização do convênio	CGDS - CGC - COCF - PRD	20/12/2014	30/12/14	R$ -	20/12/2014	31/12/2014	R$ -	100,0%	**Concluído**		
5	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE			R$ -		31/12/2014	R$ -	100,0%	**Concluído**		
6	Publicação do convênio	CGC/SUDENE			R$ -		08/01/2015	R$ -	100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**0,0%**	**Atrasado**		
7	* Liberação da primeira parcela de recursos	SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	R$ 212.141,92			R$ -	0,0%	**Atrasado**	Dentro dos prazos legais, foram feitas análises dos Termos de Referências, os quais foram aprovados no dia 28 de abril. Foi solicitado à convenente no dia 21/05 que realizasse os ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso, bem como o depósito da contrapartida, sendo este último atendido no dia 29/05. A convenente solicitou ajuste de Plano de Trabalho, o qual foi rejeitado (03/06/2015) tendo em vista não haver compatibilidade entre as datas de liberação e execução (a execução estava prevista para data anterior à liberação dos recursos). Em 01/07/2015, foi solicitado ajuste do cronograma de desembolso. Em 18/08/2015, foi solicitado ao gestor um pedido de esclarecimento da convenente. Em 21/08/2015, o gestor solicitou esclarecimento sobre o não ajuste do Plano de Trabalho.	
8	**Meta 1: Realizar 4 Capacitações em Gestão Financeira (R$ 167.250,00)**	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	14/05/2015				R$ -	**0,0%**	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
8.1	**Etapa 1:** Sensibilização e Mobilização/Procedimentos Licitatórios e Contratuais (R$ 500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	31/12/2014	14/03/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
8.2	**Etapa 2:** Realizar 2 Cursos sobre E-social e Administração Pública (R$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/03/2015	14/04/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.

8.3	**Etapa 3:** Realizar 1 Curso sobre GFIP-SEFIP (R$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/04/2015	30/04/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
8.4	**Etapa 4:** Realizar 1 Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira na Administração Pública (R$ 69.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/05/2015	14/05/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
9	*Visíta Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
10	**Liberação da segunda parcela de recursos	SUDENE	30/06/2015	30/06/2015	R$ 198.061,70			R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
11	**Meta 2: Realizar 1 Capacitação em Patrimônio Público (R$ 32.250,00)**	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015				R$ -	**0,0%**	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
11.1	**Etapa 1:** Realiza 1 Curso sobre Gestão do Patrimônio Público (R$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/05/2015	30/05/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
12	*Visíta Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
13	**Meta 3: Realizar 1 Capacitação em Gestão de Projetos (R$ 26.500,00)**	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015				R$ -	**0,0%**	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
13.1	**Etapa 1:** 1 Curso sobre SICONV – Da Celebração à Prestação de Contas. (Elaboração de Projetos para Captação de Recursos Fianaceiros). (R$ 26.500,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/06/2015	15/06/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
14	*Visíta Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R$ -	0,0%	**A Iniciar**		
15	**Meta 4: Realizar 6 Capacitações em Compras Governamentais (R$ 211.000,00)**	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	30/11/2015				R$ -	**0,0%**	**A Iniciar**		
15.1	**Etapa 1:** 1 Curso sobre Licitações Públicas (R$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	01/07/2015	14/07/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
15.2	**Etapa 2:** 1 Curso sobre Elaboração de Edital e Termo de Referência (R$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/07/2015	30/07/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
15.3	**Etapa 3:** 1 Curso sobre Pregão Presencial e Eletrônico (R$ 37.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/08/2015	30/08/2015				R$ -	0,0%	**Atrasado**		Repactuar data com o executor.
15.4	**Etapa 4:** 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R$ 34.750,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/09/2015	30/09/2015				R$ -	0,0%	**A Iniciar**		
15.5	**Etapa 5:** 1 Curso sobre Novo Sistema de Registro de Preço (R$ 32.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/10/2015	30/10/2015				R$ -	0,0%	**A Iniciar**		
15.6	**Etapa 6:** 1 Curso sobre Contratos Administrativos (Gestão e Fiscalização) (R$ 37.250,00)	Governo do Estado da Paraíba/SEAD	15/11/2015	30/11/2015				R$ -	0,0%	**A Iniciar**		
16	*Visíta Técnica de Acompanhamento	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir				R$ -	0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
17	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**A Iniciar**	Parecer financeiro a ser emitido pela unidade de gestão de convênios após emissão do laudo técnico.	
			Valor Previsto:		R$ 410.203,62	**Valor realizado:**		R$ 0,00	**20,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Governo do Estado da Paraíba/Secretaria de Estado da Administração
Observações:
3º Ciclo 2015

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 13 (ex PO 14)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	GND 3	30	400.000,00	420.540,15

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/14	200.000,00	10.000,00	210.000,00
set/15	200.000,00	10.540,15	210.540,15
TOTAL	**400.000,00**	**20.540,15**	**420.540,15**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	400.000,00
Orçamento Autorizado no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	200.000,00
Saldo a liberar	R$	200.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	200.000,00

Previsão de Conclusão:	09/11/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Anne Michelle Franco Carvalho/Município de Jardim de Piranhas/RN.

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	03/04/2014	03/04/2014	-	03/04/2014	03/04/2014		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	24/02/2014	24/08/2014	-	24/02/2014	21/08/2014		100,0%	**Concluído**		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014	-	18/05/2014	19/05/2014		100,0%	**Concluído**		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	24/03/2014	24/08/2014	-	18/03/2014	21/08/2014		100,0%	**Concluído**		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	25/08/2014	30/12/2014	-	22/08/2014	22/12/2014		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014	-	23/12/2014	23/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015	-	09/01/2015	09/01/2015		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**20,1%**	**Em Andamento**		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida (R$ 10.000,00)	Município de Jardim de Piranhas	01/12/2015	31/12/2015		02/02/2015	02/02/2015		100,0%	**Concluído**		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R$ 200.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R$ 200.000,00	100,0%	**Concluído**		
10	**Meta 1 (R$ 205.027,43)**		**29/05/2015**	**18/09/2015**		29/05/2015			**0,5%**	**Em Andamento**		
10.1	Serviços preliminares: Barracão da obra, locação da obra, placa da obra. (R$ 935,31)	Município de Jardim de Piranhas	29/05/2015	08/06/2015		29/05/2015			5,0%	**Atrasado**	O Município iniciou o processo de licitação	
10.2	Demolições (R$ 18.661,72)	Município de Jardim de Piranhas	31/05/2015	10/06/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.3	Movimento de Terra (R$ 232,37)	Município de Jardim de Piranhas	11/06/2015	21/06/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.4	Fundações (R$ 10.937,59)	Município de Jardim de Piranhas	16/06/2015	06/07/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.5	Estrutura (R$ 50.949,17)	Município de Jardim de Piranhas	11/07/2015	31/07/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.6	Paredes e Painéis (R$ 22.822,52)	Município de Jardim de Piranhas	05/08/2015	15/08/2015					0,0%	**Atrasado**		

10.7	Cobertura (R$ 36.425,31)	Município de Jardim de Piranhas	05/08/2015	20/08/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.8	Revestimento (R$ 45.814,51)	Município de Jardim de Piranhas	25/08/2015	06/09/2015					0,0%	A Iniciar		
10.9	Esquadrias e Ferragens - 32% (R$ 18.248,93)	Município de Jardim de Piranhas	15/08/2015	25/08/2015					0,0%	**Atrasado**		
10.10	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	07/09/2015	12/09/2015					0,0%	A Iniciar		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida (R$ 10.540,15)	Município de Jardim de Piranhas	26/08/2015	31/08/2015					0,0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	13/09/2015	18/09/2015	R$ 200.000,00				0,0%	A Iniciar		
13	**Meta 2 (R$ 215.512,72)**		**19/09/2015**	**24/09/2015**					**0,0%**	A Iniciar		
13.1	Esquadrias e Ferragens - 68% (R$ 38.778,99)	Município de Jardim de Piranhas	19/09/2015	04/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.2	Instalações Hidrosanitárias (R$ 15.680,90)	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	14/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.3	Instalações elétricas (R$ 20.630,80)	Município de Jardim de Piranhas	29/09/2015	14/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.4	Instalação de Granito/Mármore (R$ 17.608,64)	Município de Jardim de Piranhas	15/10/2015	30/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.5	Instalações contra incêndio (R$ 2.102,99)	Município de Jardim de Piranhas	19/10/2015	29/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.6	Piso (R$ 77.762,05)	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	19/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.7	Pintura (R$ 40.661,95)	Município de Jardim de Piranhas	24/09/2015	14/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.8	Diversos (R$ 2.286,40)	Município de Jardim de Piranhas	30/10/2015	09/11/2015					0,0%	A Iniciar		
13.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	CGDS	10/11/2015	25/11/2015					0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		**24/01/2016**	**23/02/2016**					**0,0%**	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	24/01/2016	23/02/2016					0,0%	**A Iniciar**		
					R$ 400.000,00	**Valor realizado:**		**R$ 200.000,00**	**40%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Município de Jardim de Piranhas/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R$ 700.000,00. Convênio nº 802415/2014 - Proposta n° 020551/2014

(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015

(3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.

(4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.

(5) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(6) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.

(7) Foi previsto no projeto do convenente o uso de menos recursos que o disponível para a execução da meta 2. Foi incorporado, para execução da meta 2 o valor de R$ 4.972,57 em virtude de não utilização na meta 1.

3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 14 (ex PO 15)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	Reforma e modernização do Mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1.00)
	100	GND 3	30	300.000,00	310.000,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1.00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENT**	**TOTAL**
dez/14	150.000,00	5.000,00	155.000,00
set/15	150.000,00	5.000,00	155.000,00
TOTAL	**300.000,00**	**10.000,00**	**310.000,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	300.000,00
Orçamento Autorizado no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	150.000,00
Saldo a liberar	R$	150.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	150.000,00

Previsão de Conclusão:	22/10/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Jackson Carlos Godeiro/Município de Messias Targino/RN

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	04/04/2014	04/04/2014		04/04/2014	04/04/2014		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		06/03/2014	25/08/2014		100,0%	**Concluído**		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	29/05/2014	30/05/2014		18/05/2014	19/05/2014		100,0%	**Concluído**		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	06/03/2014	06/09/2014		18/03/2014	25/08/2014		100,0%	**Concluído**		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	07/09/2014	07/12/2014		26/08/2014	04/12/2014		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	30/12/2014	30/12/2014		05/12/2014	05/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	02/01/2015	15/01/2015		08/01/2015	08/01/2015		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**20,0%**	**Em Andamento**		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida (R$ 5.000,00)	Município de Messias Targino/RN	01/12/2014	31/12/2014		04/02/2015	04/02/2015		100,0%	**Concluído**		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/12/2014	31/12/2014	R$ 150.000,00	28/05/2015	28/05/2015	R$ 150.000,00	100,0%	**Concluído**		
10	**Meta 1 (R$ 155.000,00)**		**29/05/2015**	**16/08/2015**					0,0%	**Atrasado**		
10.1	Serviços preliminares - 100% (R$ 18.399,26)	Município de Messias Targino/RN	29/05/2015	08/06/2015					0,0%	**Atrasado**	O Município concluiu a licitação e iniciou a obra.	Em contato com o município de Messias Targino, ficou acertado que as obras se iniciariam a partir do dia 16/06/2015.
10.2	Trabalhos em terra - 100% (R$ 656,27)	Município de Messias Targino/RN	09/06/2015	24/06/2015					0,0%	Atrasado		
10.3	Fundações e Estruturas - 100% (R$ 30.872,07)	Município de Messias Targino/RN	25/06/2015	15/07/2015					0,0%	Atrasado		
10.4	Alvenaria - 100% (R$ 14.584,98)	Município de Messias Targino/RN	16/07/2015	31/07/2015					0,0%	Atrasado		
10.5	Cobertura - 100% (R$ 5.927,69)	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	04/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.6	Esquadrias - 39,49% (R$ 12.000,00)	Município de Messias Targino/RN	25/07/2015	04/08/2015					0,0%	Atrasado		

10.7	Instalações Hidrosanitárias - 26,03% (R$ 4.000,00)	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	04/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.8	Instalações elétricas - 34,68% (R$ 4.000,00)	Município de Messias Targino/RN	20/07/2015	01/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.9	Revestimentos - 56,72% (R$ 17.059,73)	Município de Messias Targino/RN	01/08/2015	06/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.10	Piso - 37,77% (R$ 35.000,00)	Município de Messias Targino/RN	01/08/2015	06/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.11	Calçada Externa - 42,45% (R$ 12.500,00)	Município de Messias Targino/RN	27/07/2015	06/08/2015					0,0%	Atrasado		
10.12	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório (R$ 42.233,00)	CGDS	07/08/2015	16/08/2015					0,0%	Atrasado		
11	Depósito da 2ª parcela da contrapartida (R$ 5.000,00)	Município de Messias Targino/RN	17/08/2015	22/08/2015					0,0%	Atrasado		
12	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/09/2015	06/09/2015	R$ 150.000,00				0,0%	A Iniciar		
13	**Meta 2 (R$ 155.000,00)**		**08/09/2015**	**28/10/2015**					0,0%	A Iniciar		
13.1	Esquadrias - 60,51% (R$ 18.390,90)	Município de Messias Targino/RN	08/09/2015	18/09/2015					0,0%	A Iniciar		
13.2	Instalações Hidrosanitárias - 73,97% (R$ 11.369,39)	Município de Messias Targino/RN	19/09/2015	04/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.3	Instalações elétricas - 65,32% (R$ 7.531,96)	Município de Messias Targino/RN	20/09/2015	30/09/2015					0,0%	A Iniciar		
13.4	Revestimentos - 43,28% (R$ 13.017,07)	Município de Messias Targino/RN	15/09/2015	25/09/2015					0,0%	A Iniciar		
13.5	Piso - 62,23% (R$ 57.670,96)	Município de Messias Targino/RN	15/09/2015	30/09/2015					0,0%	A Iniciar		
13.6	Pintura - 100% (R$ 26.706,86)	Município de Messias Targino/RN	26/09/2015	06/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.7	Calçada Externa - 57,55% (R$ 16.943,86)	Município de Messias Targino/RN	20/09/2015	05/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.8	Diversos - 100% (R$ 3.369,00)	Município de Messias Targino/RN	06/10/2015	22/10/2015					0,0%	A Iniciar		
13.9	Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório final	CGDS	23/10/2015	28/10/2015					0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		**27/12/2015**	**26/01/2016**					**0,0%**	A Iniciar		
14	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	27/12/2015	26/01/2016					0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		**R$ 300.000,00**	**Valor realizado:**		**R$ 150.000,00**	**40%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Município de Messias Targino/RN

Observações:

(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, consignada no OGU-SUDENE, na ação 8902, vinculada ao Programa 2029, no valor global de R$ 700.000,00. Convênio nº 802144/2014 - Proposta n° 024010/2014

(2) O covenente se comprometeu a liberar as contrapartidas em duas parcelas, como segue: 1ª parcela: Dez/2014 - 2ª parcela: Mar/2015

(3) A liberação da 1ª parcela ainda não foi efetuada, visto que a SUDENE ainda não recebeu a verba destinada para este fim.

(4) Ressalta-se que o convenente terá 60 dias, após o término do convênio, para apresentar a prestação de contas final.

(5) Houve atraso na liberação dos recursos financeiros para a SUDENE, acarretando em atraso na liberação da 1ª parcela, que só foi efetuada no dia 28/05/2015.

(6) Foi efetuada prorrogação de ofício por 139 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 05/06/2015 para o dia 22/10/2015.

3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 15 (ex PO 16)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio de Alencar Guimarães (Diretoria de Planejamento)	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Crescimeto na área da construção civil com falta de mão de obra especializada, ao mesmo tempo que cresce o número de mulheres que buscam se qualificar e ingressar no segmento da construção.		
Projeto:	"Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio n° 813665/2014		
Objetivo do projeto:	Promover a inclusão social e produtiva, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional no setor da Construção Civil, atendendo, preferencialmente, mulheres e beneficiários de programas sociais de transferência de renda, com maior vulnerabilidade social, menor renda per capita e que possuam, no mínimo, a primeira fase do ensino fundamental (1ª a 4ª série).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	GND 3	30	1.069.868,00	1.090.800,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL (R$)**
mar/15	326.618,00	20.932,00	347.550,00
jun/15	371.625,00		371.625,00
set/15	371.625,00		371.625,00
TOTAL	**1.069.868,00**	**20.932,00**	**1.090.800,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	1.069.868,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	326.618,00
Saldo a liberar	R$	743.250,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	326.618,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Givanildo Ramos e Macira Sotero (SUDENE/CGDS)
	Convenente	Vanessa Tenório Beltrão Barbirato (coordenadora), Adrianny Cristiny De Lima Silva (técnica)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Elaboração do projeto	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100,0%	**Concluído**		
2	Análise do Projeto	CGDS/SUDENE	26/11/2015	31/12/2015	-	26/11/2015	30/12/2015		100,0%	**Concluído**		
3	Apresentação formal do Projeto à SUDENE	SEMTABES	25/11/2014	25/11/2014	-	25/11/2014	25/11/2014		100,0%	**Concluído**		
4	Formalização do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100,0%	**Concluído**		
5	Aprovação na Diretoria Colegiada	CGDS/SUDENE	Não informado	Não informado	-	Não informado	Não informado		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio no DOU	CGDS/SUDENE	01/01/2015	10/01/2015	-	08/01/2015	08/01/2015		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**16,4%**	**Atrasado**		
8	Depósito da contrapartida (R$ 20.932,00)	SEMTABES	01/02/2015	28/02/2015		23/03/2015	23/03/2015		100,0%	**Concluído**		
9	**Liberação da 1ª parcela**	COCF /CGAF / DAD	01/03/2015	31/03/2015	**R$ 326.618,00**	24/03/2015	24/03/2015	**R$ 326.618,00**	100,0%	**Concluído**		
10	Visita técnica	CGDS	05/05/2015	06/05/2015	**-**	16/04/2015	17/04/2015		100,0%	**Concluído**		
11	Processo licitatório para contratação de serviços	SEMTABES	01/01/2015	31/05/2015	**-**	Não informado			15,0%	**Atrasado**		
12	Mobilização e divulgação	SEMTABES	31/03/2015	31/05/2015	-	Não informado			30,0%	**Atrasado**		
13	Contratação de entidade para selecionar e contratar profissionais e monitores práticos de obras, pessoal de apoio administrativo, palestrantes, monitores inclusive com capacitação dos mesmos, para formação de equipe de execução do projeto (R$ 41.750,00)	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015		Não informado			10,0%	**Atrasado**		

14	Seleção dos Alunos/Aprendiz	SEMTABES	01/04/2015	31/05/2015	-	Não informado			10,0%	**Atrasado**		
15	Aquisição de equipamentos e material permanente, dos materiais de consumo e permanente para os três cursos (R$ 305.800,00)	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015					0,0%	**Atrasado**	Em processo de licitação.	
16	Elaboração do Material Didático	SEMTABES	01/03/2015	31/05/2015	-				0,0%	**Atrasado**	Em virtude de solicitação de Ajuste no Plano de Trabalho para a inclusão de mais um curso e da responsabilização da entidade contratada de eleborar o material didático, houve atraso na contratação da entidade que efetuará os cursos e o material didático.	Ajuste do Plano de Trabalho aprovado e iniciadas alterações. Andamento do projeto retomado.
17	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/06/2015	05/06/2015	-	16/04/2015	17/04/2015		100,0%	**Concluído**	Visita prévia para esclarecimentos e informações ao convenente sobre o processo de convênio.	
18	**Liberação da 2ª parcela**	COCF /CGAF / DAD	06/06/2015	15/06/2015	**R$ 371.625,00**				0,0%	**Atrasado**		
19	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/06/2015	31/08/2015					0,0%	**A Iniciar**		
20	Visita técnica para fiscalização das etapas	CGDS	01/09/2015	05/09/2015	-				0,0%	**A Iniciar**		
21	**Liberação da 3ª parcela**	COCF /CGAF / DAD	06/09/2015	15/09/2015	**R$ 371.625,00**				0,0%	**A Iniciar**		
22	Capacitação de 300 profissionais para construção civil nos cursos de Aplicador de revestimento cerâmico, Pintura de obras e auxiliar de gerenciamento de obras	SEMTABES	16/09/2015	30/11/2015					0,0%	**A Iniciar**		
23	Inserção das alunas no mercado de trabalho	SEMTABES	01/08/2015	30/12/2015	-				0,0%	**A Iniciar**		
24	Visita técnica para elaboração de relatório final	CGDS	01/12/2015	30/12/2015	-				0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
25	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer técnico final	CGDS/SUDENE	01/02/2016	31/05/2016	-				0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		**R$ 1.069.868,00**	**Valor realizado:**		**R$ 326.618,00**	**36%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas

Observações:

(1) Foi solicitado Ajuste no Plano de Trabalho no dia 30/04/2015, que ainda está em andamento.

3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO 16 (ex PO 17)**
Objetivo estrátegico:	**2.3. Promover a sustentabilidade ambiental**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	A Mesorregião da Borborema no Estado da Paraíba possui atualmente um modelo de desenvolvimento insatisfatório, considerando-se fatores socioeconômicos e ambientais, possuindo indicadores de processos de desertificação e desordenamento do território preocupantes. Necessita, portanto, de um instrumento que venha subsidiar o ordenamento territorial, para o delineando de diretrizes e ações que possam orientar o uso e ocupação do solo deste território.		
Projeto:	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Elaboração e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema, tendo como linha de ação o ordenamento do uso e ocupação do território e seus recursos ambientais, indicando um conjunto de diretrizes e metas que servirão de orientação aos poderes públicos na elaboração de suas legislações de ordenamento do uso e da ocupação do solo.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	3330.41 e 4430.42	30	835.823,47	928.692,75

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
JUN/2015	458.149,49	41.800,00	499.949,49
SET/2015	377.673,98	51.069,28	428.743,26
-	**835.823,47**	**92.869,28**	**928.692,75**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP 2014)	R$	835.823,47
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	835.823,47
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Victor Uchôa Silva, Renato Vaz de Oliveira e Isis Guimarães Moreira - SUDENE
	Convenente	Beranger Arnaldo Araújo e Vanessa Oliveira Fernandes - SEIRHMACT/PB

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	19/09/2014	30/10/2014	--	19/09/2014	30/10/2014	--	100,0%	**Concluído**		
1.1	Disponibilização do Programa / Ação no SICONV para o recebimento de propostas	CGDS/SUDENE	19/09/2014	20/10/2014	--	19/09/2014	20/10/2014	--	100,0%	**Concluído**		
1.2	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	21/10/2014	30/10/2014	--	21/10/2014	30/10/2014	--	100,0%	**Concluído**		
2	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	31/10/2014	28/11/2014	--	31/10/2014	28/11/2014	--	100,0%	**Concluído**		
3	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	29/11/2014	30/12/2014	--	29/11/2014	30/12/2014	--	100,0%	**Concluído**		
4	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	--	31/12/2014	31/12/2014	--	100,0%	**Concluído**		
5	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	08/01/2015	08/01/2015	--	08/01/2015	08/01/2015	--	100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**2,5%**	**Em Andamento**		
6	Liberação da primeira parcela	SUDENE	01/08/2015	31/08/2015	R$ 458.149,49	Não informado	--		50,0%	**Em Andamento**	Tendo a convenente atendido os requisitos necessários, foi solicitada a liberação da primeira parcela. Tal liberação encontra-se em andamento.	
7	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SEIRHMACT / PB	Não informado	Não informado	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
8	**Consolidação do Projeto (R$ 41.304,00)**	SEIRHMACT / PB	01/08/2015	31/08/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9	**Elaboração de Diagnóstico (R$ 458.645,49)**	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9.1	Elaboração do Diagnóstico do Meio Físico (biótico e abiótico) (R$ 134.729,10)	SEIRHMACT / PB	01/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9.2	Elaboração do Diagnóstico Sócioeconômico e Cultural (R$ 80.969,09)	SEIRHMACT / PB	02/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9.3	Elaboração do Diagnóstico Jurídico Institucional (R$ 69.449,10)	SEIRHMACT / PB	03/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9.4	Elaboração de Relatório da Síntese da Situação Atual (R$ 109.769,10)	SEIRHMACT / PB	04/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		

9.5	Desenvolvimento de um SIG Integrado para a Gestão Territorial (R$ 63.729,10)	SEIRHMACT / PB	05/09/2015	31/10/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
10	**Visita técnica de acompanhamento**	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
11	**Liberação da segunda parcela**	SUDENE	01/10/2015	31/10/2015	R$ 377.673,98	--	--		0,0%	**A Iniciar**		
12	**Elaboração de Prognóstico (R$ 294.170,50)**	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
12.1	Elaboração de Cenários (R$ 44.674,10)	SEIRHMACT / PB	02/10/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
12.2	Proposição de Unidades de Intervenção (R$ 91.174,10)	SEIRHMACT / PB	01/10/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
12.3	Elaboração do Mapeamento Cartográfico de Zonas e Subzonas (R$ 45.094,10)	SEIRHMACT / PB	03/10/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
13	Relatório com a Apresentação de Diretrizes Gerais e Específicas de Uso (R$ 73.894,10)	SEIRHMACT / PB	04/10/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
14	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei (R$ 39.334,10)	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/11/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
15	**Elaboração do Plano de Implementação do ZEE Borborema (R$ 89.649,88)**	SEIRHMACT / PB	01/11/2015	30/12/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
16	**Planejamento, divulgação, mobilização e realização do seminário final (R$ 44.922,88)**	SEIRHMACT / PB	01/12/2015	31/12/2015		--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
17	**Visita técnica final de acompanhamento.**	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/02/2016	29/05/2016					0,0%	**A Iniciar**	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios após a emissão do laudo técnico pela CGDS.	
			Valor Previsto:		R$ 835.823,47	**Valor realizado:**		R$ 0,00	**23%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão da Paraíba - SEPLAG/PB; Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Paraíba - SUDEMA/PB; Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado da Paraíba - AESA/PB.

Observações:

3º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 17 (ex PO 18)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes socioeconômicas da agr
Finalidade da ação:	Melhorar a qualidade de vida nas regiões estagnadas, dinamizando as economias locais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Carência de apoio na mecanização agrícola de produção de alimentos		
Projeto:	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município de Currais Novos/RN		
Objetivo do projeto:	Adquirir frota de equipamentos agrícolas(plantadeira e adubadeira de cereais, trator agrícola e grade aradora)		

Dados Orçamentários	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	GND 3	30	250.000,00	266.400,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
jan/14	250.000,00	16.400,00	266.400,00
TOTAL	**250.000,00**	**16.400,00**	**266.400,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	250.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Autorizado no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	250.000,00

Previsão de Conclusão:	**13/09/2015**
Data Atualização:	**28/08/2015**

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Agrimon Marcos Brasileiro Lima/SUDENE - Marcelo Viana/Município de Currais Novos/RN.

	Meta/ Etapas	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	13/06/2013	13/06/2013	-	13/06/2013	13/06/2013		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	11/06/2013	11/07/2013	-	16/09/2013	30/10/2013		100,0%	**Concluído**		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	-	-	-	-	-		100,0%	**Concluído**		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	16/09/2013	24/01/2014		100,0%	**Concluído**		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	11/06/2013	30/10/2013	-	03/01/2014	03/01/2014		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	31/12/2014	31/12/2014	-	31/12/2014	31/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	16/01/2014	16/01/2014	-	16/01/2014	16/01/2014		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**60,0%**	**Concluído**		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida (R$ 16.400,00)	Município de Currais Novos	01/01/2014	31/01/2014		31/01/2014	31/01/2014		100,0%	**Concluído**		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/01/2014	31/01/2014	R$ 250.000,00	04/07/2014	04/07/2014	R$ 250.000,00	100,0%	**Concluído**		
10	**Meta 1 (R$ 266.400,00)**		**31/12/2013**	**05/06/2015**		16/07/2014	22/08/2014		100,0%	**Concluído**		
10.1	Trator agrícola sobre rodas, 4x4(02 Unid.=R$ 196.000,00).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		16/07/2014	16/07/2014		100,0%	**Concluído**		
10.2	Plantadeira adubadeira de cereais(02 Unid.=R$ 34.400,00).	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		21/08/2014	21/08/2014		100,0%	**Concluído**		
10.3	Grade aradora(02 Unid.=R$ 36.000,00))	Município de Currais Novos	31/12/2013	05/06/2015		22/08/2014	22/08/2014		100,0%	**Concluído**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)		**04/08/2015**	**03/09/2015**					**0,0%**	Em Andamento		
11	Visita técnica de acompanhamento para emissão de Laudo Técnico	CGDS	05/06/2015	04/08/2015					0,0%	**Atrasado**	A visita técnica, para possibilitar a emissão do Laudo Técnico final, está na dependência da disponibilidade de recursos financeiros.	
12	Análise da PTC, sob o aspecto técnico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	04/08/2015	03/09/2015					0,0%	**A Iniciar**		
					R$ 250.000,00	**Valor realizado:**		R$ 250.000,00	**80,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Município de Currais Novos/RN
Observações:
(1) Trata-se de Projeto apoiado pela Emenda Parlamentar proposta pelo deputado João Maia/RN, Convênio Siconv nº 789015/2013;
(2) Foi efetuada prorrogação de ofício por 156 dias, alterando a data de vigência do convênio, do dia 23/06/2015 para o dia 09/11/2015.
(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para encaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.
3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 18**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	**Objetivo estrátegico (MI):**	0840 - Implementação de Infraestrutura logística voltada para inclusão na cadeia produtiva.
Finalidade da ação:	Promover ações que contribuam para a superação dos limites da Infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Mercado Público Municipal com elementos estruturais e estéticos comprometidos		
Projeto:	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.		
Objetivo do projeto:	Promover melhorias nas instalações do Mercado Público visando o desenvolvimento econômico e financeiro da população que se beneficia com seu fucionamento e estrutura		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	GND 3	30	1.000.000,00	1.053.000,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
fev/14	400.000,00	23.000,00	423.000,00
	300.000,00	15.000,00	315.000,00
	300.000,00	15.000,00	315.000,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**53.000,00**	**1.053.000,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior (2014)	R$	400.000,00
A realizar no exercício	R$	600.000,00
Orçamento Autorizado no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	600.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	400.000,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2016
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Edson Fernando de Laranjeiras Pinto/SUDENE - Givanildo Ramos de Souza/SUDENE - Engenheiro João Bosco/Município de Saboeiro/CE.

	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Data de abertura do processo	CGDS/SUDENE	02/10/2013	02/10/2013	-	03/04/2014	03/04/2014		100,0%	**Concluído**		
2	Recebimento e análise da proposta	CGDS/SUDENE	30/09/2013	12/12/2013	-	30/09/2013	12/12/2013		100,0%	**Concluído**		
3	Realização de visita técnica	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100,0%	**Concluído**		
4	Emissão de Pareceres	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100,0%	**Concluído**		
5	Outros procedimentos formais - legais	CGDS/SUDENE	...	...	-	...	...		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGDS/SUDENE	26/12/2013	26/12/2013	-	23/12/2014	23/12/2014		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação no DOU	CGDS/SUDENE	14/01/2014	14/01/2014	-	09/01/2015	09/01/2015		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**18,0%**	**Em Andamento**		
8	Depósito da 1ª parcela da contrapartida (R$ 23.000,00)	Município de Saboeiro	01/02/2014	28/02/2014		05/02/2014	05/02/2014		100,0%	**Concluído**		
9	Liberação da 1ª parcela	COCF /CGAF / DAD	01/02/2014	28/02/2014	R$ 400.000,00	13/02/2014	13/02/2014	R$ 400.000,00	100,0%	**Concluído**		
10	**Meta 1 (R$ 1.053.000,00)**		**30/12/2013**	**26/12/2014**		28/02/2014			40,0%	**Atrasado**		
10.1	Reforma do Mercado Público	Município de Saboeiro	30/12/2013	26/12/2014		28/02/2014			40,0%	**Atrasado**		
11	Visita técnica	CGDS/SUDENE							0,0%	A Iniciar		
12	Liberação da 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD			R$ 300.000,00				0,0%	A Iniciar		
13	Visita Ttécnica	CGDS/SUDENE							0,0%	A Iniciar		
14	Liberação 2ª parcela	COCF /CGAF / DAD			R$ 300.000,00				0,0%	A Iniciar		
15	Visita técnica	CGDS/SUDENE							0,0%	A Iniciar		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	A Iniciar		
16	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final	CGDS/SUDENE	22/12/2015	30/03/2016					0,0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		**R$ 1.000.000,00**	**Valor realizado:**		R$ 400.000,00	**38,0%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Município de Saboeiro/CE

Observações:

(1) O convênio teve a sua vigência prorrogada até 21/12/2015 em face da necessidade de se proceder o ajuste do plano de trabalho, que encontra-se em andamento;

(2) Os recursos financeiros da segunda parcela, no valor de R$ 300.000,00, estão disponíveis na Sudene, aguardando o término do ajuste do plano de trabalho.

(3) A data de previsão da conclusão do convênio considerou 60 dias para aencaminhamento da prestação de contas e 40 dias para emissão do laudo técnico, como previsto na Portaria 69, de 15/08/2013.

3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 19**
Objetivo estrátegico:	**1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APLs, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de uma política energética que considere as especificidades da região Nordeste.		
Projeto:	Fórum de Energia		
Objetivo do projeto:	Estabelecimento de uma política energética regional		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena; Manoel Jardim; Isis Guimarães

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (Peso 20%)**		**04/05/2015**	**15/09/2015**		**04/05/2015**			**18,5%**	**Em Andamento**		
1.1	Mobilização dos Contatos/Secretários	Maria Helena; Carlos Almiro	04/05/2015	15/09/2015		04/05/2015			70,0%	**Em Andamento**		
1.2	Atualização dos representantes das instituições envolvidas no GT- Planejamento Energético	Maria Helena; Manoel; Isis	04/05/2015	15/07/2015		04/05/2015	15/07/2015		100,0%	**Concluído**		
1.3	Identificação de instituições e participantes do Fórum de Energia	Maria Helena; Manoel; Isis	01/06/2015	30/07/2015		01/06/2015	30/07/2015		100,0%	**Concluído**		
1.4	Leitura de documentos, estudos e referencial teórico	Maria Helena; Manoel; Isis	04/05/2015	30/06/2015		04/05/2015	30/06/2015		100,0%	**Concluído**		
2	**REALIZAÇÃO DO FÓRUM (Peso 80%)**		**01/07/2015**	**30/09/2015**		**01/07/2015**			**22,4%**	**Em Andamento**		
2.1	Elaboração de material em articulação com a ASCOM (folder, banner, cartaz, bloco, crachá...)	Maria Helena; Manoel; Isis; ASCOM	01/07/2015	18/09/2015		01/07/2015			80,0%	**Em Andamento**	Já existe material de fóruns anteriores que será reutilizado.	
2.2	Planejamento de logísitica e infraestrutura	Maria Helena; Manoel; Isis; ASCOM	01/07/2015	18/09/2015		01/07/2015			60,0%	**Em Andamento**		
2.3	Divulgação do Fórum e convite de autoridades e palestrantes	Maria Helena; Almiro; Diretor; Superintendente	14/09/2015	23/09/2015					0,0%	**A Iniciar**		
2.4	Realização do Fórum	CGDS	29/09/2015	29/09/2015					0,0%	**A Iniciar**		
2.5	Elaboração de documento final e	Maria Helena; Manoel	29/09/2015	30/09/2015					0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	41%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Repactuadas as atividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.,3.1, 3.2
3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 20**
Objetivo estrátegico:	**1.5. Fortalecer as administrações públicas**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação do PPA:	**Ação interna**	**Objetivo estrátegico (MI):**	Promover valorização e qualificação permanente dos servidores
Finalidade da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável- CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade da melhoria na gestão de projetos dos municipais da área de atuação de Bom Conselho-PE, em virtude de investimentos privados na região.		
Projeto:	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional		
Objetivo do projeto:	Qualificar os servidores públicos (gestores e técnicos) municipais da área de atuação de Bom Conselho quanto aos aspectos gerenciais de projetos de desenvolvimento local		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	25/09/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Macira Régia Sotero; Givanildo Ramos de Souza; Manoel de Sá Jardim Neto; Renato Arruda Vaz de Oliveira;

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Visita técnica aos municípios	Macira	02/03/2015	06/03/2015	-	02/03/2015	05/03/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2	Apropriação do Diagnóstico Situacional	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	09/03/2015	20/03/2015	-	06/03/2015	21/03/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3	Leitura de documentos, estudos e referencial teórico	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	02/03/2015	10/04/2015	-	02/03/2015	01/04/2015	-	100,0%	**Concluído**		
	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS (Peso 60%)								**55,6%**	**Atrasado**		
2	**Levantamento de Demandas e as situação da Gestão de Projetos**	**Macira; Givanildo; Renato; Manoel;**	**02/03/2015**	**31/07/2015**	-	**02/03/2015**		-	**91,4%**	**Atrasado**	Dois integrantes do grupo foram deslocados para a força-tarefa do programa Água para Todos, de tal forma que houve prejuízo ao andamento das etapas do projeto, o que justifica o atraso nas etapas visto que o cronograma previsto foi elaborado contando com a participação dos 5 integrantes.	Redistribuir as atividades entre os três integrantes restantes e prolongar o prazo de entrega para o dia 25 de Setembro.
2.1	Elaboração do Questionário e Ofício	Givanildo; Macira	02/03/2015	19/06/2015	-	02/03/2015	08/06/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2.2	Levantamento dos contatos municipais	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	05/06/2015	10/06/2015	-	03/06/2015	09/06/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2.3	Envio dos Questionários e Ofício aos municipios	CGDS	03/06/2015	16/06/2015	-	12/06/2015	12/06/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2.4	Definição dos participantes municipais	Manoel; Givanildo; Macira	18/03/2015	31/03/2015	-	19/03/2015	26/03/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2.5	Recebimento dos Questionários preenchidos	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	20/06/2015	30/06/2015	-	20/06/2015	10/08/2015	-	100,0%	**Concluído**	Houve atraso no recebimento dos questionários respondidos pelos municípios	
2.6	Análise dos dados coletados	Macira; Givanildo; Renato; Manoel	01/07/2015	15/07/2015	-	09/07/2015		-	90,0%	**Atrasado**	*vide observação do item 2*	
2.7	Resultados da Análise	Renato; Macira	16/07/2015	31/07/2015	-	01/09/2015		-	50,0%	**Atrasado**	*vide observação do item 2*	
3	**Estratégias de Capacitação**	**Macira; Givanildo; Renato; Manoel**	**27/05/2015**	**28/08/2015**	-	**29/05/2015**		-	**94,0%**	**Atrasado**	*vide observação do item 2*	
3.1	Melhores Práticas	Givanildo	28/05/2015	29/06/2015	-	29/05/2015	29/06/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3.2	Perfil da Instituição Capacitadoras	Renato	27/05/2015	27/06/2015	-	29/05/2015	20/07/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3.3	Modelo de Estruturas de Execução	Manoel	28/05/2015	15/07/2015	-	29/05/2015	20/07/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3.4	Modelo de Projeto de Capacitação	Macira	29/05/2015	17/07/2015	-	29/05/2015	17/07/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3.5	Consolidação e Digitação das Informações	Macira; Givanildo; Renato; Manoel;	03/08/2015	28/08/2015	-	10/08/2015		-	70,0%	**Atrasado**	*vide observação do item 2*	
	DIVULGAÇÃO DO PLANO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
4	Impressão	CGDS	31/08/2015	05/09/2015	-			-	0,0%	**A Iniciar**	*vide observação do item 2*	
5	Apresentação à CGDS	Macira	11/09/2015	15/09/2015	-			-	0,0%	**A Iniciar**		
6	Distribuição aos Municípios	CGDS	06/09/2015	12/09/2015	-			-	0,0%	**A Iniciar**		

7	Publicização	CGDS	06/09/2015	15/09/2015	-			-	0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	**76%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

(1) Houve Reunião com o CONDEPE/FIDEM no dia 12/02/2015 para tratar de ações referentes ao Plano

(2) Houve Reunião com a SEPLAG/CONDEPE/FIDEM no dia 15/05/2015 para tratar de ações referentes ao Plano

(3) São realizadas reuniões internas da equipe todas as quintas às 14:30h

3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO 21**
Objetivo estrátegico:	**2.3. Promover a sustentabilidade ambiental**	**Ano:**	**2015**

Programa:	Não se aplica	**Eixo temático (MI):**	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva.
Ação:	Não se aplica	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão.
Finalidade da ação:	Não se aplica		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Falta de conhecimento da atuação entre os parceiros com atuação na área ambiental na área de atuação da SUDENE; Necessidade do recorte/ abordagem regional Nordeste para a discussão de questões ambientais para a região nordeste., para melhor identificação, compreensão dos processos associados, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019		
Objetivo do projeto:	Articular parceiros da área de atuação da SUDENE, com atuação no seguimento ambiental, para discussão, identificação, compreensão dos processos associados, para contribuir com o aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental, necessário à definição, priorização e implementação de políticas públicas ambientais, bem como, articulação com políticas setoriais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	--	--	--	0,00	0,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
--	0,00	0,00	0,00
--	0,00	0,00	0,00
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2015
Data Atualização:	18/09/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria Helena Lima, Victor Uchôa Silva, Isis Moreira, Renato Oliveira e Caio de Assis.

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto Início	Previsto Fim	Previsto Valor	Realizado Início	Realizado Fim	Realizado Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1	Levantamento de instituições/ órgãos envolvidos com a temática na área de atuação da Sudene	CGDS/DPLAN/SUDENE	27/01/2015	06/02/2015	--	--	--	--	100,0%	**Concluído**		
2	Realizar contato prévio com órgãos ministeriais e conselhos de meio ambiente	CGDS/DPLAN/SUDENE	03/02/2015	06/03/2015	--	03/02/2015	06/03/2015	--	**100,0%**	**Concluído**		
2.1	Reunião com o MMA	CGDS/DPLAN/SUDENE	03/02/2015	03/02/2015	--	03/02/2015	03/02/2015	--	100,0%	**Concluído**		
2.2	Reunião com a Abema (Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente)	CGDS/DPLAN/SUDENE	06/03/2015	06/03/2015	--	06/03/2015	06/03/2015	--	100,0%	**Concluído**		
3	Construção da programação do evento (metodologia, temática)	CGDS/DPLAN/SUDENE	01/06/2015	17/07/2015	--	17/08/2015	26/08/2015	--	100,0%	**Concluído**		
4	Elaboração de material em articulação com a ASCOM (folder, banner, cartaz, bloco, crachá...)	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	24/07/2015	--	17/08/2015	11/09/2015	--	100,0%	**Concluído**		
5	Planejamento de logísitica e infraestrutura	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	24/07/2015	--	17/08/2015	26/08/2015	--	100,0%	**Concluído**		
6	Divulgação do Fórum e convite de autoridades e palestrantes	CGDS/DPLAN/SUDENE	21/07/2015	04/08/2015	--	27/08/2015	17/09/2015	--	100,0%	**Concluído**		
7	Realização do Fórum	CGDS/DPLAN/SUDENE	18/09/2015	18/09/2015	--	18/09/2015	18/09/2015	--	100,0%	**Concluído**		
8	Elaboração de documento final e encaminhamentos do evento	CGDS/DPLAN/SUDENE	18/09/2015	30/09/2015	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
9	Divulgação do documento final e encaminhamentos.	CGDS/DPLAN/SUDENE e ASCOM/SUDENE	18/09/2015	30/09/2015	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ 0,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	78%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Secretarias e Órgãos Estaduais, da área de influência da SUDENE, com atuação da área de meio ambiente, bem como, as Secretarias que integram o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Observações:

A Oficina e o Fórum serão realizados na sede da SUDENE, em Recife/PE.

3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 22**
Objetivo estrátegico:	**1.5. Fortalecer as administrações públicas**	**Ano:**	**2015**

Programa:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar a participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Finalidade da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Ausência de articulação entre o poder público e as organizações da sociedade civil no município de Goiana-PE e entorno, em vista da implantação de grandes empreendimentos na região.		
Projeto:	1ª Oficina de Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento		
Objetivo do projeto:	Articulação de parceiros do desenvolvimento local com atuação, na região de Goiana e entorno, com vistas ao diagnostico e identificação de demandas de fortalecimento institucional		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
				0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	16/09/2015
Data Atualização:	28/08/2015

ADL14-15

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Teresa Oliveira, Caio Dias, Socorro Vilar, Vera Assunção e Victor Silva

	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO (Peso 20 %)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Reunião com o Condepe/Fidem para sondagem de área prioritária para realizar a oficina	Vera, Teresa, Socorro e Henrique	12/02/2015	12/02/2015	-	12/02/2015	12/02/2015	-	100,0%	**Concluído**		
2	Discussão sobre a redefinição da área de prioritária para realização da oficina	Vera, Teresa, Socorro, Caio e Victor	08/06/2015	08/06/2015	-	08/06/2015	08/06/2015	-	100,0%	**Concluído**		
3	Identificação/levantamento preliminar de parceiros do desenvolvimento local	Vera, Teresa, Socorro, Caio e Victor	09/06/2015	09/06/2015		09/06/2015	09/06/2015		100,0%	**Concluído**		
4	Levantamento de publicações (vídeo). Diagnóstico preliminar com foco no desenvolvimento /fortalecimento	Vera, Socorro, Caio , Victor e Teresa	09/06/2015	09/07/2013		09/06/2015	09/07/2015		100,0%	**Concluído**		
5	Reunião com o Condepe/Fidem para validar a redefinição de área prioritária para a realização da oficina	Vera, Teresa, Socorro e Victor	17/06/2015	17/06/2015		17/06/2015	17/06/2015		100,0%	**Concluído**		
6	Reunião com o Condepe/Fidem para discutir a programação, data e público-alvo da oficina e possibilidade de apoio da agência	Socorro, Victor e Caio	08/07/2015	08/07/2014	-	08/07/2015	08/07/2015	-	100,0%	**Concluído**		
7	Nota Técnica com justificativa, data, local, atores envolvidos e desdobramentos	Teresa, Socorro, Vera, Caio, Victor	17/07/2015	18/07/2015		17/07/2015	18/07/2015	-	100,0%	**Concluído**		
	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA OFICINA (Peso 80 %)								**80,0%**	**Concluído**		
8	Elaboração de Minuta de Convite e envio para os convidados.	Vera, Socorro, Teresa e Caio	12/08/2015	12/08/2015	-	12/08/2015	12/08/2015	-	**100,0%**	**Concluído**		
9	Elaboração de caracterização do território	Isis, Caio, Teresa e Vera	17/08/2015	11/09/2015	-	17/08/2015	11/09/2015	-	100,0%	**Concluído**	A caracterização do território serviu de base para nortear as questões discutidas na oficina.	
10	Elaboração da versão final da Programação	Vera, Isis, Socorro, Caio e Teresa	24/08/2015	02/09/2015	-	24/08/2015	02/09/2015	-	100,0%	**Concluído**		
11	Concepção e elaboração de roteiro para orientar as discussões na Oficna	Vera, Renato, Teresa, Caio e Isis	02/09/2015	14/09/2015	-	02/09/2015	14/09/2015	-	100,0%	**Concluído**		
12	Reuniões preparatórias com a ASCOM	Vera, Teresa, Isis e Caio	03/09/2015	15/09/2015	-	03/09/2015	15/09/2015	-	100,0%	**Concluído**		
13	Mobilização telefônica e por e-mail	Vera, Isis, Socorro, Caio e Teresa	08/09/2015	15/09/2015	-	08/09/2015	15/09/2015	-	100,0%	**Concluído**		
14	Elaboração de apresentações	Isis, Teresa, Caio e Vera	14/09/2015	15/09/2015	-	14/09/2015	15/09/2015		100,0%	**Concluído**		
15	Realização da Oficina	CGDS	16/09/2015	16/09/2015	-	16/09/2015	16/09/2015	-	100,0%	**Concluído**		
			Valor Previsto:			**Valor realizado:**			**100,0%**	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

(1) Houve Reunião com o CONDEPE/FIDEM no dia 12/02/2015 para tratar de ações referentes ao Plano
(2) Houve Reunião com a SEPLAG/CONDEPE/FIDEM no dia 15/05/2015 para tratar de ações referentes ao Plano
(3) São realizadas reuniões internas da equipe todas as quintas às 14:30h
3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 23**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Promover valorização e qualificação permanente dos servidores
Finalidade da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Necessidade de identificação e priorização de APLs na área de atuação da SUDENE		
Projeto:	Programa "Rotas da Integração Nacional" – Oficina Macrorregional Nordeste		
Objetivo do projeto:	Discutir as estratégias de desenvolvimento regional/local pelos estados que compõem a macrorregião Nordeste, além de políticas de inclusão sócio produtivas, compreendidas a partir da metodologia de arranjos produtivos locais (APLs)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Maria do Socorro Vilar, Teresa Oliveira, Caio Dias, Marcelo Saiki

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Organização da Oficina (Peso 15%) Proposta CGGI**								**15,0%**			
1.1	Reunião com Professora Lúcia Moutinho da UFRPE especialista em APL	Renato, Marcelo, Socorro, Teresa, Isis e Maria Helena	05/02/2015	05/02/2015	-	05/02/2015	05/02/2015		100,0%	**Concluído**	Articulação Institucional para apoio na organização do Seminário/Oficina	
1.2	Levantamento de instituições com atuação em APL no NE (versão parcial)	Marcelo Viana, Renato, Socorro, Teresa e Saiki	05/02/2015	05/02/2015	-	05/02/2015	05/02/2015	-	100,0%	**Concluído**	Levantar os atores envolvidos para participarem do Seminário/Oficina.	
1.3	Construção da programação do Seminário /Oficina (versão parcial)	Marcelo, Socorro e Teresa	23/02/2015	26/02/2015		23/02/2015	26/02/2015		100,0%	**Concluído**	Montar a estrutura (metodologia) da oficina a ser realizada.	
1.4	Reunião com a professora Lúcia Moutinho da UFRPE para discussão sobre a organização e programação do Seminário/Oficina APL e convite para estabelecer e discutir Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho.	Vera, Maria Helena, Marcelo Saiki, Isis, Teresa e Socorro	27/02/2015	27/02/2015		27/02/2015	27/02/2015		100,0%	**Concluído**	Discutir Acordo de Cooperação e organização conjunta do Seminário/Oficina (construção de sua programação, definição da metodologia, atores a serem convidados e produtos a serem gerados).	
1.5	Reunião da equipe de organização/SUDENE para elaborar estratégia de construção dos projetos para a Oficina e para a estratégia de articulação com os atores que serão convidados.	Marcelo Viana, Renato, Socorro, Teresa, Socorro e Saiki	03/03/2015	03/03/2015		03/03/2015	03/03/2015		100,0%	**Concluído**	Elaboração de Projeto para o Seminário e para as Oficinas e convite para reunião com a professora Lúcia para realizar convites dos atores.	
1.6	Reunião entre SUDENE e UFRPE sobre programação do evento e sobre acordo de cooperação.	Almiro, Vera, Marcelo, Socorro e Teresa	12/03/2015	12/03/2015		12/03/2015	12/03/2015		100,0%	**Concluído**	Realizar discussão sobre Programação da Oficina e Termo de Cooperação.	
1.7	Reunião entre SUDENE e UFRPE sobre programação do evento e articulação de convidados.	Teresa, Socorro, Saiki, Vera e Lúcia Moutinho	15/04/2015	15/04/2015		15/04/2015	15/04/2015		100,0%	**Concluído**	Realizar discussão sobre Programação da Oficina.	
1.8	Elaboração dos Projeto Seminário e Oficina.	Teresa, Socorro, Saiki, Vera e Lúcia Moutinho	04/03/2015	17/03/2015		04/03/2015	17/03/2015		100,0%	**Concluído**	Construção da apresentação, justificativa, organizadores/realizadores, parceiros, objetivo geral e objetivos específicos, público alvo, custos, programação e resultados esperados.	
1.9	Articulação com o Ministério da Integração para realização da Oficina/Seminário.	Almiro, Maria Helena, Vera e Lúcia Moutinho	04/03/2015	26/04/2015		04/03/2015	26/04/2015		100,0%	**Concluído**	Definir programação a partir dos interesses convergentes entre a Sudene e Ministério da Integração.	
1.10	Elaboração da Programção em conjunto com o Ministério da Integração.	Ministério da Integração, Vera, Maria Helena, Lúcia Moutinho, Socorro, Saiki, Teresa	25/03/2015	25/04/2015		25/03/2015	25/04/2015		100,0%	**Concluído**	Elaboração da Proposta de Oficina (convidados e temáticas)	

1.11	Articular com a ASCOM material de divulgação (folderes, baneres etc), lanche e pastas.	Vera, Teresa, Socorro, Caio, Isis, Marcelo, Almiro e ASCOM	15/04/2015	29/04/2015		15/04/2015	29/04/2015		100,0%	**Concluído**	Divulgação interna e externa + Elaboração do material a ser utilizado (folderes, cartazes, banneres etc.)	
1.12	Contatos e convites dos atores (convidados, palestrantes, autoridades).	MI, Vera, Lúcia Moutinho, Teresa, Socorro e Caio	13/04/2015	24/04/2015		13/04/2015	24/04/2015		100,0%	**Concluído**	Formalizar o convite com os atores envolvidos.	
1.13	Convites internos	Maria Helena, Caio e Socorro	17/04/2015	17/04/2015		17/04/2015	17/04/2015		100,0%	**Concluído**	Envio de convite para toda a SUDENE.	
1.14	Logistica e Infraestrutura.	Vera, Maria Helena, Teresa, Saiki, Caio, Socorrinho, ASCOM, Administração e TI	27/04/2015	27/04/2015		27/04/2015	27/04/2015		100,0%	**Concluído**	Definir/Reservar local onde ocorrerá o Evento, Definir Lanche - Passagens, hospedagens e transporte do colaborador eventual.	
2	**Realização da Oficina (Peso 80 %)**								**80,0%**	**Concluído**		
2.1	Realização da Oficina	CGDS	30/04/2015	30/04/2015	-	30/04/2015	30/04/2015	-	100,0%	**Concluído**	a) Articulação e concertação com os parceiros do APL no Nordeste; b) conhecer as metodologias e experiências dos parceiros; c) enxergar demandas e possibilidades de intervenção; d) difundir conhecimentos das possibilidades.	
3	**Atividades Finais (Peso 5%)**								**5,0%**	**Concluído**		
3.1	Elaborar documento com avaliação da atividade	Isis, Caio e Teresa	03/05/2015	05/05/2015	-	05/05/2015	05/05/2015	-	100,0%	**Concluído**	Levantar os pontos positivos da realização da atividade e os pontos que precisam ser melhorados.	
3.2	Realizar envio de material produzido durante a Oficina	Caio, Vera, Socorro e Teresa	20/05/2015	20/05/2015	-	20/05/2015	20/05/2015	-	100,0%	**Concluído**	Produzir a lista de contatos dos presentes na Oficina, Produzir certificados e reunir o meterial apresentado durante a oficina.	
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	**100,0%**	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO 24 (ex PO 19)**
Objetivo estrátegico:	**2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	**Eixo temático (MI):**	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	**Objetivo estrátegico (MI):**	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessaos nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antônio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastes naturais e antrpogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do istema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.		
Objetivo do projeto:	Fortalecimento do sistema Municipal de Defesa Civil da Paraíba, por meio da capacitação dos Coordeandores e Subcoordenadores Municiapis de Defesa Civil nos 223 municípios do Estado, bem como, integrantes do sistema Nacional de Defesa Civil a nível municipal (Corpo de Bombeiros, Políia Militar e técnicos da EMATER).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	228.797,21	254.219,12

Previsão de Conclusão:	31/05/2015	Convênio Nº 770741/2012 (Proposta SICONV Nº 013022)
Data Atualização:	28/08/2015	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/ Juliana Borges e Marcélo de Castro Viana - SIEE/ Antônio Cavalcanti Brito

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)

MÊS	CONCEDENTE	CONVENENTE	TOTAL
dez/12	167.999,61	25.421,91	193.421,52
fev/13	60.797,60	--	60.797,60
-	**228.797,21**	**25.421,91**	**254.219,12**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)

Pago até o ano anterior	R$	167.999,61
A realizar no exercício	R$	60.797,60
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	60.797,60
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	167.999,61

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/12	19/04/12		20/03/12	19/04/12		100,0%	**Concluído**		
2	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	23/04/12	09/05/12		23/04/12	09/05/12		100,0%	**Concluído**		
3	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Não informado	09/05/12		Não informado	09/05/12		100,0%	**Concluído**		
4	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/12	25/06/12		09/05/12	25/06/12		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	25/06/12	20/12/12		25/06/12	20/12/12		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/12	28/12/12		28/12/12	28/12/12		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	04/01/13	04/01/13		Não informado	04/01/13		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								**21,4%**	**Atrasado**	Com a reforma administrativa implantada pelo governo no Estado da Paraíba, as ações de Defesa Civil passaram a ser executadas pela Secretaria de Estado de Governo, em substituição à Secretaria de Infraestrutura, responsável pela execução do Projeto. Desta forma, houve a necessidade da transferência dos recursos financeiros à nova Secretaria, assim como, os projetos em andamento no Estado.	
8	Liberação da 1ª parcela	SUDENE	14/06/13	28/06/13	R$ 167.999,61	14/06/13	28/06/13	R$ 167.999,61	100,0%	**Concluído**		
9	Processo Licitatório	Gov/PB	31/08/13	20/03/14		31/08/13			50,0%	**Atrasado**	Foi encaminhado ofício Nº 186/2015/GAB/SUDENE em 15/05/2015, dando um prazo para que sejam tomadas as providências para o término das licitações.	
10	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	29/01/14	30/01/14		30/01/14	30/01/14		100,0%	**Concluído**		
11	Realizar 16 Cursos de CODC (Curso Operacional de Defesa Civil)	Gov/PB	30/04/13	31/08/14					0,0%	**Atrasado**		
12	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	a definir	a definir					0,0%	**Atrasado**		
13	Liberação da 2ª parcela	SUDENE	01/05/14	31/05/14	R$ 60.797,60				0,0%	**Atrasado**		
14	Aquisição 11 equipamentos de informática e eletroeletrônicos	Gov/PB	15/06/13	31/08/14					0,0%	**Atrasado**		
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
15	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/SUDENE	31/07/15	31/10/15					0,0%	**A Iniciar**	Aguardando a prestação de contas para elaboração do Relatório Final (Laudo Técnico).	
			Valor Previsto:		R$ 228.797,21	**Valor realizado:**		R$ 167.999,61	**41,4%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Secretaria de Estado de Infraestrutura da Paraíba/Gerência Executiva de Defesa Civil
Observações:
Obs.: De acordo com o técnico Marcelo Viana, o projeto será cancelado por dificuldades de execução
3º ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO 25 (ex PO 20)**
Objetivo estrátegico:	**2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	**Eixo temático (MI):**	Assegurar proteção civil
Ação:	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	**Objetivo estrátegico (MI):**	Ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres
Finalidade da ação:	Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessaos nas atividades de defesa civil.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimaraes	**Gestor da subunidade:**	Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa):	Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastes naturais e antrpogênicos, causando danos e prejuízos às populações.		
Projeto:	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará		
Objetivo do projeto:	Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250/280	GND 3 e 4	30	350.978,27	370.465,27

Previsão de Conclusão:	28/12/2014	Convênio Nº 7703355/2012 (Proposta SICONV Nº 015048/2012)
Data Atualização:	28/08/2015	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE/Macira Régia Sotero e Marcélo de Castro Viana - CBMCE/ Aluízio Souza Freitas

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/12	186.696,80	19.487,00	206.183,80
fev/13	164.281,47	--	164.281,47
TOTAL	**350.978,27**	**19.487,00**	**370.465,27**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	350.978,27
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	350.978,27

N.E.	Meta/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
	INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	**Concluído**		
2	Análise da Proposta	CGDS/SUDENE	23/04/2012	09/05/2012		23/04/2012	09/05/2012		100,0%	**Concluído**		
3	Resultado do Chamamento Público	CGDS/SUDENE	09/05/2012	09/05/2012		09/05/2012	09/05/2012		100,0%	**Concluído**		
4	Ajustes do Projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	09/05/2012	14/06/2012		09/05/2012	14/06/2012		100,0%	**Concluído**		
5	Etapas de formalização do convênio	CGC/SUDENE	15/06/2012	20/12/2012		15/06/2012	20/12/2012		100,0%	**Concluído**		
6	Assinatura do Convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	**Concluído**		
7	Publicação do Convênio	CGC/SUDENE	04/01/2013	04/01/2013		04/01/2013	04/01/2013		100,0%	**Concluído**		
	EXECUÇÃO (Peso 60%)								60,0%	**Concluído**		
8	**Liberação da 1ª parcela**	SUDENE/CGDS	01/12/2012	30/12/2012	R$ 186.696,80	29/11/2013	29/11/2013	R$ 186.696,80	100,0%	**Concluído**		
9	**Processo Licitatório**	GOV/CE	28/12/2012	30/12/2013		25/07/14	19.08.2014		100,0%	**Concluído**	Processo concluido.	
10	**Meta 1**: Aquisição 13 notebooks	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013			-	**Cancelado**	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2014 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros deverão ser devolvidos na prestação de contas.	
11	**Meta 2**: Aquisição 08 projetores multimídia	GOV/CE	14/12/2012	13/12/2013		09/08/2013	13/12/2013		100,0%	**Concluído**		
12	**Meta 3**: Aquisição 14 câmeras fotográficas integradas com GPS	GOV/CE	28/12/2012	13/12/2013		25/07/2014			-	**Cancelado**	Licitação concluída. Todavia como a empresa não pode entregar o equipamento até final de dezembro e o convênio se encerrou em 28/12/2014 a meta não pode ser realizada. Valores orçamentários e financeiros a devolvidos na prestação de contas.	
13	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	28/12/2012	13/12/2013		20/10/2014	22/10/2014		100,0%	**Concluído**		
14	**Liberação da 2ª parcela**	SUDENE	28/12/2012	27/09/2014	R$ 164.281,47	Não informado	28/11/2014	R$ 164.281,47	100,0%	**Concluído**		
15	**Meta 4**: Realização 14 cursos de capacitação de	GOV/CE	25.08.2014	05/12/2014		25.08.2014	05/12/2014		100,0%	**Concluído**		
16	**Meta 5**: Realização um Fórum Internacional Sobre	GOV/CE	19/11/2014	22/11/2014		10/12/2014	13/12/2014		100,0%	**Concluído**		
17	Visita técnica para emissão de laudo/parecer final	CGDS/DPLAN/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015		25/02/2015	26/02/2015		100,0%	**Concluído**	Realizado de 25 a 26/02/2015.	
	ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
18	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGC/DAD/SUDENE	29/12/2014	29/03/2015		06/07/2015	06/07/2015		100,0%	**Concluído**	Parecer técnico com laudo final foi realizado e inserido no Siconv. Aprovado sob o ponto de vista técnico e enviado à Coord. de Gestão de Convênios para análise financeira.	
					Valor Previsto:	R$ 350.978,27		**Valor realizado:**	R$ 350.978,27	**100,0%**	**Concluído**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Observações:
A prestação de contas de acordo com a Portaria 507/2011 seria até 28/02/2015 e a análise técnica e financeira até 28/05/2015, por isso ainda consta a situação 'em andamento'.
3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 26 (ex PO 21)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de confecções.		
Projeto:	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e estudar protótipo de sistemas locais e regionais de inovação e projetos de incorporação e de difusão de inovação.para replicagem em outros estados do Nordeste.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	4.4.30.00	Descentralização	857.015,99	965.632,35

Crono Desembolso			
CONCEDENTE	CONVENENTE	Liberação	TOTAL
274.405,33	108.616,36	Maio/2013	383.021,69
582.610,66	0,00	Dez/2014	582.610,66
857.015,99	**108.616,36**	**-**	**965.632,35**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	857.015,99
A realizar no exercício (RAP 2012)	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP 2012)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	857.015,99

Previsão de Conclusão:	29/02/2016
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Convenente	Jussara Santanna Alves

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Celebração do Convênio	SUDENE E Gov Sergipe	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100%	Concluído		
2	Publicação no DOU	CGC/SUDENE (Zizete Falcão)	11/01/2013	11/01/2013		11/01/2013	11/01/2013		100%	Concluído		
3	Visita técnica	DPLAN (Vernon Walsmsley)	06/03/2013	08/03/2013		06/03/2013	08/03/2013		100%	Concluído	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	Providenciado
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de mobiliários, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de segurança e gases e aparelhos de áudio, videoconferência (e sua instalação) e aparelhos de telecomunicações.	DPLAN (Vernon Walsmsley e Ruvem Monteiro) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	01/05/2013	30/05/2013	274.405,33	17/06/2013	17/06/2013	274.405,33	100%	Concluído		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Vernon Walsmsley e Rubem Monteiro)	26/03/2014	29/03/2014		26/03/2014	29/03/2014		100%	Concluído	Aguardando conclusão de licitação pelo proponente para conclusão da meta 1 e posterior fiscalização visando a autorização da liberação da 2ª parcela.	Licitações realizadas (90%)
6	Vistoria de campo	DPLAN (Marcus Paz e Robson Brandão)	01/12/2014	03/12/2014		04/12/2014	05/12/2014		100%	Concluído	Vistoria realizada	
7	Liberação da 2ª parcela para aquisição de máquinas, equipamentos, produtos de informática, licenças de software, materiais de consumo e aviamentos, aparelhos de áudio e material bibliográfico (livros, vídeos e assinaturas de revistas).	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	03/12/2014	10/12/2014	582.610,66	06/12/2014	16/12/2014	582.610,66	100%	Concluído	Segunda Parcela liberada	Liberado em 16/12/2014
8	Assinatura do Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/12/2014	31/12/2014		01/12/2014	29/12/2014		100%	Concluído	Minuta de Termo Aditivo assinada	Prorrogado para 31/07/2015

9	Realização de visita técnica para acompanhamento	DPLAN (Robson e Marcus)	23/04/2015	24/04/2014					**0%**	**Cancelado**	A visita técnica programada não era obrigatória, segundo o cronograma de trabalho, mas tinha como objetivo garantir o bom andamento do convênio, considerando os atrasos ocorridos anteriormente. Tendo em vista que o acompanhamento pelo SICONV, e-mails e contatos telefônicos se mostrou suficiente para atestar o andamento do convênio em pauta, a referida viagem foi suspensa	SEDETEC/SE irá enviar o Relatório atualizado até 29/05/2015, será avaliada a necessidade de se fazer uma visita anterior a prestação de contas, mas de acordo com informações colhidas no SICONV, o convênio está em conformidade.
10	Assinatura do 2o Termo Aditivo	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	27/07/2015	27/07/2015		27/07/2015	27/07/2015		**100%**	**Concluído**	Convênio prorrogado para 31/10/2015 - SEDETEC/SE solicitou prorrogação do convênio para viabilizar a utilização do saldo das aplicações finnaceiras	
11	Apresentação da prestação de contas	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe (Jussara Santanna Alves) - SEDETEC	01/11/2015	31/01/2016					**0%**	**A Iniciar**	Prestação de contas adiada devido ao 2o termo aditivo	
12	Realização de visita técnica para parecer, se houve incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/02/2016	29/02/2016					**0%**	**A Iniciar**		
13	Emissão de Laudo Técnico	DPLAN (Albertina Pereira, Robson Brandão)	01/02/2016	29/02/2016					**0%**	**A Iniciar**		
14	Encerramento do Convênio	DPLAN (Albertina Pereira)	01/02/2016	29/02/2016					**0%**	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		857.015,99	**Valor realizado:**		857.015,99	69%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 27 (Ex PO 23)**
Objetivo estrátegico:	**1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido.**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de Menor Dinamismo Econômico e Social
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Inexistência de Diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais conforme estabelece o inciso II, art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014.		
Projeto:	Diretrizes Regionalizadas Para a Política Industrial do Governo Federal		
Objetivo do projeto:	Promover a Diferenciação Regional da Política Industrial		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor Total do Projeto**
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Produto 1 - Análise das Últimas Três Políticas Industriais**	**Miguel Vieira**	**09/03/2015**	**09/04/2015**		**09/03/2015**	**09/04/2015**		**100%**	**Concluído**		
1.1	Análise da PITCE	José Luis	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	25/03/2015		100%	**Concluído**		
1.2	Análise da PDP	Marcus Vinícius	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	09/04/2015		100%	**Concluído**		
1.3	Análise do PBM	Miguel Vieira	09/03/2015	27/03/2015		09/03/2015	02/04/2015		100%	**Concluído**		
1.4	Relatório Produto 1	**Miguel Vieira**, com o apoio de José Luis e Marcus Vinícius	30/03/2015	09/04/2015		06/04/2015	09/04/2015		100%	**Concluído**		
2	**Produto 2 - Análise de Indicadores Industriais**	**José Luis**	**10/04/2015**	**01/06/2015**		**10/04/2015**	**16/06/2015**		**100%**	**Concluído**		
2.1	Obtenção dos Dados	José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira	10/04/2015	19/05/2015		10/04/2015	12/05/2015		100%	**Concluído**		
2.2	Relatório Produto 2	**José Luis**, com o apoio de Marcus Vinícius e Miguel Vieira	20/05/2015	01/06/2015		13/05/2015	16/06/2015		100%	**Concluído**		
3	**Produto 3 - Gargalos e Potencialidades do Nordeste por Estado**	**Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano**	**02/06/2015**	**16/09/2015**		**10/04/2015**			**43%**	**Em Andamento**		
3.1	Levantamento das Potencialidades por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		10/04/2015	**27/08/2015**		100%	**Concluído**	Atividade antecipada oportunizada em razão de articulação com os governos da Bahia e Pernambuco.	
3.2	Relatórios parciais, por Estado	Marcus Vinícius, Miguel Vieira, Tássia Germano	02/06/2015	21/07/2015		05/05/2015			64%	**Atrasado**	O planejamento inicial previa visita aos estados para execução desta etapa. Devido ao corte de diárias e passagens, esta etapa precisou ser replanejada e, consequentemente, as posteriores	
3.3	Matrizes estaduais e síntese	Marcus Vinícius	09/07/2015	11/09/2015		09/07/2015			9%	**Em Andamento**		
3.4	Matriz regional e síntese	Marcus Vinícius	14/09/2015	16/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4	**Produto 4 - Relatório Base para Elaboração de Diretrizes para Regionalização da Política Industrial**	**Marcus Vinícius, Marina Barbosa, Miguel Vieira e Tássia Germano**	**31/08/2015**	**23/09/2015**		**31/08/2015**			**0,1%**	**Em Andamento**		

4.1	Introdução	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	17/09/2015	18/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4.2	Capítulo 1 - Síntese das três últimas políticas industriais	Marina Barbosa	31/08/2015	04/09/2015		31/08/2015			1%	**Em Andamento**		
4.3	Capítulo 2 - Síntese dos indicadores da indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	08/09/2015	11/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4.4	Capítulo 3A - Apreciação geral sobre as potencialidades e gargalos nos estados	Marina Barbosa	14/09/2015	18/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4.5	Capítulo 3B - Gargalos e Potencialidas à indústria na área de atuação da SUDENE	Marina Barbosa	21/09/2015	23/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4.6	Conclusão	Marcus Vinícius e Miguel Vieira	24/09/2015	25/09/2015					0%	**A Iniciar**		
4.7	Revisão e entrega final	Albertina Pereira e Lautemyr Canel	28/09/2015	30/09/2015					0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	61%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Responsável Produto 1 - Miguel Vieira; Responsável Produto 2 - José Luis; Responsável Produto 3 - Marcus Vinícus; Responsáveis Produto 4 - José Luis, Marcus Vinícius e Miguel Vieira.

Inclusão de uma atividade do produto 3 em função de maior compreensão do produto via desmembramento de atividade

2º ciclo 2015

Observação para o 3º ciclo: dada a restrição de diárias e passagens, houve a necessidade de readequar o planejamento e execução deste PO

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 28 (ex PO 24)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	**Eixo temático (MI):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Promover a difusão de inovação nos processos produtivos da cadeia produtiva regional, gerando renda, emprego e propiciando agregação de valor.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Fragilidades no aproveitamento das potencialidades locais para desenvolvimento e inovação no ramo de fitoterápicos.		
Projeto:	Desenvolvimento da Cadeia Biossustentável de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE		
Objetivo do projeto:	Estabelecer padrão de qualidade químico-biológico às Plantas Medicinais e Fitoterápicos produzidos em Pernambuco, em poio aos arranjos produtivos locais e regionais de inovação, bem como projetos de incorporação e de difusão de tecnologias.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100 e 286	Custeio (3) e Capital (4)	Descentralização	2.000.000,00	2.000.000,00

Crono Desembolso			
ÓRGÃO REPASSADOR	ÓRGÃO RECEBEDOR	Liberação	TOTAL
1.277.000,00	**0,00**	Novembro/2014	1.277.000,00
723.000,00	**0,00**	Março/2015	723.000,00
2.000.000,00	**0,00**	**-**	**2.000.000,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	1.277.000,00
A realizar no exercício	R$	723.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	723.000,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	2.000.000,00

Previsão de Conclusão:	17/12/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Albertina de Souza Leão Pereira
	Convenente	Cláudia Sampaio de Andrade Lima

	Metas/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Visita técnica	DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/08/2014	13/08/2014		13/08/2014	13/08/2014		**100%**	**Concluído**	Necessidade de acerto dos procedimentos burocráticos para prosseguimento do projeto.	
2	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE E UFPE	12/11/2014	12/11/2014		12/11/2014	12/11/2014		**100%**	**Concluído**		
3	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	17/11/2014	17/11/2014		17/11/2014	17/11/2014		**100%**	**Concluído**		
4	Liberação da 1ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo, além da contratação de bolsistas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	27/11/2014	27/11/2014	1.277.000,00	**100%**	**Concluído**		
5	Vistoria de campo	DPLAN (Jéssica Rivas, Miguel Vieira e Robson Brandão)	27/02/2015	27/02/2015		27/02/2015	27/02/2015		**100%**	**Concluído**		
6	Liberação da 2ª parcela para aquisição de equipamentos e material de consumo.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas) e CGAF/COCF (Brivaldo V. Soares)	24/03/2015	31/03/2015	723.000,00	10/03/2015	23/03/2015	723.000,00	100%	**Concluído**	Relatório da vistoria de campo recomendou liberação da 2a parcela. Liberação autorizada em 23/03/2015, mas aguardando limite financeiro. (Foi liberado com atraso)	
7	Solicitação de Termo aditivo financeiro	UFPE (Cláudia Sampaio)	27/05/2015	27/05/2015					0%	**Cancelado**	Foi solicitado um aditivo no valor de R$252.045,00, mas a executora decidiu não pedir mais o termo aditivo financeiro, uma vez que conseguiu adequar o andamento do plano de trabalho ao valor inicial.	
8	Paracer técnico referente ao termo aditivo financeiro	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	27/05/2015	29/05/2015					0%	**Cancelado**		
9	Trâmites burocráticos	Convênios e Procuradoria	01/06/2015	30/06/2015					0%	**Cancelado**		
10	Apresentação de relatório final	UFPE (Cláudia Sampaio)	25/11/2015	25/11/2015					0%	**A Iniciar**		
11	Realização de visita técnica para emissão de laudo/parecer final.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	03/12/2015	03/12/2015					0%	**A Iniciar**		
12	Apresentação da prestação de contas	UFPE (Cláudia Sampaio)	10/12/2015	10/12/2015					0%	**A Iniciar**		
13	Realização de visita técnica para parecer, se houver incoformidade na prestação de contas.	DPLAN (Albertina Pereira, Jéssica Rivas)	17/12/2015	17/12/2015					0%	**A Iniciar**		

	Valor Previsto:	2.000.000,00	**Valor realizado:**	2.000.000,00	60%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 29 (ex PO 26)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Superar Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer Cadeias e Arranjos Produtivos Locais, Articulando-os a Investimentos Estruturadores, nas Regiões de
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Desatualização dos critérios e das prioridades adotadas na aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em P&D e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5%, calculados sobre o produto do retorno das operações financeiras concedidos pelo FDNE conforme estabelecido pela alínea "d", inciso XIII, art. 4º do Decreto nº 8276/14.		
Projeto:	Critérios e Prioridades para aplicação dos Recursos oriundos do 1,5% do retorno das operações do FDNE.		
Objetivo do projeto:	Melhorar seletividade no custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e inovação com base em critérios objetivos para aplicação de 1,5% oriundo do retorno das operações de financiamento concedido pelo FDNE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	22/12/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Albertina Pereira

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Produto 1 - Estudos dos critérios anteriormente definidos**	**Albertina**	**01/10/2015**	**08/10/2015**	**-**			**-**	**0%**	**A Iniciar**		
1.1	Leitura do relatório resultante do Estudo VIII da Coordenação de Estudos e Pesquisas	Albertina	01/10/2015	06/10/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
1.2	Identificação dos projetos que utilizam recursos do 1,5% (usar como apoio Estudo VIII citado acima)	Albertina	07/10/2015	08/10/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
2	**Produto 2 - Levantamento dos critérios utilizados por outras instituições executoras de fundos de C&T**	**Albertina**	**09/10/2015**	**04/11/2015**	-			-	**0%**	**A Iniciar**		
2.1	Identificar instituições que executam fundos de C&T (CNPq, Finep...)	Albertina	09/10/2015	14/10/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
2.2	Contactar tais instituições (Faz-se necessária a coordenação de articulação)	Albertina	15/10/2015	23/10/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
2.3	Contactar o CETENE para alinhar os critérios	Albertina	26/10/2015	04/11/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
3	**Produto 3 - Definição dos critérios de aplicação do 1,5%**	**Albertina**	**05/11/2015**	**18/11/2015**	-			-	**0%**	**A Iniciar**		
3.1	Reunião interna para discussão do que foi levantado e definição dos critérios	Albertina	05/11/2015	11/11/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
3.2	Redigir relatório parcial com os critérios definidos	Albertina	12/11/2015	18/11/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
4	**Produto 4 - Definição das prioridades de aplicação do 1,5%**	**Albertina**	**19/11/2015**	**04/12/2015**	-			-	**0%**	**A Iniciar**		
4.1	Oficina para discussão de prioridades para aplicação dos recursos	Albertina	19/11/2015	27/11/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
4.2	Redigir relatório parcial com as prioridades definidas	Albertina	30/11/2015	04/12/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
5	**Produto 5 - Apresentação Interna**	**Albertina**	**07/12/2015**	**07/12/2015**	-			-	**0%**	**A Iniciar**		
5.1	Reunião para apresentação interna dos critérios e aplicações eleitos pela equipe	Albertina	07/12/2015	07/12/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
6	**Produto 6 - Relatório Final**	**Albertina**	**09/12/2015**	**22/12/2015**	-			-	**0%**	**A Iniciar**		
6.1	Elaboração do relatório final	Albertina	09/12/2015	14/12/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
6.2	Validação do relatório	Albertina	15/12/2015	16/12/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
6.3	Possíveis correções e entrega do relatório final	Albertina	17/12/2015	22/12/2015	-			-	0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:	R$	-	**Valor realizado:**	R$	-	0,0%	**A Iniciar**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
Responsável Produto
3º ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a Execelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 30 (ex PO 27)**
Objetivo estrátegico:	**-**	**Ano:**	**2015**
Sub-objetivo:	**-**	**Medida Institucional Normativa**	

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Finalidade da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Sérgio Antonio Alencar Guimarães	**Gestor da subunidade:**	Frederico Augusto de Araújo Cavalcanti
Problema (causa):	Necessidade de implantação de uma sistemática de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE conforme atribuição estabelecida no Decreto 8276/14		
Projeto:	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE		
Objetivo do projeto:	Avaliar um programa de âmbito nacional, com relação à área de atuação da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2015
Data Atualização:	31/08/2015

ADI 14-15

Após a Entrega da metodologia geral ao TCU, foram feitos ajustes pelo em que se concluiu que o programa ser avaliado seria a Universidade Aberta do Brasil, no âmbito da INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, por questões de foco do governo federal, disponibilidade de dados e suas externalidades.

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Lautemyr Cannel

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Pesquisa e leitura sobre referenciais bibliográficos acerca do Sistema Universidade Aberta do Brasil	Gabriela Lins	02/03/2015	24/04/2015		02/03/2015	24/04/2015		100%	Concluído		
2	Realização da avaliação orçamentária/legal	Gabriela Lins	24/04/2015	06/05/2015		24/04/2015	10/08/2015		100%	Concluído	Aguardando dados orçamentários/financeiros que serão enviados pela Capes. O atraso ocorreu por mudanças de presidência da Capes e também pelos dados não se encontrarem consolidados	Caso não haja recebimento dos dados até o final de junho, serão modificados os indicadores relacionados a este item e utilizadas as informações disponíveis dos Relatórios de Gestão da Capes.
3	Coleta de dados específicos para a avaliação operacional/técnica	Gabriela Lins	07/05/2015	11/05/2015		07/05/2015	11/05/2015		100%	Concluído		
4	Análise dos Dados Específicos, com elaboração de gráficos, mapas e avaliação baseada em indicadores.	Gabriela Lins	12/05/2015	19/06/2015		12/05/2015	10/08/2015		100%	Concluído		
5	Elaboração do Relatório de Avaliação	Gabriela Lins	22/06/2015	03/07/2015		24/04/2015	10/08/2015		100%	Concluído	O relatório começou a ser elaborado antes do previsto, sendo inseridas as informações que estão consolidadas.	
6	Aprovação final da Metodologia pelo gestor	Frederico/Lautemyr	06/07/2015	30/09/2015		10/08/2015			95%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	99,2%	Em Andamento	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

A data acordada com o TCU para entrega do Relatório de Avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE é Dez-2015.

Plano de Trabalho para avaliação de uma ação na área de atuação da SUDENE será incluído como PO de monitoramento em 2015. Equipe constituída para execução do projeto: Emmanuel Albuquerque, Gabriela Lins, Jéssica Rivas, Ludmilla Calado.

Observações: 1 - Dificuldade de obtenção de dados por parte da CAPES.

2 - Como não foi possível finalizar o item 4, o item 5 foi iniciado antes do prazo previsto.

3º Ciclo 2015

Fonte: DPLAN/CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 31 (ex PO 28)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2008**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA		
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R$	811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	124.639.832,64
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	3.065.105.668,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**08/08/08**	**28/11/08**	**0,00**	**08/08/08**	**24/11/08**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	Concluído	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	

11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	**Concluído**	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	**Concluído**	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	**Concluído**	Aditado no valor de R$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	**Concluído**	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	**Atrasado**	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
16	liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	**Atrasado**		
Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)			**12/01/10**	**31/05/15**	**3.876.491.700,00**	**12/01/10**	**-**	**3.065.105.668,00**	**83%**	**Atrasado**		
Competência da SUDENE /Banco									**92%**	**Atrasado**		
17	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	**A Iniciar**		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	**A Iniciar**		
Encerramento (Banco)			**-**	**-**	**0,00**			**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
Resultado Geral do Projeto			**Valor Previsto:**		**3.876.491.700,00**			**3.065.105.668,00**	**77,78%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)./ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteraçao de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do Ministério da Integração Nacional.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 32 (ex PO 29)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2013**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda (antiga TCA Tecnologia em Componentes Automotivos S/A)		
Objetivo do projeto:	Produção de automóveis - 250 mil/ano e motores - 120 mil/ano		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	1.959.000.000,00	10.366.000.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2016
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	1.180.925.388,15
A realizar no exercício	R$	778.074.611,85
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	277.000.000,00
Valor liberado no Exercício (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	501.074.611,85
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	1.457.925.388,15

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta Prévia	Casimiro (SUDENE/DFIN)	18/12/12	17/01/13	-	18/12/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Reapresentação do pleito de financiamento com alterações do Projeto.	
2	Apresentação do Projeto	Empresa/BB	27/12/12	25/02/13	-	18/02/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Análise do Projeto	BB	25/02/13	26/05/13	-	18/02/13	29/04/13	-	100,00%	Concluído		
4	Aprovação pela Diretoria Colegiada	Roberto (SUDENE/DFIN)	29/04/13	29/05/13		29/04/13	22/05/13		100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 155/2013.	
5	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**18/12/12**	**31/05/13**	**0,00**	**18/12/12**	**24/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/13	01/10/13	387.000.000,00	24/10/13	07/11/13	R$ 387.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
7	Liberação 2	SUDENE/BB	01/11/13	01/12/13	505.925.388,15	20/06/14	04/07/14	R$ 505.925.388,15	100,00%	Concluído	Liberado um valor menor do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 3	SUDENE/BB	01/02/14	03/03/14	288.000.000,00	27/11/14	15/12/14	R$ 288.000.000,00	100,00%	Concluído	Embora o valor da parcela tenha sido maior que o previsto inicialmente, em termos cumulativos foi liberado menos que o previsto.	
9	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	132.000.000,00	21/05/15	29/05/15	R$ 132.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
10	Liberação 5	SUDENE/BB	15/06/15	15/07/15	140.000.000,00	12/06/15	29/06/15	R$ 145.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberação concluída.	
11	Liberação 6	SUDENE/BB	15/07/15	14/08/15	110.000.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando pedido de liberação.	
12	Liberação 7	SUDENE/BB	15/09/15	15/10/15	126.942.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 8	SUDENE/BB	15/11/15	15/12/15	269.132.611,85	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**01/09/13**	**15/12/15**	**1.959.000.000,00**	**24/10/13**	**-**	**1.457.925.388,15**	**63%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**81%**	**Em Andamento**		
14	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
15	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$ 1.959.000.000,00**	**Valor realizado:**	**R$ 1.457.925.388,15**	**66,67%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A empresa tem 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto corrigido, sob pena de ter que começar todo o processo novamente, desde a Carta-consulta.
Obs3: Em 11/04/2012 a Empresa protocolou pedido de desistência do processo de financiamento do projeto com recursos do FDNE.
Obs4: Empresa reapresentou o pedido de financiamento com alterações do projeto.
Obs.5: O BB concluiu a análise do projeto, tendo efetuado os ajustes solicitados pela SUDENE no relatório de resultado da análise.
Obs.6 A sudene está aguadando novo conograma de liberação do agente operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 33 (ex PO 30)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2008**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)		
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	61.728.156,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	61.728.156,00

Previsão de Conclusão:	01/03/2010
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**24/07/08**	**31/08/11**	**0,00**	**24/07/08**	**15/08/11**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**21/03/12**	**20/04/12**	**61.728.156,00**	**21/03/12**	**01/06/12**	**61.728.156,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		Não informado	Não informado		-	-		0,0%	**A Iniciar**	No ofício BNB 187000020140614, 17/06/14, informa que o empreendimento está concuído e funcionando. No caso em que a empresa já tenha efetuado o pagamento da 1ª parcela de reembolso, o Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses para emitir o Certificado de Implantação, a contar da data da disponibi-ização da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015, no sítio da Sudene.	
	Encerramento (Banco)		**17/06/14**	**Não informado**	**0,00**	**17/06/14**	**-**	**0,00**	**50%**	**Em Andamento**		
Resultado Geral do Projeto			**Valor Previsto:**		**61.728.156,00**	**Valor realizado:**		**61.728.156,00**	**85,71%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 34 (ex PO 31)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2008**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR		
Objetivo do projeto:	Rede de distribuição de energia elétrica (ampliação e modernização) - MA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	53.376.481,00	89.294.135,70

Previsão de Conclusão:	27/11/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (RAP)	R$	53.376.481,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	53.376.481,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	José Villeneuve (SUDENE/DGFI)	21/01/08	22/02/08	-	21/01/08	22/02/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	29/09/08	28/11/08	-	29/09/08	31/10/08	-	100,00%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias. A postergação dos prazos de pré-análise decorreu da devolução/reapresentação do projeto por 3 vezes.	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENOP/BNB)	31/10/08	28/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,00%	Concluído	Houve atraso na conclusão da análise pelo BNB. Demorou aproximadamente 25 meses nessa fase.	
4	Aprovação do projeto no montante de R$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	06/12/08	05/01/09	-	01/08/11	15/08/11	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada da SUDENE nº 39/2010, de 15/12/10.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**21/01/08**	**05/01/09**	**0,00**	**21/01/08**	**15/08/11**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	01/05/15	31/05/15	53.576.481,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando pedido de liberação.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**01/05/15**	**31/05/15**	**53.576.481,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**Atrasado**		

	Competência da SUDENE /Banco								**50%**	**Em Andamento**		
5	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	**A Iniciar**		
6	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**53.576.481,00**	**Valor realizado:**	**0,00**	**57,14%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O relatório de análise foi apresentado em 13/09/2010, mas houve necessidade de complementação e correções, resultando na conclusão desta fase somente em 30/11/2010, conforme Ofício BNB/ANGPF-2010/575/162, protocolado na SUDENE em 06/12/2010.
Obs3:	A adesão às normas definidas pela MP 564/2012, depende da edição do novo Regulamento do FDNE, em tramitação.
Obs4:	Gestões do MI junto ao MF para a liberação dos recursos na regra anterior à MP 564/2012, convertida na Lei nº 12.712/2012, de 30.08.12.
Obs6:	Empresa formalizou pedido de Adesão às regras no novo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012, posteriormente manifestou a intenção de permanecer com o financiamento nas regras do Decreto nº 6.952/2009.
Obs7:	Está em trâmite a liberação dos recursos na sistemática de emissão de debêntures, conforme contratado e de acordo com o disposto no Decreto nº 6.952/2009. Pendências jurídicas para aprovação da minuta de Escritura de Debêntures.
Obs8:	Alterações no quadro de garantias e especificação do tipo e classe de ação em caso de conversão das debêntures em ações ensejou a emissão de várias Notas Técnicas da SUDENE e do BNB sobre o assunto. As alterações finais foram autorizadas pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 10.09.2013. O BNB e
Obs9:	Aguardando a confirmação de concrusão do Agente Operador.
Obs10:	Recursos bloqueados pela STN. Em andamento tratativas junto ao BNB e Cemar para adesão ao regulamento aprovado pelo decreto 7.838/2012 ou o cancelamento da operação.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 35 (ex PO 32)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

janeiro-00

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	42.723.785,57
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	16.976.214,43
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	59.700.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**24/04/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	Concluído	Liberações concluidas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**31/07/14**	**59.700.000,00**	**22/05/13**	**02/02/15**	**59.700.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	

Encerramento (Banco)	**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**59.700.000,00**	**Valor realizado:**	**59.700.000,00**	**80,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 36 (ex PO 33)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para implantação do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	53.635.943,87
A realizar no exercício	R$	1.264.056,13
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício		
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	1.264.056,13
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	53.635.943,87

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**24/04/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**31/05/14**	**54.900.000,00**	**22/05/13**	**-**	**53.635.943,87**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**54.900.000,00**	**Valor realizado:**		**53.635.943,87**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a confirmção de conclusão do Antegente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 37 (ex PO 34)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísa I Geração e Comercialização de Energia Ltda		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	64.439.000,00	111.845.737,70

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	63.942.862,59
A realizar no exercício	R$	496.137,41
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício		
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Valor liberado (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	496.137,41
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	63.942.862,59

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	05/12/11	03/02/12	-	05/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 287/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 142/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**05/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	63.942.862,59	12/06/14	04/07/14	63.942.862,59	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação2		01/07/14	31/07/14	496.137,41	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**31/07/14**	**64.439.000,00**	**15/05/13**	**-**	**63.942.862,59**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**64.439.000,00**	**Valor realizado:**		**63.942.862,59**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do CMN, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº 142/2013.
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 38 (ex PO 35)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairi/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	59.864.000,00	103.767.630,90

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	59.435.321,28
A realizar no exercício	R$	428.678,72
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	428.678,72
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	59.435.321,28

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DFI)	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 288/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 143/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**05/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	59.435.321,28	22/10/14	20/11/14	59.435.321,28	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	428.678,72	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**31/07/14**	**59.864.000,00**	**15/05/13**	**-**	**59.435.321,28**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**59.864.000,00**	**Valor realizado:**	**59.435.321,28**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 39 (ex PO 36)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	55.278.000,00	96.211.685,60

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	54.848.909,88
A realizar no exercício	R$	429.090,12
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	429.090,12
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	54.848.909,88

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 289/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 144/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**05/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05//13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.848.909,88	25/06/14	04/07/14	54.848.909,88	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	429.090,12	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**31/07/14**	**55.278.000,00**	**15/05/13**	**-**	**54.848.909,88**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado			-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**55.278.000,00**	**Valor realizado:**		**54.848.909,88**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE - Resolução nº
Obs6: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 40 (ex PO 37)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 25,2 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	55.273.000,00	97.724.438,55

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	54.216.447,60
A realizar no exercício	R$	1.056.552,40
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	1.056.552,40
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	54.216.447,60

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 290/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 145/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**05/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05//13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	54.216.447,60	13/08/14	02/09/14	54.216.447,60	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	1.056.552,40	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**31/07/14**	**55.273.000,00**	**15/05/13**	**-**	**54.216.447,60**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**55.273.000,00**	**Valor realizado:**		**54.216.447,60**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5 Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 41 (ex PO 38)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA		
Objetivo do projeto:	Geração de energia Eólica - 27,3 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	64.455.000,00	110.812.435,83

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	64.455.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	57.321.606,84
Saldo a liberar	R$	7.133.393,16
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	57.321.606,84

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	28/12/11	26/02/12	-	28/12/11	24/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	07/03/12	10/02/13	-	07/03/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 292/2012, de 27/02/2012.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	06/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/05/13	05/06/13	-	06/05/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 146/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**05/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05//13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/03/14	31/03/14	57.321.606,84	15/01/2015	10/02/15	57.321.606,84	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
8	Liberação 2		01/07/14	31/07/14	7.133.393,16	25/08/15	-		50,00%	Atrasado	Proposta de liberação em análise.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**31/07/14**	**64.455.000,00**	**15/05/13**	**-**	**57.321.606,84**	**83%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**92%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**64.455.000,00**	**Valor realizado:**		**57.321.606,84**	**75,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 42 (ex PO 39)**
Objetivo estrátégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 16,8 MW - Amontada/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	33.900.000,00	79.486.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	28.688.696,90
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	5.211.303,10
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	33.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 460/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 153/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**24/04/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		26/12/13	24/01/14		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1		01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	01/02/14	03/03/14	28.688.696,90	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	5.211.303,10	24/12/14	02/02/15	5.211.303,10	100,00%	Concluído	Liberações concluidas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**01/05/14**	**33.900.000,00**	**26/12/13**	**02/02/15**	**33.900.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**33.900.000,00**	**Valor realizado:**		**33.900.000,00**	**80,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 43 (ex PO 40)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	46.786.085,39
A realizar no exercício	R$	3.213.914,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	3.213.914,61
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	46.786.085,39

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05//13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**07/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05//13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05//13	31/05/13		22/05//13	24/0513		100,00%	Concluído		
7	Liberação1		01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2		01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05//13**	**01/05/14**	**50.000.000,00**	**22/05//13**	**-**	**46.786.085,39**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado					0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**-**	**-**	**0,00**			**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**50.000.000,00**	**Valor realizado:**		**46.786.085,39**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 44 (ex PO 41)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	49.690.000,03	94.474.032,62

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	49.687.713,17
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	49.687.713,17

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	**Concluído**		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	**Concluído**		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	**Concluído**	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 183/2012, de 03/02/2012.BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Joema/J.Emerson/A.F.Brito	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	**Concluído**	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 147/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**01/09/11**	**24/04/13**	**0,00**	**01/09/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	**Concluído**		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	37.225.328,03	26/12/13	24/01/14	37.225.328,03	100,00%	**Concluído**		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	12.464.672,00	02/07/14	12/08/14	12.462.385,14	100,00%	**Concluído**	O BNB informou que o valor não comprovado (R$ 2.286,86) foi baixado do saldo de liberação, em 29/04/2014, não sendo mais objeto de novo pedido de liberação.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**01/05/14**	**49.690.000,03**	**15/05/13**	**12/08/14**	**49.687.713,17**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
8	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	**A Iniciar**		

9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	**A Iniciar**	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
Encerramento (Banco)			**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**49.690.000,03**	**Valor realizado:**	**49.687.713,17**	**80,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 45 (ex PO 42)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eólica Moxotó S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 19,8 MW - João Câmara/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	46.701.999,96	85.684.069,03

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	34.986.862,96
A realizar no exercício	R$	11.715.137,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	11.715.137,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	34.986.862,96

Previsão de Conclusão:	01/04/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 184/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 148/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**01/09/11**	**24/04/13**	**0,00**	**01/09/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31//05/13		15/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
6	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	34.986.862,96	13/12/13	24/01/14	34.986.862,96	100,00%	Concluído		
7	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/03/14	14/06/13	11.715.137,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**14/06/13**	**46.701.999,96**	**15/05/13**	**-**	**34.986.862,96**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**46.701.999,96**	**Valor realizado:**		**34.986.862,96**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 46 (ex PO 43)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 18,0 MW - Sobradinho/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	29.040.000,00	61.107.977,00

Previsão de Conclusão:	30/05/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	29.040.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	29.040.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	26/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 186/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 150/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**01/09/11**	**24/04/13**	**0,00**	**01/09/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	21.755.374,08	02/01/14	24/01/14	21.755.374,08	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	7.284.625,92	22/10/14	20/11/14	7.284.625,92	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**01/05/14**	**29.040.000,00**	**15/05/13**	**20/11/14**	**29.040.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**29.040.000,00**	**Valor realizado:**	**29.040.000,00**	**80,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:	
Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 47 (ex PO 44)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Pedra do Reino S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 30,0 MW - Sobradinho/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	53.959.000,00	127.613.439,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	53.959.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Valor liberado no Exercício (LOA)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	53.959.000,00

Previsão de Conclusão:	01/08/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro (SUDENE/DGFI)	01/09/11	31/10/11	-	01/09/11	06/10/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	07/12/11	05/02/12	-	07/12/11	01/02/12	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	06/02/12	10/02/13	-	06/02/12	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 185/2012, de 03/02/2012. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/ Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	15/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 149/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**01/09/11**	**24/04/13**	**0,00**	**01/09/11**	**15/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	15/05/13	31/05/13		15/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	01/02/14	03/03/14	40.423.492,77	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	13.535.507,23	22/10/14	20/11/14	13.535.507,23	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**15/05/13**	**01/05/14**	**53.959.000,00**	**15/05/13**	**20/11/14**	**53.959.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**53.959.000,00**	**Valor realizado:**	**53.959.000,00**	**80,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto.
Obs3: Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4: Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 48 (ex PO 45)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 42,0 MW - Paracuru/CE		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	99.970.000,00	174.770.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	96.407.194,96
A realizar no exercício	R$	3.562.805,04
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício		
Valor liberado no Exercício (RAP)		0,00
Saldo a liberar	R$	3.562.805,04
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	96.407.194,96

Previsão de Conclusão:	01/08/2014	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Data Atualização:	31/08/2015	

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	23/08/10	22/10/10	-	23/08/10	24/09/10	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	31/10/11	30/12/11	-	31/10/11	07/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB / A definir	19/12/11	10/02/13	-	-	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 2033/2011, de 19/12/2011. BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Cláudio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13		08/05/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 156/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**23/08/10**	**07/06/13**	**0,00**	**23/08/10**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/03/14	31/03/14	96.407.194,96	02/04/14	25/04/14	96.407.194,96	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	3.562.805,04	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**31/07/14**	**99.970.000,00**	**22/05/13**	**-**	**96.407.194,96**	**67%**	**Atrasado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Atrasado**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**99.970.000,00**	**Valor realizado:**		**96.407.194,96**	**70,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:	
Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	BNB concedeu prazo adicional de 30 dias para a Empresa atender exigências quanto a análise do projeto e a SUDENE autorizou duas prorrogações, ampliando o prazo por mais 90 dias.
Obs3:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs4:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs5:	Houve prorrogações do prazo de análise do projeto.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 49 (ex PO 46)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP		
Objetivo do projeto:	Implantação de fabrica de Cimento		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	303.000.000,00	701.131.477,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2016
Data Atualização:	31/08/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	197.811.049,39
A realizar no exercício	R$	105.188.950,61
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	72.058.690,67
Saldo a liberar	R$	33.130.259,94
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	269.869.740,06

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	21/12/12	19/02/13	-	21/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	28/01/13	28/04/13	-	29/01/13	18/02/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	22/03/13	21/04/13	-	22/03/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 130/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**21/12/12**	**21/04/13**	**0,00**	**21/12/12**	**19/04/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	24/05/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/02/14	29/03/14	105.409.597,25	27/02/14	28/03/14	105.409.597,25	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/14	01/05/14	92.401.452,14	04/09/14	07/10/14	92.401.452,14	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/14	31/07/14	72.058.690,67	13/05/15	09/07/15	72.058.690,67	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	30.130.259,94	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/16	31/01/16	3.000.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**19/04/13**	**31/01/16**	**303.000.000,00**	**19/04/13**	**-**	**269.869.740,06**	**67%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**83%**	**Em Andamento**		
9	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**303.000.000,00**	**Valor realizado:**		**269.869.740,06**	**63,64%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 50 (ex PO 47)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)		
Objetivo do projeto:	Implantação de Condomínio Logístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	270.582.240,00	548.262.603,00

Previsão de Conclusão:	30/09/2018
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	86.845.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	30.000.000,00
Saldo a liberar	R$	240.582.240,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	30.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	01/02/13	02/05/13	-	06/02/13	27/03/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	11/04/13	11/05/13	-	11/04/13	19/04/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 140/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**14/12/12**	**11/05/13**	**0,00**	**14/12/12**	**19/04/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/04/13	18/06/13		19/04/13	23/08/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	02/01/15	01/02/15	30.000.000,00	28/05/15	29/06/15	30.000.000,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	12.575.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	31/05/15	30/06/15	15.392.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	31/08/15	30/09/15	9.944.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	18.934.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	29/02/16	30/03/16	22.367.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	31/05/16	30/06/16	23.543.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	31/08/16	30/09/16	5.861.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
13	Liberação 9	SUDENE/BB	30/11/13	30/12/13	13.852.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
14	Liberação 10	SUDENE/BB	28/02/17	30/03/17	23.240.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
15	Liberação 11	SUDENE/BB	31/05/17	30/06/17	27.752.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
16	Liberação 12	SUDENE/BB	31/08/17	30/09/17	20.673.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
17	Liberação 13	SUDENE/BB	30/11/17	30/12/17	12.159.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
18	Liberação 14	SUDENE/BB	28/02/18	30/03/18	5.047.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
19	Liberação 15	SUDENE/BB	31/05/18	30/06/18	23.945.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
20	Liberação 16	SUDENE/BB	31/08/18	30/09/18	5.298.240,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**19/04/13**	**30/09/18**	**270.582.240,00**	**19/04/13**	**-**	**30.000.000,00**	**12%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**56%**	**Em Andamento**		
21	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
22	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**270.582.240,00**	**Valor realizado:**		**30.000.000,00**	**22,73%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs 2 Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 51 (ex PO 48)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.		
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	23.855.042,00	63.051.003,61

Previsão de Conclusão:	31/12/2015
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	13.862.197,00
A realizar no exercício	R$	9.992.845,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	5.677.786,88
Saldo a liberar	R$	4.315.058,12
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**06/09/12**	**16/08/13**	**0,00**	**06/09/12**	**20/06/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/15	31/12/15	4.315.058,12	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**20/06/13**	**31/12/15**	**23.855.042,00**	**20/06/13**	**-**	**19.539.983,88**	**75%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**88%**	**Em Andamento**		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**23.855.042,00**	**Valor realizado:**		**19.539.983,88**	**66,67%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 52 (ex PO 49)**
Objetivo estrátégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Deten Química S.A.		
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão:	30/01/2016
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	15.447.600,00
A realizar no exercício	R$	15.808.400,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	15.808.400,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	15.447.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**05/02/13**	**26/10/13**	**0,00**	**05/02/13**	**10/09/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	2.787.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	Concluído	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	10.160.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	A sudene está aguadando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/11/14	01/12/14	4.340.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	28/02/15	30/03/15	5.260.000,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	31/07/15	30/08/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/11/15	30/12/15	4.354.200,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**10/09/13**	**30/12/15**	**31.256.000,00**	**10/09/13**	**-**	**15.447.600,00**	**29%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**64%**	**Em Andamento**		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**31.256.000,00**	**Valor realizado:**	**15.447.600,00**	**41,67%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.
Obs3: A sudene está aguadando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 53 (ex PO 50)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Shineray do Brasil S.A.		
Objetivo do projeto:	Produção de Motocicletas		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	61.867.350,00	128.207.602,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	61.867.350,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	61.867.350,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	26/04/13	25/06/13	-	26/04/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	12/07/13	09/12/13	-	12/07/13	18/11/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/11/13	19/12/13	-	19/11/13	27/11/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 176/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**26/04/13**	**19/12/13**	**0,00**	**26/04/13**	**27/11/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	27/11/13	27/03/14		27/11/13	10/12/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	43.716.664,18	14/04/14	25/04/14	43.716.664,18	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	8.932.605,95	10/06/14	26/06/14	18.150.685,82	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	9.218.079,87	-	-	-	0,00%	Cancelado		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**27/11/13**	**01/10/14**	**61.867.350,00**	**27/11/13**	**-**	**61.867.350,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
8	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
9	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5° da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**61.867.350,00**	**Valor realizado:**		**61.867.350,00**	**66,67%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3° Ciclo 2015

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 54 (ex PO 51)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Cone Multicenter Ltda		
Objetivo do projeto:	Implantação de Complexo Turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	191.238.424,00	347.706.225,00

Previsão de Conclusão:	30/03/2017
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	161.068.054,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	191.238.424,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	14/12/12	12/02/13	-	14/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	01/02/13	27/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	28/06/13	27/08/13	-	28/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 162/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**14/12/12**	**27/08/13**	**0,00**	**14/12/12**	**28/06/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	28/06/13	30/04/14		02/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	22.399.683,00	-	-	-	0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	37.389.326,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/09/14	01/10/14	47.931.097,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	41.045.299,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	12.302.649,00	-	-	-	0,00%	Atrasado		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	2.614.993,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/08/16	31/08/16	13.684.507,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/17	03/03/17	13.870.870,00	-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**28/06/13**	**03/03/17**	**191.238.424,00**	**02/06/13**	**-**	**0,00**	**11%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**56%**	**Em Andamento**		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-		0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**191.238.424,00**	**Valor realizado:**		**0,00**	**28,57%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 55 (ex PO 52)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S.A.		
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	50.000.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	50.000.000,00

Previsão de Conclusão:	30/11/2014
Data Atualização:	31/08/2015

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**03/09/13**	**08/06/14**	**0,00**	**03/09/13**	**12/05/14**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**12/05/14**	**31/08/14**	**50.000.000,00**	**16/05/14**	**22/08/14**	**50.000.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
6	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar	O Agente Operador dispõe de um prazo de 6 meses a contar da data do 1ª reembolso, para emitir o Certificado de Implantação, paragrafo único do art. 5º da Resolução Nº 214, de 5 de fevereiro 2015 .	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**50.000.000,00**	**Valor realizado:**	**50.000.000,00**	**71,43%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 56 (ex PO 53)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Companhia Siderúrgica Suape S/A		
Objetivo do projeto:	Implantação de Laminadora de Aço		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	1.075.935.159,00	1.956.601.489,00

Previsão de Conclusão:	30/09/2017
Data Atualização:	31/08/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	363.477.082,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	1.075.935.159,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Casimiro SUDENE/DGFI)	19/12/13	18/01/14	-	19/12/12	27/12/12	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	01/02/13	01/07/13	-		05/05/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	06/06/14	06/07/14	-	06/06/14	27/06/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 189/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**19/12/13**	**06/07/14**	**0,00**	**19/12/12**	**27/06/14**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	27/06/14	26/08/14		16/05/14	-	-	50,00%	Atrasado	Minuta de contrato enviada ao Banco.	
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/10/14	31/10/14	141.458.966,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação.	Contrato CEF/Empresa em fase de formalização.
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/04/15	01/05/15	62.922.240,00	-	-		0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/07/15	31/07/15	159.095.876,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/01/16	31/01/16	441.712.002,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/07/16	31/07/16	158.476.107,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/01/17	31/01/17	82.598.869,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/07/17	31/07/17	29.671.099,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**27/06/14**	**31/07/17**	**1.075.935.159,00**	**16/05/14**	**-**	**0,00**	**6%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**53%**	**Em Andamento**		
12	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
13	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**1.075.935.159,00**	**Valor realizado:**		**0,00**	**26,92%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGGI/ Coordenação de Planejamento Institucional e acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 57 (ex PO 54)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa do PPA:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Foz do Atlântico Saneamento S/A)		
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	70.152.822,60
A realizar no exercício	R$	168.380,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	345.429.739,92
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	70.152.822,60

Previsão de Conclusão:	01/06/16
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**03/05/13**	**20/03/14**	**0,00**	**03/05/13**	**21/02/14**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	114.555.923,52	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído	Valor liberado menor que a parcela prevista.	
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	57.163.904,46	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/14	31/12/14	54.743.293,10	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/06/15	01/07/15	75.370.699,94	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	56.874.370,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/CEF	01/06/16	01/07/16	56.874.370,75	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**21/02/14**	**01/07/16**	**415.582.562,52**	**21/02/14**	**-**	**70.152.822,60**	**28,57%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**64,29%**	**Em Andamento**		
11	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$ 415.582.562,52**	**Valor realizado:**	**R$ 70.152.822,60**	**41,67%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:	
3º Ciclo 2015	
Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs3:	A sudene está aguadando novo conograma de liberação do agente operador, incluindo alterações nos valores das parcelas.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO 58 (ex PO 55)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa do PPA:	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	**Eixo temático (MI):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MI):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Icentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Ricardo Andrade Bezerra Barros	**Gestor da subunidade:**	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler
Problema (causa):			
Projeto:	Cone S/A		
Objetivo do projeto:	Implantação de plataforma de serviços de logística		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100	5	90	123.186.471,03	357.142.405,97

Previsão de Conclusão:	28/02/2016
Data Atualização:	31/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Sabrina Lyra de Oliveira Guendler

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	123.186.471,03
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	123.186.471,03
Valor Empenhado no Exercício	R$	123.186.471,03
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	123.186.471,03
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Cosulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DFIN)	12/12/13	11/01/14	-	12/12/13	26/12/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	23/05/14	20/10/14	-	23/05/14	19/09/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	02/04/14	02/05/14	-	02/04/14	12/11/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 210/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**12/12/13**	**02/05/14**	**0,00**	**12/12/13**	**12/11/14**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	18/11/14	15/12/15	-		-	-	0,00%	A Iniciar	Contrato Empresa/BB em fase de formalização.	autorizado a prorrogação do prazo de contratação pela Sudene até 15/12/15.
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/14	31/12/14	60.559.000,00	-	-		0,00%	Atrasado	Aguardando proposta de liberação do agente operador.	Em função da prorrogação do prazo de contratação o cronograma de desembolso será repactuado.
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/02/15	03/03/15	8.986.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/04/15	01/05/15	4.616.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/06/15	01/07/15	4.289.000,00	-	-		0,00%	Atrasado		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/08/15	31/08/15	14.059.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/10/15	31/10/15	11.656.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	11.751.000,00	-	-		0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/02/16	02/03/16	7.270.471,03	-	-		0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**18/11/14**	**02/03/16**	**123.186.471,03**	**00/01/00**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**50,00%**	**Em Andamento**		
13	Fiscalizações	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
14	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	A definir	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	A Iniciar		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$ 123.186.471,03**	**Valor realizado:**	**R$ -**	**21,43%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
3º Ciclo 2015
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 59 (ex PO 56)**
Objetivo estrátegico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2014**
Sub-objetivo:	**3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.**		

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios administrativos e de gestão para a implementação e operacionalização da estrutura prevista pelo novo Decreto de regulamentação da estrutura organizacional do órgão		
Unidade Responsável:	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste	**Subunidade responsável:**	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável:	Marcos Robalinho (Superintendente substituto)	**Gestor da subunidade:**	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Desatualização do regimento interno face à nova regulamentação da estrutura organizacional da SUDENE.		
Projeto:	Atualização do Regimento Interno.		
Objetivo do projeto:	Adequar o atual RI da SUDENE às novas atribuições sancionadas por meio de Decreto.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
				0,00	R$ -

Previsão de Conclusão:	15/04/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carmen Lúcia Couto Fonseca

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Análise das atribuições contidas no decreto da nova estrutura regimental da SUDENE	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	30/06/14	04/07/14		30/06/14	04/07/14		100,00%	Concluído	Todo o andamento das providências para a construção do RI teve por começo a publicação do novo Decreto de estrutura regimental da SUDENE.	O Decreto nº 8.276 foi assinado em 27/06/14 e publicado no DOU de 30/06/14, Seção 1, pág. 5..
2	Montagem da primeira minuta para envio às unidades	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	03/07/14	04/07/14		03/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
3	Envio e Articulação com as unidades internas para ajuste das atribuições.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	07/07/14	22/07/14		07/07/14	04/07/14		100,00%	Concluído		
4	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	14/07/14	23/07/14		28/07/14	22/08/14		100,00%	Concluído		
5	Elaboração da Portaria que aprova as Siglas da Sudene. Abertura de processo, envio à Procuradoria, Assinatura do Superintendente.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	01/09/14	09/09/14		01/09/14	09/09/14		100,00%	Concluído	Só foi possível elaborar as siglas quando as unidades retornaram com as competências analisadas e os nomes correspondentes.	
6	Apresentação das siglas para conhecimento à Diretoria Colegiada	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	11/09/14	19/09/14		11/09/14	11/09/14		100,00%	Concluído	Em função de algumas observações que surgiram na reunião houve a necessidade de alguns ajustes	
7	Retorno das competências pelas unidades para apresentação dos resultados e novos ajustes	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	15/09/14	26/09/14		15/09/14	03/10/14		100,00%	Concluído		
8	Montagem final da primeira versão completa do Regimento Interno e envio às unidade para análise final	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	29/09/14	24/10/14		06/10/14	24/10/14		100,00%	Concluído		

9	Retorno das unidades e ultimos ajustes, se for o caso	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	24/10/14	31/10/14		29/10/14	14/11/14		100,00%	**Concluído**		
10	Encaminhamento à PRD para apreciação dos aspectos jurídicos da proposta (inclui apreciações preliminares e ajustes)	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	19/11/14	15/12/14		19/11/14	15/12/14		100,00%	**Concluído**	O prazo previsto desta etapa incluiu uma apreciação preliminar da PRD, que foi seguida por sugestões de ajustes e o envio para apreciação da versão final no dia 15/12/14.	
11	Apresentação da proposta à Diretoria Colegiada para aprovação.	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	22/12/14	29/12/14		27/02/15	27/02/15		100,00%	**Concluído**	Aguardando agenda da Diretoria colegiada.	Em reunião realizada dia 25/03/15, a Diretoria pediu que as unidades internas apresentassem, no prazo de 48 horas, sugestões à proposta de RI que ainda percebam como necessárias.
12	Reunião prévia de esclarecimento e alinhamento de posições com os Diretores de Administração, de Fundos e Incentivos, e de Planejamento	Carmen Lúcia e Manoel Barreiros (CGGI)	25/03/15	25/03/15		29/04/15	29/04/15		100,00%	**Concluído**	Essa reunião objetivou o encontro de soluções para a implantação da Coordenação de Gestão de Convênios e TCE, para a retomada do cargo da coordenação da CGGI e para a troca de cargo DAS 102-3 por 101.3, da unidade de Suprimentos para a Coordenação de Gestão de Convênios e TCE.	A CGGI preparou nota técnica com data de 12/05/15 para subsiidiar decisão do Superintendente sobre o assunto.
13	Aprovação pela DC, publicação no DOU e/ou Boletim interno.	Gabinete da Superintendência	01/03/15	29/05/15		13/05/15			50,00%	**Atrasado**	Continuamos a aguardar uma decisão da DC para o fechamento completo do RI.	
			Valor Previsto:		0,00	**Valor realizado:**			96,15%	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Unidades Administrativas internas, particularmente a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Observações:

3º Ciclo 2015

O prazo de conclusão foi reajustado para 15/04/2015 em função de agenda da Diretoria colegiada.

Fonte: CGGI/Coordenação de Gestão de Processos, Desenvolvimento Organizacional e Suporte a Colegiados (CGGI/CGP)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 60 (ex PO 57)**
Objetivo estrátegico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competênci**	**Ano:**	**2013**
Sub-objetivo:	**3.1.1 – Reestruturar as unidades gestoras.**		

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover a SUDENE dos meios funcionais e de gestão para a sua operacionalidade organizacional.		
Unidade responsável:	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste	**Subunidade responsável:**	Assessoria de Gestão Institucional
Responsável :	João Paulo Lima e Silva (Superintendente)	**Gestor da subunidade:**	Manoel Francisco Barreiros
Problema (causa):	Disfunções/desvios e superposição de processos em decorrência da inexistência de procedimentos formais de articulação e interconexão de funções administrativas internas.		
Projeto:	Construção do Escritório de Processos da SUDENE (Mapeamento Experimental da atividade CONVÊNIOS)		
Objetivo do projeto:	Elaborar e institucionalizar procedimentos/rotinas operacionais que eliminem disfunções/superposições de procedimentos internos.		

Dados Orçamentários	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	1	90	0,00	0,00

Previsão de Conclusão:	09/12/2015
Data Atualização:	28/08/2015

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Barreiros e Carmen Lúcia Couto Fonseca

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Reunião com representantes das unidades internas na sala JK, para apresentação, por meio de vídeoconferência, da experiência do MI na construção do Escritório de Processos.	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI)	31/10/13	31/10/13	-	31/10/13	31/10/13	-	100%	**Concluído**		
2	Reunião de nivelamento conceitual e sensibilização gerencial em Recife, sede da SUDENE, para nivelamento de conceitos e apresentação detalhada dos avanços do MI e da proposta de plano de trabalho da SUDENE, para construção de seu EP.Prezados gestores da CGEP/DPLAN, CGDS/DPLAN, COC/CGAF/DAD, AUD, CGC, Boa tarde! Convidamos representante das unidades acima citadas para tratarmos das orientações que irão	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Sra. Terezinha (CGPM/DGE/MI)	05/12/13	05/12/13	-	05/12/13	05/12/13	-	100%	**Concluído**	Participaram da reunião: Amarildo Baesso (Diretoria de Programas do MI) e Francette Amorim (Consultora contratada pelo MI).	
3	Reunião com uniaddes internas para encaminhamento de providências objetivando a construção do EP e discussão preliminar sobre etapas do trabalho e proposta de portaria	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE) e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	02/04/13	02/04/13	-	02/04/13	02/04/13	-	100%	**Concluído**	Desaceleração dos trabalhos em função da elaboração do novo Regimento Interno.	
4	177ª Reunião Diretoria Colegiada (explanação sobre andamento dos trabalhos de mapeamento)	Manoel e Carmen (CGGI)	11/09/14	11/09/14	-	11/09/14	11/09/14	-	100%	**Concluído**		
5	Envio, pelo Superintendente, de memorando às Diretorias para indicação de titular e suplente para compor o Esc de Processos.	Carmen e Gab	11/09/14	18/09/14	-	11/09/14	18/09/14	-	100%	**Concluído**		
6	Seleção da área a ser mapeada	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	26/03/15	10/04/15	-	26/03/15	26/03/15	-	100%	**Concluído**	**Foi escolhido o tema "convênios"**	
7	Definição da Metodologia	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado	12/06/15	12/06/15	-	12/06/15	12/06/15	-	100%	**Concluído**		

8	Ajuste/revisão a minuta de portaria	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	10/06/15	18/06/15		10/06/15	18/06/15		100%	**Concluído**		
9	Revisão do projeto de GESTÃO DE PROCESSOS e elaboração versão final com base na metodologia escolhida.	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	12/06/15	19/06/15	-	100%	**Concluído**		
10	Preparar Material a ser distribuído aos interlocutores	Manoel Barreiros e Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	16/06/15	19/06/15	-	20/08/15	20/08/15	-	100%	**Concluído**		
11	Reunião com representante das unidades envolvidas no processo "convênios" (CGGI; CGDS/DPLAN; CGEP/DPLAN; AUD; CGC-CPTCE; COC/CGAF) para tratar das orientações que irão nortear o mapeamento das atividades/ Inicio dos trabalhos e início do mapeamento na temática "**Convênios".**	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	21/08/15	21/08/15	-	21/08/15	21/08/15	-	100%	**Concluído**	É importante que o servidor indicado seja mantido no trabalho até o seu final.	
12	Acompanhamento dos trabalhos com os interlocutores envolvidos no convênio, para elaboração e conclusão das entrevistas	Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE)	24/08/15	30/09/15	-			-	0%	**A Iniciar**	Agendado quartas-feiras pela manhã (9h-11h)	
13	Trabahos internos do grupo de processos relativo ao processo de convênios	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE)	01/11/15	30/11/15					0%	**A Iniciar**		
14	Apresentação, para o Superintendente e Diretores, dos resultados do mapeamento do Processo "Convênio".	Manoel, Vinicius, Carmen Fonseca (CGGI/SUDENE) e Luiz Carlos Dourado (CGTI/SUDENE) GAB Diretoria Colegiada	02/12/15	09/12/15	-			-	0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		0,00	**Valor realizado:**		0,00	79%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Auditoria interna; Coordenação-Geral de Logística, Administrção e Finanças/DAD; Coordenação de Gestão de Convênios/DAD; Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente/DPLAN e Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação/DPLAN.

Observações:

Obs.1: Em razão da experiência da Diretoria de Gestão Estratégica do MI, este trabalho poderá ser estender por até 4 anos, a depender da disponibilidade dos recursos humanos das unidades envolvidas e do grau de sensibilização do gestor para a prioridade e o apoio a ser dado ao trabalho.

Obs.2: Cada processo mapeado corresponderá a um Plano Operativo como forma de melhor se acompanhar a evolução de suas etapas.

3º Ciclo 2015

Fonte: CGGI/Coordenação de Planejamento Institucional e Acompanhamento da Gestão (CGGI/CPA)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3-Promover a Execelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 61 (ex PO 58)**
Objetivo estrátegico:	**-**	**Ano:**	**2015**
Sub-Objetivo:	**-**	**Medida Institucional Normativa**	

Programa do PPA:	Ação interna	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente Eficaz e Efetiva.
Ação do PPA:	Ação interna	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria continua dos meios e processos de gestão.
Objetivo da ação:	Elaboração do novo PPA 2016-2019		
Diretoria responsável:	-	**Subunidade responsável:**	Coordenação Geral de Gestão Institucional
Superintendente:	José Márcio de Medeiros Maia	**Gestor da subunidade:**	Manoel Barreiros
Problema (causa):	Risco de desarticulação interna, desperdício e organização assistemática das discussões e elaboração da proposta da SUDENE para o novo Plano Plurianual do Governo Federal para o período 2016-2019.		
Projeto:	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA.		
Objetivo do projeto:	Elaborar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional e com as demais diretorias, propostas para o plano plurianual, para a lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual, em relação aos projetos e atividades previstos na área de atuação da SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	
A realizar no exercício	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	

Previsão de Conclusão:	24/07/15
Data Atualização:	23/07/15

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Manoel Barreiros (CGGI/SUDENE), Andreza Oliveira (CPA/CGGI) e Vinicius Almeida (CPA/CGGI)

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Comunicação à Diretoria Colegiada da SUDENE, do início dos trabalhos internos para a elaboração do novo PPA.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	29/12/14	21/01/15		29/12/14	21/01/15		100%	Concluído	Na reunião nº 185 (29/12/14) a CGGI comunicou o início dos trabalhos para janeiro/15, e na reunião nº 186 (21/01/15) a CGGI pediu a colaboração da alta administração para apoiar tanto nas articulações políticas que se fizessem necessárias, como institucionais, com os diferentes ministérios de nosso interesse, particularmente o MI. O Superintendente José Márcio e os diretores presentes hipotecaram total apoio.	
2	Articulação com o Ministério da Integração Nacional pedindo a agenda de discussão para o novo PPA, os objetivos para o novo período e a metodologia prevista .	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	03/02/15	05/02/15		20/01/15	20/01/15		100%	Concluído	A articulação, feita por e-mail de 20/03, dirigido à CGPM/SECEX/MI objetivou também, provocar o MI a se mexer para iniciar articulação com a SPI/MPO e inserir a SUDENE nas discussões.	
3	Reunião interna para disseminação das primeiras orientações da SPI/MPO	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	04/02/15		21/01/15	21/01/15		100%	Concluído	A CGGI estava vislumbrando risco de desarticulação interna, falta de foco e de metodologia.	A CGGI sugeriu a formação de um grupo interno de trabalho e comunicou, com base na informação recebida, os possíveis momentos nos quais seriam recebidas as prioridades do governo federal, oportunidade na qual a SPI disponibilizará o manual para a elaboração do novo PPA, e mais, comunicará as prioridades elegidas, a agenda de temas setoriais e o cronograma de encaminhamentos oficiais.

4	Identificação de ponto de contato na SPI/MPO para ntercambio de informações.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	04/02/15		23/01/15	23/01/15		100%	**Concluído**	O MI não estava demonstrando clareza, eficiência e eficácia nas informações que transmitia.	A identificação do contato (Marcos Silva - Coordenador do Departamento de Gestão do Ciclo de Planejamento da SPI/MPO, fone (61) 2020.4119) objetivou facilitar e agilizar a troca de informações haja vista que o MI não estava demonstrando clareza, eficiência e eficácia nas informações que transmitia.
5	Reuniões internas, preparatórias, para as discussões do programa 2040 - Gestão de Riscos, em Brasília, levantamento de documentação de suporte, legislação, artigos acadêmicos sobre sucessos e insucessos de políticas públicas..	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	04/02/15	05/02/15		28/01/15	30/01/15		100%	**Concluído**	Foi escolhido o Prog. 2040 - Gestão de Riscos para aplicação da metodologia, que constou de revisão de objetivos, metas e iniciativas do PPA 2012-2015. Foram realizadas reuniões internas nos dias 28 e 30/01.	A CGGI , em 23/01/15 pediu que todas as unidades finalísticas definissem representantes para a reunião presencial. A informação da CGDS e CGEP/DPLAN foi recebida pela CGGI na mesma data.
6	Reunião presencial para discussão de metodologia de elaboração do novo PPA sobre projeto piloto a ser escolhido.	SPI/MPO	05/02/15	05/02/15		03/02/15	03/02/15		100%	**Concluído**	A reunião foi presencial, realizada na ENAP/Brasília e servirá para orientar a preparação interna para quando chegar o momento das discussões da agenda oficial.	
7	Reuniões internas para avaliação de resultados da oficina do Prog. 2040, dia 03/02/15 em Brasília, desdobramentos do trabalho, integração das equipes, defdinição do modelo metodológico, testes, refinamentos de metodologia,transmissão de orientações advindas da SPI (resultados da reunião com secretários de ministérios dia 19/03) .	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros), CGEP/DPLAN (Frederico Cavalcanti), CGDS/DPLAN (Carlos Almiro)	06/02/15	31/03/15		04/02/15	25/03/15		100%	**Concluído**	Foram realizadas reuniões nos dias 04, 06, 11, 12, 13, 19, 25 e 26/fev, 02, 03, 19, 25/mar para discutir resultados do Prog. 2040, a agenda de trabalhos subsequentes, conteúdo metodológico, formação de equipes internas de discussão temática e apresentação de resultados.	As reuniões dos dias 25/02 e 03/03 objetivaram alinhar com o Chefe de Gabinete, Clésio Oliveira, e com o Diretor da DPLAN, Sérgio Alencar, o andamento dos trabalhos e os resultados já alcançados.
8	Expedição de comunicação aos Ministérios setoriais, ao Mi e ao MPO sobre pedido de inserção da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do novo PPA.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	25/03/15	31/03/15		24/03/15	24/03/15		100%	**Concluído**	Encaminhado e-mail à CGPM/MI cobrando agenda oficial de oficinas do PPA e expedidos ofícios, assinados pelo Sr. Superintendente, com data de 24/03/15, aos Ministérios dos Transportes; Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação; Cultura; Educação, Secretaria de Portos; Cidades; Relações Exteriores; Minas e Energia; Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Planejamento e Turismo.	
9	Videoconferência do MI sobre o Prog. 2040-Gestão de Riscos.	CGPM/SECEX/MI	26/03/15	26/03/15		26/03/15	26/03/15		100%	**Concluído**	Busca, pelo MI, de sugestões junto a vinculadas para ajustes de objetivos, metas e iniciativas do Prog. 2040 - Gestão de Riscos.	
10	Encaminhamento da agenda de oficinas temáticas e pedido de relação de técnicos para as oficinas temáticas	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	27/03/15	31/03/15		01/04/15	01/04/15		100%	**Concluído**	Encaminhamento as unidades finalísticas (CGEP e CGDS/DPLAN) da relação de oficinas enviadas pela SPI/MPO e pela CGPM/MI, que terão participação da SUDENE e pedido da CGPM para indicação de técnicos da SUDENE que participarão de reuniões preliminares de orientação para a elaboração do novo PPA 2016-2019. CGEP e CGDS apresentaram suas indicações de oficinas de interesse por e-mail dos dias 01 e 02/04 respectivamente.	Adicionalmente, como reforço, a SUDENe enviou ao Secretário da SPI, o of. 172/2015/GAB, de 06/04, com as indicações das oficinas de interesse da Autarquia.
11	Reunião com o Diretor da DPLAN para apresentação, pela CGDS e CGEP, da proposta da SUDENE para o Prog. 2029.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros) e DPLAN (Diretor Sérgio Alencar)	13/04/15	13/04/15		13/04/15	13/04/15		100%	**Concluído**	Além da proposta da SUDENE, também foram discutidas as justificativas sugeridas por Amarildo Baesso (Diretor de Programas do MI) para participação da SUDENE nas oficinas e pedido de relação de técnicos para essas oficinas oficiais.	
12	Videoconferência do MI com as vinculadas, preparatória para as oficinas do PPA.	CGPM/SECEX/MI	16/04/15	16/04/15		16/04/15	16/04/15		100%	**Concluído**	A reunião objetivou democratizar as orientações da SPI/MPO e informar sobre ajuste de datas das oficinas temáticas.	
13	Projeção de gastos com diárias e passagens para participação da SUDENE nas oficinas do PPA.	CGGI/SUDENE, CGEP e CGDS/DPLAN	17/04/15	17/04/15		17/04/15	17/04/15		100%	**Concluído**	A CGGI pediu a todas as unidades finalísticas e DFIN/CGDF que, com base em suas indicações de pessoal e temas de interesse, apresentasse a projeção de gastos com diárias e passagens. Na mesma data (17/04) a CGGI recebeu as respostas das unidades.	

14	Videoconferência da SUDENE, para discussão com as vinculadas SUDECO e SUDAM, das propostas da Autarquia para o novo PPA (Autorizada pelo Superintendente).	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	20/04/15	20/04/15		20/04/15	20/04/15		100%	**Concluído**	A reunião objetiva intercâmbio de propostas, conciliação de pontos de interesse, defesa conjunta de objetivos e definição de estratégia de abordagem para as oficinas temáticas.. A SUDECO não pode participar por que não conseguiu as instalações do MI, mas mesmo assim, foi inserida na agenda de intercâmbio.	Para facilitar o trânsito de dados entre a SUDENE e a SUDAM a CGGI, a CGEP e a CGDS/DPLAN intercambiaram seus contatos.
15	Participação da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do PPA 2016-2019 (1ª Rodada).	CGEP/DPLAN, CGDS/DPLAN e CGDF/DFIN(equipes)	22/04/15	15/05/15		22/04/15	15/05/15		100%	**Concluído**	Oficinas escolhidas para apresentação de propostas de objetivos, metas e iniciativas: desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; pesca e aquicultura; mobilidade urbana; agricultura familiar; aviação civil; educação; agropecuária sustentável; petróleo, gás e combústivel; energia elétrica; conservação e uso sustentável da biodiversidade; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e serviços; mudanças climáticas. A oficina que apresentou os piores resultados foi a do Prog. 2029 onde o MI concentra suas ações.	Em todas as oficinas da 1ª rodada a SUDENE apresentou propostas.
16	Videoconferência extraordinária do MI com as vinculadas sobre o programa 2029.	CGPM/SECEX/MI	24/04/15	24/04/15		24/04/15	24/04/15		100%	**Concluído**	A reunião objetivou consilidar posição sobre o programa 2029 em razão do insucesso da reunião de 19/05, em Brasília, com posições técnicas conflituosas entre MI, MDA e MMA.	
17	Reunião interna, pela manhã, para busca de convergência com os objetivos do Programa 2029 no novo PPA	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	27/04/15	27/04/15		27/04/15	27/04/15		100%	**Concluído**	A reunião objetivou discutir pontos da proposta da reunião do dia 24/04 (videoconferência do MI), que trouxeram prejuízos para a atuação da SUDENE e buscar posição interna como preparação para a reunião da videoconferência, novamente com o MI, na tarde de 27/04.	
18	Videoconferência do MI e vinculadas, à tarde, sobre as propostas para o Programa 2029 discutidas na videcoconferência do dia 24/04.	CGPM/SECEX/MI	27/04/15	27/04/15		27/04/15	27/04/15		100%	**Concluído**	A reunião objetivou superar pontos de dúvida e conflitos de objetivos contidos nas proposta da SDR/MI e vinculadas, particularmente a SUDENE, sempre mais proativa que as demais.	
19	Participação da SUDENE nas discussões das oficinas temáticas do PPA 2016-2019 (2ª Rodada).	CGEP/DPLAN, CGDS/DPLAN e CGDF/DFIN(equipes)	04/05/15	28/05/15		04/05/15	28/05/15		100%	**Concluído**	Oficinas escolhidas para discussão dos resultados da avaliação da SPI/MPO: desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; micro e pequena empresa; pesca e aquicultura; educação; energia elétrica; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e serviços; mudanças climáticas. A oficina que apresentou os piores resultados foi a do Prog. 2029 onde o MI concentra suas ações.	Em função de problemas de conciliação entre MI, MDA e MMA houve oficina extra do Prog. 2029, dia 28/05.
20	Reunião interna.	CGGI/SUDENE(Manoel Barreiros)	06/05/15	06/05/15		06/05/15	06/05/15		100%	**Concluído**	Avaliação dos avanços/resultados alcançados nas oficinas de elaboração do novo PPA e seleção das oficinas da segunda rodada.	Oficinas escolhidas para discussão dos resultados da avaliação da SPI/MPO (número menor): pesca e aquicultura; educação; desenvolvimento regional; transporte terrestre; saneamento; micro e pequenas empresas; energia elétrica; ciência, tecnologia e inovação; desenvolvimento da indústria, comércio e turismo; conservação e uso sustentável da biodiversidade; petróleo, gás e combustível; e mudanças climáticas.

21	Videconferência da SUDENE (Autorizada pelo Superintendente) com as vinculadas SUDECO e SUDAM.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	07/05/15	07/05/15		07/05/15	07/05/15		100%	**Concluído**	A reunião objetivou avaliação conjunta e o compartilhamento de posições a respeito dos resultados das oficinas do PPA 2016-2019.	Os resultados demonstraram divergências entre equipes do MI com repercussão nas ações das vinculadas, além de monopolização das discussões pelo MI, ignorando posições das mesmas. A SUDECO não pode participar por que não conseguiu apoio do MI. A reunião se revelou de extrema importância para a SUDAM.
22	Captação para a PLOA 2016	CGPM/SECEX/MI (Katlen Eutáquio)	08/05/15	22/05/15		08/05/15	01/06/15		100%	**Concluído**	Orientação originada da CGPM/SECEX/MI. A CGPM informou por meio de e-mail de 08/05/15 que tanto as informações para a PLOA 2016 qto. Para admissão de atributos para o novo PPA serão inseridos no SIOP por ela.	
23	Reunião convocada pela CGEP/DPLAN para discutir questões para o Prog. 2029, preparatória para a 2ª reunião (1ª rodada ainda) na ENAP, dia 15/05.	CGGI/SUDENE e CGEP/DPLAN (Frederico Cavalcanti)	13/05/15	13/05/15		13/05/05	13/05/15		100%	**Concluído**	Objetivo: fechamento de redação da proposta da SUDENE para objetivoe, metas e iniciativas.	
24	Reunião interna para discutir resultados e posição alcançada na formulação de objetivos, metas e iniciativas para o prog. 2029.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	25/05/15	25/05/15		25/05/15	25/05/15		100%	**Concluído**	A reunião é preparatória para a reunião extra, na ENAP, dia 28/05.	A reunião revelou que vem ocorrendo mudanças de posição entre o que a SUDENE envia para o MI e a SPI, e o que aparece nas discussões das oficinas, sem aviso prévio. A reunião objetivou corrigir essa questão.
25	Videconferência, a pedido da SUDENE, com o MI e demais viculadas.	CGGI/SUDENE (Manoel Barreiros)	26/05/15	26/05/15		26/05/15	26/05/15		100%	**Concluído**	A reunião contou com a participação da SPI/MPO, a SDR/MI,Amarildo Baesso (responsavel pela consolidação das propostas), as vinculadas e a CGPM. A reunião revelou a resistência da SPI/MPO e do Mi em acatar as propostas da SUDENE. A perpceção geral foi de que os resultados trouxeram prejuízos para a atuação da SUDENE no cumprimento de seus objetivos regimentais.	Alinhar posições sobre o prog. 2029, que ainda aparecem discordantes e sem justificativas do MI para as supressões aplicadas sem aviso, preparatória para a reunião do prog. 2029, na ENAP, dia 28/05.
26	Captação quantitativa para o PPA 2016-2019	SPI/MPO	13/07/15	24/07/15		17/07/15	21/07/15		100%	**Concluído**	Datas previstas revistas pela SPI/MPO. As propostas encaminhadas pela SUDENE à CGOR/DGE/MI seguiram as classificações orçamentárias do PPA 2012-2015.	
			Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	100,0%	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

CGDS e CGEP/DPLAN; COC/CGAF/DAD; CGGP e CGTI/DAD; CGDF e CGIF/DFIN, SPI/MPO e CGPM/SECEX/MI e SDR/MI. Ademais do MMA; MDIC; MME; MCT&I; SUDAM e SUDECO.

Observações:

3º Ciclo 2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 62 (ex PO 59)**
Objetivo estrátegico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2014**
Sub-objetivo:	**3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.**		

Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000-Administração da Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	**Subunidade responsável:**	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	**Gestor da subunidade:**	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de melhor compreensão das estratégias e competências técnicas para o trabalho de equipe		
Projeto:	DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS		
Objetivo do projeto:	Desenvolver competências técnicas e comportamentais, propiciando o autoconhecimento, mudança e estratégias, para motivar e compreender as equipes de trabalho.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	250	3.3.90.00		26.600,00	26.600,00

Previsão de Conclusão:	27/11/2015
Data Atualização:	04/09/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	1.600,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	25.000,00
Total Liberado até o exercício	R$	1.600,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Planejamento do Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	17/11/14	28/11/14		17/11/14	28/11/14		100%	Concluído		
2	Contratação de facilitador para realização do Workshop	Marlene Franklin e Marina Braga	01/12/14	05/12/14	1.600,00	01/12/14	05/12/14	1.600,00	100%	Concluído		
3	Workshop - Aprendizado para melhoria de desempenho profissional	Marlene Franklin e Marina Braga	11/12/14	11/12/14		11/12/14	11/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração do Projeto Desenvolvimento de Lideranças	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	03/02/15	31/03/15		03/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Marketing do Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	30/04/15		01/04/15	30/04/15		100%	Concluído		
6	Gerenciamento da contratação e seleção dos participantes	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	04/05/15	30/09/15	25.000,00	04/05/15			50%	Em andamento	Data repactuada	
7	Realização do curso de orientação para uso da ferramenta coaching	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	05/10/15	07/10/15					0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de mentores	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	19/10/15	21/10/15					0%	A Iniciar		
9	Elaboração de Projetos Desenvolvimento de coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	22/10/15	23/10/15					0%	A Iniciar		
10	Acompanhamento do desenvolvimento dos mentores e coachee's	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	26/10/15	20/11/15					0%	A Iniciar		
11	Avaliação e encerramento do projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga	23/11/15	27/11/15					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		26.600,00	**Valor realizado:**		1.600,00	50%	Em Andamento	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:
3º ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 63 (ex PO 60)**
Objetivo estrátegico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2015**
Sub-objetivo:	**3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.**		

Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e getão de seus programas frinalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	**Subunidade responsável:**	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	**Gestor da subunidade:**	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de implementar uma gestão com foco nas competências organizacionais e individuais.		
Projeto:	Gestão por Competências		
Objetivo do projeto:	Implementar na Sudene o Projeto de Gestão por Competências como instrumento de gestão capaz de gerar melhorias de resultados dos servidores e da Instituição.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	250	3.3.90.00		25.000,00	25.000,00

Previsão de Conclusão:	30/10/2015
Data Atualização:	04/09/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin e Marina Braga

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	25.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	25.000,00
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto de Gestão por Competências	Marlene Franklin e Marina Braga	24/11/14	12/12/14		24/11/14	12/12/14		100%	Concluído		
2	Reunião com participantes do Grupo de Trabalho	Marlene Franklin e Marina Braga	19/01/15	30/01/15		19/01/15	30/01/15		100%	Concluído		
3	Formação de Grupo de Estudo	Marlene Franklin e Marina Braga	02/02/15	31/03/15		02/02/15	31/03/15		100%	Concluído		
4	Contratação de facilitadores para realização de Oficinas	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/07/15	25.000,00	01/04/15	20/08/15		100%	Concluído	Quantitativo insuficiente de propostas para análise - Repactuação de datas	Encaminhamento de solicitação de propostas
5	Realização de Oficinas para gestores	Marlene Franklin e Marina Braga	08/10/15	09/10/15					0%	A Iniciar	Repactuação de datas	
6	Realização de Oficinas para técnicos	Marlene Franklin e Marina Braga	13/10/15	14/10/15					0%	A Iniciar		
7	Elaboração de perfis de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	19/10/15	30/10/15					0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	19/10/15	30/10/15					0%	A Iniciar		
9	Elaboração de parâmetros de avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	19/10/15	30/10/15					0%	A Iniciar		
10	Avaliação de competências	Marlene Franklin, Marina Braga e Unidades Administrativas	03/11/15	30/11/15					0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		25.000,00	**Valor realizado:**		0,00	40%	Em Andamento	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:
O planejamento dos itens 7, 8 e 9 serão concomitantes.
3º Ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 64 (ex PO 61)**
Objetivo estrátegico:	**3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho**	**Ano**	**2015**
Sub-objetivo:	**VALORIZAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES**		

Programa:	2111- Progrrama de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	IMPLEMENTAR GESTÃO EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA
Ação:	2000 - Administração da Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e Gestão de seus programas finalísticos		
Unidade responsável:	COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS	**Subunidade responsável:**	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO,ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR E LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Responsável :	ÂNGELA MARIA LIMA GOUVEIA	**Gestor da subunidade:**	MARLENE FRANKLIN CORDEIRO
Problema (causa):	Necessidade de preparar os servidores para as mudanças decorrentes da interrupção da vida laboral		
Projeto:	Investindo nos Sonhos		
Objetivo do projeto:	Sensibilizar os participantes para a importância do planejamento para a aposentadoria, como um dos elementos promotores do bem estar e da qualidade de vida após a interrupção da vida laborativa.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	3.3.90.00		10.000,00	10.000,00

Previsão de Conclusão:	01/12/2015
Data Atualização:	04/09/2015

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Ângela Lima, Marlene Franklin, Marina Braga e Ester Selva.

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	10.000,00
Valor Empenhado no Exercício	R$	5.000,00
Valor liberado no Exercício	R$	5.000,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	5.000,00
Total Liberado até o exercício	R$	5.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do Projeto experimental Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	06/10/14	10/10/14		06/10/14	10/10/14		100%	Concluído		
2	Realização da Intervenção Breve Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Ester Selva	17/10/14	17/10/14		17/10/14	17/10/14		100%	Concluído		
3	Elaboração do Projeto de Intervenção Continuada Investindo nos Sonhos	Ângela Lima e Marlene Franklin	17/11/14	05/12/14		19/11/14	05/12/14		100%	Concluído		
4	Elaboração das fases do Projeto : 1) Estudo da demanda ; 2) Identificação dos Grupos Psicossociais; 3) Seleção dos temas a serem trabalhados; 4) Identificação e convite de facilitadores; 5) Elaboração do cronograma.	Ângela Lima e Marlene Franklin	20/01/15	31/03/15		20/01/15	31/03/15		100%	Concluído		
5	Levantamento e estudo da demanda	Marlene Franklin e Marina Braga	01/04/15	10/04/15		01/04/15	10/04/15		100%	Concluído		
6	Divulgação do Projeto e formação do grupo de orientadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	13/04/15	26/06/15		13/04/15	21/05/15		100%	Concluído		
7	Palestra de sensibilização para implantação do Projeto	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	01/06/15	5.000,00	01/06/15	01/06/15	5.000,00	100%	Concluído		
8	Formação dos grupos de participantes	Marlene Franklin e Marina Braga	08/06/15	12/06/15		08/06/15	26/06/15		100%	Concluído		
9	Contratação de facilitadores e realização dos Encontros - primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	16/06/15	18/08/15	2.500,00	16/06/15	18/05/15		100%	Concluído	Os recursos não foram utilizados. Prevê-se utilizar na segunda turma.	

10	Encontros de formação de facilitadores	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	21/05/15	03/07/15		21/05/15	03/07/15		100%	**Concluído**		
11	Realização dos Encontros com os participantes da primeira turma	Marlene Franklin, Marina Braga, Ester Selva e Ângela Lima	01/06/15	15/09/15		01/06/15	15/09/15		100%	**Concluído**		
12	Planejamento e Homenagem aos servidores aposentados	Participantes do Projeto e facilitadores	15/09/15	22/09/15		15/09/15			50%	**Em Andamento**		
13	Planejamento para realização dos encontros da segunda turma	CGGP e facilidadores	15/09/15	02/10/15	2.500,00	15/09/15			10%	**Em Andamento**		
14	Realização dos Encontros - segunda turma	CGGP e facilidadores	05/10/15	24/11/15					0%	**A Iniciar**		
15	Encerramento do Projeto	CGGP, facilidadores e participantes do projeto	24/11/15	24/11/15					0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		10.000,00	**Valor realizado:**		5.000,00	77%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal Rural de Pernambuco

Observações:

3º Ciclo 2015

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 65 (ex PO 62)**
Objetivo estrátegico:	**3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho**	**Ano:**	**2012**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	**Gestor da subunidade:**	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Risco de desmoronamento do Anexo Nilo Coelho		
Projeto:	Recuperação do Anexo Nilo Coelho		
Objetivo do projeto:	Escorar o prédio do anexo sinistrado por um incêndio de grande proporção, fazer um diagnóstico da situação estrutural para depois recuperar as instalações que foram destruídas pelo incêndio.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	44	90	7.553.642,89	7.553.642,89

Previsão de Conclusão:	13/09/2016
Data Atualização:	10/09/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	**José Wilson Galdino**

ADI 14-15

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	2.630.114,65
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R$	555.861,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	241.454,70
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar no Exercício	R$	241.454,70
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total liberado até o exercício	R$	2.630.114,65

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Reforma da Edificação (I Etapa) (1º e 2º Aditivos)	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	23/04/12	11/03/13	1.128.948,82	23/04/12	03/04/13	908.911,38	100%	Concluído	Ordem de Execução dos Serviços emitida em 23/04/12. Valor contrato para o escoramento da estrutura, de R$ 658.668,51.	
1.1	Escoramento da estrutura	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda	23/04/12	11/03/13		02/05/12	-	0,00	100%	Concluído		
1.2	Diagnóstico da situação estrutural	CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda.	02/05/12	23/07/12		02/05/12	09/08/12	0,00	100%	Concluído	A contratada entregou o diagnóstico da situação estutural, acompanhado do Projeto Executivo contendo todos os elementos necessários para a contratação dos serviços de recuperação estrutural da edificação.	Setor de Engenharia irá elaborar o projeto básico.
2	Elaboração do Projeto Básico para a licitação	José Wilson Galdino e José Villeneuve	24/07/12	06/09/12		10/08/12	19/09/12	0,00	100%	Concluído	O Projeto Básico para a contratação da execução da obra foi elaborado a partir do Projeto Executivo entregue pela CONSTREL, que apresentou um valor estimado em R$ 1.259.170,95 para a obra, com prazo de conclusão dos serviços em 180 dias.	Entregar o projeto básico à CPL para abertura de licitação.
3	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	10/09/12	21/02/13		20/09/12	21/02/13	0,00	100%	Concluído	Após decisão da fase de recursos e de contrarrazões, a licitação foi homologada pelo Sr. Superintendente, tendo sido adjudicado o objeto da licitação para a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., estando a Administração nas providências quanto à celebração do Contrato e à emissão da Ordem de Execução dos Serviços.	Celebrar contrato e emitir ordem de execução dos serviços.
4	Execução da Obra (II etapa)	Jatobeton Engenharia	11/03/13	11/02/14	1.679.694,07	11/03/13	11/02/14	1.581.203,27	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo aditado, com preço global realizado de R$ 1.581.203,27, restando saldo do empenho a cancelar em R$ 98.490,80.	
5	Fiscalização da Obra	José Wilson Galdino e CONSTREL Engenharia	11/03/13	11/02/14	140.000,00	11/03/13	11/02/14	140.000,00	100%	Concluído	Com a conclusão da obra, foi encerrado também o contrato com a empresa de consultoria à Fiscalização, CONSTREL - Construtora Eldorado Ltda. Foram liberados R$ 105 mil em 2013 e R$ 35 mil já este ano.	
6	Licitação dos projetos de arquitetura e complementares	Eneida (SUDENE/CPL)	16/12/13	24/04/15	0,00	20/01/14	13/04/15	0,00	100%	Concluído	O objeto da licitação foi adjudicado em 13/04/2015, em favor da empresa Compor Engenharia e Automação Ltda., pelo valor global de R$ 241.454,70.	

7	Contratação das poltronas para os auditórios	Mariza Fontaine	02/12/13	05/12/14	960.000,00	06/02/14	05/12/14		100%	**Concluído**		A Nota de Empenho, no valor global de R$ 555.861,00, foi realizada em 05/12/2014, aguardando autorização superior para fabricação das poltronas.
8	Elaboração dos projetos de arquitetura, ambientação e complementares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/10/15	273.000,00	11/06/15			52%	**Em Andamento**	Foi celebrado em 07/05/2015 o Contrato Sudene nº 02/2015 e emitida a Ordem de Execução dos Serviços em 11/06/2015, com prazo de entrega dos projetos em 180 dias.	Foi emitida a Portaria nº 48, de 20/05/2015, nomeando a Comissão de Fiscalização dos serviços, composta pela arquiteta Paula Aragão de Souza e pelos engenheiros José Wilson Galdino, Thiago Teles da Silva e Diego Véras Emerenciano.
8.1	Levantamentos e estudos preliminares	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/04/15	27/05/15		11/06/15			95%	**Em Andamento**	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R$ 25.356,00.	Os serviços foram iniciados em 11/06/2015, tendo a Contratada apresentado os resultados desta fase para análise da Fiscalização.
8.2	Projeto Básico da reforma geral	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/05/15	27/07/15		27/07/15			55%	**Em Andamento**	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R$ 60.220,50.	A partir dos elementos levantados na etapa anterior, a Contratada vem elaborando o Projeto Básico.
8.3	Projeto Executivo	Compor Engenharia e Automação Ltda.	27/06/15	27/10/15		17/08/15			5%	**Em Andamento**	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R$ 87.478,20.	A partir dos elementos já acordados com a Fiscalização nas etapas anteriores, a Contratada vem elaborando o Projeto Executivo.
9	Licitação da obra de ambientação final	SUDENE/CPL	12/12/15	12/03/16	0,00				0%	**A Iniciar**		
10	Execução da obra de ambientação final	Empresa a contratar	13/03/16	13/09/16	3.300.000,00				0%	**A Iniciar**		
11	Fiscalização da obra de ambientação final	Comissão a definir, com a assessoria da Compor Engenharia e Automação Ltda.	13/03/16	13/09/16	72.000,00				0%	**A Iniciar**	Essa etapa dos serviços foi contratada pelo valor de R$ 68.400,00.	
12	Entrega da obra			13/09/16					0%	**A Iniciar**		
			Valor Previsto:		7.553.642,89	**Valor realizado:**		2.630.114,65	60%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 66 (ex PO 63)**
Objetivo estrátegico:	**3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho**	**Ano:**	**2009**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	**Gestor da subunidade:**	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Desgaste pela ação do tempo nos blocos de fundação do edifício.		
Projeto:	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Recuperar as fundações do edifício SUDENE, bem como, recuperar as salas danificadas do subsolo, adequando-as ao novo layout.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	100/250	44	90	9.673.041,23	9.673.041,23

Previsão de Conclusão:	20/08/2015
Data Atualização:	10/09/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino / José Villeneuve Peixôto Bem

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	5.191.716,42
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R$	3.478.828,44
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exerc. (LOA 2015+RAP 2014)	R$	1.266.897,20
Saldo a liberar no Exercício	R$	2.211.931,24
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total liberado até o exercício	R$	6.458.613,62

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Básico	Roberto Pina	04/09/09	05/10/09	0	04/09/09	05/10/09	0,00	100%	Concluído		
2	Licitação	Eneida (SUDENE/CPL)	07/10/09	08/06/10	0,00	07/10/09	08/06/10	0,00	100%	Concluído		
3	Execução da Obra Etapa I.	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 53/2011	06/12/10	06/04/12	3.927.235,55	06/12/10	30/03/12	2.924.739,18	100%	Concluído	A obra foi concluída dentro do prazo contratual, porém foram identificadas incorreções em alguns itens de serviços.	Foi emitido o Termo de Recebimento Provisório da obra em 02/04/2012, anotando-se as pendências em documento anexo, e concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a contratada corrigir essas pendências, de acordo com a previsão legal.
4	Projeto Básico para a complementação das Obras	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	16/01/12	30/01/12	0,00	16/01/12	30/01/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico de complementação elaborado dentro do prazo estimado.	Encaminhar projeto básico para a CPL.
5	Licitação para complementação das obras	Eneida (SUDENE/CPL)	02/02/12	07/05/12	0,00	02/02/12	14/05/12	0,00	100%	Concluído	Elaboração do edital conforme projeto básico entregue pela área de engenharia.	Lançar edital de licitação.
6	Alterações no projeto básico	José Wilson Galdino José Villeneuve Peixoto Bem	15/06/12	29/06/12	0,00	15/06/12	05/07/12	0,00	100%	Concluído	Projeto básico alterado decorrente de revisão da planilha orçamentária.	Encamihar alterações do projeto básico para CPL para andamento do processo licitatório.
7	Continuidade do processo licitatório	Eneida (SUDENE/CPL)	29/06/12	28/09/12	0,00	06/07/12	09/10/12	0,00	100%	Concluído	Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jatobeton Engenharia Ltda., com valor global de R$ 4.225.259,21.	Assinar Contrato. Ordem de Serviço foi emitida em 22.10.2012.
8	Execução complementar da Obra - Etapa II	Jatobeton Engenharia	22/10/12	20/08/15	5.745.805,68	22/10/12		3.533.874,44	88%	Em Andamento	Foi celebrado o 5º Termo Aditivo, acrescentando o prazo de 30 dias ao contrato. Faz-se necessária a celebração do 6º Termo Aditivo, de prazo e valor, promovendo ajustes para a continuidade dos serviços.	A Comissão de Fiscalização e a Contratada estão concluindo os entendimentos quanto aos quantitativos e custos unitários que comporão o 6º Termo Aditivo.
9	Fiscalização da Obra	Comissão de Fiscalização, Portaria nº 75/2012, modificada pela Portaria nº 153/2014	22/10/12	20/08/15	0,00	22/10/12			88%	Em Andamento	A Comissão de Fiscalização foi modificada através da Portaria nº 153/2014, sendo composta pelos engenheiros civis Wilson Galdino e José Villeneuve e pelos engenheiros eletricistas Diego Véras e Thiago Teles e pela arquiteta Rebeca Ramalho.	O engenheiro José Villeneuve encontra-se afastado da Comissão, a pedido, desde 09/02/2015, para coordenar o projeto Água para Todos, e a arquiteta Rebeca Ramalho solicitou demissão da Sudene.
10	Entrega da obra	Jatobeton Engenharia		20/08/15	0,00				0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		9.673.041,23	**Valor realizado:**		6.458.613,62	**90%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:
3º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 67 (ex PO 64)**
Objetivo estrátegico:	**3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho**	**Ano:**	**2009**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Administração e Finanças
Diretor:	Marcos Robalinho	**Gestor da subunidade:**	Brivaldo José de Vasconcelos Soares
Problema (causa):	Exaustão e obsoletismo das máquinas que integram as subestações instaladas, comprometendo a segurança e a qualidade da energia fornecida.		
Projeto:	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.		
Objetivo do projeto:	Substituição completa de máquinas e equipamentos que integram o sistema de suprimento de energia do Edifício SUDENE, que serve aos condôminos nele instalados.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	250	33	90	4.663.522,50	4.663.522,50

Previsão de Conclusão:	10/12/2015
Data Atualização:	10/09/2015

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Wilson Galdino, Diego Véras Emerenciano e Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	100.000,00
A realizar no exercício 2015 (RAP 2014)	R$	48.000,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar no Exercício	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total liberado até o exercício	R$	100.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas/Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Projeto Executivo	Policonsult	30/06/09	22/09/10	70.000,00	30/06/09	22/09/10	70.000,00	100%	Concluído	A empresa contratada entregou o projeto no prazo estabelecido; porém limitações orçamentárias e Decreto do MPOG suspenderam obras no Governo Federal.	A SUDENE ficou aguardando autorização ministerial para prosseguir com esse projeto.
2	Termo de Referência para contratação de Consultoria	Villeneuve / Wilson (SUDENE/CGAF)	30/07/12	31/08/12	0,00	30/07/12	31/08/12	0,00	100%	Concluído	A equipe de engenharia concluiu o termo de referência para contratar uma consultoria.	Entregar termo de referência para a CPL.
3	Tomada de Preços para contratação da Consultoria	Eneida (SUDENE/CPL)	01/09/12	18/05/13	0,00	24/09/12	07/10/13	0,00	100%	Concluído	A CPL concluiu a licitação, tendo sido contratada a empresa Elétrica Engenharia, pelo valor global de R$ 78.000,00, sendo R$ 30.000,00 para o item 1 (projetos) e R$ 48.000,00 para o item 2 (fiscalização).	
4	Revisão do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	24/10/13	28/01/14	30.000,00	24/10/13	28/02/14	30.000,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria concluiu a revisão do projeto executivo elaborado pela Policonsult e apresentou o Projeto Básico para a licitação da obra.	A Área de Engenharia, em 28/02/2014, encaminhou o Projeto Básico para a contratação da modernização das subestações, acompanhado da planilha orçamentária, orçamento básico e cronograma físico-financeiro.
5	Licitação da Obra	Eneida (SUDENE/CPL)	28/01/14	19/09/14	0,00	06/03/14	14/08/14	0,00	100%	Concluído	A CPL suspendeu a abertura da licitação, outrora prevista para 14/08/2014, em virtude de terem sido impetradas várias impugnações ao Edital.	A Área de Engenharia encaminhou essas impugnações para a empresa de consultoria, estando no aguardo das alterações que serão realizadas no Projeto Básico.
6	Atualização do Projeto Executivo e Elaboração do Projeto Básico	Elétrica Engenharia	18/08/14	31/03/15	0,00	18/08/14	20/03/15	0,00	100%	Concluído	A empresa de consultoria, Elétrica Engenharia, entregou a versão final do Projeto Básico, apresentando Orçamento Básico no valor global de R$ 4.503.522,50.	A Área de Engenharia encaminhou Memorando à CGAF, em 20/03/2015, solicitando a contratação dos serviços de modernização das subestações elétricas.
7	Relançamento da Licitação da Obra	SUDENE/CPL	06/04/15	06/08/15	0,00	23/03/15			0%	Paralisado	A CPL devolveu o processo para a Área de Engenharia, em 15/04/2015, informando que seja aguardada a decisão final sobre que órgão condominial irá realizar esta licitação.	Ficou decidido que a contratação será realizada pela Sudene, tendo sido encaminhado o Ofício GAB/SUDENE nº 371/2015, em 17/07/15, solicitando autorização ao MI.
8	Execução da Obra	A definir	10/08/15	10/12/15	4.503.522,50				0%	A Iniciar		
9	Fiscalização da Obra	Thiago Teles, Diego Véras e empresa de consultoria	10/08/15	10/12/15	60.000,00				0%	A Iniciar		
10	Entrega da obra			10/12/15					0%	A Iniciar		
				Valor Previsto:	4.663.522,50		**Valor realizado:**	100.000,00	**26,09%**	Paralisado	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
3º ciclo 2015

Fonte: CGAF/CSG/Área de Engenharia

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 68 (ex PO 65)**
Objetivo estrátegico:	**3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Gabinete	**Subunidade responsável:**	Chefia do Gabinete
Diretor:		**Gestor da subunidade:**	
Problema (causa):	Deterioração do acervo (memória) de informações impressas referentes à trajetória do Conselho Deliberativo da antiga SUDENE período 1971 - 2000.		
Projeto:	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL entre 1959/1970; digitalização do acervo de áudio; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	**484.650,00**

Previsão de Conclusão:	**30/06/2015**
Data Atualização:	**28/08/2015**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	484.650,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	484.650,00

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, assinatura e publicação do Termo de Cooperaçãopara Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/03/2014	07/04/2014		15/03/2014	07/04/2014		100%	Concluído		
2	Descentralização em parcela única	Coordenação de Orçamento, Contabililidade e Finanças	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	11/04/2014	11/04/2014	484.650,00	100%	Concluído		
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	07/04/2014	15/04/2014	-	07/04/2014	15/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	17/04/2014	22/04/2014	-	17/04/2014	22/04/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
5	Seleção de bolsistas UFPE - História	Angela Nascimento	30/05/2014	30/05/2014		30/05/2014	30/05/2014		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R$ 46.800,00)	Marcos Costa Lima	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
7	Tratamento do acervo textual -1971/2000 (R$ 82.100,00) (642 docs./10.413 umagens)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/04/2014	31/12/2014		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
8	Tratamento do acervo iconográfico (R$ 10.400,00)	Débora Lopes do Rêgo e Lucas Souto Maior	02/06/2014	30/11/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução inciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
9	Pesquisa em jornais (R$ 20.800,00)	Bhreno Henrique, Felipe Ramos, Pedro Cardos e Pedro Maranhão	15/04/2014	30/11/214		15/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Os alunos bolsistas ficaram suspensos do dia 09/05 até 02/06 devido ao atraso do pagamento da bolsa pela PROEXT/UFPE.	
10	Produção de Artigos (R$ 12.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	02/06/2014	31/12/2014		02/06/2014	31/01/2015		100%	Concluído	Execução inciada porém o percentual físico ainda é inexpressivo.	
11	Desenvolvimento e codificação do Portal; Documentação do Sistema; Serviço de Sttreaming; Capacitação (R$ 15.000,00)	M2S	04/04/2014	31/12/2014		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
12	Gestão Administrativa do PROCONDEL (R$ 9.000,00)	Rayanny Oliveira	04/04/2014	31/12/20147		04/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
13	Produção de material de comunicação visual; gestão do site; diagramação material gráfico. (R$ 9.000,00)	Alaíde Vilanova	04/04/2014	31/12/2014		05/04/2014	31/01/2015		100%	Concluído		
14	Concepção, organização e realização do Seminário Um prédio fantástico.	Angela Nascimento/Luiz Amorim	17/12/2013	16/04/2014	-	17/12/2013	16/04/2014		100%	Concluído	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	

15	Revisão e normatização de material textual (R$ 3.100,00)	Simone Rosa e Cláudia Freire	04/04/2014	30/06/2014		04/04/2014	30/06/2014		100%	**Concluído**		
16	Organização e realização do Seminário Internacional Desenvolvimento e Disparidades Regionais em Países Emergentes. (R$ 100.000,00)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	19/12/2013	07/05/2014		19/12/2013	07/05/2014		100%	**Concluído**	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros9organização); Realização igual a R$ 100.00,00	
17	Concepção, organização e realização do Seminário 100 Anos de Nascimento de Ignácio Rangel e Rômulo Almeida.	Angela Nascimento/Sônia Cruz/Anita Rozemblit	09/12/2013	15/05/2014		09/12/2013	15/05/2014		100%	**Concluído**	Atividades iniciadas antes da assinatura do Termo de Cooperação, que não envolveram recursos financeiros do PROCONDEL	
18	Digitalização Acervo Sonoro 1975-1983, 12.000 minutos (R$ 2.400,00)	Alexandre Malta	02/06/2014	31/08/2014		02/06/2014	28/08/2014		100%	**Concluído**		
19	Consultoria para o acervo sonoro (R$ 5.600,00)	Severino Silva	02/06/2014	30/11/2014		02/12/2014	31/01/2015		100%	**Concluído**		
20	Serviço de tradução (R$ 40.000,00)	Pessoa Jurídica	02/06/2014	30/11/2014		-	-		-	**Cancelado**	Atividade não executada.	
21	Serviço de transcrição (R$ 20.000,00)	Arabera Traduçõe Técnicas	02/06/2014	30/11/2014		10/10/2014	30/11/2014		100%	**Concluído**		
22	Aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação de Execução Descentralizada	Diretoria Colegiada	11/08/2014	15/08/2014		11/08/2014	15/08/2014		100%	**Concluído**		
23	Finaização (Relatório)	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	28/02/2015	30/06/2015					0%	**Atrasado**	Aguardando o relatório da UFPE.	
			Valor Previsto:		484.650,00	**Valor realizado:**		484.650,00	95%	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais: Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

3º ciclo 2015

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 69 (ex PO 66)**
Objetivo estrátegico:	**3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.**	**Ano:**	**2015**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Gabinete	**Subunidade responsável:**	Chefia do Gabinete
Diretor:		**Gestor da subunidade:**	
Problema (causa):	Preservação e migração de suporte do acervo produzido pelo Conselho Deliberativo da Sudene (1960 - 2000)		
Projeto:	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000		
Objetivo do projeto:	Digitalização e disponibilização do acervo textual produzido pelo CONDEL 1960-2000; digitalização do acervo de áudio (150 fitas) e vídeo (200 fitas) ; coleta de depoimentos; transcrição; produção de site; análise crítica de acervo selecionado e produção de artigos científicos.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	100	33	90	**565.700,00**

Previsão de Conclusão:	**31/07/2016**
Data Atualização:	**28/08/2015**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	565.700,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	565.700,00

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração, aprovação da Diretoria Colegiada, assinatura e publicação do Termo de Cooperaçãopara Execução descentralizada de Crédito	Angela Nascimento e Marcos Costa Lima	15/02/2015	30/04/2015		15/02/2015	08/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
2	Descentralização em parcela única e vinculação do Projeto ao Gabinete	Coordenação de Orçamento, Contabililidade e Finanças	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	11/05/2015	14/05/2015	565.700,00	100%	Concluído	Portaria nº 046 de 13/05/2015, pela o qual o Chefe de Gabinete passa a ser o coordenador institucional do Projeto	
3	Seleção de bolsistas UFPE- Ciência da Informação	Angela Nascimento/ Vildeane Borba/Májory Miranda	20/04/2015	30/04/2015	-	20/04/2015	30/04/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
4	Seleção de bolsistas UFPE - Ciência Política	Angela Nascimento/ Marcos Costa Lima	25/05/2015	29/05/2015	-	25/05/2015	29/05/2015		100%	Concluído	Atividades que não envolveram recursos financeiros	
6	Coordenação Científica (R$ 67.600,00)	Marcos Costa Lima	30/04/2015	30/05/2016		30/04/2015			30%	Em andamento		
7	Tratamento do acervo textual -1960/2000 (R$ 116.400,00)	Evaldo Souza/Májory Miranda/Vildeane Borba e mais 08 bolsistas	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			40%	Em andamento		
8	Tratamento do acervo audiovisual -125 fitas cassete e 200 fitas de vídeo (R$ 7.800,00)	Bolsistas do Departamento de Comunicação Social	01/07/2015	31/12/2015		01/07/2015			20%	Em andamento		
9	Pesquisa em jornais (R$ 31.200,00)	Felipe Ramos, Pedro Maranhão, Philipe Pedro, Sergio Cavalcanti	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			30%	Em andamento		
10	Produção de Artigos (R$ 24.000,00)	Deijenane Gomes dos Santos e Jean Henri Benoit de Mulder Fuentes	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			20%	Em andamento		
11	Pesquisa sobre alterações regimentais do Condel (1959/2000) e informações para o site (R$ 7.800,00)	Lucas Souto Maior Gonçalves de Carvalho	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			25%	Em andamento		
12	Coleta de depoimento ne elaboração de documentário (R$ 22.800,00)	Fernando Weller, 01 pesquisador e 02 bolsistas	01/10/2015	31/03/2016					0%	A Iniciar		

13	Alimentação e monitoramento do site (R$ 7.800,00)	Fabrício Silva	15/05/2015	31/05/2016		15/05/2015			30%	**Em andamento**		
14	Produção de Artigos (R$ 67.500,00)	Pesquisadores e professores convidados	01/06/2015	30/09/2015		01/06/2015			5%	**Em andamento**		
15	Revisão, normatização e diagramação (R$ 6.000,00)	Não selecionado	01/10/2015	31/12/2015					0%	**A Iniciar**		
16	Transcrição de depoimentos (R$ 10.000,00)	Não selecionado	01/08/2015	29/02/2016					0%	**A Iniciar**		
17	Publicação do livro (R$ 20.000,00)	Não selecionado	02/01/2015	30/04/2016					0%	**A Iniciar**		
18	Preservação analógica do acervo textual (R$ 20.000,00)	Não selecionado	01/07/2015	29/02/2016					0%	**A Iniciar**		
19	Realização de Ciclos de Debates (R$ 10.000,00)	Em elaboração	01/06/2015	30/04/2016		01/06/2015			10%	**Em Andamento**	Definição de tema, convites expedidos, material de divulgação elaborados.	
20	Assistência administrativa (R$ 7.800,00)	Não selecionado	01/07/2015	31/07/2016					0%	**A Iniciar**		
21	Elaboração de base de dados para a pesquisa em jornais e fotos e atualização do site (R$ 16.000,00)	M2S	01/07/2015	31/05/2016					30%	**Em andamento**		
22	Assessoria de comunicação (R$ 45.000,00)	Igor Jatobá	01/05/2015	31/07/2016		01/05/2015			20%	**Em Andamento**		
			Valor Previsto:		**565.700,00**	**Valor realizado:**		**565.700,00**	**31%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Universidade Federal de Pernambuco/ Pró-Reitoria de Extensão/Departamentos de Ciência Política e Ciência da Informação/Laboratório de Tecnologia do Conhecimento

Observações:

3º ciclo 2015

Responsável pelas informações: Ângela Nascimento (UFPE)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 70 (ex PO 67)**
Objetivo estrátegico:	**3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.**	**Ano:**	**2014**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	**Gestor da subunidade:**	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Ampliar a oferta de serviços as unidades administrativas e melhorar os processos de trabalho da área de TI.		
Projeto:	Modernização da Infraestrutura da Rede Local		
Objetivo do projeto:	Melhoria da Infraestrutura de TI.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor Total do Projeto**
	Rec. Próprios	44	90	1.899.749,20

Previsão de Conclusão:	**30/11/2015**
Data Atualização:	**03/09/2015**

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.

ADI 14-15

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	1.899.749,20
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	1.899.749,20
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	1.899.749,20
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Elaboração do TR para contratação do serviço.	Eduardo Ferreira de Souza e Márcio Ricardo Alves Gadelha de Araújo.	01/10/14	28/11/14	-	22/09/14	13/11/14		100%	Concluído		
2	Elaboração de licitação.	Setor de Licitação	01/12/14	29/08/14	-	14/11/14	09/02/15		100%	Concluído		
3	Contratação da 1a etapa	Setor de Licitação	11/06/15	30/06/15	-	11/06/15	18/06/15		100%	Concluído		
4	Contratação da 2a etapa	Setor de Licitação	01/07/15	31/07/15	-	21/07/15	03/09/15		100%	Concluído		
5	Realização do serviço da 1a. etapa.	Fornecedor	01/08/15	30/09/15	1.065.604,20	03/09/15	-		2%	Em Andamento		
6	Realização do serviço da 2a. etapa.	Fornecedor	01/09/15	30/112015	834.145,00	03/09/15	-		2%	Em Andamento		
			Valor Previsto:		1.899.749,20	**Valor realizado:**		0,00	80%	Em Andamento	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

3º Ciclo 2015

Considerando as restrições orçamentárias, a etapa de contratação foi dividida em duas, assim como a etapa de realização.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2015

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 71 (ex PO 68)**
Objetivo estrátegico:	**3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.**	**Ano:**	**2015**

Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MI):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estrátegico (MI):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
Diretor:	Marcos Robalinho	**Gestor da subunidade:**	Josué Ribeiro
Problema (causa):	Necessidade de sistema informatizado para gestão do Fundo de Desenvolvimento.		
Projeto:	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO		
Objetivo do projeto:	Implantar o Sistema de Gestão de Fundos de Desenvolvimento (FDNE/FDA/FDCO)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto
	a definir	44	90	613.862,88

Previsão de Conclusão:	**30/12/2015**
Data Atualização:	**08/09/2015**

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Lucas Nolêto de Arruda e Sara Carvalho da Rocha Brito.

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	272.909,00
A realizar no exercício	R$	340.953,88
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	35.043,28
Saldo a liberar	R$	305.910,60
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	307.952,28

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Consulta Prévia.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	04/02/13	21/06/13	-	04/02/13	28/06/13	-	100%	Concluído		
2	Desenvolvimento do módulo de Cons. Prévia.	Empresa Contratada.	01/07/13	31/07/14	-	05/07/12	15/08/14	-	100%	Concluído		
3	Implantação do módulo de Consulta Prévia.	Área de TI, Empresa Contratada,	01/08/14	30/09/14	272.909,00	16/08/14	31/10/14	272.909,00	100%	Concluído	Recursos da SUDENE + SUDAM	
4	Levantamento das necessidades e definição do módulo de Projeto.	Antonio Roberto Cavalcante, Antonio Edgar Cunha, Josué da Silva Ribeiro, Empresa Contratada.	01/12/14	31/03/15	-	01/12/14	30/04/15	-	100%	Concluído		
5	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - especificação de requisitos, arquitetura, processos,modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/04/15	30/09/15	340.953,88	06/04/15	08/09/15	35.043,28	100%	Concluído	Recursos da SUDENE	
6	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador - codificação e testes	Empresa Contratada.	01/10/15	30/10/15	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
7	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - especificação de requisitos, arquitetura, processos,modelo de dados e diagrama de classes.	Empresa Contratada.	01/11/15	30/12/15	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
8	Desenvolvimento do módulo de Projeto - Acesso SUDENE - codificação e testes	Empresa Contratada.	04/01/16	31/03/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
9	Implantação do módulo de Projeto - Acesso do Agente Operador e da SUDENE	Área de TI, Empresa Contratada,	01/04/16	30/06/16	-	-	-	-	0%	A Iniciar		
			Valor Previsto:		613.862,88	**Valor realizado:**		307.952,28	80%	Em Andamento	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Ministério da Integração Nacional e SUDAM

Observações:

3º Ciclo 2015

Os recursos previstos são referentes ao desenvolvimento e implantação do sistema. Os recursos para manutenção correrão à conta de orçamentos ainda a serem definidos, após a implantação.

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO II
Gestão Orçamentária e Financeira

SUDENE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Tabela 1 - INDICADORES DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO FÍSICA - (exercício de 2015)

Função	Subfunção	Programa	Ação	Tipo de Ação	Prioridade	LOA + CRÉDITOS	Orçamento autorizado (b)	Orçamento Executado (c)	Percentual de Liberação do Orçamento Aprovado (b/a) (%)	Percentual de Exec. do Orçamento Autorizado (c/b) (%)	Unidade de Medida	Meta Prevista (d)	Meta Realizada (e)	Perc. de Exec. da Meta Física (e/d) (%)	Meta a ser realizada em 2015	Comentários dos ajustes
04	122	2111	2000/PO0002	A	1	26.198.061,00	15.678.836,00	7.556.620,43	59,85	48,20	-	-	-	-	-	
04	122	2111	2000/PO0001	A	1	600.000,00	400.000,00	169.930,08	66,67	42,48	Servidor capacitado	199		0,00		
04	301	2111	2004/PO0001	A	1	576.000,00	576.000,00	206.753,76	100,00	35,89	Pessoa beneficiada	228		0,00		
04	301	2111	2004/PO0002	A	1	56.100,00	56.100,00	0,00	100,00	0,00	Servidor beneficiado	255		0,00		
04	331	2111	2010/PO0001	A	1	31.680,00	31.680,00	6.398,70	100,00	20,20	Criança atendida	50		0,00		
04	331	2111	2011/PO0001	A	1	240.000,00	240.000,00	82.285,07	100,00	34,29	Servidor beneficiado	51		0,00		
04	331	2111	2012/PO0001	A	1	1.075.416,00	1.075.416,00	686.726,83	100,00	63,86	Servidor beneficiado	184		0,00		
04	331	2111	00M1/PO0001	A	1	21.204,00	21.204,00	591,32	100,00	2,79	Servidor beneficiado					
04	122	2111	09HB	A	1	3.848.455,00	3.848.455,00	2.258.702,15	100,00	58,69	-	-	-	-	-	
04	122	2111	20TP	A	1	26.850.455,00	26.850.455,00	17.173.687,59	100,00	63,96	-	-	-	-	-	
2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI					**Total**	**59.497.371,00**	**48.778.146,00**	**28.141.695,93**	**81,98**	57,69	-	-	-	-	-	
09	272	0089	0181	OP	1	2.258.123,00	2.258.123,00	1.428.253,10	100,00	63,25	-	-	-	-	-	
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União					**Total**	**2.258.123,00**	**2.258.123,00**	**1.428.253,10**	**100,00**	63,25	-	-	-	-	-	
11	128	2029	4640	A	1	1.100.000,00	800.000,00	0,00	72,73	0,00	Pessoa capacitada	260	0	0,00		
19	573	2029	8340	A	1	1.211.233,00	253.000,00	0,00	20,89	0,00	Rede implantada	7		0,00		
04	127	2029	8689	A	1	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	0,00	Zoneamento realizado - km2	25000	0	0,00		
19	691	2029	8902/0020	A	1	1.000.000,00	541.010,00	0,00	54,10	0,00	Iniciativa apoiada	4		0,00		
04	128	2029	8917/0020	A	1	532.475,00	532.475,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa apoiada	240	0	0,00		
04	128	2029	8917/7002	A	1	900.000,00		0,00	0,00	0,00	Iniciativa apoiada					
04	128	2029	8917/7004	A	1	100.000,00		0,00	0,00	0,00	Empreendimento beneficiado	8	0	0,00		
15	244	2029	20N7	A	1	1.000.000,00	600.000,00	0,00	60,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado	3	0	0,00		
15	244	2029	20N9	A	1			0,00	-	-	Organização apoiada	4	0	0,00		
04	127	2029	20WQ/PO003	A	1			0,00	-	-	Avaliação Realizada			-	-	
04	127	2029	20WQ/PO004	A	1	2.964.293,00	1.612.316,00	565.700,00	54,39	35,09	Plano Elaborado			-		
04	127	2029	20WQ/PO005	A	1	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	Iniciativa Implementada	4				
15	244	2029	7K66/71243	A	1	800.000,00		0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71243	A	1	262.300,00		0,00	0,00	0,00	Arranjo produtivo local apoiado					
15	244	2029	7K66/71244	A	1	800.000,00		0,00	0,00	0,00						
2029 - Desenvolvimento Regional Territorial Sustentável e Economia Solidária					**Total**	**11.535.301,00**	**5.203.801,00**	**565.700,00**	**45,11**	**10,87**						
06	182	2040	8172	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entidade apoiada	150		0,00	-	
06	182	2040	8424	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Levantamento realizado	16		0,00	-	
2040 - Gestão de Riscos e Respostas a Desastres					**Total**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
20	606	2052	4518	A	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tecnologia desenvolvida	1	0	0,00	-	

Fonte: SUDENE/Coordenação Geral de Logística, Administração e Finanças/Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças
Posição: em 31/08/2015 - SIAFI
Orçamento executado: total da despesa empenhada.

ANEXO III
Projetos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da SUDENE

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO 2015, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
1	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R$ 694.459,19	R$ 694.459,19	100%
2	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	100%
3	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária.	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R$ 9.452.840,00	R$ 1.352.840,00	14%
4	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 1.183.120,40	R$ 1.183.120,40	100%
5	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 485.874,65	R$ 255.723,17	53%
6	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 207.542,62	R$ 107.354,71	52%
7	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 359.682,64	R$ 221.267,56	62%
8	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R$ 343.585,70	R$ 206.151,42	60%
9	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R$ 771.000,00	R$ 221.000,00	29%
10	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estrategico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municipios do Semiárido paraibano	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 410.203,62	R$ 0,00	0%
11	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 400.000,00	R$ 200.000,00	50%
12	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 150.000,00	50%
13	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 1.069.868,00	R$ 326.618,00	31%
14	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%
15	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 400.000,00	40%
16	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa "Rotas da Integração Nacional" – Oficina Macrorregional Nordeste	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
17	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 857.015,99	R$ 857.015,99	100%
18	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossutentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO 2015, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
19	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
20	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 3.876.491.700,00	R$ 3.065.105.668,00	79%
21	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 1.959.000.000,00	R$ 1.457.925.388,15	74%
22	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 61.728.156,00	R$ 61.728.156,00	100%
23	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 53.376.481,00	R$ 0,00	0%
24	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 59.700.000,00	R$ 59.700.000,00	100%
25	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 54.900.000,00	R$ 53.635.943,87	98%
26	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 64.439.000,00	R$ 63.942.862,59	99%
27	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 59.864.000,00	R$ 59.435.321,28	99%
28	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 55.278.000,00	R$ 54.848.909,88	99%
29	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 55.273.000,00	R$ 54.216.447,60	98%
30	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 64.455.000,00	R$ 57.321.606,84	89%
31	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 33.900.000,00	R$ 33.900.000,00	100%
32	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 50.000.000,00	R$ 46.786.085,39	94%
33	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 49.690.000,03	R$ 49.687.713,17	100%
34	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 46.701.999,96	R$ 34.986.862,96	75%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO 2015, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
35	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 29.040.000,00	R$ 29.040.000,00	100%
36	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 53.959.000,00	R$ 53.959.000,00	100%
37	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 99.970.000,00	R$ 96.407.194,96	96%
38	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 303.000.000,00	R$ 269.869.740,06	89%
39	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 270.582.240,00	R$ 30.000.000,00	11%
40	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 23.855.042,00	R$ 19.539.983,88	82%
41	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 31.256.000,00	R$ 15.447.600,00	49%
42	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 61.867.350,00	R$ 61.867.350,00	100%
43	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 191.238.424,00	R$ 0,00	0%
44	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%
45	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 1.075.935.159,00	R$ 0,00	0%
46	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 415.582.562,52	R$ 70.152.822,60	17%
47	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 - Denvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 123.186.471,03	R$ 0,00	0%
		Total do Objetivo 1.1						**9.294.854.778,35**	**5.858.730.207,67**	**63%**
48	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fórum de Energia	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-
		Total do Objetivo 1.2						**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0%**
49	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas politicas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-
		Total do Objetivo 1.4						**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0%**
50	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 234.105,49	R$ 139.865,15	60%
51	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO 2015, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)
52	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	1ª Oficina de Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
		Total do Objetivo 1.5						**234.105,49**	**139.865,15**	**60%**
		TOTAL DA DIRETRIZ 1						**9.295.088.883,84**	**5.858.870.072,82**	**63%**
53	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R$ 530.482,50	R$ 265.241,25	50%
54	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paríba	2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R$ 835.823,47	R$ 0,00	0%
55	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019	Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
		Total do Objetivo 2.3						**1.366.305,97**	**265.241,25**	**19%**
56	24	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do istema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R$ 228.797,21	R$ 167.999,61	73%
57	25	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Concluído	R$ 350.978,27	R$ 350.978,27	100%
		Total do Objetivo 2.4						**579.775,48**	**518.977,88**	**90%**
		TOTAL DA DIRETRIZ 2						**1.946.081,45**	**784.219,13**	**40%**
58	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
59	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
60	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 26.600,00	R$ 1.600,00	6%
61	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 25.000,00	R$ 0,00	0%
62	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	50%
		Total do Objetivo 3.1						**61.600,00**	**6.600,00**	**11%**
63	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R$ 484.650,00	R$ 484.650,00	100%
64	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 565.700,00	R$ 565.700,00	100%
65	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 1.899.749,20	R$ 0,00	0%
66	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 613.862,88	R$ 307.952,28	50%
		Total do Objetivo 3.2						**3.563.962,08**	**1.358.302,28**	**38%**
67	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 7.553.642,89	R$ 2.630.114,65	35%
68	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 9.673.041,23	R$ 6.458.613,62	67%
69	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R$ 4.663.522,50	R$ 100.000,00	2%
		Total do Objetivo 3.3						**21.890.206,62**	**9.188.728,27**	**42%**
70	30	3. Promover a Execelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
71	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
		Total da Medida Institucional Normativa						**0,00**	**0,00**	**0%**
		TOTAL DA DIRETRIZ 3						**25.515.768,70**	**10.553.630,55**	**41%**
		TOTAL GERAL						**9.322.550.733,99**	**5.870.207.922,50**	**63,0**

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 3º Ciclo 2015
Notas:
1- Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
2- O status informado para os projetos da Ação 0355, referente ao FDNE, refere-se aos compromissos da SUDENE no projeto, não se considerando, neste caso, a obrigação que cabe ao banco operador, por se tratar de compromisso legal e específico do agente, por exemplo, a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI).
3- Medida Institucional Normativa é aquela que, de acordo com o Manual de Elaboração do PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.
Posição: 28/08/2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

ANEXO IV
Projetos tabulados segundo a Programação do PPA 2012-2015

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO DE 2015, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA, E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
1	31	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 3.876.491.700,00	R$ 3.065.105.668,00	79%
2	32	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	TCA - Tecnologia em Componentes Automotivos S/A (unidade da FIAT em Goiana/PE)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 1.959.000.000,00	R$ 1.457.925.388,15	74%
3	33	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 61.728.156,00	R$ 61.728.156,00	100%
4	34	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 53.376.481,00	R$ 0,00	0%
5	35	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 59.700.000,00	R$ 59.700.000,00	100%
6	36	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 54.900.000,00	R$ 53.635.943,87	98%
7	37	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa I Geração e Comercialização de Energia Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 64.439.000,00	R$ 63.942.862,59	99%
8	38	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa II Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 59.864.000,00	R$ 59.435.321,28	99%
9	39	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa III Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 55.278.000,00	R$ 54.848.909,88	99%
10	40	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa IV Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 55.273.000,00	R$ 54.216.447,60	98%
11	41	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Faísa V Geração e Comercialização de Energia LTDA	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 64.455.000,00	R$ 57.321.606,84	89%
12	42	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Icaraí Geração e Comercialização de Energia	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 33.900.000,00	R$ 33.900.000,00	100%
13	43	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 50.000.000,00	R$ 46.786.085,39	94%
14	44	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Baixa Verde S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 49.690.000,03	R$ 49.687.713,17	100%
15	45	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eólica Moxotó S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 46.701.999,96	R$ 34.986.862,96	75%
16	46	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Gestamp Eolicatec Sobradinho S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 29.040.000,00	R$ 29.040.000,00	100%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO DE 2015, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA, E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
17	47	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Pedra do Reino S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 53.959.000,00	R$ 53.959.000,00	100%
18	48	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia Elétrica S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 99.970.000,00	R$ 96.407.194,96	96%
19	49	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia de Cimento da Paraíba - CCP	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 303.000.000,00	R$ 269.869.740,06	89%
20	50	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Aratu S/A (antiga Aratu Empreendimentos Ltda)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 270.582.240,00	R$ 30.000.000,00	11%
21	51	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 23.855.042,00	R$ 19.539.983,88	82%
22	52	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 31.256.000,00	R$ 15.447.600,00	49%
23	53	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Shineray do Brasil S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 61.867.350,00	R$ 61.867.350,00	100%
24	54	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone Multicenter Ltda	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 191.238.424,00	R$ 0,00	0%
25	55	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%
26	56	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Companhia Siderúrgica Suape S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 1.075.935.159,00	R$ 0,00	0%
27	57	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S/A (antiga Foz do Atlantico Saneamento S/A)	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 415.582.562,52	R$ 70.152.822,60	17%
28	58	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Cone S/A	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária - FDNE	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 123.186.471,03	R$ 0,00	0%
		P 2029 - Ação 0355						**9.274.269.585,54**	**5.849.504.657,23**	**63%**
29	10	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R$ 343.585,70	R$ 206.151,42	60%
		P 2029 - Ação 20N7						**343.585,70**	**206.151,42**	**60%**
30	6	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade: Mulheres na Construção Civil (Estado da Paraíba) - Termo de Execução Descentralizada	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 1.183.120,40	R$ 1.183.120,40	100%
31	15	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construindo com Mulheres" - Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – Estado de Alagoas - Convênio nº 813665/2014	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 1.069.868,00	R$ 326.618,00	31%
		P 2029 - Ação 4640						**2.252.988,40**	**1.509.738,40**	**67%**
32	2	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R$ 530.482,50	R$ 265.241,25	50%

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO DE 2015, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA, E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
33	16	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento Ecológico-Econômico da Mesorregião da Borborema do Estado da Paríba	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Em Andamento	R$ 835.823,47	R$ 0,00	0%
		P 2029 - Ação 8689						**1.366.305,97**	**265.241,25**	**19%**
34	1	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Desenvolvimento Sustentável da área de influência do Município de Bom Conselho/PE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 234.105,49	R$ 139.865,15	60%
35	4	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de ponte de concreto armado sobre o rio Olho D'água na localidade de Santa Rosa, interligando ao centro urbano do município de Ruy Barbosa/RN.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Concluído	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00	100%
36	5	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Regional de Energia_Estruturação de um Sistema de Informações Energéticas	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Atrasado	R$ 9.452.840,00	R$ 1.352.840,00	14%
37	7	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 485.874,65	R$ 255.723,17	53%
38	9	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Plano de Desenvolvimento Regional, Territorial, sustentável do Município de Salgueiro e seu entorno.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 359.682,64	R$ 221.267,56	62%
39	13	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhoria do Mercado Público Municipal de Jardim de Piranhas/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 400.000,00	R$ 200.000,00	50%
40	14	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e modernização do mercado de Carne, Frutas e Verduras do Município de Messias Targino/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 150.000,00	50%
41	18	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	1ª Etapa da reforma e melhorias do Mercado Público Municipal do Município de Saboeiro/CE.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 400.000,00	40%
		P 2029 - Ação 8902						**13.032.502,78**	**3.519.695,88**	**27%**
42	8	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de recursos humanos para fortalecimento das administrações locais dos 11 municípios impactados por grandes investimentos na região Norte Metropolitana do Recife e Mata Norte do Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 207.542,62	R$ 107.354,71	52%
43	12	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação Estrategico-Gerencial dos Servidores Públicos de 10 Municipios do Semiárido paraibano	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 410.203,62	R$ 0,00	0%
		P 2029 - Ação 8917						**617.746,24**	**107.354,71**	**17%**
44	26	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Centro Vocacional Tecnológico de Confecções de Tobias Barreto/SE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 857.015,99	R$ 857.015,99	100%
45	28	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Desenvolvimento da Cadeia Biossutentável de plantas Medicinais e Fitoterápicos em PE	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%
		P 2029 - Ação 8340						**2.857.015,99**	**2.857.015,99**	**100%**
46	3	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Capacitação de Produtores Familiares e Fortalecimento das Estruturas Produtivas da Caprinocultura e Apicultura no Estado de Pernambuco.	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R$ 694.459,19	R$ 694.459,19	100%
47	11	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da Caprinocultura no Estado do Ceará	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8918 – Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	Em Andamento	R$ 771.000,00	R$ 221.000,00	29%
		P 2029 - Ação 8918						**1.465.459,19**	**915.459,19**	**62%**
48	17	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Mecanização agrícola para apoio à agricultura familiar no Município - Currais Novos/RN	2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	7K66 - Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%
		P 2029 - Ação 7K66						**250.000,00**	**250.000,00**	**100%**
		Total do Programa 2029						**9.296.455.189,81**	**5.859.135.314,07**	**63%**
49	24	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação de Coordenadores e Subcoordenadores Municipais de Defesa Civil e Integrantes do istema Nacional de defesa Civil, técnicos da EMATER, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da Paraíba.	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Atrasado	R$ 228.797,21	R$ 167.999,61	73%
50	25	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defesa Civil	Capacitação e Reequipamento das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará	2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	Concluído	R$ 350.978,27	R$ 350.978,27	100%
		P 2040 - Ação 8172						**579.775,48**	**518.977,88**	**90%**
		Total do Programa 2040						**579.775,48**	**518.977,88**	**90%**

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

RELAÇÃO DE PROJETOS MONITORADOS NO 3º CICLO DE 2015, SEGUNDO PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA, E INICIATIVAS INSTITUCIONAIS

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado(b)	(b/a) (%)
51	59	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Atualização do Regimento Interno.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
52	60	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Construção do Escritório de Processos da SUDENE	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
53	62	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Desenvolvimento de Lideranças	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 26.600,00	R$ 1.600,00	6%
54	63	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Gestão por Competências	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 25.000,00	R$ 0,00	0%
55	64	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Investindo nos Sonhos	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	50%
56	65	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação do Anexo Nilo Coelho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 7.553.642,89	R$ 2.630.114,65	35%
57	66	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Recuperação das Fundações do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 9.673.041,23	R$ 6.458.613,62	67%
58	67	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.3. Recuperar e modernizar as instalações internas, melhorando a segurança do ambiente de trabalho	Modernização das subestações elétricas do Edifício SUDENE.	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Paralisado	R$ 4.663.522,50	R$ 100.000,00	2%
59	68	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL II - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL entre 1971/2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Atrasado	R$ 484.650,00	R$ 484.650,00	100%
60	69	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	PROCONDEL III - Preservação e disponibilização do acervo produzido pelo CONDEL 1960 - 2000	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 565.700,00	R$ 565.700,00	100%
61	70	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Modernização da infraestrutura da rede Local	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 1.899.749,20	R$ 0,00	0%
62	71	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.2. Aperfeiçoar a governança de Tecnologia da Informação e garantir a segurança da informação e comunicação.	Sistema Informatizado de Gestão do FDNE / FDA / FDCO	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 613.862,88	R$ 307.952,28	50%
		P 2111 - Ação 2000						**25.515.768,70**	**10.553.630,55**	**41%**
		Total do Programa 2111						**25.515.768,70**	**10.553.630,55**	**41%**
63	19	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fórum de Energia	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
64	20	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Plano de Capacitação em Gestão de Projetos de Desenvolvimento Sub-regional	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
65	21	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Fórum Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional - Perspectivas 2016-2019	Não se aplica	Não se aplica	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
66	22	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	1ª Oficina de Fortalecimento Institucional para o Desenvolvimento	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
67	23	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa "Rotas da Integração Nacional" – Oficina Macrorregional Nordeste	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
68	27	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas politicas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Elaboração de Diretrizes Regionalizadas para a Política Industrial do Governo Federal	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
69	29	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Critérios e Prioridades de Aplicação dos Recursos do 1,5% do FDNE	Ação interna	Ação interna	A Iniciar	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
70	30	3. Promover a Execelência Técnica e a Qualidade da Gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração de avaliação de um programa utilizando a metodologia geral de avaliação de planos, programas e projetos na área de atuação da SUDENE	Ação interna	Ação interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
71	61	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	Medida Institucional Normativa	Elaboração da proposta da SUDENE para o novo PPA	Ação interna	Ação interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	0%
		Total das Ações Internas						0,00	0,00	**0%**
		TOTAL GERAL						**9.322.550.733,99**	**5.870.207.922,50**	**63,0**

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 3º Ciclo 2015
Notas:
1- Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.
2- O status informado para os projetos da Ação 0355, referente ao FDNE, refere-se aos compromissos da SUDENE no projeto, não se considerando, neste caso, a obrigação que cabe ao banco operador, por se tratar de compromisso legal e específico do agente, por exemplo, a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado (CEI).
3- Medida Institucional Normativa é aquela que, de acordo com o Manual de Elaboração do PPA, contribui tanto para o alcance das atribuições regimentais da unidade como para a diretriz estratégica na qual se enquadra, além de não demandar recursos orçamentários.
Posição: 28/08/2015

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado
